

대전지방국토관리청

옥산~오창 고속도로 민간투자사업

꺅 기 비 탈 면 현 황 도 보 고 서

꺅기비탈면 : STA.8+010~8+610 우안, 오창방향

작성기관 : (주)에스알이앤씨

2017. 11.



제 출 문

옥산오창고속도로주식회사 귀하

귀사와 계약 체결한 “옥산~오창 고속도로 민간투자사업 중 깎기비탈면 현황도 작성(STA.8+010~8+610 우안, 오창방향)”에 대한 과업을 과업지시서에 의거 성실히 수행 완료하고 그 성과를 본 보고서로 제출합니다.

2017. 11.

서울특별시 종로구 종로 33
GS건설
대표이사 임병용

과업 참여진

▶ 책임기술자

정 석 열 (토질 및 기초 기술사)

▶ 참여기술자

오 세 웅 (지질 및 지반 기술사)

송 진 영 (고급기술자)

김 도 선 (공 학 석 사)

이 용 민 (초급기술자)

김 한 일 (초급기술자)

정 송 희 (초급기술자)

전 상 수 (초급기술자)

대전광역시 유성구 학하북로 53-23
주식회사 에스알이앤씨
대표이사 정 석 열

목 차

1. 과업의 개요	1
1.1 과업의 목적	1
1.2 과업의 범위 및 내용	2
1.3 과업 수행 기간	2
2. 현장 개요	3
2.1 과업구간 위치	3
2.2 주변지형 특성	3
2.3 지질 개요	4
3. 구간별 깎기 비탈면 현황	6
3.1 깎기 비탈면	6
가. 주변지형	6
나. 깎기 비탈면 현황	6
다. 전경 사진	8
라. 측면 사진	9
4. 깎기 비탈면 현황도	10
5. 세부 설명	15
5.1 STA.8+500~8+610	16
5.2 STA.8+420~8+500	19

5.3 STA.8+250~8+420	22
5.4 STA.8+810~8+250	26
6. 비탈면 적용 대책공법 및 필요공법	29
6.1 적용 대책공법	29
6.2 필요공법	29
7. 총 평	29

부록.

깎기 비탈면 현황도 작성 사용기호

불연속면 특성의 공학적 분류

1. 깎기 비탈면 전경사진
2. 깎기 비탈면 현황도
3. 깎기 비탈면 구간별 종평면도
4. 깎기 비탈면 구간별 횡단면도
5. 깎기 비탈면 구간별 세부사진
6. 깎기 비탈면 체크리스트

그림 목차

그림 1. 조사대상 깎기비탈면 위치도	3
그림 2. 조사대상 깎기비탈면 지질도	4
그림 3. 깎기비탈면 시점부 측면사진	9
그림 4. 깎기비탈면 종점부 측면사진	9
그림 5. 종점부 산마루배수구 시공사진	15
그림 6. 계곡부 전경사진	15
그림 7. A 영역에 발달한 불연속면	16
그림 8. A 영역 전경사진	17
그림 9. A 영역 계곡부 상세사진	17
그림 10. A 영역 상세사진 (세편화된 암석)	18
그림 11. A 영역 측면사진	18
그림 12. B 영역에 발달한 불연속면	19
그림 13. B 영역 전경사진	20
그림 14. B 영역 상부 부체도로 및 경작지	20
그림 15. B 영역에서 관찰된 우류침식 및 지하수 누수	21
그림 16. B 영역 하부 생태터널 시공사진	21
그림 17. C 영역에 발달한 불연속면(1)	22
그림 18. C 영역에 발달한 불연속면(2)	23
그림 19. C 영역에 발달한 불연속면 상세사진	23
그림 20. C 영역에서 관찰된 세편화된 암편(1)	24
그림 21. C 영역에서 관찰된 세편화된 암편(2)	24
그림 22. C 영역 측면사진	25
그림 23. C 영역 상부 경작지	25
그림 24. D 영역에 발달한 불연속면	26
그림 25. C 영역 상세사진	27
그림 26. C 영역에서 관찰된 우류침식	27

그림 27. D 영역 상부 경작지 전경사진	28
그림 28. D 영역 측면사진	28

표 목차

표 1. 지질 계통표	5
표 2. 주변지형 및 상부자연비탈면현황	6
표 3. 깎기 비탈면 조사영역별 기본현황	7

1. 과업의 개요

1.1 과업의 목적

본 과업은 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 구간 내에 분포하는 깎기 비탈면 현장의 현황도(Face Map)를 작성하는 것이다.

국내의 경우 전국토의 2/3 이상이 산악지로 구성되어 있어 각종 토목공사에 따른 깎기 비탈면의 발생은 필연적이다. 또한 기상특성상 장마기의 집중강우와 사계절반복에 의한 동결융해 작용으로 토층 이동현상과 암 블록 이완현상에 의한 깎기 비탈면의 붕괴가 많이 발생하고 있는 실정이다. 최근에는 지역적 집중강우에 의해 깎기 비탈면의 붕괴가 더욱 빈번하게 발생하고 있으며, 인명 및 재산피해를 초래하고 있다. 따라서 산업 발전과 더불어 산지를 이용하는 국가기간 도로망의 개설 또는 확장 등의 개발에 있어 깎기 비탈면의 안정성 확보의 중요성이 증대되고 있으며, 이러한 깎기 비탈면의 안정성은 도로 시설의 운영 및 이용의 안전성과도 연관된다.

현재 국토교통부는 전국 일반국도에 분포하고 있는 모든 깎기 비탈면의 현황자료를 데이터베이스로 구축하여 유지관리에 적극 활용하고 있다. 최근 도로의 선형을 직선화하는 개량사업이 활발히 추진됨에 따라 새로운 깎기 비탈면이 지속적으로 생겨나고 있으며, 새로운 비탈면에 대한 데이터 수집이 요구된다. 그러나 최근 조성되는 깎기 비탈면은 친환경적 차원의 방안으로 표면부 녹화공법의 적용 빈도가 매우 높다. 따라서 비탈면 녹화 등의 원인으로 도로공사 준공 후 조사가 불가능한 원지반 및 지질 특성에 대한 자료를 시공 단계에서 수집하는 것이 바람직하며, 본 과업의 목적 또한 여기에 있다. 수집된 자료는 데이터베이스에 전산화되어 관리됨으로써 향후 유지관리 및 보수, 보강시 안정성 평가의 기초 자료로 활용될 것이다.

1.2 과업의 범위 및 내용

본 과업은 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 구간 내에 조성되고 있는 깎기 비탈면을 대상으로 한다. 조사자가 직접 현장을 방문하여 육안 관찰 및 정밀조사를 실시하여 비탈면 안정성에 영향을 미치는 주변지형 및 지질특성을 파악하였다. 국토교통부 도로운영과에서 제시하고 있는 깎기 비탈면 현황도 작성 요령을 숙지하고 정해진 형식에 따라 조사대상 깎기 비탈면의 현황도를 작성하였다. 작성된 현황도는 대표적인 구간에 있어서 영역을 구분하고, 각 영역별로 암질, 풍화도, 불연속면 특성, 위험인자 등을 기입하였다. 현황도에 표현하지 못한 깎기 비탈면 안정성과 관련된 주요 특징들은 사진자료를 첨부하여 각 영역별 세부설명을 기재하였다.

- 공 사 명 : 옥산~오창 고속도로 민간투자사업
- 과 업 구 간 : STA.8+010~8+610 우안, 오창방향



- 과업수행내용 : 주변지형 및 지질특성 파악
현황도 작성
불연속면 자료 수집
사진자료 수집

1.3 과업 수행 기간

- 2015. 04. ~ 2018. 01.

2. 현장 개요

2.1 과업구간 위치

○ 행정지명 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 성산리




【그림 1】 조사대상 깎기비탈면 위치도

2.2 주변지형 특성

본 조사지역은 충청북도 서남단에 위치하며, 청주시 흥덕구 옥산면 수락리부터 청원구 오창읍 도암리에 위치하고 있다. 본 조사지역의 산계는 북동-남서방향으로 발달하고 있으며, 시점부 일대는 변성암류로 비교적 기복의 차가 심한 험준한 지형을 이루며, 종점부 일대는 풍화 및 침식에 약한 화강암류의 영향으로 지형적으로 평탄한 지형을 이루고 있다. 조사구간의 남서쪽의 만경산($\Delta 385.0\text{m}$), 매봉산($\Delta 209.5\text{m}$)의 경우 비교적 높은 고도로 발달하는 반면 노선구간 주변의 돛대산($\Delta 177.1\text{m}$), 상봉산($\Delta 196.3\text{m}$) 경우 비교적 낮은 고도로 발달하고 있다.

본 조사지역의 수계는 시점부에서 병천천, 용두천, 성재천, 화산천이 종점부에서 송대천, 미호천이 발달하여 병천천, 용두천, 화산천, 송대천은 노선과 교차하는 수계에 해당한다. 주수계는 사행하천으로 발달하고, 대부분의 하천이 수지상으로 발달되어있다. 시점부와 중앙부의 경우 중밀도의 수계망을 보이며, 종점부로 갈수록 저밀도의 수계망을 보인다.

2.3 지질 개요

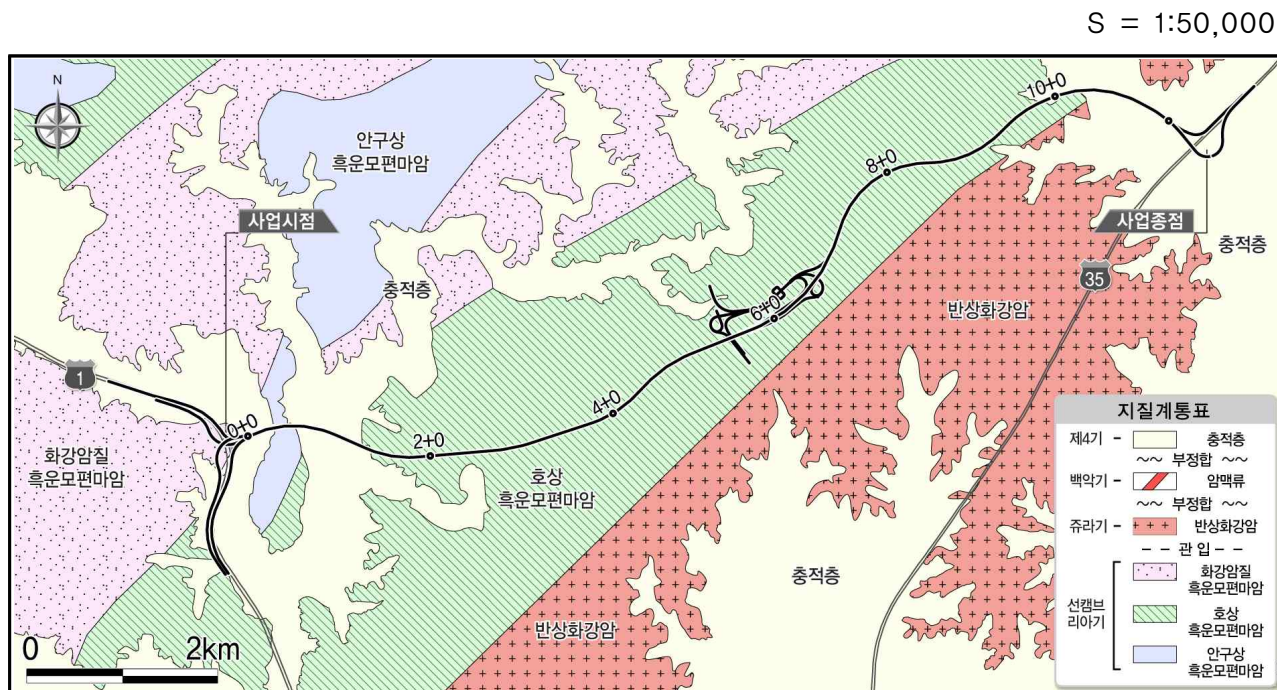

【그림 2】 조사대상 깎기비탈면 지질도

본 조사지역의 지질은 주로 선캠브리아기의 흑운모편마암류를 기반암으로 이를 관입한 주라기의 반심성 화강암류와 이들을 관입한 암맥류가 산재하며, 이를 제4기 충적층이 부정합으로 피복하고 있다. 편마암은 호상흑운모편마암이 우세하며 화강암질흑운모편마암 및 안구상흑운모편마암 등이 일부 관찰된다.


호상흑운모편마암은 석영, 장석, 흑운모가 우세하며, 2~3cm 두께의 우흑대와 우백대가 교호하는 엽리구조가 발달 되어있다.

화강암질 흑운모편마암은 흑운모는 신장되어 엽리상의 구조가 발달하며 화강암과 조성과 구조가 유사한 중립 내지 조립질이다.

안구상 흑운모편마암은 석영, 흑운모, 사장석 등으로 구성되며, 화성기원의 변성암에 해당된다. 노선구간에 분포하는 암석 중 가장 신선한 상태를 보인다.

쥬라기 반심성 화강암류는 반상화강암이 괴상으로 지표에 노출되어 노두는 풍화되어 신선한 상태의 암반을 관찰할 수 없고 대부분 모암의 구조를 보여주는 풍화암 내지 풍화토로 분포된다.

【표 1】 지질 계통도

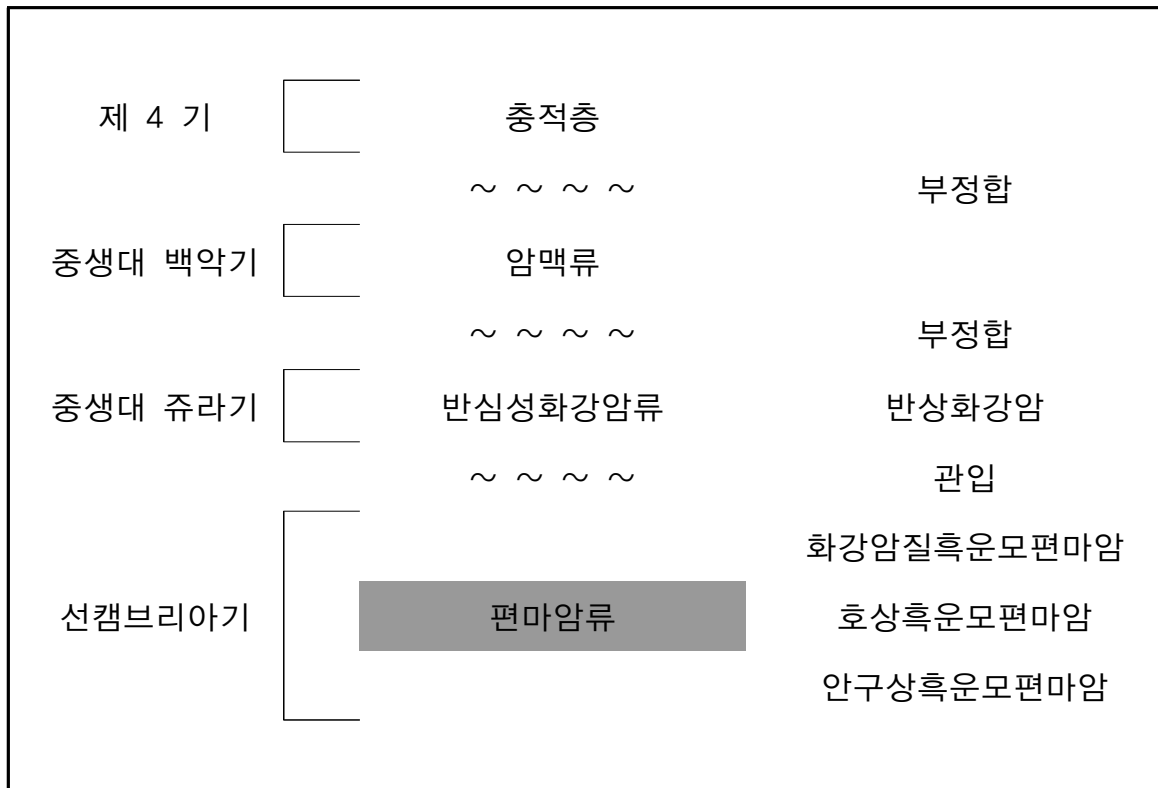

3. 구간별 깎기 비탈면 현황

3.1 깎기 비탈면

가. 주변지형

【표 2】 주변지형 및 상부 자연 비탈면 현황

주변지형의 특성	• STA.8+010~8+610 우안, 오창방향 • 준 산악 지형	
상부자연비탈면	경 사	-19 ~ 9°
	인장균열	무
	포행흔적	무
	수목의 기울어짐	무
	인공구조물	유(부체도로#30)
	산마루 배수구	유(STA.8+460~8+520, STA.8+550~8+610)
	계곡부 유무	유(STA.8+500)
토층 심도	5.0 m 이하	

나. 깎기비탈면 현황

본 깎기 비탈면은 STA.8+010~8+610 우안, 오창방향에 위치한 연장 600m, 최대높이 30.3m, 경사/경사방향이 27~45/336~357인 혼합비탈면이다. 소단은 5개소이며, 비탈면의 깎기 경사도는 토사 1:1.2~2.0, 리핑 1:1.0으로 시공되어 있다.

깎기 비탈면을 이루고 있는 주 암종은 호상흑운모편마암으로 발달하고 있는 상태이다. 상부 자연비탈면의 경사는 -17 ~ 9° 의 준 산악 지형으로 형성되어 있다. STA.8+500 구간에 계곡부가 형성되어 있으며, 산마루 배수구 및 종배수구가 시공중에 있다.

비탈면 전체적으로 풍화가 심한 상태이며 부분적으로 지하수 누출이 관찰된다. 비탈면 하부 암반에 불연속면이 발달하여 있으며, 토사구간에서 우수에 의한 토사유실 및 우류침식이 관찰된다. STA.8+420~8+465 구간에 생태통로를 위한 개착식 터널이 시공중에 있으며 상부비탈면 구간이 되메우기 되어 생태통로가 시공될 예정이다.

본 깎기 비탈면은 풍화의 정도와 절리면들의 상태, 우류에 의한 세굴 및 소단유실 등을 기준으로 총 4개 영역으로 나누어 조사를 실시하였으며, 기타 자세한 사항은 첨부한 현황도에 도시화하여 나타내었다.

【표 3】 깎기 비탈면 조사 영역별 기본 현황

영역	소단	구간	경사도	풍화도	암종	비고
A	2	STA.8+500~8+610 하단부	1:1.0~2.0	H.W.~C.W.	호상흑운모 편마암	불연속면 발달 세편화된 암석 지하수 유출
B	4	STA.8+420~8+500	1:1.0~2.0	M.W.~C.W.	호상흑운모 편마암	불연속면 발달 세편화된 암석 지하수 유출
C	2	STA.8+250~8+420 하단부	1:1.0~2.0	M.W.~C.W.	호상흑운모 편마암	불연속면 발달 세편화된 암석
D	1	STA.8+010~8+250 하단부	1:1.0~2.0	H.W.~C.W.	호상흑운모 편마암	불연속면 발달 세편화된 암석 토사유실 및 우류침식

다. 전경 사진



라. 측면 사진





【그림 3】 깎기비탈면 시점부 측면 사진





【그림 4】 깎기비탈면 종점부 측면 사진


4. 깎기비탈면 현황도

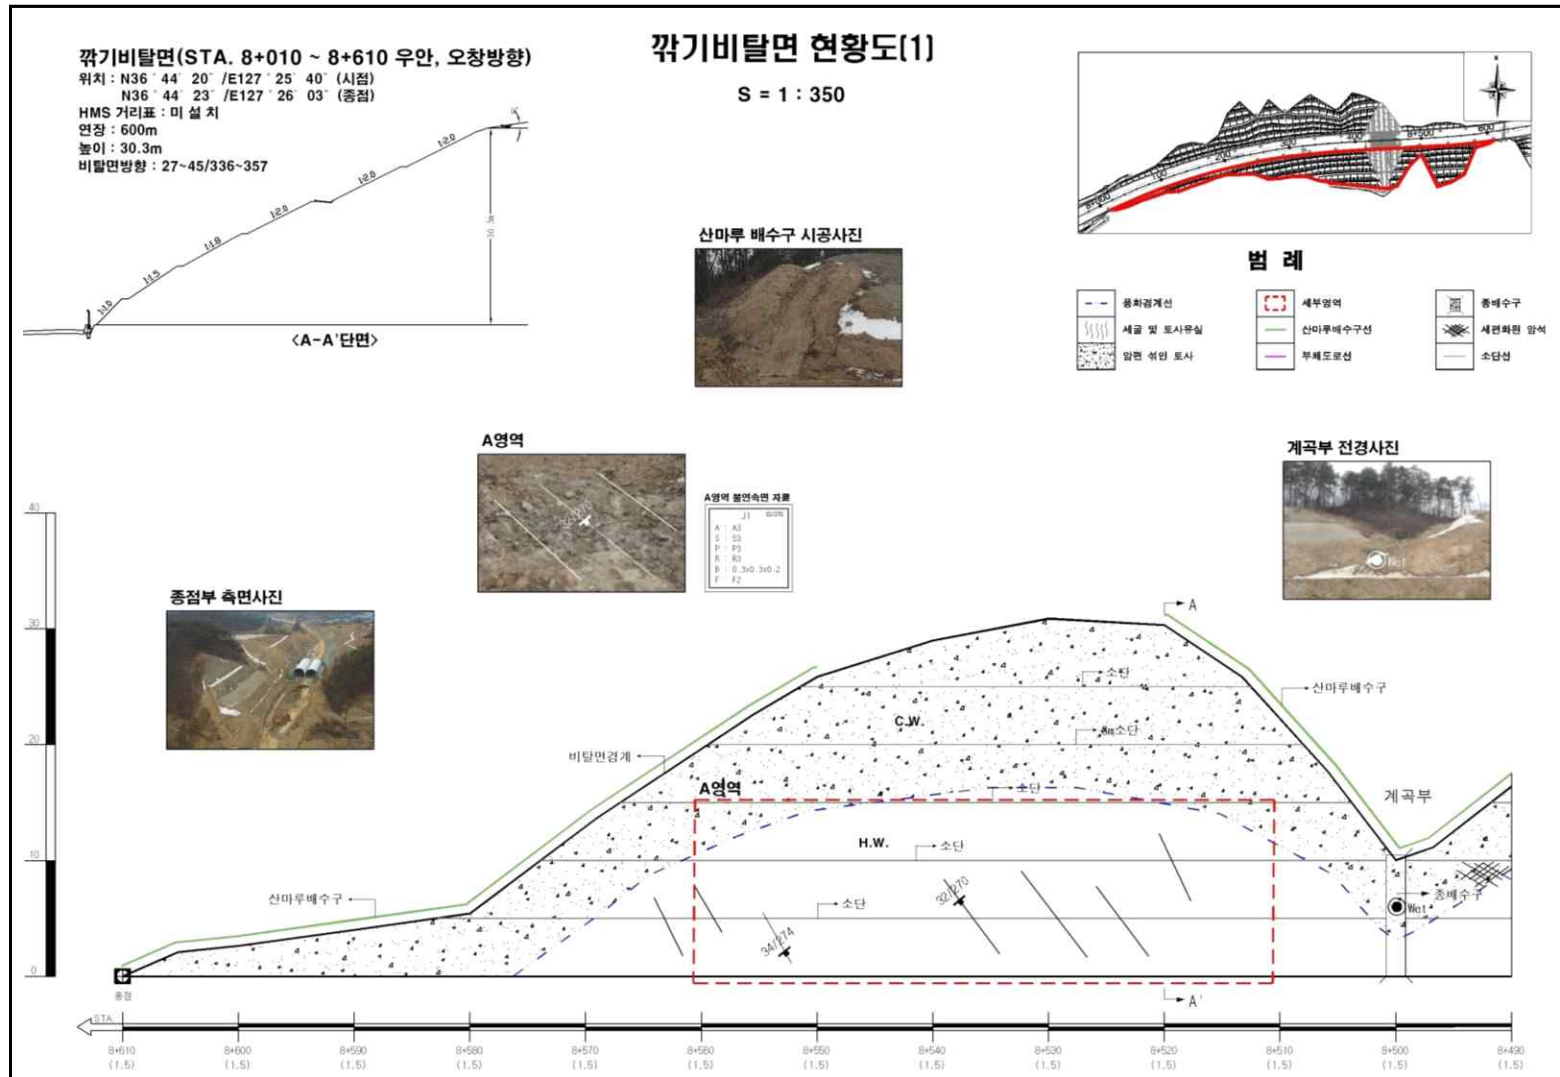

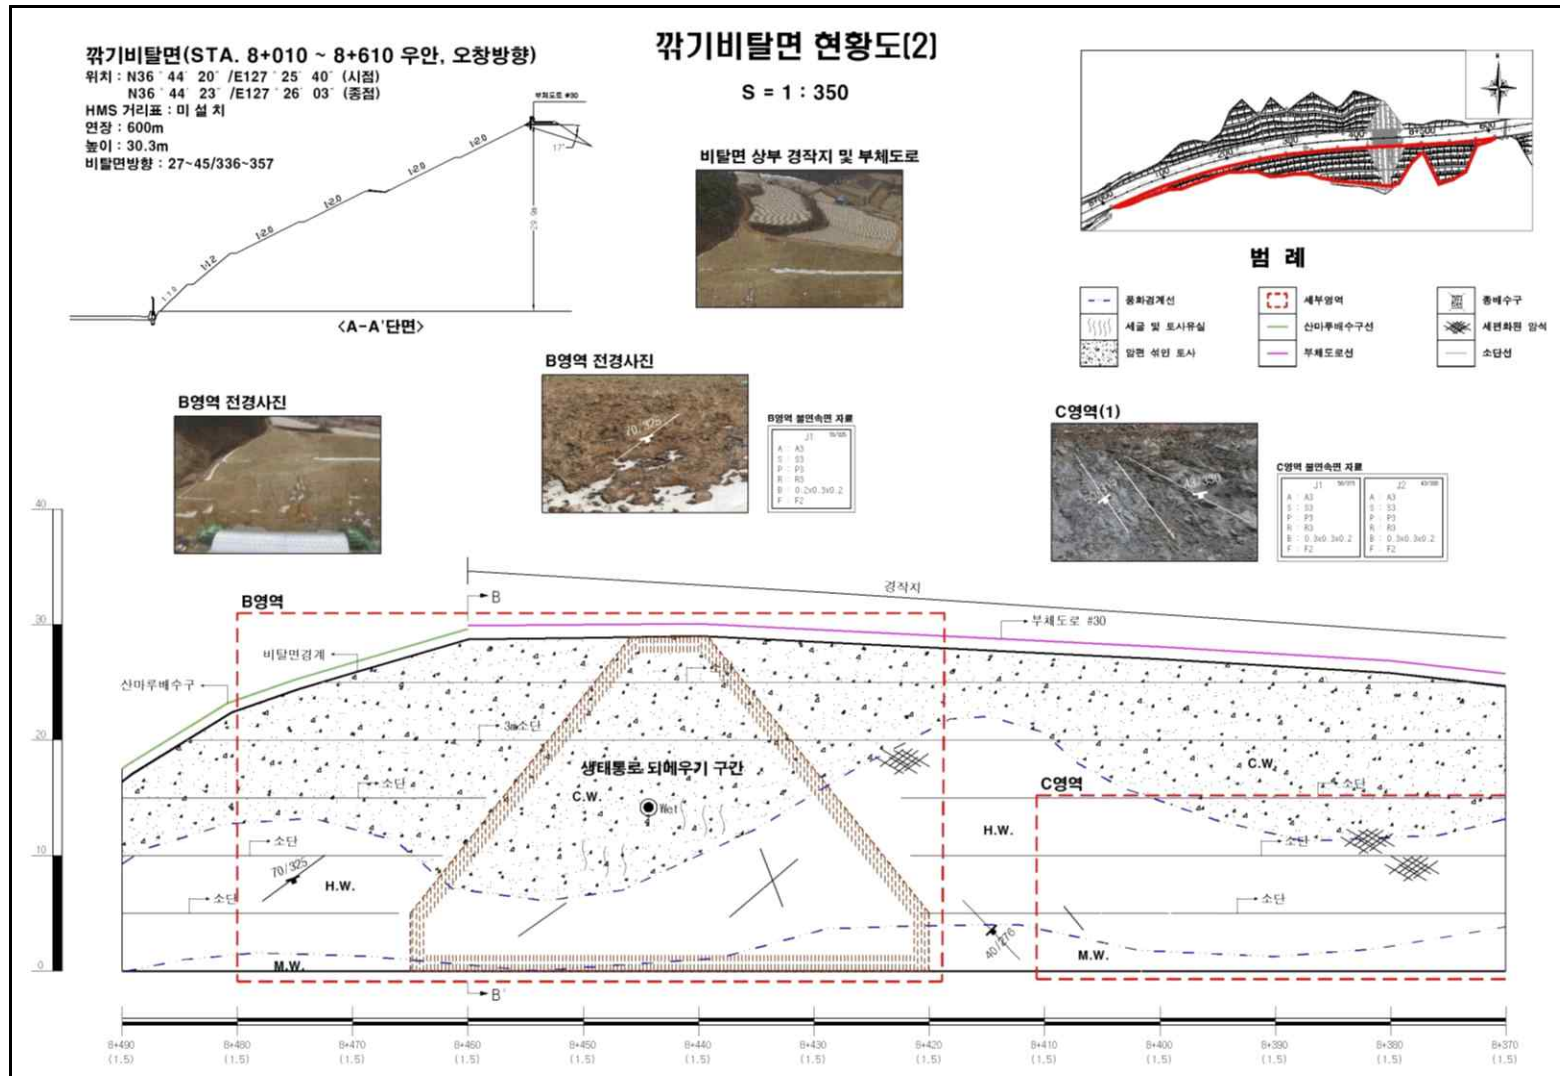

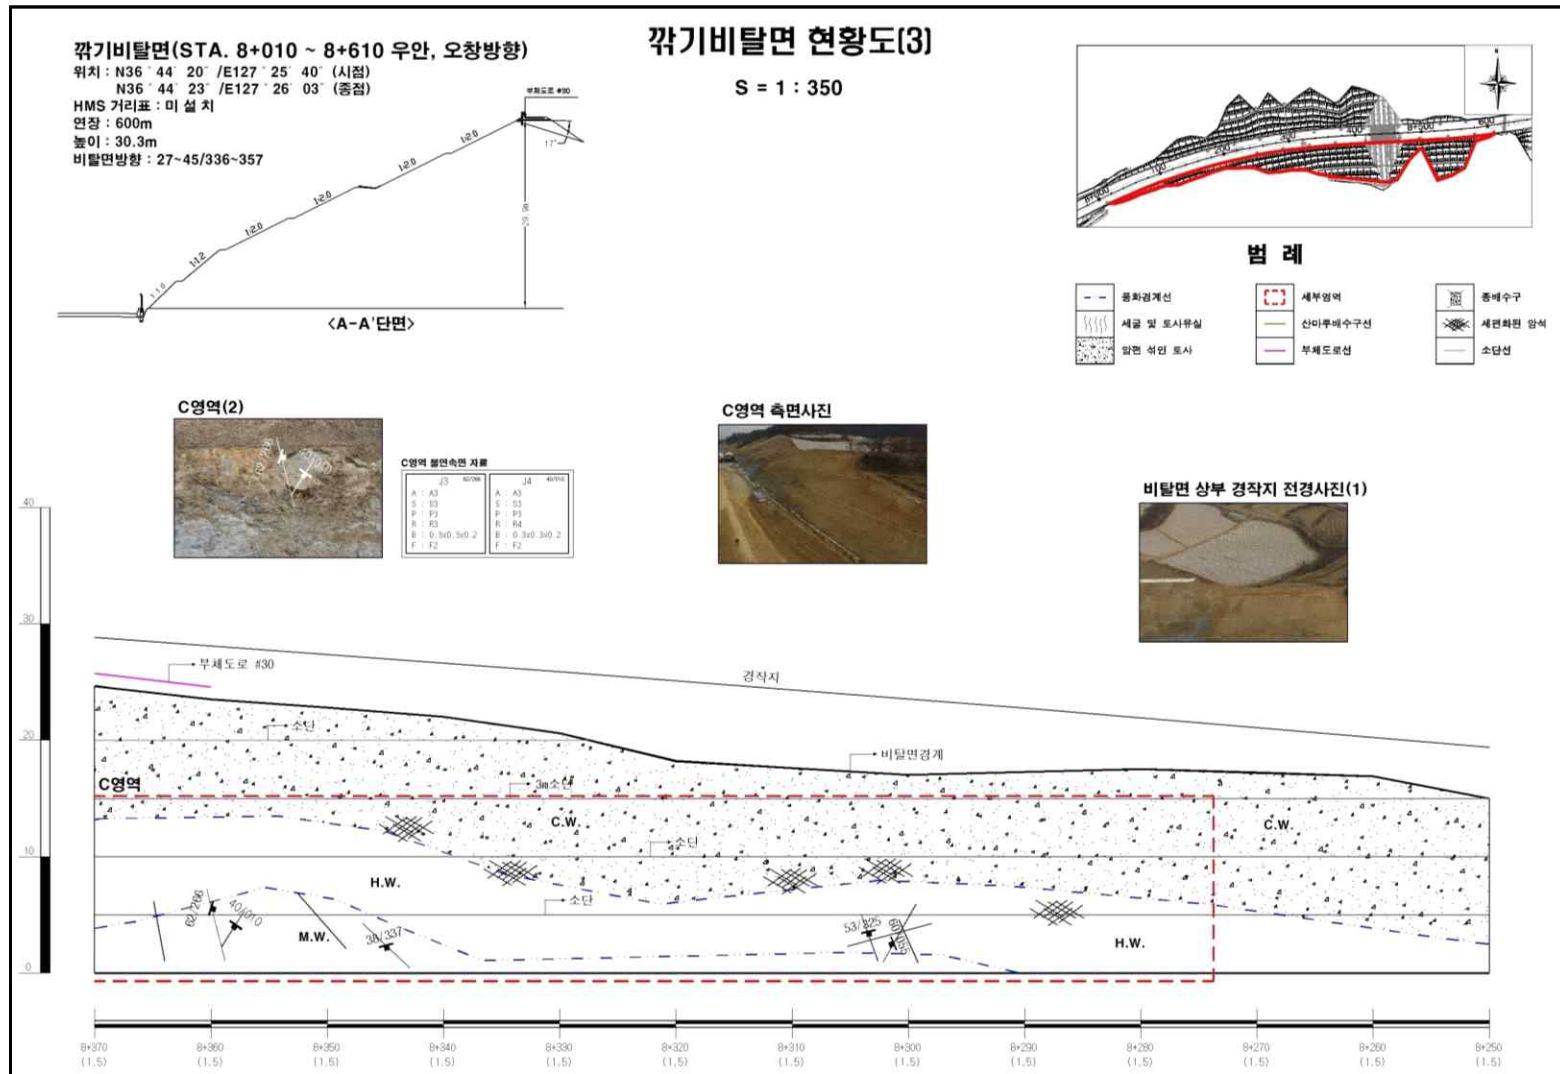

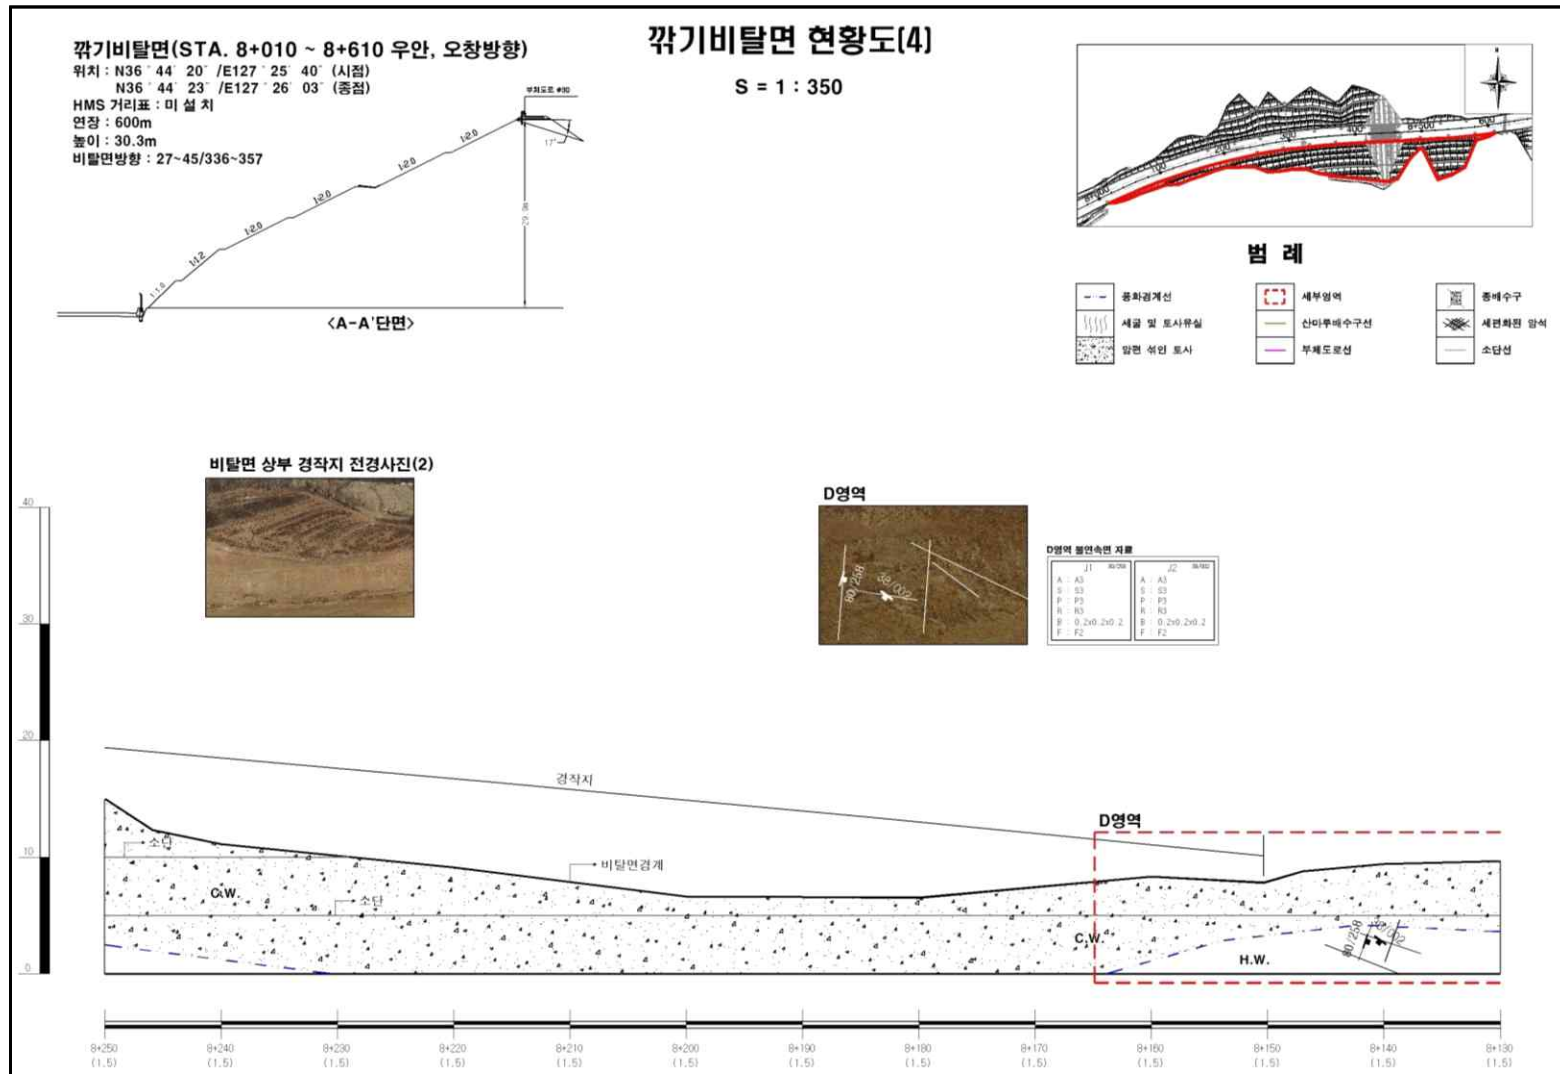

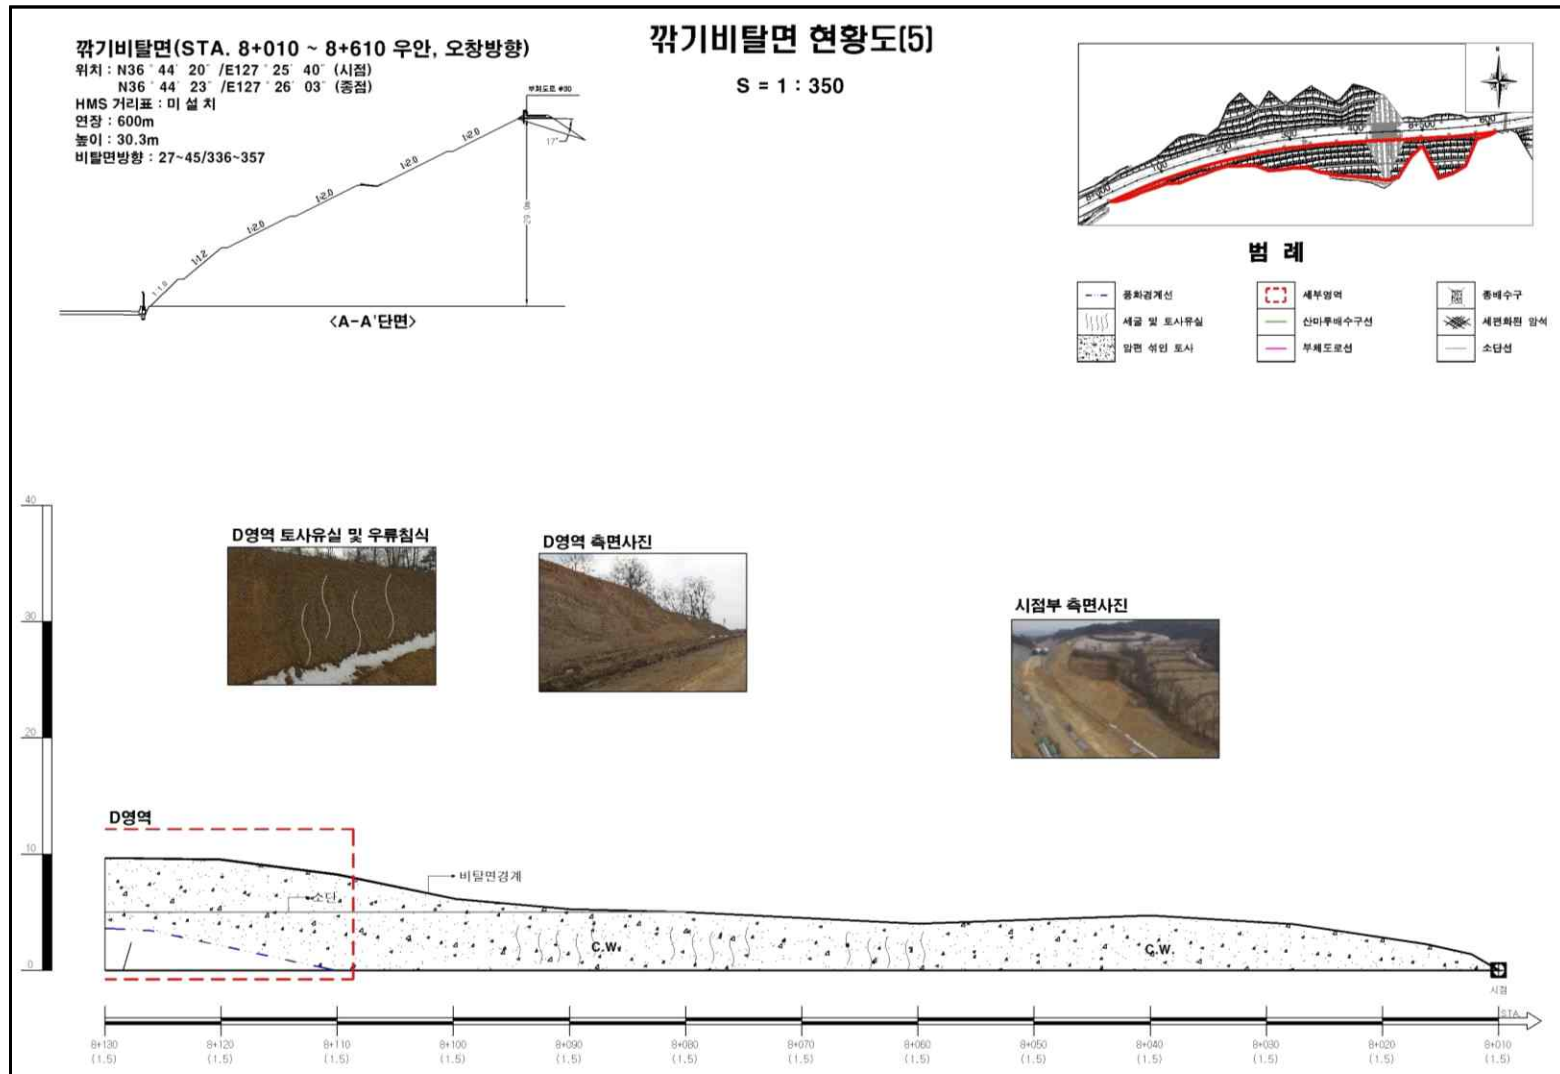

5. 세부 설명

조사대상 깎기비탈면의 세부적인 특징을 각 영역별로 살펴보면 다음과 같다.




【그림 5】 종점부 산마루배수구 시공사진



【그림 6】 계곡부 전경사진

5.1 STA.8+500~8+610

STA.8+500~8+610 구간에서 비탈면의 방향은 27~45/336~357 이며 하단부에 A영역이 위치하고 있다. 암반의 풍화정도는 심한풍화~완전풍화 상태이며, 비탈면을 이루고 있는 주 암종은 호상흑운모편마암으로 발달하고 있다. 주변에 발달한 32/270 불연속면 특성은 간극 0.1~1.0mm, 간격 0.2~0.6m, 연장성 3~10m, 거칠기는 약간거침 상태이며 암석의 크기는 0.3m×0.3m×0.2m의 규모로 단단한 충전물 5mm이하로 협재되어 있다. STA.8+500구간에 계곡이 형성되어 있으며 비탈면 하부에 젖음 상태의 지하수 누수 흔적이 관찰되었다. 불연속면의 방향성은 비탈면의 안정성에 크게 영향을 미치지 않을 것으로 보이나 암반의 풍화가 심하여 부분적으로 세편화 되어 있다. 암반의 풍화가 진행됨에 따라 세편화된 암편이 이완되어 소규모 낙석이 발생할 것으로 보인다. 따라서 비탈면의 장기적인 안정성을 유지하기 위한 적절한 비탈면 보호공법이 적용되어야 할 것으로 판단된다.

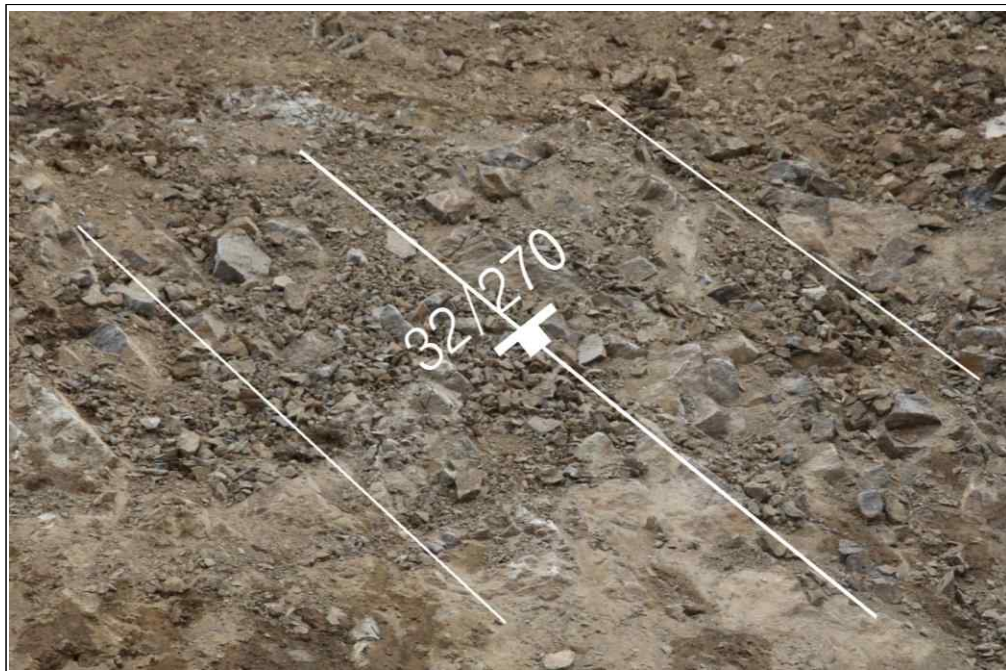

【그림 7】 A 영역에 발달한 불연속면



【그림 8】 A 영역 전경사진



【그림 9】 A 영역 계곡부 상세사진



【그림 10】 A 영역 상세사진 (세편화된 암석)



【그림 11】 A 영역 측면사진

5.2 STA.8+420~8+500

STA.8+420~8+500 구간에서 비탈면의 방향은 27~45/336~357 이며 구간 내에 B영역이 위치하고 있다. 암반의 풍화정도는 보통풍화~완전풍화 상태이며, 비탈면을 이루고 있는 주 암종은 호상흑운모편마암으로 발달하고 있다. 주변에 발달한 70/325 불연속면 특성은 간극 0.1~1.0mm, 간격 0.2~0.6m, 연장성 3~10m, 거칠기는 약간거침 상태이며 암석의 크기는 0.2m×0.3m×0.2m의 규모로 단단한 충전물 5mm이하로 협재되어 있다. 비탈면 상단부에 부체도로#30이 시공중에 있으며, 그 뒤로 경작지가 형성되어 있다. 비탈면 중단부에 젖음 상태의 지하수 누수가 관찰되었으며, 부분적으로 세편화된 암편이 발달하여 있다. 비탈면 하부 STA.8+420~8+465 구간에 생태통로를 위한 터널이 시공중에 있으며, 상부에 되메우기를 통하여 생태통로가 시공될 예정이다. 불연속면의 방향성은 비탈면의 안정성에 크게 영향을 미치지 않을 것으로 보이나, 암반의 풍화가 진행됨에 따라 세편화된 암편의 이완으로 소규모 낙석이 예상된다. 따라서 비탈면의 장기적인 안정성을 유지하기 위한 적절한 비탈면 보호공법이 적용되어야 할 것으로 판단된다.




【그림 12】 B 영역에 발달한 불연속면



【그림 13】 B 영역 전경사진



【그림 14】 B 영역 상부 부체도로 및 경작지

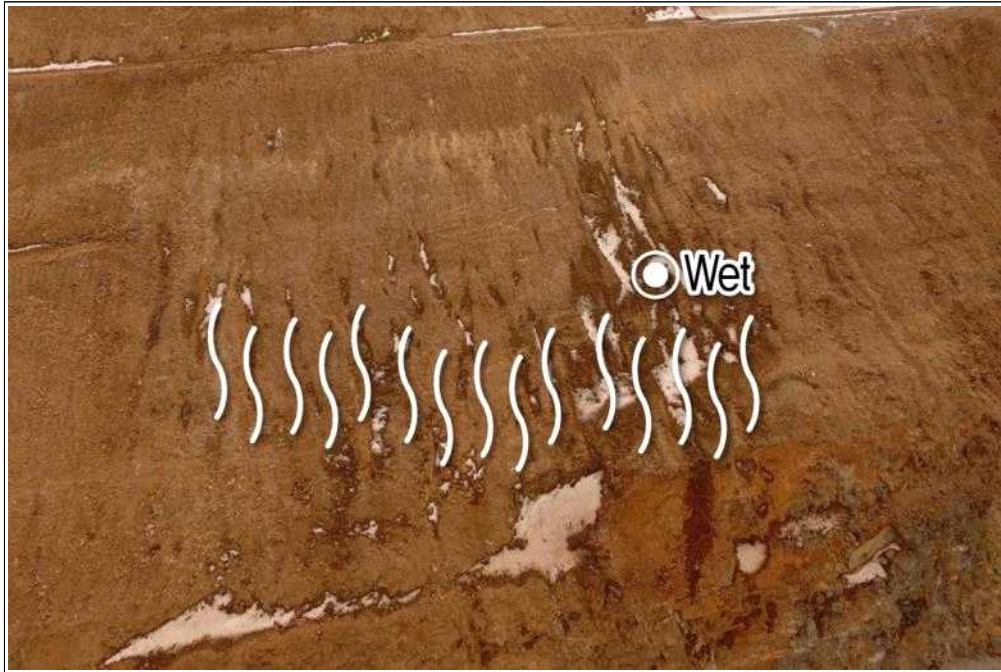


【그림 15】 B 영역에서 관찰된 우류침식 및 지하수 누수




【그림 16】 B 영역 하부 생태터널 시공사진

5.3 STA.8+250~8+420

STA.8+250~8+420 구간에서 비탈면의 방향은 27~45/336~357 이며 하단부에 C영역이 위치하고 있다. 암반의 풍화정도는 보통풍화~완전풍화 상태이며, 비탈면을 이루고 있는 주 암종은 호상흑운모편마암으로 발달하고 있다. 주변에 발달한 50/315 불연속면 특성은 간극 0.1~1.0mm, 간격 0.2~0.6m, 연장성 3~10m, 거칠기는 약간거침 상태이며 암석의 크기는 0.3m×0.3m×0.2m의 규모로 단단한 충전물 5mm이하로 협재되어 있고, 43/330 불연속면 특성은 간극 0.1~1.0mm, 간격 0.2~0.6m, 연장성 3~10m, 거칠기는 약간거침 상태이며 암석의 크기는 0.3m×0.3m×0.2m의 규모로 단단한 충전물 5mm이하로 협재되어 있다. 62/266 불연속면 특성은 간극 0.1~1.0mm, 간격 0.2~0.6m, 연장성 3~10m, 거칠기는 약간 거침 상태이며 암석의 크기는 0.3m×0.3m×0.2m의 규모로 단단한 충전물 5mm이하로 협재되어 있으며, 40/010 불연속면 특성은 간극 0.1~1.0mm, 간격 0.2~0.6m, 연장성 3~10m, 거칠기는 평활 상태이며 암석의 크기는 0.3m×0.3m×0.2m의 규모로 단단한 충전물 5mm이하로 협재되어 있다. 비탈면 상부는 암반의 풍화가 심하나, 하단부는 비교적 양호한 상태이다. 62/266, 40/010 방향성의 절리가 교차하며 발달하고 있어 소규모 썩기파괴가 예상되며 부분적으로 세편화된 암편의 이완으로 인한 낙석이 예상된다. 따라서 비탈면의 장기적인 안정성을 유지하기 위한 적절한 비탈면 보호 및 보강공법이 적용되어야 할 것으로 판단된다.



【그림 17】 C 영역에 발달한 불연속면(1)




【그림 18】 C 영역에 발달한 불연속면(2)



【그림 19】 C 영역에 발달한 불연속면 상세사진



【그림 20】 C 영역에서 관찰된 세편화된 암편(1)



【그림 21】 C 영역에서 관찰된 세편화된 암편(2)




【그림 22】 C 영역 측면사진



【그림 23】 C 영역 상부 경작지

5.4 STA.8+010~8+250


STA.8+010~8+250 구간에서 비탈면의 방향은 27~45/336~357 이며 하단부에 D영역이 위치하고 있다. 암반의 풍화정도는 심한풍화~완전풍화 상태이며, 비탈면을 이루고 있는 주 암종은 호상흑운모편마암으로 발달하고 있다. 주변에 발달한 80/258 불연속면 특성은 간극 0.1~1.0mm, 간격 0.2~0.6m, 연장성 3~10m, 거칠기는 약간거침 상태이며 암석의 크기는 0.2m×0.2m×0.2m의 규모로 단단한 충전물 5mm이하로 협재되어 있고, 38/002 불연속면 특성은 간극 0.1~1.0mm, 간격 0.2~0.6m, 연장성 3~10m, 거칠기는 약간거침 상태이며 암석의 크기는 0.2m×0.2m×0.2m의 규모로 단단한 충전물 5mm이하로 협재되어 있다. 토사 구간에서 우수에 의한 토사유실 및 우류침식이 관찰되었다. 비탈면 전체적으로 풍화가 심하고 비탈면 방향으로 발달한 38/002 방향성의 불연속면으로 인한 소규모 평면파괴가 예상된다. 풍화가 빠르게 진행되고 있어 절리의 교차로 발달한 암편의 이완으로 낙석이 발생할 것으로 보인다. 따라서 비탈면의 장기적인 안정성을 유지하기 위한 적절한 비탈면 보호 및 보강공법이 적용되어야 할 것으로 판단된다.



【그림 24】 D 영역에 발달한 불연속면



【그림 25】 D 영역 상세사진



【그림 26】 D 영역에서 관찰된 우류침식



【그림 27】 D 영역 상부 경작지 전경사진



【그림 28】 D 영역 측면사진

6. 비탈면 적용 대책공법 및 필요공법

6.1 적용 대책공법

깎기 경사도	적용 대책공법	시공현황
리핑 1:1.0	낙석방지울타리 종배수구 산마루배수구	시공예정
토사 1:1.2~2.0		시공중 시공중

6.2 필요공법

깎기 경사도	필요공법	선정사유
리핑 1:1.0	비탈면 보호공법 비탈면 보강공법	-
토사 1:1.2~2.0		

7. 총 평

- 조사대상 깎기 비탈면은 옥산~오창 고속도로 민간투자사업 구간 내에 분포하는 깎기 비탈면으로 행정 구역상 충청북도 청주시 청원구 오창읍 성산리에 위치함.
- 본 깎기 비탈면은 STA.8+010~8+610 우안, 오창방향에 위치한 연장 600m, 최대높이 30.3m, 경사/경사방향이 27~45/336~357인 혼합비탈면임.
- 깎기 비탈면을 이루고 있는 주 암종은 호상흑운모편마암으로 발달하고 있고 풍화정도는 보통풍화~완전풍화의 상태임.
- STA.8+500 구간에 계곡부가 형성되어 있으며, 산마루 배수구 및 종배수구가 시공중에 있음. STA.8+420~8+465 구간에 생태통로를 위한 개착식 터널이 시공중에 있으며 상부비탈면 구간이 되메우기 되어 생태통로가 시공될 예정임.
- A영역은 STA.8+500~8+610 하단부에 위치하여 32/270 방향성의 불연속면이 발달하고 있으며 풍화정도는 심한풍화~완전풍화 상태임. 부분적으로 지하수누수의 흔적이 및 세편화된 암편이 관찰됨. 불연속면의 방향성은 비탈면의 안정성에 크게 영향을 미치지 않을 것으로 보이나 암반의 풍화가 진행됨에 따라 세편화된 암편이 이완되어 소규모 낙석이 발생할 것으로 예상됨. 따라서 비탈면의 장기적인 안정성을 유지하기 위한 적절한 비탈면 보호

공법이 적용되어야 할 것으로 판단됨.

- B영역은 STA.8+420~8+500 구간에 위치하며 70/325 방향성의 불연속면이 발달하고 있음, 암반의 풍화정도는 보통풍화~완전풍화 상태로 비탈면 부분적으로 세편화된 암편이 발달하여 있음. 비탈면 상단부에 부체도로#30이 시공중에 있으며, 그 뒤로 경작지가 형성되어 있음. 비탈면 하부 STA.8+420~8+465 구간에 생태통로를 위한 터널이 시공중에 있으며, 상부에 되메우기를 통하여 생태통로가 시공될 예정임. 비탈면 중단부에 젖음 상태의 지하수 누수가 관찰되었으며, 불연속면의 방향성은 비탈면의 안정성에 크게 영향을 미치지 않을 것으로 보이나, 암반의 풍화가 진행됨에 따라 세편화된 암편의 이완으로 소규모 낙석이 예상됨. 따라서 비탈면의 장기적인 안정성을 유지하기 위한 적절한 비탈면 보호공법이 적용되어야 할 것으로 판단됨.
- C영역은 STA.8+250~8+420 하단부에 위치하며 50/315, 43/330, 62/266, 40/010 방향성의 불연속면이 발달하고 있음. 암반의 풍화정도는 보통풍화~완전풍화 상태로 62/266, 40/010 방향성의 절리가 교차하며 발달하고 있어 소규모 썩기파괴가 예상되며 부분적으로 세편화된 암편의 이완으로 인한 낙석이 예상됨. 따라서 비탈면의 장기적인 안정성을 유지하기 위한 적절한 비탈면 보호 및 보강공법이 적용되어야 할 것으로 판단됨.
- D영역은 STA.8+010~8+250 하단부에 위치하며 80/258, 38/002 방향성의 불연속면이 발달하고 있음. 암반의 풍화정도는 심한풍화~완전풍화 상태로 토사구간에서 우수에 의한 토사유실 및 우류침식이 관찰됨. 비탈면 전체적으로 풍화가 심하고 비탈면 방향으로 발달한 38/002 방향성의 불연속면으로 인한 소규모 평면파괴가 예상됨. 풍화가 빠르게 진행되고 있어 절리의 교차로 발달한 암편의 이완으로 낙석이 발생할 것으로 보임. 따라서 비탈면의 장기적인 안정성을 유지하기 위한 적절한 비탈면 보호 및 보강공법이 적용되어야 할 것으로 판단됨.
- 위 내용을 종합하여 보면 비탈면 전체적으로 풍화가 심하며, 부분적으로 지하수 누수의 흔적 및 우수에 의한 세굴이 관찰됨. 암반구간에 불연속면이 발달하여 있으며 서로 교차하여 소규모 썩기파괴 및 평면파괴가 발생할 것으로 예상됨. 암반의 풍화가 진행됨에 따라 절리의 교차로 발달한 세편화된 암편의 이완으로 낙석이 발생할 것으로 보임. 따라서 비탈면의 장기적인 안정성을 유지하기 위한 적절한 비탈면 보호 및 보강공법이 적용되어야 할 것으로 판단됨.







부 록

깎기비탈면현황도 작성 사용기호

불연속면 특성의 공학적 분류

1. 깎기비탈면 전경사진
 2. 깎기비탈면 현황도
 3. 깎기비탈면 구간별 종평면도
 4. 깎기비탈면 구간별 횡단면도
 5. 깎기비탈면 구간별 세부사진
 6. 깎기비탈면 체크리스트
-

깎기비탈면 현황도(Face map) 작성 사용기호

기호	대상	비고	기호	대상	비고
	연장 (이격거리)		S : S3	불연속면 간격	
	높이		P : P4	불연속면 연장성	
M.W.	풍화도		R : R5	불연속면 거칠기	
	절리 (20 : 경사)		B : 2×2×1	암괴의 크기	
	역전된 절리		F : F2	불연속면 충진물질	
	층리 (30 : 경사)		 damp	누수정도	
	엽리 (45 : 경사)			붕괴부	
	단층 (U ; 상반 D ; 하반)			슬라이딩	
	습곡(향사)			동굴	
	습곡(배사)			식생	
A : A2	불연속면 틈 간극			붕괴가능지역	

<부록 그림 1> 현황도에 사용되는 기호

불연속면 특성의 공학적 분류

- 방향성 : 방향성은 경사/경사방향으로 표시한다.
- 간극(Aperture) : 틈 게이지(Aperture gauge)를 이용하여 측정한 간극을 기호로서 표기한다.

구분(mm)	기호
0	A1
0.0~0.1	A2
0.1~1.0	A3
1.0~5.0	A4
>5.0	A5

- 간격(Spacing) : 불연속면의 간격은 불연속면군을 이루는 불연속면의 수직 거리로, 절리를 직접 잴 수 없는 경우에는 시추코어를 사용하여 추정하며, 절리간격은 다음과 같은 값의 범위로 표기한다.

구분(m)	기호
>2.0	S1
0.6~2.0	S2
0.2~0.6	S3
0.06~0.2	S4
<0.06	S5

- 연장성(Persistence) : 불연속면이 연장되는 크기를 기호로서 표기한다.

구분(m)	기호
<1	P1
1~3	P2
3~10	P3
10~20	P4
>20	P5

- 거칠기(Roughness) : 불연속면의 거친 정도를 기호로서 표기한다.

구분	기호
매우거침(Very rough)	R1
거침(rough)	R2
약간거침(slightly rough)	R3
평활(Smooth)	R4
활면(slickensided)	R5

- 암괴의 크기(Block Size) : 암괴의 크기는 불연속면군의 수, 불연속면 간격 및 연장성에 의해 결정되며, 현황도상의 표기는 (가로×세로×높이)로서 기재한다.
- 충전물질(Filling material) : 불연속면의 인접 암괴 벽면을 분리시키고 있는 물질에 대해 기술하는 것으로 점토, 사질토, 단층점토, 방해석, 단층각력 등의 존재 여부와 두께를 기호로 표시한다.

구분(mm)			기호
없음			F1
있음	단단한 충전물 (Hard filling)	<5mm	F2
		>5mm	F3
	연약한 충전물 (Soft filling)	<5mm	F4
		>5mm	F5

- 누수정도 : 불연속면 내 지하수의 누수 정도를 습윤(Damp), 젖음(Wet), 흐름(Flow)의 3단계로 구분하여 기호로 기재한다.

용어	정의	기호
습윤 (Damp)	불연속면 내 이끼 축적 가 자생하여 한 상태	● damp
젖음 (Wet)	불연속면 내 지하 수로 인하여 젖어 있는 상태	● wet
흐름 (Flow)	불연속면 내 지하 수가 누수되고 있는 상태	● flow

1. 깎기비탈면 전경사진



측면사진


• 시점부




• 종점부



2. 깎기비탈면 현황도

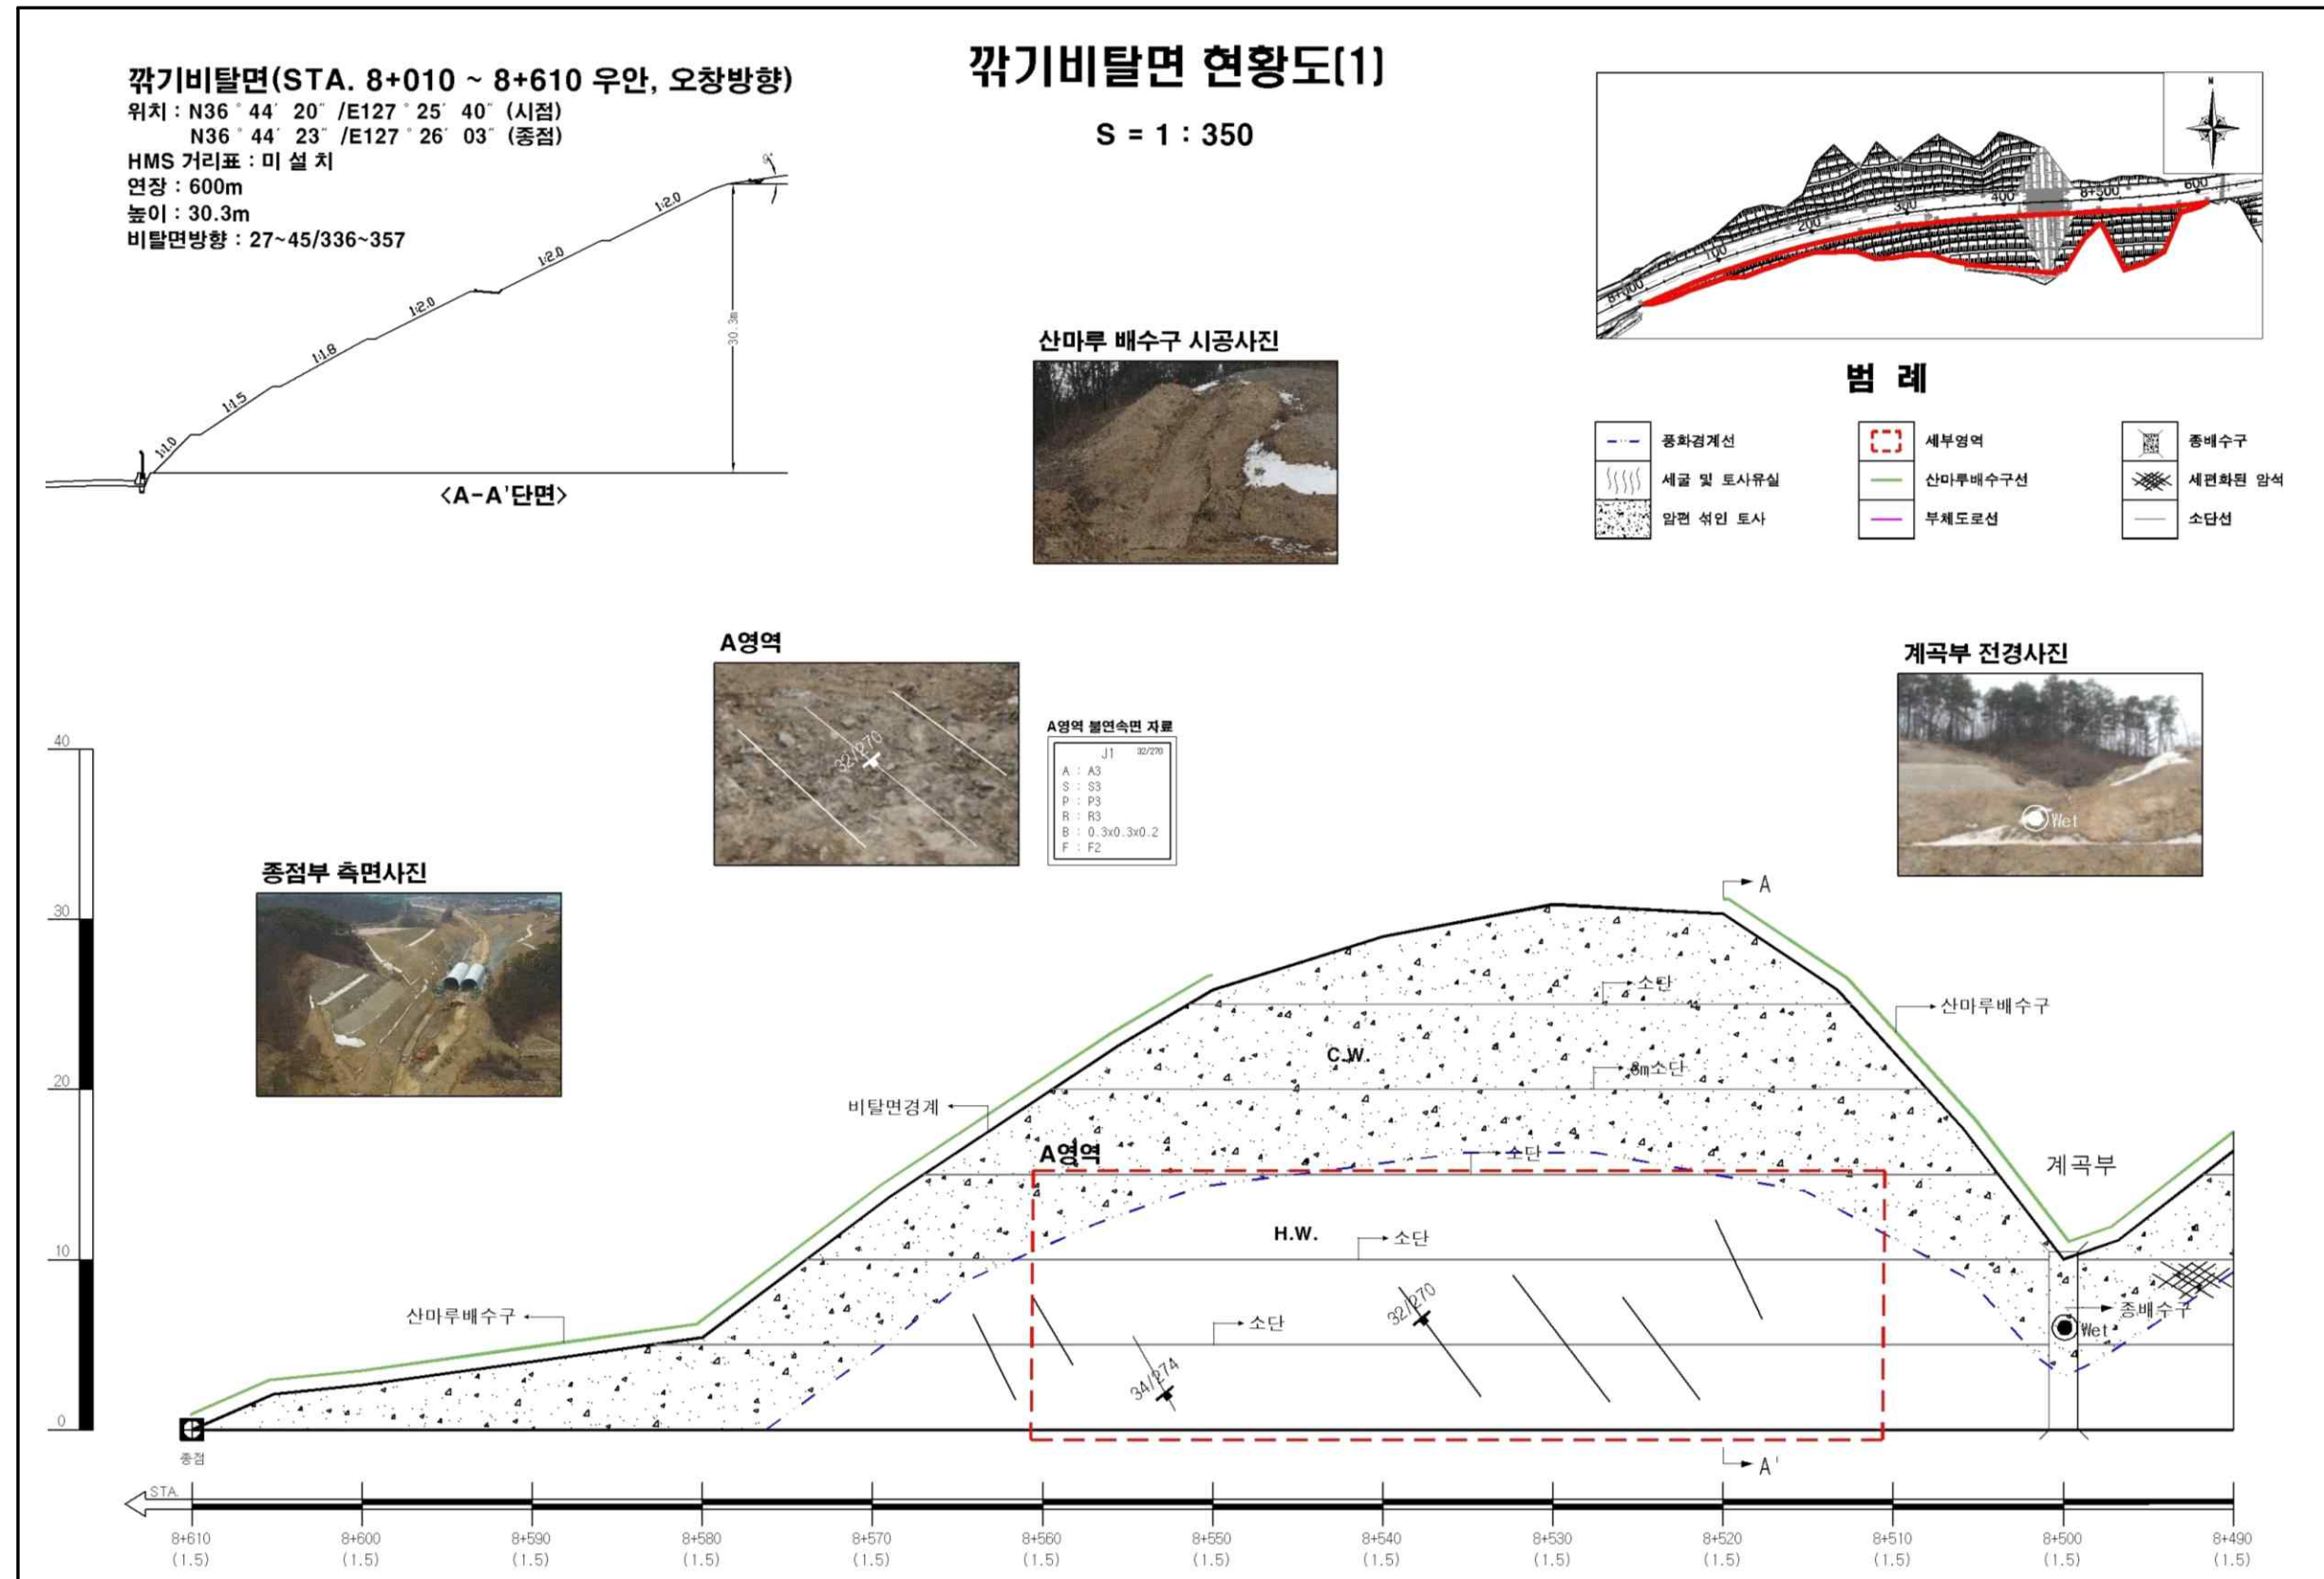

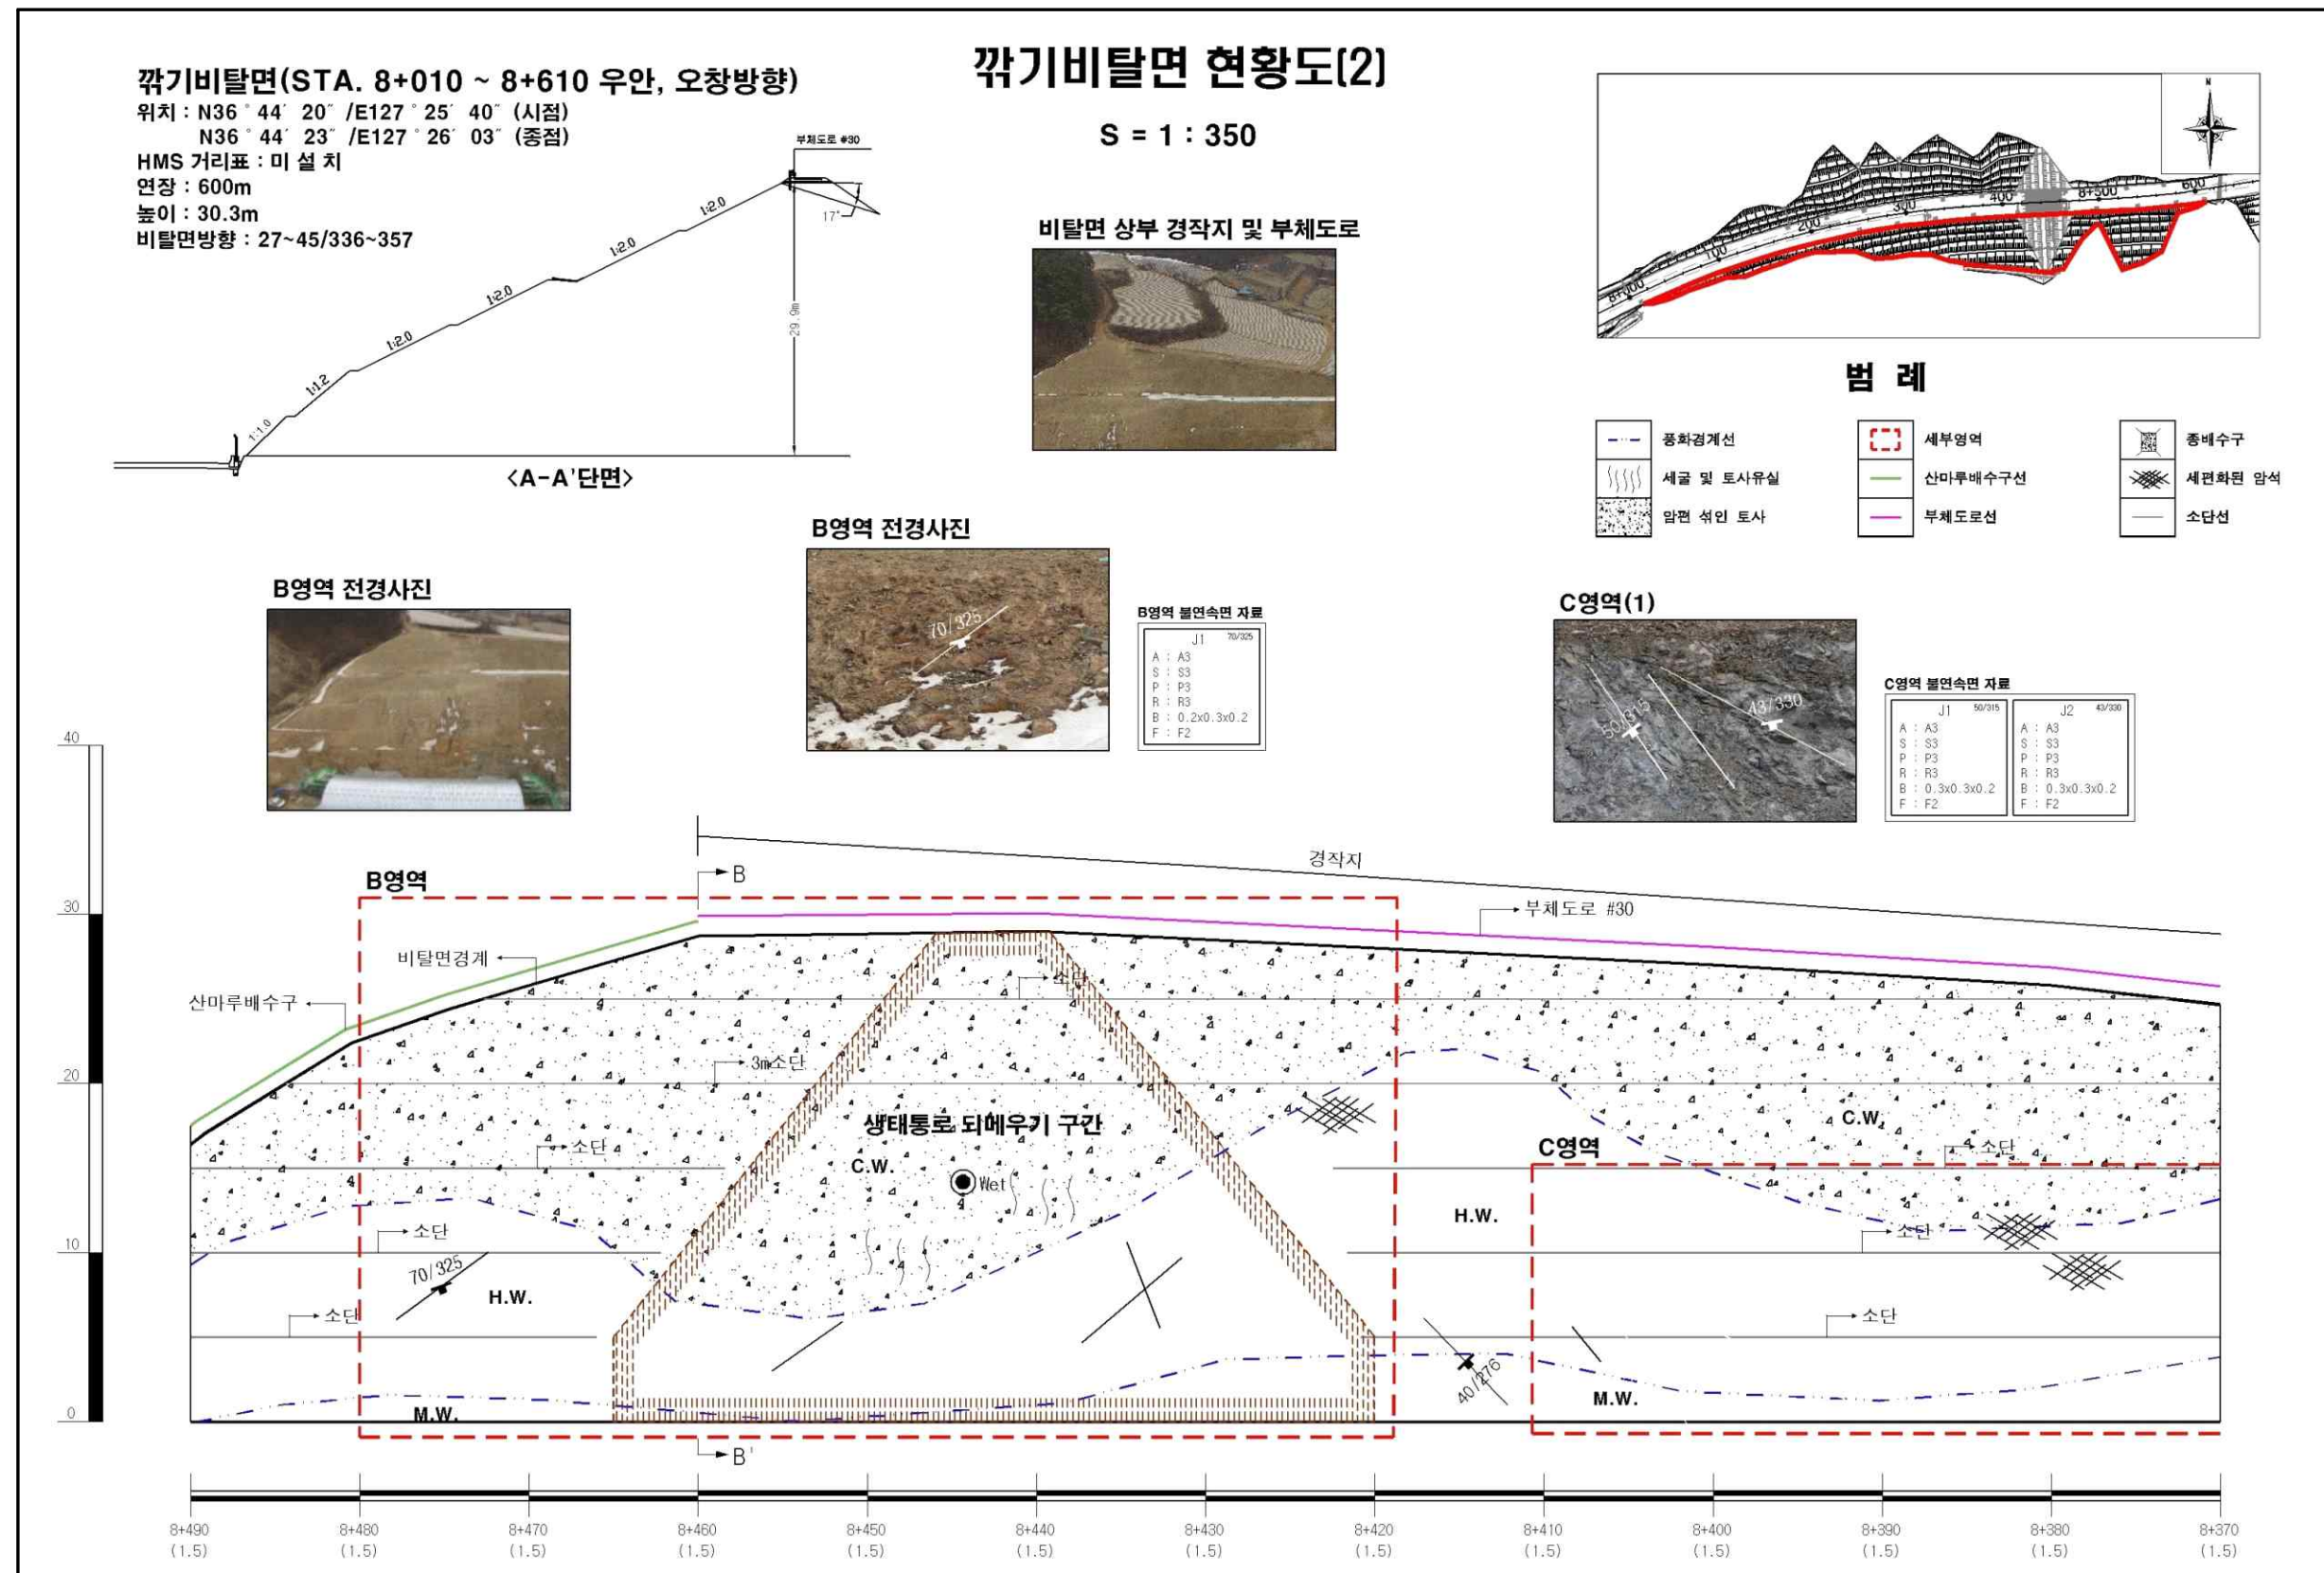

깎기비탈면(STA. 8+010 ~ 8+610 우안, 오창방향)


위치 : N36° 44' 20" / E127° 25' 40" (시점)
N36° 44' 23" / E127° 26' 03" (종점)

HMS 거리표 : 미 설치

연장 : 600m


높이 : 30.3m

비탈면방향 : 27~45/336~357

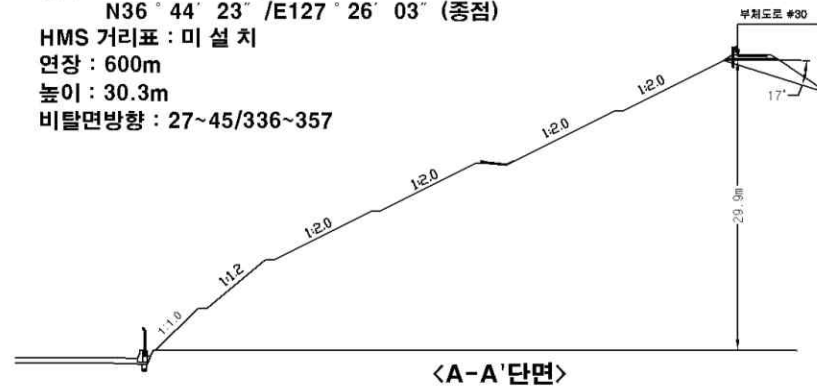

깎기비탈면 현황도(3)

S = 1 : 350

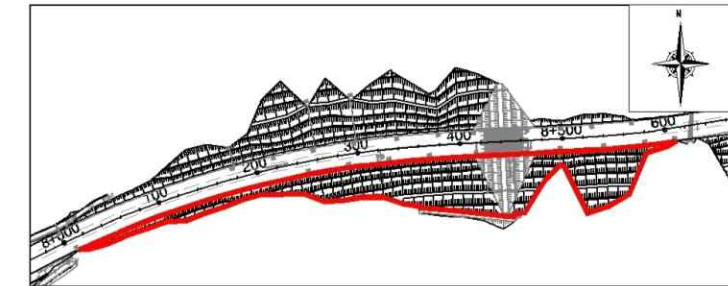

범례



C영역(2)




C영역 불연속면 자료

J3	62/286	J4	40/010
A : A3		A : A3	
S : S3		S : S3	
P : P3		P : P3	
R : R3		R : R4	
B : 0.3x0.3x0.2		B : 0.3x0.3x0.2	
F : F2		F : F2	

C영역 측면사진



비탈면 상부 경작지 전경사진(1)

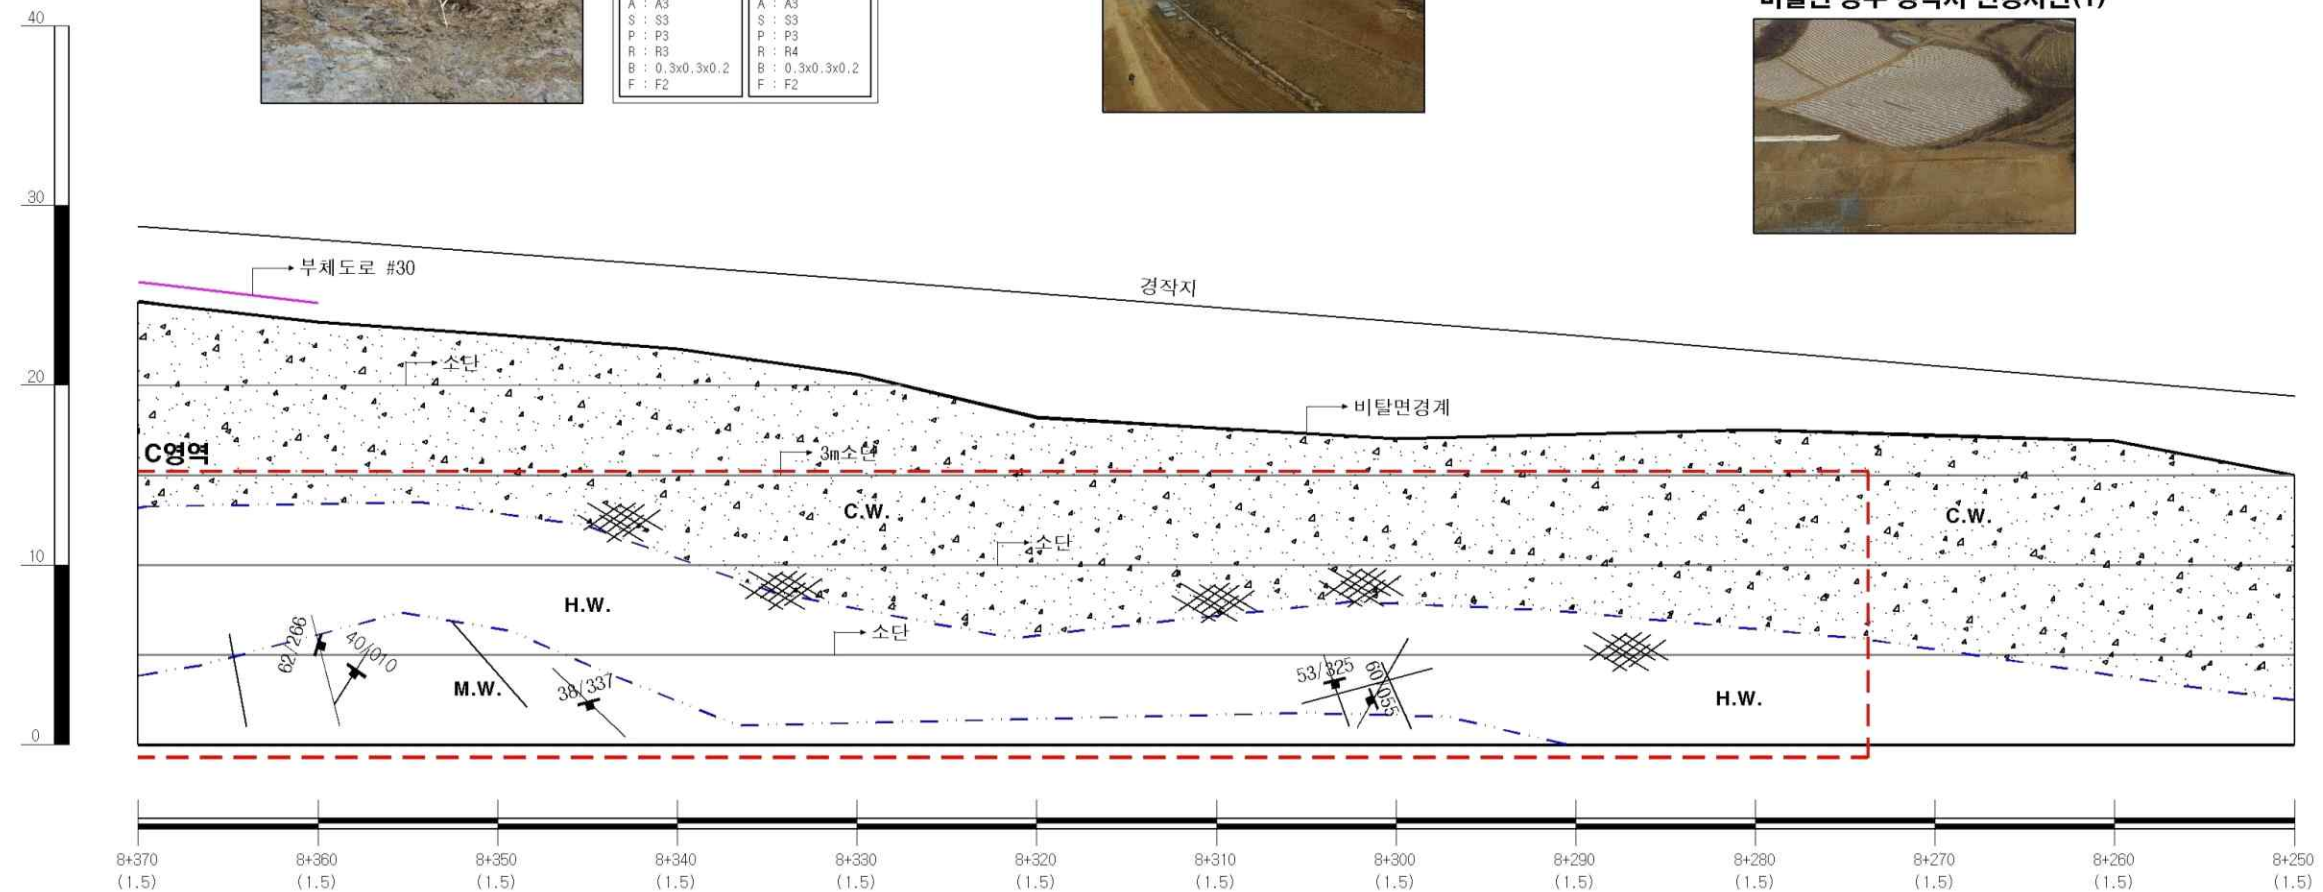

깎기비탈면(STA. 8+010 ~ 8+610 우안, 오창방향)


위치 : N36° 44' 20" / E127° 25' 40" (시점)
N36° 44' 23" / E127° 26' 03" (종점)

HMS 거리표 : 미 설치

연장 : 600m


높이 : 30.3m

비탈면방향 : 27~45/336~357

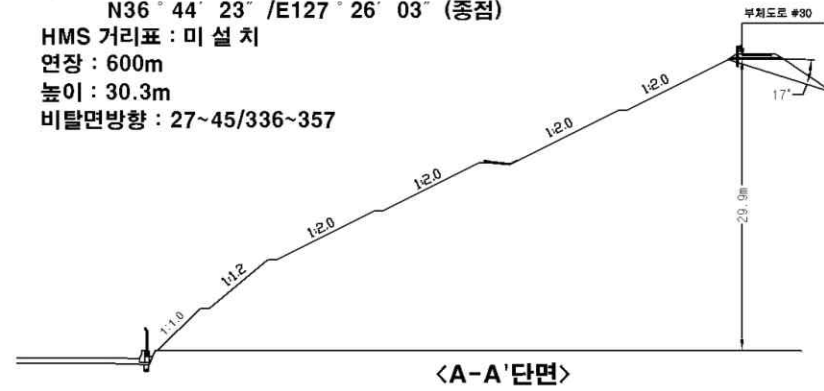

깎기비탈면 현황도(4)

S = 1 : 350

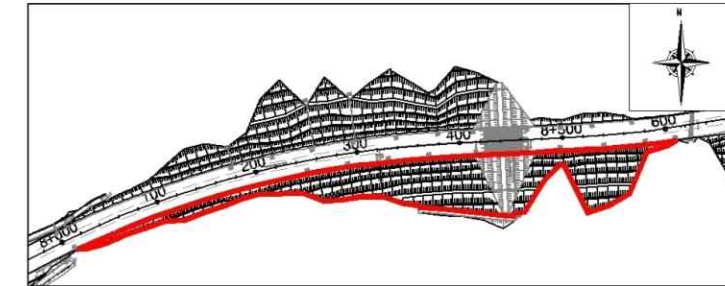


범례



비탈면 상부 경작지 전경사진(2)





D영역



D영역 불연속면 자료


J1	80/258	J2	38/002
A : A3		A : A3	
S : S3		S : S3	
P : P3		P : P3	
R : R3		R : R3	
B : 0.2x0.2x0.2		B : 0.2x0.2x0.2	
F : F2		F : F2	

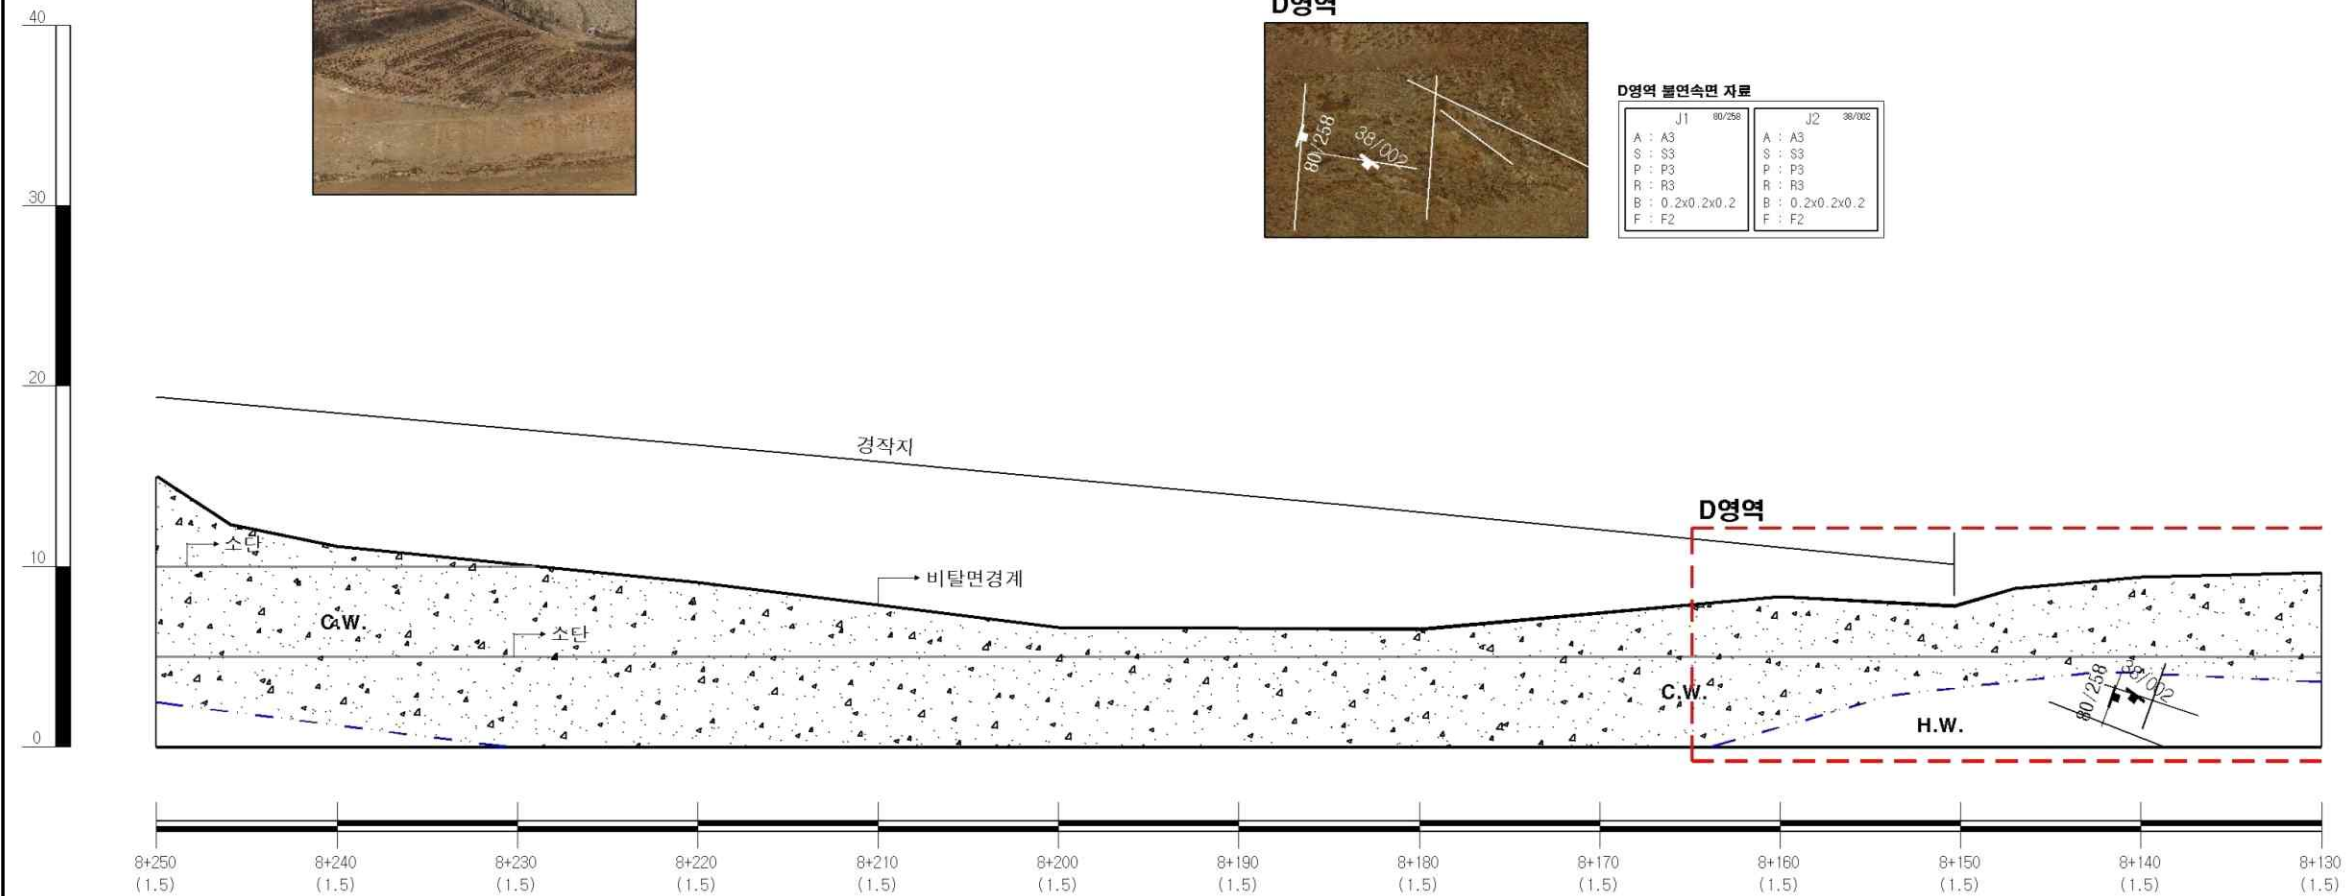

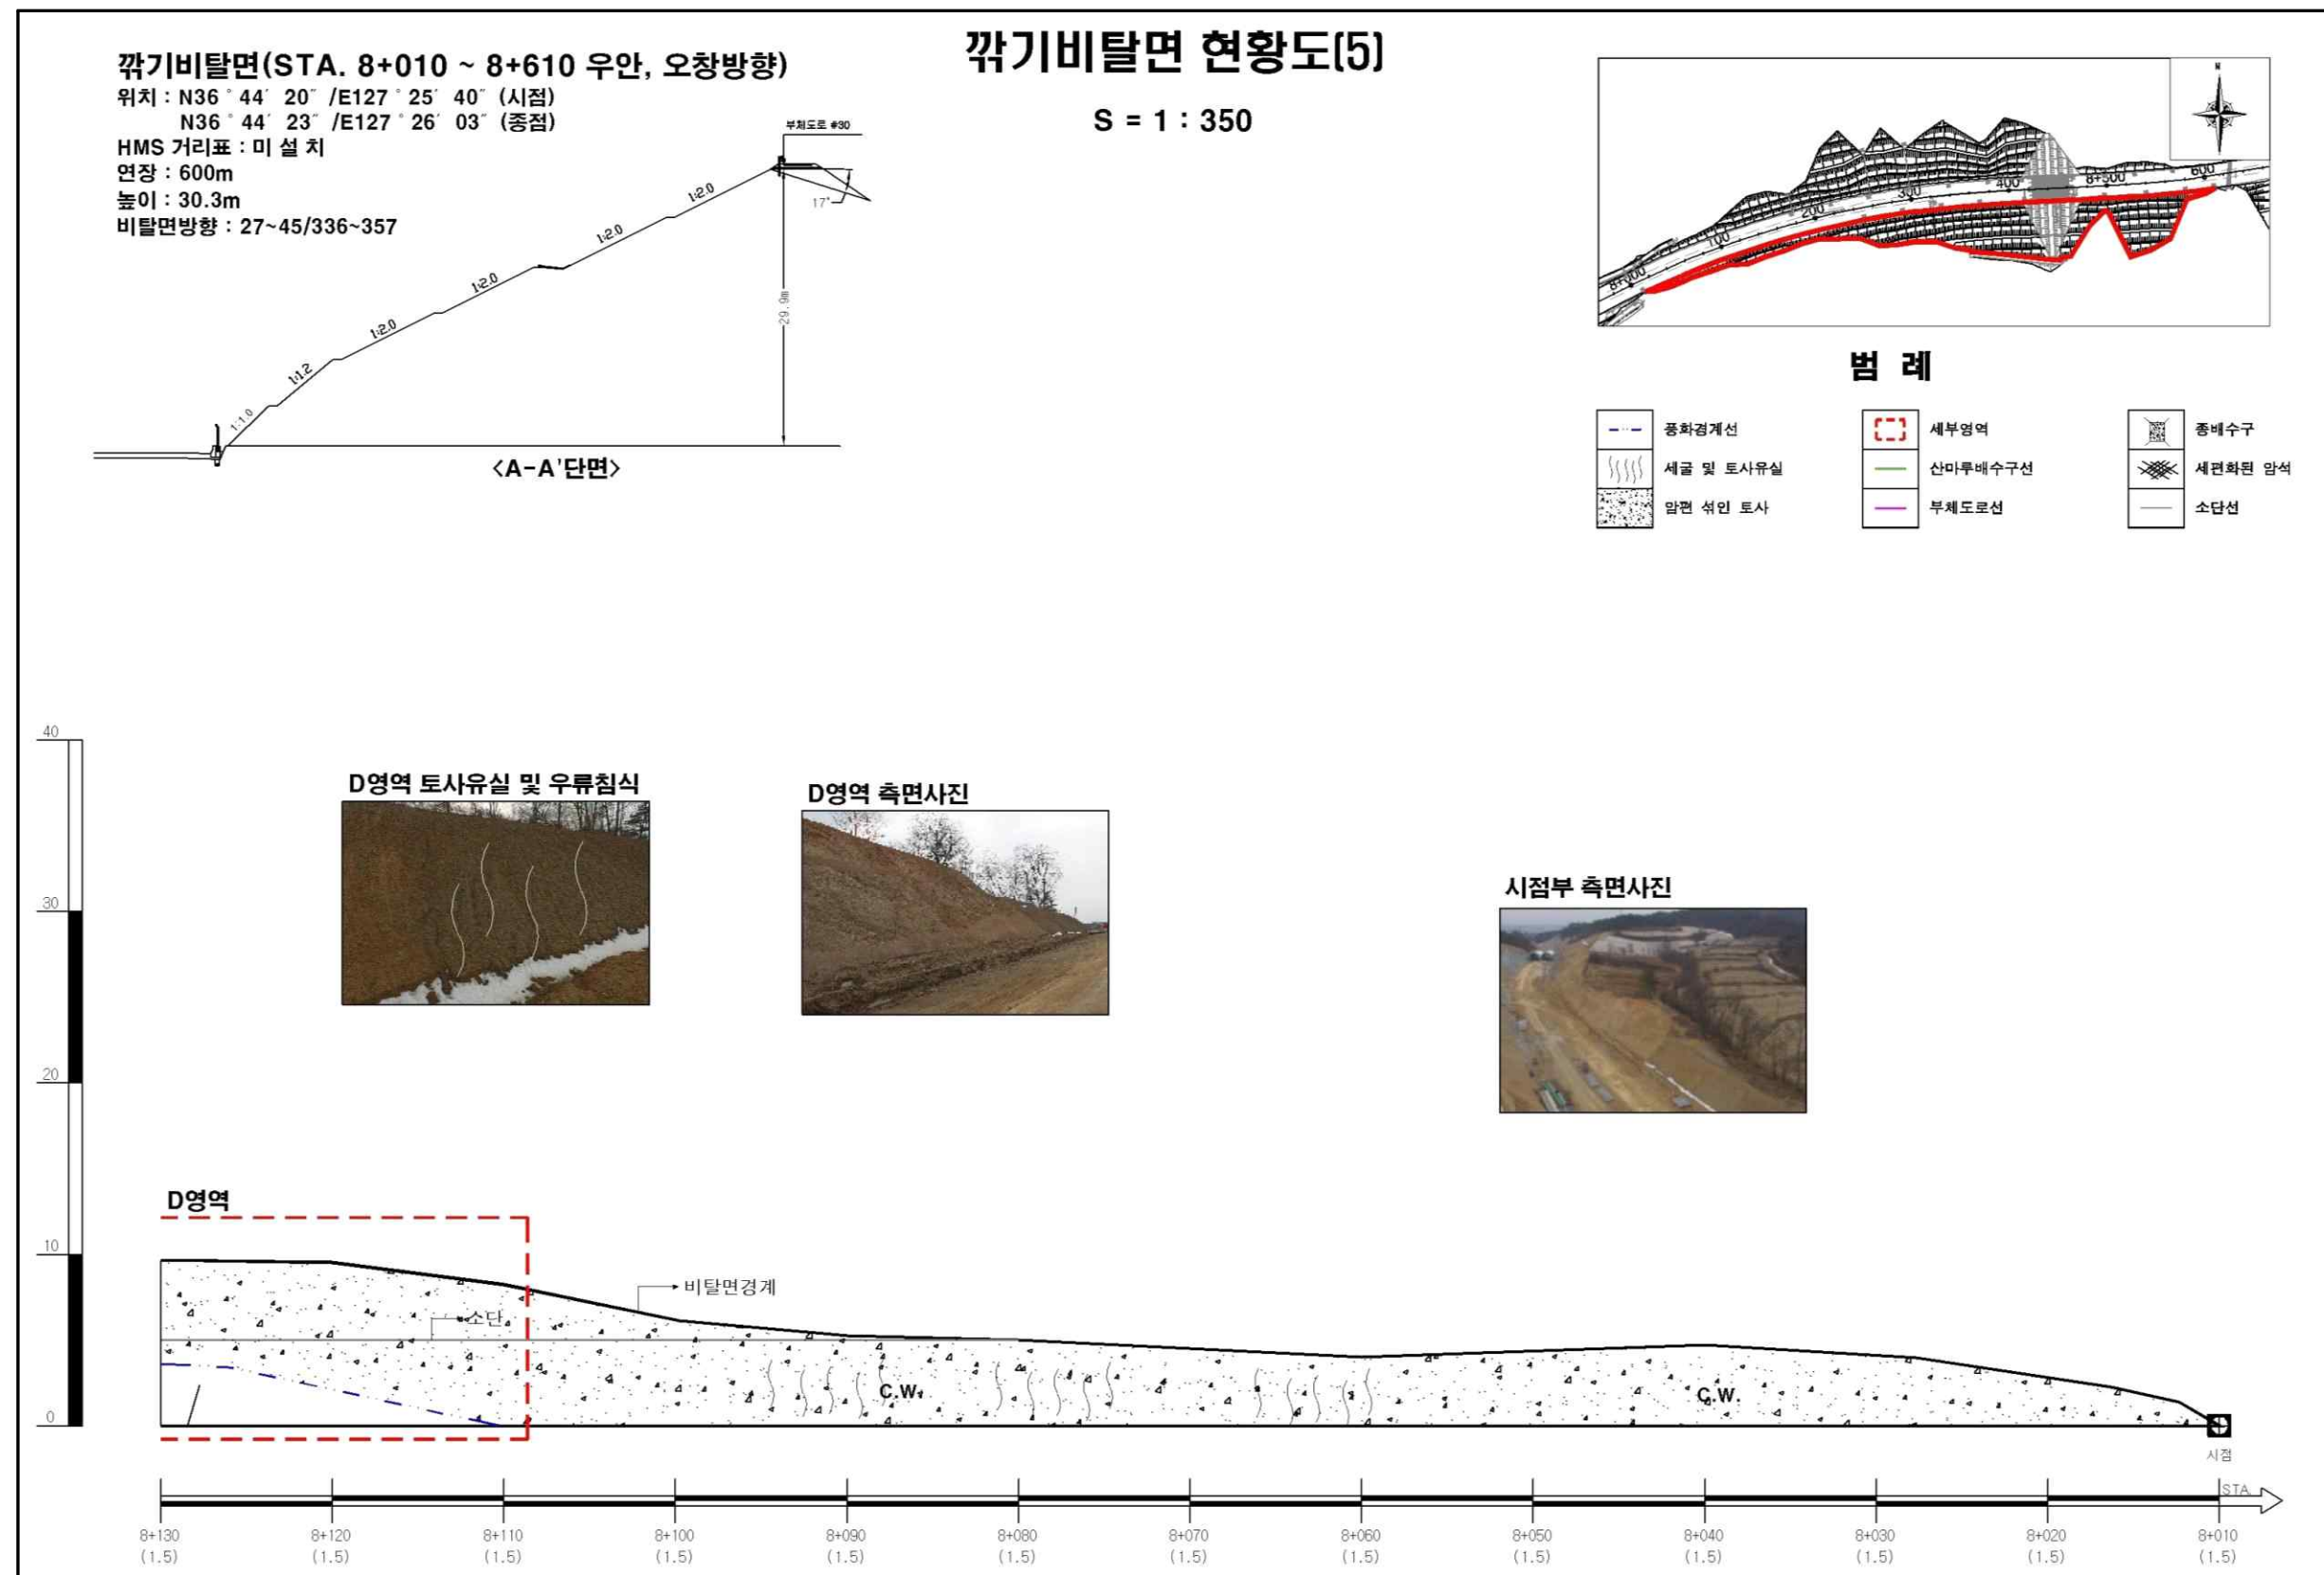



[illegible]


옥산~오창 고속도로 민간투자사업

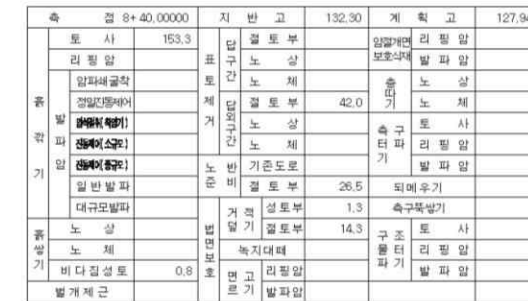



주 우 관 청	사 업 시 행 자	사 업 명	설 계 일 자	사업책임기술자	분야별책임기술자	설 계 자	도 면 명	축 척	도면번호
 국 토 교 통 부	 옥산오창고속도로주식회사	옥산~오창 고속도로 민간투자사업	2013. 10	도로 및 공항기술사 양 선 직 <i>14-023</i>	도로 및 공항기술사 이 용 관 <i>116</i>	박 효 근 <i>102</i>	횡 단 면 도 (158)	1:200	158

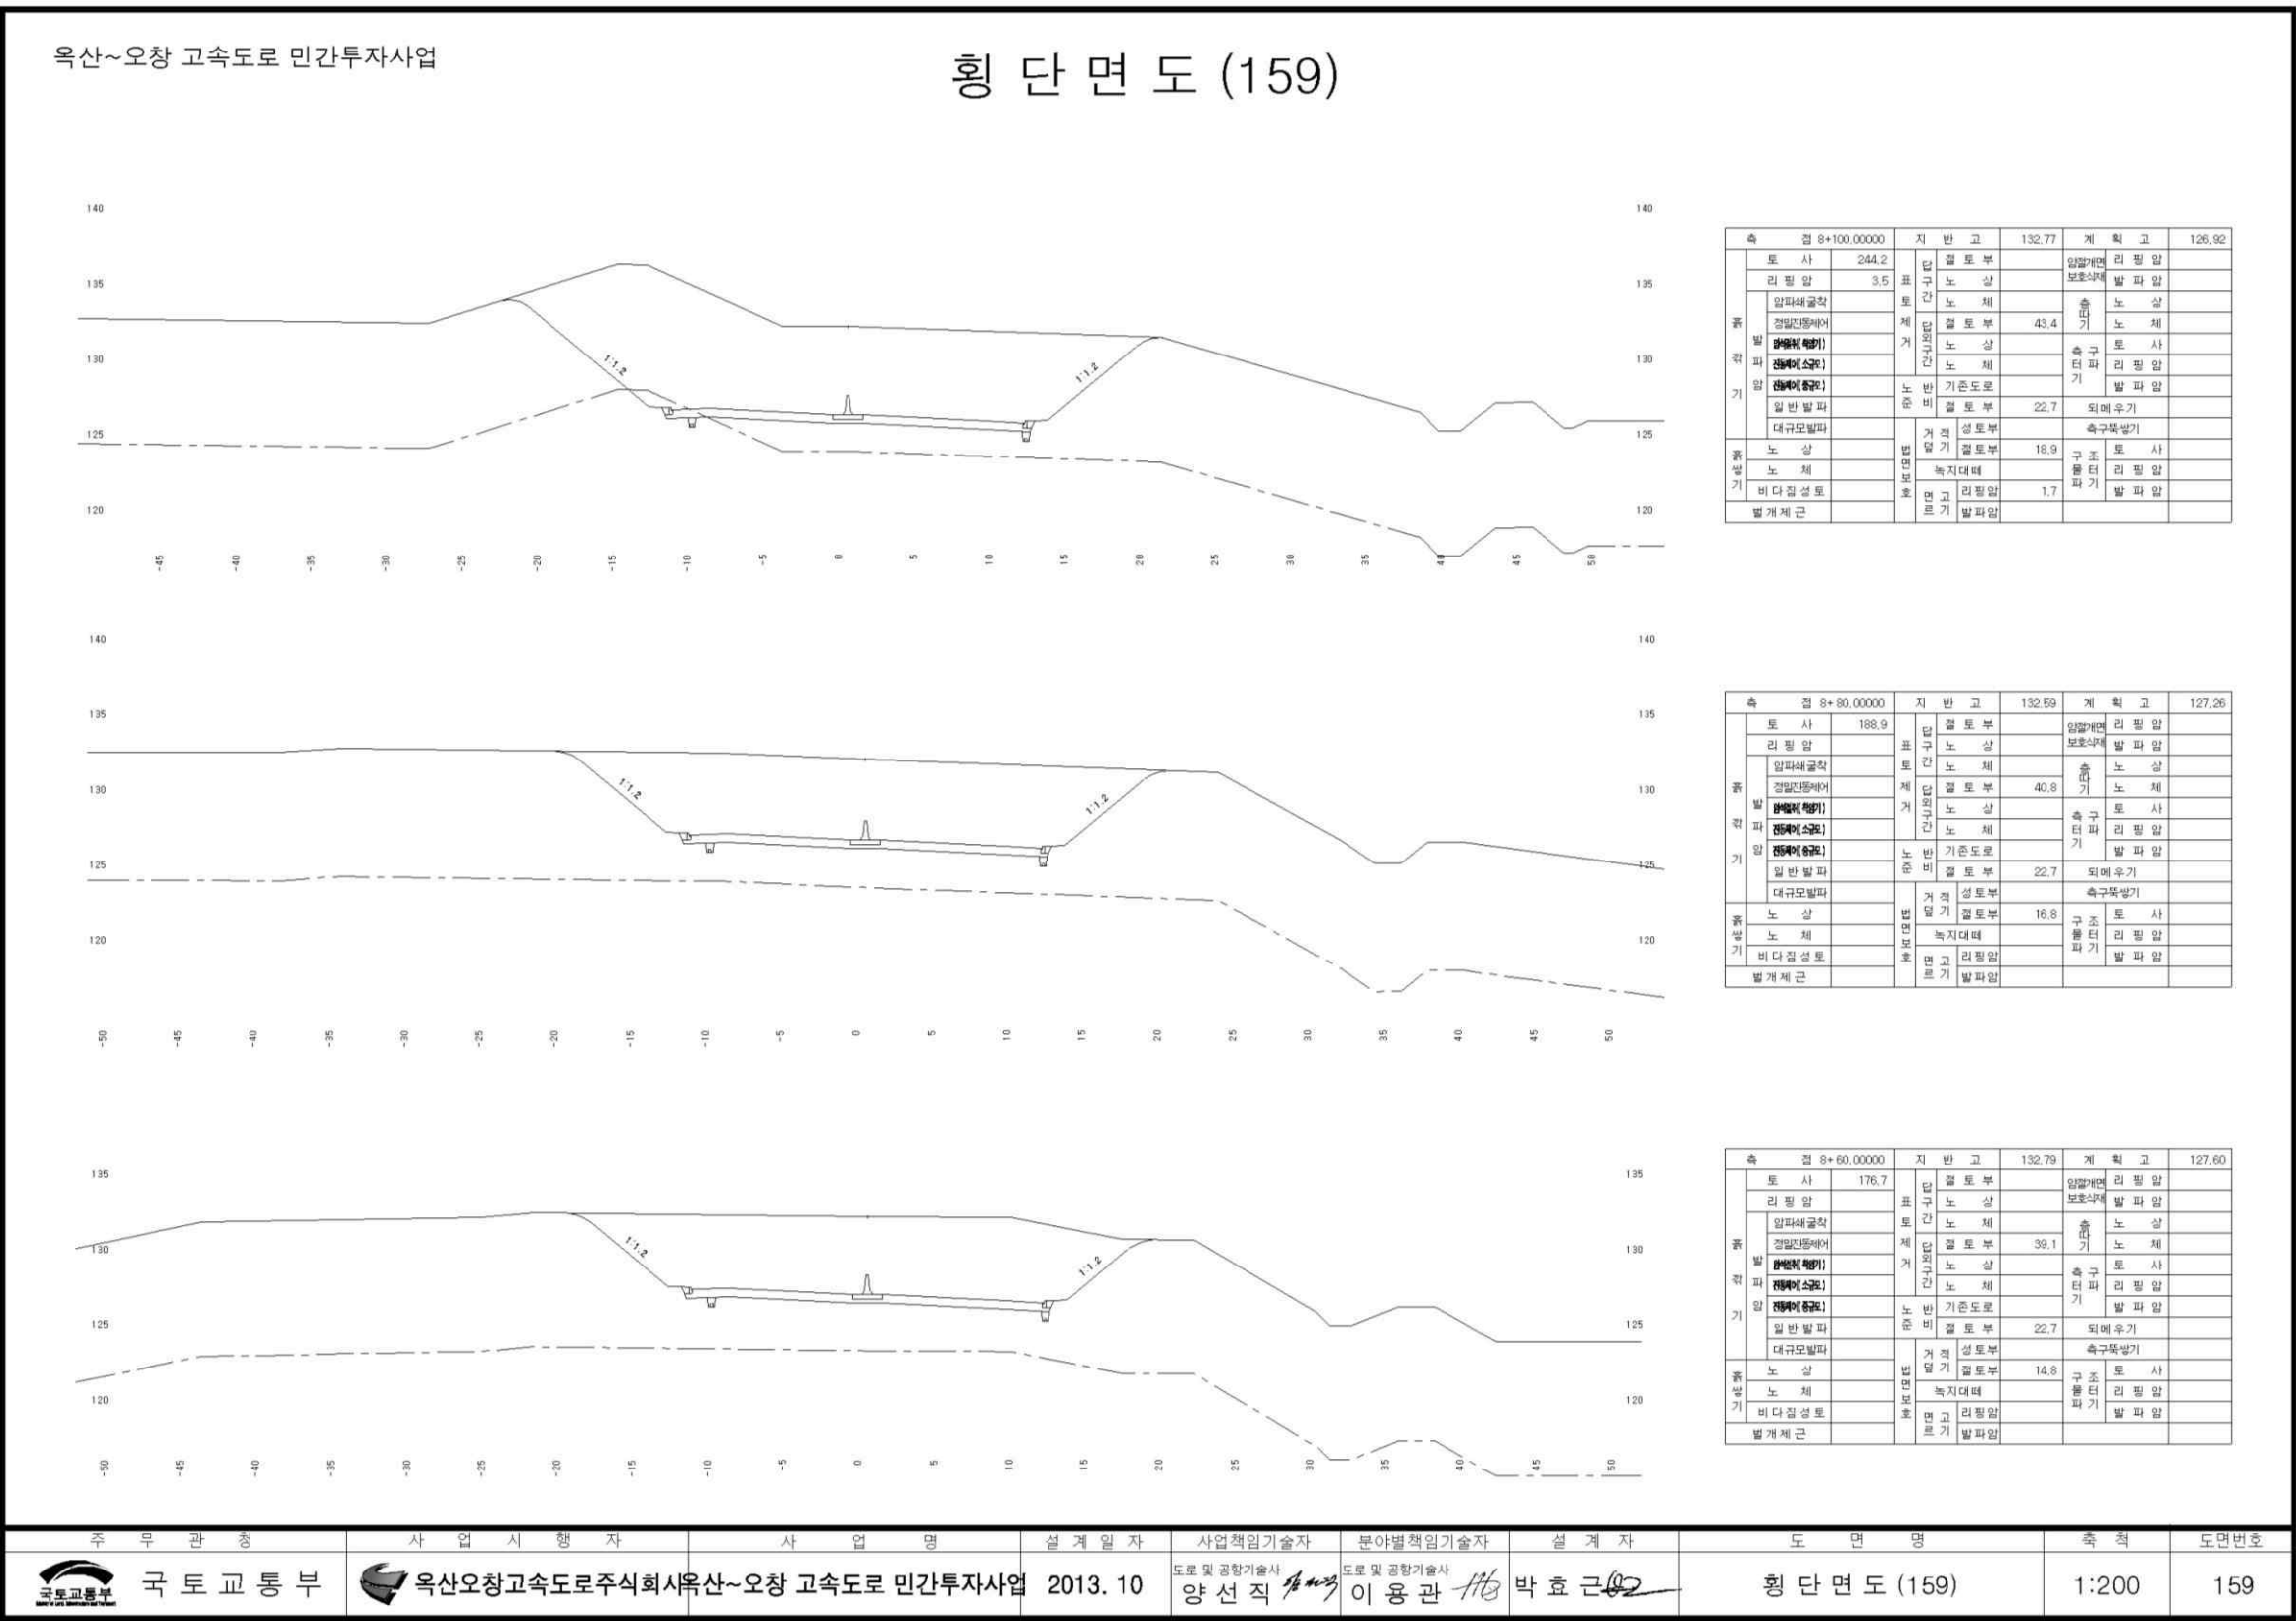





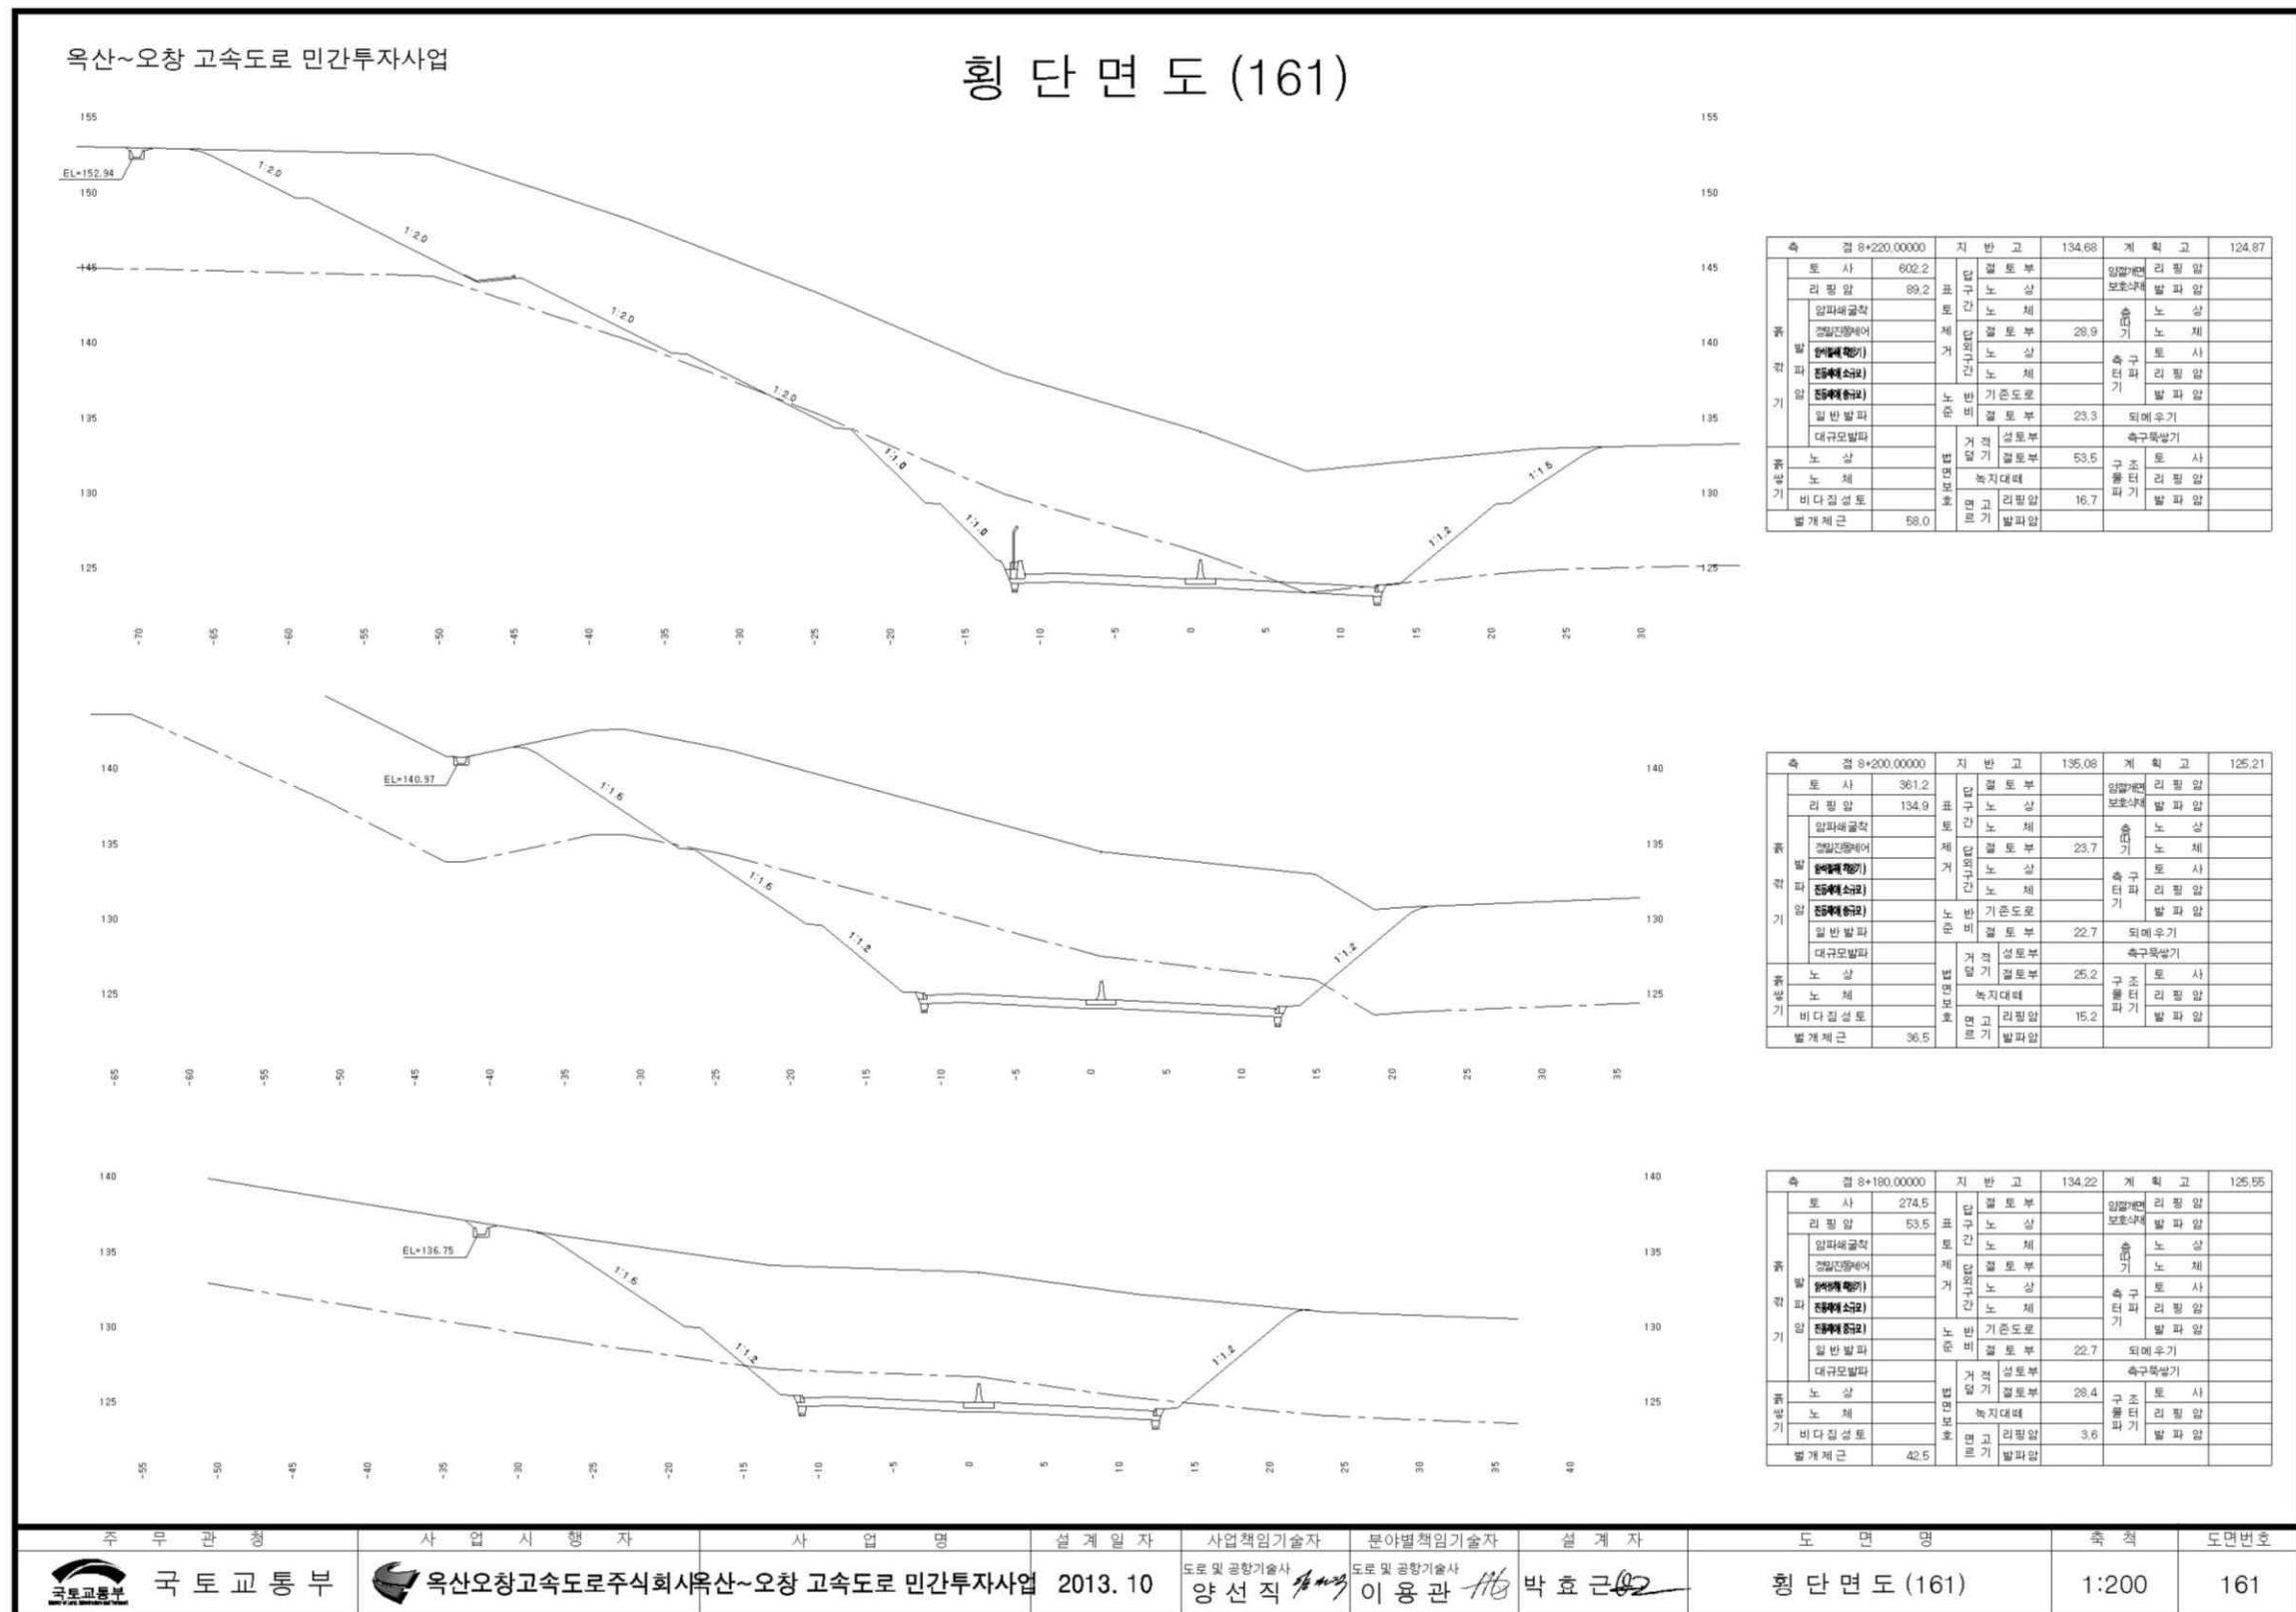














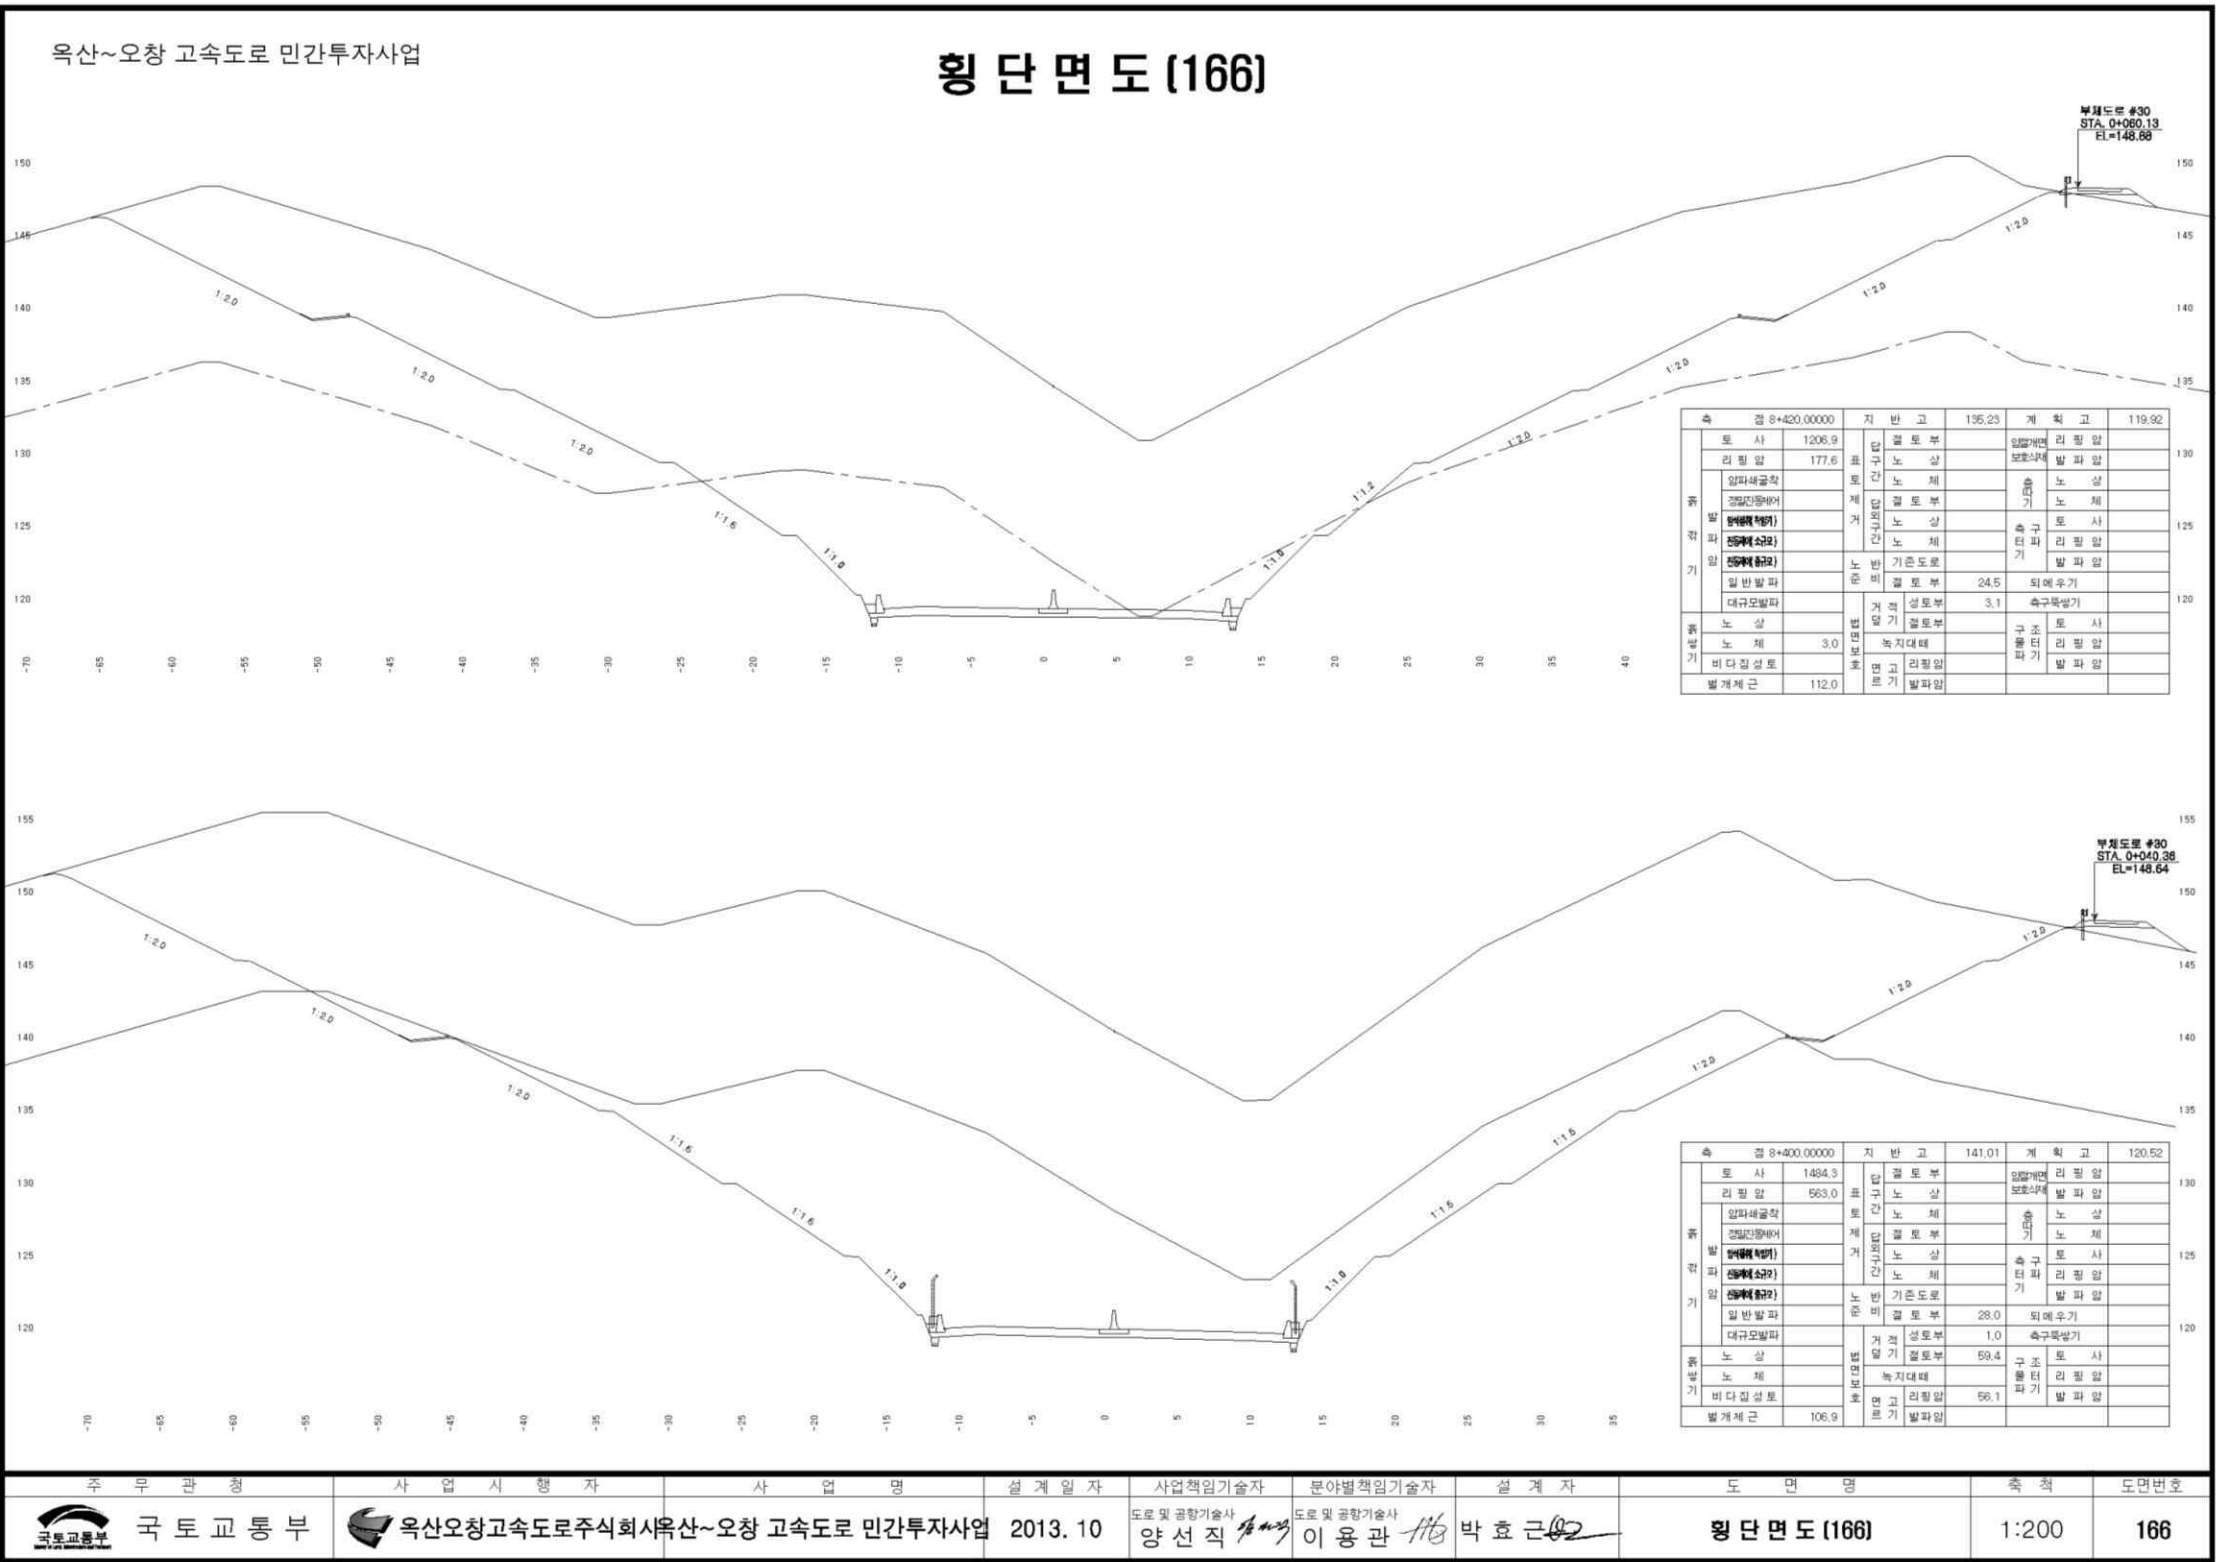







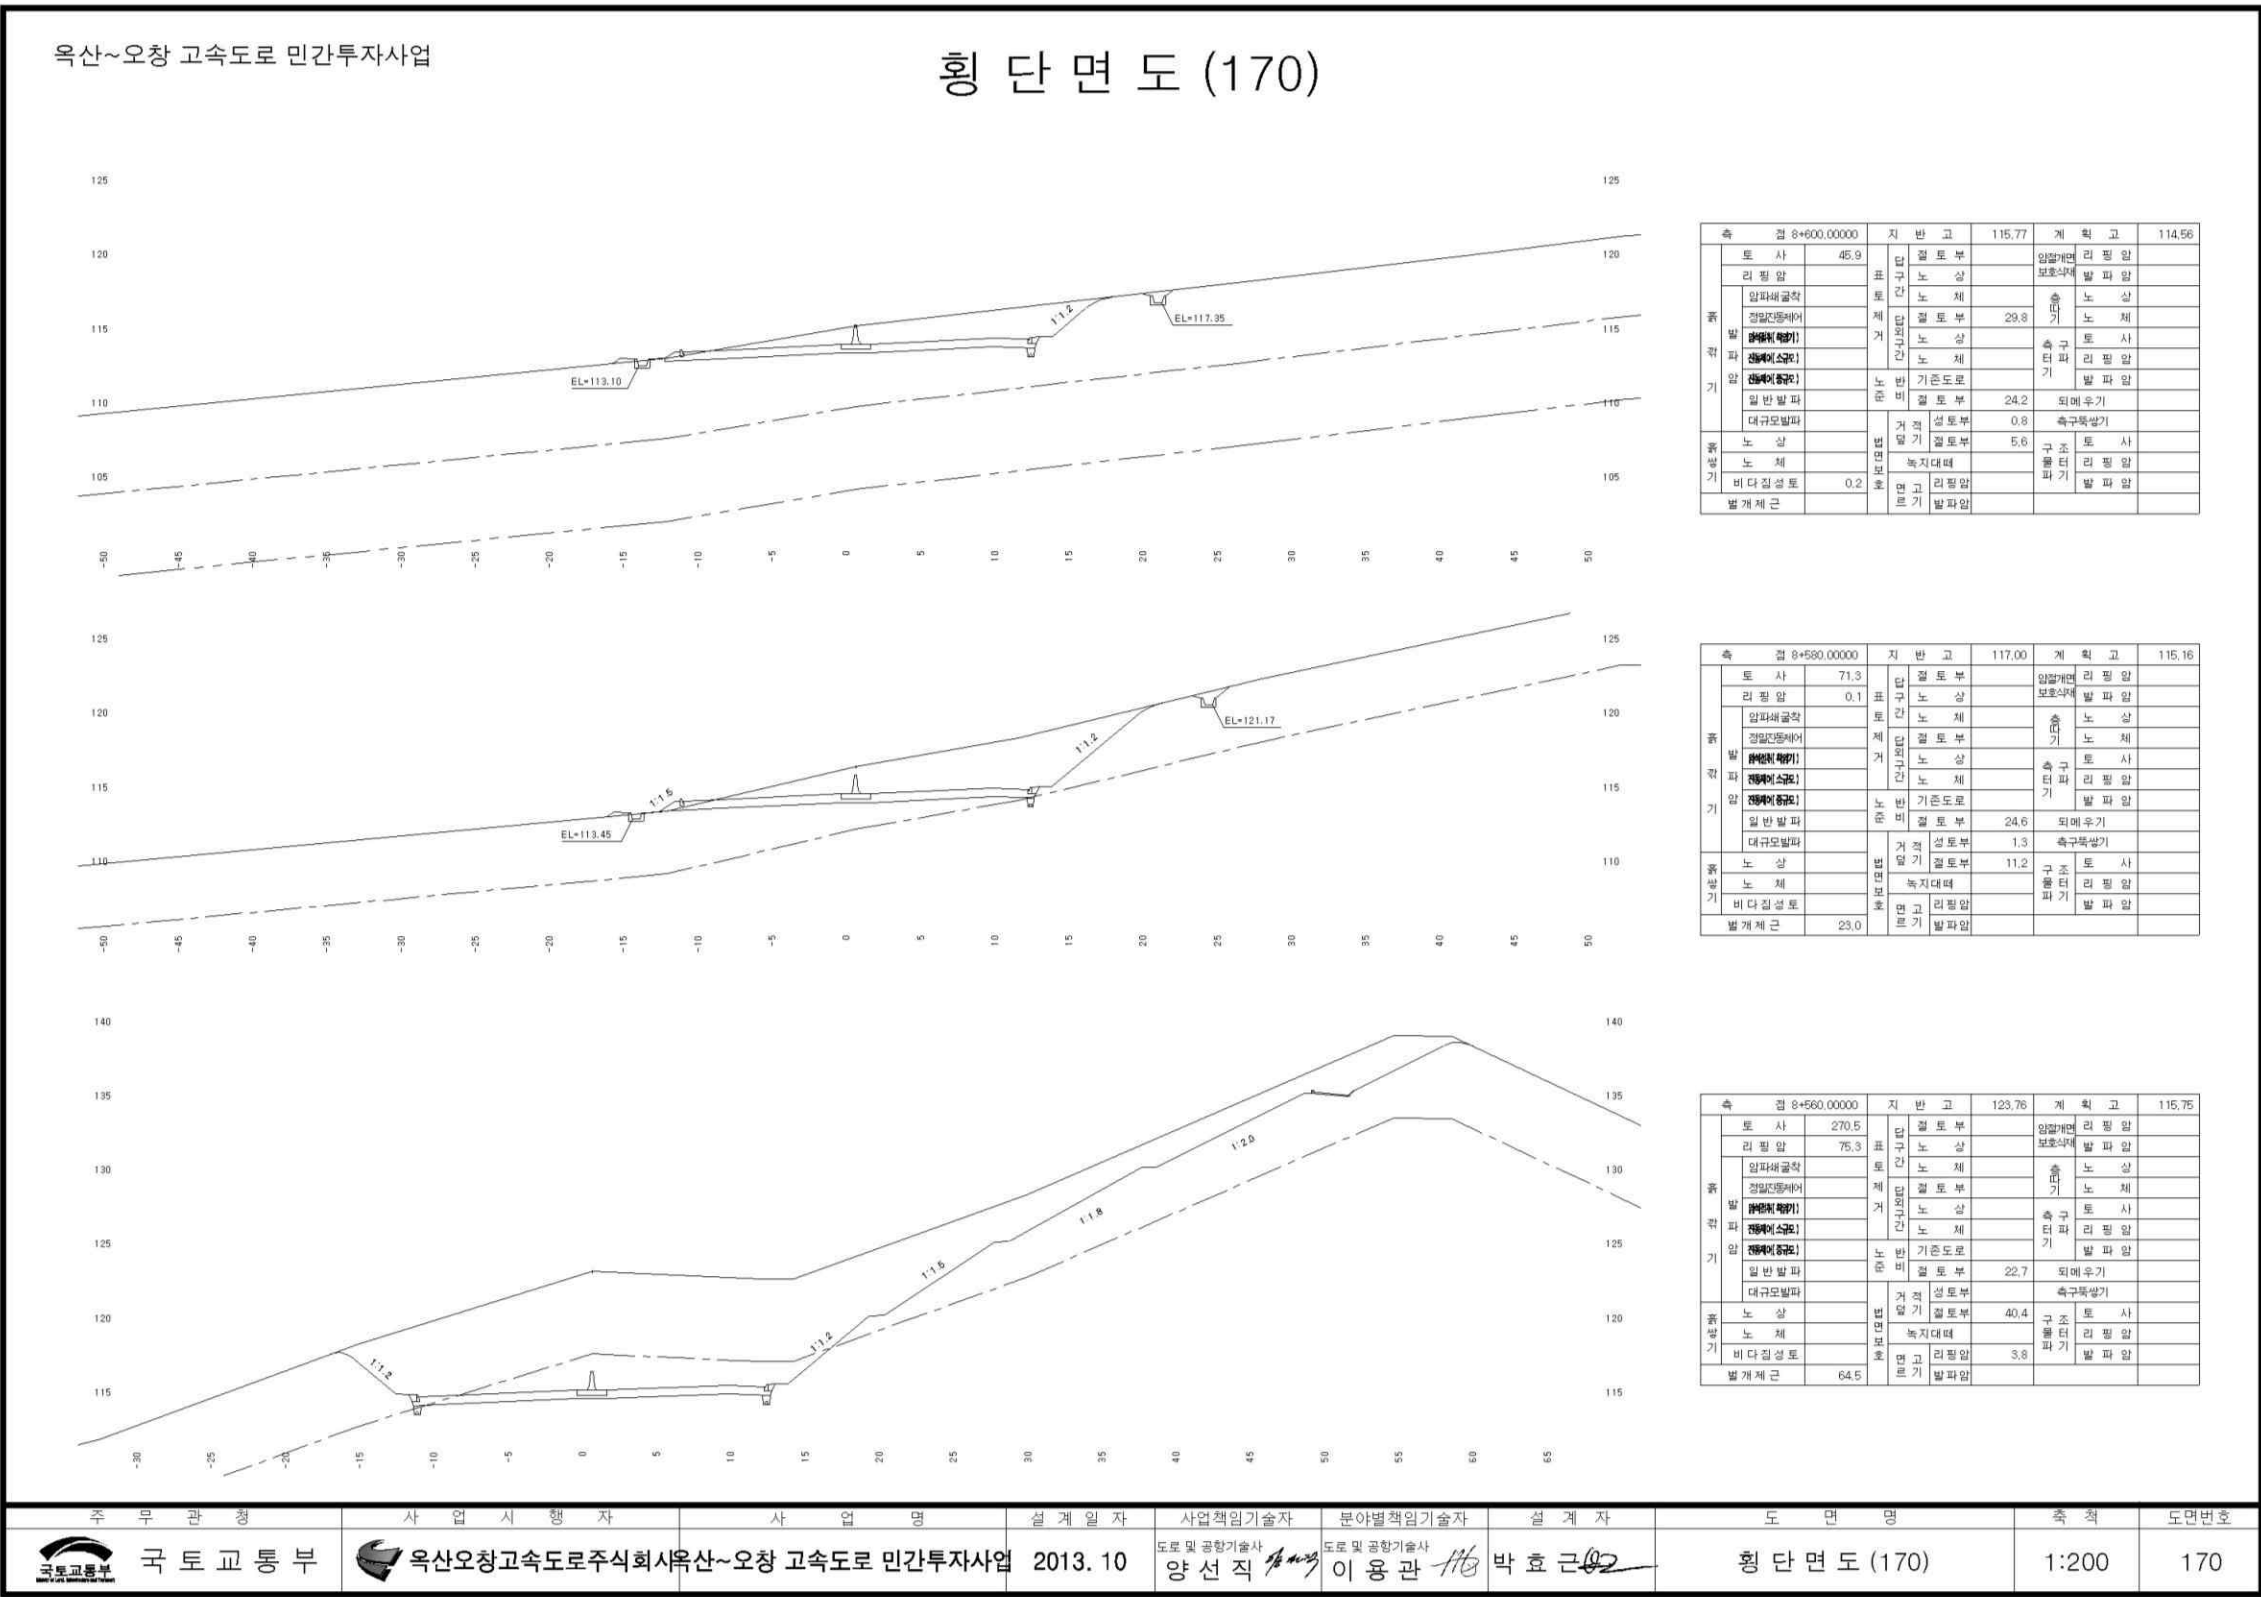

5. 깎기비탈면 구간별 세부사진



STA.8+010



STA.8+020



STA.8+030



STA.8+040



STA.8+050



STA.8+060



STA.8+070



STA.8+080



STA.8+090



STA.8+100



STA.8+110



STA.8+120



STA.8+130



STA.8+140



STA.8+150



STA.8+160



STA.8+170



STA.8+180



STA.8+190



STA.8+200



STA.8+210



STA.8+220



STA.8+230



STA.8+240



STA.8+260



STA.8+270



STA.8+280



STA.8+290



STA.8+300 상단부



STA.8+300 하단부



STA.8+310 상단부



STA.8+310 하단부



STA.8+320 상단부



STA.8+320 하단부



STA.8+330 상단부



STA.8+330 하단부



STA.8+340 상단부



STA.8+340 하단부



STA.8+350 상단부



STA.8+350 하단부



STA.8+360 상단부



STA.8+360 하단부



STA.8+370 상단부



STA.8+370 하단부



STA.8+380 상단부



STA.8+380 하단부



STA.8+390 상단부



STA.8+390 하단부



STA.8+400 상단부



STA.8+400 하단부



STA.8+410 상단부



STA.8+410 하단부



STA.8+420 상단부



STA.8+420 하단부



STA.8+430 상단부



STA.8+430 하단부



STA.8+440 상단부



STA.8+440 하단부



STA.8+450 상단부



STA.8+450 하단부



STA.8+460 상단부



STA.8+460 하단부



STA.8+470 상단부



STA.8+470 하단부



STA.8+480 상단부



STA.8+480 하단부



STA.8+490 상단부



STA.8+490 하단부



STA.8+500



STA.8+510



STA.8+520 상단부



STA.8+520 하단부



STA.8+530 상단부



STA.8+530 하단부



STA.8+540 상단부



STA.8+540 하단부



STA.8+550 상단부



STA.8+550 하단부



STA.8+560 상단부



STA.8+560 하단부



STA.8+570



STA.8+580



STA.8+590



STA.8+600

6. 깎기비탈면 (STA. 8+010 ~ 8+610 우안, 오창방향)

깎기비탈면 현황조사 체크리스트

■ 일반현황

관리청/국도	대전지방국도관리청/	도로호선/구간	/
행정구역	충청북도 청주시 청원구 오창읍 성산리		
거 리 표	()호선 ()방향 ()km ()m ()행		미설치 (☒)
위 경 도	N:36°44 ' 20 " /E:127°25 ' 40 " (시점), N:36°44 ' 23 " /E:127°26 ' 03 " (종점)		
차 선		교 통 량	(/일)
조사일자	2017년 02월 13일	조 사 자	김한일, 정송희
		조사기관	(주) 에스알이앤씨

■ 깎기비탈면 특성

연 장	(600) m	최대높이	(22) m
경 사	(27~45)°	이격거리	(1.5) m
종 류	☐ 암 ☐ 토사 ☒ 혼합 ☐ 자연	누수위치	☐ 상 ☒ 중 ☒ 하 ☐ 무
횡단형상		종단형상	
주변지형 특 성	☐ 구릉 ☒ 준산악 ☐ 산악	상부자연 비탈면경사	-17 ~ 9°
계 곡 부	(1) 개소	풍화정도	☐ 상 ☐ 중 ☒ 하
암석의 결		붕괴유형 (중복가능)	☒ 켜기 ☒ 평면 ☐ 전도 ☐ 원호 ☒ 표층유실 ☒ 낙석 ☐ 무

■ 시공현황 및 필요공법

시공현황 (중복가능)	☐ 낙석방지망 ☒ 낙석방지울타리 ☐ L형측구 ☒ 생태통로 ☒ 식생공 ☐ 콘크리트 옹벽 ☐ 보강토 옹벽 ☐ 수평배수공 ☐ 네일 ☐ 록볼트 ☐ 앵커 ☐ 억지말뚝 ☐ 버트리스 ☐ 범면정비 ☒ 산마루배수구 ☒ 종배수구 ☐ 피암터널 ☐ 링네트 ☐ 암부착특수망 ☐ 콘크리트뿔어붙이기
필요공법	☐ 현상태유지, ☐ 기존시설 교체·보수, ☒ 보호공 필요, ☒ 보강공 필요
조 사 자 소 견	위 내용을 종합하여 보면비탈면 전체적으로 풍화가 심하며, 부분적으로 지하수 누수의 흔적 및 우수에 의한 세굴이 관찰됨. 암반구간에 불연속면이 발달하여 있으며 서로 교차하여 소규모 켜기파괴 및 평면파괴가 발생할 것으로 예상됨. 암반의 풍화가 진행됨에 따라 절리의 교차로 발달한 세편화된 암편의 이완으로 낙석이 발생할 것으로 보임. 따라서 비탈면의 장기적인 안정성을 유지하기 위한 적절한 비탈면 보호 및 보강공법이 적용되어야 할 것으로 판단됨.
