


호남고속선 장구교_29(48.691~48.698km, S6-3)

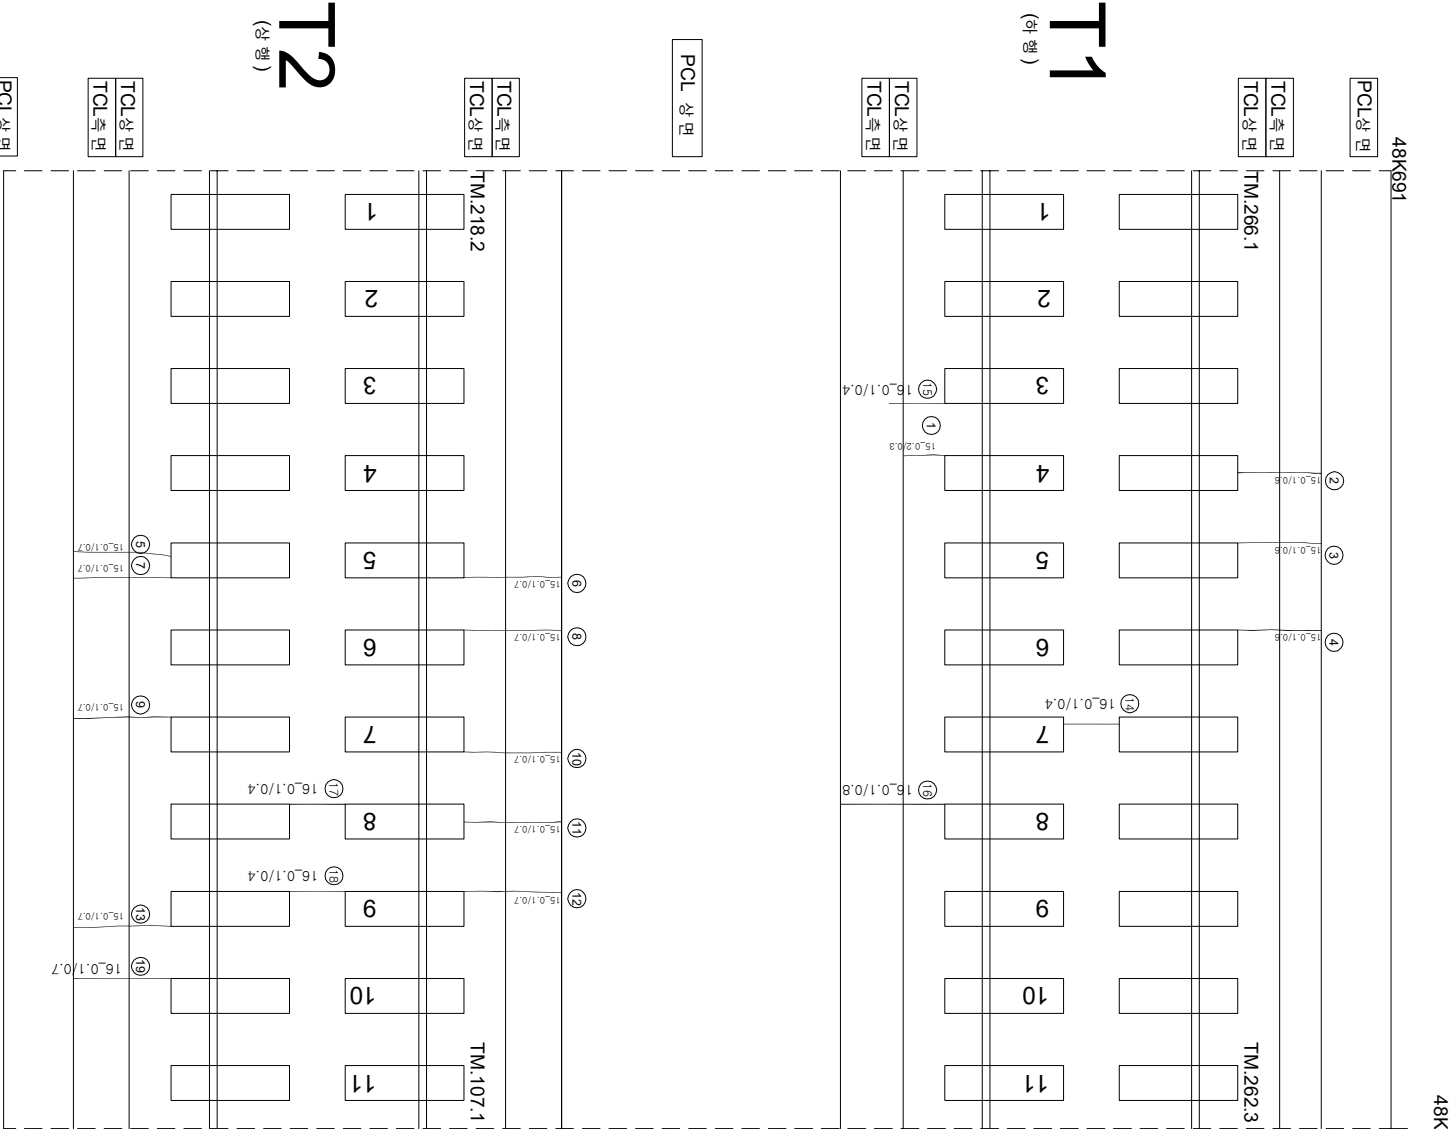

면번	손상	폭	면장	비고	면번	손상	폭	면장	비고
1	균열 0.2 mm	0.3 m		55					
2	균열 0.1 mm	0.6 m		56					
3	균열 0.1 mm	0.6 m		57					
4	균열 0.1 mm	0.6 m		58					
5	균열 0.1 mm	0.7 m		59					
6	균열 0.1 mm	0.7 m		60					
7	균열 0.1 mm	0.7 m		61					
8	균열 0.1 mm	0.7 m		62					
9	균열 0.1 mm	0.7 m		63					
10	균열 0.1 mm	0.7 m		64					
11	균열 0.1 mm	0.7 m		65					
12	균열 0.1 mm	0.7 m		66					
13	균열 0.1 mm	0.7 m		67					
14	균열 0.1 mm	0.4 m		68					
15	균열 0.1 mm	0.4 m		69					
16	균열 0.1 mm	0.8 m		70					
17	균열 0.1 mm	0.4 m		71					
18	균열 0.1 mm	0.4 m		72					
19	균열 0.1 mm	0.7 m		73					
20				74					
21				75					
22				76					
23				77					
24				78					
25				79					
26				80					
27				81					
28				82					
29				83					
30				84					
31				85					
32				86					
33				87					
34				88					
35				89					
36				90					
37				91					
38				92					
39				93					
40				94					
41				95					
42				96					
43				97					
44				98					
45				99					
46				100					
47				101					
48				102					
49				103					
50				104					
51				105					
52				106					
53				107					
54				108					

시	행	사	용	역	명	용	역	사	과업 책임자		참가별 과업명		군	현											
									이복영	김경기 윤석기	간운강 김경기	라운 박영 김영기		장목도안판리	양상	누수수용부	시공이음판리,층판리								
한국철도공사			2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트계도 점검용역			(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원			이복영		간운강 김경기 윤석기		현		0.220 (0.3mm이하 : 흑색)		0.420 (0.5mm초과 0.5mm이하 : 청색)		0.620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)		0.820 (1.0mm이상 : 분홍색)		50g		
