

옥산-오창 고속도로 풍수해 현황 및 조치계획 PM보고

'20. 7.30(목) 08:00 / 옥산오창고속도로 시설팀

◆ 7.30(목) 현재 청주·오창 일부 지역에 호우경보는 진행 중이며, 도로분야 풍수해 현황 및 조치 계획을 보고 드립니다

□ 강우 상황 및 전망

- (강우 상황) 호우경보가 진행 중인 청주, 오창과 옥산 지역에는 계속 비가 내리고 있는 상태 임.

** 호우경보 : 20. 7.30(목) 01:30 상황시작 ~ 진행 중(기온 23.8℃)

* 호우주의보 :

< 주요지점 강수량(mm) 현황 (29일 06:00까지 누적강수량) >

청주	오창	증평	천안(병천)	진천	세종
99.4	180	157.5	123.3	132.5	67.9

- (강우 전망) 청주, 오창과 옥산에는 30일 18시까지 계속 비가 내리겠다는 기상특보

□ 피해현황 및 조치계획

○ 피해내용


일 시	장 소	피해내용	조치계획
'20.7.30	STA.1.6k(오창) 외 4개소	사면 토사유출 시설물 파손 (동물유도웬스 外)	굴삭기 1대 동원 및 보수인원 7명 투입 임시 조치 후 복구예정

-.사진대지 : [#별첨](#)

○ 조치계획

- 비탈면 유실구간 비탈면안전성 검토 등 피해 원인 파악 및 보수공법 선정·보수 예정
- 고속도로 주변 사유지로 인한 피해발생은 토지소유자와 협의하여 파손시설물 원상복구 예정

사진대지(1)

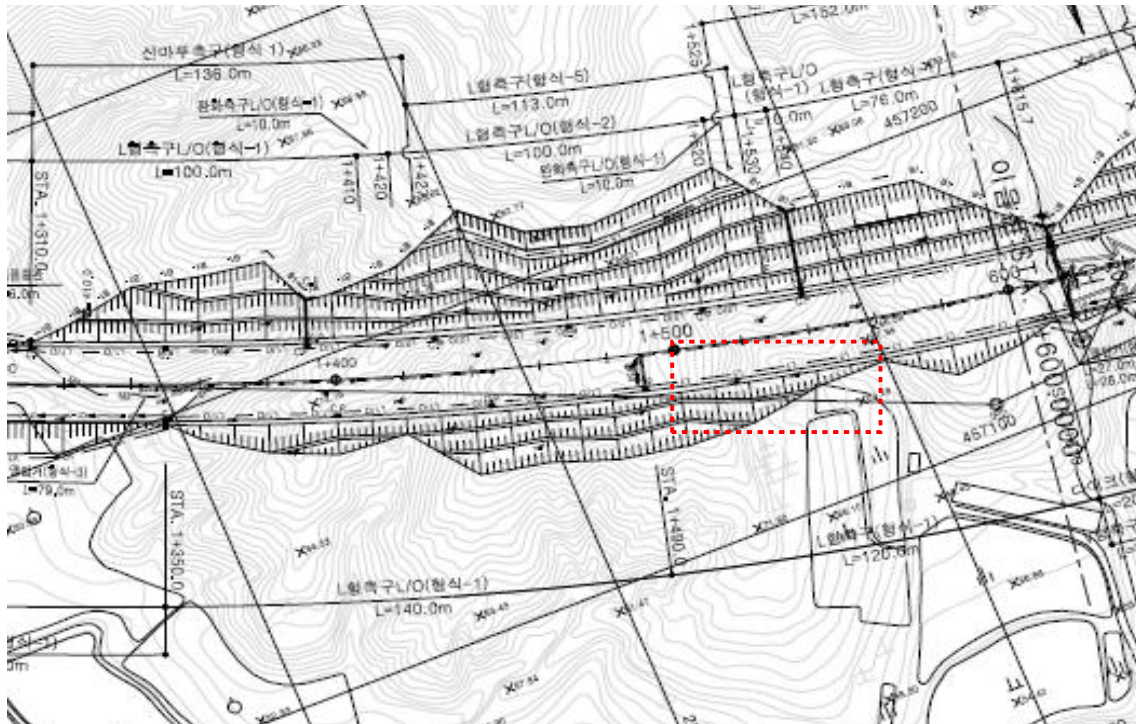


위 치

본선구간 1.6k지점(오창방향)

내 용

절토사면 표면유실(임시복구 완료)

사진대지(2)

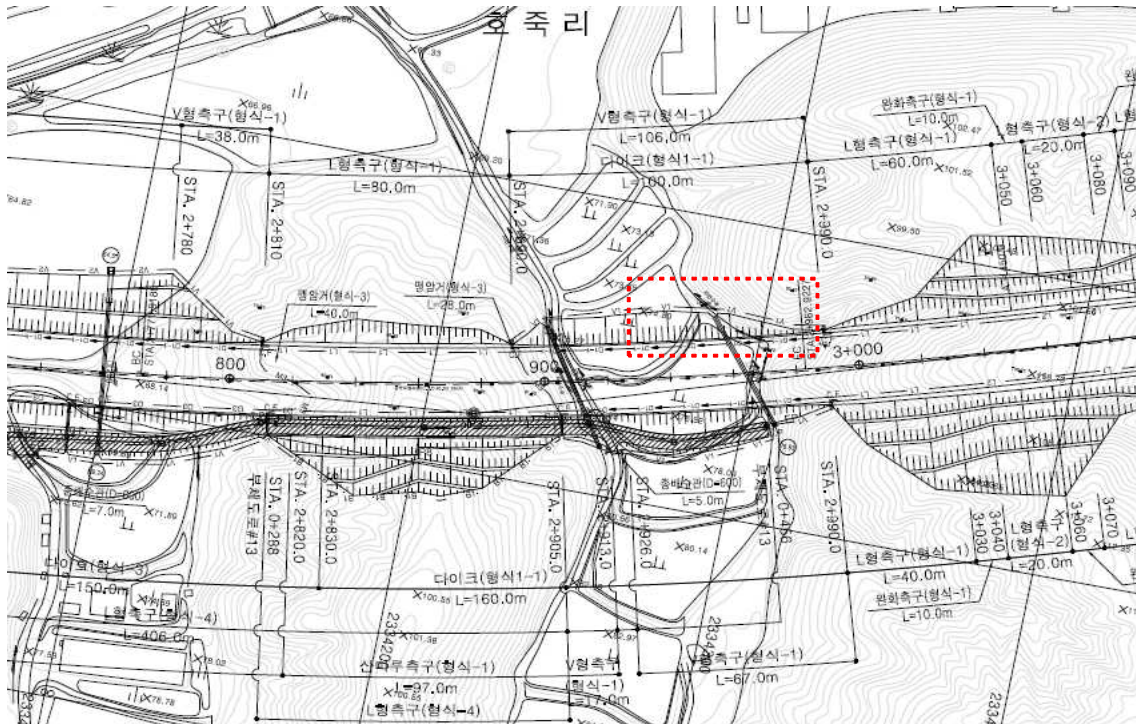

위 치

본선구간 3.0k지점(옥산방향)

내 용

성토사면 표면유실(임시복구 완료)


사진대지(3)



위 치 본선구간 9.5k지점(옥산방향)

내 용 절토사면 표면유실


사진대지(4)

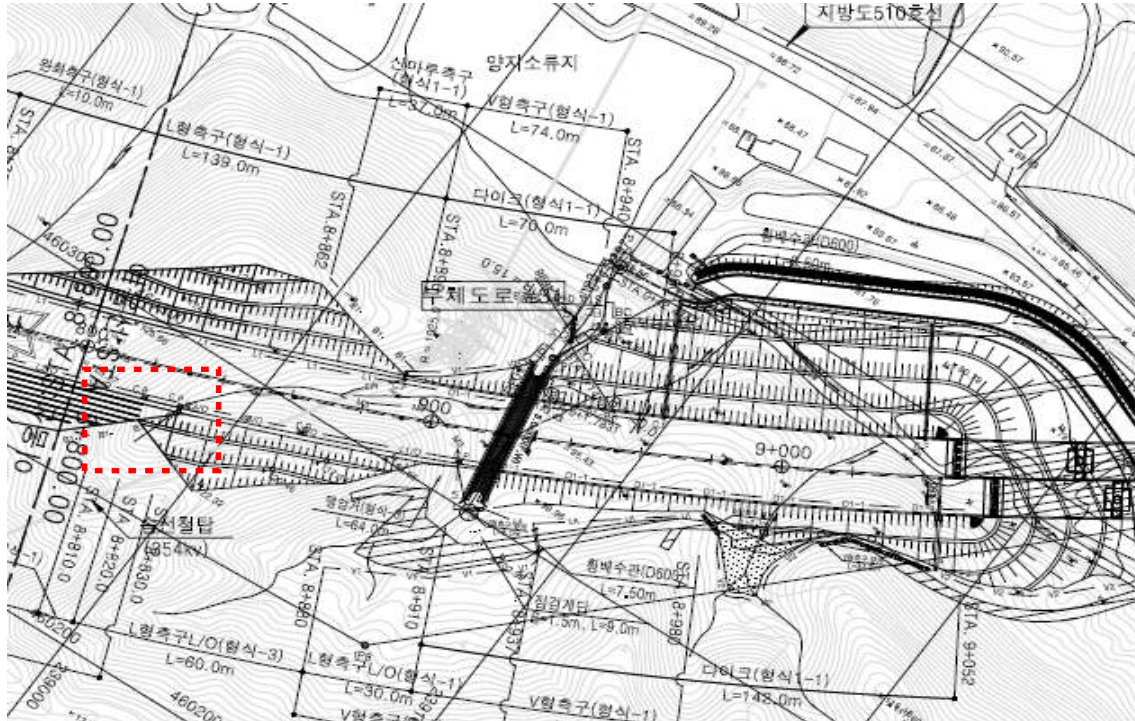

위 치 본선구간 8.8k지점(오창방향)

내 용 절토부옹벽 단부 토사세굴

사진대지(5)

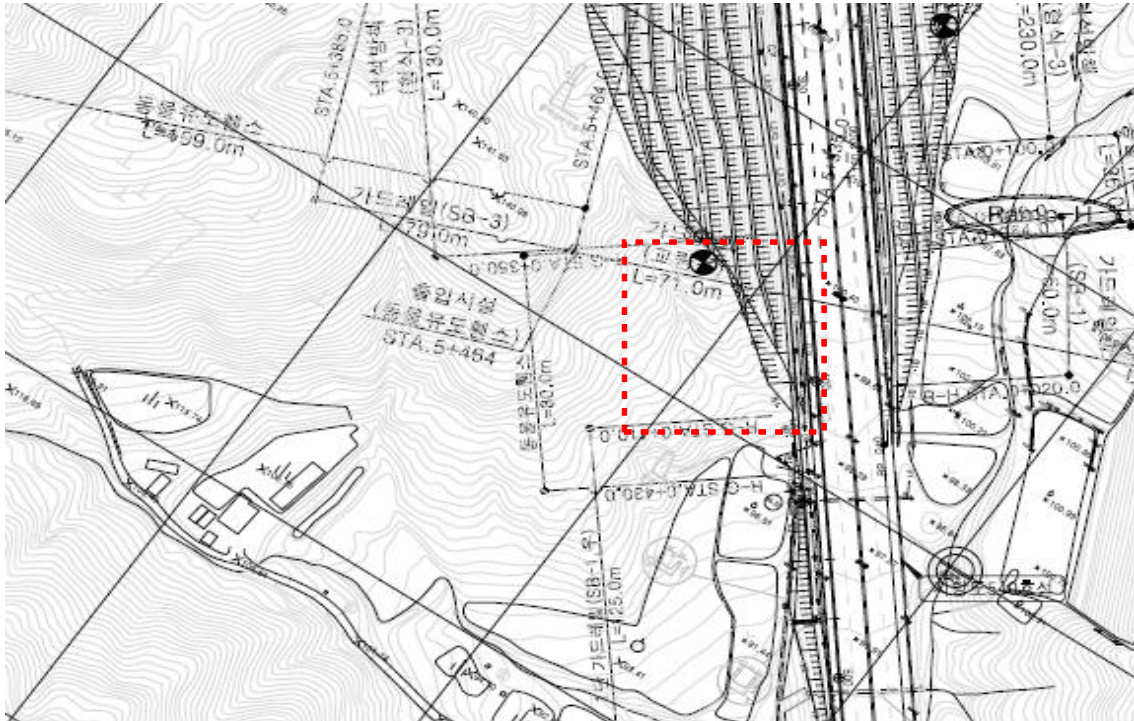

위 치	서오창IC R-G 0+340(우측)
내 용	램프 주변 공장부지 축대(돌쌓기) 붕괴로 인한 시설물 파손
