


5. 패널식옹벽(STA.5+040~5+277.5)


ID : STA.5+040.00 ~ STA.5+277.50

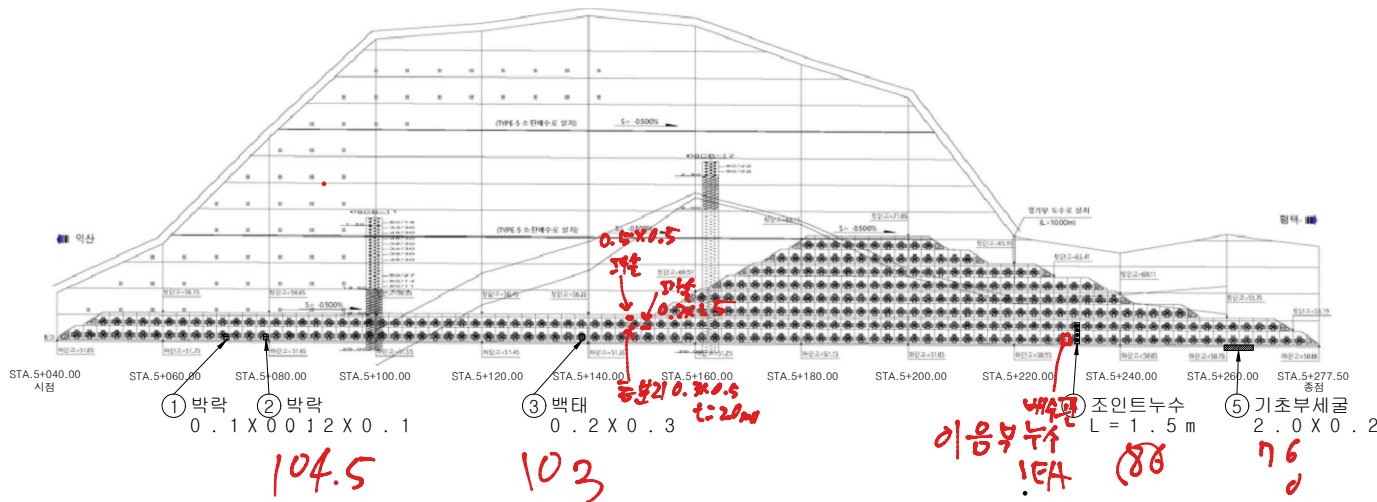

손상 현황 표

번호	구분	결함내용	손상규모						비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	개소	손상물량	단위	
1	기존	박락	-	0.1	0.1	1	0.01	m ²	-
2	기존	박락	-	0.2	0.1	1	0.02	m ²	-
3	기존	백태	-	0.2	0.3	1	0.06	m ²	-
4	신규	조인트누수	-	-	1.5	1	1.50	m	-
5	신규	기초부세굴	-	2.0	0.2	1	0.40	m ³	-
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

KEY PLAN



범례

	콘크리트		방사근형		재료분리
	관형/공동		박리, 박락/파손		시공이음/중분리
	누수/습윤부		백태		철근노출
	콘크리트 변색, 녹물		표장요철		강재부식
	작공/변형		볼트결함		용접불량

용역명	서부내륙고속도로 2025년 시설물 정기안전점검 용역(하반기)
시설물명	5. 패널식옹벽(STA.5+040~5+277.5)
점검일시	2025. 07 ~ 2025. 12
확인자	책임기술자 김경수
도면번호	01

