가락 공동구 - 중대로(STA. 0 m ~ 20 m) 통신구 구간







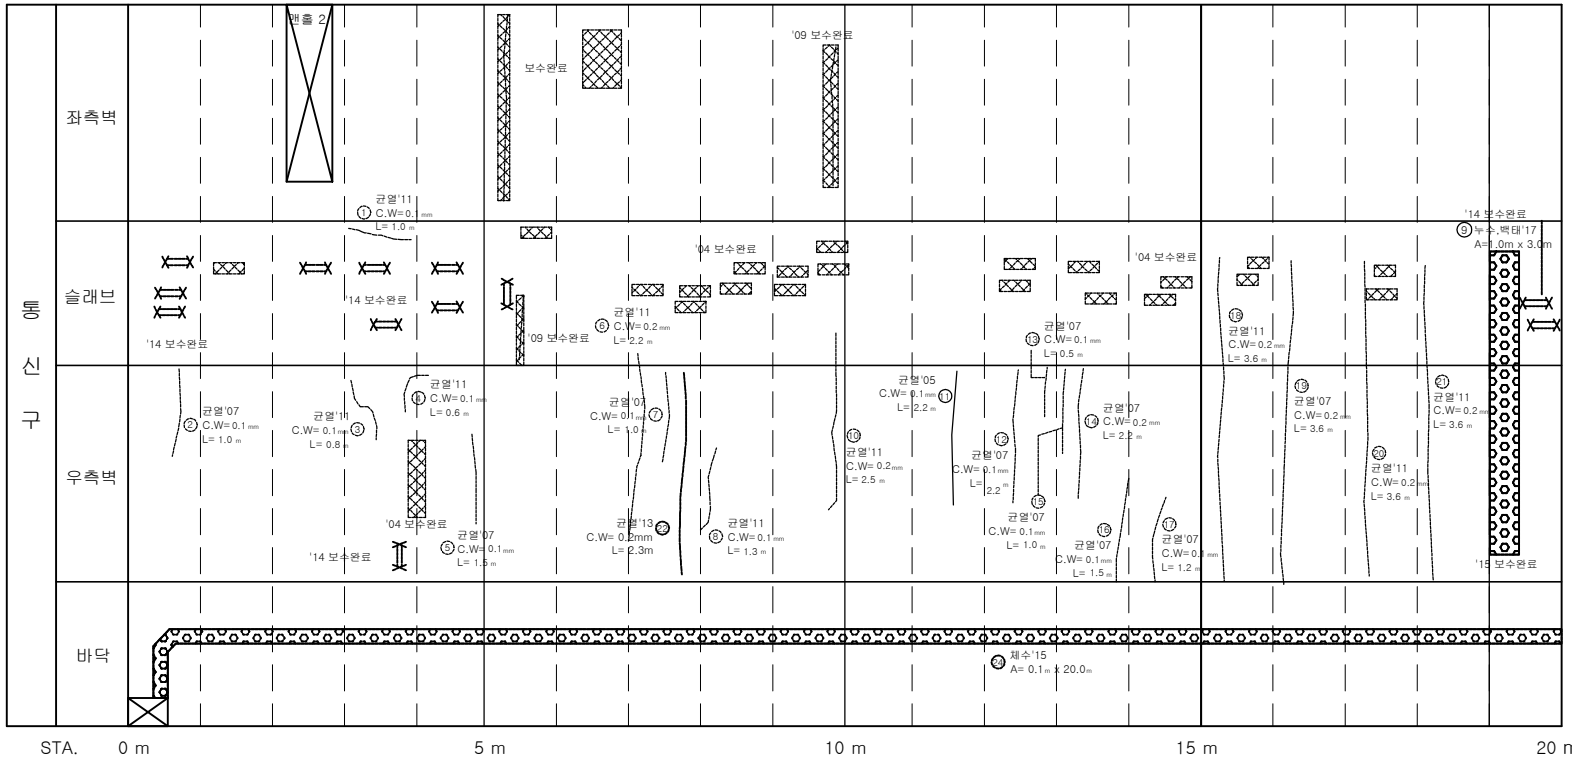

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량	
1	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1			
2	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1			
3	2011	균열	0.10	0.80		0.80	m	1			
4	2011	균열	0.10	0.60		0.60	m	1			
5	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1			
6	2011	균열	0.20	2.20		2.20	m	1			
7	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1			
8	2011	균열	0.10	1.30		1.30	m	1			
9	2017	누수,백태	1.00	3.00		3.00	㎡	1			
10	2011	균열	0.20	2.50		2.50	m	1			
11	2005	균열	0.10	2.20		2.20	m	1			
12	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1			
13	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1			
14	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1			
15	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1			
16	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1			
17	2007	균열	0.10	1.20		1.20	m	1			
18	2011	균열	0.20	3.60		3.60	m	1			
19	2007	균열	0.20	3.60		3.60	m	1			
20	2011	균열	0.20	3.60		3.60	m	1			
21	2011	균열	0.20	3.60		3.60	m	1			
22	2013	균열	0.20	2.30		2.30	m	1			
23	2015	누수		1.20		1.20	m	1			
24	2015	체수	0.10	20.0		2.00	㎡	1			
25	2019	분기구누수(선상)		4.00		4.00	m	1			신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 20 m ~ 40 m) 통신구 구간





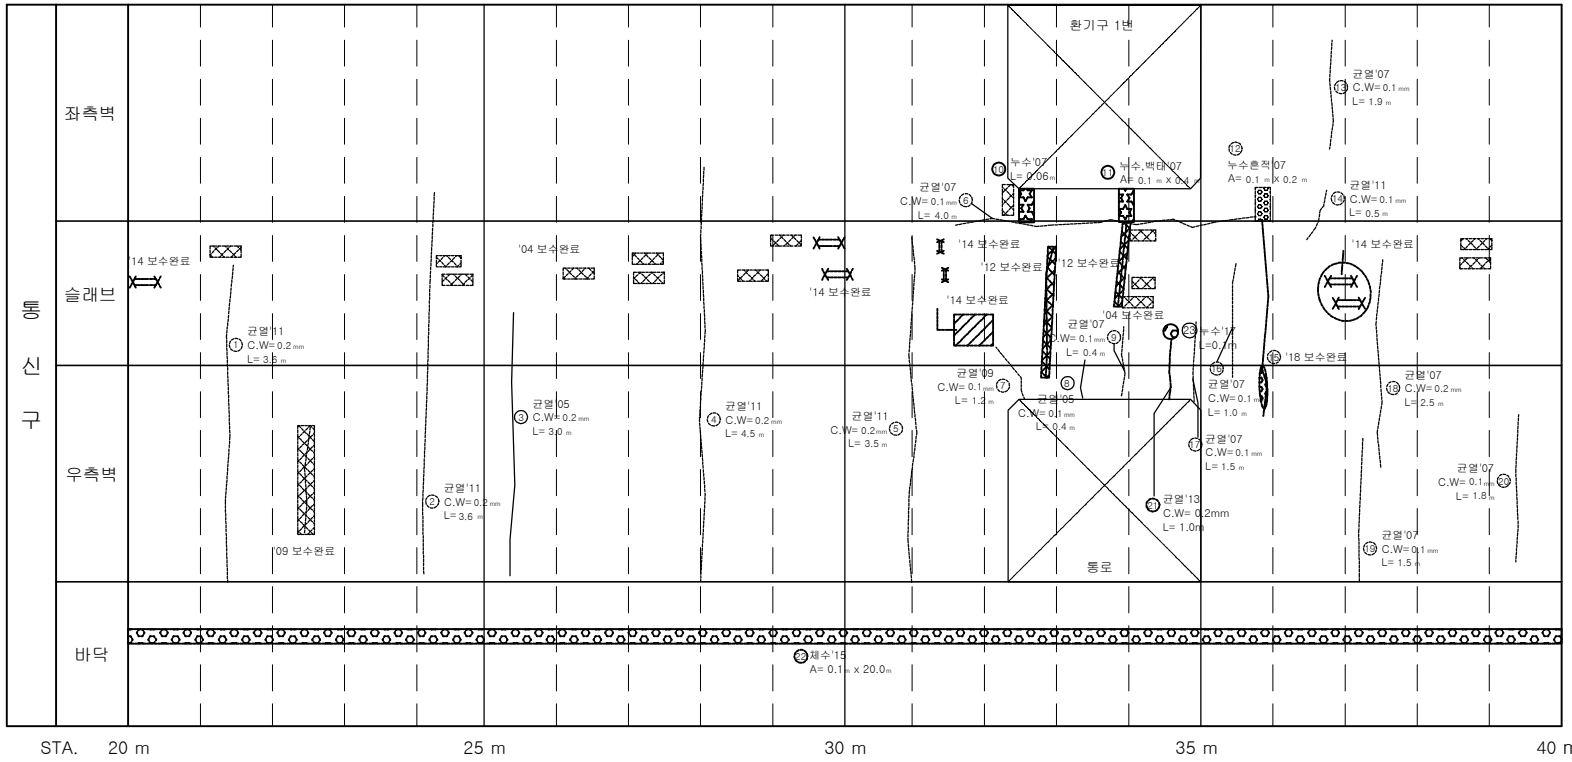

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2011	균열	0.20	3.60		3.60	m	1				
2	2011	균열	0.20	3.60		3.60	m	1				
3	2005	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
4	2011	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
5	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
6	2007	균열	0.10	4.00		4.00	m	1				
7	2009	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
8	2005	균열	0.10	0.40		0.40	m	1				
9	2007	균열	0.10	0.40		0.40	m	1				
10	2007	누수		0.06		0.06	m	1				
11	2007	누수,백태	0.10	0.40		0.40	㎡	1				
12	2007	누수흔적	0.10	0.20		0.02	㎡	1				
13	2007	균열	0.10	1.90		1.90	m	1				
14	2011	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
15	2007	균열,누수,백태	0.20	2.30		0.46	㎡	1	2018	패턴누수보수	0.46	
16	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
17	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
18	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
19	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
20	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
21	2013	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
22	2015	체수	0.10	20.0		2.00	㎡	1				
23	2017	누수		0.10		0.10	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 40 m ~ 60 m) 통신구 구간





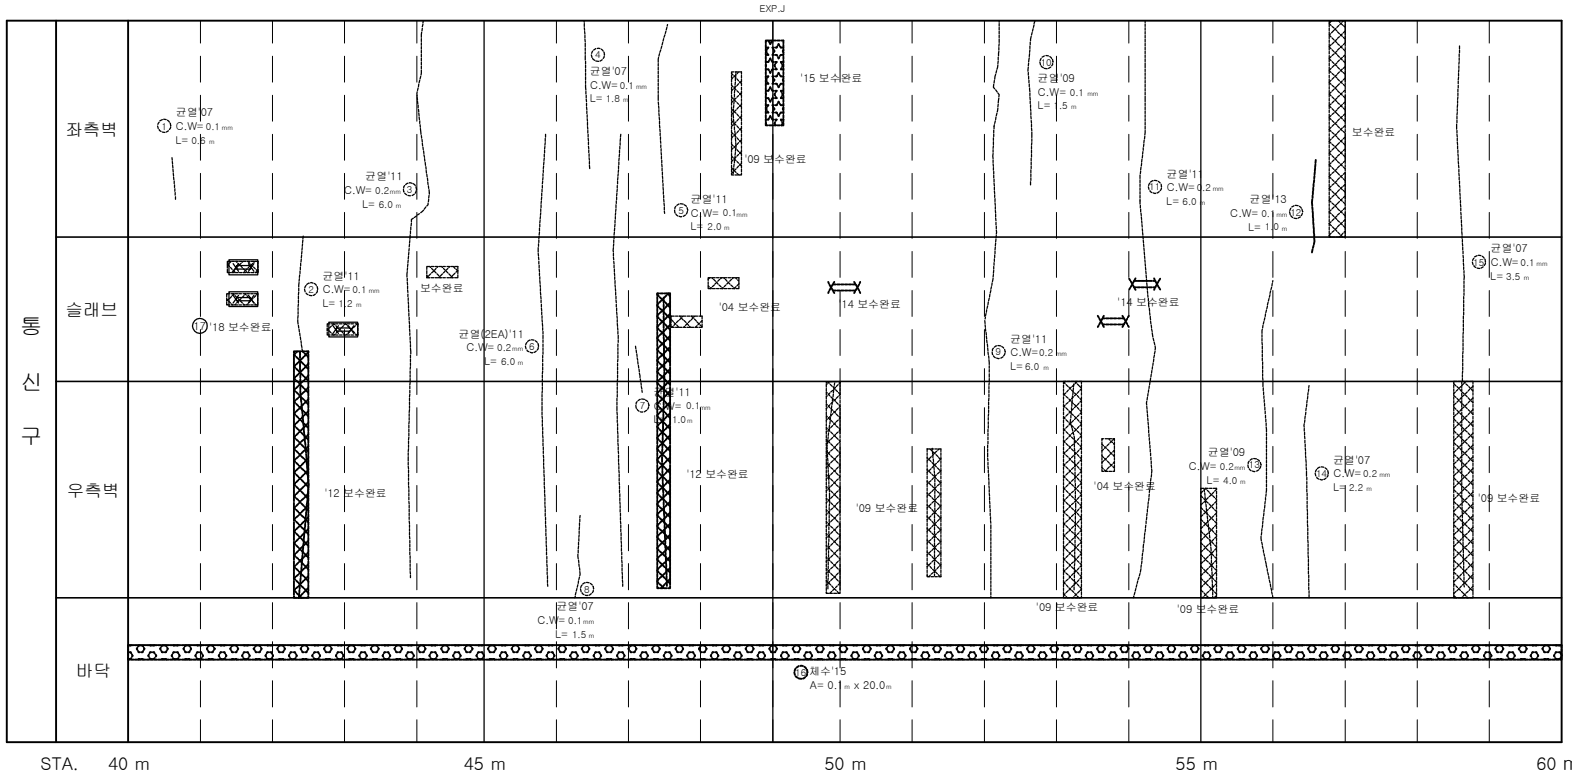

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2007	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
2	2011	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
3	2011	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
4	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
5	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
6	2011	균열	0.20	6.00		12.00	m	2				
7	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
8	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
9	2011	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
10	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
11	2011	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
12	2013	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
13	2009	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
14	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
15	2007	균열	0.10	3.50		3.50	m	1				
16	2015	체수	0.10	20.0		2.00	㎡	1				
17	2017	철근노출	0.10	0.30		0.09	㎡	3	2018	단면복구(방청)	0.11	중요

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 60 m ~ 80 m) 통신구 구간





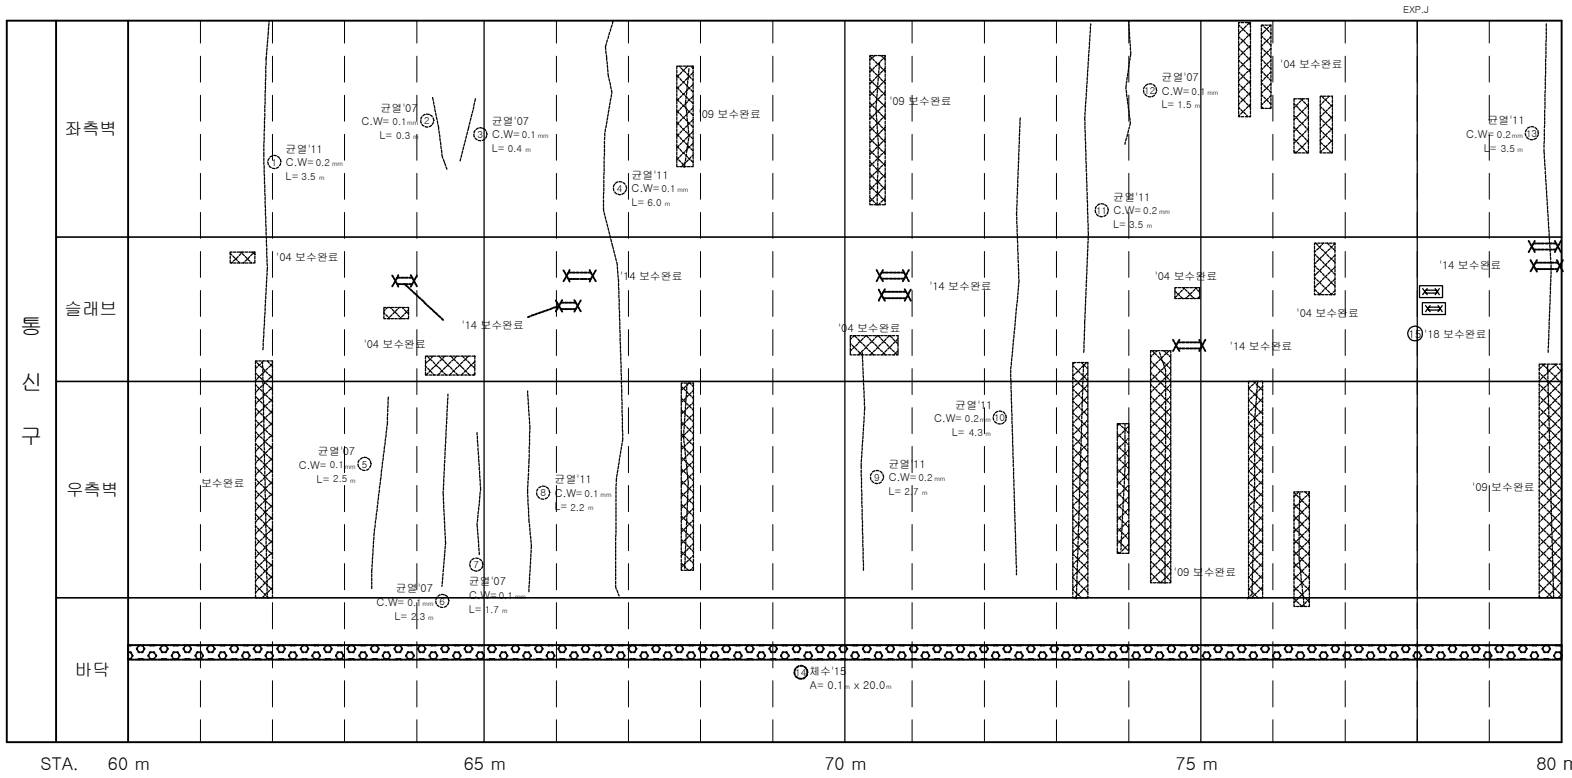

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	중량		
1	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
2	2007	균열	0.10	0.30		0.30	m	1				
3	2007	균열	0.10	0.40		0.40	m	1				
4	2011	균열	0.10	6.00		6.00	m	1				
5	2007	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				
6	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
7	2007	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
8	2011	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
9	2011	균열	0.20	2.70		2.70	m	1				
10	2011	균열	0.20	4.30		4.30	m	1				
11	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
12	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
13	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
14	2015	체수	0.10	20.0		2.00	㎡	1				
15	2017	철근노출	0.10	0.20		0.04	㎡	2	2018	단면복구(방청)	0.05	중요

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 80 m ~100 m) 통신구 구간





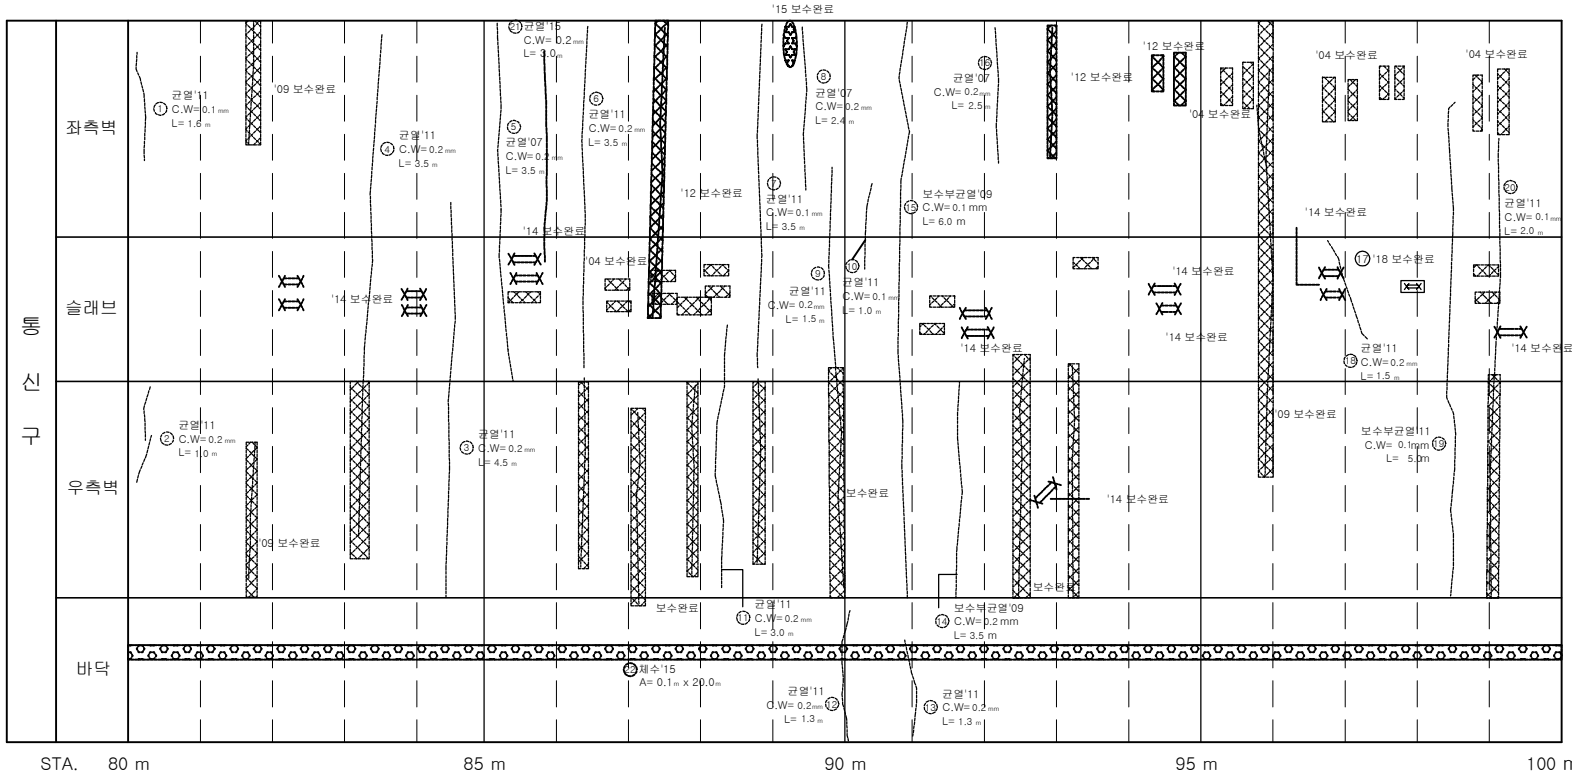

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량		
1	2011	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
2	2011	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
3	2011	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
4	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
5	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
6	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
7	2011	균열	0.10	3.50		3.50	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
9	2011	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
10	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
11	2011	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
12	2011	균열	0.20	1.30		1.30	m	1				
13	2011	균열	0.20	1.30		1.30	m	1				
14	2009	보수부균열	0.20	3.50		3.50	m	1				재결함
15	2009	균열	0.10	6.00		6.00	m	1				
16	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
17	2017	철근노출	0.10	0.20		0.02	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.02	종요
18	2011	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
19	2011	균열	0.10	5.00		5.00	m	1				
20	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
21	2015	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
22	2015	체수	0.10	20.0		2.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.100 m ~120 m) 통신구 구간





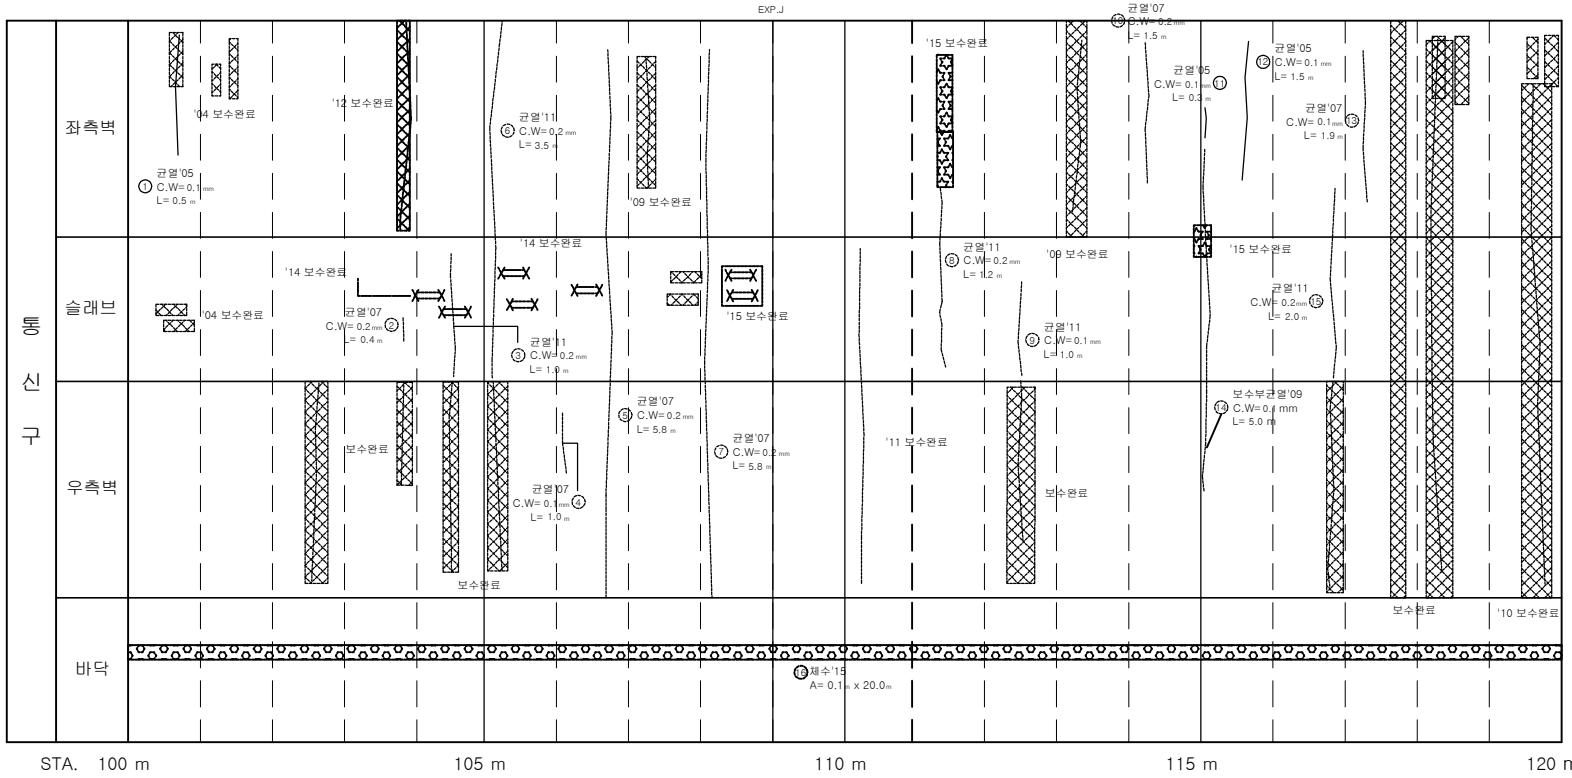

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2005	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
2	2007	균열	0.20	0.40		0.40	m	1				
3	2011	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
4	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
5	2007	균열	0.20	5.80		5.80	m	1				
6	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
7	2007	균열	0.20	5.80		5.80	m	1				
8	2011	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
9	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
10	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
11	2005	균열	0.10	0.30		0.30	m	1				
12	2005	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
13	2007	균열	0.10	1.90		1.90	m	1				
14	2009	보수부균열	0.10	5.00		5.00	m	1				재결함
15	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
16	2015	체수	0.10	20.0		2.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 120 m ~ 140 m) 통신구 구간





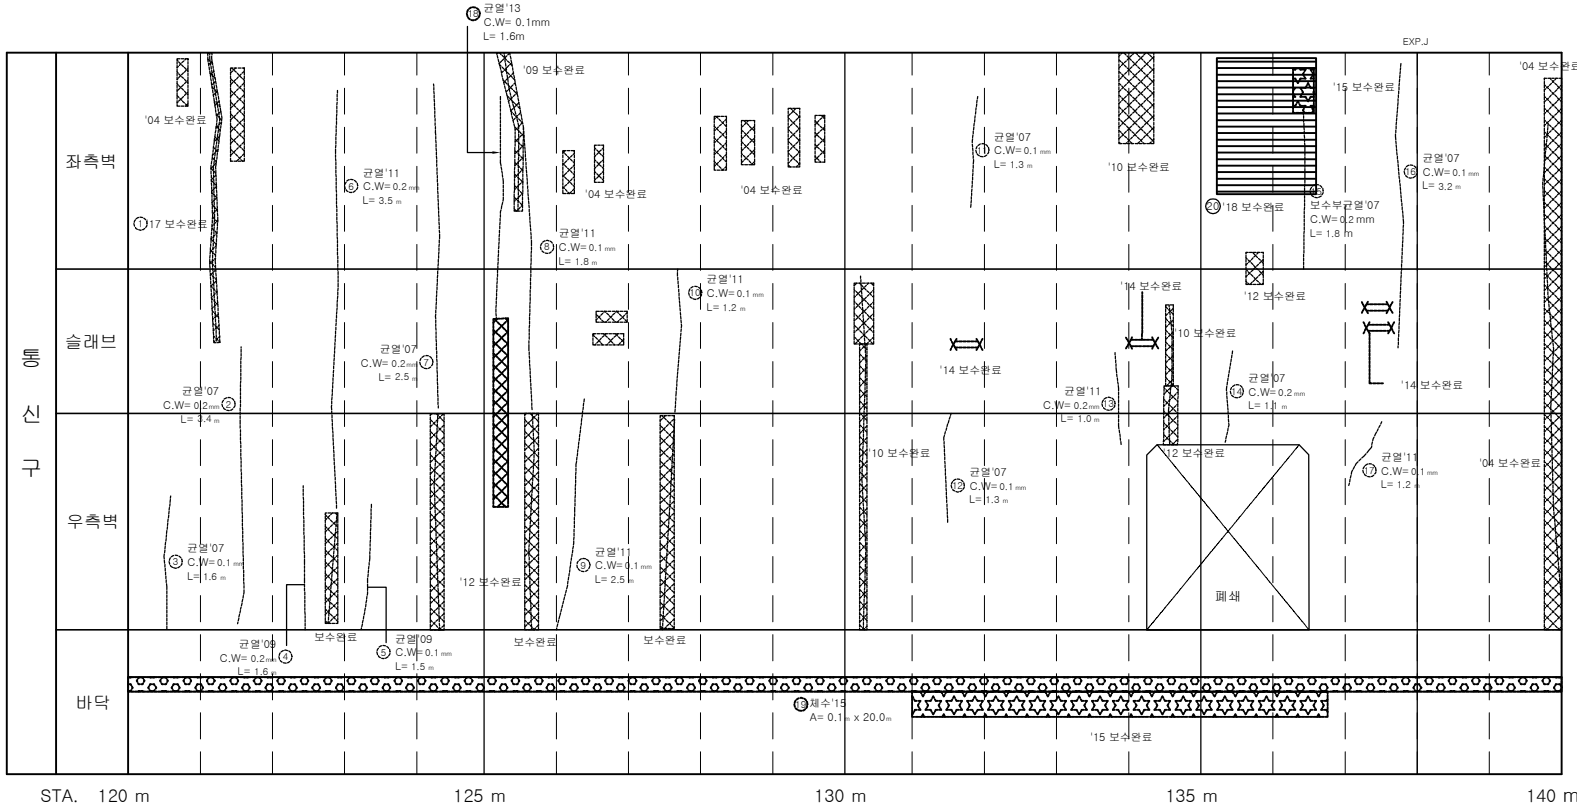

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2009	균열	0.20	3.50		3.50	m	1	2017	표면처리공법	4.20	
2	2007	균열	0.20	3.40		3.40	m	1				
3	2007	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
4	2009	균열	0.20	1.60		1.60	m	1				
5	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
6	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
7	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
8	2011	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
9	2011	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				
10	2011	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
11	2007	균열	0.10	1.30		1.30	m	1				
12	2007	균열	0.10	1.30		1.30	m	1				
13	2011	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
14	2007	균열	0.20	1.10		1.10	m	1				
15	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
16	2007	균열	0.10	3.20		3.20	m	1				
17	2011	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
18	2013	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
19	2015	체수	0.10	20.0		2.00	㎡	1				
20	2017	보수부들림	1.40	1.80		2.52	㎡	1	2018	단면복구공법	3.02	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락공동구 - 중대로(STA.148m)환기구 2번

KEYPLAN



SECTION



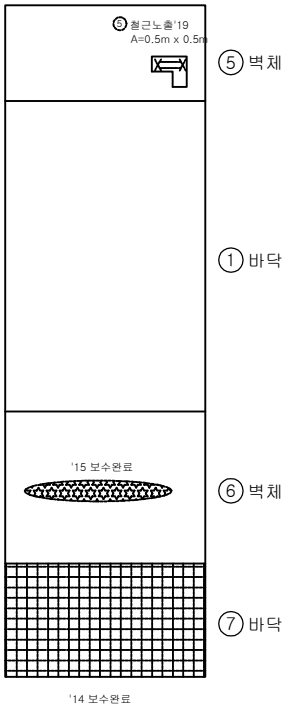

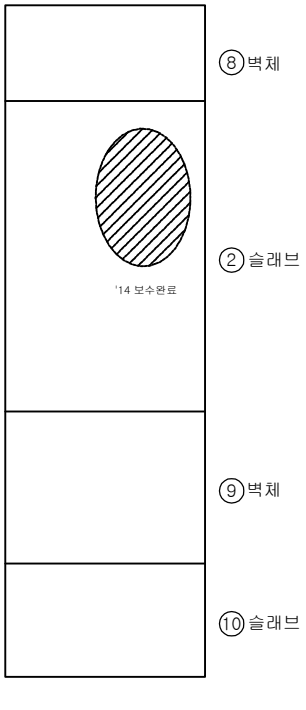

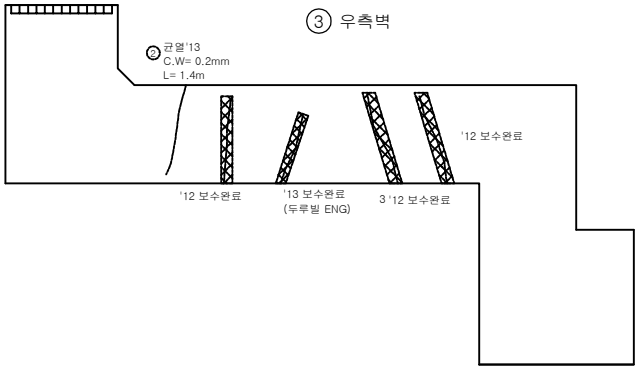

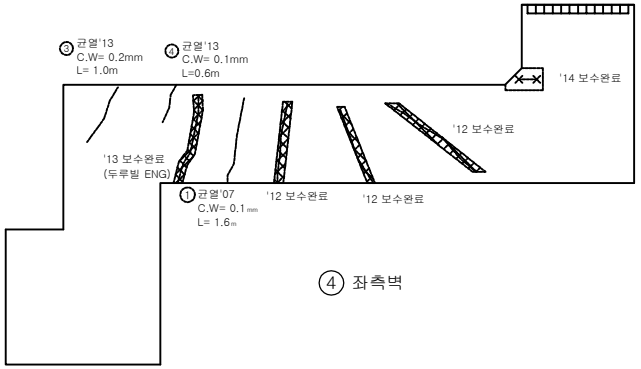

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량		
1	2007	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
2	2013	균열	0.20	1.40		1.40	m	1				
3	2013	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
4	2013	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
5	2019	철근노출	0.50	0.50		0.25	㎡	1				신규

??? ??????	TITLE OF PROJECT 2017 ??? ???? ?? (?????)	TITLE OF SHIFT ??? ??????

가락 공동구 - 중대로(STA.140 m ~160 m) 통신구 구간





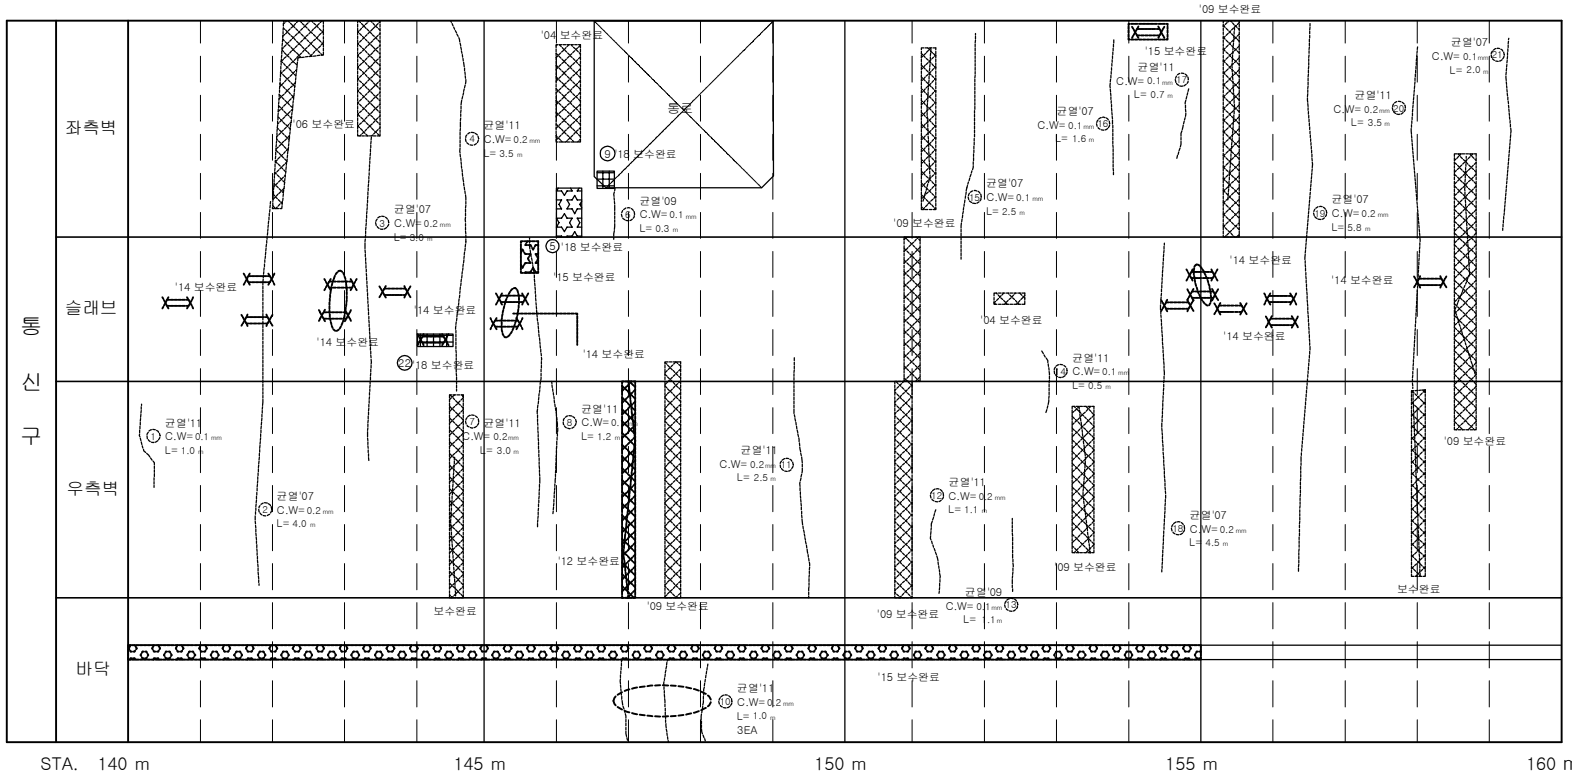

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량		
1	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
2	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
3	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
4	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
5	2007	백태	0.10	0.20		0.02	㎡	1	2018	표면처리공법	0.02	
6	2009	균열	0.10	0.30		0.30	m	1				
7	2011	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
8	2011	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
9	2017	파손	0.20	0.20		0.04	㎡	1	2018	단면복구공법	0.05	
10	2011	균열	0.20	3.00		9.00	m	3				
11	2011	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
12	2011	균열	0.20	1.10		1.10	m	1				
13	2009	균열	0.10	1.10		1.10	m	1				
14	2011	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
15	2007	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				
16	2007	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
17	2011	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
18	2007	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
19	2007	균열	0.20	5.80		5.80	m	1				
20	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
21	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
22	2017	보수부박락	0.10	0.20		0.02	㎡	1	2018	단면복구공법	0.02	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.160 m ~180 m) 통신구 구간

KEYPLAN



SECTION 6-6



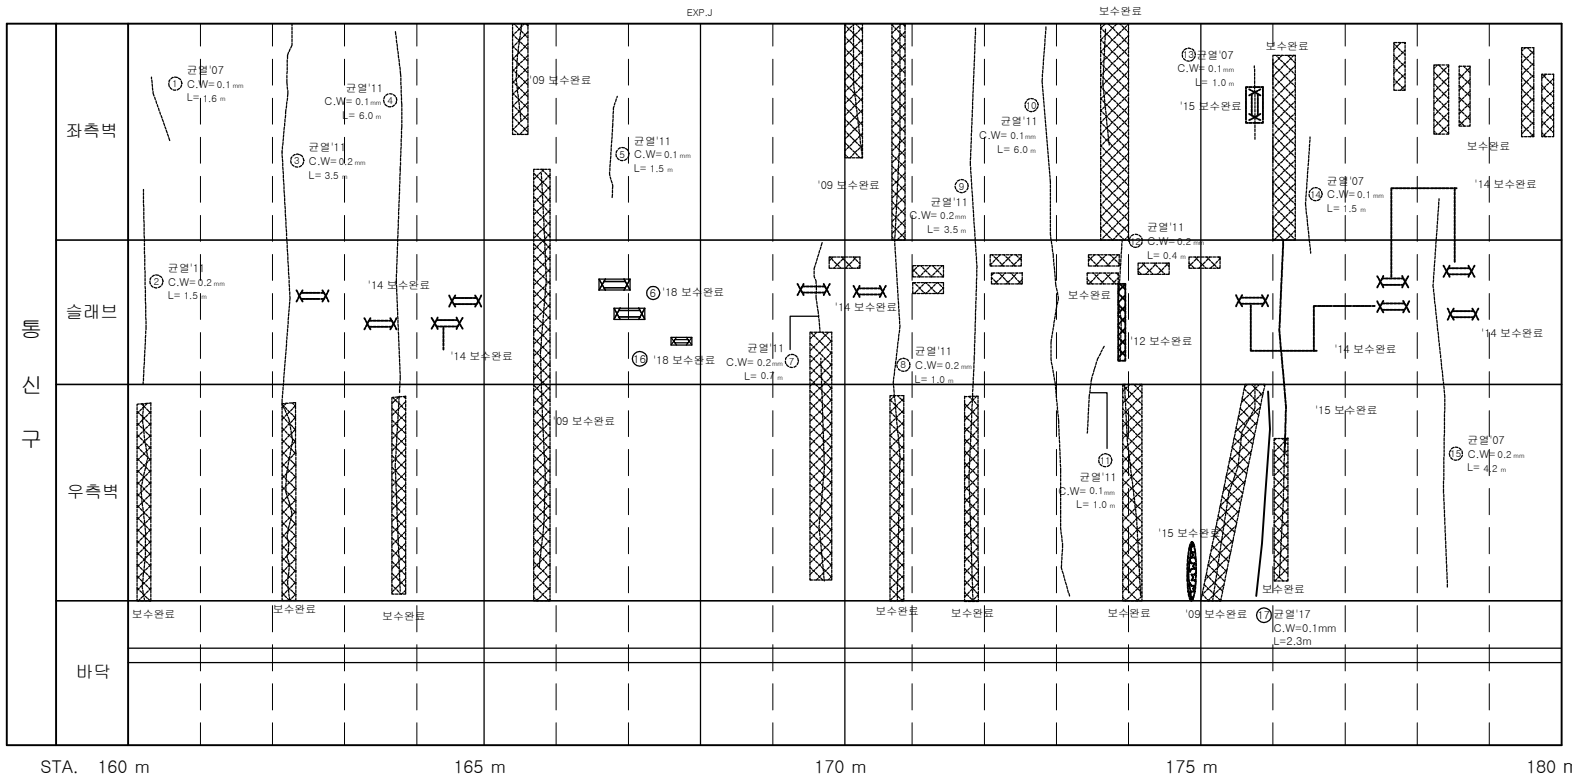

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량		
1	2007	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
2	2011	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
3	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
4	2011	균열	0.10	6.00		6.00	m	1				
5	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
6	2007	철근노출	0.10	0.10		0.02	㎡	2	2018	단면복구(방청)	0.05	중요
7	2011	균열	0.20	0.70		0.70	m	1				
8	2011	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
9	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
10	2011	균열	0.10	6.00		6.00	m	1				
11	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
12	2011	균열	0.20	0.40		0.40	m	1				
13	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
14	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
15	2007	균열	0.20	4.20		4.20	m	1				
16	2017	철근노출	0.10	0.10		0.01	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.01	중요
17	2017	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.180 m ~200 m) 통신구 구간





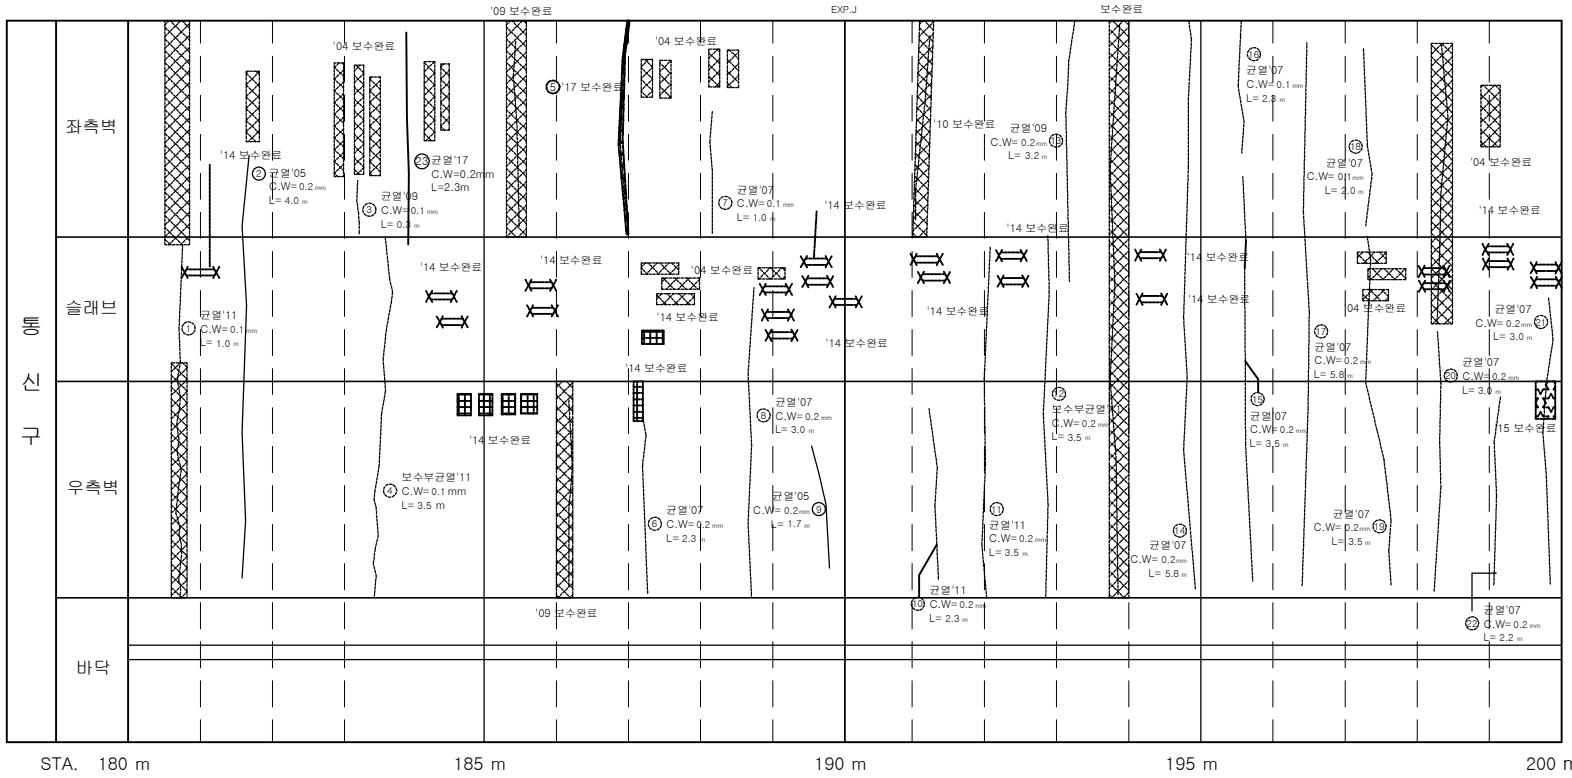

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량		
1	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
2	2005	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
3	2009	균열	0.10	0.30		0.30	m	1				
4	2011	보수부균열	0.10	3.50		3.50	m	1				재결함
5	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1	2017	표면처리공법	2.76	
6	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
7	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
8	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
9	2005	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
10	2011	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
11	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
12	2011	보수부균열	0.20	3.50		3.50	m	1				재결함
13	2009	균열	0.20	3.20		3.20	m	1				
14	2007	균열	0.20	5.80		5.80	m	1				
15	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
16	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
17	2007	균열	0.20	5.80		5.80	m	1				
18	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
19	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
20	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
21	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
22	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
23	2017	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.200 m ~220 m) 통신구 구간





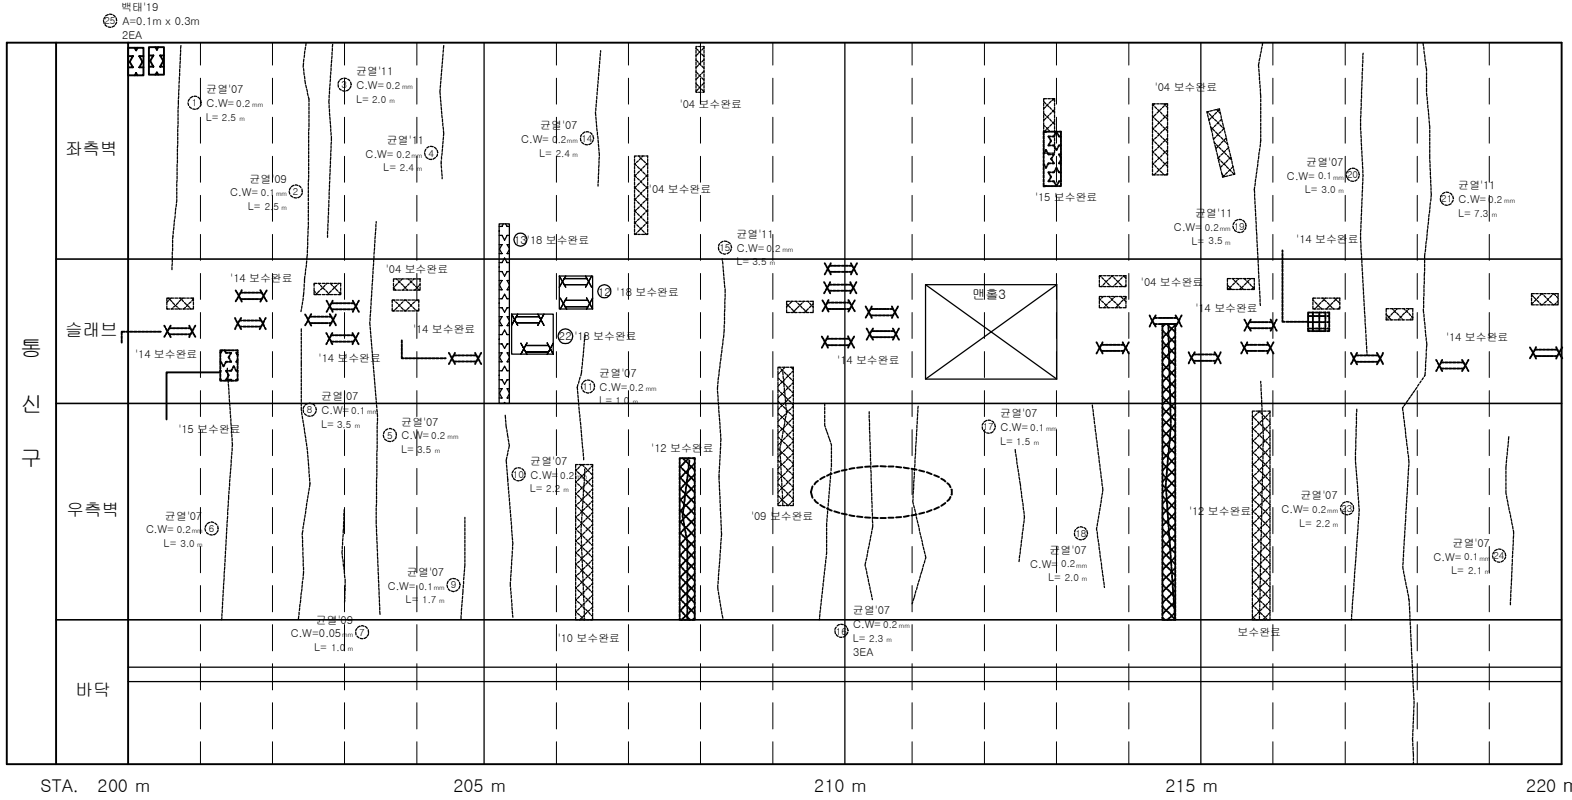

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량		
1	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
2	2009	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				
3	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
4	2011	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
5	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
6	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
7	2009	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
8	2007	균열	0.10	3.50		3.50	m	1				
9	2007	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
10	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
11	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
12	2009	철근노출	0.10	0.20		0.04	㎡	2	2018	단면복구(방청)	0.05	중요
13	2007	백태	0.20	2.00		0.40	㎡	1	2018	표면처리공법	0.48	
14	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
15	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
16	2007	균열	0.20	2.30		6.90	m	3				
17	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
18	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
19	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
20	2007	균열	0.10	3.00		3.00	m	1				
21	2011	균열	0.20	7.30		7.30	m	1				
22	2017	철근노출	0.10	0.20		0.04	㎡	2	2018	단면복구(방청)	0.05	중요
23	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
24	2007	균열	0.10	2.10		2.10	m	1				
25	2019	백태	0.10	0.30		0.06	㎡	2				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.220 m ~240 m) 통신구 구간





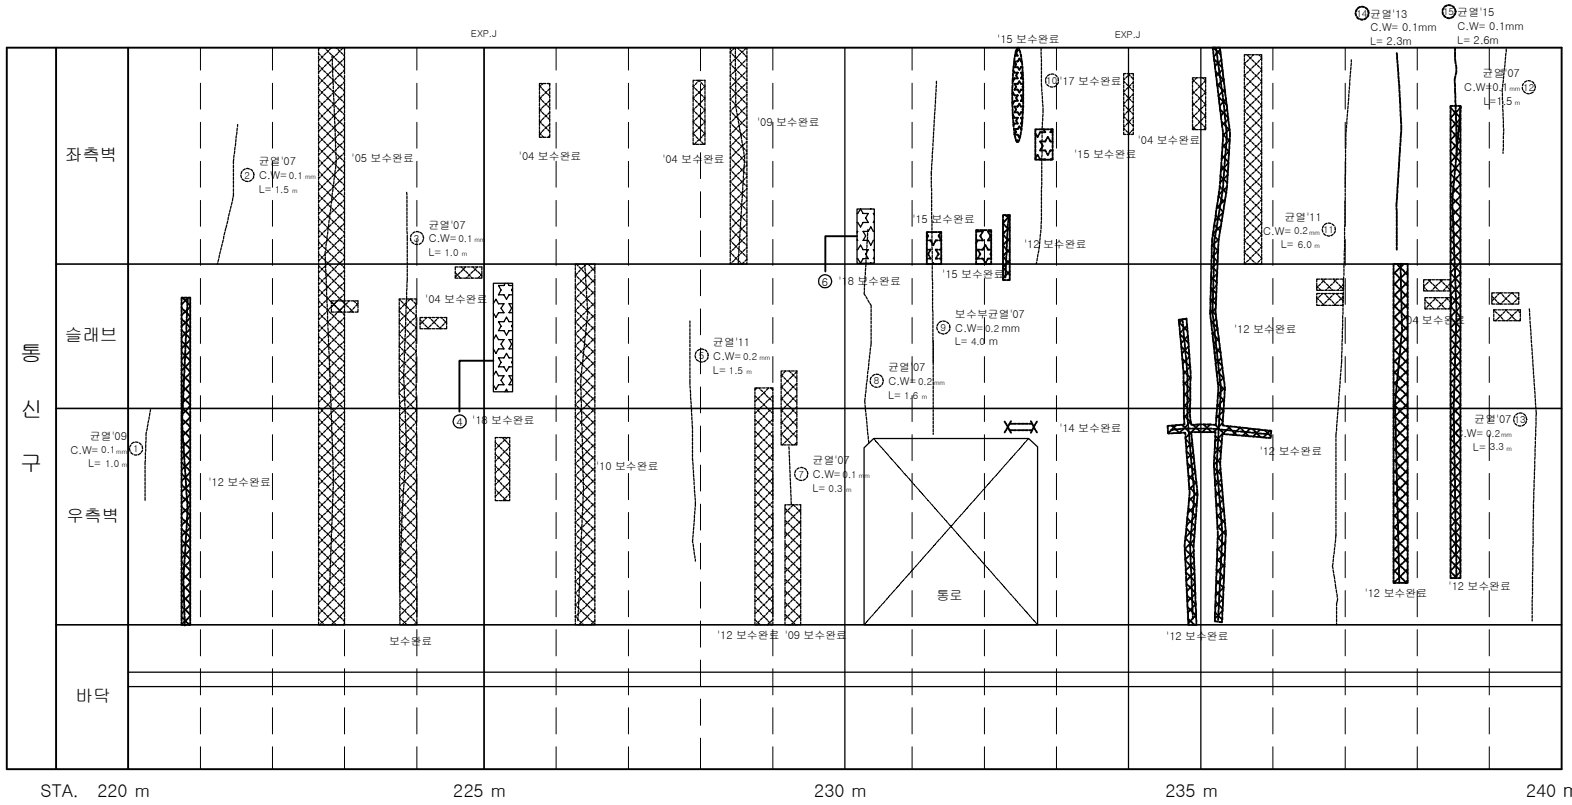

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2009	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
2	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
3	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
4	2009	백태	0.10	1.00		0.10	㎡	1	2018	표면처리공법	0.12	
5	2011	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
6	2009	백태	0.10	0.40		0.04	㎡	1	2018	표면처리공법	0.05	
7	2007	균열	0.10	0.30		0.30	m	1				
8	2007	균열	0.20	1.60		1.60	m	1				
9	2007	보수부균열	0.20	4.00		4.00	m	1				재결함
10	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1	2017	표면처리공법	2.40	
11	2011	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
12	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
13	2007	균열	0.20	3.30		3.30	m	1				
14	2013	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
15	2015	균열	0.10	2.70		2.70	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.240 m ~260 m) 통신구 구간





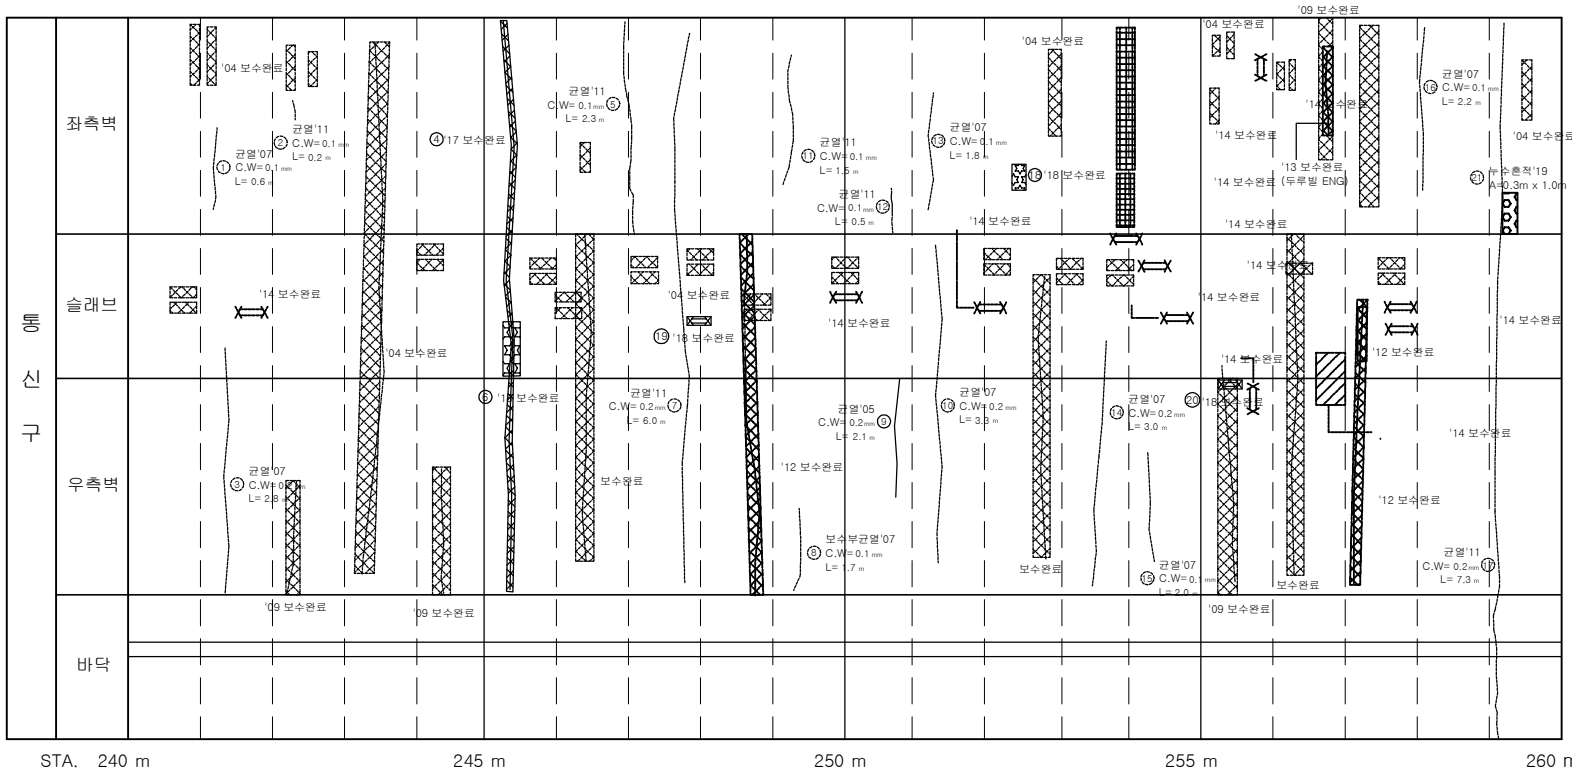

손 상 물 량 표

번호	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
2	2011	균열	0.10	0.20		0.20	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.80		2.80	m	1				
4	2011	균열부백태	0.20	6.00		1.20	㎡	1	2017	표면처리공법	1.44	
5	2011	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
6	2009	백태	0.10	0.30		0.03	㎡	1	2018	표면처리공법	0.04	
7	2011	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
8	2007	보수부균열	0.10	1.70		1.70	m	1				재결함
9	2005	균열	0.20	2.10		2.10	m	1				
10	2007	균열	0.20	3.30		3.30	m	1				
11	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
12	2011	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
13	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
14	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
15	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
16	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
17	2011	균열	0.20	7.30		7.30	m	1				
18	2015	백태	0.10	0.80		0.08	㎡	1	2018	표면처리공법	0.10	
19	2017	철근노출	0.10	0.20		0.02	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.02	중요
20	2017	철근노출	0.10	0.20		0.02	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.02	중요
21	2019	누수흔적	0.30	1.00		0.30	㎡	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.260 m ~280 m) 통신구 구간





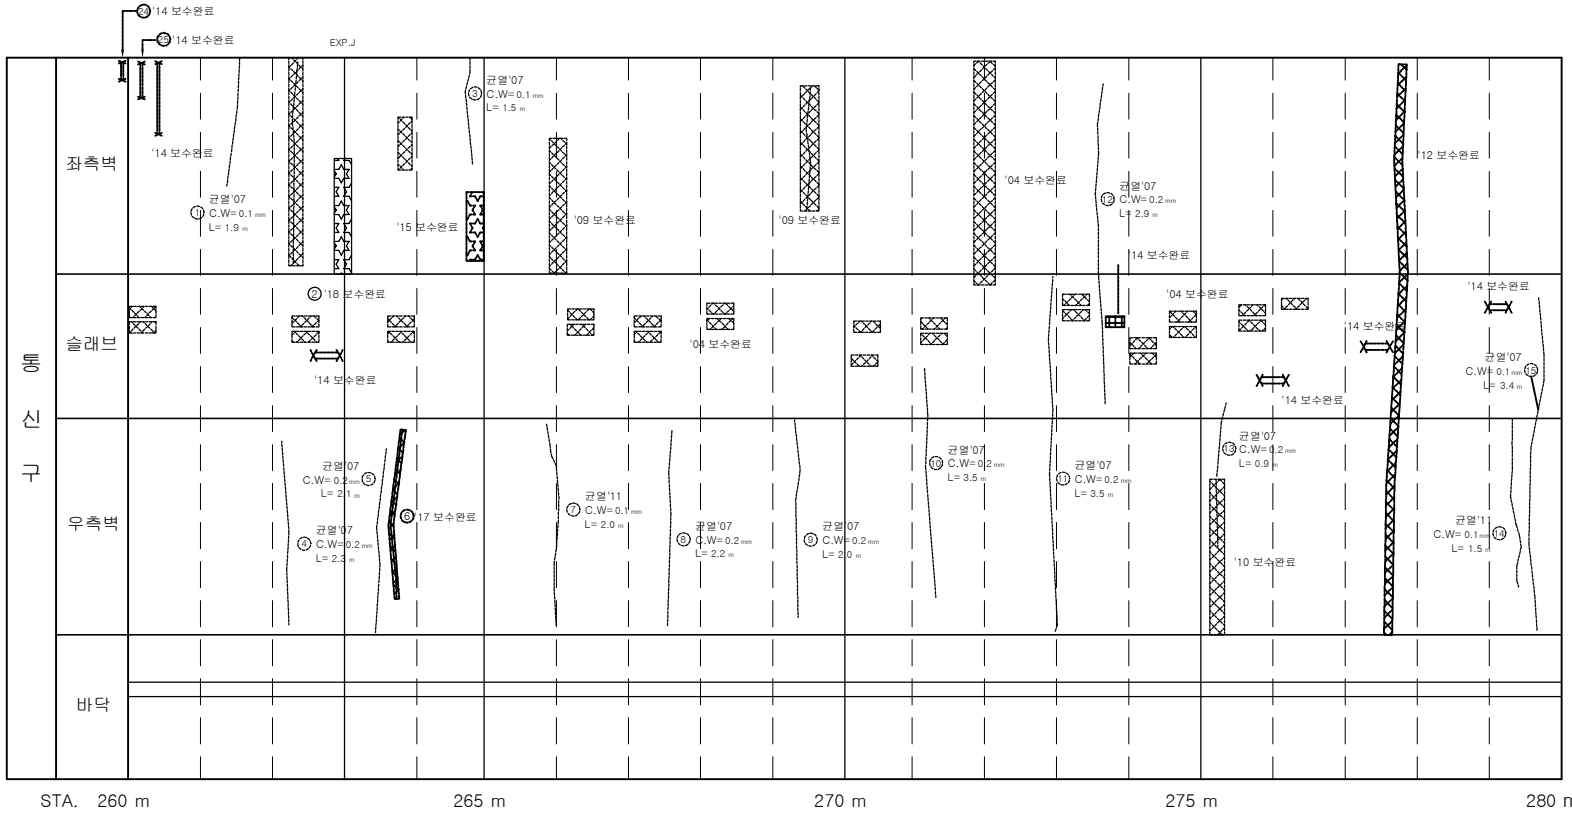

손 상 물 량 표

번호	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2007	균열	0.10	1.90		1.90	m	1				
2	2009	박태	0.10	1.70		0.17	㎡	1	2018	표면처리공법	0.20	
3	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
4	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.10		2.10	m	1				
6	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1	2017	표면처리공법	2.40	
7	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
9	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
10	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
11	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
12	2007	균열	0.20	2.90		2.90	m	1				
13	2007	균열	0.20	0.90		0.90	m	1				
14	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
15	2007	균열	0.10	3.40		3.40	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.280 m ~300 m) 통신구 구간

KEYPLAN



SECTION 6-6



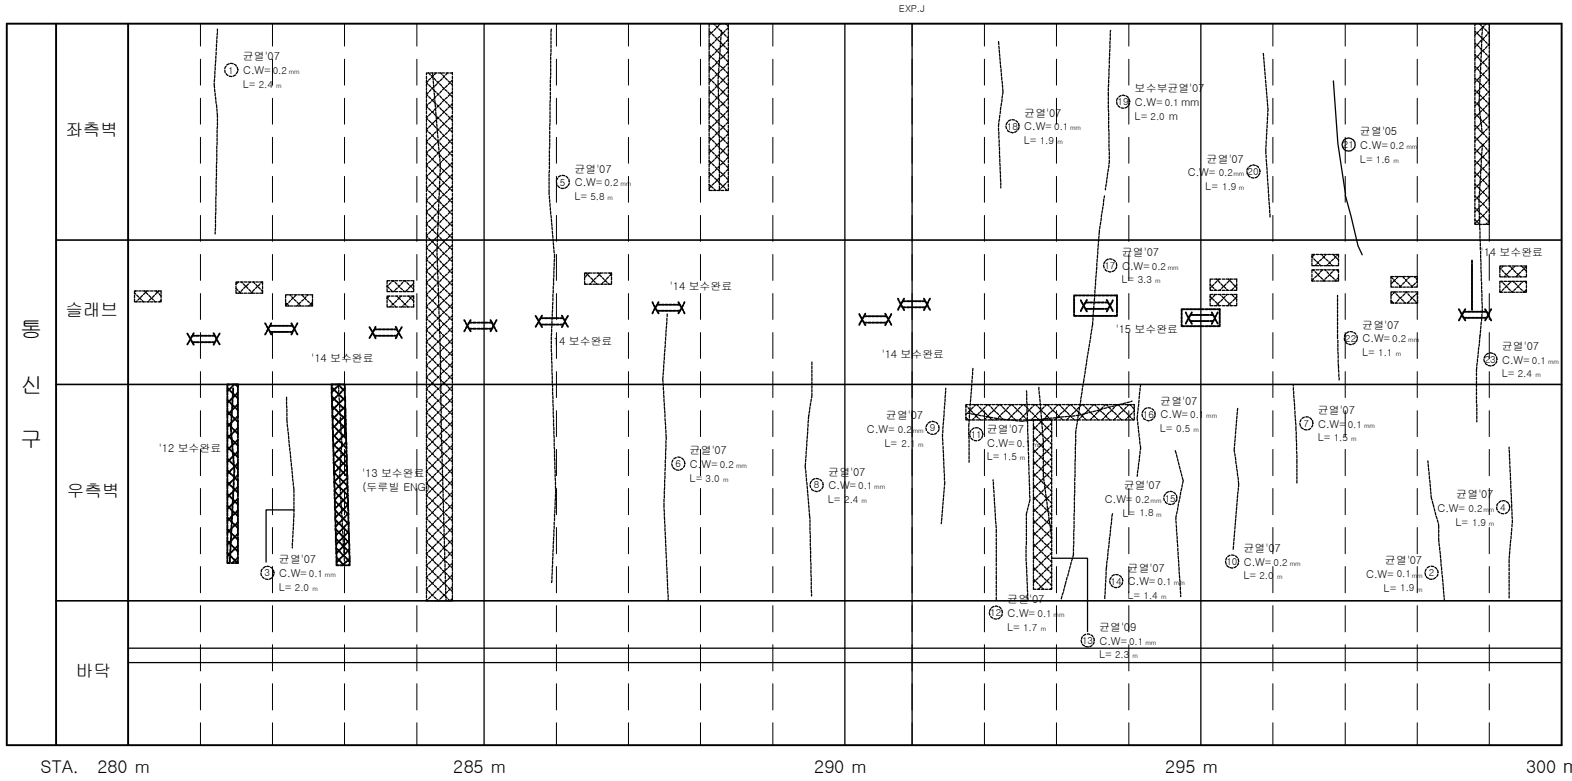

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	증량	
1	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
2	2007	균열	0.10	1.90		1.90	m	1				
3	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
4	2007	균열	0.20	1.90		1.90	m	1				
5	2007	균열	0.20	5.80		5.80	m	1				
6	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
7	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
8	2007	균열	0.10	2.40		2.40	m	1				
9	2007	균열	0.20	2.10		2.10	m	1				
10	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
11	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
12	2007	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
13	2009	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
14	2007	균열	0.10	1.40		1.40	m	1				
15	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
16	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
17	2007	균열	0.20	3.30		3.30	m	1				
18	2007	균열	0.10	1.90		1.90	m	1				
19	2007	보수부균열	0.10	2.00		2.00	m	1				재결함
20	2007	균열	0.20	1.90		1.90	m	1				
21	2005	균열	0.20	1.60		1.60	m	1				
22	2007	균열	0.20	1.10		1.10	m	1				
23	2007	균열	0.10	2.40		2.40	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.300 m ~320 m) 통신구 구간





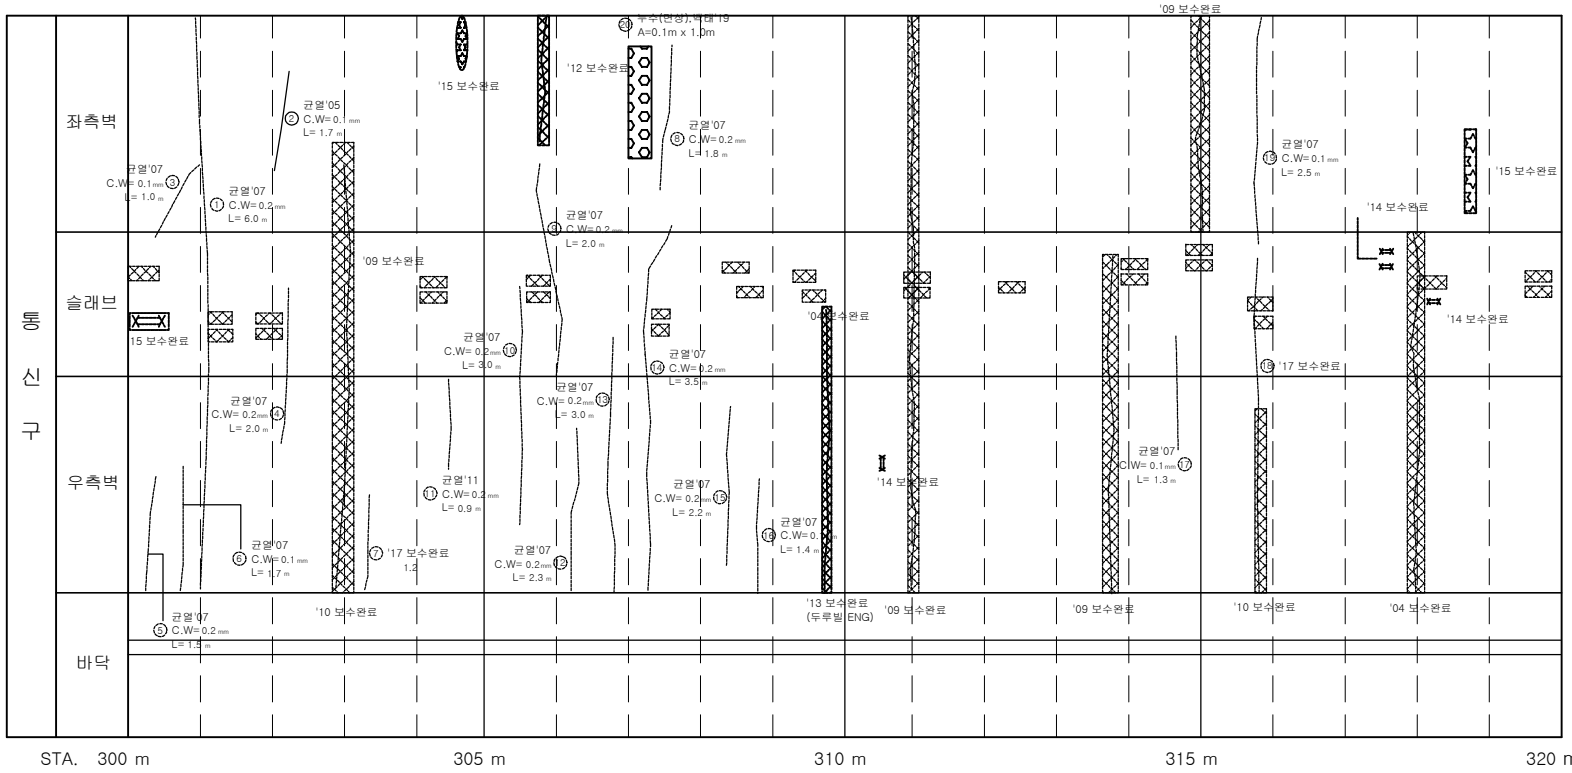

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2007	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
2	2005	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
3	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
4	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
5	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
6	2007	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
7	2007	균열	0.10	1.20		1.20	m	1	2017	표면처리공법	1.44	
8	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
9	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
10	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
11	2011	균열	0.20	0.90		0.90	m	1				
12	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
13	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
14	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
15	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
16	2007	균열	0.10	1.40		1.40	m	1				
17	2007	균열	0.10	1.30		1.30	m	1				
18	2007	균열	0.20	1.20		1.20	m	1	2017	표면처리공법	1.44	
19	2007	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				
20	2019	누수(찬성),백태	0.10	1.00		0.10	㎡	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.320 m ~340 m) 통신구 구간





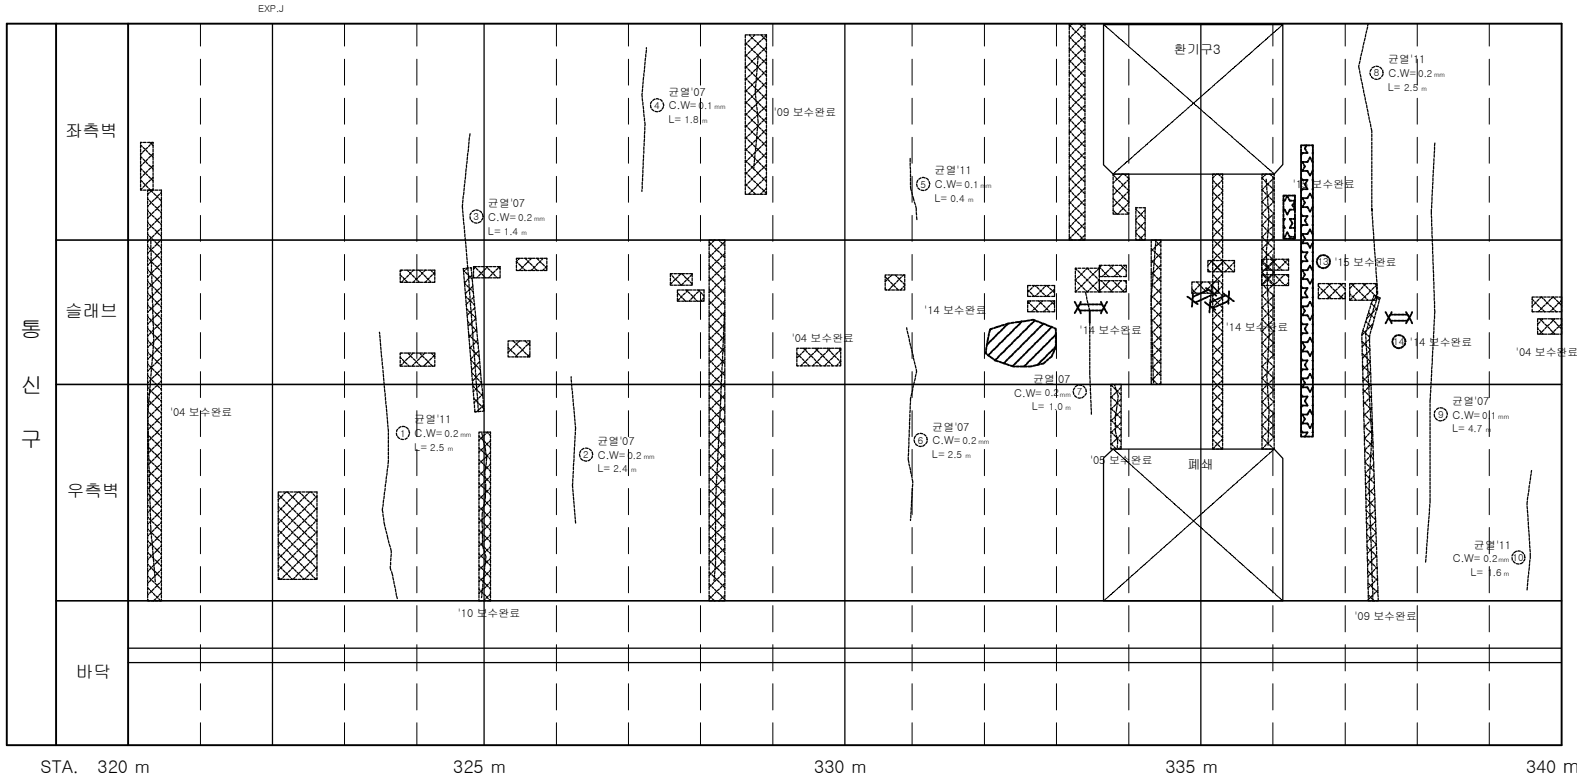

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	중량	
1	2011	균열	0.20	2.50		2.50	m	1			
2	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1			
3	2007	균열	0.20	1.40		1.40	m	1			
4	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1			
5	2011	균열	0.10	0.40		0.40	m	1			
6	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1			
7	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1			
8	2011	균열	0.20	2.50		2.50	m	1			
9	2007	균열	0.10	4.70		4.70	m	1			
10	2011	균열	0.20	1.60		1.60	m	1			

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락공동구 - 중대로(STA.335m)환기구 3번

KEYPLAN



SECTION



BOX A

① 좌측벽 ② 슬래브 ③ 우측벽 ④ 바닥

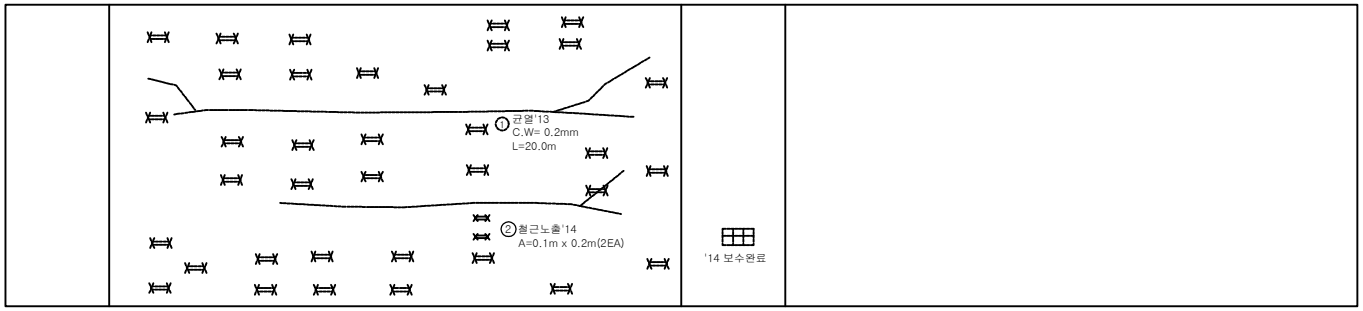

'14 보수완료

BOX B

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

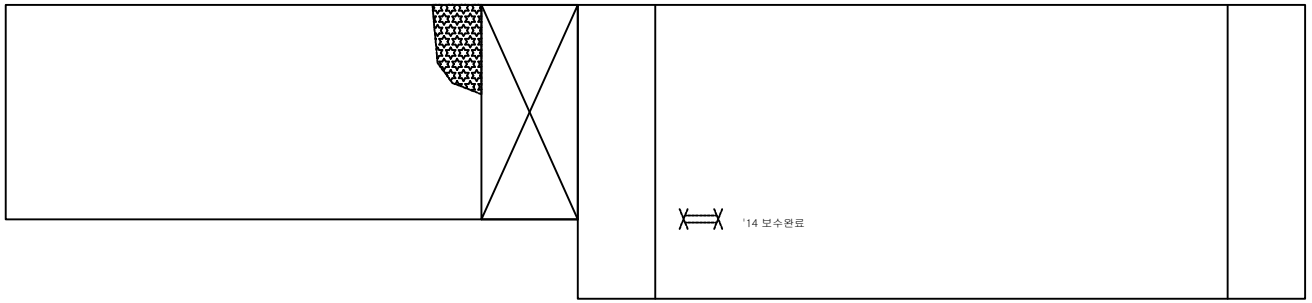

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량	
1	2013	균열	0.20	20.00		20.00	m	1			
2	2014	철근노출	0.10	0.20		0.04	㎡	2			중요

??? ??????	TITLE OF PROJECT 2017 ??? ???? ?? (?????)	TITLE OF SHIFT ??? ??????

가락 공동구 - 중대로(STA.340 m ~360 m) 통신구 구간





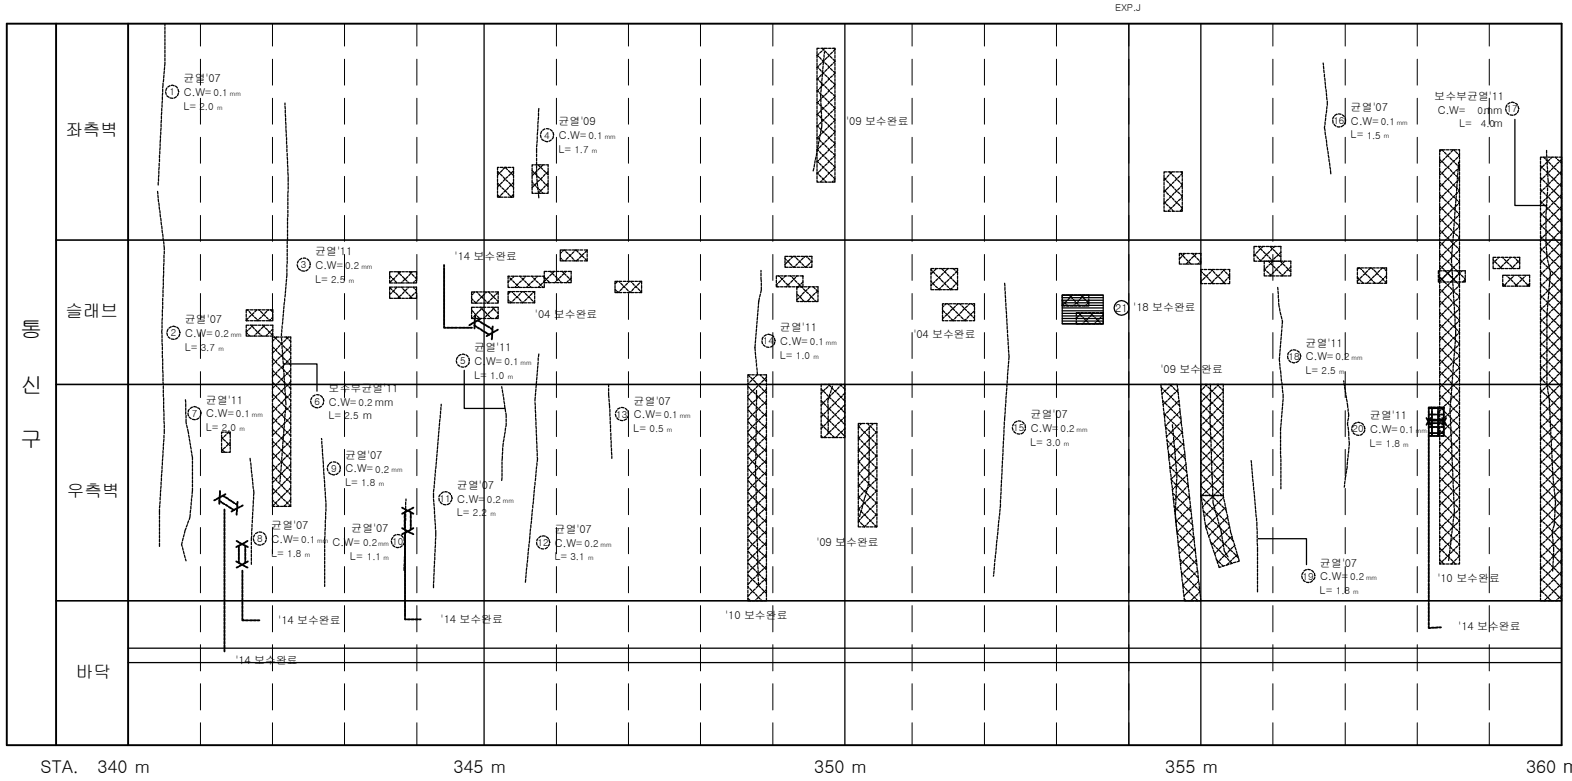

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량		
1	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
2	2007	균열	0.20	3.70		3.70	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
4	2011	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
5	2009	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
6	2011	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
7	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
8	2011	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
9	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
10	2007	균열	0.20	1.10		1.10	m	1				
11	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
12	2007	균열	0.20	3.10		3.10	m	1				
13	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
14	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
15	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
16	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
17	2011	보수부균열	0.10	4.00		4.00	m	1				재균열
18	2011	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
19	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
20	2011	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
21	2017	보수부들뜸	0.10	0.20		0.04	㎡	2	2018	단면복구공법	0.05	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.360 m ~380 m) 통신구 구간





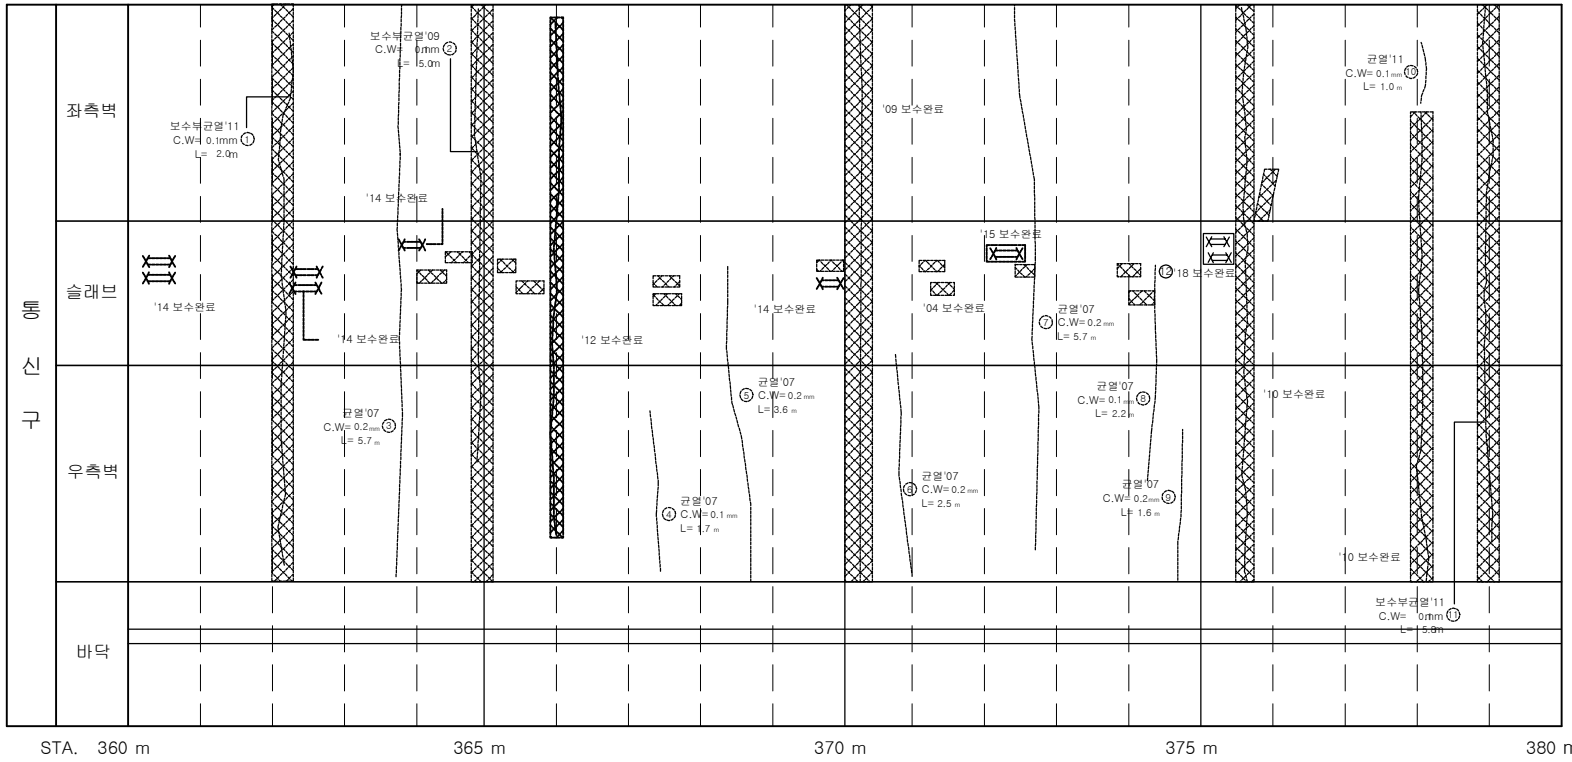

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량		
1	2011	보수부균열	0.10	2.00		2.00	m	1				해결함
2	2009	보수부균열	0.10	5.00		5.00	m	1				해결함
3	2007	균열	0.20	5.70		5.70	m	1				
4	2007	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
5	2007	균열	0.20	3.60		3.60	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
7	2007	균열	0.20	5.70		5.70	m	1				
8	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
9	2007	균열	0.20	1.60		1.60	m	1				
10	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
11	2011	보수부균열	0.10	5.00		5.00	m	1				해결함
12	2015	철근노출	0.10	0.10		0.02	㎡	2	2018	단면복구(방청	0.02	중요

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.380 m ~400 m) 통신구 구간





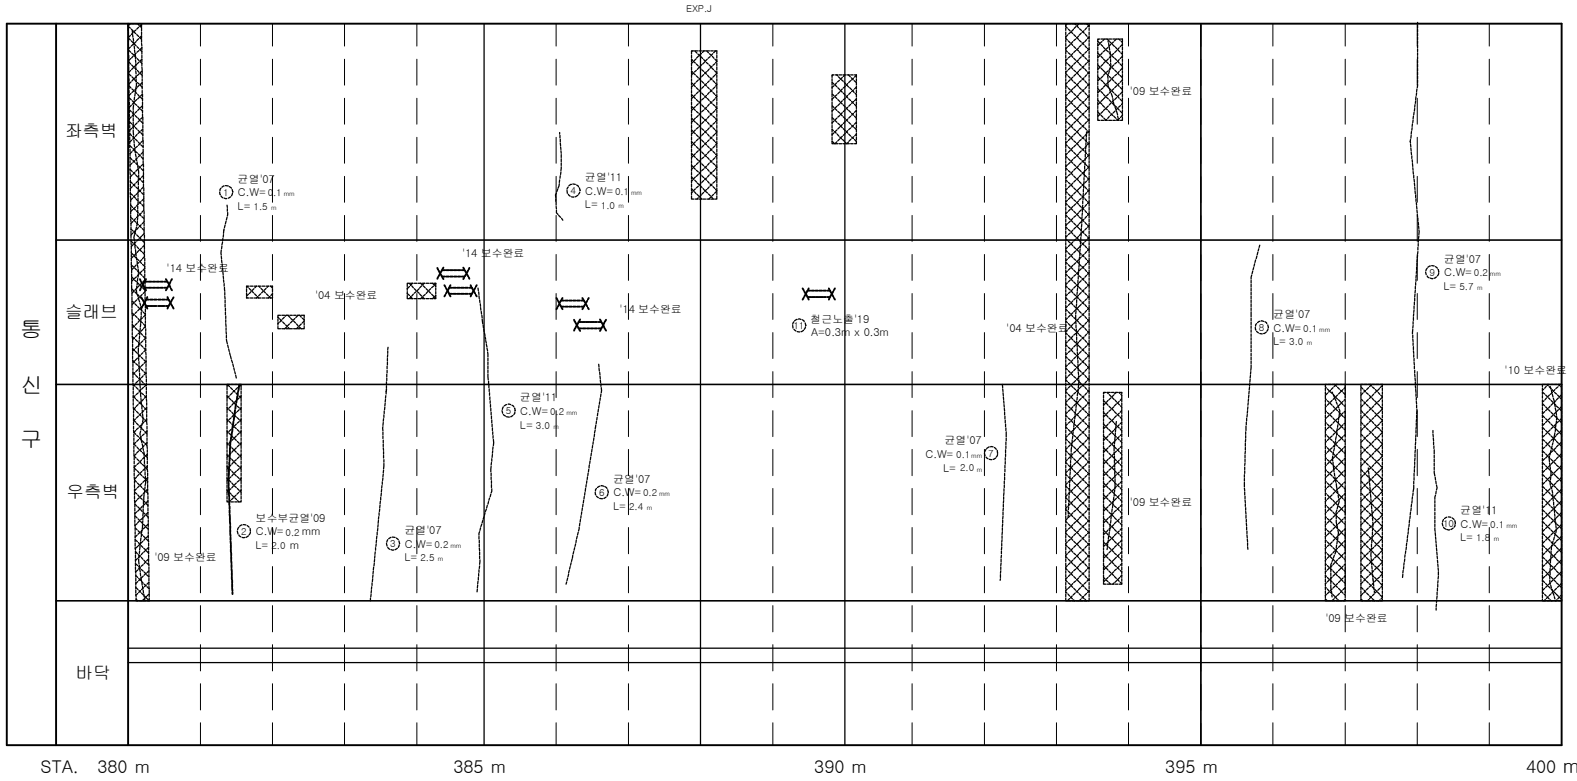

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	종량	
1	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
2	2009	보수부균열	0.20	2.00		2.00	m	1				재결함
3	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
4	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
5	2011	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
7	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
8	2007	균열	0.10	3.00		3.00	m	1				
9	2007	균열	0.20	5.70		5.70	m	1				
10	2011	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
11	2019	철근노출	0.30	0.30		0.09	㎡	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.400 m ~420 m) 통신구 구간





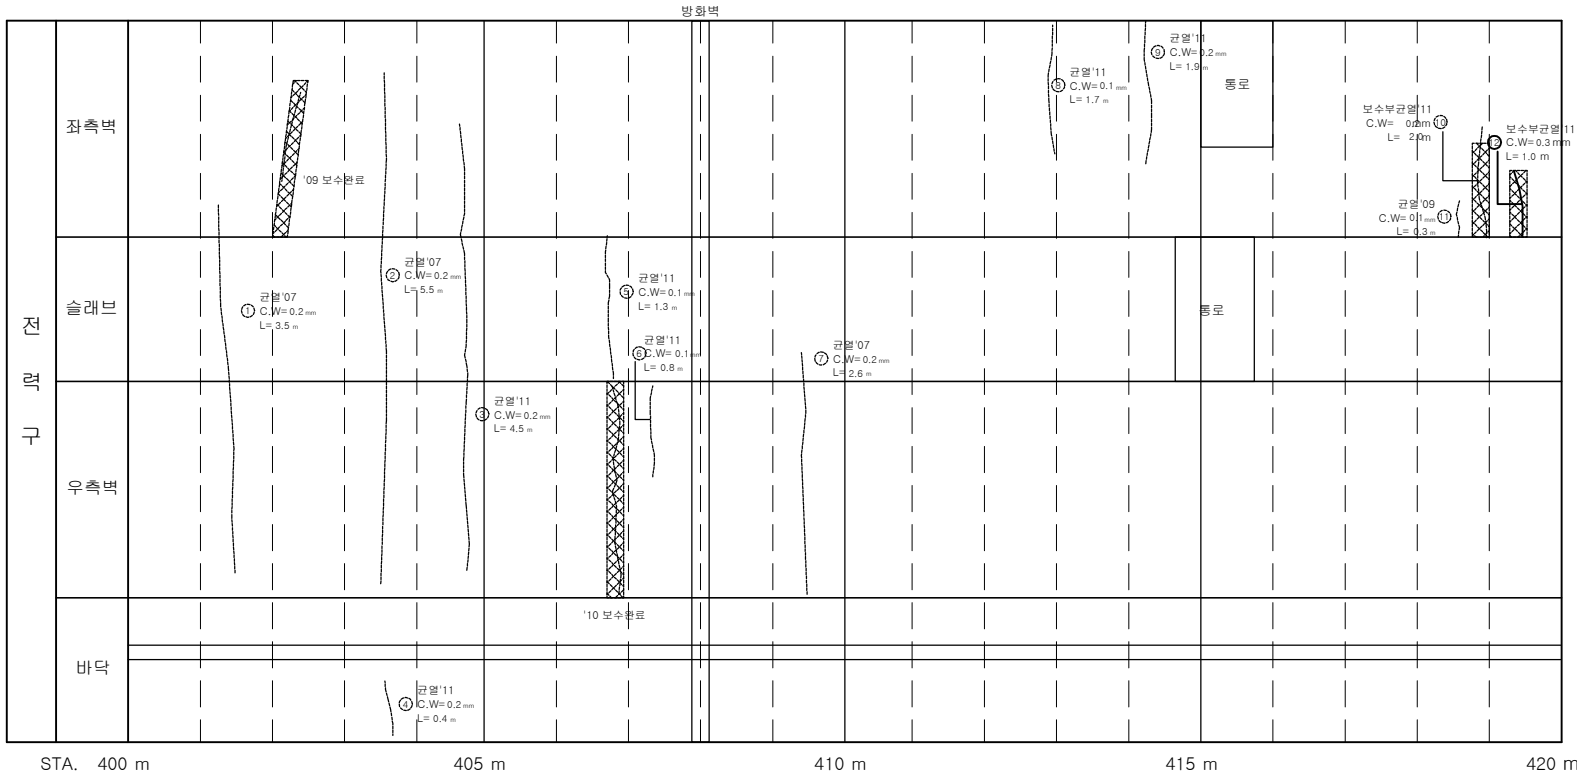

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1			
2	2007	균열	0.20	5.50		5.50	m	1			
3	2011	균열	0.20	4.50		4.50	m	1			
4	2011	균열	0.20	0.40		0.40	m	1			
5	2011	균열	0.10	1.30		1.30	m	1			
6	2011	균열	0.10	0.80		0.80	m	1			
7	2007	균열	0.20	2.60		2.60	m	1			
8	2011	균열	0.10	1.70		1.70	m	1			
9	2011	균열	0.20	1.90		1.90	m	1			
10	2011	보수부균열	0.20	2.00		2.00	m	1			재결함
11	2009	균열	0.10	0.30		0.30	m	1			
12	2011	보수부균열	0.30	1.00		1.00	m	1			재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.420 m ~440 m) 통신구 구간





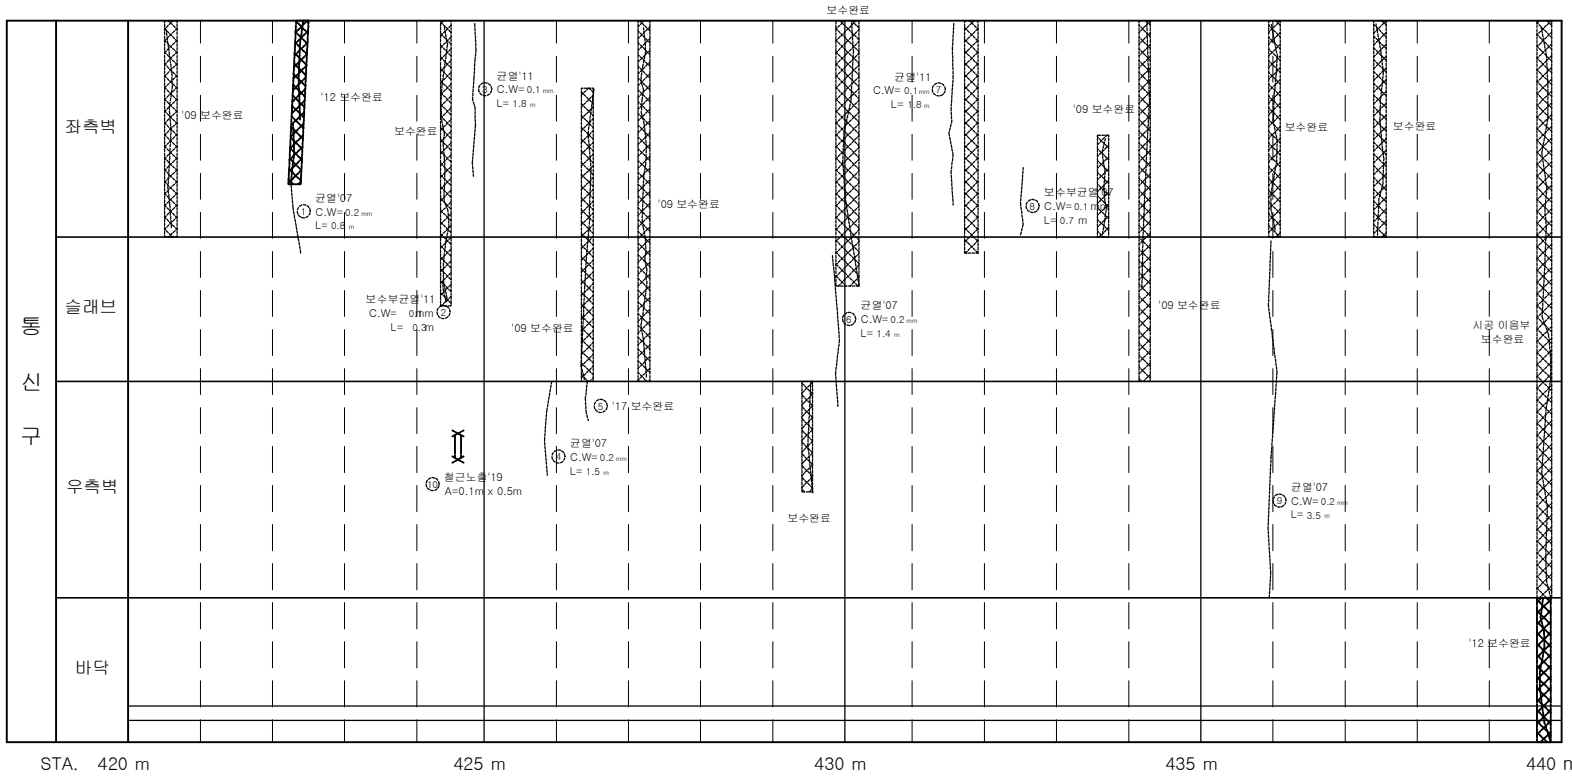

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량		
1	2007	균열	0.20	0.80		0.80	m	1				
2	2011	보수부균열	0.10	0.30		0.30	m	1				재결함
3	2011	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
4	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
5	2011	균열	0.10	0.20		0.20	m	1	2017	표면처리공법	0.24	
6	2007	균열	0.20	1.40		1.40	m	1				
7	2011	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
8	2007	보수부균열	0.10	0.70		0.70	m	1				재결함
9	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
10	2019	철근노출	0.10	0.50		0.05	㎡	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.440 m ~460 m) 통신구 구간





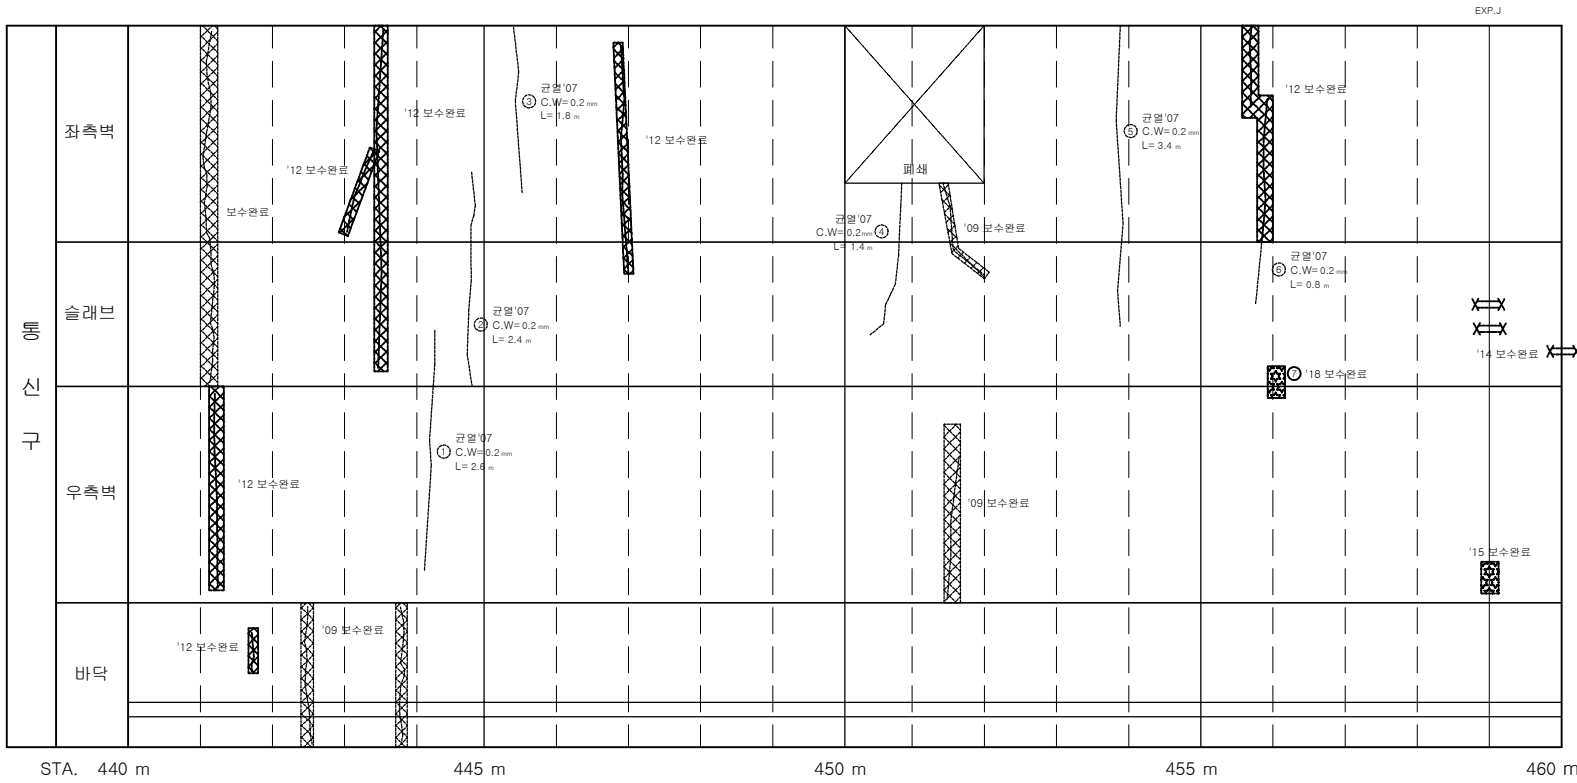

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2007	균열	0.20	2.60		2.60	m	1				
2	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
3	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
4	2007	균열	0.20	1.40		1.40	m	1				
5	2007	균열	0.20	3.40		3.40	m	1				
6	2007	균열	0.20	0.80		0.80	m	1				
7	2009	박태	0.10	0.20		0.02	㎡	1	2018	표면처리공법	0.02	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.460 m ~480 m) 통신구 구간





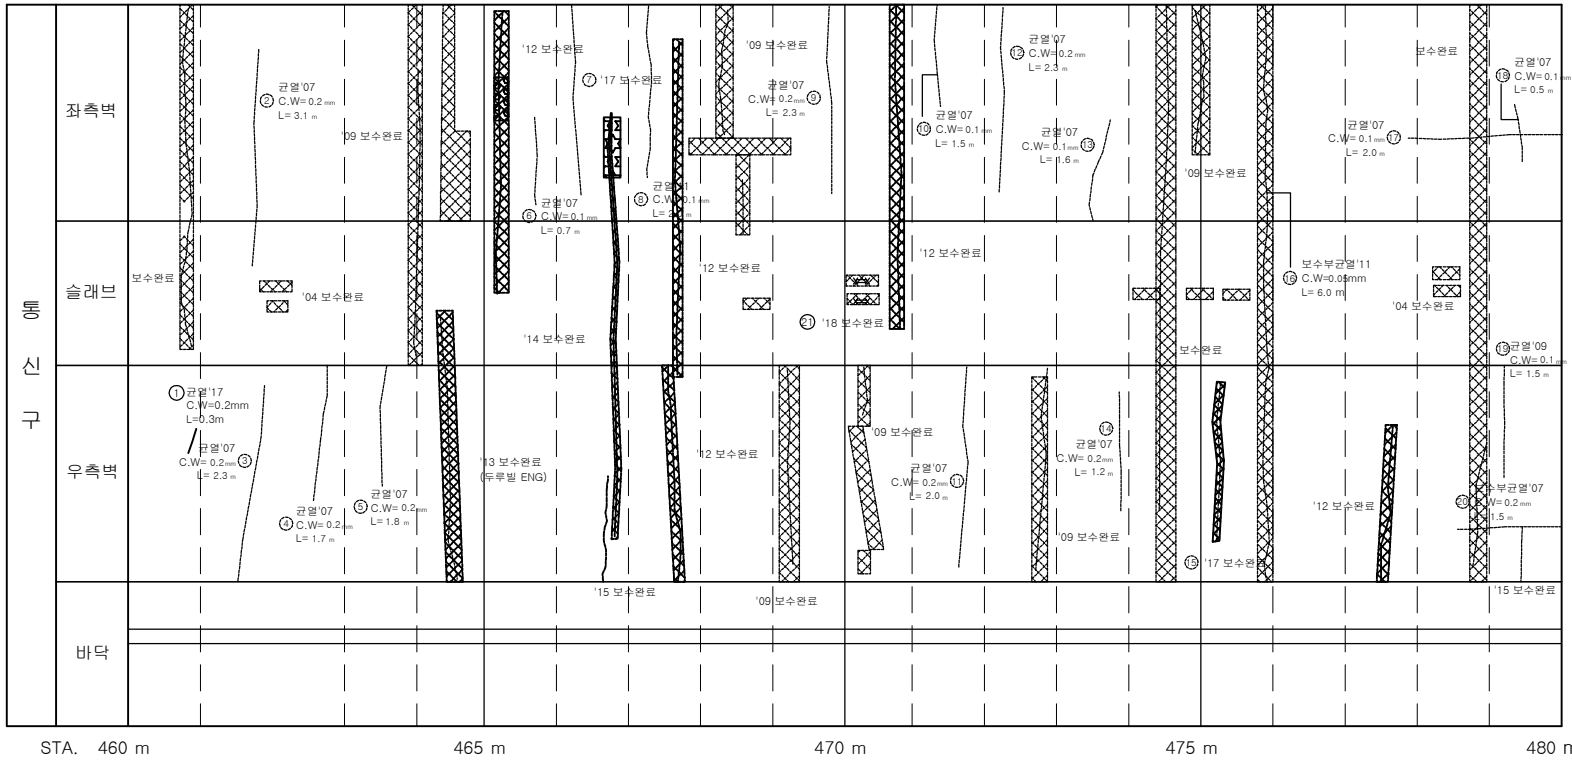

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2017	균열	0.20	0.30		0.30	m	1				
2	2007	균열	0.20	3.10		3.10	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
4	2007	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
5	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
6	2007	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
7	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1	2017	표면처리공법	2.40	
8	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
9	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
10	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
11	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
12	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
13	2007	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
14	2007	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
15	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1	2017	표면처리공법	2.16	
16	2011	균열	0.10	6.00		6.00	m	1				
17	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
18	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
19	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
20	2007	보수부균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
21	2017	철근노출	0.10	0.10		0.02	㎡	2	2018	단면복구(방청)	0.02	종요

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.480 m ~500 m) 통신구 구간





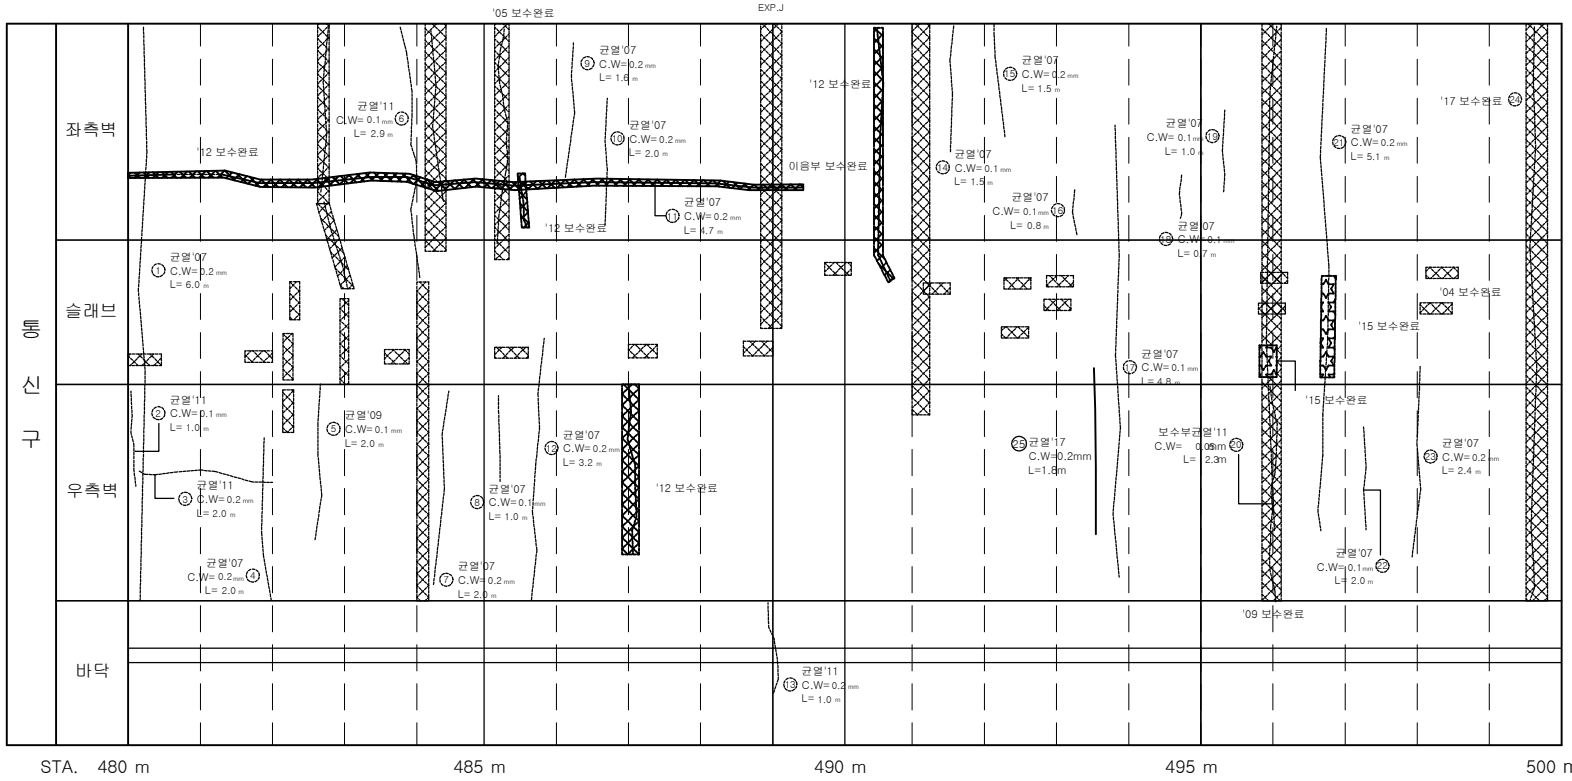

손 상 물 량 표

연번	점검년도	점검내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	중량	
1	2007	균열	0.20	6.00		6.00	m	1			
2	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1			
3	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1			
4	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1			
5	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1			
6	2011	균열	0.10	2.90		2.90	m	1			
7	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1			
8	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1			
9	2007	균열	0.20	1.60		1.60	m	1			
10	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1			
11	2007	균열	0.20	4.70		4.70	m	1			
12	2007	균열	0.20	3.20		3.20	m	1			
13	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1			
14	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1			
15	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1			
16	2007	균열	0.10	0.80		0.80	m	1			
17	2007	균열	0.10	4.80		4.80	m	1			
18	2007	균열	0.10	0.70		0.70	m	1			
19	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1			
20	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1			
21	2009	균열	0.20	5.10		5.10	m	1			
22	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1			
23	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1			
24	2011	보수부균열	0.10	6.00		6.00	m	1	2017 표면처리공법	7.20	
25	2017	균열	0.20	1.80		1.80	m	1			

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.500 m ~520 m) 통신구 구간





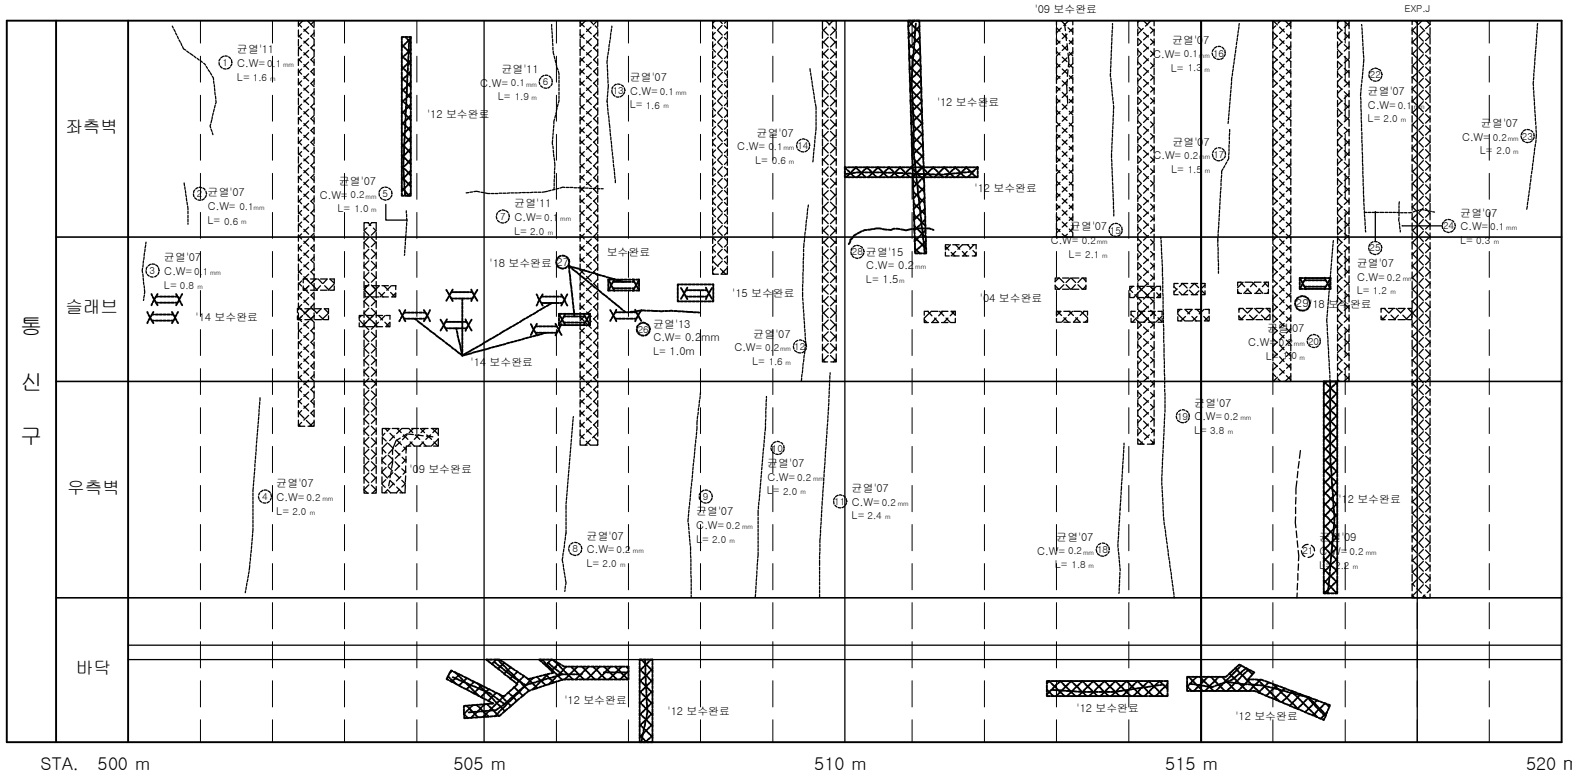

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2011	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
2	2007	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
3	2007	균열	0.10	0.80		0.80	m	1				
4	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
5	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
6	2011	균열	0.10	1.90		1.90	m	1				
7	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
9	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
10	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
11	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
12	2007	균열	0.20	1.60		1.60	m	1				
13	2007	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
14	2007	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
15	2007	균열	0.20	2.10		2.10	m	1				
16	2007	균열	0.10	1.30		1.30	m	1				
17	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
18	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
19	2007	균열	0.20	3.80		3.80	m	1				
20	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
21	2009	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
22	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
23	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
24	2007	균열	0.10	0.30		0.30	m	1				
25	2007	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
26	2013	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
27	2015	철근노출	0.10	0.20		0.06	㎡	3	2018	단면복구(방청)	0.07	중요
28	2015	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
29	2017	철근노출	0.10	0.30		0.03	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.04	중요

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 -중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.520 m ~540 m) 통신구 구간





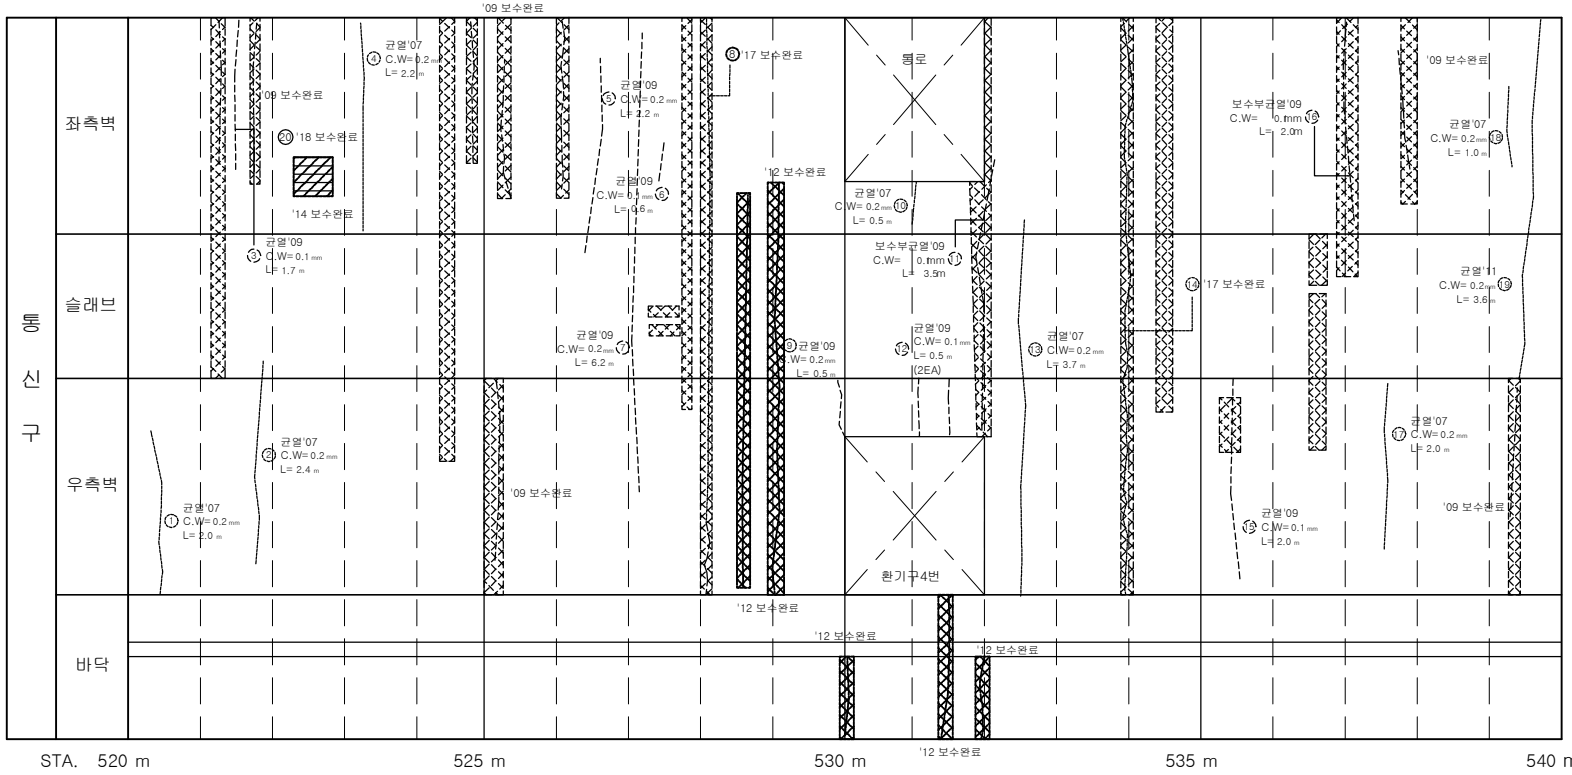

손 상 물 량 표

연번	점용년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
2	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
3	2009	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
4	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
5	2009	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
6	2009	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
7	2009	균열	0.20	6.20		6.20	m	1				
8	2009	균열	0.10	6.00		6.00	m	1	2017	표면처리공법	7.20	
9	2009	균열	0.20	0.50		0.50	m	1				
10	2007	균열	0.20	0.50		0.50	m	1				
11	2009	보수부균열	0.10	3.50		3.50	m	1				재결함
12	2009	균열	0.10	0.50		0.10	m	2				
13	2007	균열	0.20	3.70		3.70	m	1				
14	2009	균열	0.10	6.00		6.00	m	1	2017	표면처리공법	7.20	
15	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
16	2009	보수부균열	0.10	2.00		2.00	m	1				재결함
17	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
18	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
19	2011	균열	0.20	3.60		3.60	m	1				
20	2017	보수부들뜸	0.30	0.30		0.09	㎡	1	2018	단면복구공법	0.11	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -중대로 외관조사망도

가락공동구 - 중대로(STA.531m)환기구 4번



BOX A

① 좌측벽 ② 슬래브 ③ 우측벽 ④ 바닥

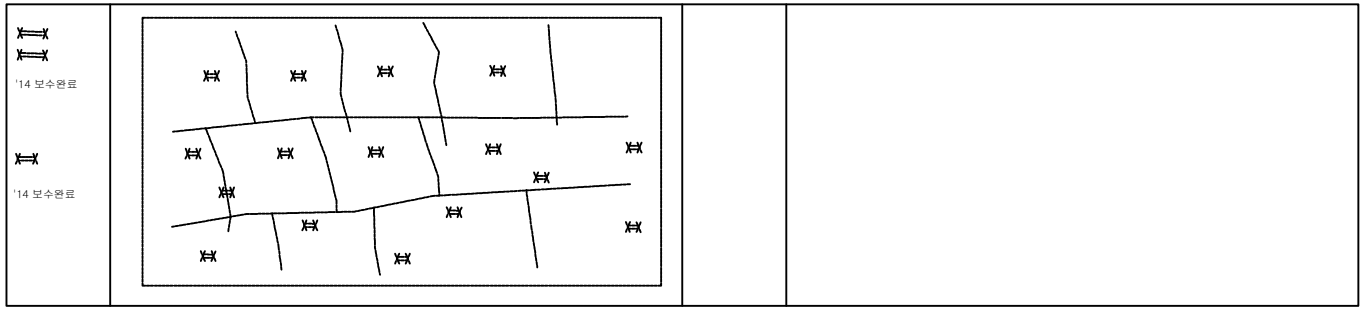

BOX B



손 상 물 량 표

연번	적용 범위	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 환기구 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.540 m ~560 m) 통신구 구간





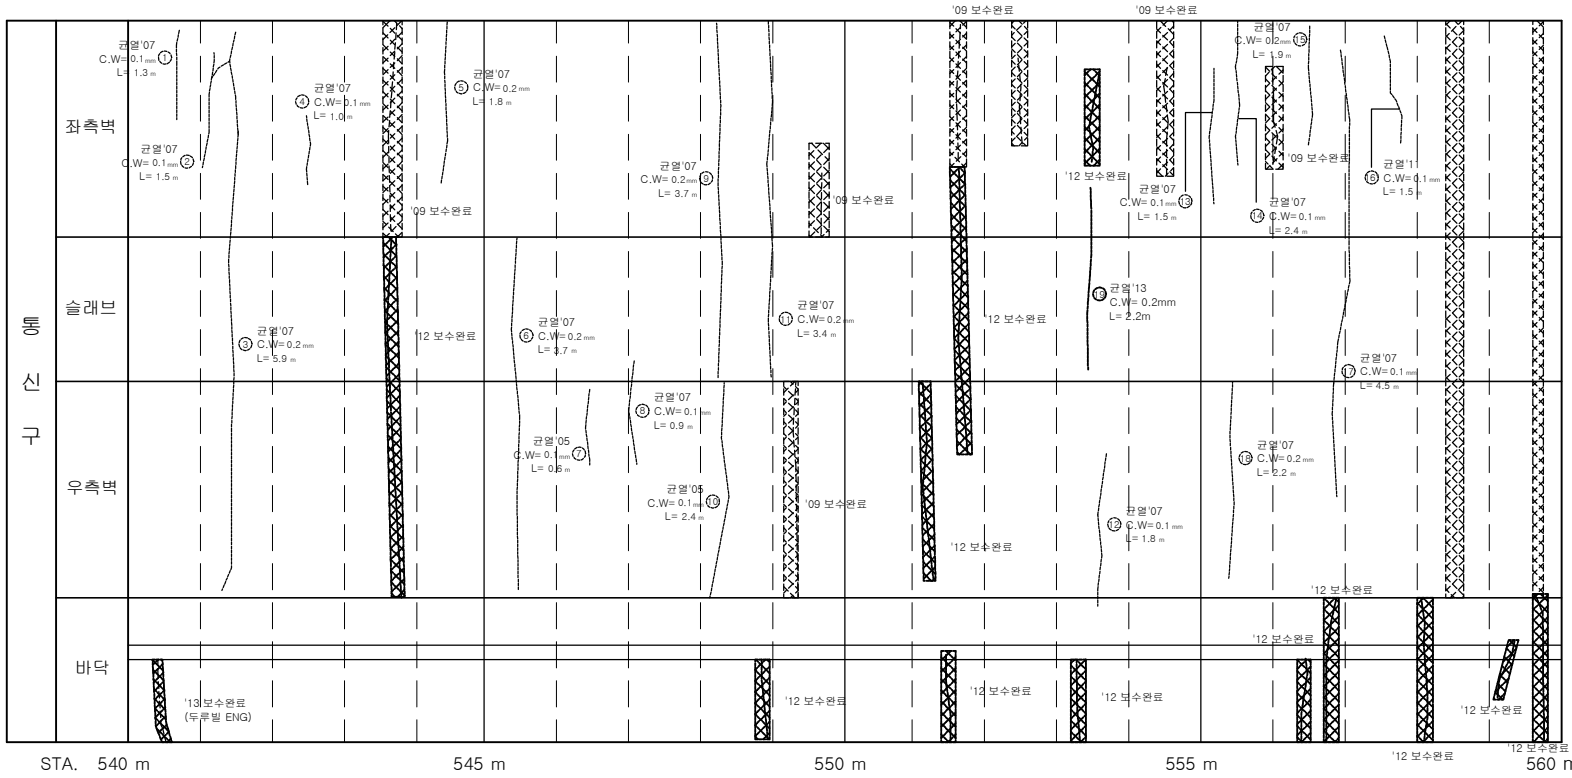

손 상 물 량 표

번호	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.10	1.30		1.30	m	1				
2	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
3	2007	균열	0.20	5.90		5.90	m	1				
4	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
5	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
6	2007	균열	0.20	3.70		3.70	m	1				
7	2005	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
8	2007	균열	0.10	0.90		0.90	m	1				
9	2007	균열	0.20	3.70		3.70	m	1				
10	2005	균열	0.10	2.40		2.40	m	1				
11	2007	균열	0.20	3.40		3.40	m	1				
12	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
13	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
14	2007	균열	0.10	2.40		2.40	m	1				
15	2007	균열	0.20	1.90		1.90	m	1				
16	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
17	2007	균열	0.10	4.50		4.50	m	1				
18	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
19	2013	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.560 m ~580 m) 통신구 구간





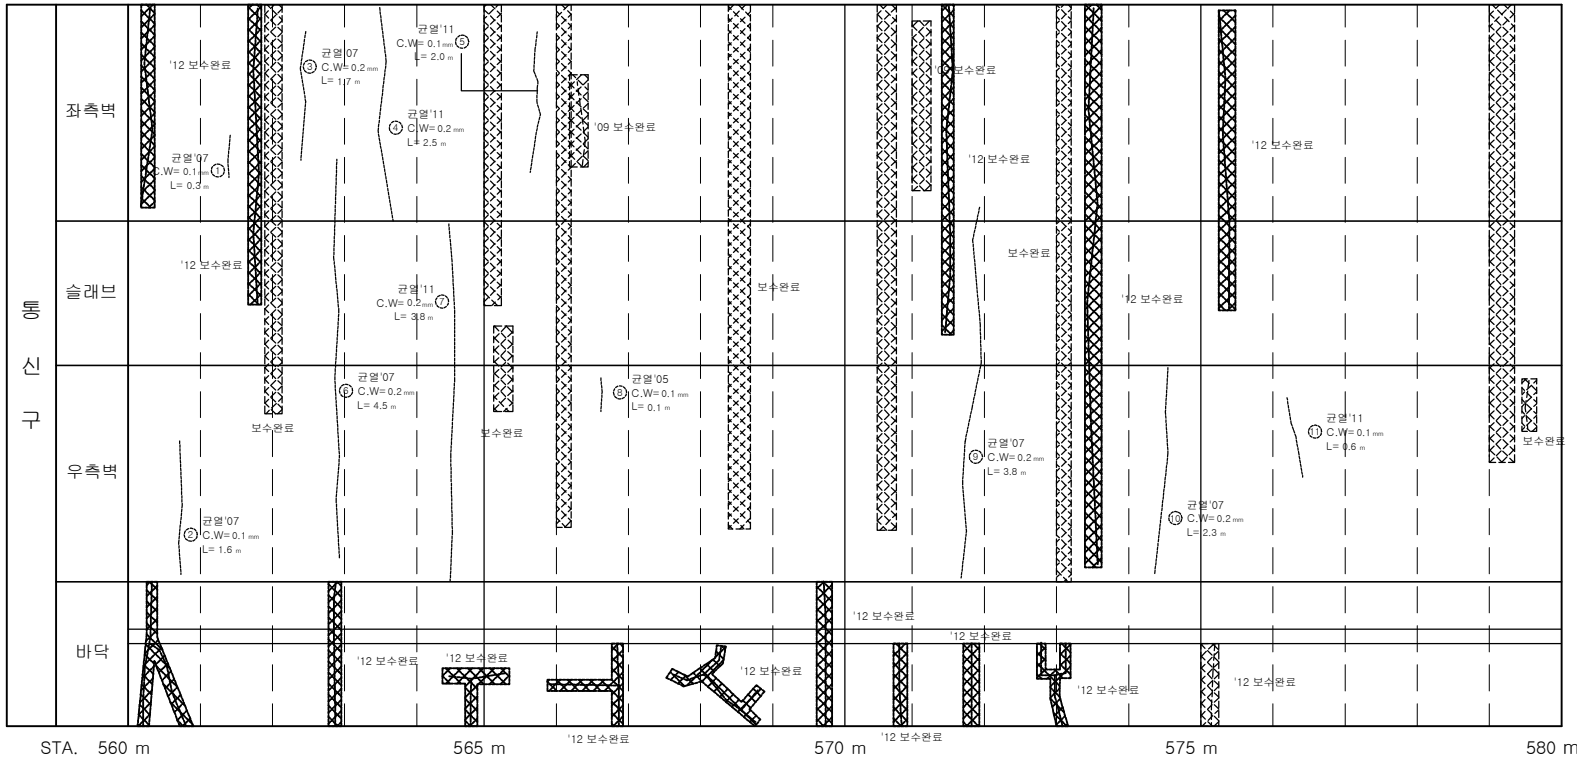

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.10	0.30		0.30	m	1			
2	2007	균열	0.10	1.60		1.60	m	1			
3	2007	균열	0.20	1.70		1.70	m	1			
4	2011	균열	0.20	2.50		2.50	m	1			
5	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1			
6	2007	균열	0.20	4.50		4.50	m	1			
7	2011	균열	0.20	3.80		3.80	m	1			
8	2005	균열	0.10	0.10		0.10	m	1			
9	2007	균열	0.20	3.80		3.80	m	1			
10	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1			
11	2011	균열	0.10	0.60		0.60	m	1			

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.580 m ~600 m) 통신구 구간





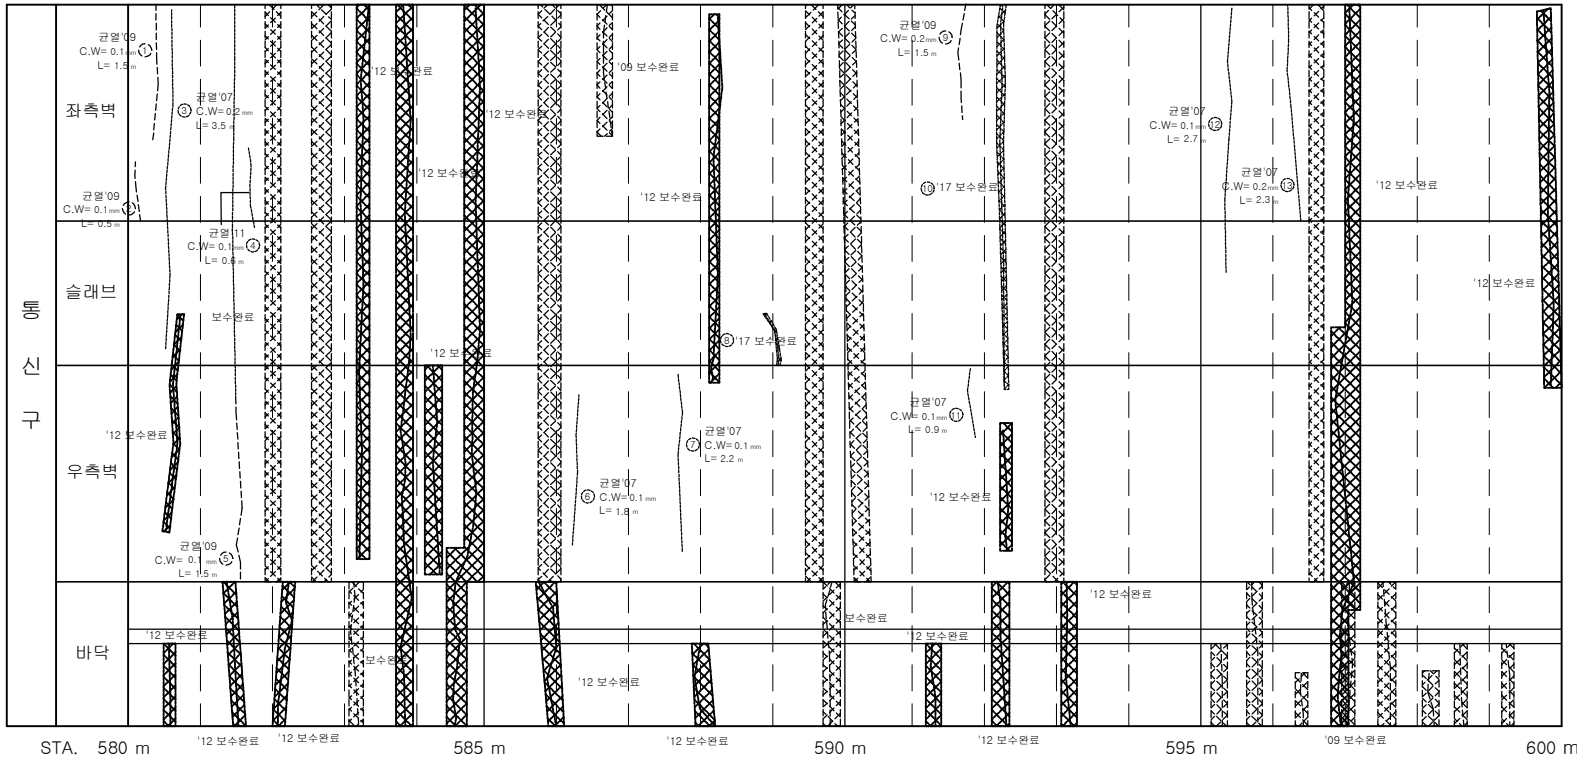

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
2	2009	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
3	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
4	2011	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
5	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
6	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
7	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
8	2009	균열	0.10	0.50		0.50	m	1	2017	표면처리공법	0.60	
9	2009	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
10	2009	균열	0.10	4.50		4.50	m	1	2017	표면처리공법	5.40	
11	2007	균열	0.10	0.90		0.90	m	1				
12	2007	균열	0.10	2.70		2.70	m	1				
13	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.600 m ~620 m) 통신구 구간





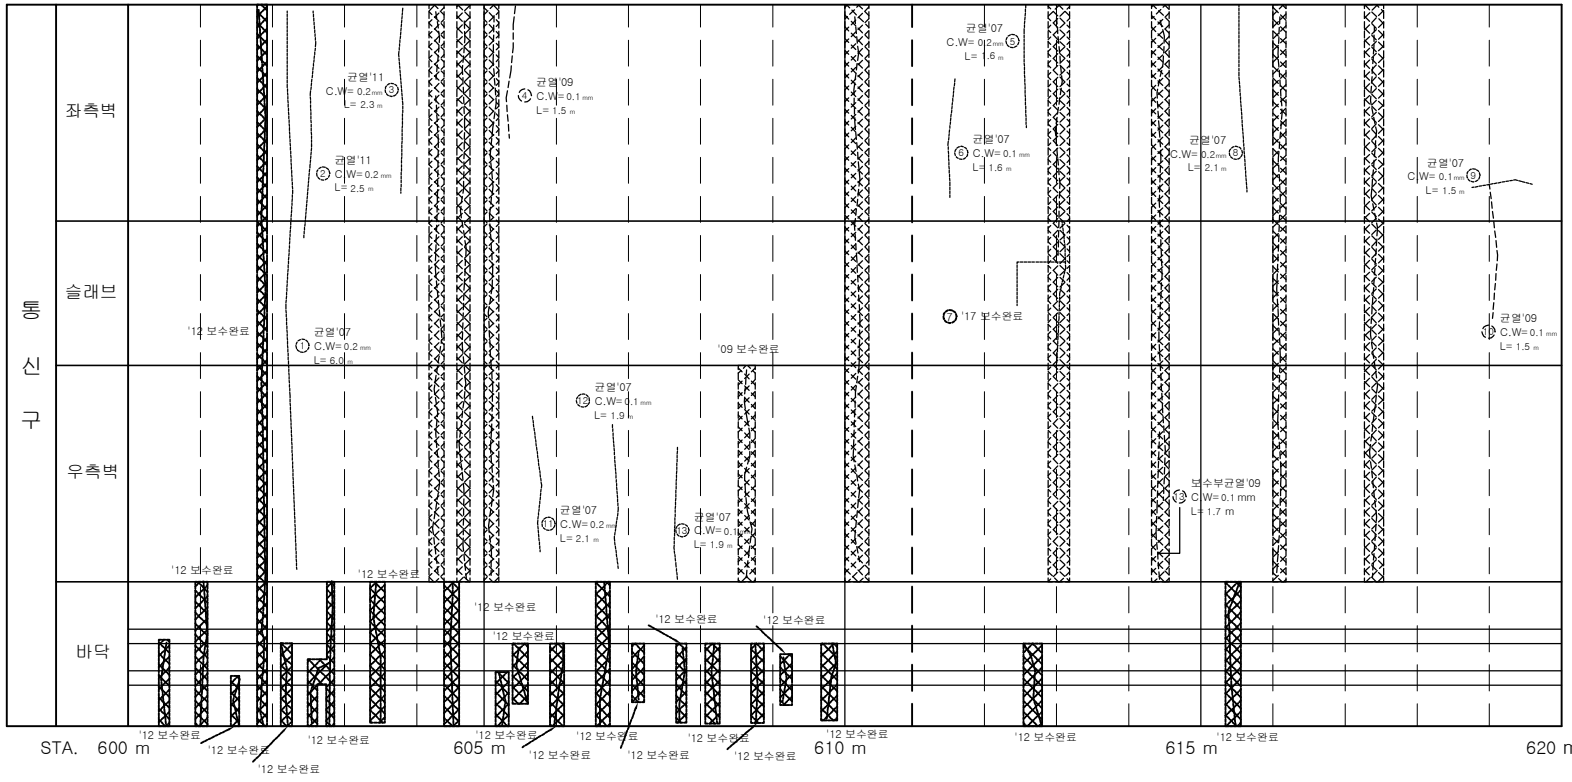

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
2	2011	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
3	2011	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
4	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
5	2007	균열	0.20	1.60		1.60	m	1				
6	2007	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
7	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1	2017	표면처리공법	1.80	
8	2007	균열	0.20	2.10		2.10	m	1				
9	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
10	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
11	2007	균열	0.20	2.10		2.10	m	1				
12	2007	균열	0.10	1.90		1.90	m	1				
13	2007	균열	0.10	1.90		1.90	m	1				
14	2009	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.620 m ~640 m) 통신구 구간





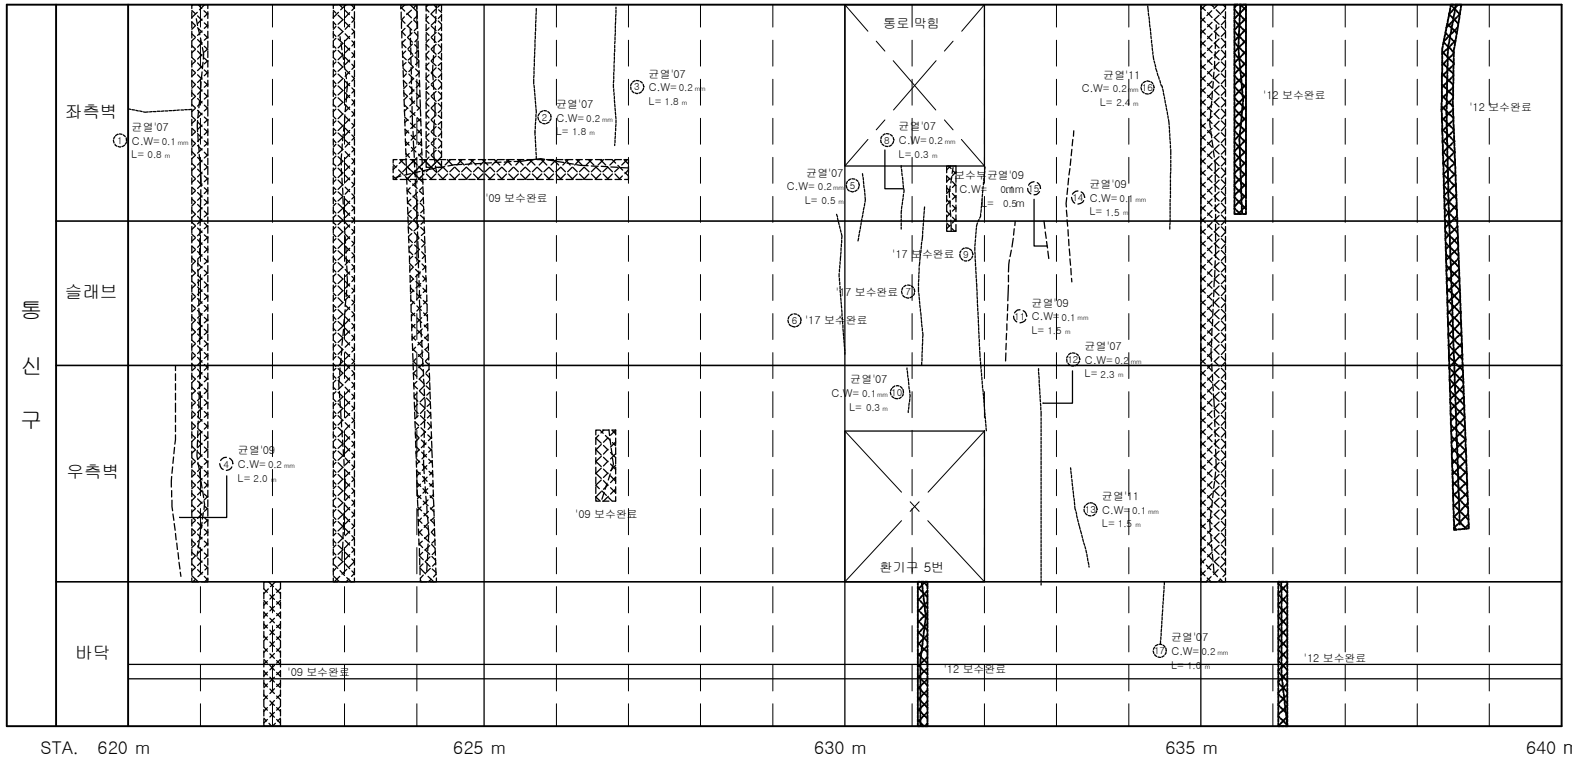

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2007	균열	0.10	0.80		0.80	m	1				
2	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
3	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
4	2009	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
5	2007	균열	0.20	0.50		0.50	m	1				
6	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1	2017	표면처리공법	1.80	
7	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1	2017	표면처리공법	1.80	
8	2007	균열	0.20	0.30		0.30	m	1				
9	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1	2017	표면처리공법	1.80	
10	2007	균열	0.10	0.30		0.30	m	1				
11	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
12	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
13	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
14	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
15	2009	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
16	2011	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
17	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -중대로 외관조사망도

가락공동구 - 중대로(STA.631m)환기구 5번

KEYPLAN



SECTION



BOX A

① 좌측벽 ② 슬래브 ③ 우측벽 ④ 바닥

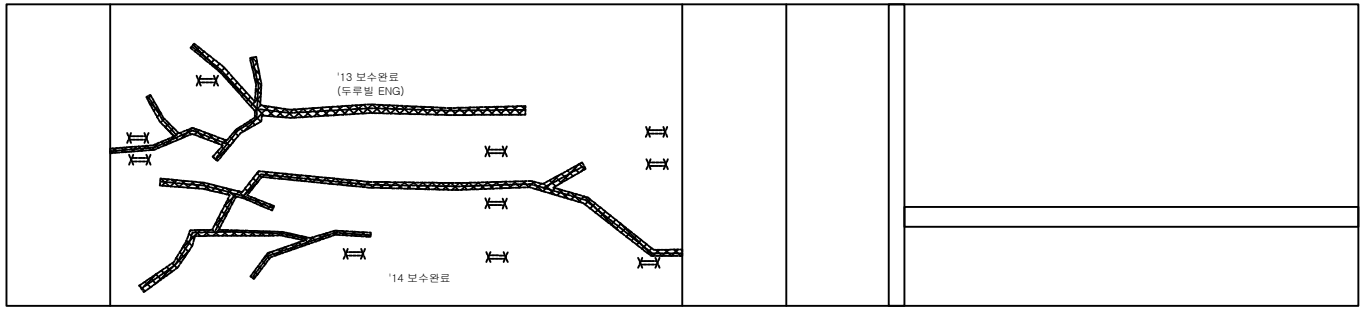

BOX B

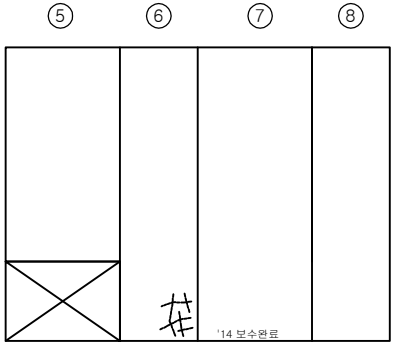

손 상 물 량 표

연번	적용 여부	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소보수년도	공법명/자재명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 환기구 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.640 m ~660 m) 통신구 구간





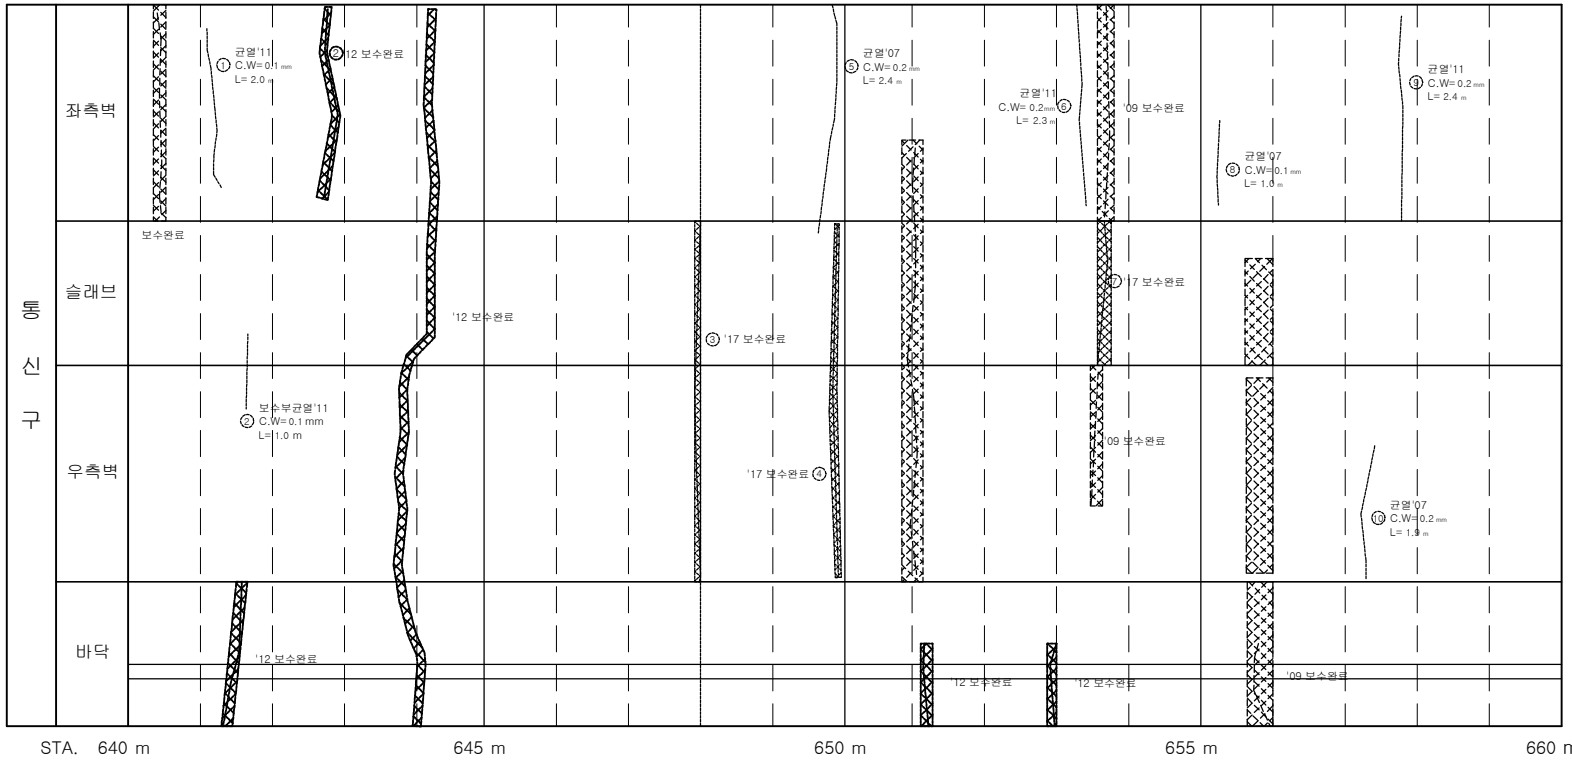

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
2	2011	보수부균열	0.10	1.00		1.00	m	1				재결함
3	2009	보수부균열	0.10	3.50		3.50	m	1	2017	표면처리공법	4.20	
4	2009	보수부균열	0.10	3.50		3.50	m	1	2017	표면처리공법	4.20	
5	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
6	2011	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
7	2011	보수부균열	0.10	1.50		1.50	m	1	2017	표면처리공법	1.80	
8	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
9	2011	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
10	2007	균열	0.20	1.90		1.90	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.660 m ~680 m) 통신구 구간





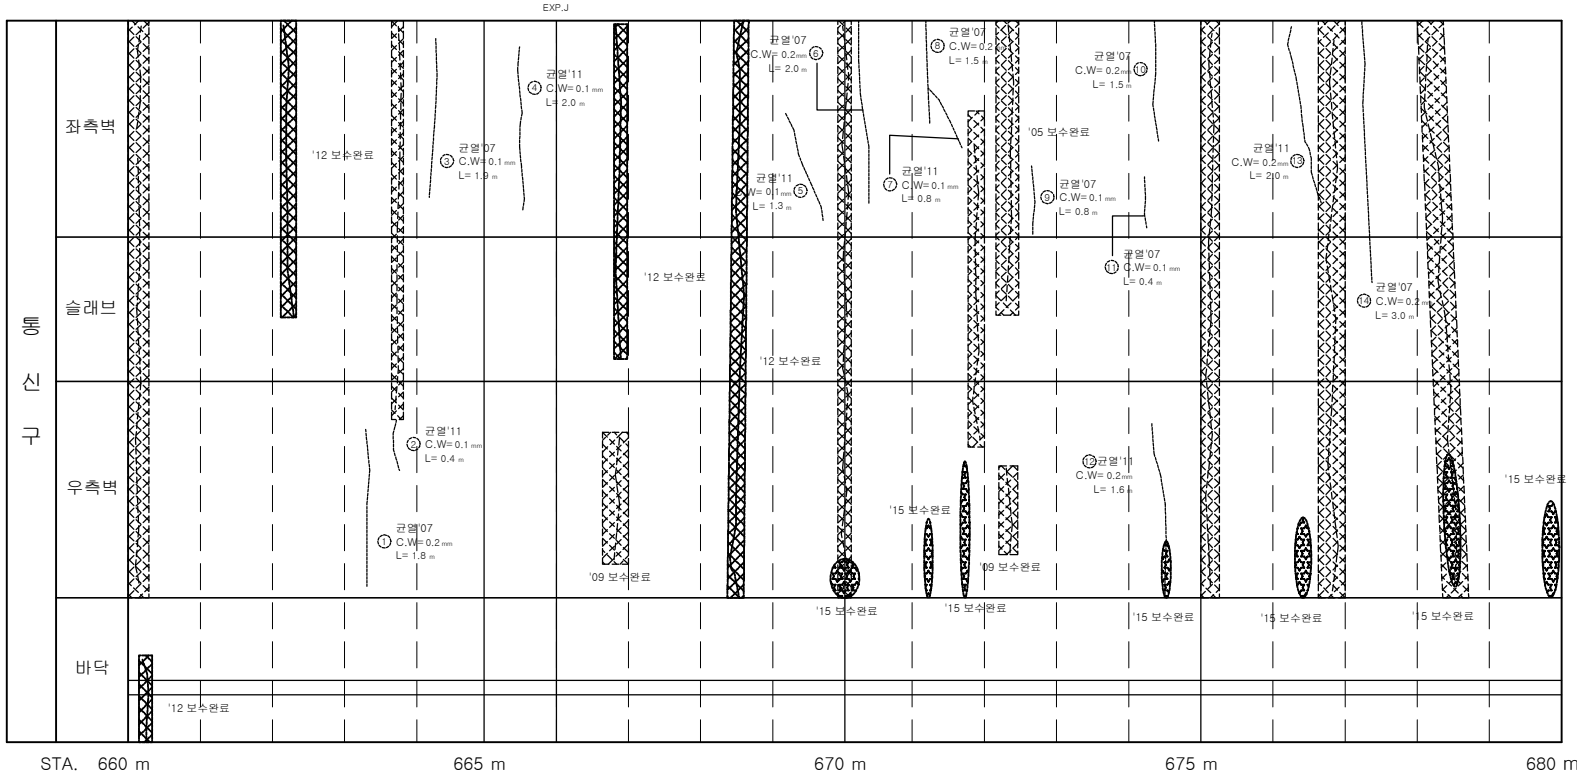

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량		
1	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
2	2011	균열	0.10	0.40		0.40	m	1				
3	2007	균열	0.10	1.90		1.90	m	1				
4	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
5	2011	균열	0.10	1.30		1.30	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
7	2011	균열	0.10	0.80		0.80	m	1				
8	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
9	2007	균열	0.10	0.80		0.80	m	1				
10	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
11	2007	균열	0.10	0.40		0.40	m	1				
12	2011	균열	0.20	1.60		1.60	m	1				
13	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
14	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.680 m ~700 m) 통신구 구간





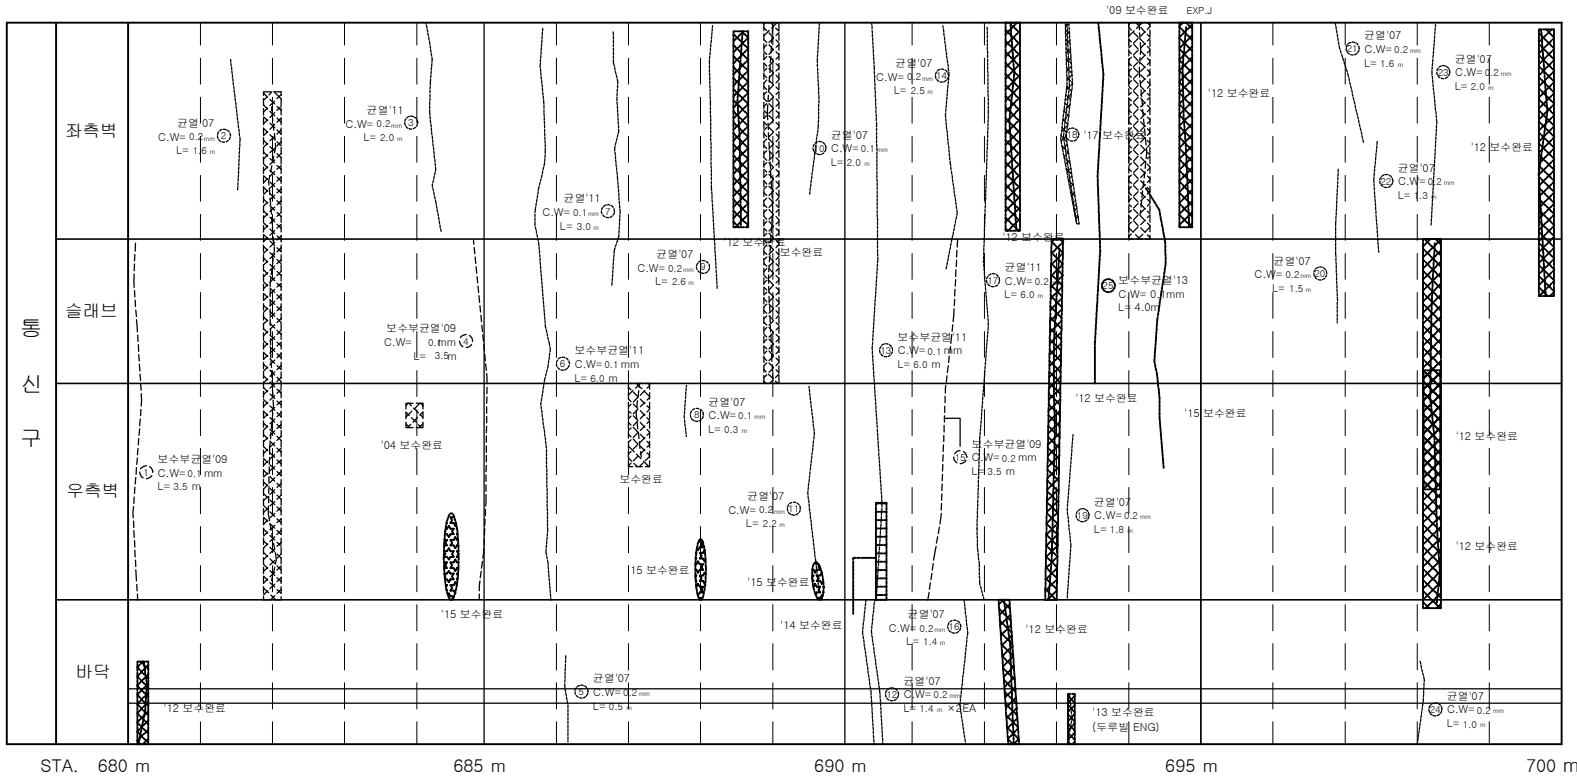

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2009	균열	0.10	3.50		3.50	m	1				
2	2007	균열	0.20	1.60		1.60	m	1				
3	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
4	2009	균열	0.10	3.50		3.50	m	1				
5	2007	균열	0.20	0.50		0.50	m	1				
6	2011	균열	0.10	6.00		6.00	m	1				
7	2011	균열	0.10	3.00		3.00	m	1				
8	2007	균열	0.10	0.30		0.30	m	1				
9	2007	균열	0.20	2.60		2.60	m	1				
10	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
11	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
12	2007	균열	0.20	2.80		5.60	m	2				
13	2011	균열	0.10	6.00		6.00	m	1				
14	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
15	2009	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
16	2007	균열	0.20	1.40		1.40	m	1				
17	2011	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
18	2007	균열	0.20	2.10		2.10	m	1	2017	표면처리공법	2.52	
19	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
20	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
21	2007	균열	0.20	1.60		1.60	m	1				
22	2007	균열	0.20	1.30		1.30	m	1				
23	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
24	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
25	2013	보수부균열	0.10	4.00		4.00	m	1				재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.700 m ~720 m) 통신구 구간





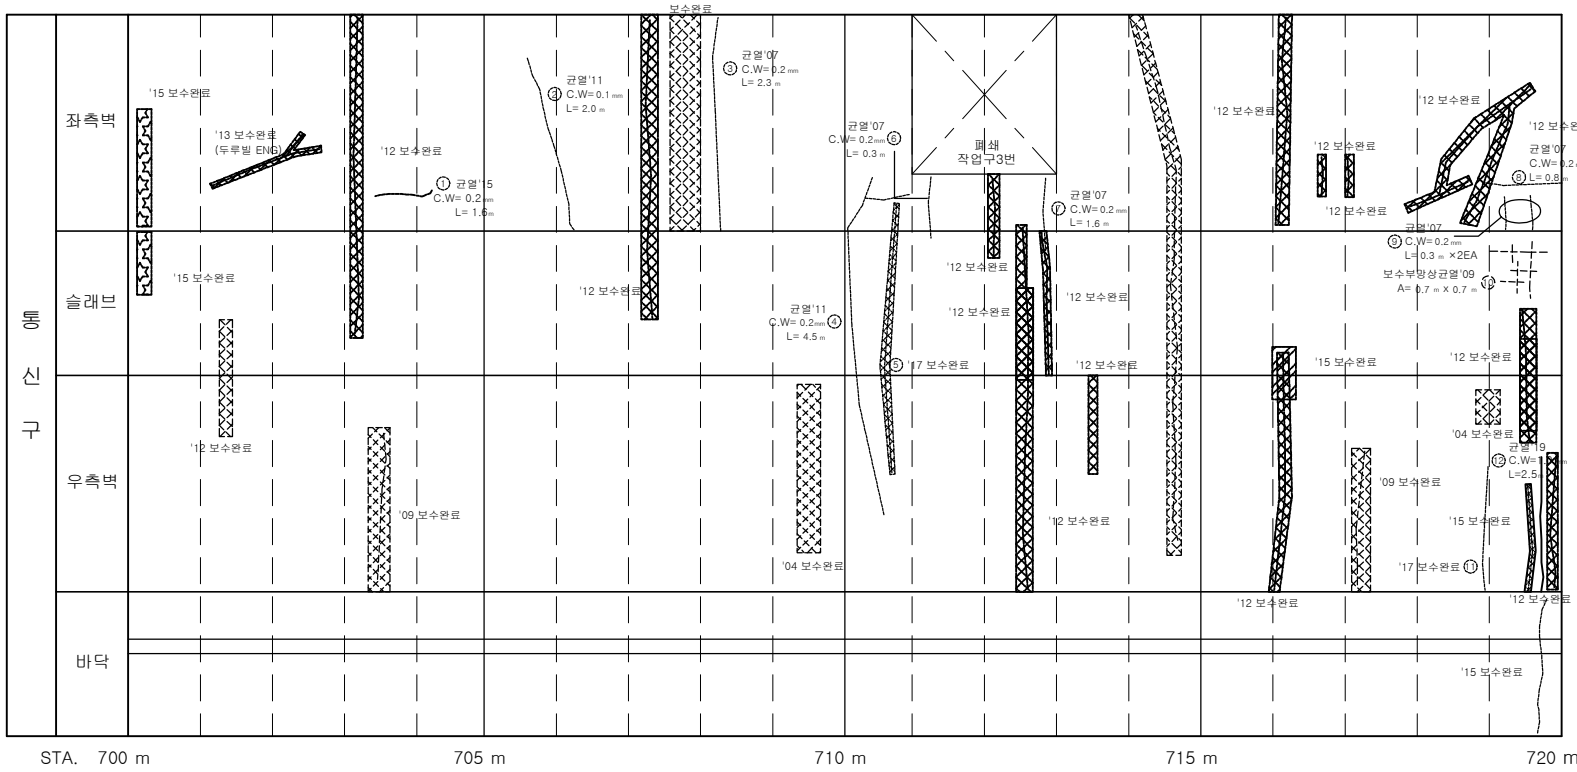

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2015	균열	0.20	1.60		1.60	m	1				
2	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
4	2011	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
5	2009	균열	0.10	2.80		2.80	m	1	2017	표면처리공법	3.36	
6	2007	균열	0.20	0.30		0.30	m	1				
7	2007	균열	0.20	1.60		1.60	m	1				
8	2007	균열	0.20	0.80		0.80	m	1				
9	2007	균열	0.20	0.60		1.20	m	2				
10	2009	보수부망상균열	0.70	0.70		0.49	㎡	1				재결함
11	2011	균열	1.00	1.80		1.80	m	1	2017	표면처리공법	2.16	
12	2019	균열	1.00	2.50		2.50	m	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.720 m ~740 m) 통신구 구간





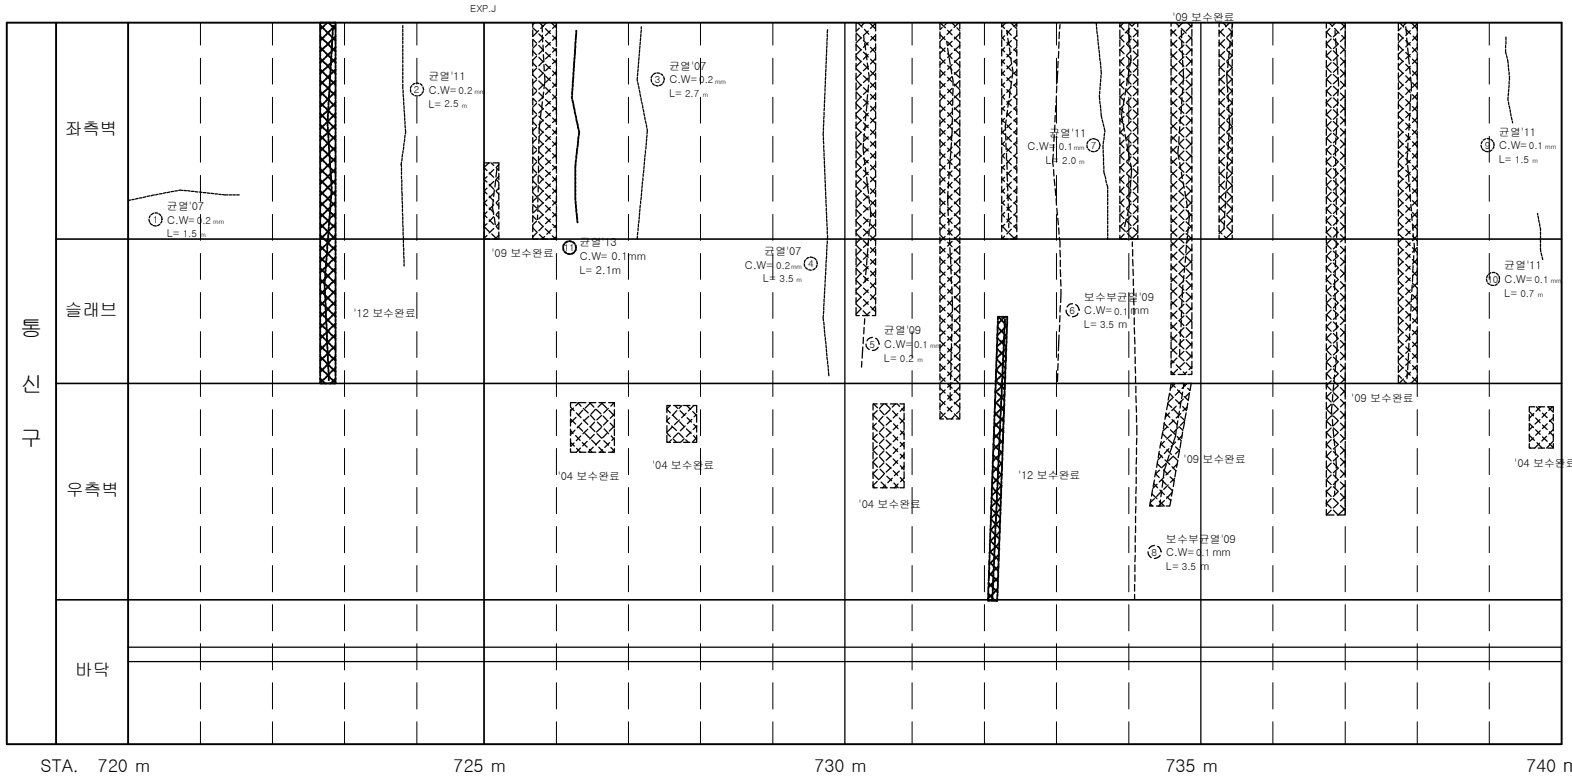

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
2	2011	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.70		2.70	m	1				
4	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
5	2009	균열	0.10	0.20		0.20	m	1				
6	2009	균열	0.10	3.50		3.50	m	1				
7	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
8	2009	균열	0.10	3.50		3.50	m	1				
9	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
10	2011	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
11	2013	균열	0.10	2.10		2.10	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.740 m ~760 m) 통신구 구간





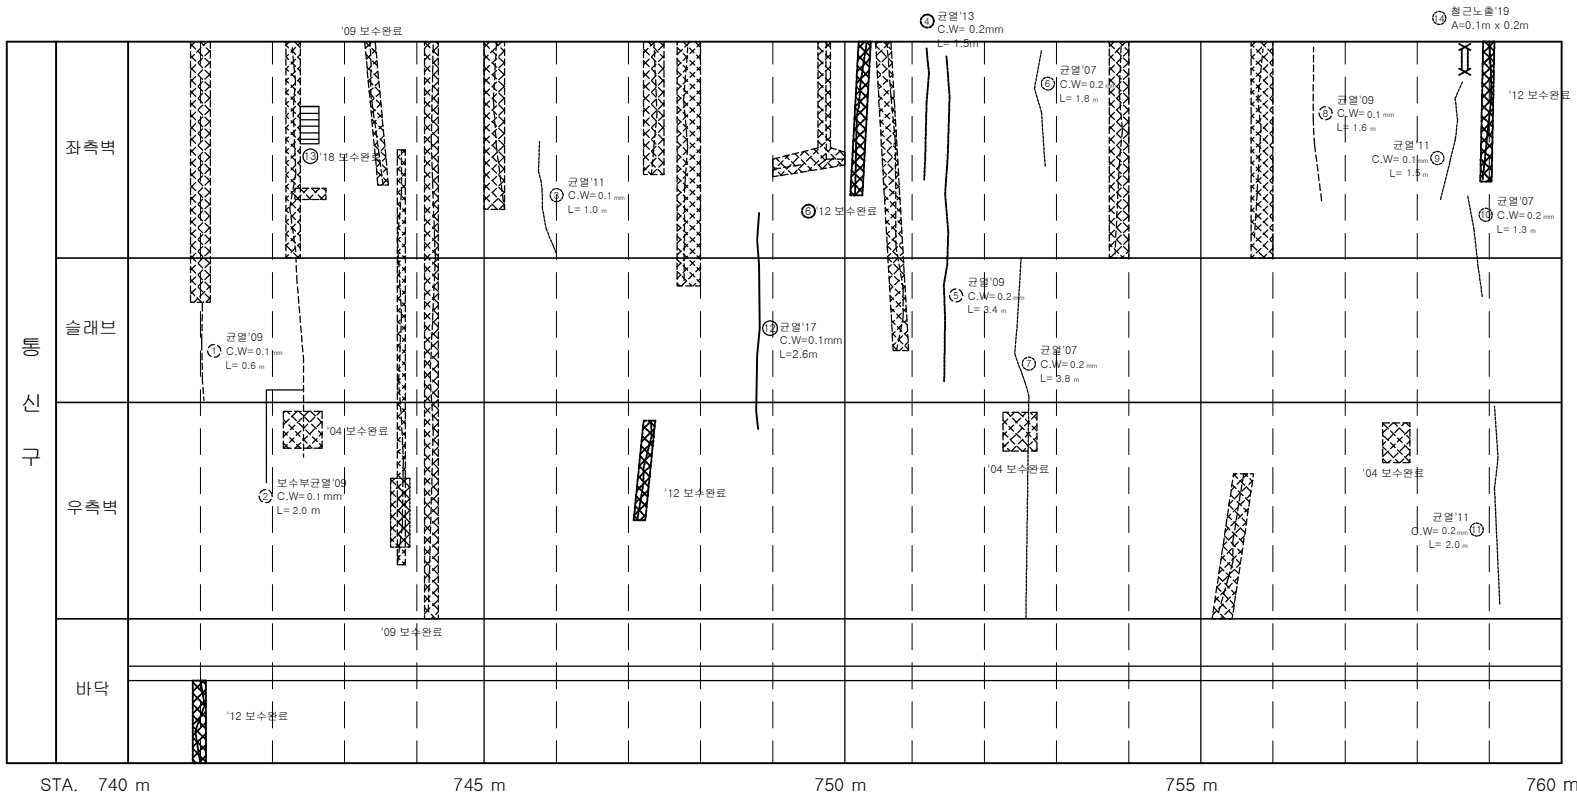

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2009	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
2	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
3	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
4	2013	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
5	2009	균열	0.20	3.40		3.40	m	1				
6	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
7	2007	균열	0.20	3.80		3.80	m	1				
8	2009	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
9	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
10	2007	균열	0.20	1.30		1.30	m	1				
11	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
12	2017	균열	0.10	2.60		2.60	m	1				
13	2017	보수부들뜸	0.10	0.30		0.03	㎡	1	2018	단면복구공법	0.04	
14	2019	철근노출	0.10	0.20		0.02	㎡	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.760 m ~780 m) 통신구 구간

KEYPLAN



SECTION 8-8



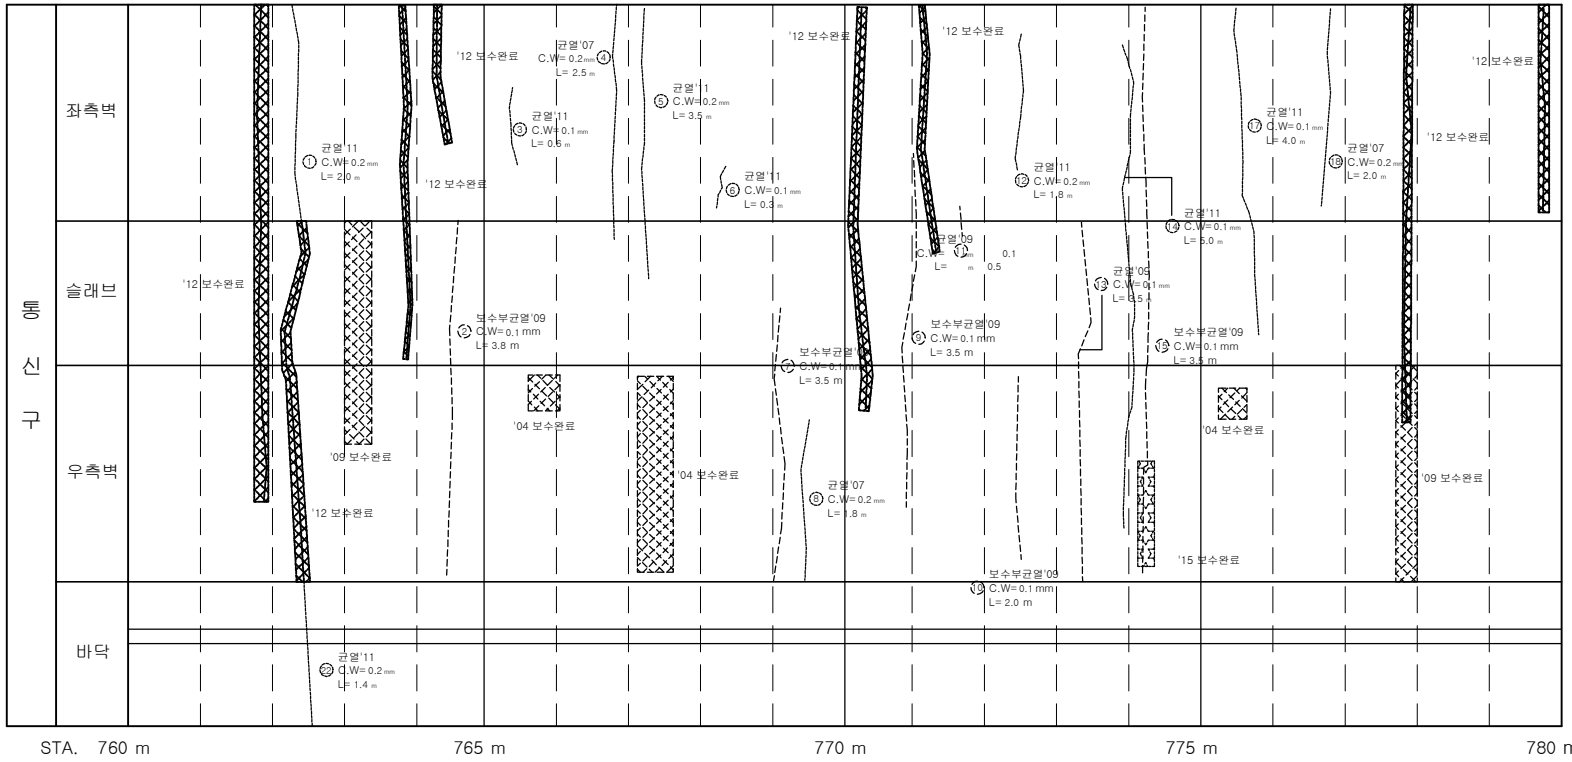

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량	
1	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1			
2	2009	균열	0.10	3.80		3.80	m	1			
3	2011	균열	0.10	0.60		0.60	m	1			
4	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1			
5	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1			
6	2011	균열	0.10	0.30		0.30	m	1			
7	2009	균열	0.10	3.50		3.50	m	1			
8	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1			
9	2009	균열	0.10	3.50		3.50	m	1			
10	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1			
11	2009	균열	0.10	0.50		0.50	m	1			
12	2011	균열	0.20	1.80		1.80	m	1			
13	2009	균열	0.10	3.50		3.50	m	1			
14	2011	균열	0.10	5.00		5.00	m	1			
15	2009	균열	0.10	3.50		3.50	m	1			
16	2011	균열	0.20	1.40		1.40	m	1			
17	2011	균열	0.10	4.00		4.00	m	1			
18	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1			

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.780 m ~800 m) 통신구 구간





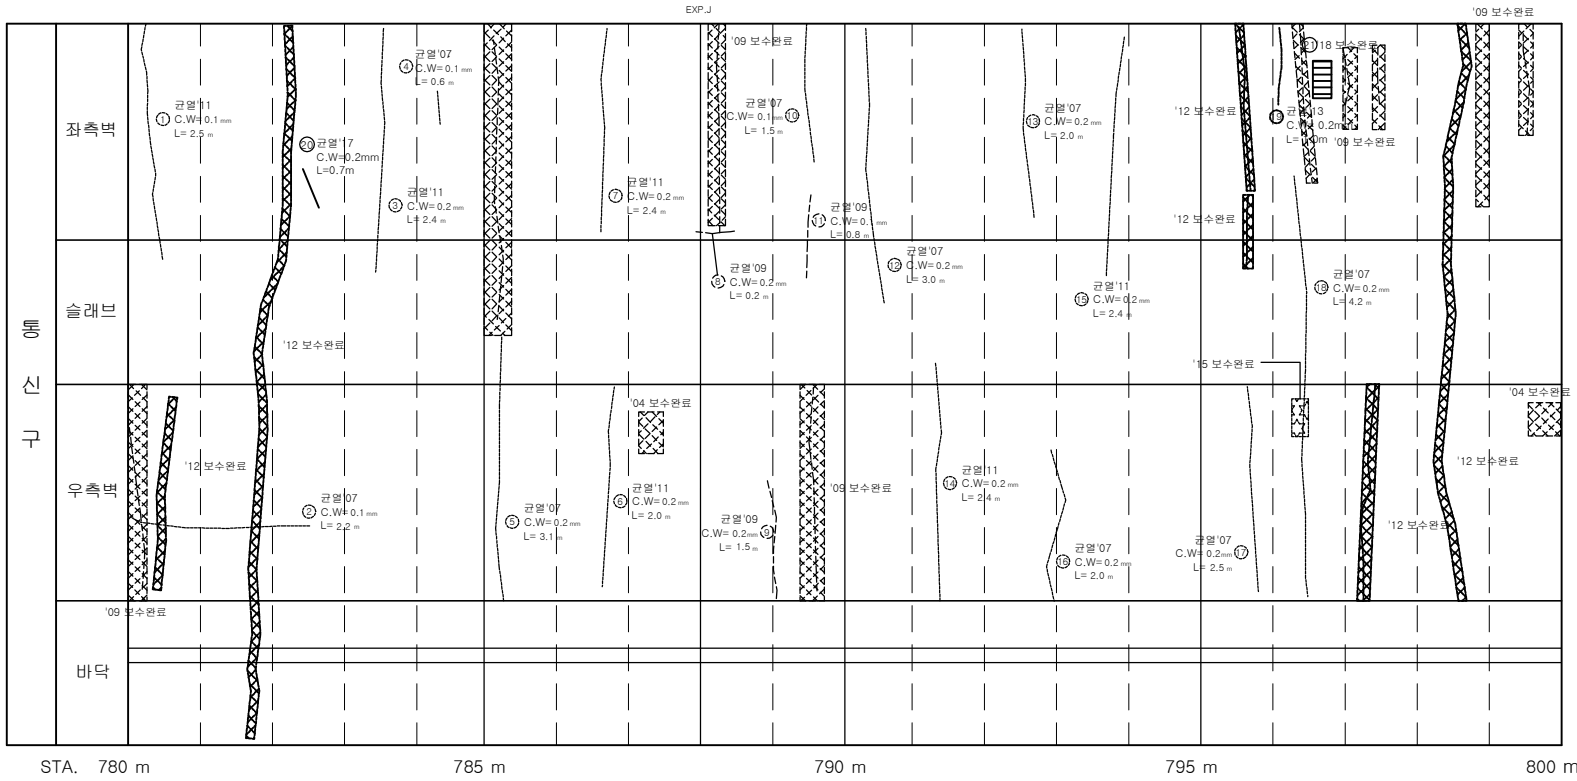

손 상 물 량 표

번호	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2011	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				
2	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
3	2011	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
4	2007	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
5	2007	균열	0.20	3.10		3.10	m	1				
6	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
7	2011	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
8	2009	균열	0.20	0.20		0.20	m	1				
9	2009	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
10	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
11	2009	균열	0.10	0.80		0.80	m	1				
12	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
13	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
14	2011	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
15	2011	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
16	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
17	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
18	2007	균열	0.20	4.20		4.20	m	1				
19	2013	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
20	2017	균열	0.20	0.70		0.70	m	1				
21	2017	보수부틈	0.30	0.50		0.15	㎡	1	2018	단면복구공법	0.18	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.800 m ~820 m) 통신구 구간





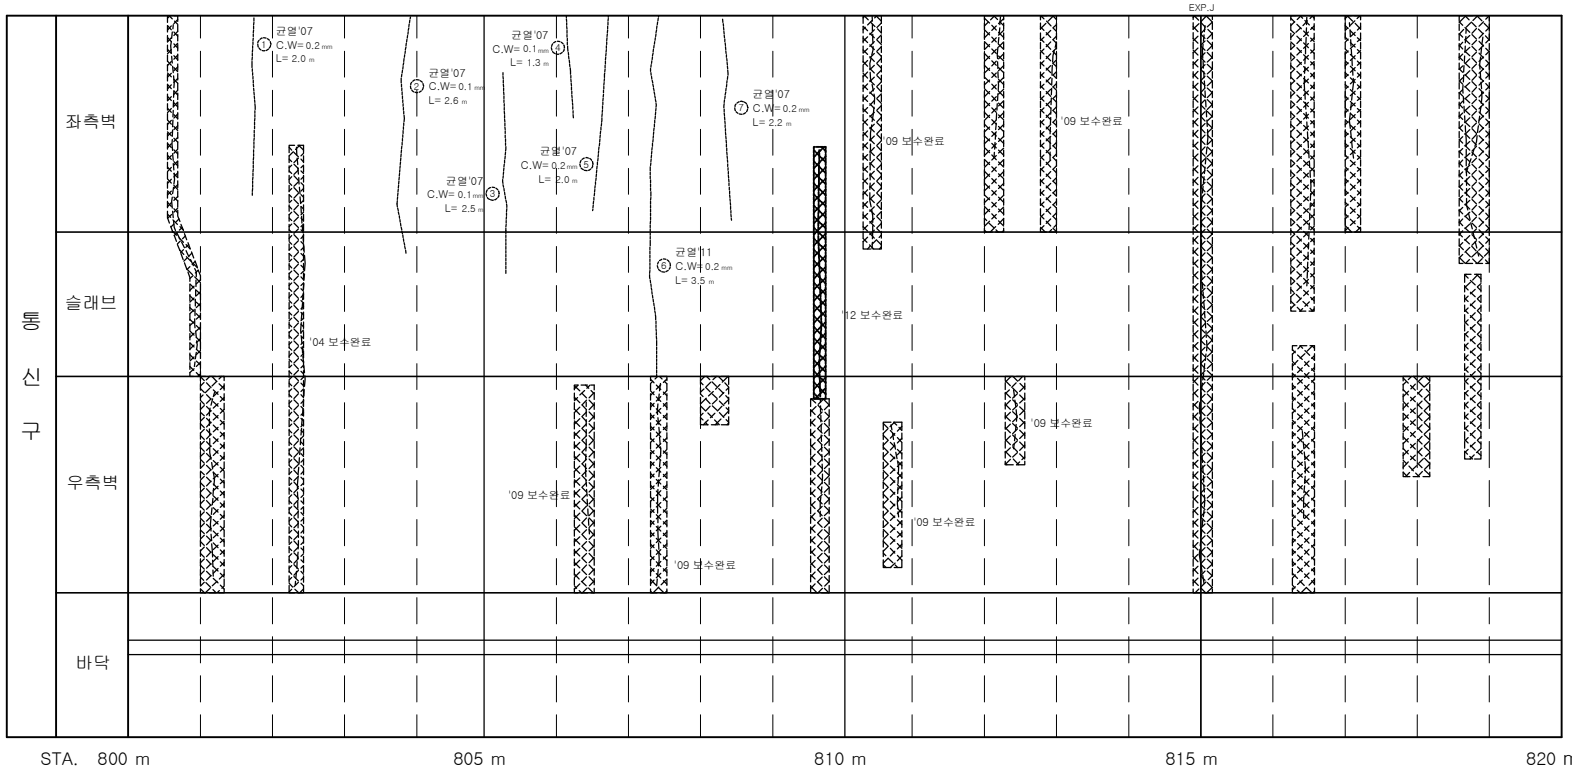

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	증량	
1	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
2	2007	균열	0.10	2.60		2.60	m	1				
3	2007	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				
4	2007	균열	0.10	1.30		1.30	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
6	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
7	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.820 m ~840 m) 통신구 구간





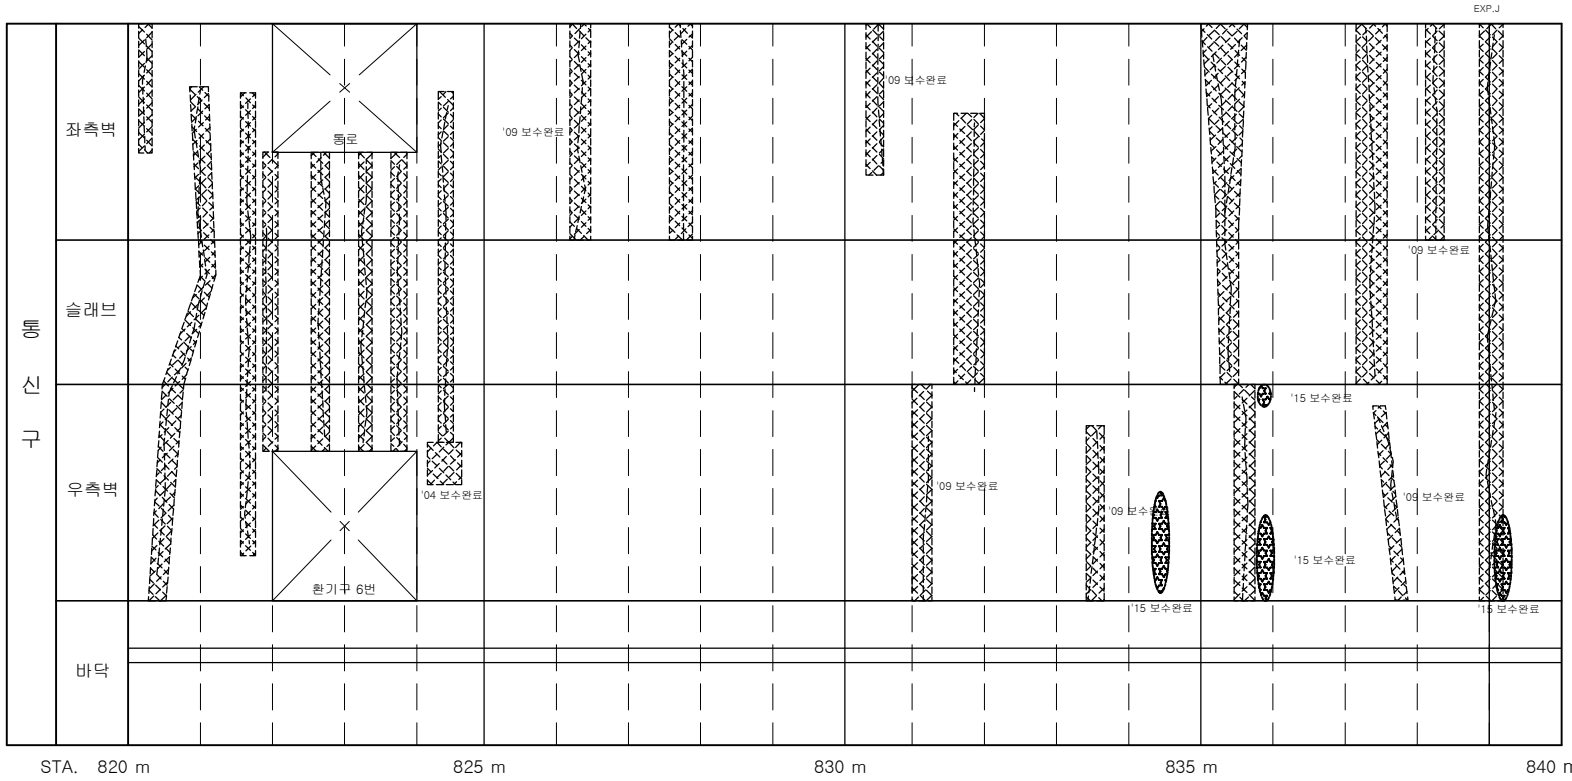

손 상 물 량 표

연번	적용구분	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -중대로 외관조사망도

가락공동구 - 중대로(STA.823m)환기구 6번

KEYPLAN



SECTION



BOX A

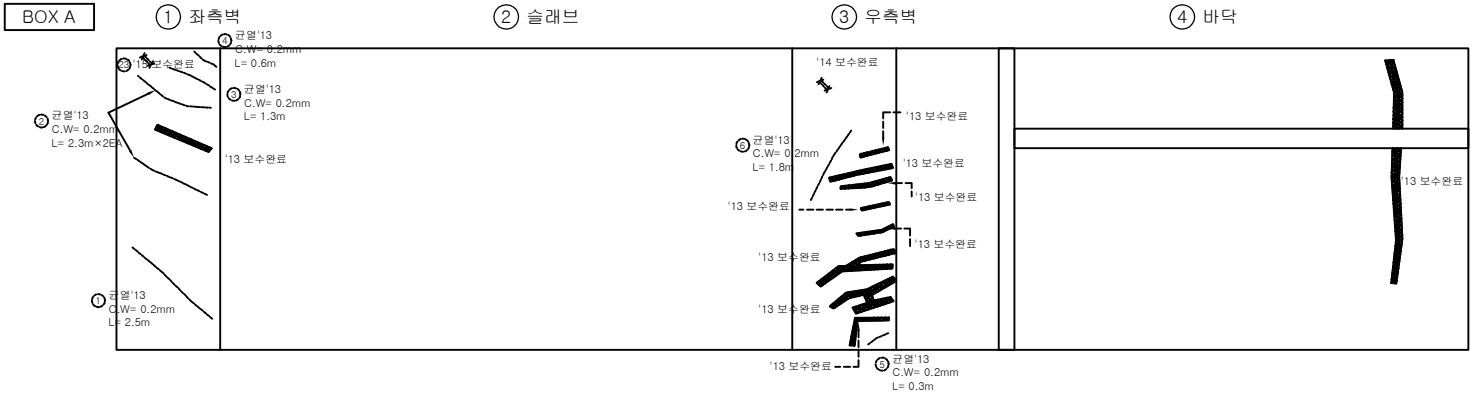

BOX B

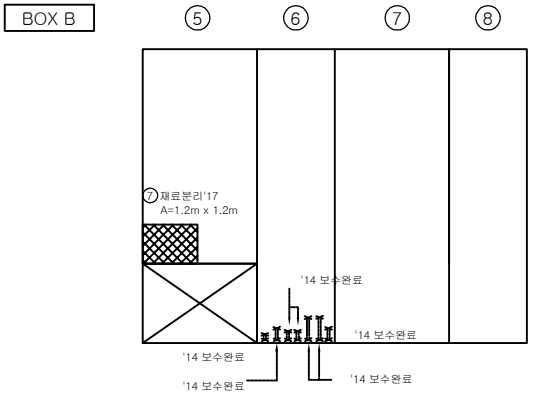

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량	
1	2013	균열	0.20	2.50		2.50	m	1			
2	2013	균열	0.20	4.60		9.20	m	2			
3	2013	균열	0.20	1.30		1.30	m	1			
4	2013	균열	0.20	0.60		0.60	m	1			
5	2013	균열	0.20	0.30		0.30	m	1			
6	2013	균열	0.20	1.80		1.80	m	1			
7	2017	재료분리	1.20	1.20		1.44	㎡	1			

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 환기구 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.840 m ~860 m) 통신구 구간





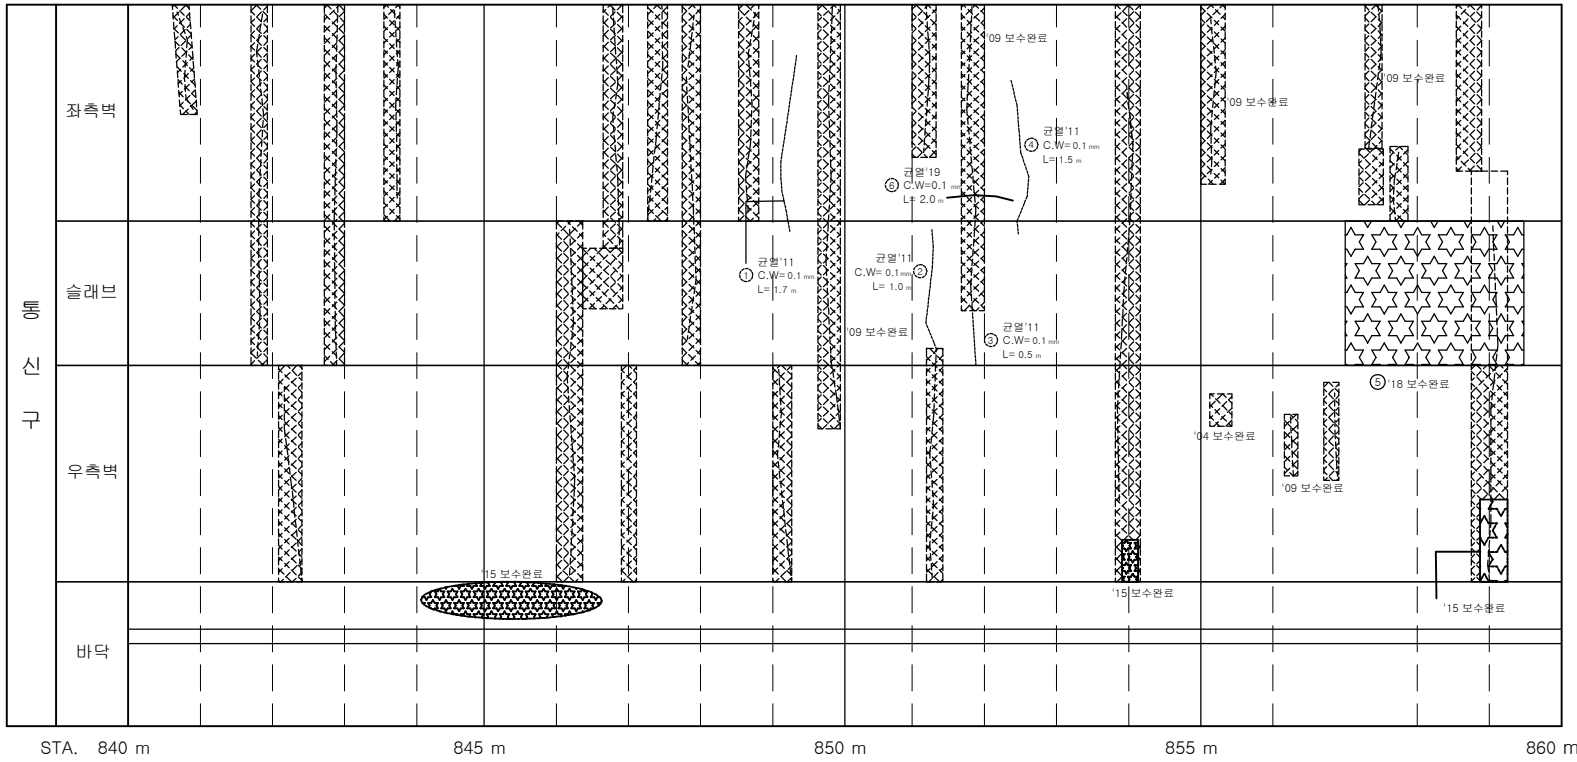

손 상 물 량 표

번호	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2011	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
2	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
3	2011	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
4	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
5	2011	백태	1.00	2.50		2.50	㎡	1	2018	표면처리공법	3.00	
6	2019	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.860 m ~880 m) 통신구 구간





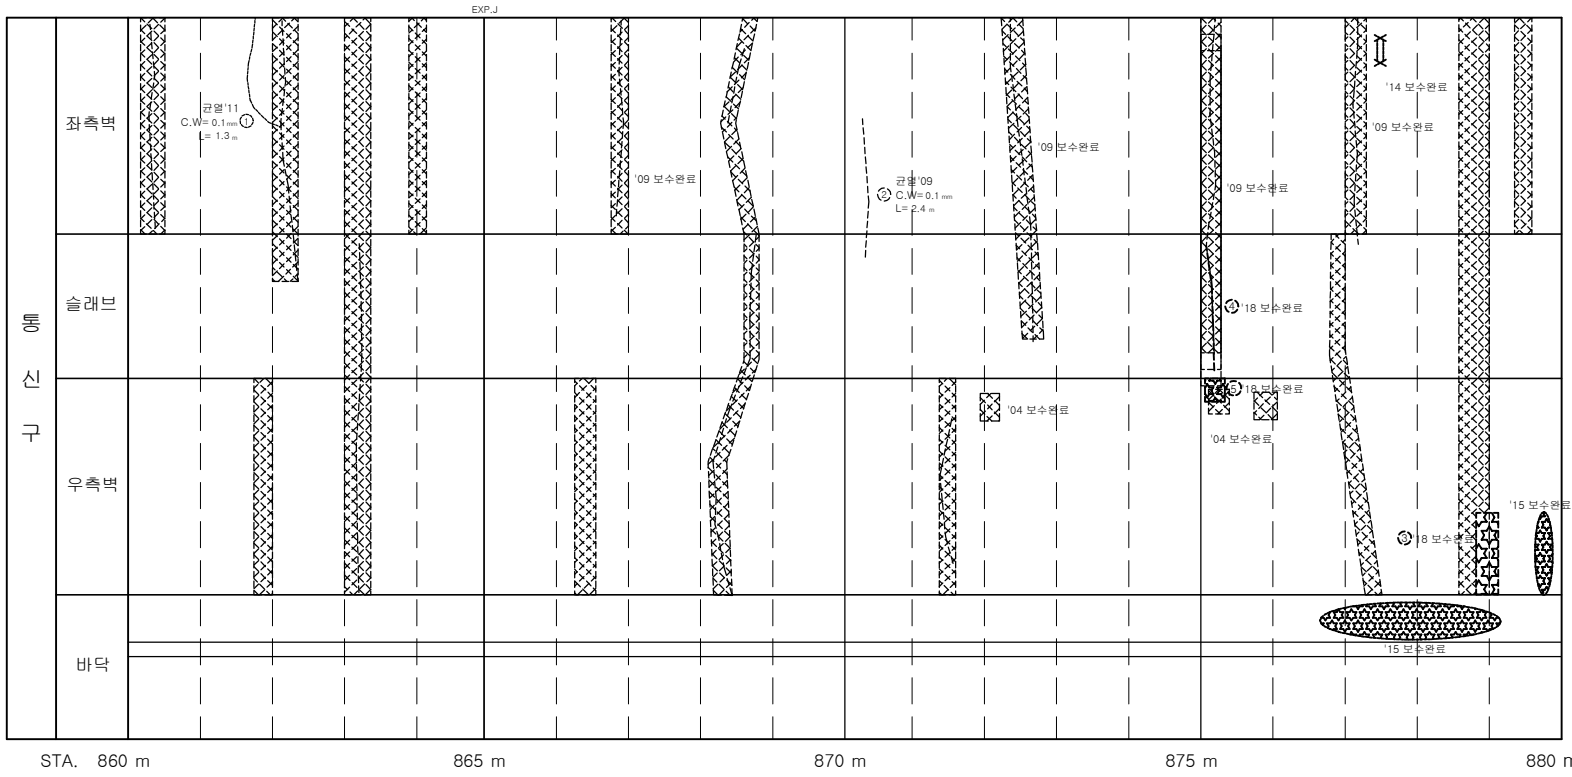

손 상 물 량 표

연번	점용년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2011	균열	0.10	1.30		1.30	m	1				
2	2009	균열	0.10	2.40		2.40	m	1				
3	2011	누수,백태	0.20	1.50		0.30	㎡	1	2018	배면누수보수	0.36	
4	2013	균열부백태	0.20	1.20		0.24	㎡	1	2018	표면처리공법	0.29	
5	2017	백태	0.20	0.20		0.04	㎡	1	2018	표면처리공법	0.05	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.880 m ~900 m) 통신구 구간





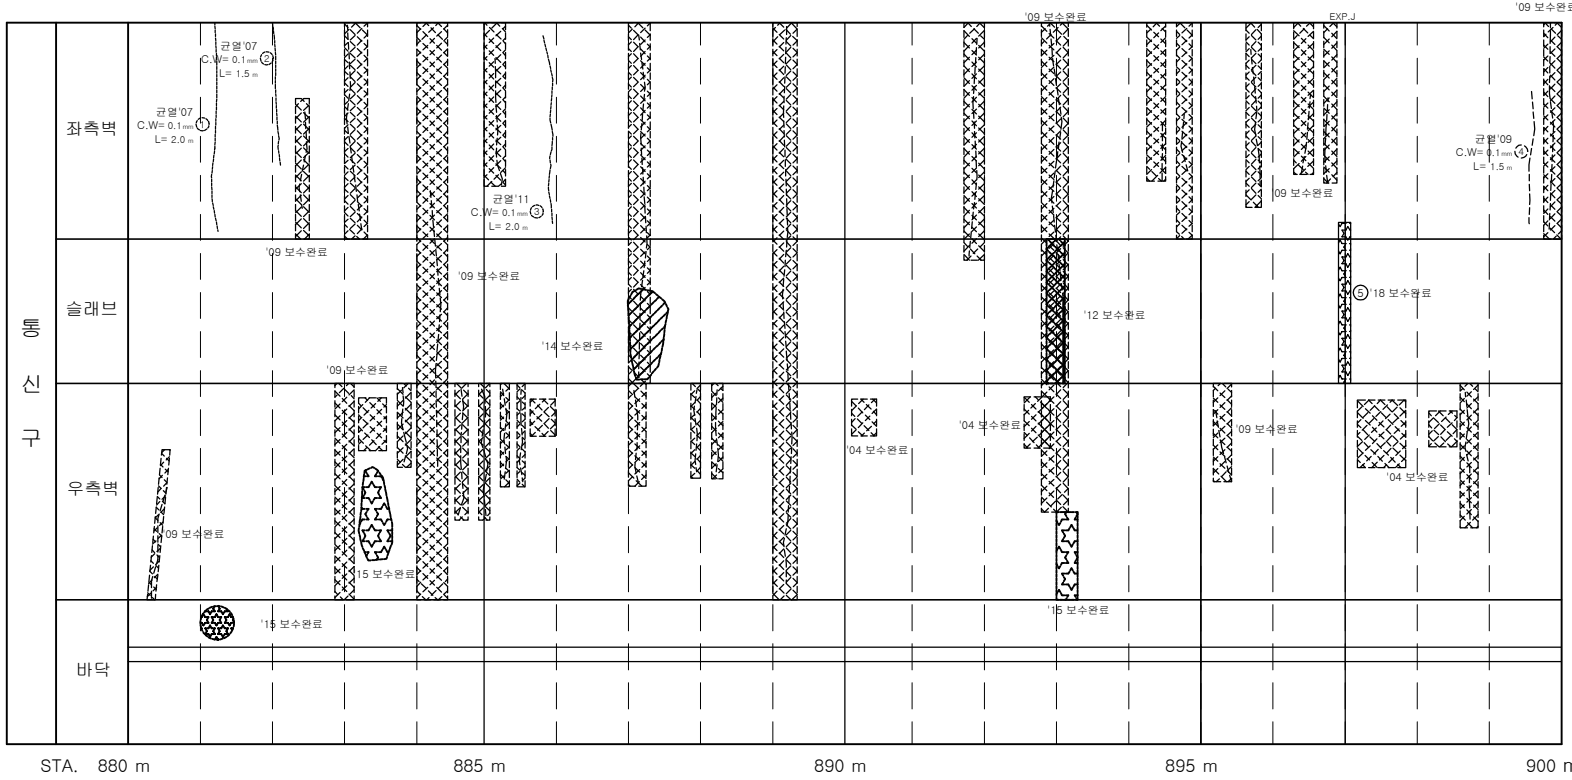

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
2	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
3	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
4	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
5	2017	백태	0.10	2.00		0.20	㎡	1	2018	표면처리공법	0.24	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -중대로 외관조사망도

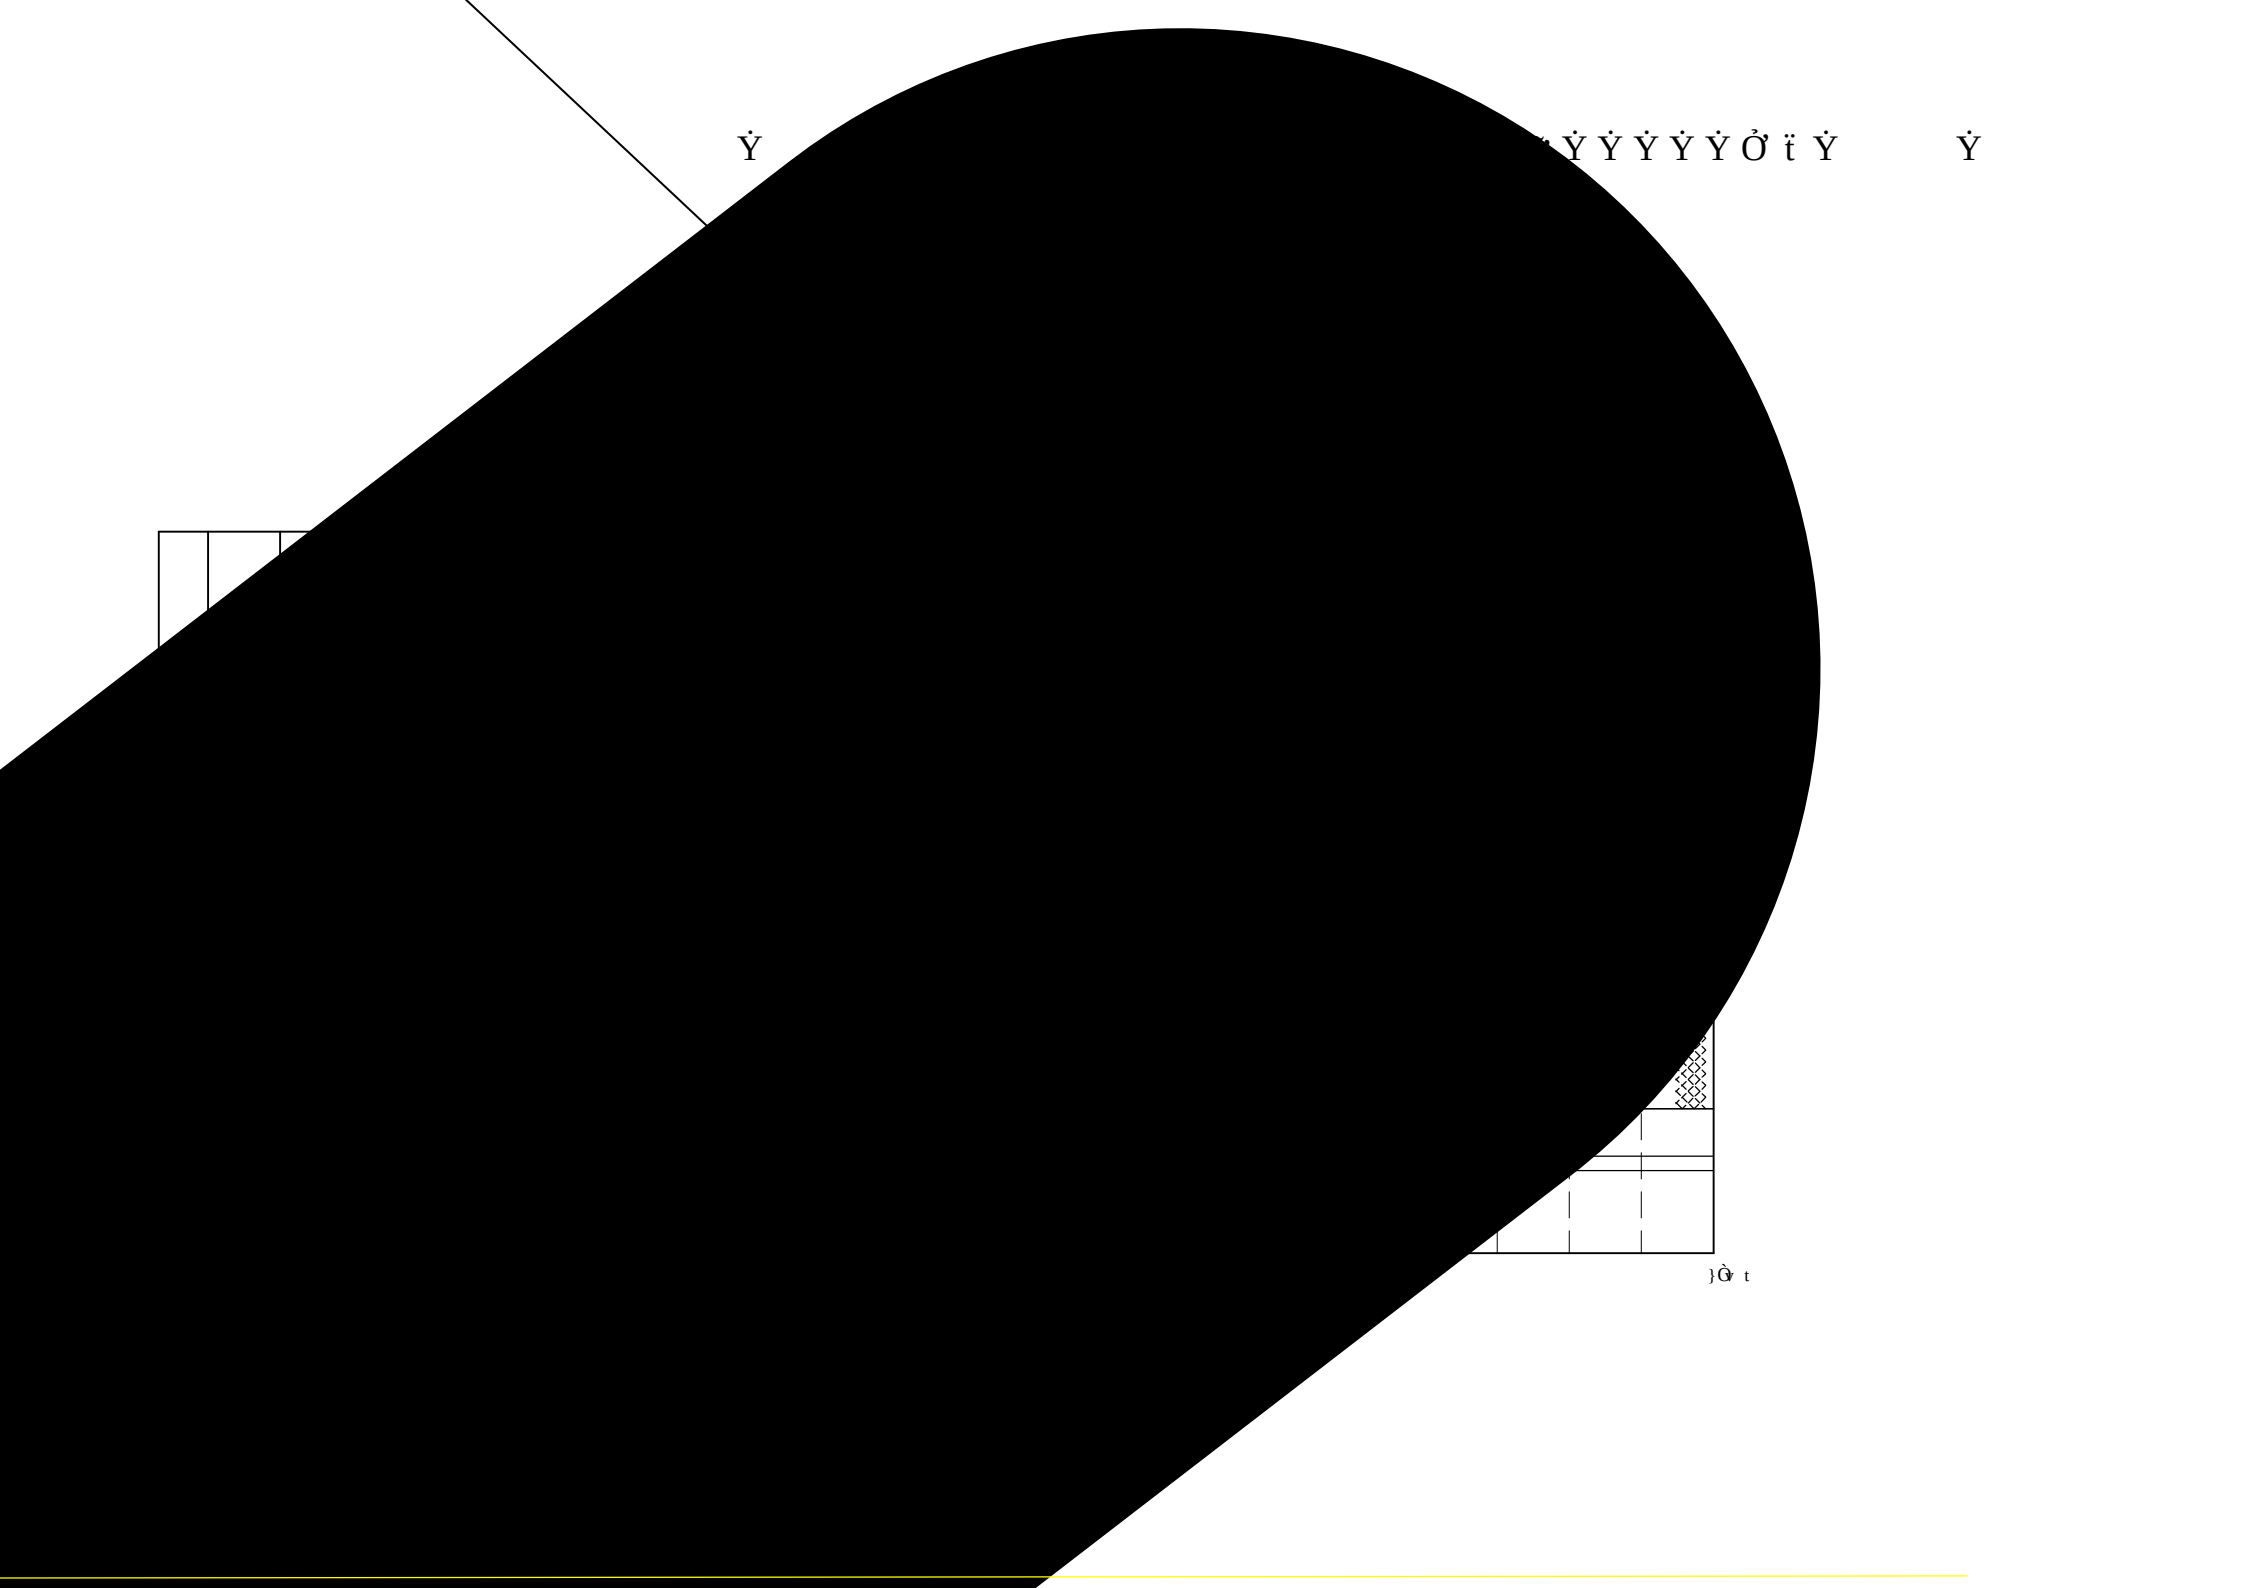

가락 공동구 - 중대로(STA.960 m ~980 m) 통신구 구간





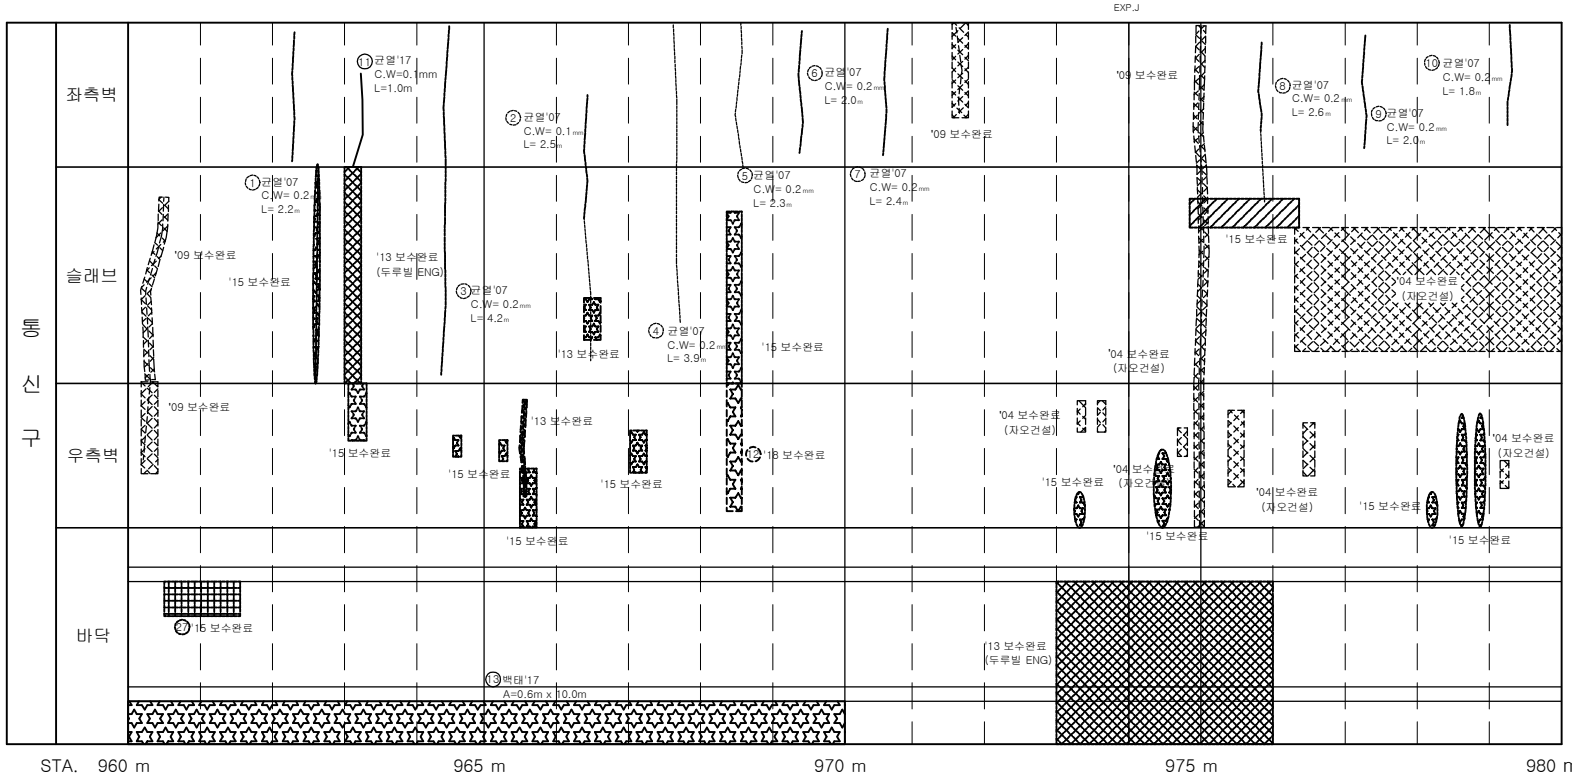

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	경과년도	공법명/자재명	물량		
1	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
2	2007	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				
3	2007	균열	0.20	4.20		4.20	m	1				
4	2007	균열	0.20	3.90		3.90	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
7	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.60		2.60	m	1				
9	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
10	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
11	2017	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
12	2017	백태	0.10	2.00		0.20	㎡	1	2018	표면처리공법	0.24	
13	2017	백태	0.60	10.00		6.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.980 m ~1000 m) 통신구 구간





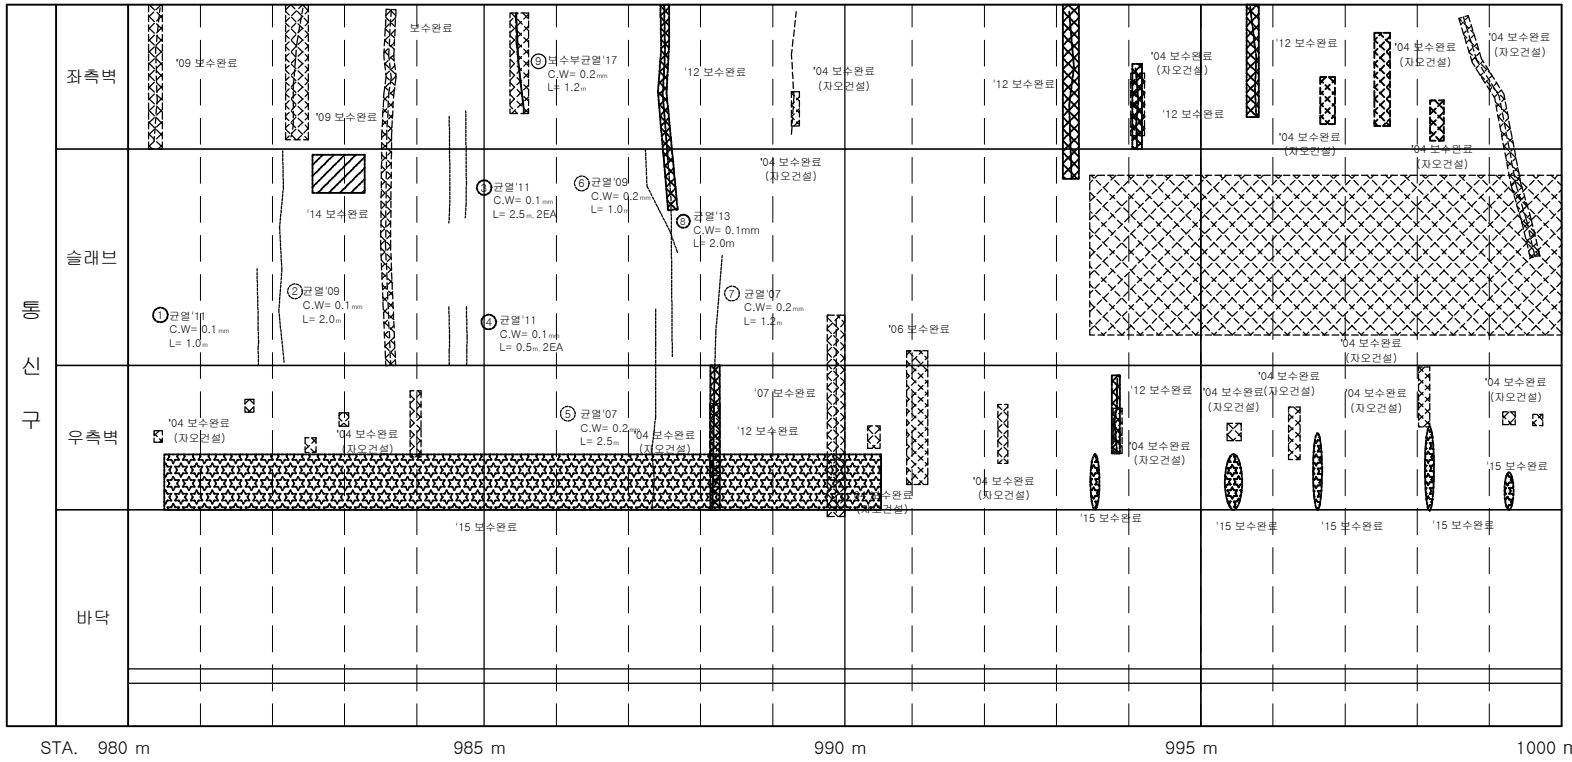

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
2	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
3	2011	균열	0.10	5.00		10.00	m	2				
4	2011	균열	0.10	1.00		2.00	m	2				
5	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
6	2009	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
7	2007	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
8	2013	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
9	2017	보수부균열	0.20	1.20		1.20	m	1				재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1000 m ~1020 m) 통신구 구간



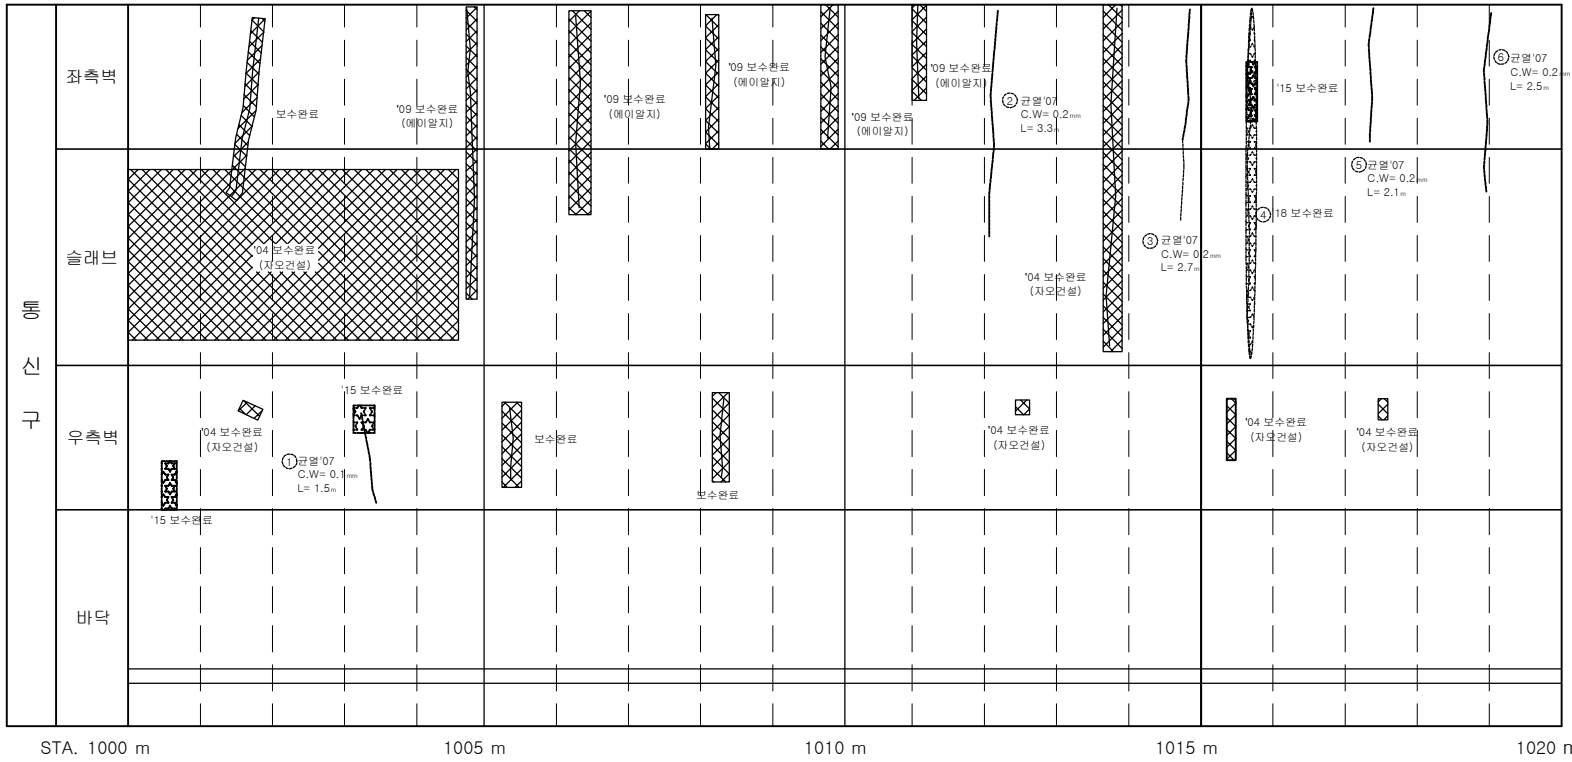

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
2	2007	균열	0.20	3.30		3.30	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.70		2.70	m	1				
4	2011	균열부백타	0.10	3.00		0.30	㎡	1	2018	표면처리공법	0.36	
5	2007	균열	0.20	2.10		2.10	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1020 m ~1040 m) 통신구 구간



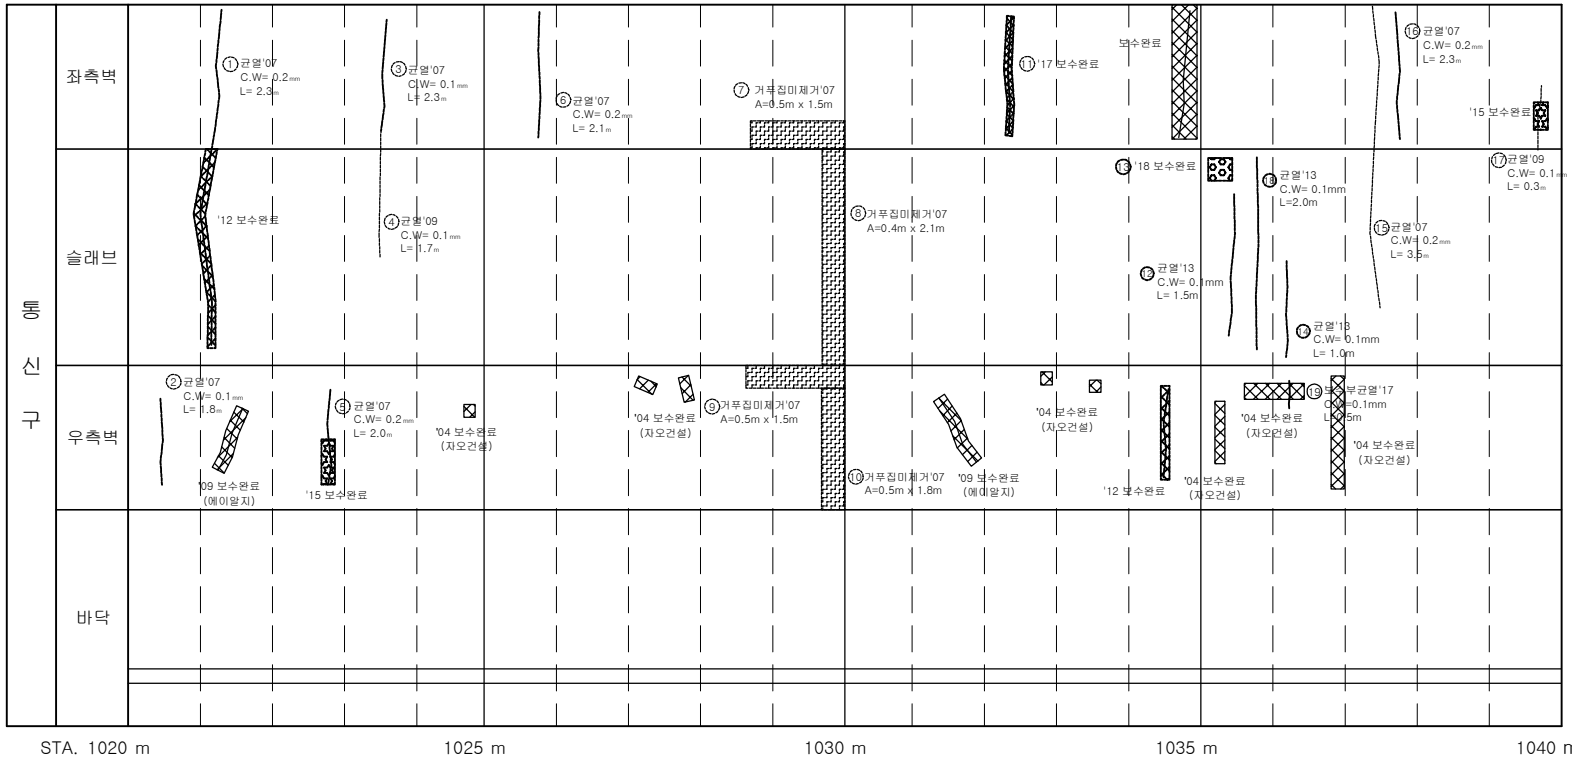

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
2	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
3	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
4	2009	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.10		2.10	m	1				
7	2007	거푸집미제거	0.50	1.50		0.75	㎡	1				
8	2007	거푸집미제거	0.40	2.10		0.84	㎡	1				
9	2007	거푸집미제거	0.50	1.50		0.75	㎡	1				
10	2007	거푸집미제거	0.50	1.80		0.90	㎡	1				
11	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1	2017	표면처리공법	2.40	
12	2013	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
13	2007	박태	0.10	0.10		0.01	㎡	1	2018	표면처리공법	0.01	
14	2013	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
15	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
16	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
17	2009	균열	0.10	0.30		0.30	m	1	2017	표면처리공법	0.36	
18	2013	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
19	2017	보수부균열	0.10	0.50		0.50	m	1				재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1040 m ~1060 m) 통신구 구간



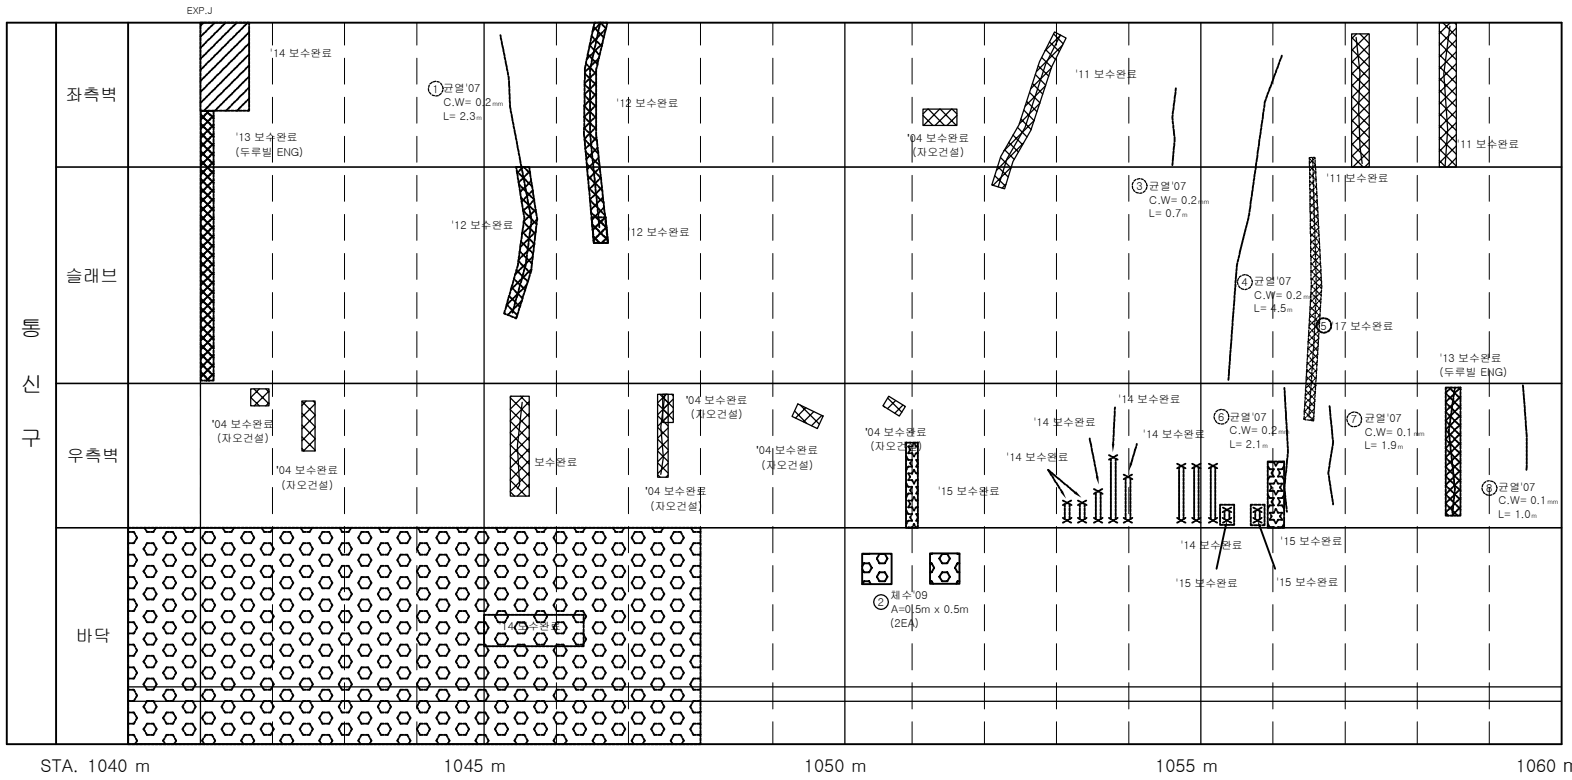

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1			
2	2009	채수	0.50	0.50		0.25	㎡	2			
3	2007	균열	0.20	0.70		0.70	m	1			
4	2007	균열	0.20	4.50		4.50	m	1			
5	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1	2017	표면처리공법	3.60	
6	2007	균열	0.20	2.10		2.10	m	1				
7	2007	균열	0.10	1.90		1.90	m	1				
8	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1060 m ~1080 m) 통신구 구간



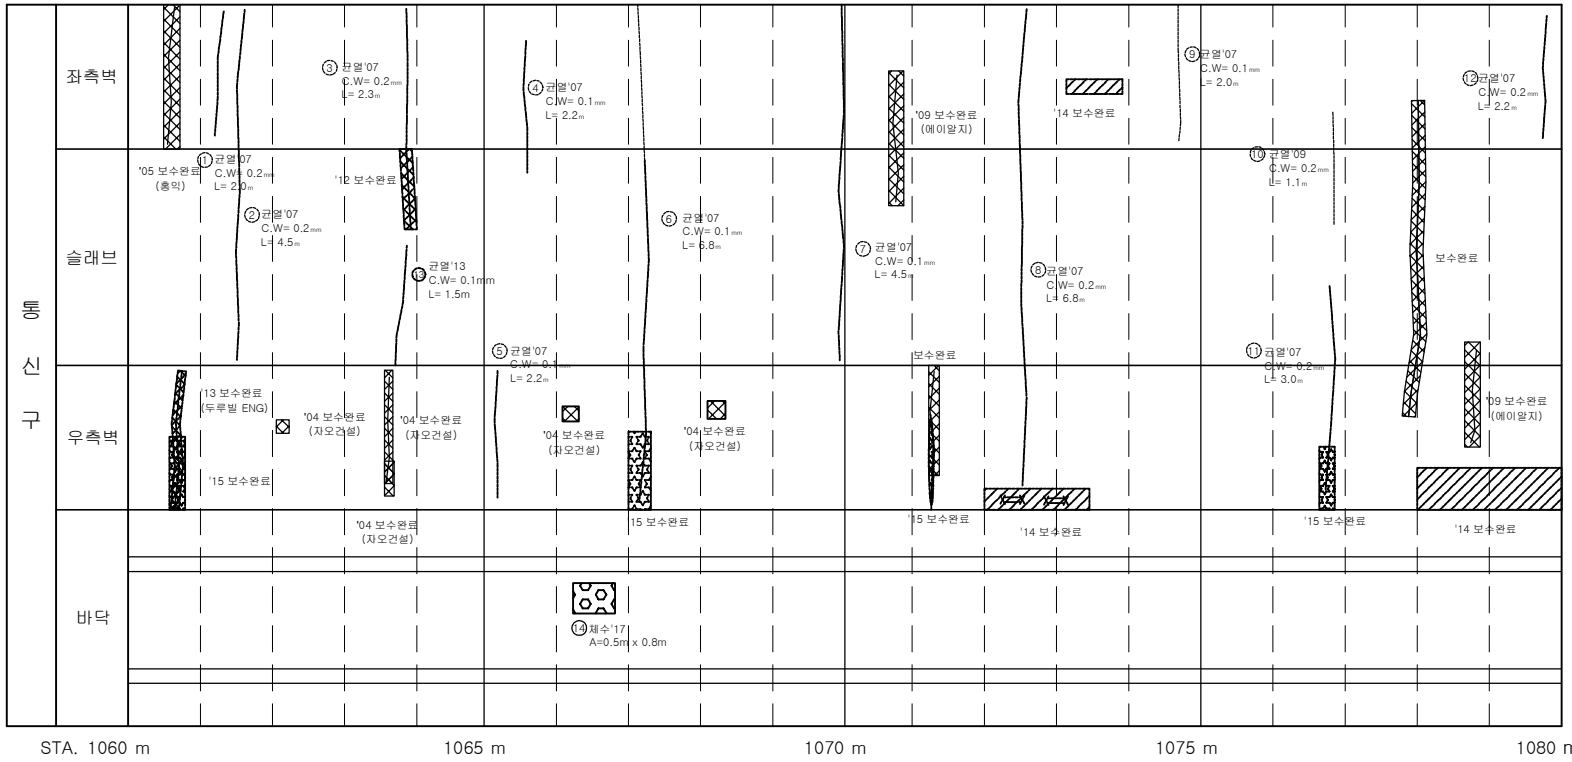

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
2	2007	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
4	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
5	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
6	2007	균열	0.10	6.80		6.80	m	1				
7	2007	균열	0.10	4.50		4.50	m	1				
8	2007	균열	0.20	6.80		6.80	m	1				
9	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
10	2009	균열	0.20	1.10		1.10	m	1				
11	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
12	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
13	2013	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
14	2017	체수	0.50	0.80		0.40	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1080 m ~1100 m) 통신구 구간



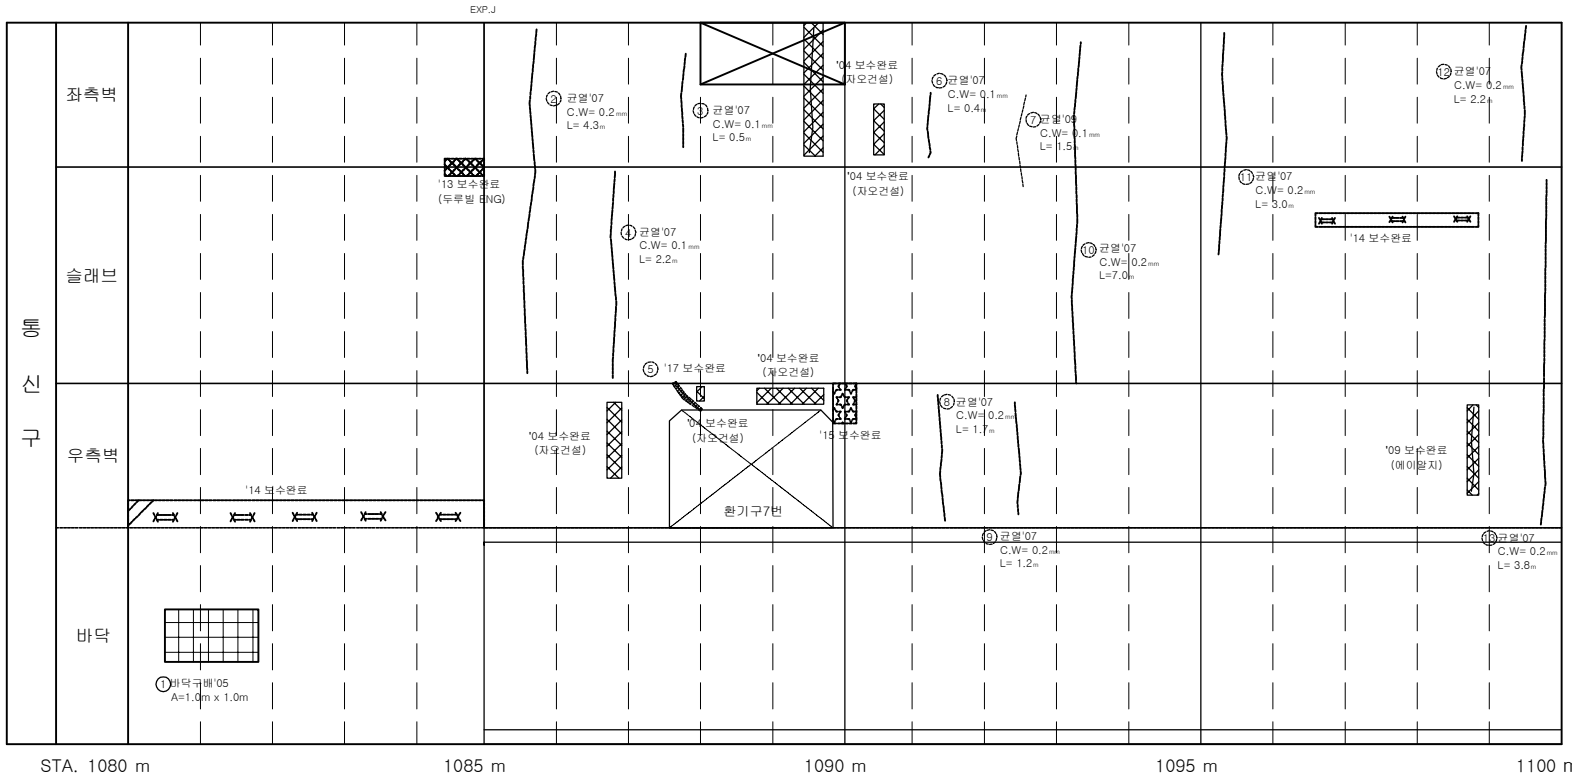

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2005	바닥구배	1.00	1.00		1.00	㎡	1				
2	2007	균열	0.20	4.30		4.30	m	1				
3	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
4	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
5	2007	균열	0.20	0.40		0.40	m	1				
6	2007	균열	0.10	0.40		0.40	m	1				
7	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
8	2007	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
9	2007	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
10	2007	균열	0.20	7.00		7.00	m	1				
11	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
12	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
13	2007	균열	0.20	3.80		3.80	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락공동구 - 중대로(STA.1089m)환기구 7번

KEYPLAN



SECTION



BOX A

① 좌측벽 ② 슬래브 ③ 우측벽 ④ 바닥

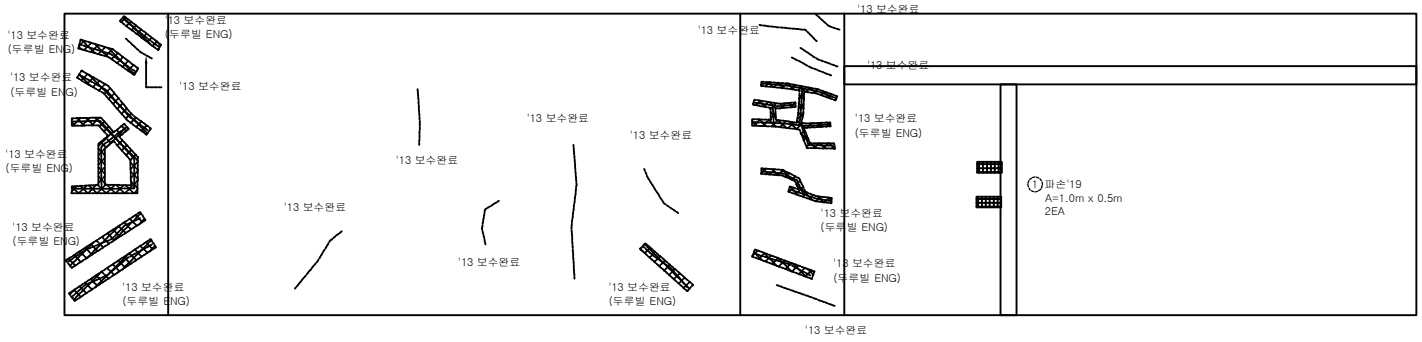

BOX B

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

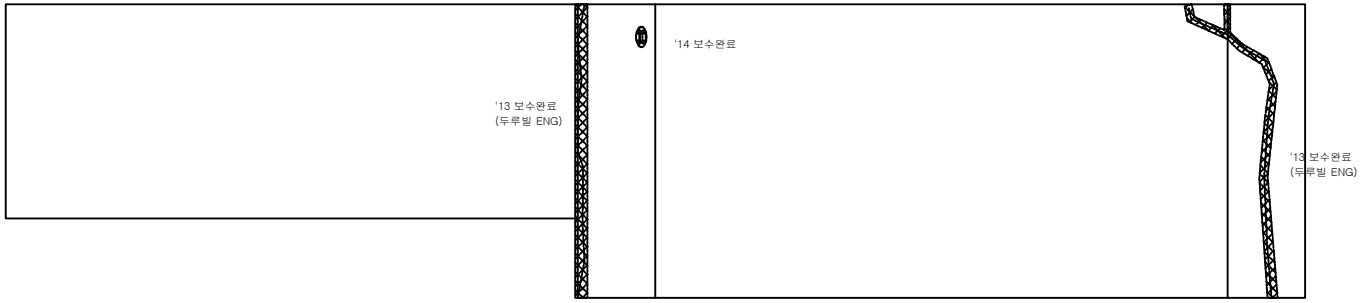

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2019	파손	1.00	0.50		1.00	㎡	2				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 환기구 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1100 m ~1120 m) 통신구 구간

KEYPLAN

SECTION 9-9



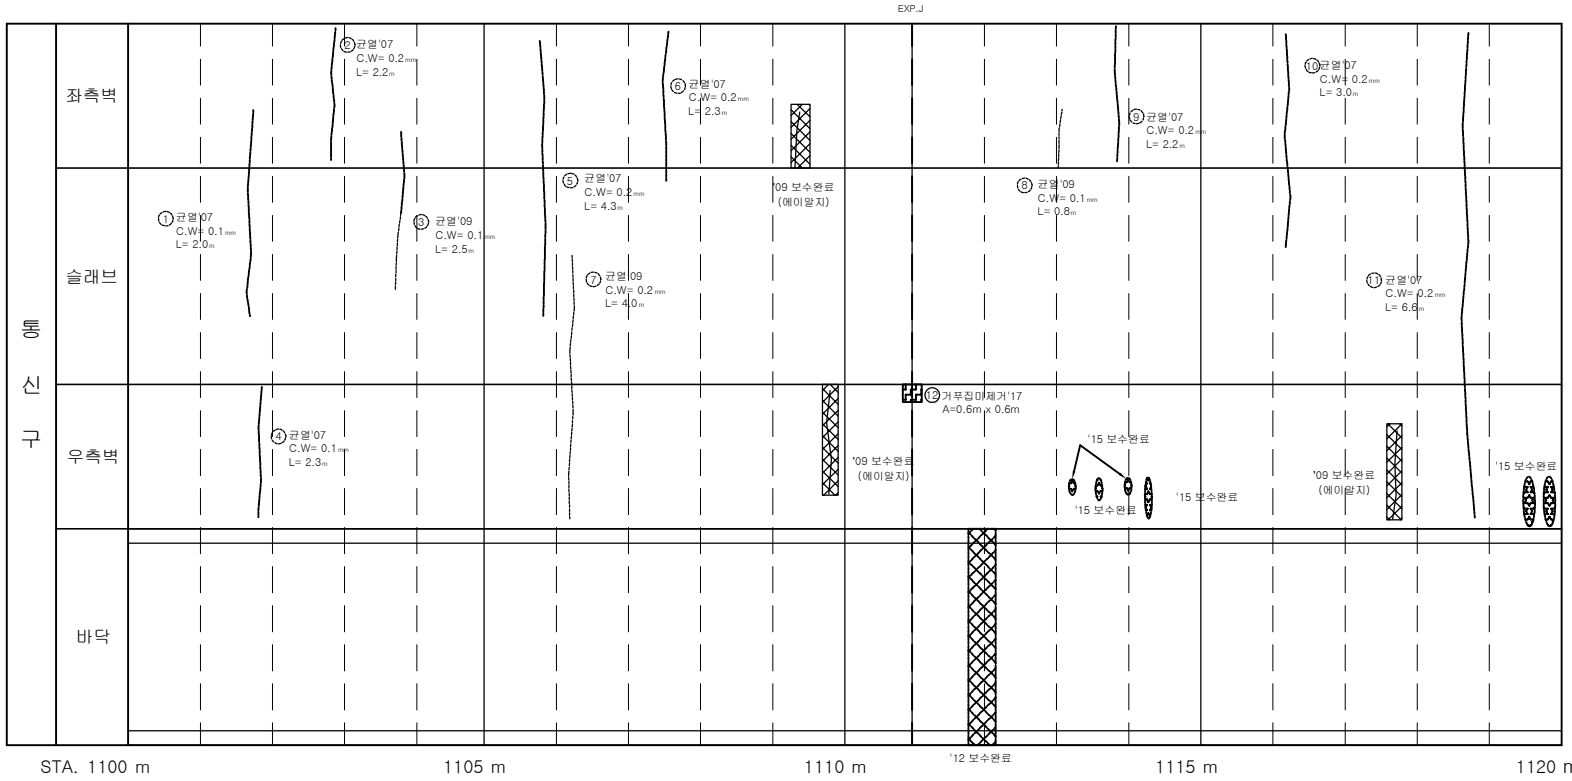

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소보수년도	공법명/자재명	증량	
1	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1			
2	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1			
3	2009	균열	0.10	2.50		2.50	m	1			
4	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1			
5	2007	균열	0.20	4.30		4.30	m	1			
6	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1			
7	2009	균열	0.20	4.00		4.00	m	1			
8	2009	균열	0.10	0.80		0.80	m	1			
9	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1			
10	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1			
11	2007	균열	0.20	6.60		6.60	m	1			
12	2017	거푸집미제거	0.60	0.60		0.36	㎡	1			

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1120 m ~1140 m) 통신구 구간



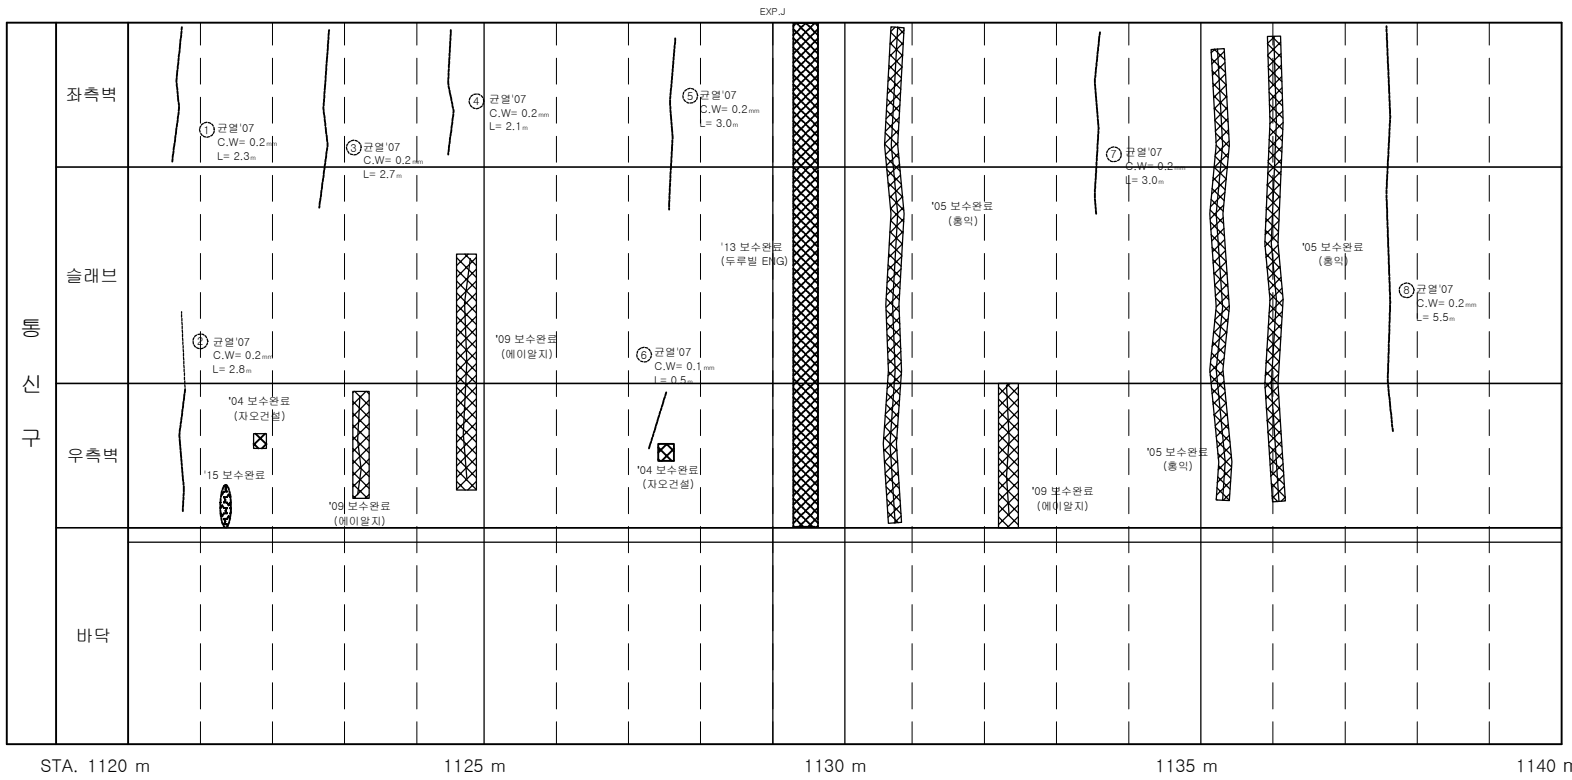

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1			
2	2007	균열	0.20	2.80		2.80	m	1			
3	2007	균열	0.20	2.70		2.70	m	1			
4	2007	균열	0.20	2.10		2.10	m	1			
5	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1			
6	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1			
7	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1			
8	2007	균열	0.20	5.50		5.50	m	1			

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1140 m ~1160 m) 통신구 구간



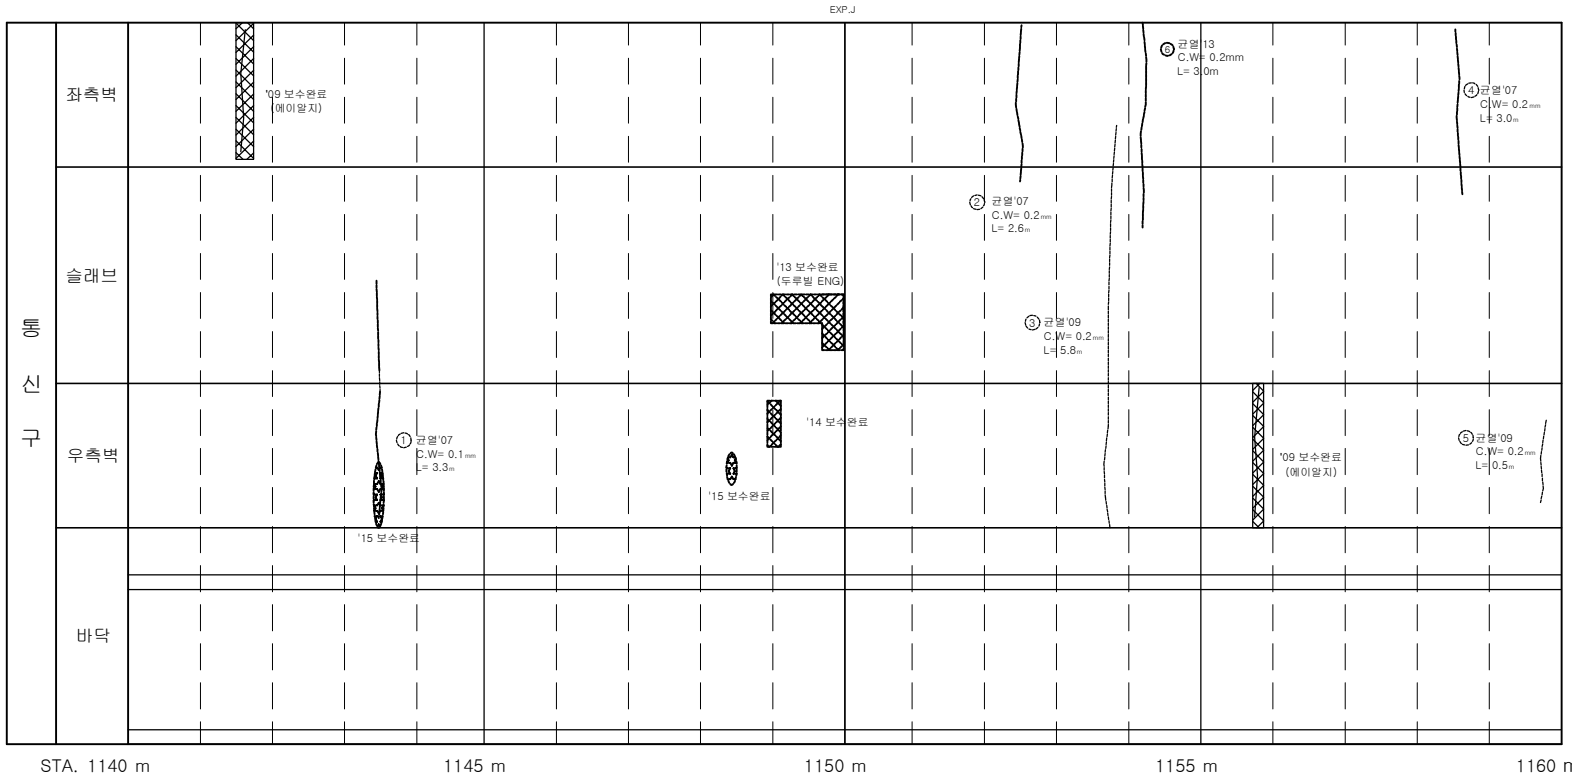

손 상 물 량 표

번호	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.10	3.30		3.30	m	1			
2	2007	균열	0.20	2.60		2.60	m	1			
3	2009	균열	0.20	5.80		5.80	m	1			
4	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1			
5	2009	균열	0.20	0.50		0.50	m	1			
6	2013	균열	0.20	3.00		3.00	m	1			

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1160 m ~1180 m) 통신구 구간

KEY PLAN

SECTION 9-9



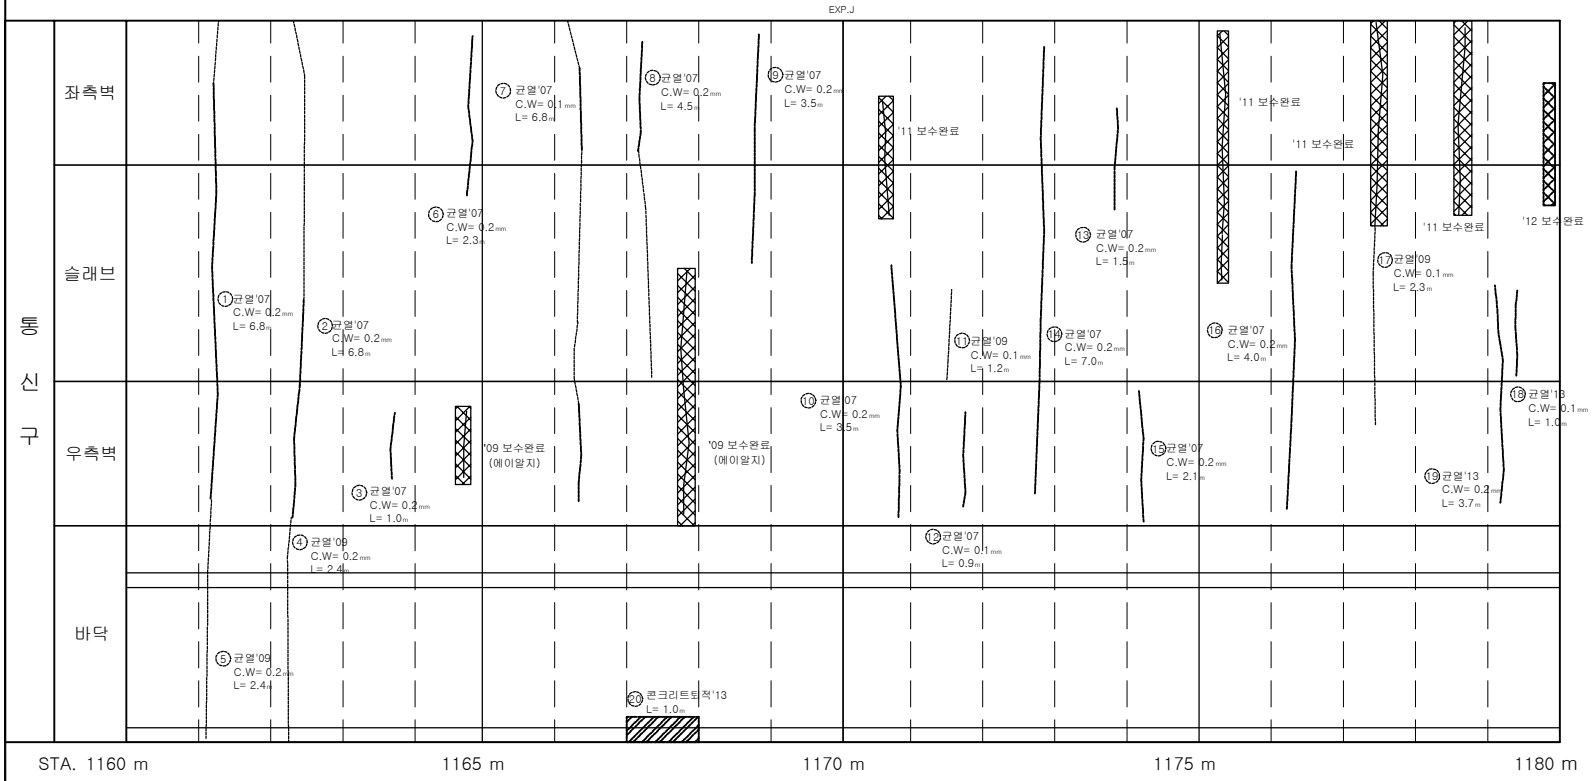

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	6.80		6.80	m	1			
2	2007	균열	0.20	6.80		6.80	m	1			
3	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1			
4	2009	균열	0.20	2.40		2.40	m	1			
5	2009	균열	0.20	2.40		2.40	m	1			
6	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1			
7	2007	균열	0.10	6.80		6.80	m	1			
8	2007	균열	0.20	4.50		4.50	m	1			
9	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1			
10	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1			
11	2009	균열	0.10	1.20		1.20	m	1			
12	2007	균열	0.10	0.90		0.90	m	1			
13	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1			
14	2007	균열	0.20	7.00		7.00	m	1			
15	2007	균열	0.20	2.10		2.10	m	1			
16	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1			
17	2009	균열	0.10	2.30		2.30	m	1			
18	2013	균열	0.10	1.00		1.00	m	1			
19	2013	균열	0.20	3.70		3.70	m	1			
20	2013	콘크리트보적		1.00		1.00	m	1			

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1180 m ~1200 m) 통신구 구간



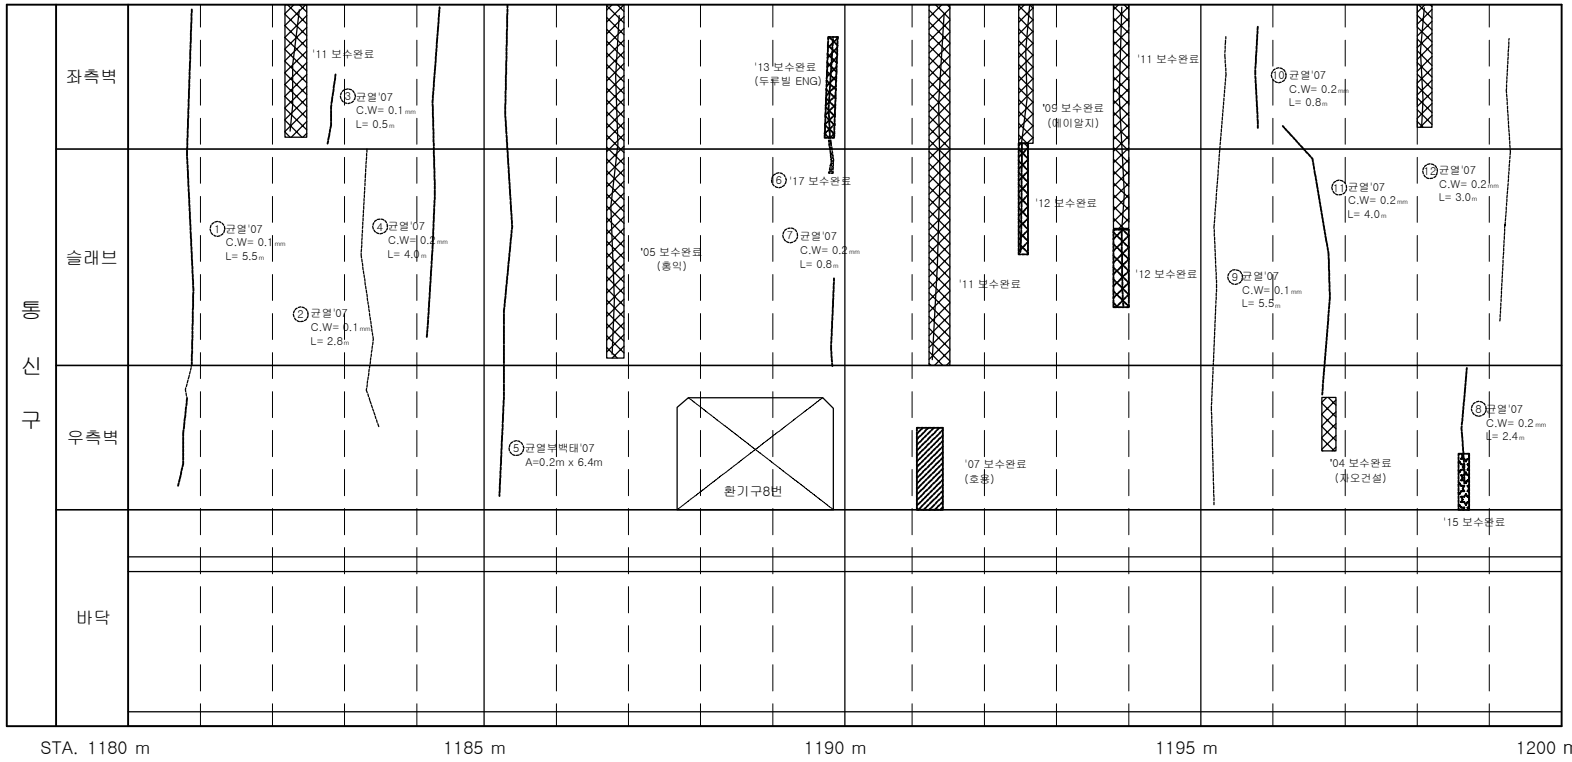

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량		
1	2007	균열	0.10	5.50		5.50	m	1				
2	2007	균열	0.10	2.80		2.80	m	1				
3	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
4	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
5	2007	균열부백태	0.20	6.40		1.28	㎡	1				
6	2009	균열	0.20	0.30		0.30	m	1	2017	표면처리공법	0.36	
7	2007	균열	0.20	0.80		0.80	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
9	2007	균열	0.10	5.50		5.50	m	1				
10	2007	균열	0.20	0.80		0.80	m	1				
11	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
12	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락공동구 - 중대로(STA.1189m)환기구 8번

KEYPLAN



SECTION



BOX A

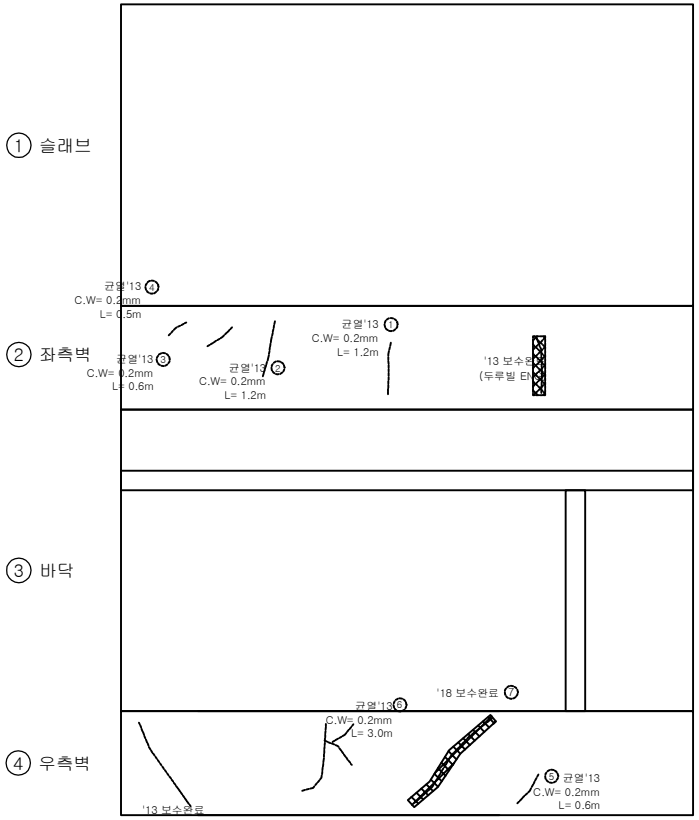

손 상 물 량 표

일련번호	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2013	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
2	2013	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
3	2013	균열	0.20	0.60		0.60	m	1				
4	2013	균열	0.20	0.50		0.50	m	1				
5	2013	균열	0.20	0.60		0.60	m	1				
6	2013	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
7	2013	균열	0.30	3.00		3.00	m	1	2018	주입보수공법	3.60	중요

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 환기구 외관조사망도

가락공동구 - 중대로(STA.1189m)환기구 8번

KEYPLAN



SECTION



BOX B





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량		
1	2019	드빙 부식		7.20		7.20	m	1				신규
2	2019	볼트미체결				2.00	EA	2				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 환기구 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1200 m ~1220 m) 통신구 구간



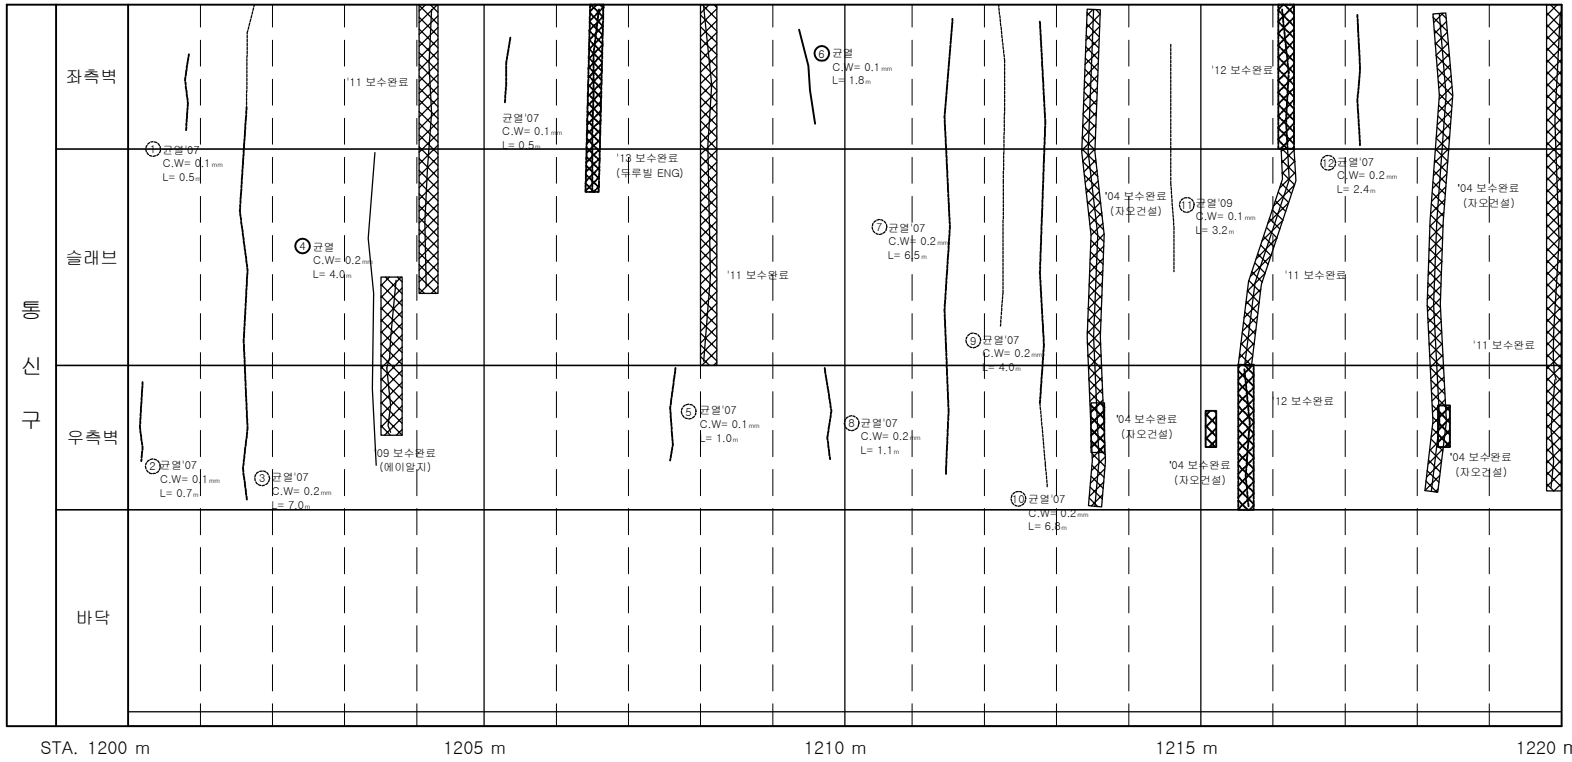

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1			
2	2007	균열	0.10	0.70		0.70	m	1			
3	2007	균열	0.20	7.00		7.00	m	1			
4	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1			
5	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1			
6	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1			
7	2007	균열	0.20	6.50		6.50	m	1			
8	2007	균열	0.20	1.10		1.10	m	1			
9	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1			
10	2007	균열	0.20	6.80		6.80	m	1			
11	2009	균열	0.10	3.20		3.20	m	1			
12	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1			

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1220 m ~1240 m) 통신구 구간



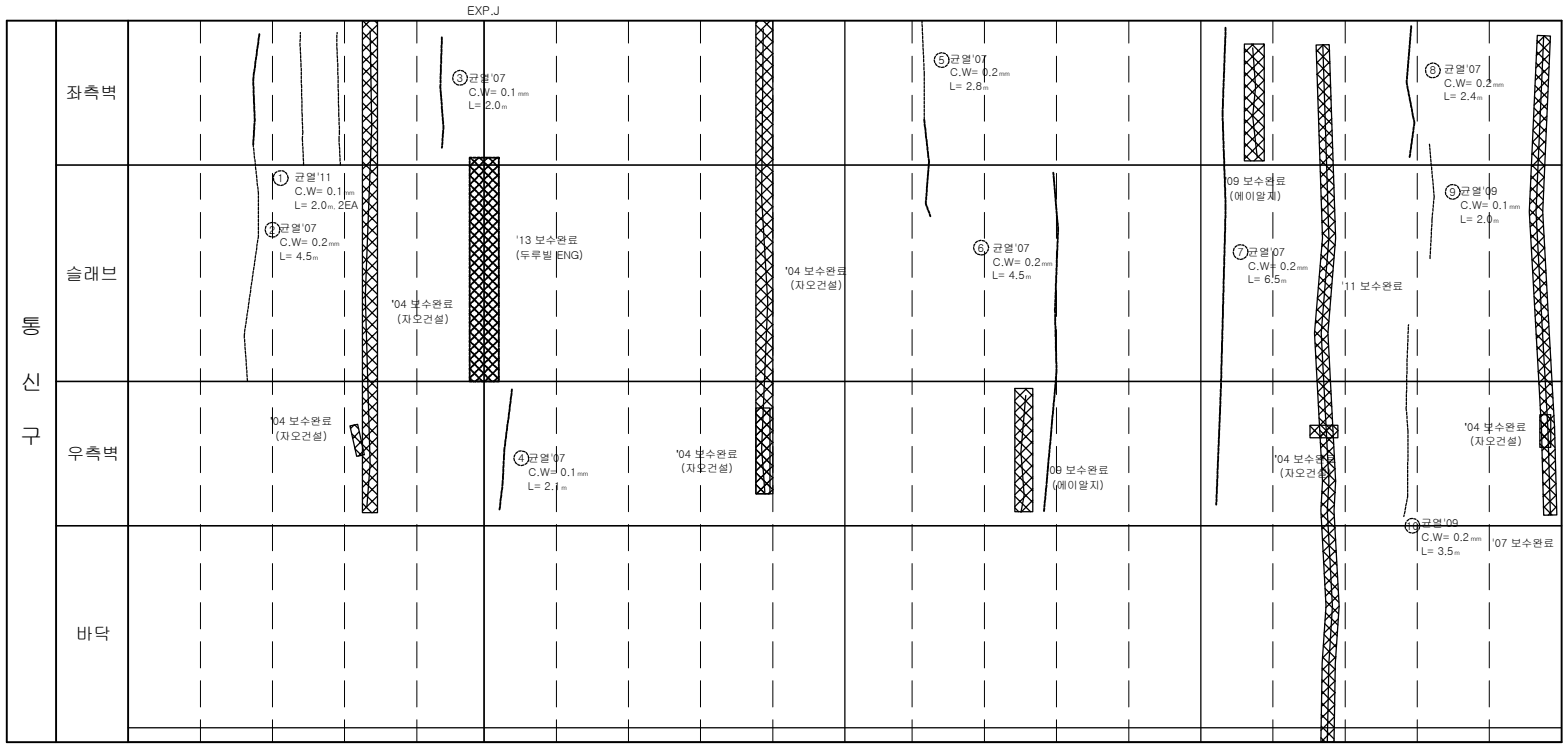

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2011	균열	0.10	4.00		8.00	m	2				
2	2007	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
3	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
4	2007	균열	0.10	2.10		2.10	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.80		2.80	m	1				
6	2007	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
7	2007	균열	0.20	6.50		6.50	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
9	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
10	2009	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1240 m ~1260 m) 통신구 구간





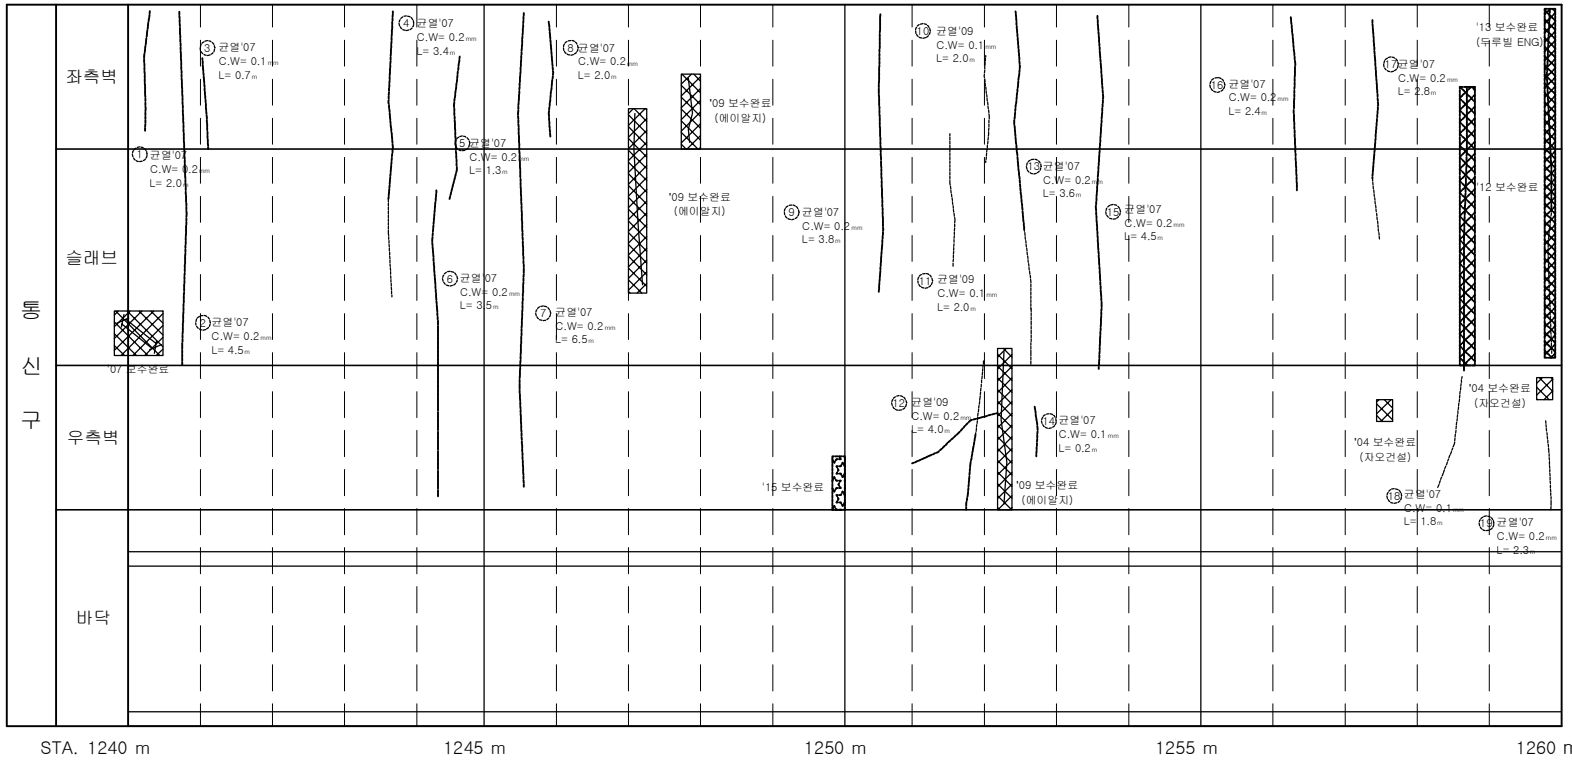

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량		
1	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
2	2007	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
3	2007	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
4	2007	균열	0.20	3.40		3.40	m	1				
5	2007	균열	0.20	1.30		1.30	m	1				
6	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
7	2007	균열	0.20	6.50		6.50	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
9	2007	균열	0.20	3.80		3.80	m	1				
10	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
11	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
12	2009	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
13	2007	균열	0.20	3.60		3.60	m	1				
14	2007	균열	0.10	0.20		0.20	m	1				
15	2007	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
16	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
17	2007	균열	0.20	2.80		2.80	m	1				
18	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
19	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1260 m ~1280 m) 통신구 구간





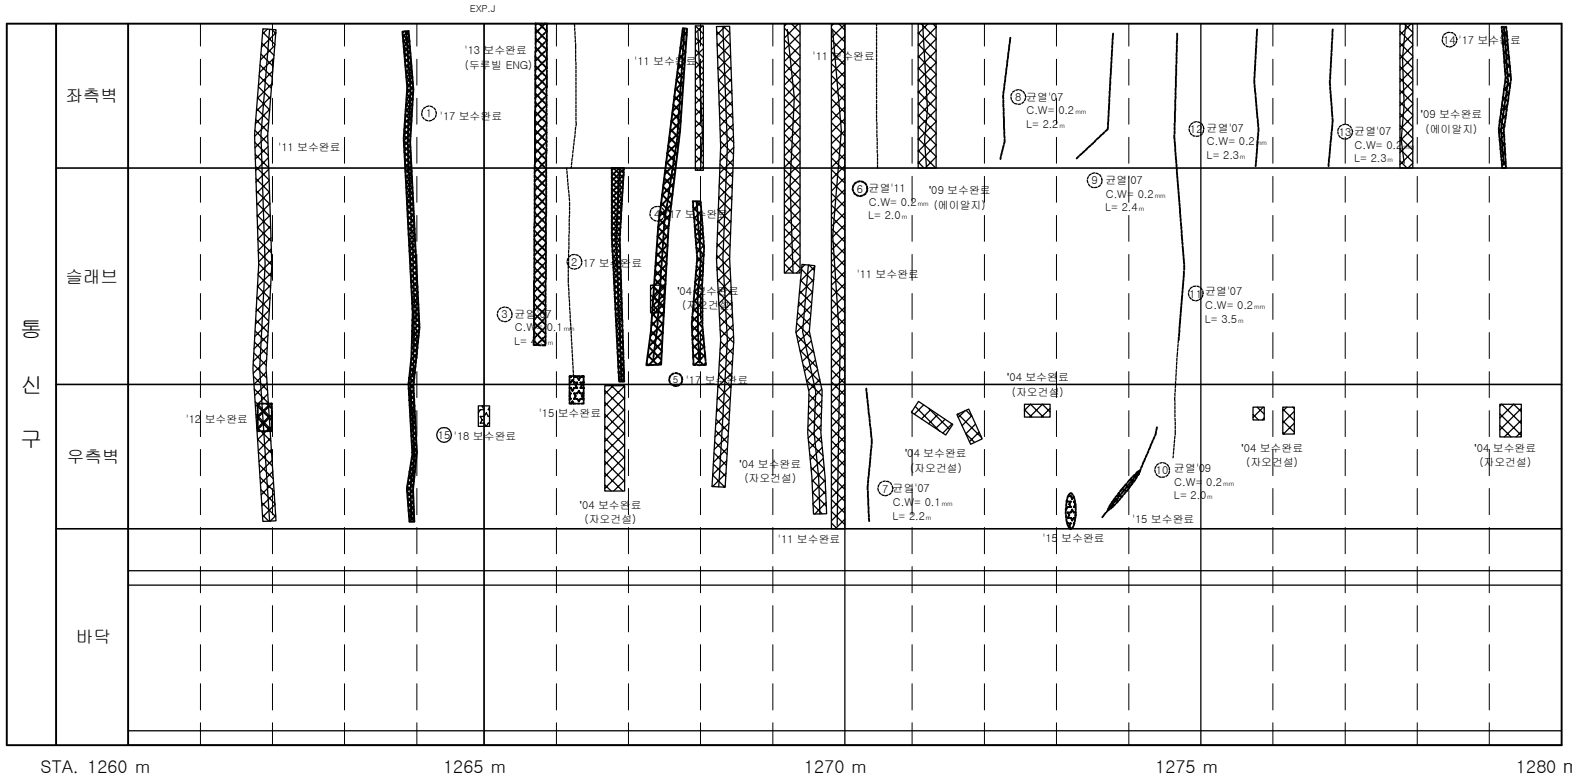

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모				최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	6.80		6.80	m	1	2017	표면처리공법	6.16	
2	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1	2017	표면처리공법	2.64	
3	2007	균열	0.10	4.50		4.50	m	1				
4	2007	균열	0.20	4.50		4.50	m	1	2017	표면처리공법	5.40	
5	2013	균열	0.20	2.00		2.00	m	1	2017	표면처리공법	2.40	
6	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
7	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
9	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
10	2009	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
11	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
12	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
13	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
14	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1	2017	표면처리공법	2.64	
15	2017	박태	0.20	0.30		0.06	㎡	1	2018	표면처리공법	0.07	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1280 m ~1300 m) 통신구 구간





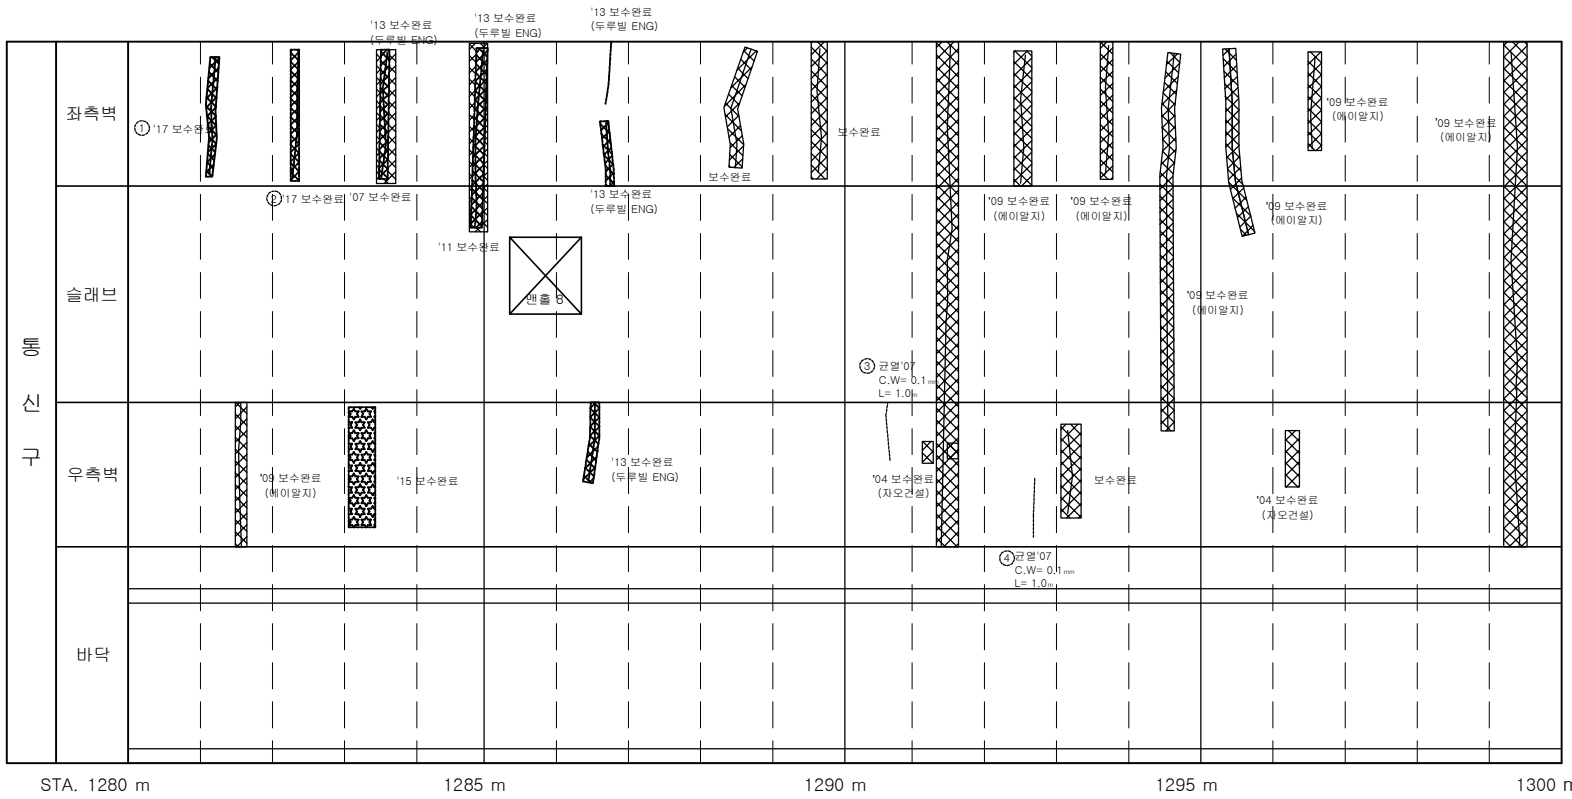

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1	2017	표면처리공법	2.64	
2	2007	균열	0.20	2.10		2.10	m	1	2017	표면처리공법	2.52	
3	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
4	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1300 m ~1320 m) 통신구 구간



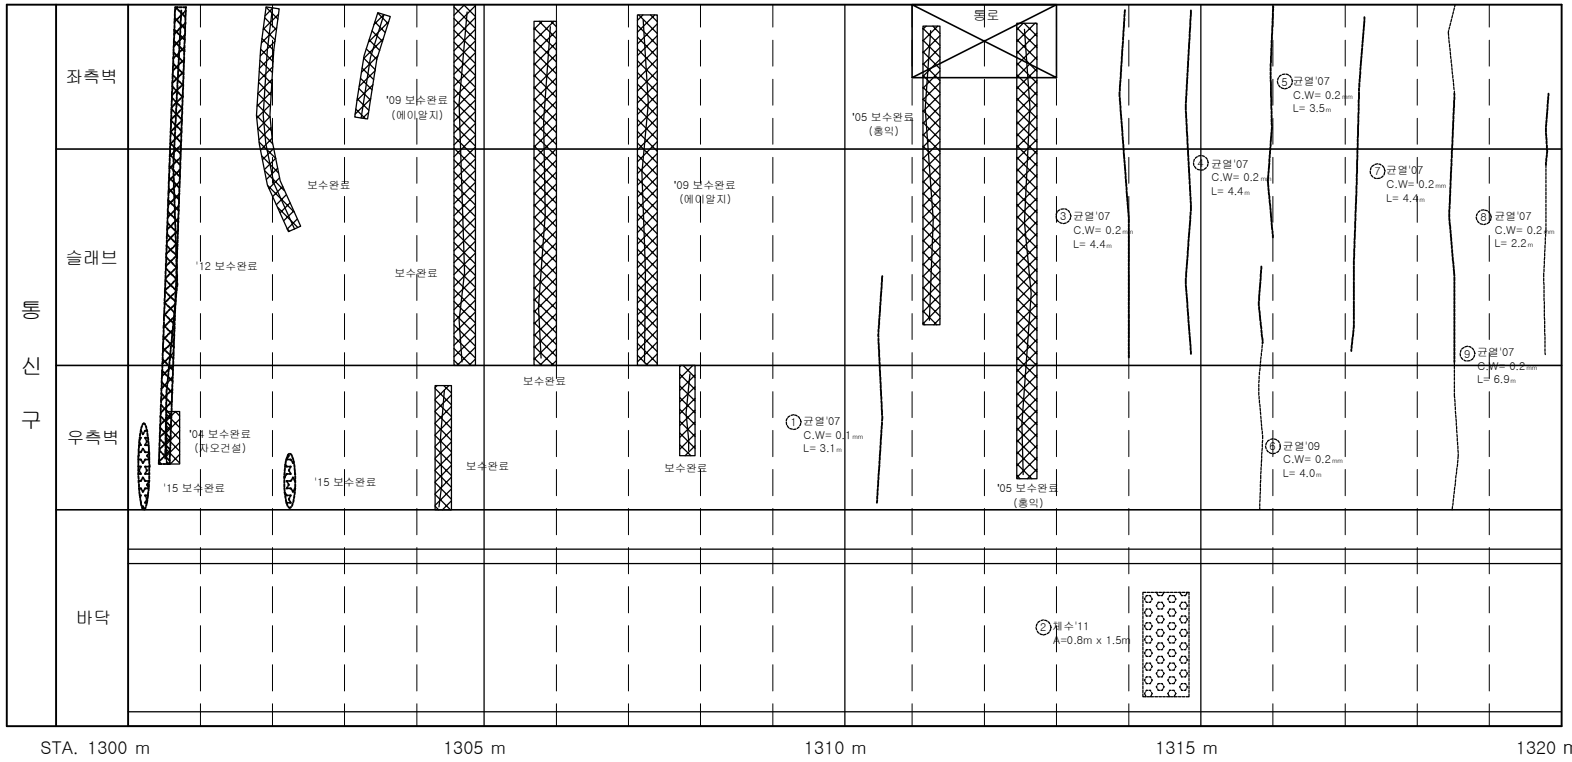

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2007	균열	0.10	3.10		3.10	m	1				
2	2011	체수		1.20		1.20	㎡	1				
3	2007	균열	0.20	4.40		4.40	m	1				
4	2007	균열	0.20	4.40		4.40	m	1				
5	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
6	2009	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
7	2007	균열	0.20	4.40		4.40	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
9	2007	균열	0.20	6.90		6.90	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1320 m ~1340 m) 통신구 구간





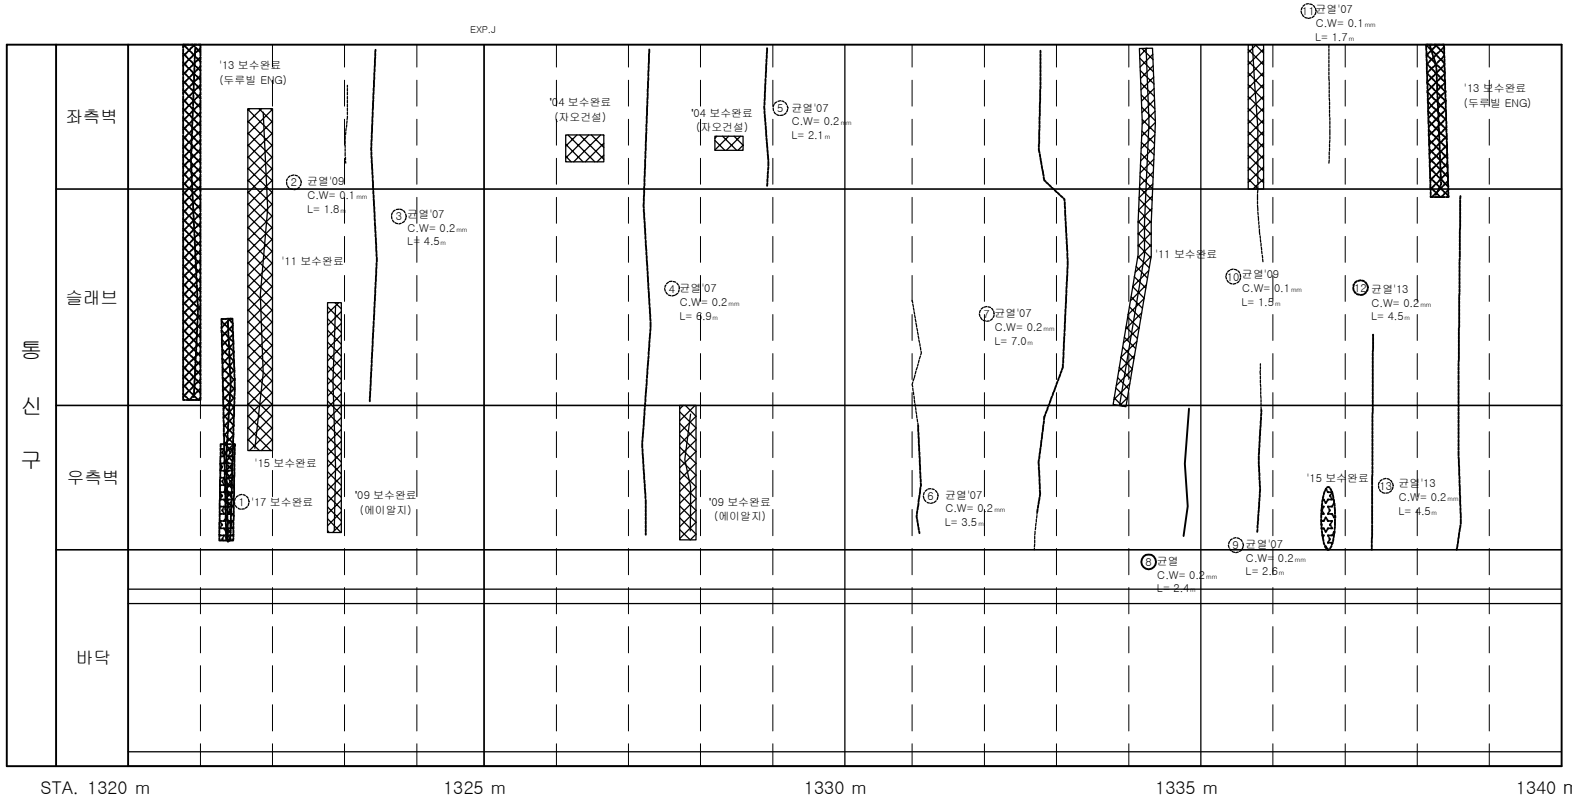

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.10	3.00		3.00	m	1	2017	표면처리공법	3.60	
2	2009	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
3	2007	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
4	2007	균열	0.20	6.90		6.90	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.10		2.10	m	1				
6	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
7	2007	균열	0.20	7.00		7.00	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
9	2007	균열	0.20	2.60		2.60	m	1				
10	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
11	2007	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
12	2013	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
13	2013	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1340 m ~1360 m) 통신구 구간

KEYPLAN



SECTION 9-9



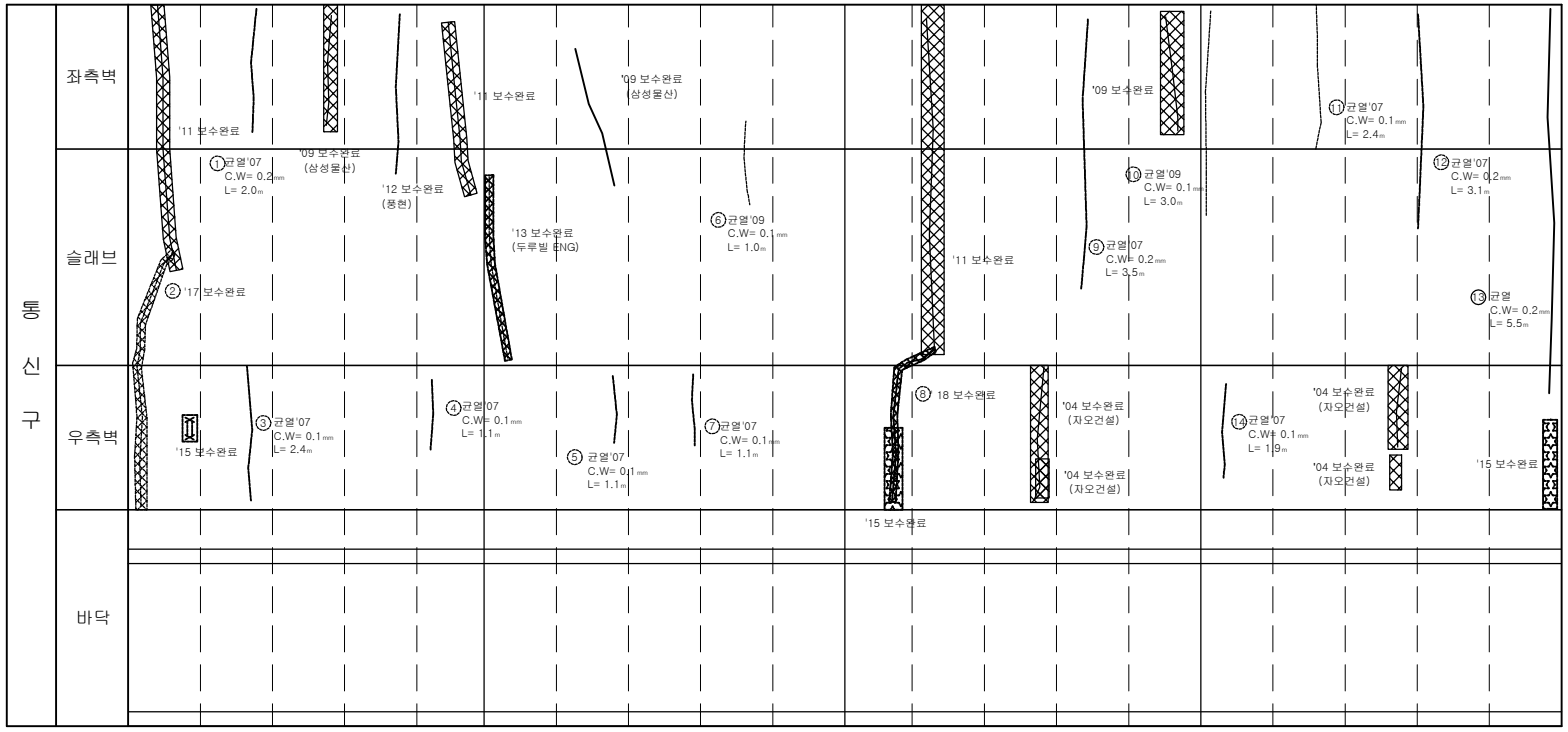

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
2	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1	2017	표면처리공법	4.20	
3	2007	균열	0.10	2.40		2.40	m	1				
4	2007	균열	0.10	1.10		1.10	m	1				
5	2007	균열	0.10	1.10		1.10	m	1				
6	2009	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
7	2007	균열	0.10	1.10		1.10	m	1				
8	2007	균열부백태	0.20	2.40		0.48	㎡	1	2018	표면처리공법	0.58	
9	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
10	2009	균열	0.10	3.00		3.00	m	1				
11	2007	균열	0.10	2.40		2.40	m	1				
12	2007	균열	0.20	3.10		3.10	m	1				
13	2007	균열	0.20	5.50		5.50	m	1				
14	2007	균열	0.10	1.90		1.90	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1360 m ~1380 m) 통신구 구간

KEY PLAN



SECTION 9-9



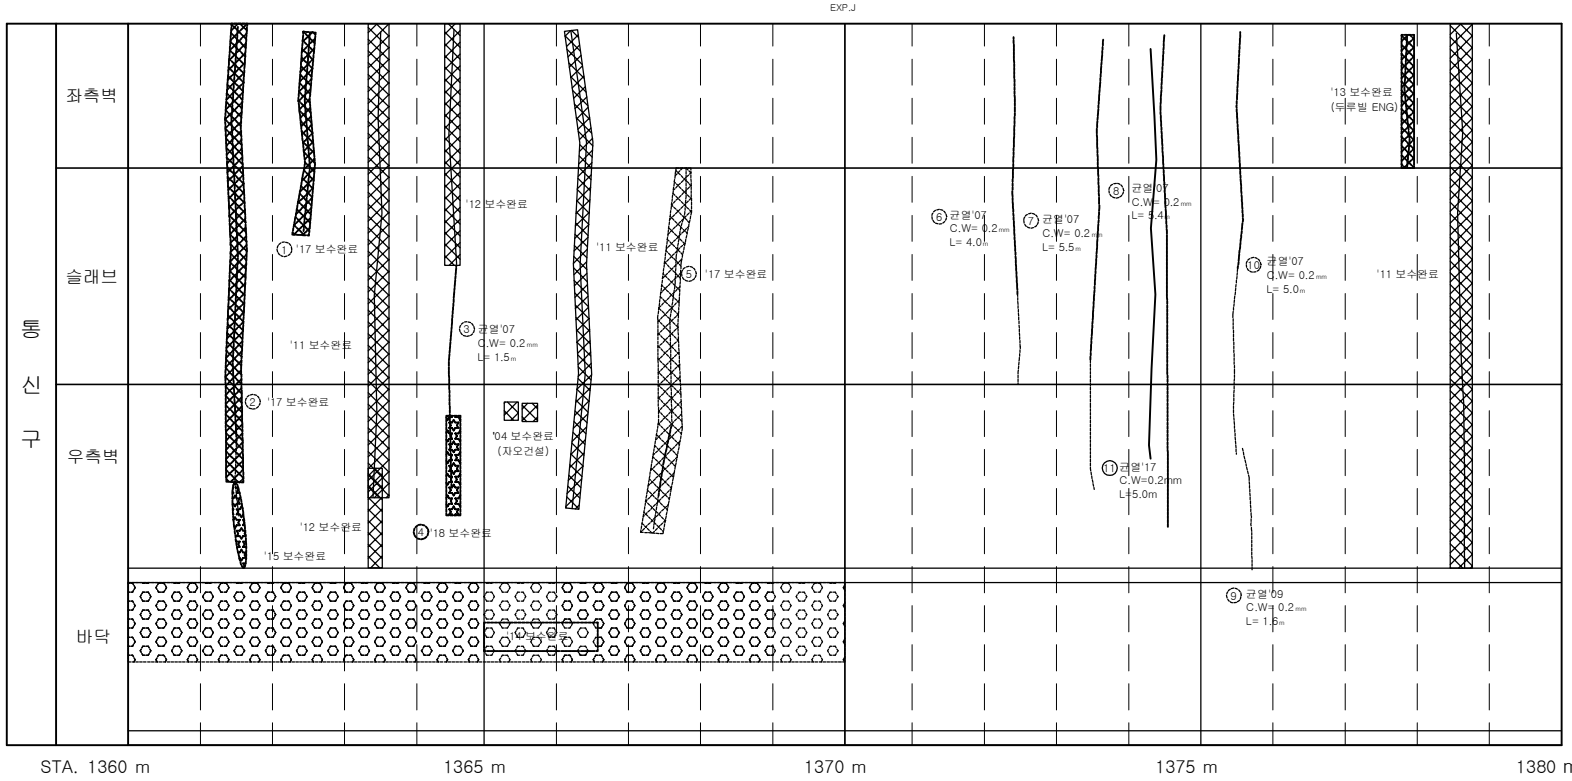

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	3.30		3.30	m	1	2017	표면처리공법	3.96	
2	2007	균열	0.20	6.90		6.90	m	1	2017	표면처리공법	8.28	
3	2007	균열	0.20	6.70		6.70	m	1				
4	2009	박태	0.25	1.50		0.38	㎡	1	2018	표면처리공법	0.46	
5	2009	균열	0.20	4.50		4.50	m	1	2017	표면처리공법	5.40	
6	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
7	2007	균열	0.20	5.50		5.50	m	1				
8	2007	균열	0.20	5.40		5.40	m	1				
9	2009	균열	0.20	1.60		1.60	m	1				
10	2007	균열	0.20	5.00		5.00	m	1				
11	2017	균열	0.20	5.00		5.00	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1380 m ~1400 m) 통신구 구간





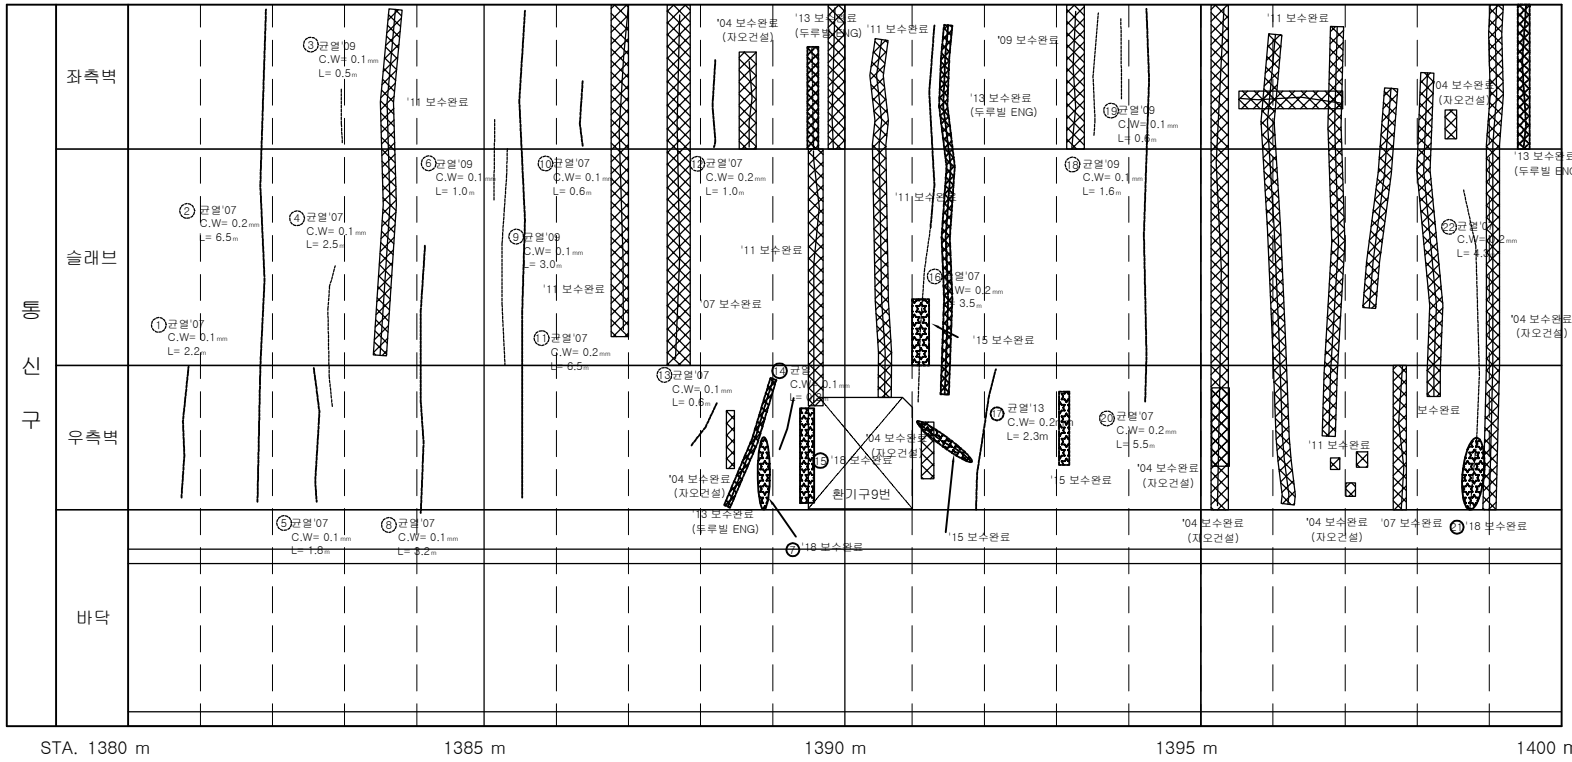

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량		
1	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
2	2007	균열	0.10	6.50		6.50	m	1				
3	2009	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
4	2007	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				
5	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
6	2009	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
7	2013	박태	0.10	1.20		0.12	㎡	1	2018	표면처리공법	0.14	
8	2007	균열	0.10	3.20		3.20	m	1				
9	2009	균열	0.10	3.00		3.00	m	1				
10	2007	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
11	2007	균열	0.20	6.50		6.50	m	1				
12	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
13	2007	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
14	2007	균열	0.10	0.30		0.30	m	1				
15	2009	박태	0.10	1.00		0.10	㎡	1	2018	표면처리공법	0.12	
16	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
17	2013	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
18	2009	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
19	2009	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
20	2007	균열	0.20	5.50		5.50	m	1				
21	2013	박태	0.20	1.00		0.20	㎡	1	2018	표면처리공법	0.24	
22	2007	균열	0.20	4.30		4.30	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락공동구 - 중대로(STA.1390m)환기구 9번

KEYPLAN



SECTION



BOX A

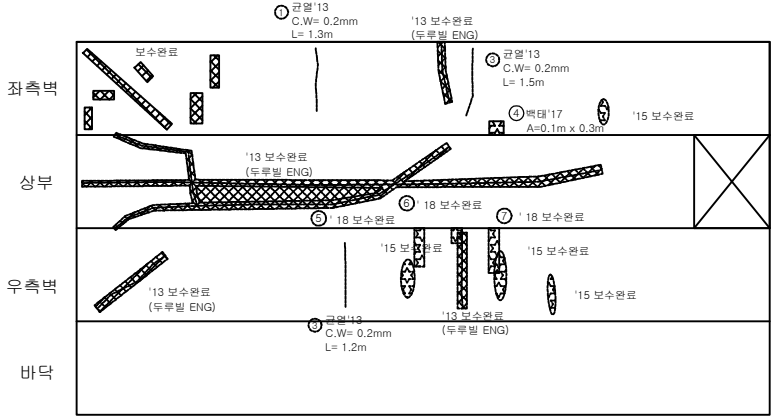

BOX A'

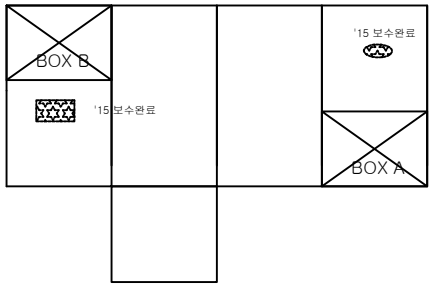

손 상 물 량 표

번호	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량	
1	2013	균열	0.20	1.30		1.30	m	1			
2	2013	균열	0.20	1.50		1.50	m	1			
3	2013	균열	0.20	1.20		1.20	m	1			
4	2017	백태	0.10	0.30		0.03	㎡	1			
5	2017	백태	0.20	1.00		0.20	㎡	1	2018	표면처리공법	0.24
6	2017	백태	0.10	0.10		0.01	㎡	1	2018	표면처리공법	0.01
7	2017	백태	0.20	1.00		0.20	㎡	1	2018	표면처리공법	0.24

BOX B



BOX C

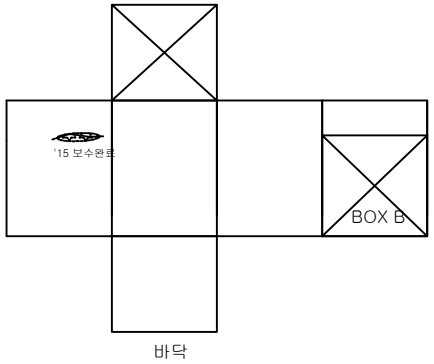

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 환기구 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1400 m ~1420 m) 통신구 구간



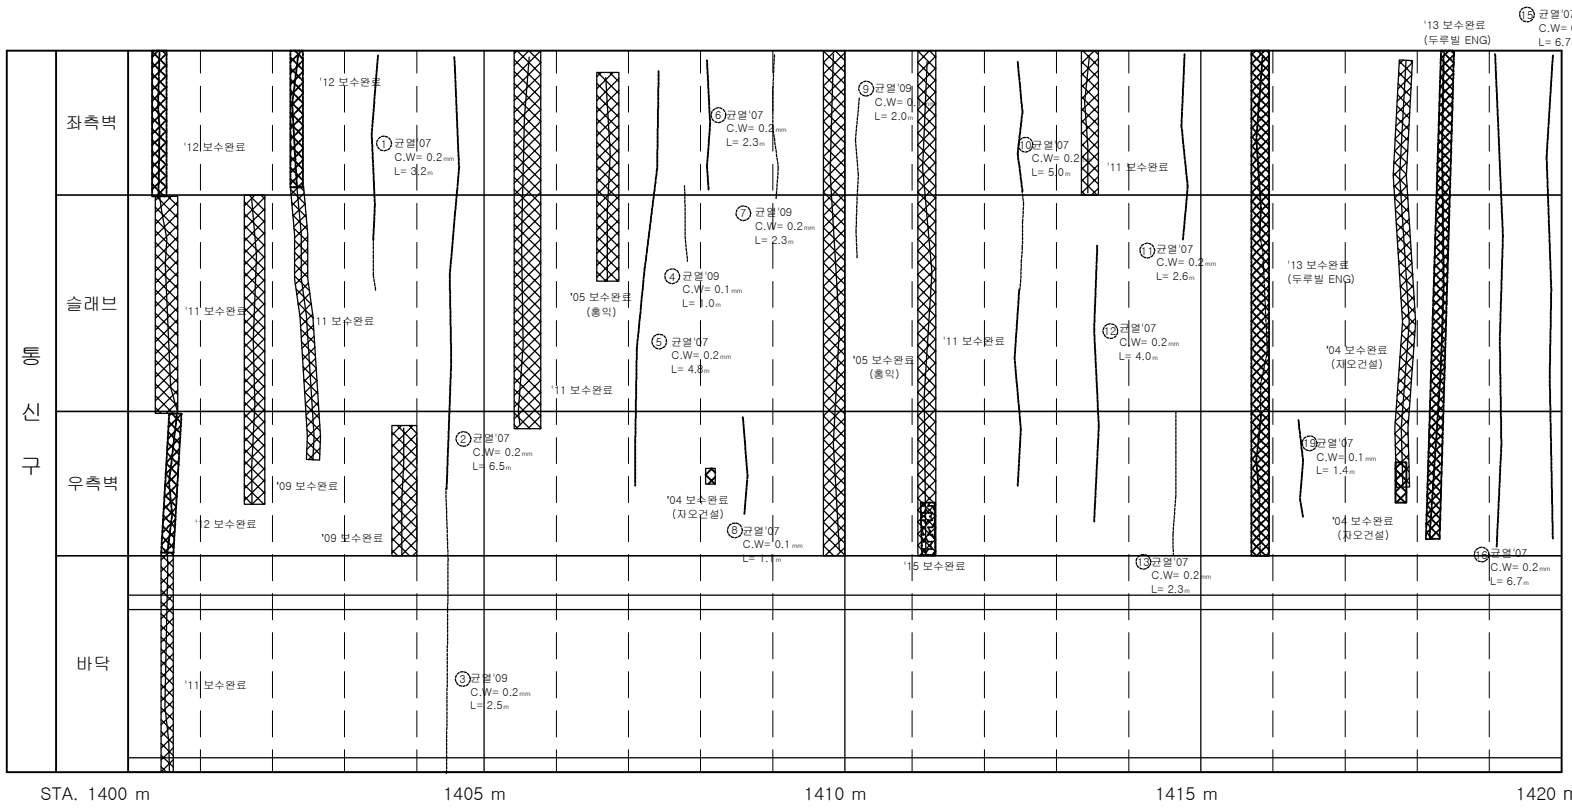

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소보수년도	공법명/자재명	중량		
1	2007	균열	0.20	3.20		3.20	m	1				
2	2007	균열	0.20	6.50		6.50	m	1				
3	2009	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
4	2009	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
5	2007	균열	0.20	4.80		4.80	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
7	2009	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
8	2007	균열	0.10	1.10		1.10	m	1				
9	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
10	2007	균열	0.20	5.00		5.00	m	1				
11	2007	균열	0.20	2.60		2.60	m	1				
12	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
13	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
14	2007	균열	0.10	1.40		1.40	m	1				
15	2007	균열	0.20	6.70		6.70	m	1				
16	2007	균열	0.20	6.70		6.70	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1420 m ~1440 m) 통신구 구간

KEY PLAN

SECTION 9-9



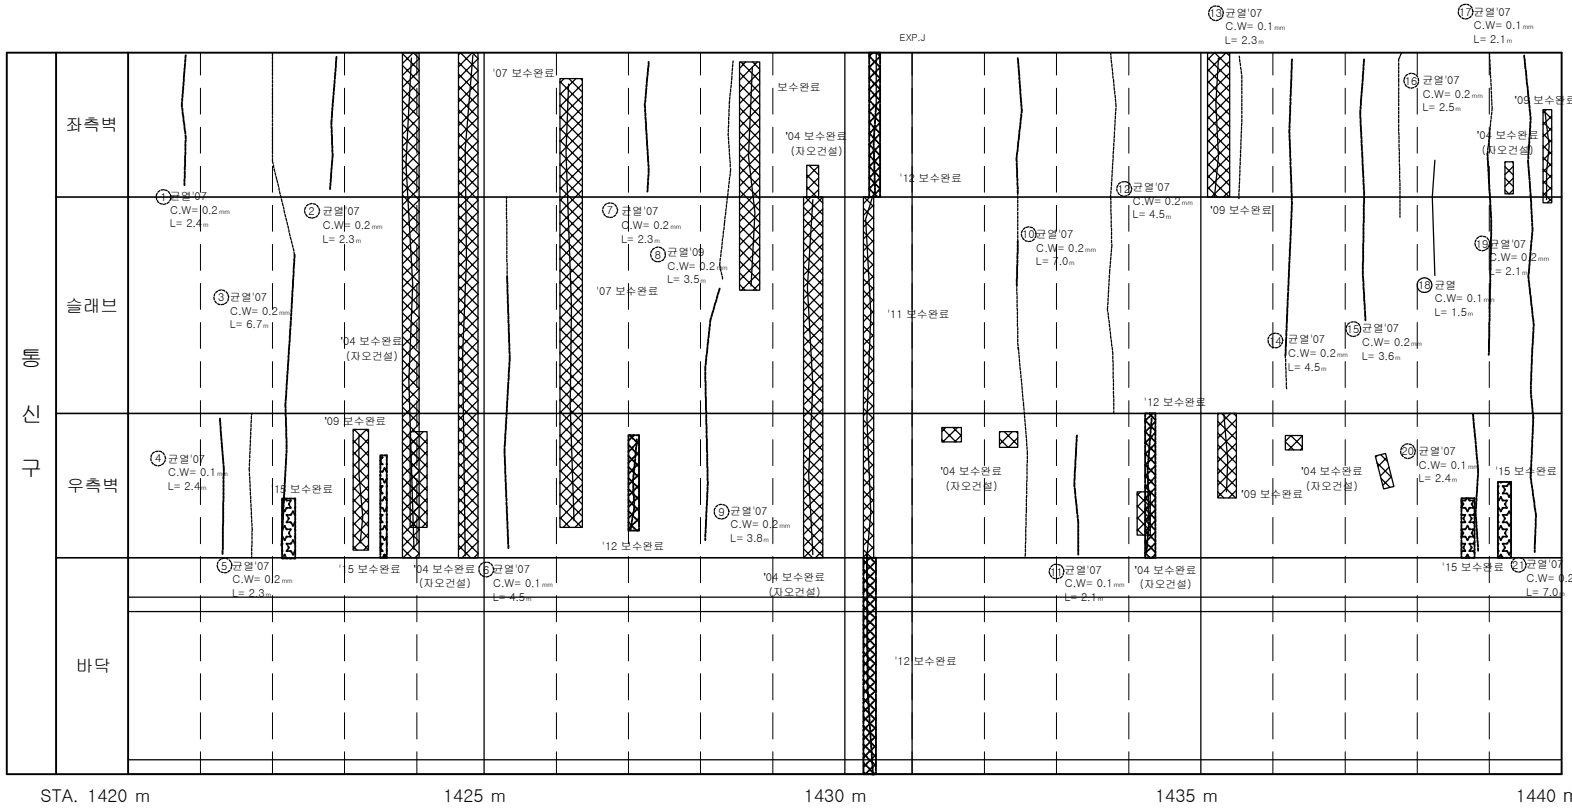

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
2	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
3	2007	균열	0.20	6.70		6.70	m	1				
4	2007	균열	0.10	2.40		2.40	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
6	2007	균열	0.10	4.50		4.50	m	1				
7	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
8	2009	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
9	2007	균열	0.20	3.80		3.80	m	1				
10	2007	균열	0.10	7.00		7.00	m	1				
11	2007	균열	0.10	2.10		2.10	m	1				
12	2007	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
13	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
14	2007	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
15	2007	균열	0.20	3.60		3.60	m	1				
16	2007	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				
17	2007	균열	0.10	2.10		2.10	m	1				
18	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
19	2007	균열	0.20	2.10		2.10	m	1				
20	2007	균열	0.10	2.40		2.40	m	1				
21	2007	균열	0.20	7.00		7.00	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1440 m ~1460 m) 통신구 구간

KEYPLAN

SECTION 9-9



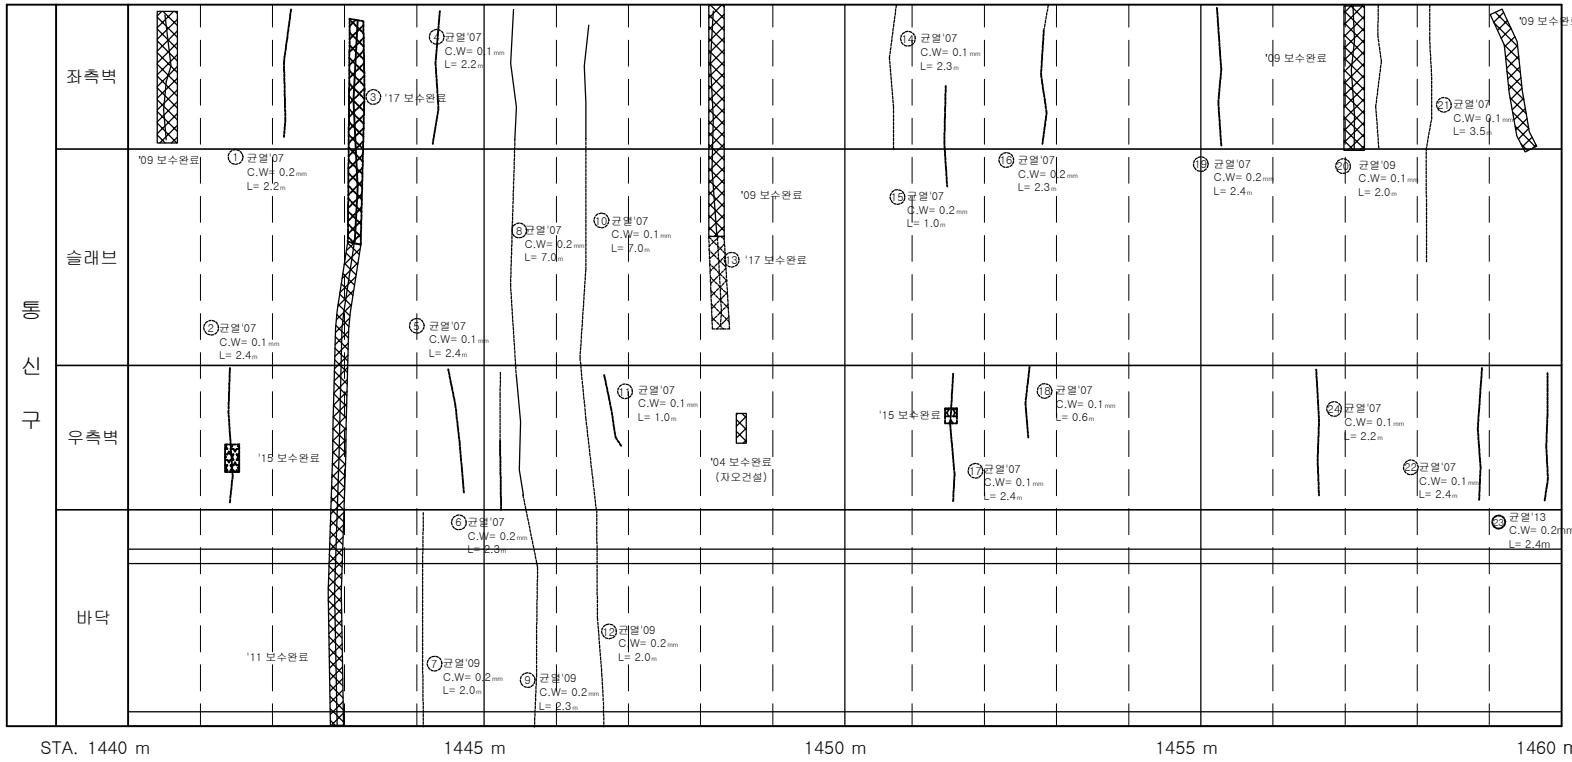

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1			
2	2007	균열	0.10	2.40		2.40	m	1			
3	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1	2017	표면처리공법	3.60	
4	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
5	2007	균열	0.10	2.40		2.40	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
7	2009	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
8	2007	균열	0.20	7.00		7.00	m	1				
9	2009	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
10	2007	균열	0.10	7.00		7.00	m	1				
11	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
12	2009	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
13	2009	균열	0.10	1.00		1.00	m	1	2017	표면처리공법	1.20	
14	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
15	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
16	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
17	2007	균열	0.10	2.40		2.40	m	1				
18	2007	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
19	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
20	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
21	2007	균열	0.10	3.50		3.50	m	1				
22	2007	균열	0.10	2.40		2.40	m	1				
23	2013	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
24	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1460 m ~1480 m) 통신구 구간

KEY PLAN

SECTION 9-9



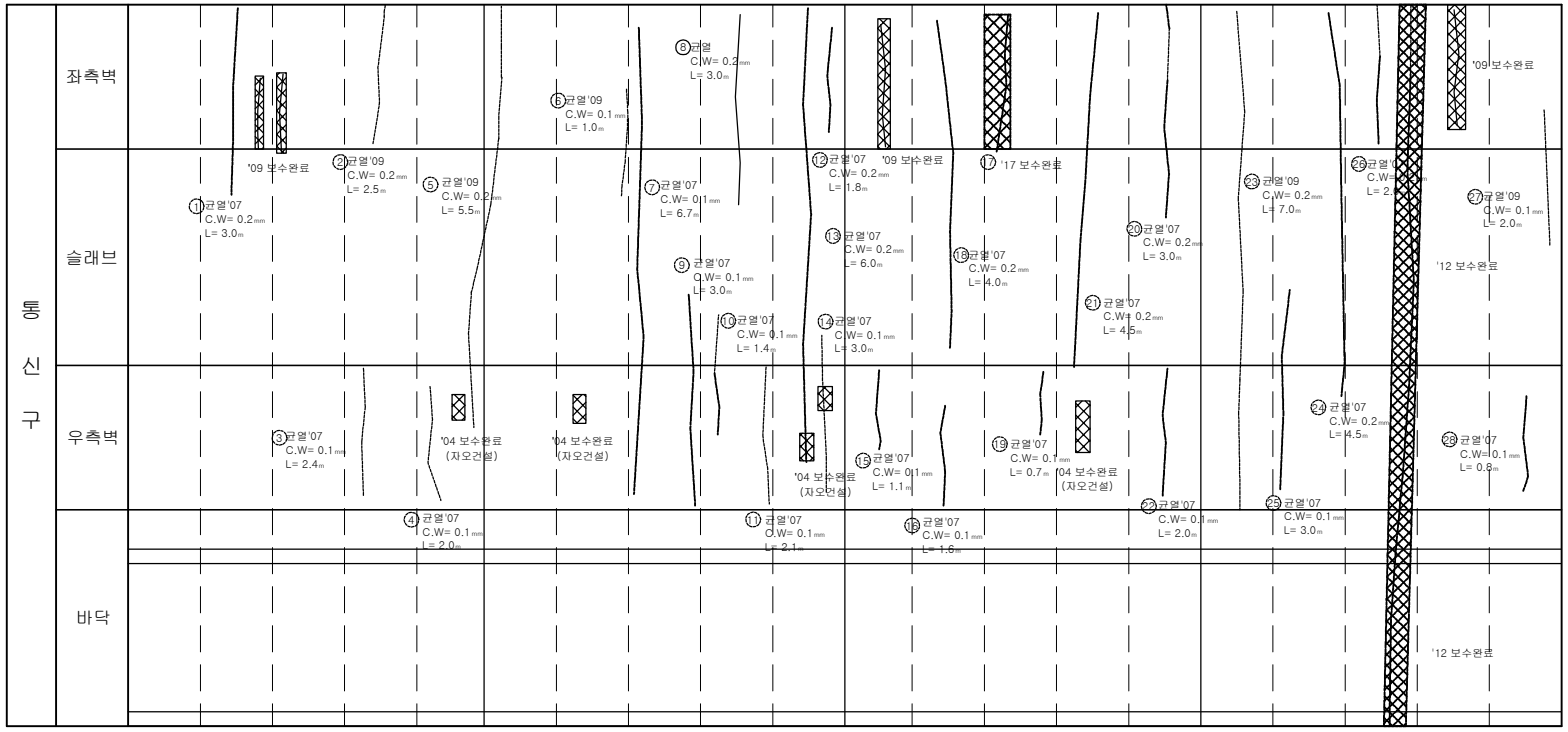

손 상 물 량 표

번호	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
2	2009	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
3	2007	균열	0.10	2.40		2.40	m	1				
4	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
5	2009	균열	0.20	5.50		5.50	m	1				
6	2009	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
7	2007	균열	0.10	6.70		6.70	m	1				
8	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
9	2007	균열	0.10	3.00		3.00	m	1				
10	2007	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
11	2007	균열	0.10	2.10		2.10	m	1				
12	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
13	2007	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
14	2007	균열	0.10	3.00		3.00	m	1				
15	2007	균열	0.10	1.10		1.10	m	1				
16	2007	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
17	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1	2017	표면처리공법	2.40	
18	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
19	2007	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
20	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
21	2007	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
22	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
23	2009	균열	0.20	7.00		7.00	m	1				
24	2007	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
25	2007	균열	0.10	3.00		3.00	m	1				
26	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
27	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
28	2007	균열	0.10	0.80		0.80	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1480 m ~1500 m) 통신구 구간

KEYPLAN

SECTION 9-9



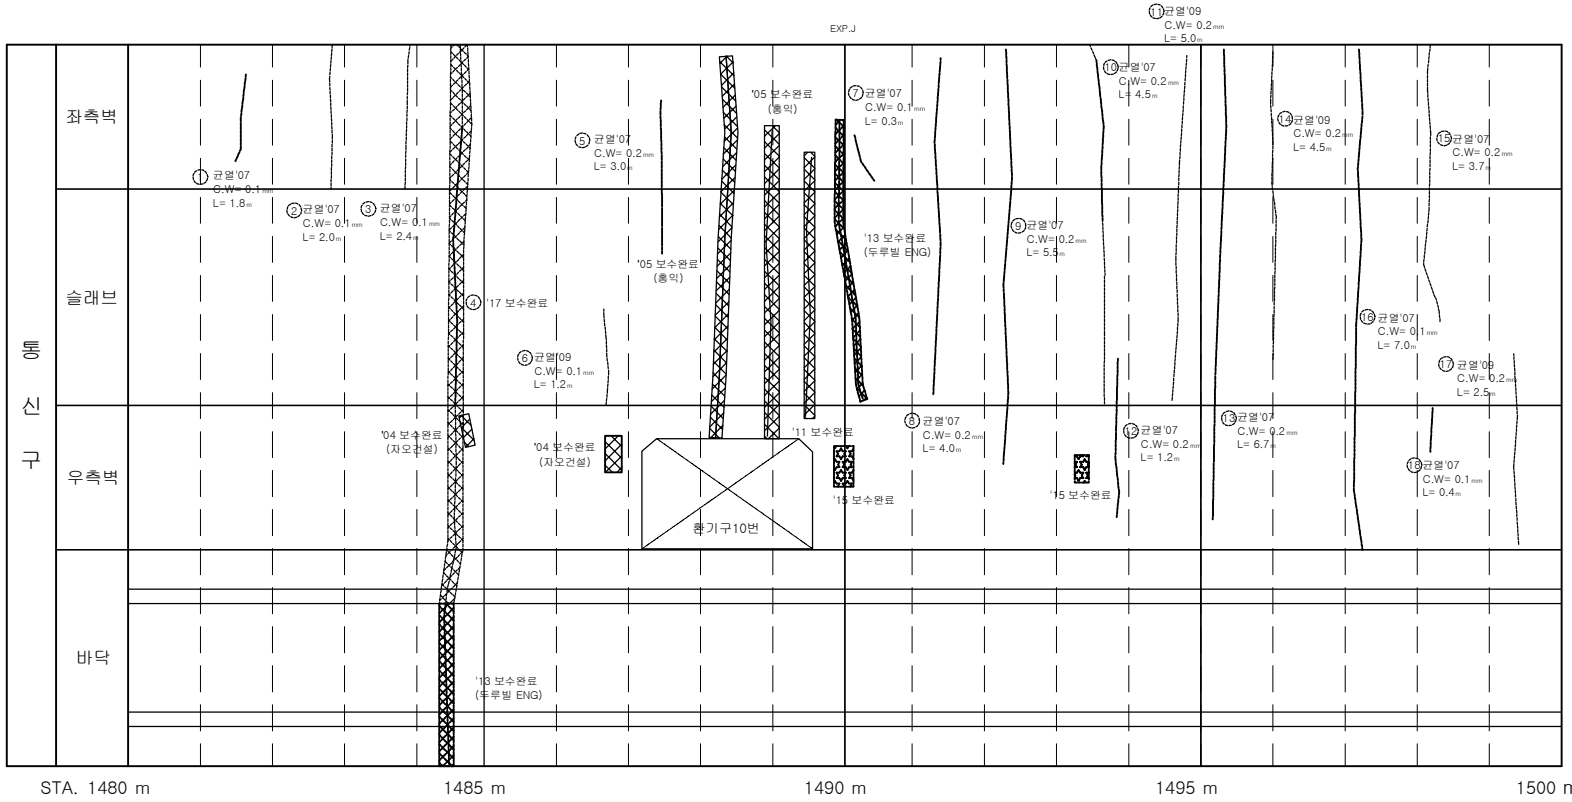

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량		
1	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
2	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
3	2007	균열	0.10	2.40		2.40	m	1				
4	2007	균열	0.10	7.00		7.00	m	1	2017	표면처리공법	8.40	
5	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
6	2009	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
7	2007	균열	0.10	0.30		0.30	m	1				
8	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
9	2007	균열	0.20	5.50		5.50	m	1				
10	2007	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
11	2009	균열	0.20	5.00		5.00	m	1				
12	2007	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
13	2007	균열	0.20	6.70		6.70	m	1				
14	2009	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
15	2007	균열	0.20	3.70		3.70	m	1				
16	2007	균열	0.10	7.00		7.00	m	1				
17	2009	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
18	2007	균열	0.10	0.40		0.40	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락공동구 - 중대로(STA.1488m)환기구 10번

KEYPLAN



SECTION



좌측벽 전면 우측벽 배면

BOX A

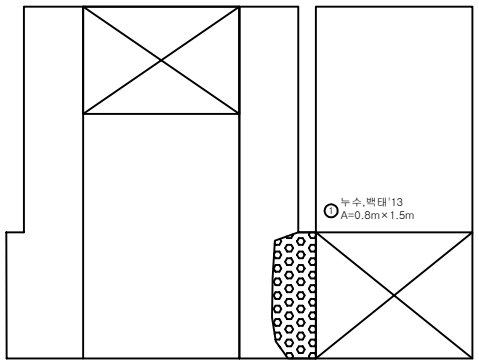

BOX B

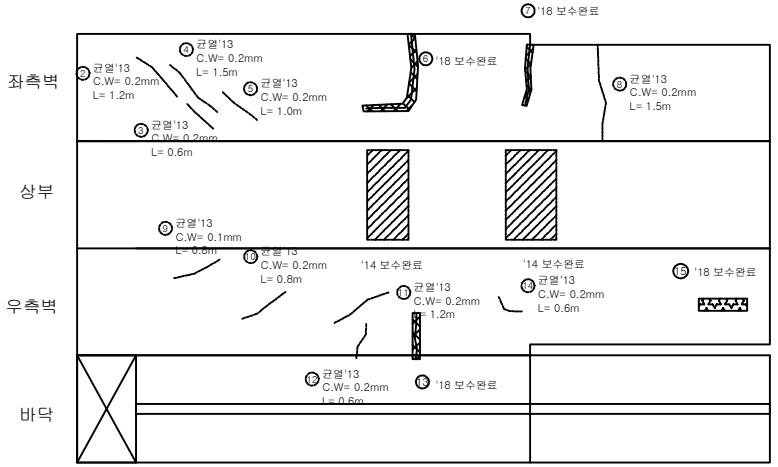

BOX C

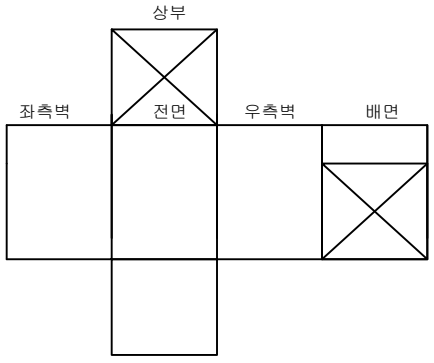

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2013	누수,백태	0.80	1.50		1.20	㎡	1				
2	2013	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
3	2013	균열	0.20	0.60		0.60	m	1				
4	2013	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
5	2013	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
6	2013	균열	0.30	2.10		2.10	m	1	2018	주입보수공법	2.52	중요
7	2013	균열	0.50	1.20		1.20	m	1	2018	주입보수공법	1.44	중요
8	2013	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
9	2013	균열	0.10	0.80		0.80	m	1				
10	2013	균열	0.20	0.80		0.80	m	1				
11	2013	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
12	2013	균열	0.20	0.60		0.60	m	1				
13	2013	균열	0.30	0.80		0.80	m	1	2018	주입보수공법	0.96	중요
14	2013	균열	0.20	0.60		0.60	m	1				
15	2017	백태	0.30	1.00		0.30	㎡	1	2018	표면처리공법	0.36	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 환기구 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1500 m ~1520 m) 통신구 구간

KEY PLAN

SECTION 9-9



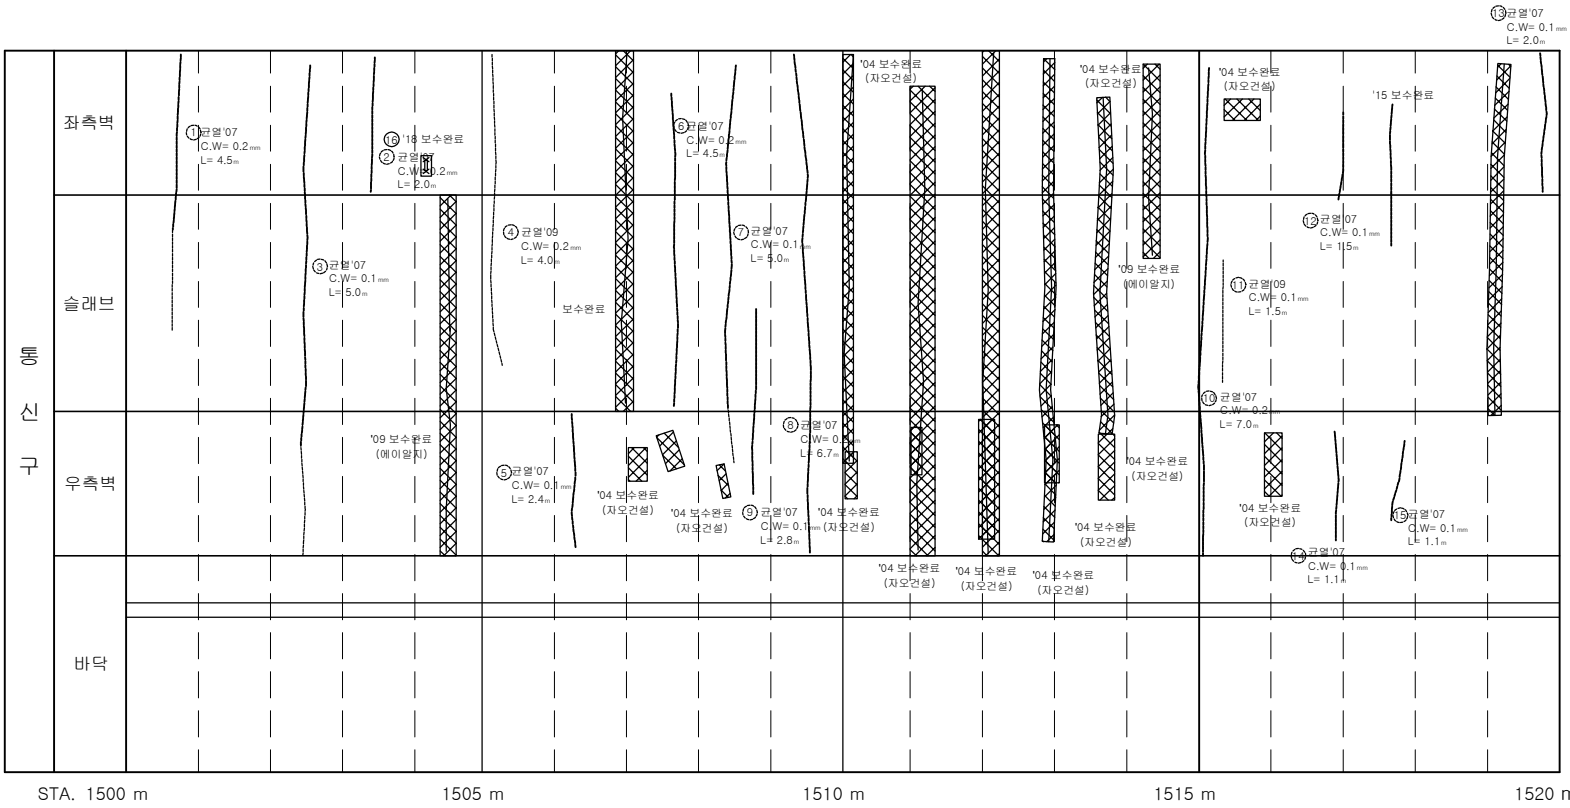

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량		
1	2007	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
2	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
3	2007	균열	0.10	5.00		5.00	m	1				
4	2009	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
5	2007	균열	0.10	2.40		2.40	m	1				
6	2007	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
7	2007	균열	0.10	5.00		5.00	m	1				
8	2007	균열	0.20	6.70		6.70	m	1				
9	2007	균열	0.10	2.80		2.80	m	1				
10	2007	균열	0.20	7.00		7.00	m	1				
11	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
12	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
13	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
14	2007	균열	0.10	1.10		1.10	m	1				
15	2007	균열	0.10	1.10		1.10	m	1				
16	2017	철근노출	0.10	0.20		0.02	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.02	중요

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1520 m ~1540 m) 통신구 구간

KEYPLAN

SECTION 9-9



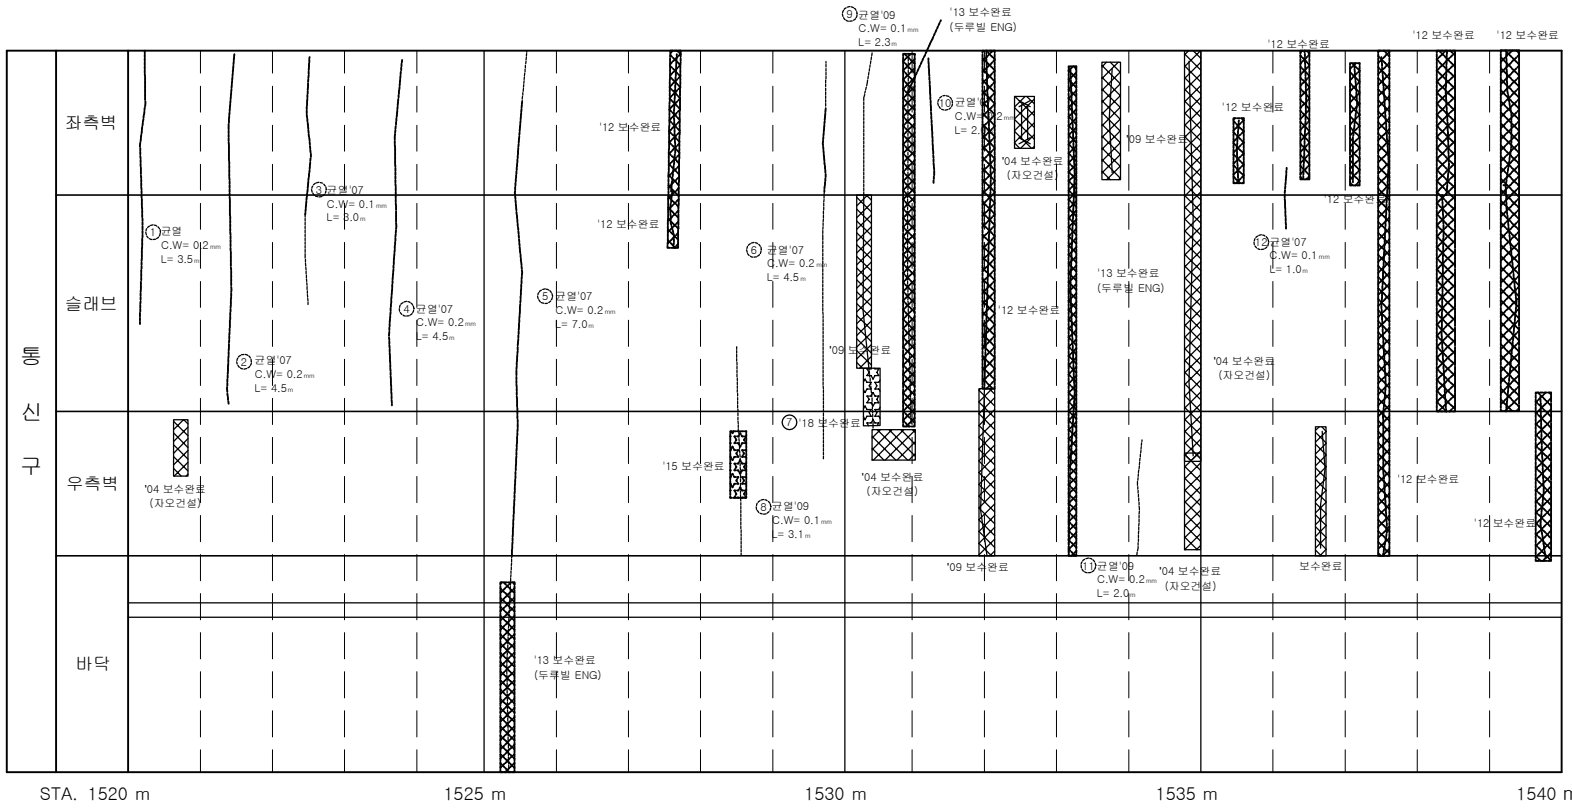

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
2	2007	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
3	2007	균열	0.10	3.00		3.00	m	1				
4	2007	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
5	2007	균열	0.20	7.00		7.00	m	1				
6	2007	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
7	2009	박태	0.10	0.25		0.03	㎡	1	2018	표면처리공법	0.04	
8	2009	균열	0.10	3.10		3.10	m	1				
9	2009	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
10	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
11	2009	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
12	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1540 m ~1560 m) 통신구 구간

KEY PLAN

SECTION 9-9



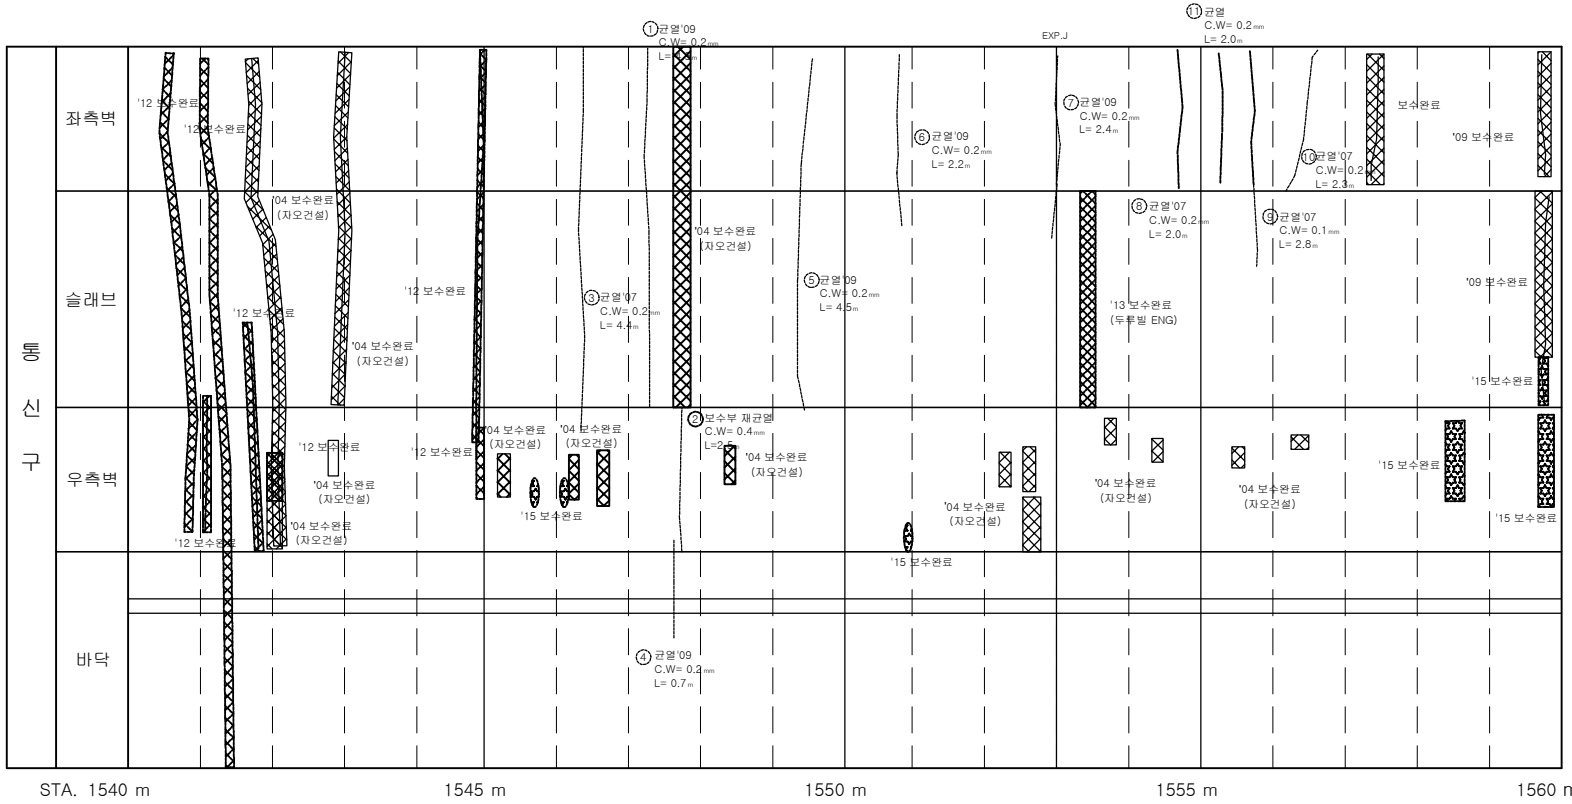

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량		
1	2009	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
2	2007	보수부균열	0.40	2.50		2.50	m	1				재결함
3	2007	균열	0.20	4.40		4.40	m	1				
4	2009	균열	0.20	0.70		0.70	m	1				
5	2009	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
6	2009	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
7	2009	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
9	2007	균열	0.10	2.80		2.80	m	1				
10	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
11	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1560 m ~1580 m) 통신구 구간

KEYPLAN

SECTION 9-9



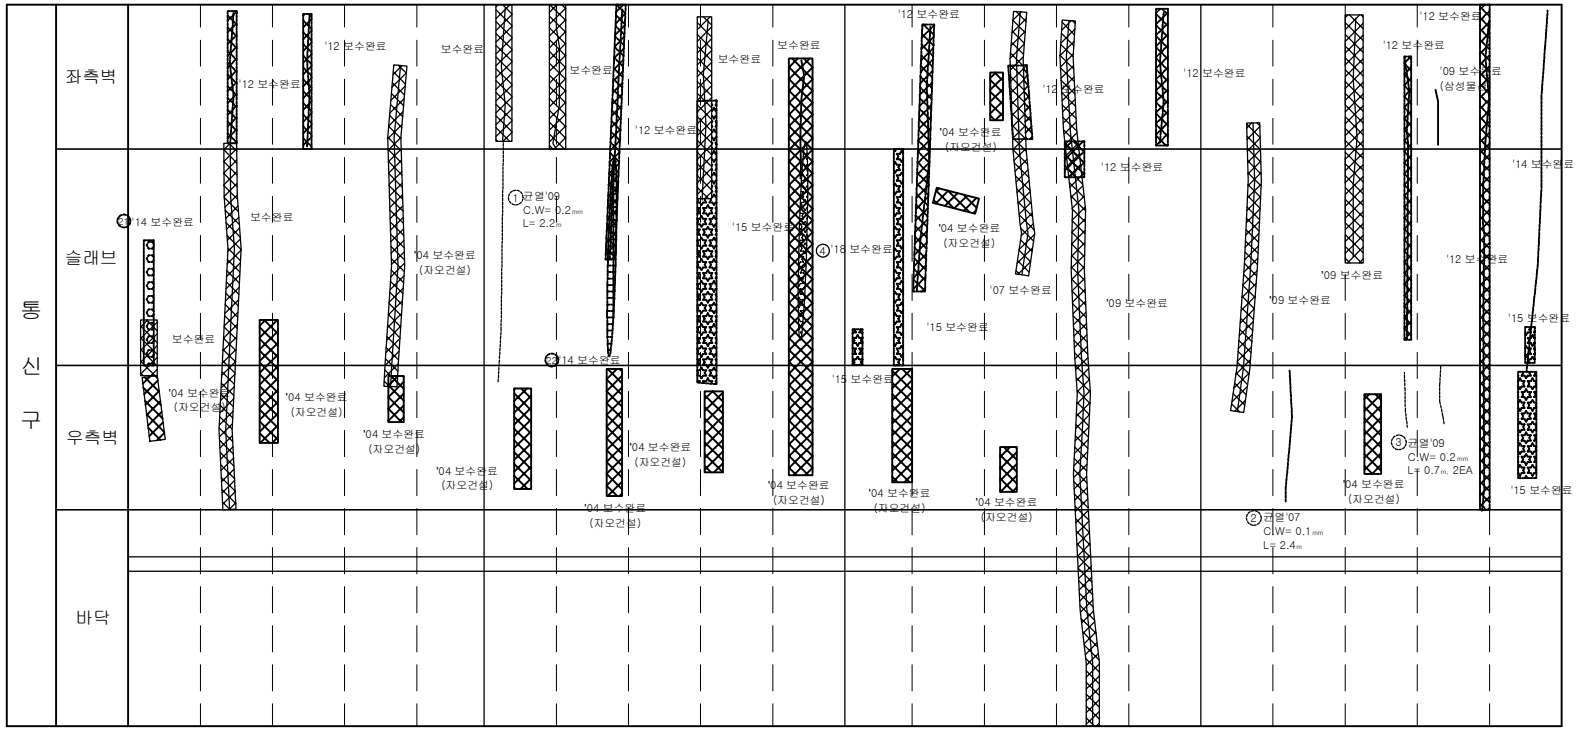

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2009	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
2	2007	균열	0.10	2.40		2.40	m	1				
3	2009	균열	0.20	1.40		2.80	m	2				
4	2013	박태	0.10	2.30		0.23	㎡	1	2018	표면처리공법	0.28	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1580 m ~1600 m) 통신구 구간

KEY PLAN

SECTION 9-9



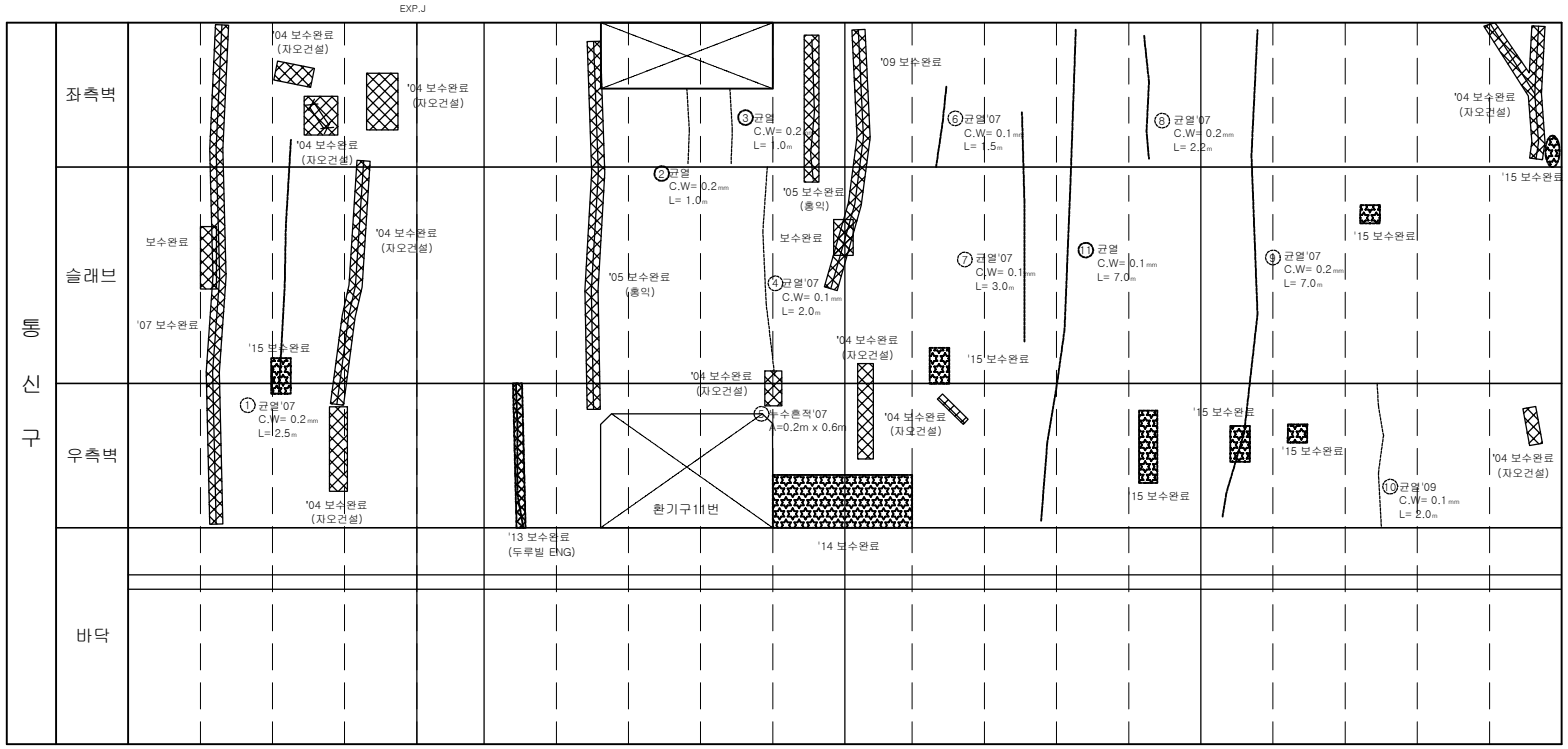

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량		
1	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
2	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
3	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
4	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
5	2007	누수흔적	0.20	0.60		0.12	㎡	1				
6	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
7	2007	균열	0.10	3.00		3.00	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
9	2007	균열	0.20	7.00		7.00	m	1				
10	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
11	2007	균열	0.10	7.00		7.00	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락공동구 - 중대로(STA.1588m)환기구 11번

KEYPLAN



SECTION



BOX A

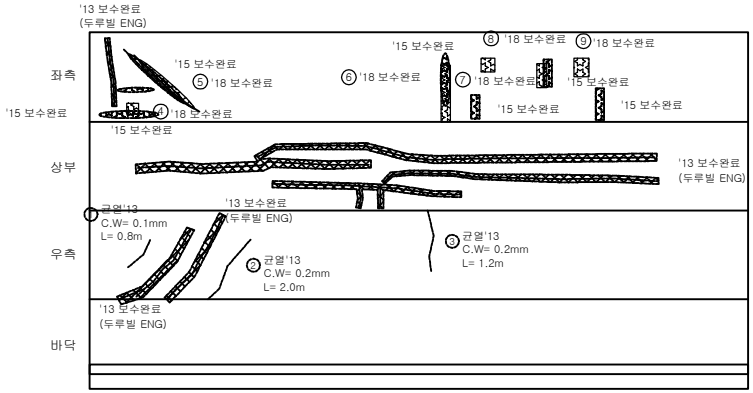

BOX B

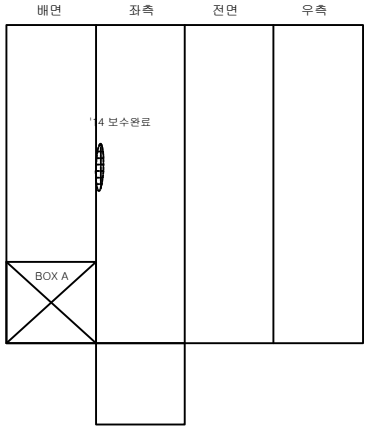

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2013	균열	0.10	0.80		0.80	m	1				
2	2013	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
3	2013	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
4	2017	박태	0.10	0.30		0.03	㎡	1	2018	표면처리공법	0.04	
5	2017	균열부박태	0.20	2.00		0.40	㎡	1	2018	표면처리공법	0.48	
6	2017	박태	0.10	1.20		0.12	㎡	1	2018	표면처리공법	0.14	
7	2017	박태	0.10	0.20		0.02	㎡	1	2018	표면처리공법	0.02	
8	2017	박태	0.10	0.60		0.06	㎡	1	2018	표면처리공법	0.07	
9	2017	박태	0.10	0.30		0.03	㎡	1	2018	표면처리공법	0.04	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 환기구 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1600 m ~1620 m) 통신구 구간

KEY PLAN

SECTION 9-9



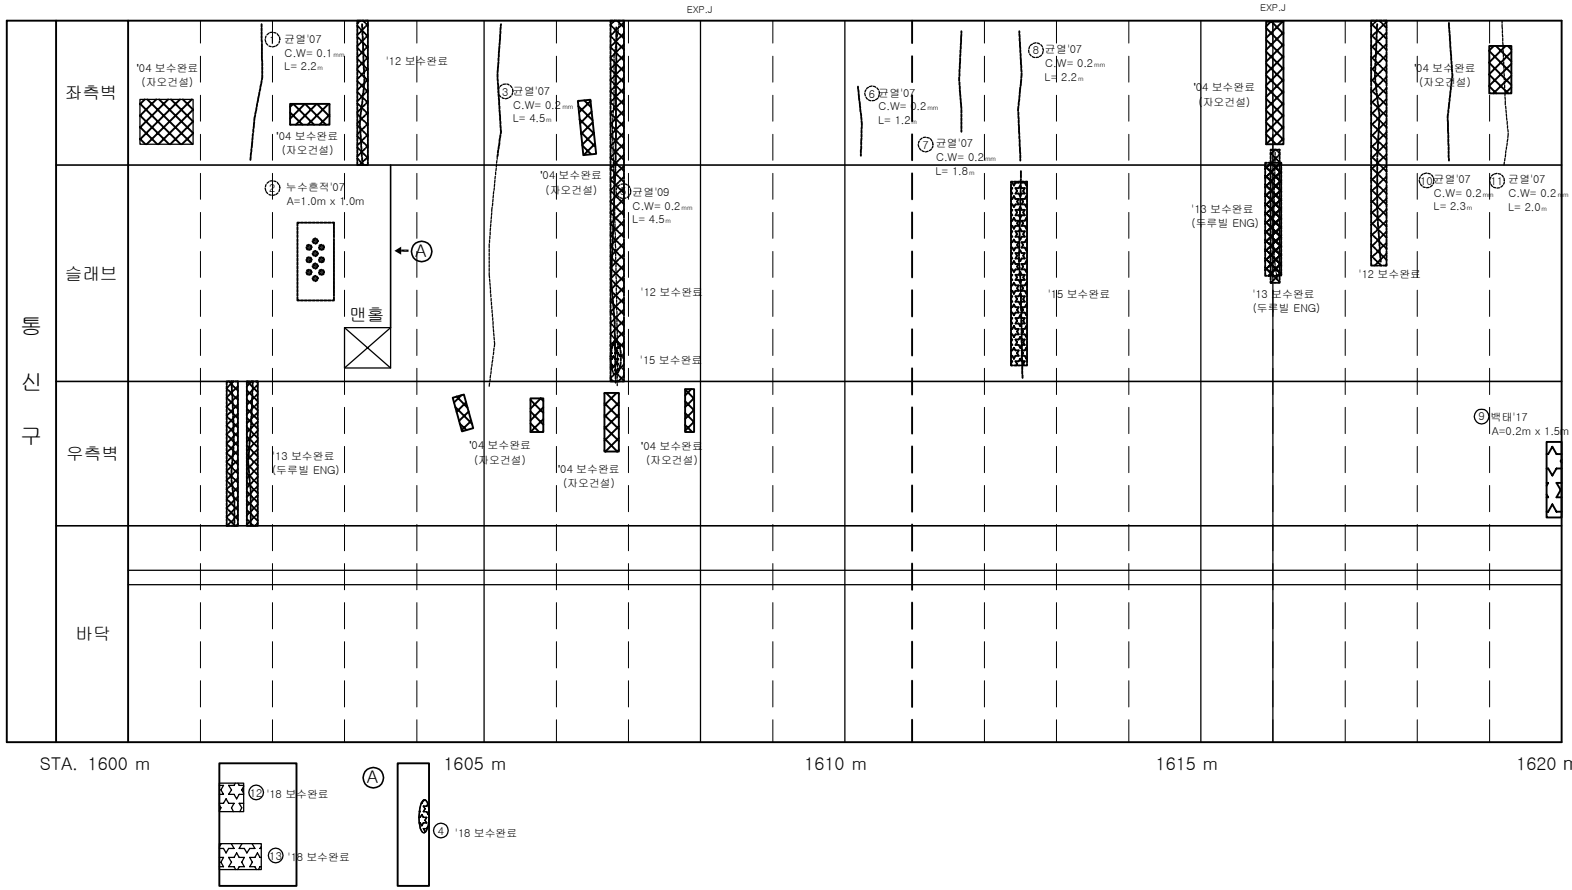

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
2	2007	누수흔적	1.00	1.00		1.00	㎡	1				
3	2007	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
4	2013	백태	0.20	0.50		0.10	㎡	1	2018	표면처리공법	0.12	
5	2009	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
6	2007	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
7	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
9	2017	백태	0.20	1.50		0.30	㎡	1				
10	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
11	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
12	2017	백태	0.30	0.40		0.12	㎡	1	2018	표면처리공법	0.14	
13	2017	백태	0.50	0.60		0.30	㎡	1	2018	표면처리공법	0.36	

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1620 m ~1640 m) 통신구 구간

KEY PLAN

SECTION 9-9



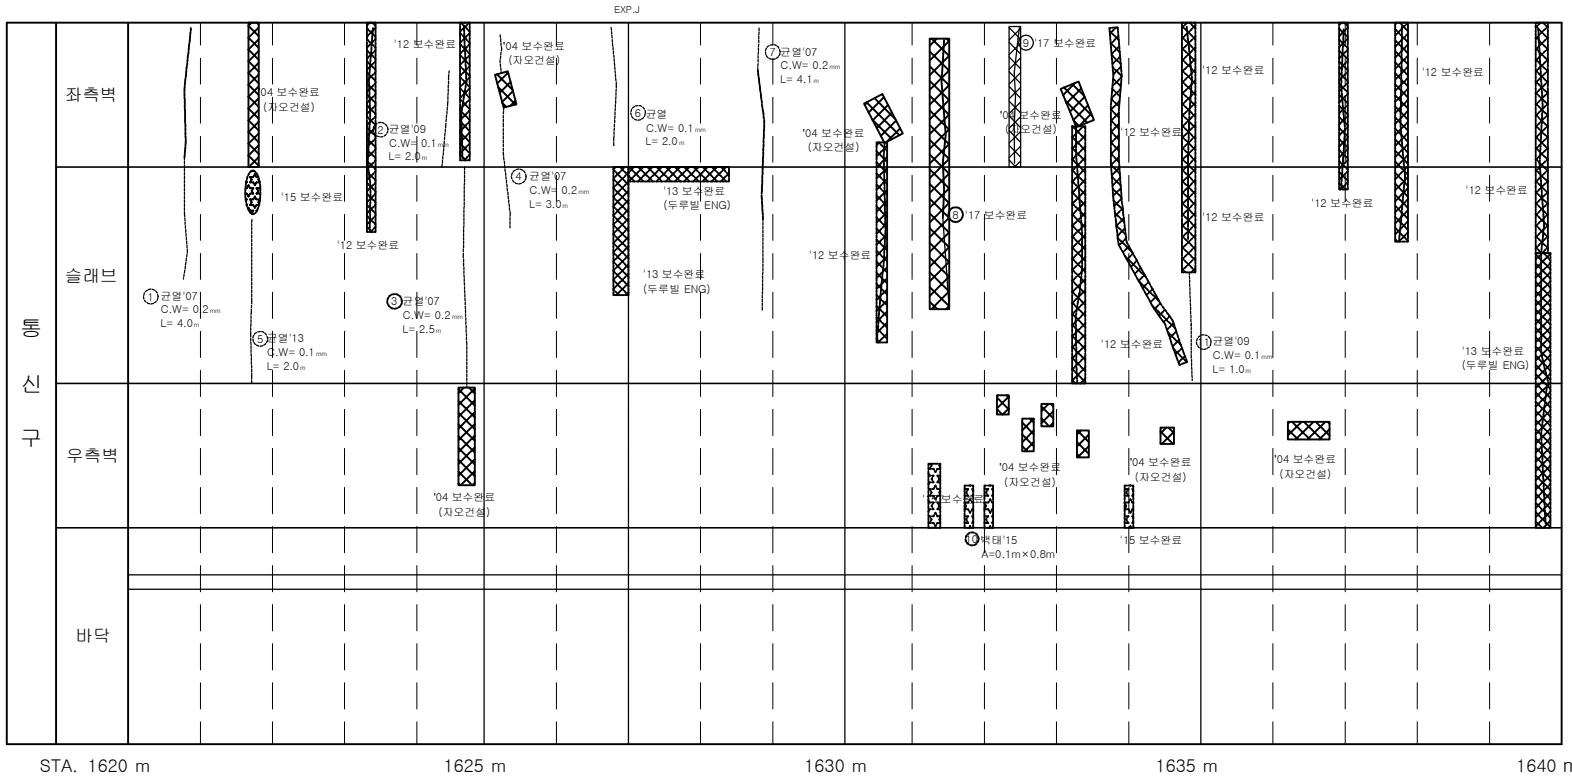

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
2	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
4	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
5	2013	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
6	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
7	2007	균열	0.20	4.10		4.10	m	1				
8	2007	균열	0.10	3.00		3.00	m	1	2017	표면처리공법	3.60	
9	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1	2017	표면처리공법	2.40	
10	2015	백태	0.10	0.80		0.16	㎡	2				
11	2009	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1640 m ~1660 m) 통신구 구간

KEY PLAN

SECTION 9-9



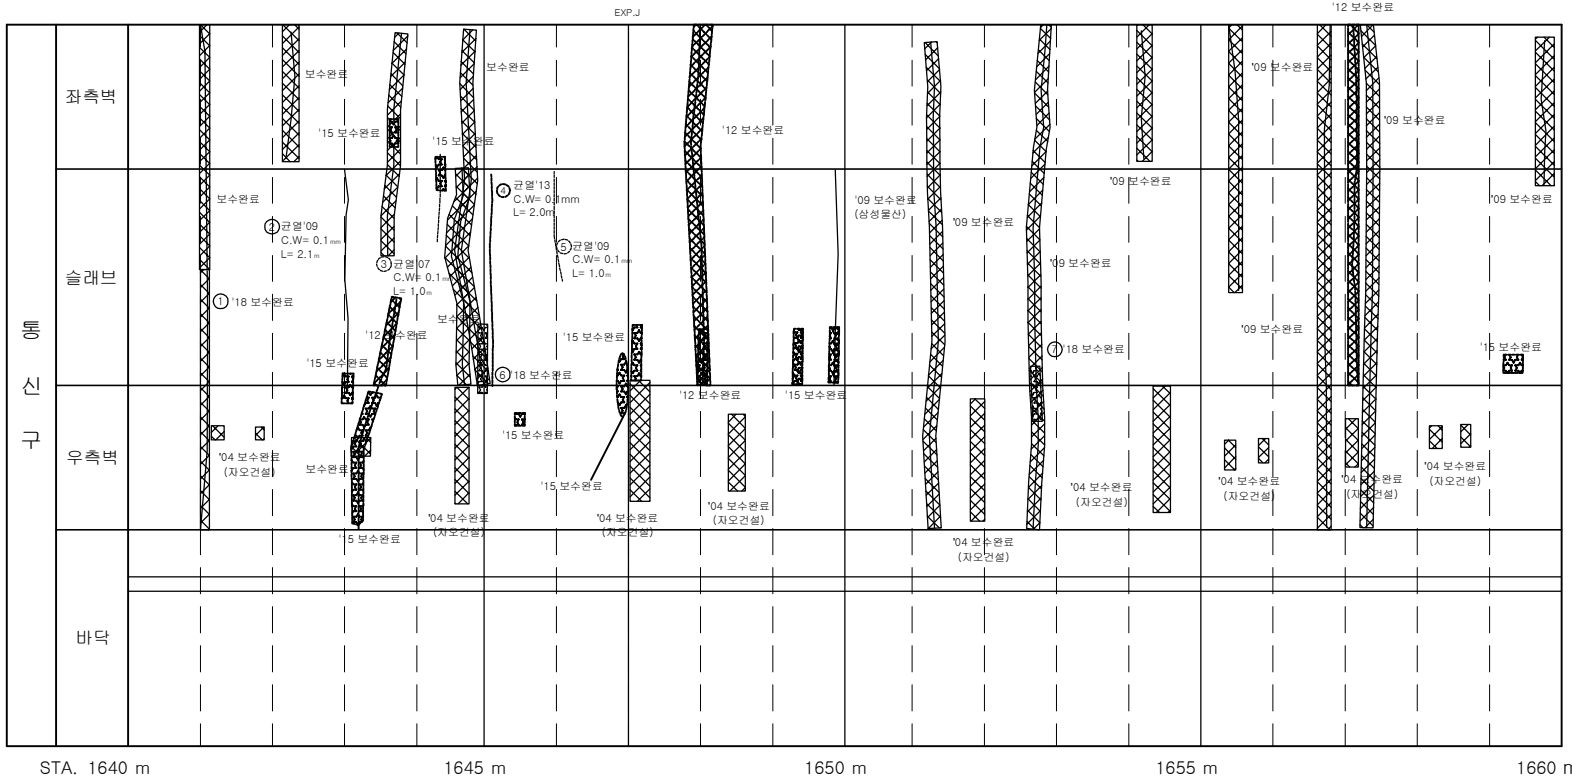

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열부백태	0.20	3.20		0.64	㎡	1	2018	표면처리공법	0.77	
2	2009	균열	0.10	2.10		2.10	m	1	2017	표면처리공법	2.52	
3	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
4	2013	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
5	2009	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
6	2009	백태	0.10	1.20		0.12	㎡	1	2018	표면처리공법	0.14	
7	2009	백태	0.10	0.50		0.05	㎡	1	2018	표면처리공법	0.06	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1660 m ~1680 m) 통신구 구간

KEY PLAN

SECTION 9-9



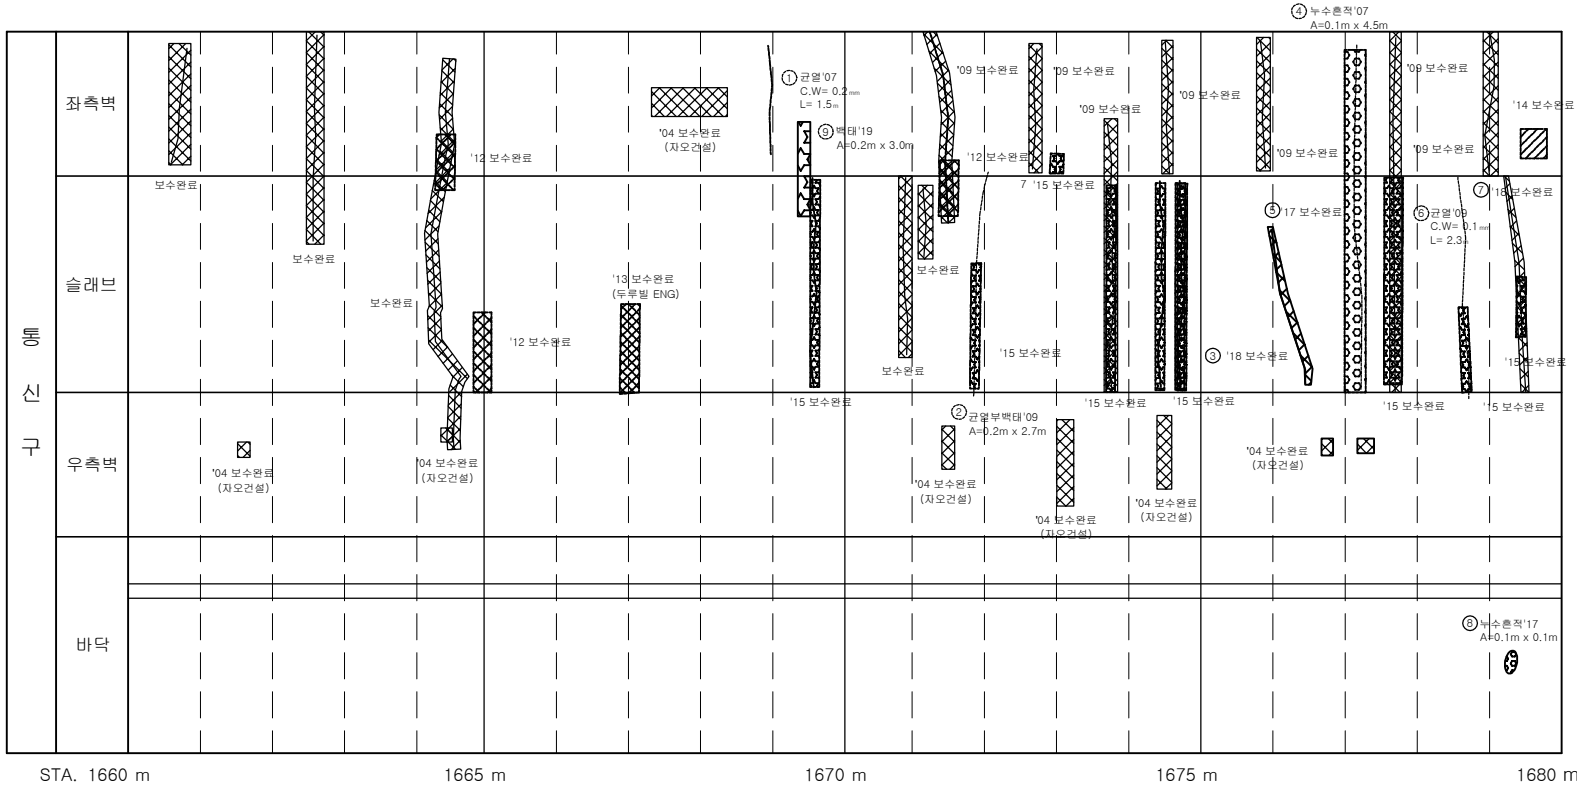

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1			
2	2009	균열부백태	0.20	2.70		0.54	㎡	1			
3	2009	균열부백태	0.10	2.20		0.22	㎡	1	2018	표면처리공법	0.26
4	2007	누수흔적	0.10	4.50		0.45	㎡	1			
5	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1	2017	표면처리공법	2.16
6	2009	균열	0.10	2.30		2.30	m	1			
7	2009	균열,누수,백태	0.10	2.30		0.23	㎡	1	2018	배면누수보수	0.28
8	2017	누수흔적	0.10	0.10		0.01	㎡	1			
9	2019	백태	0.20	3.00		0.60	㎡	1			신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1680 m ~1700 m) 통신구 구간

KEYPLAN

SECTION 9-9



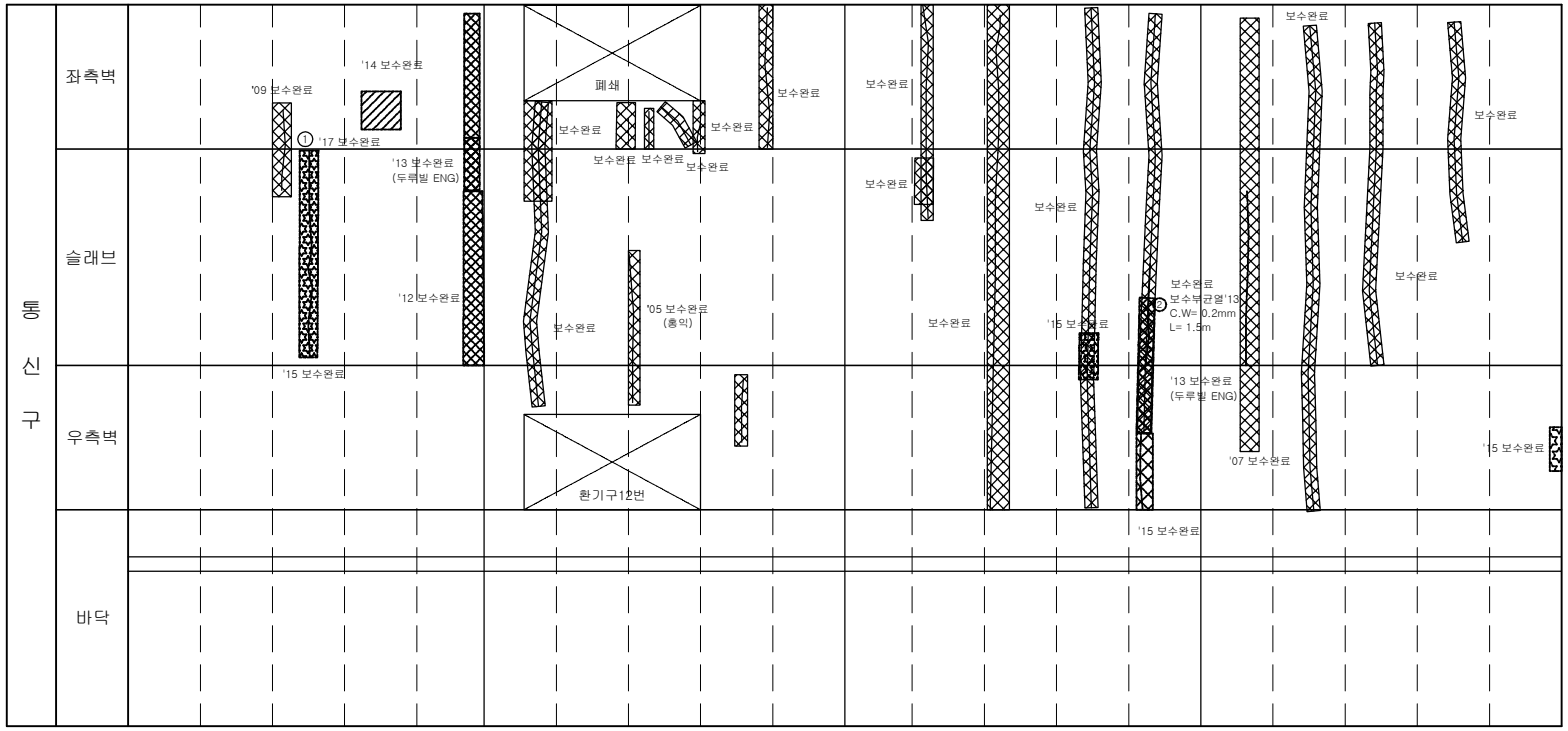

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.10	0.70		0.70	m	1	2017	표면처리공법	0.84	
2	2013	보수부균열	0.20	1.50		1.50	m	1				재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락공동구 - 중대로(STA.1686m)환기구 12번

KEYPLAN



SECTION



BOX A

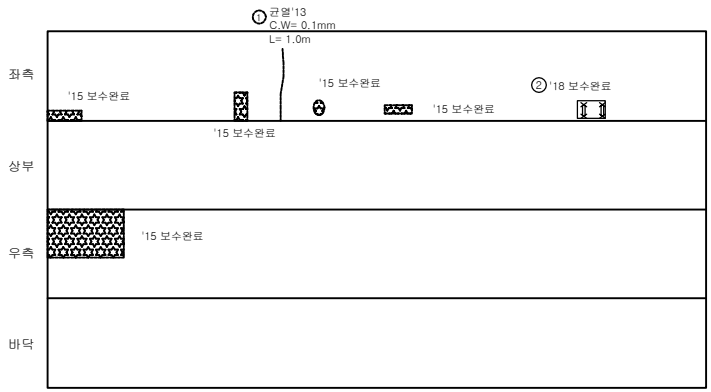

BOX B

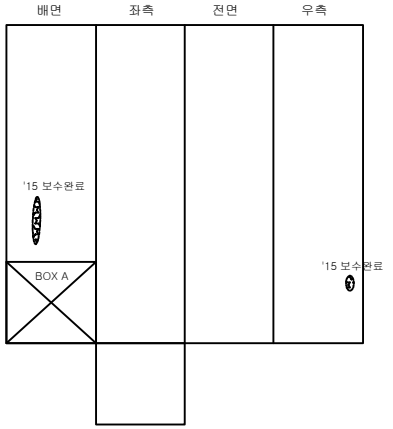

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	경과년도	공법명/자재명	물량	
1	2013	균열	0.10	1.00		1.00	m	1			
2	2017	철근노출	0.10	0.10		0.02	㎡	2	2018 단면복구(방청)	0.02	중요

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 환기구 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1700 m ~1720 m) 통신구 구간



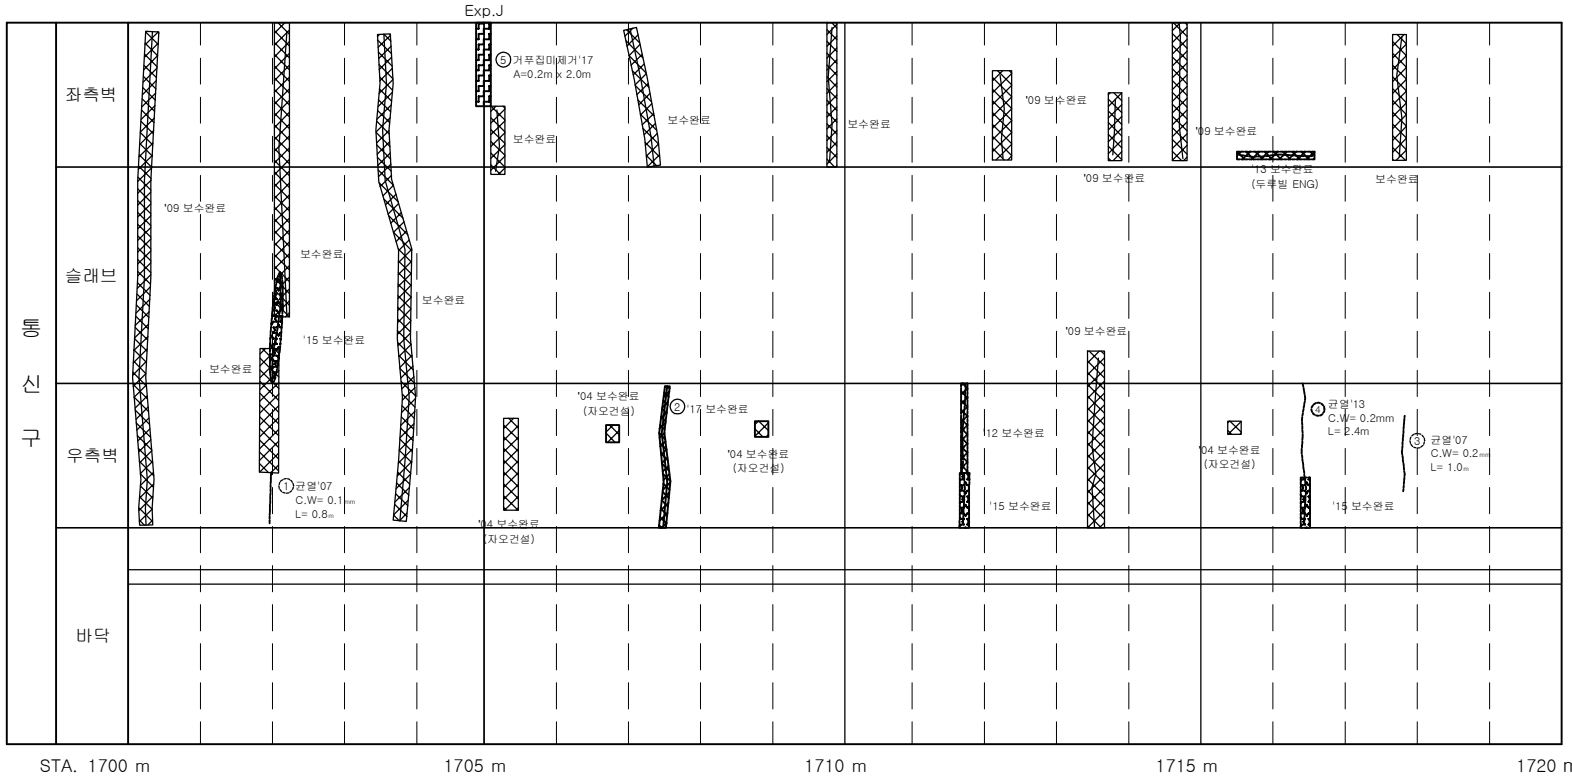

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.10	0.80		0.80	m	1				
2	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1	2017	표면처리공법	2.76	
3	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
4	2013	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
5	2017	거푸집미제거	0.20	2.00		0.40	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1720 m ~1740 m) 통신구 구간

KEY PLAN

SECTION 9-9



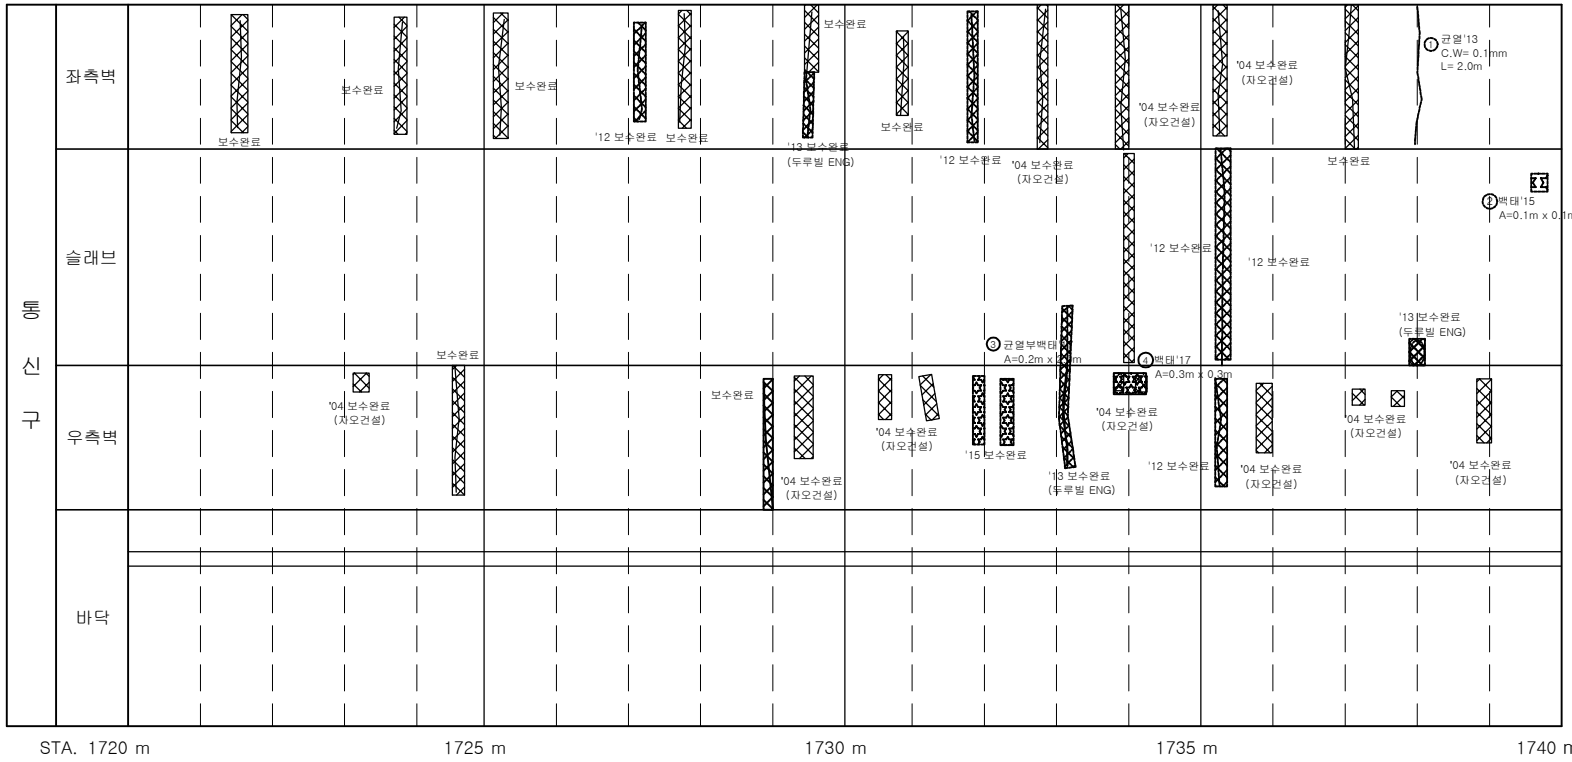

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량	
1	2013	균열	0.10	2.00		2.00	m	1			
2	2013	백태	0.10	0.10		0.01	㎡	1			
3	2017	균열부백태	0.20	2.00		0.40	㎡	1			
4	2017	백태	0.30	0.30		0.09	㎡	1			

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1740 m ~1760 m) 통신구 구간

KEY PLAN

SECTION 9-9



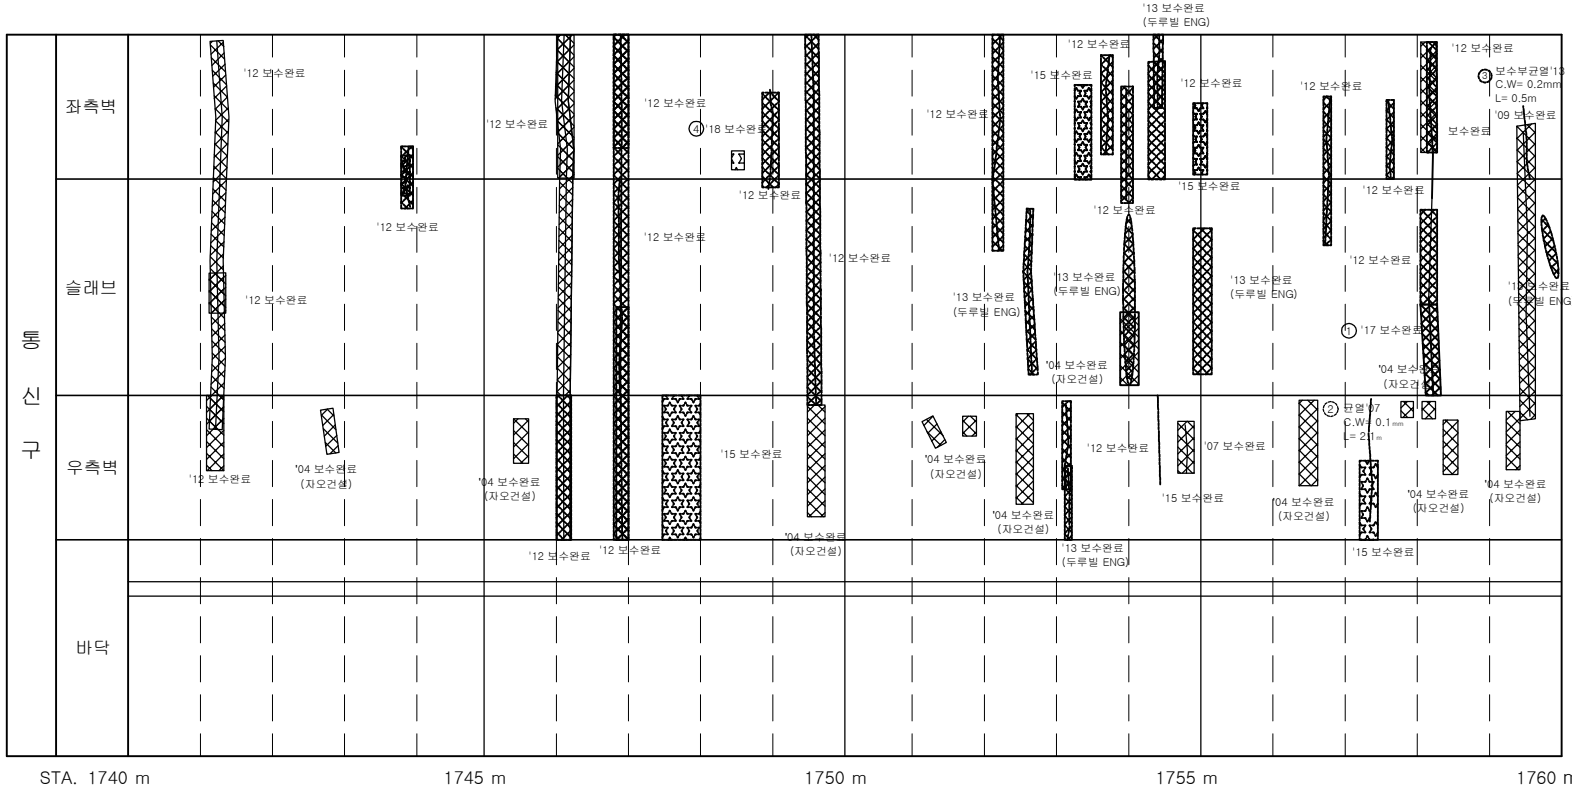

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	보수공법명/자재명	물량		
1	2007	균열	0.10	3.00		3.00	m	1	2017	표면처리공법	3.60	
2	2007	균열	0.10	2.10		2.10	m	1				
3	2013	보수부균열	0.20	0.50		0.50	m	1				
4	2017	박태	0.20	0.40		0.08	㎡	1	2018	표면처리공법	0.10	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1760 m ~1780 m) 통신구 구간



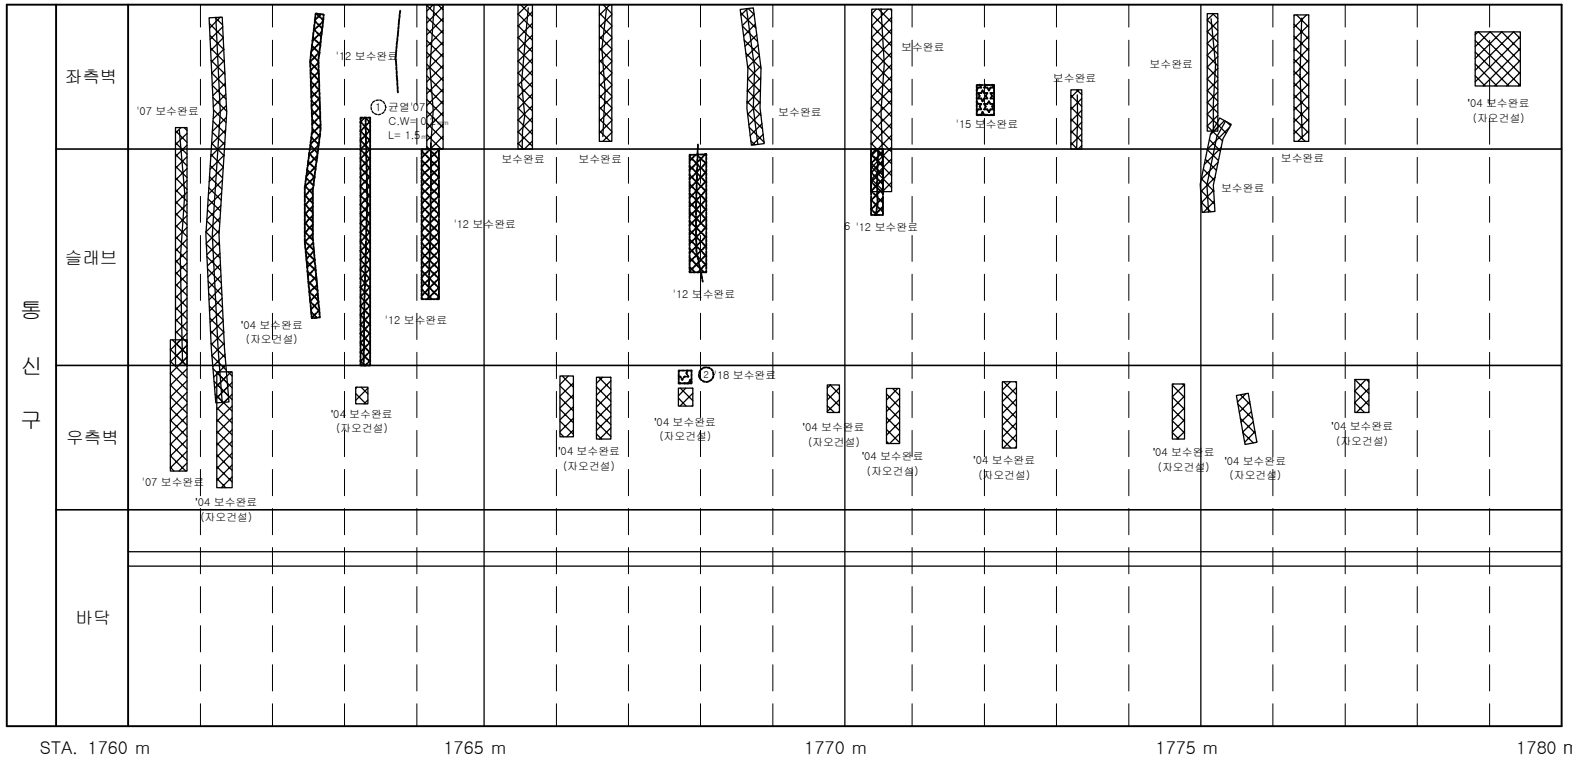

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
2	2017	박태	0.10	0.20		0.02	㎡	1	2018	표면처리공법	0.02	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1780 m ~1800 m) 통신구 구간



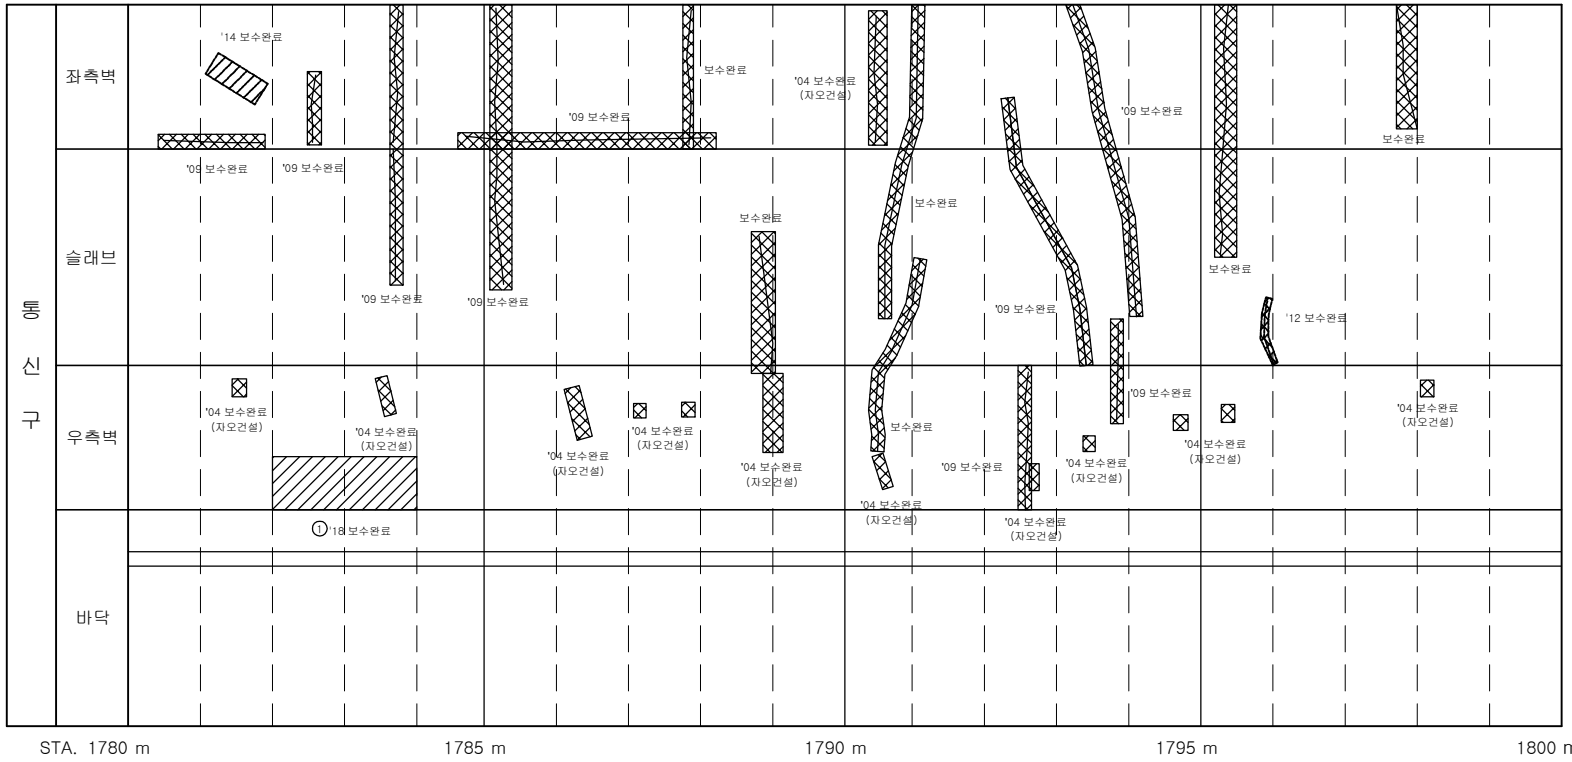

손 상 물 량 표

번호	적용년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2015	재료분리	1.00	2.00		2.00	㎡	1	2018	표면처리공법	2.40	

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1800 m ~1820 m) 통신구 구간



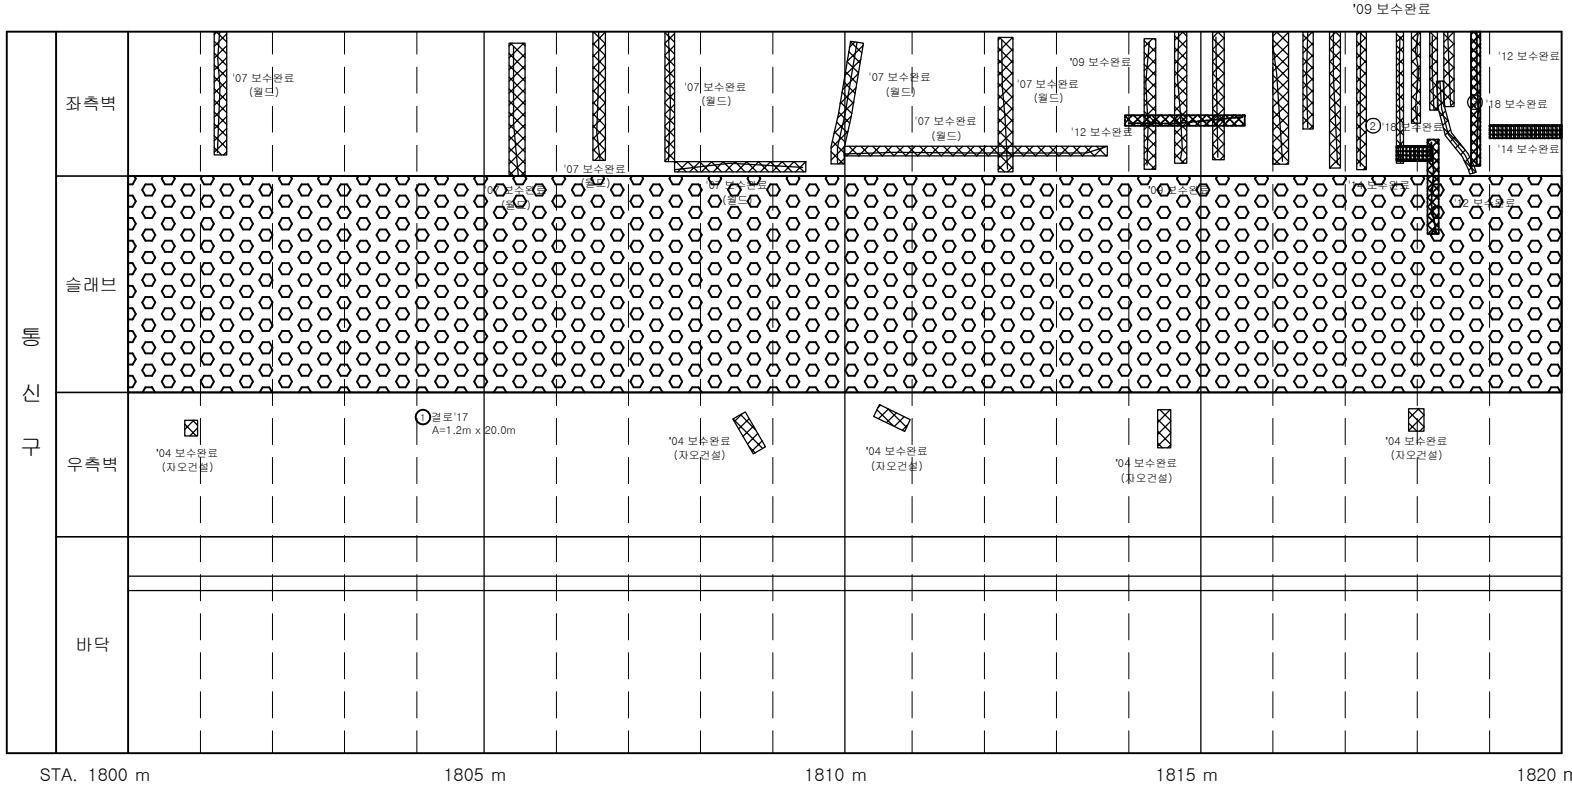

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량	
1	2017	결로	1.20	20.00		24.00	㎡	1			
2	2017	보수부들림	0.20	0.60		0.12	㎡	1	2018	표면처리공법	0.14
3	2017	보수부들림	0.10	0.70		0.07	㎡	1	2018	표면처리공법	0.08

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1820 m ~1840 m) 통신구 구간



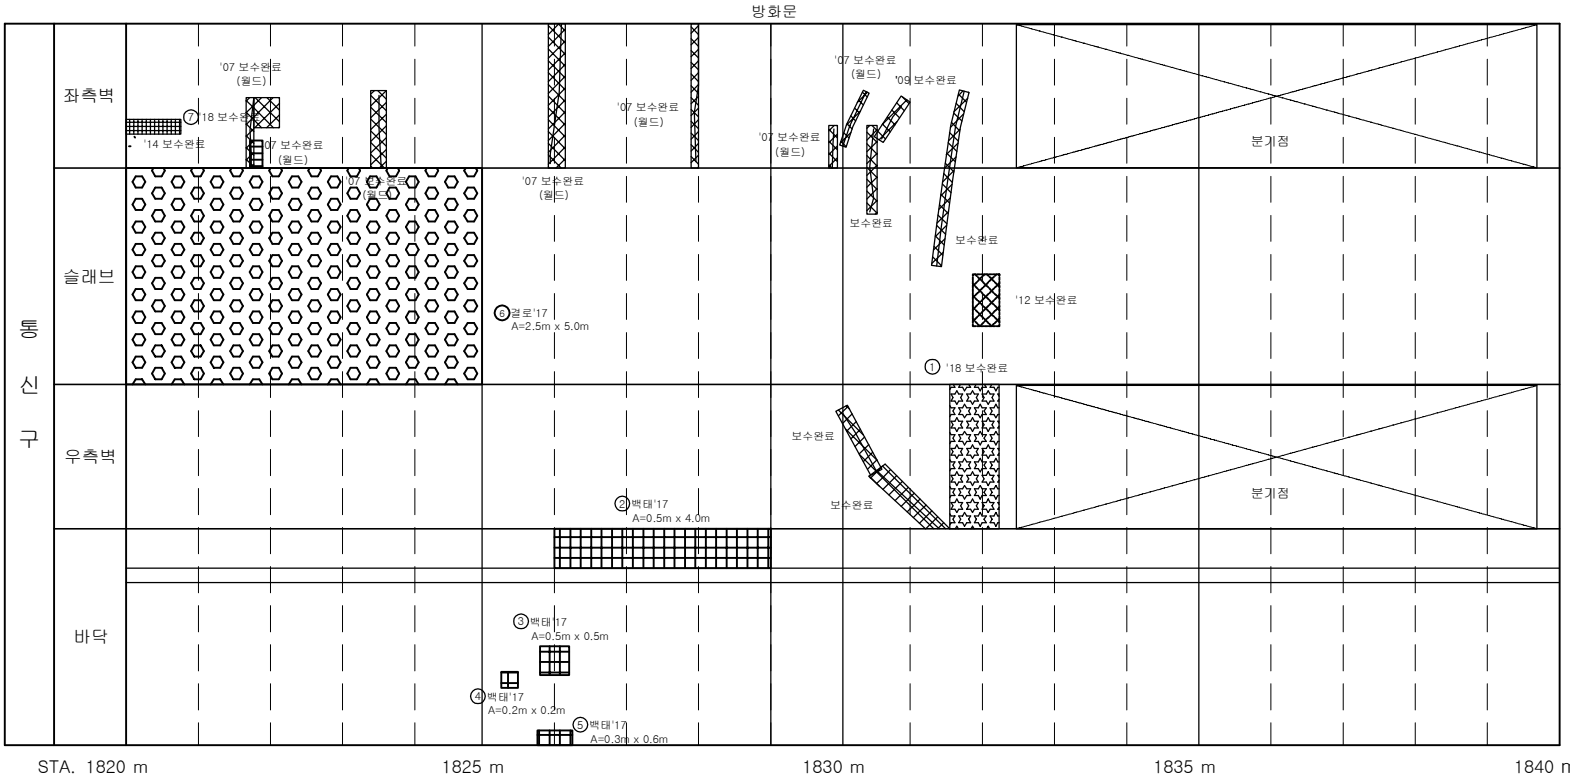

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	백태	1.00	2.30		2.30	㎡	1	2018	표면처리공법	2.76	
2	2017	백태	0.50	4.00		2.00	㎡	1				
3	2017	백태	0.50	0.50		0.25	㎡	1				
4	2017	백태	0.20	0.20		0.04	㎡	1				
5	2017	백태	0.30	0.60		0.18	㎡	1				
6	2017	결로	2.50	5.00		12.50	㎡	1				
7	2017	보수부들음	0.20	0.50		0.10	㎡	1	2018	단면복구공법	0.12	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1840 m ~1860 m) 통신구 구간

KEYPLAN



SECTION 9-9



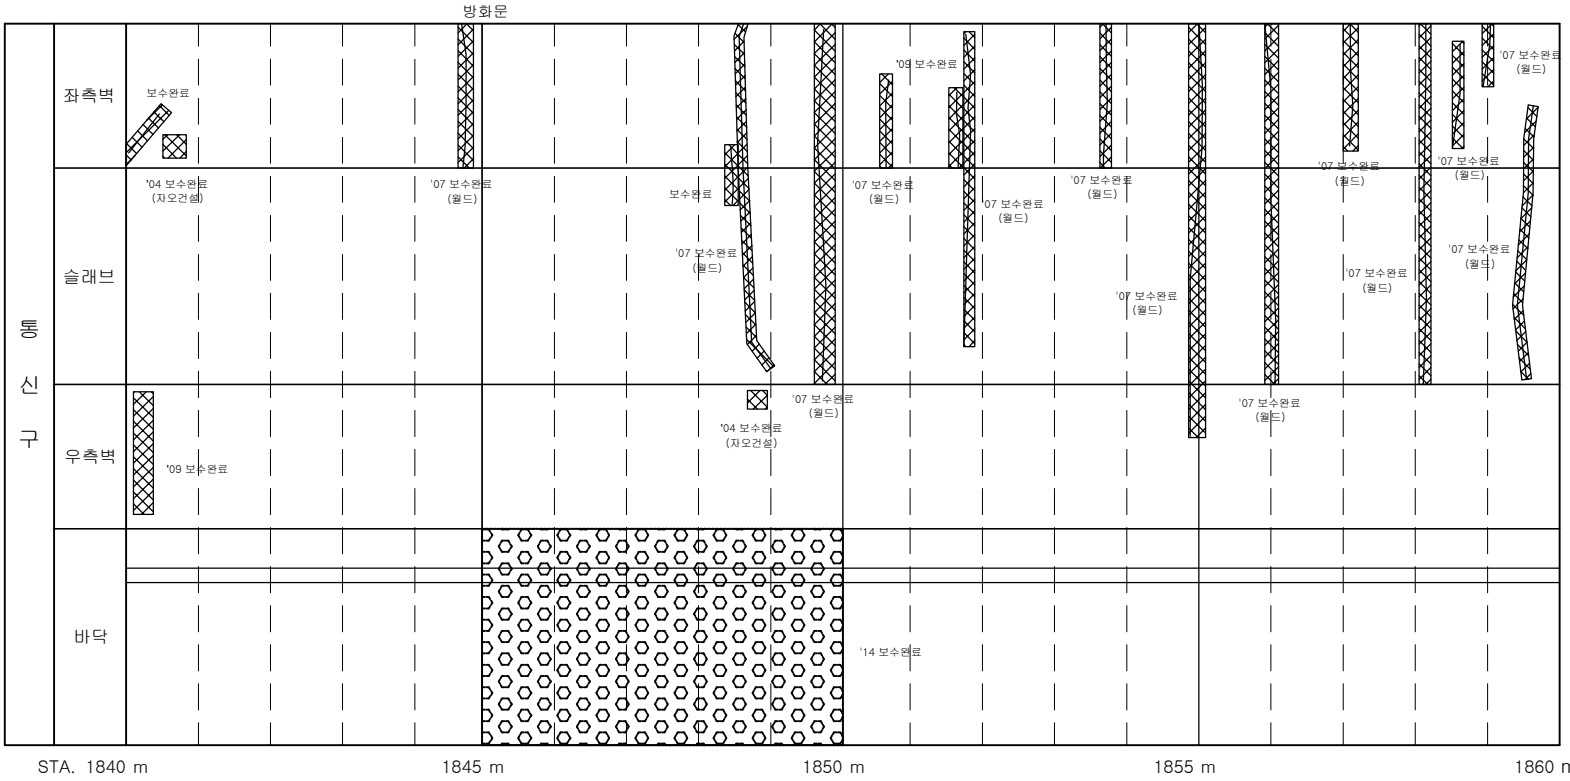

손 상 물 량 표

연번	적용 여부	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1860 m ~1880 m) 통신구 구간





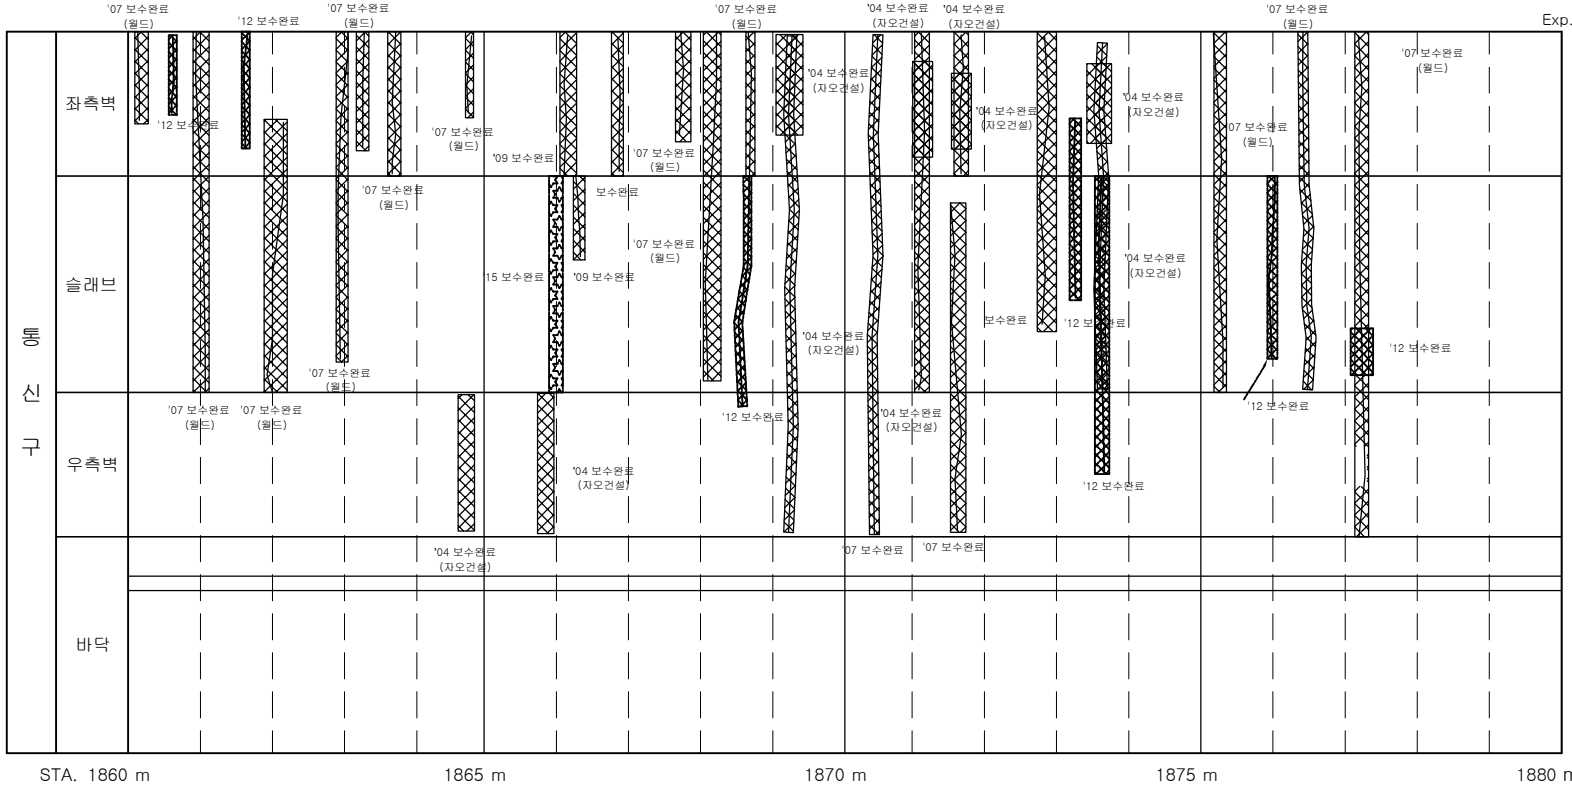

손 상 물 량 표

연번	적용 여부	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	계소년도	공법명/자재명	총량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1880 m ~1900 m) 통신구 구간





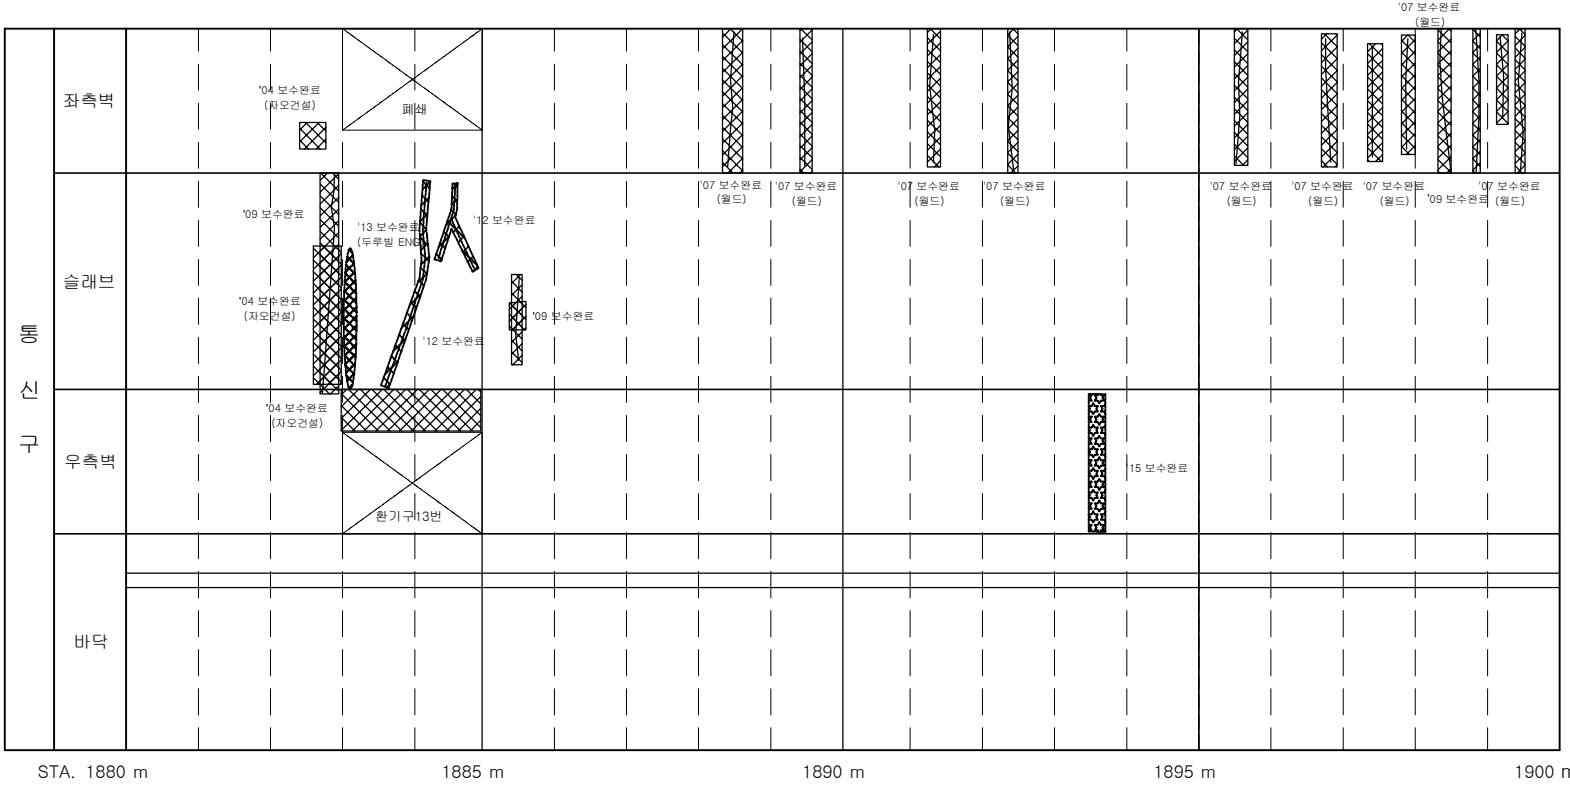

손 상 물 량 표

연번	적용 대분	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락공동구 - 중대로(STA.1884m)환기구 13번

KEYPLAN



SECTION



BOX A

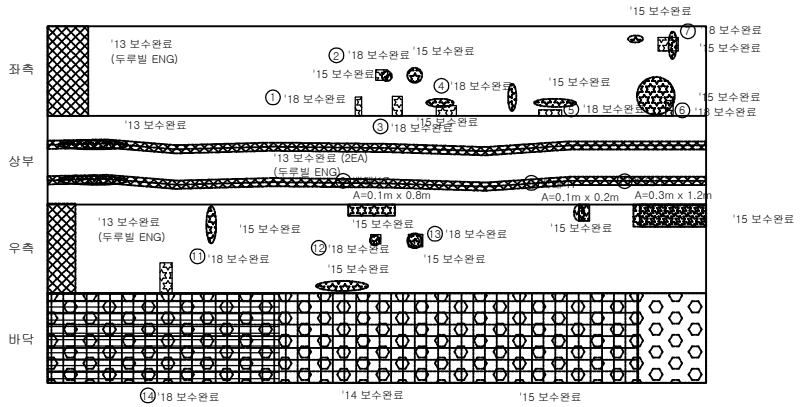

BOX B

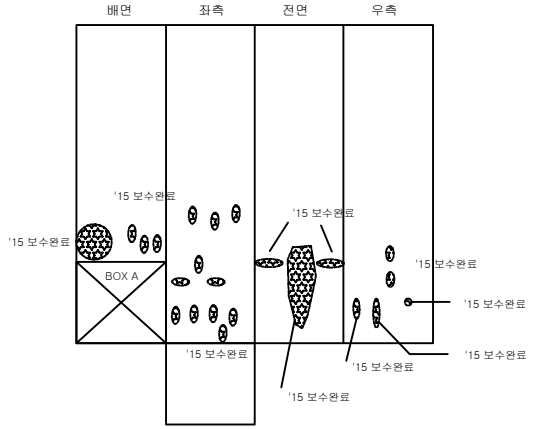

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2017	박태	0.10	0.30		0.03	㎡	1	2018	표면처리공법	0.04	
2	2017	박태	0.30	0.30		0.09	㎡	1	2018	표면처리공법	0.11	
3	2017	박태	0.20	0.30		0.06	㎡	1	2018	표면처리공법	0.07	
4	2017	박태	0.20	0.50		0.10	㎡	1	2018	표면처리공법	0.12	
5	2017	박태	0.70	0.10		0.07	㎡	1	2018	표면처리공법	0.08	
6	2017	박태	0.10	0.30		0.03	㎡	1	2018	표면처리공법	0.04	
7	2017	박태	0.50	0.50		0.25	㎡	1	2018	표면처리공법	0.30	
8	2017	박태	0.10	0.80		0.08	㎡	1				
9	2017	박태	0.10	0.20		0.02	㎡	1				
10	2017	박태	0.30	1.20		0.36	㎡	1				
11	2017	박태	0.10	0.60		0.06	㎡	1	2018	표면처리공법	0.07	
12	2017	박태	0.10	0.10		0.01	㎡	1	2018	표면처리공법	0.01	
13	2017	박태	0.20	0.20		0.04	㎡	1	2018	표면처리공법	0.05	
14	2017	들뜸	1.30	5.00		6.50	㎡	1	2018	단면복구공법	7.80	

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

환기구 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1900 m ~1920 m) 통신구 구간





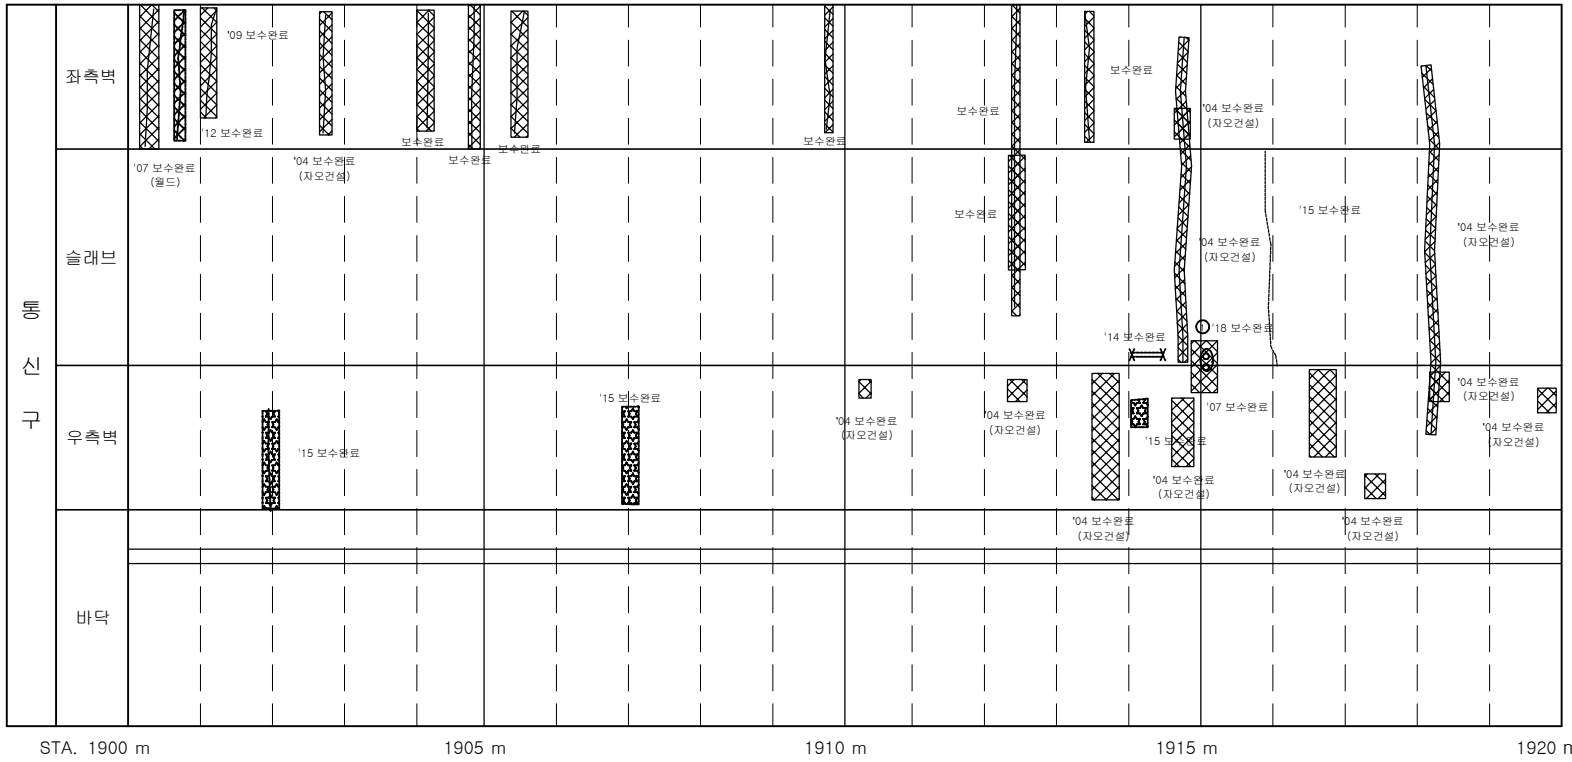

손 상 물 량 표

연번	적용년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2019	누수		0.20		0.20	m	1	2018	음식누수보수	0.24	

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1920 m ~1940 m) 통신구 구간

KEYPLAN



SECTION 10-10



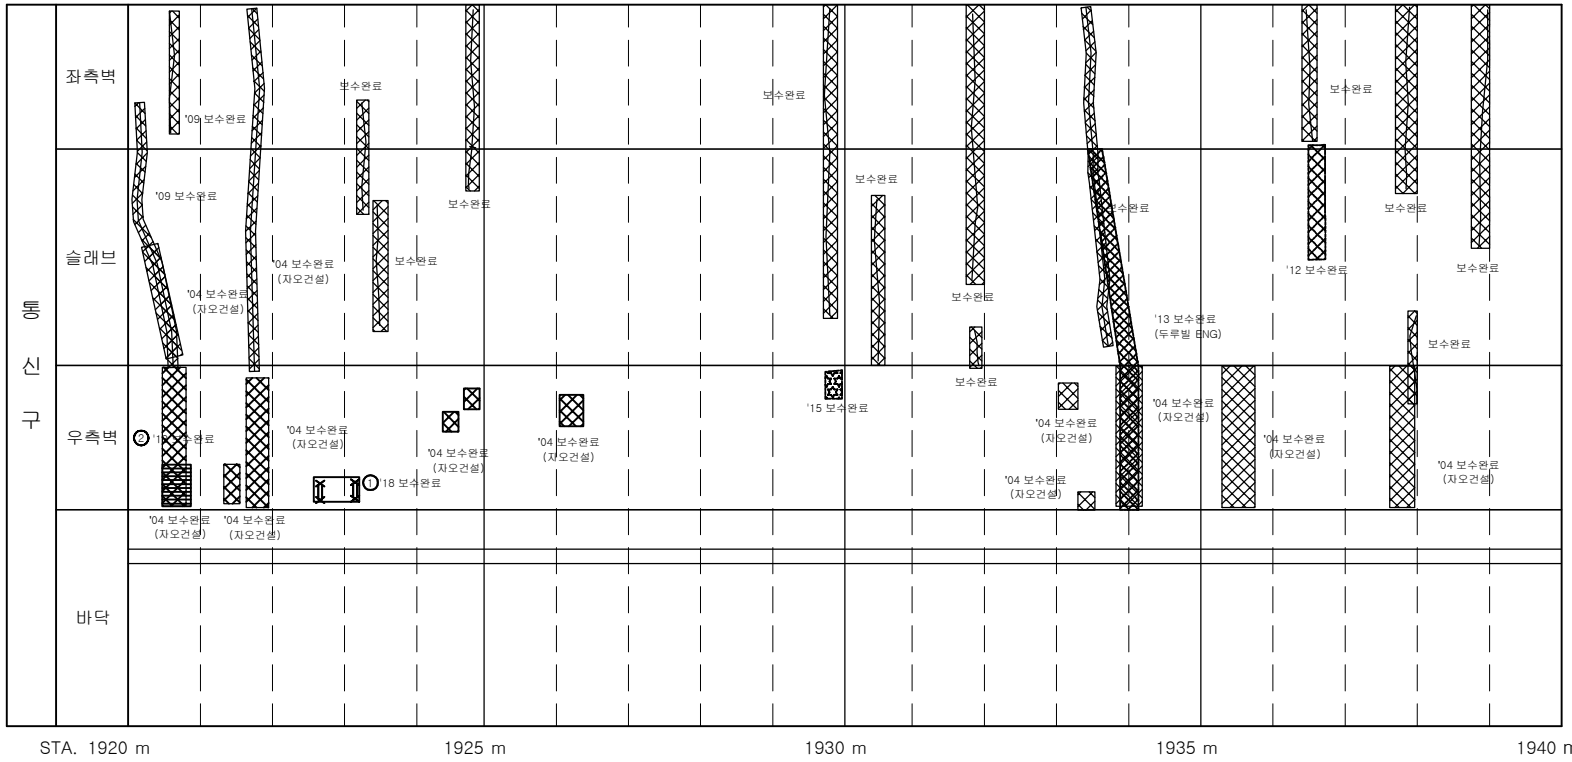

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2017	철근노출	0.20	0.40		0.16	㎡	2	2018	단면복구(방청)	0.19	중요
2	2017	보수부들뜸	0.10	1.00		0.10	㎡	1	2018	단면복구공법	0.12	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1940 m ~1960 m) 통신구 구간





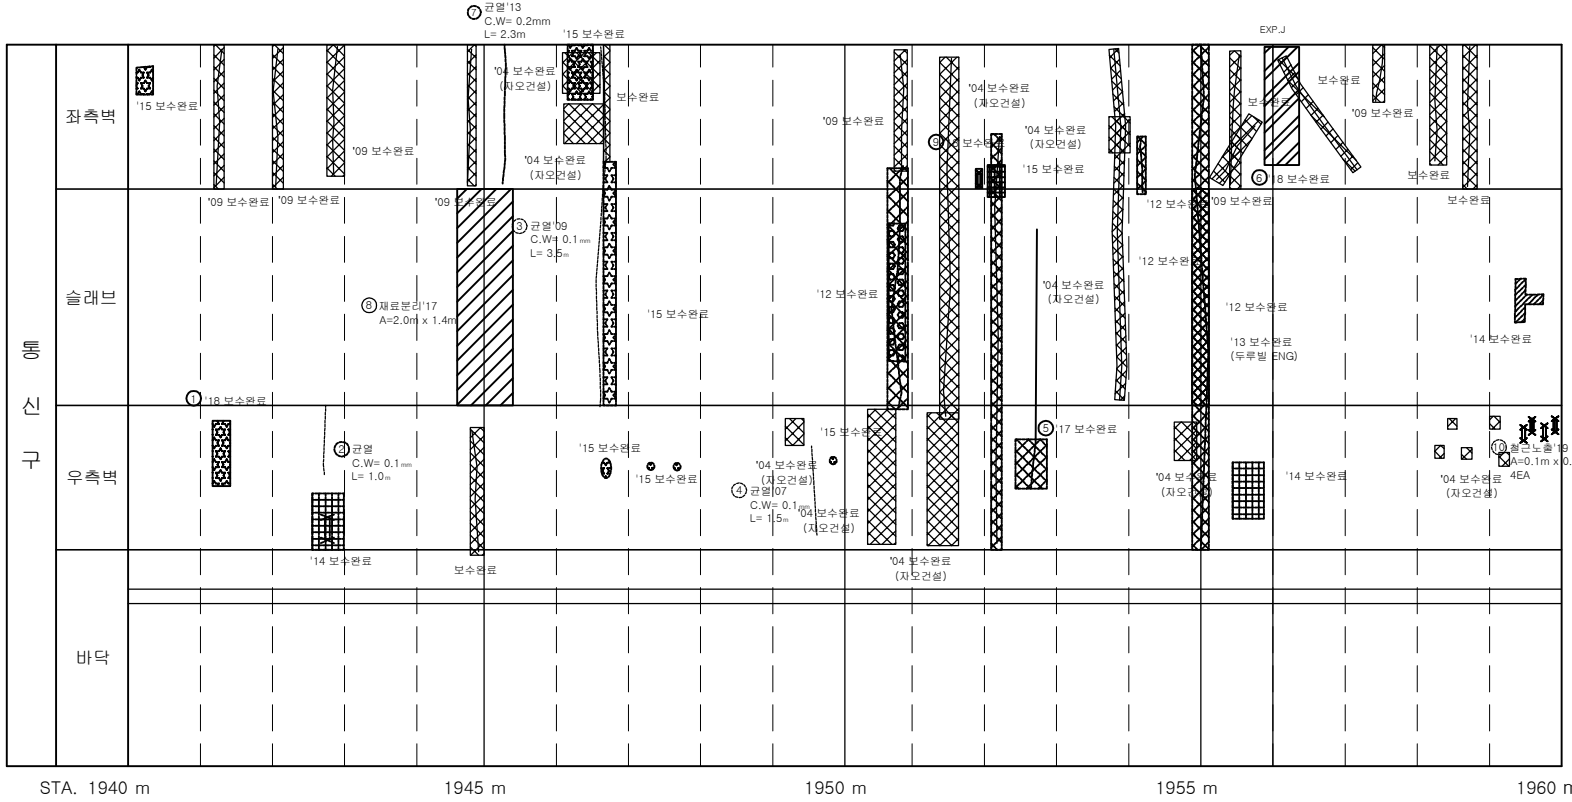

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	박태	0.10	0.50		0.05	㎡	1	2018	단면복구공법	0.06	
2	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
3	2009	균열	0.10	3.50		3.50	m	1				
4	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
5	2007	균열	0.20	1.60		1.60	m	1	2017	표면처리공법	1.92	
6	2013	보수불량	0.50	1.80		0.90	㎡	1	2018	단면복구공법	1.08	
7	2013	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
8	2017	재료분리	2.00	1.40		2.80	㎡	1				
9	2017	철근노출	0.10	0.10		0.01	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.01	중요
10	2019	철근노출	0.10	0.30		0.12	㎡	4				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1960 m ~1980 m) 통신구 구간





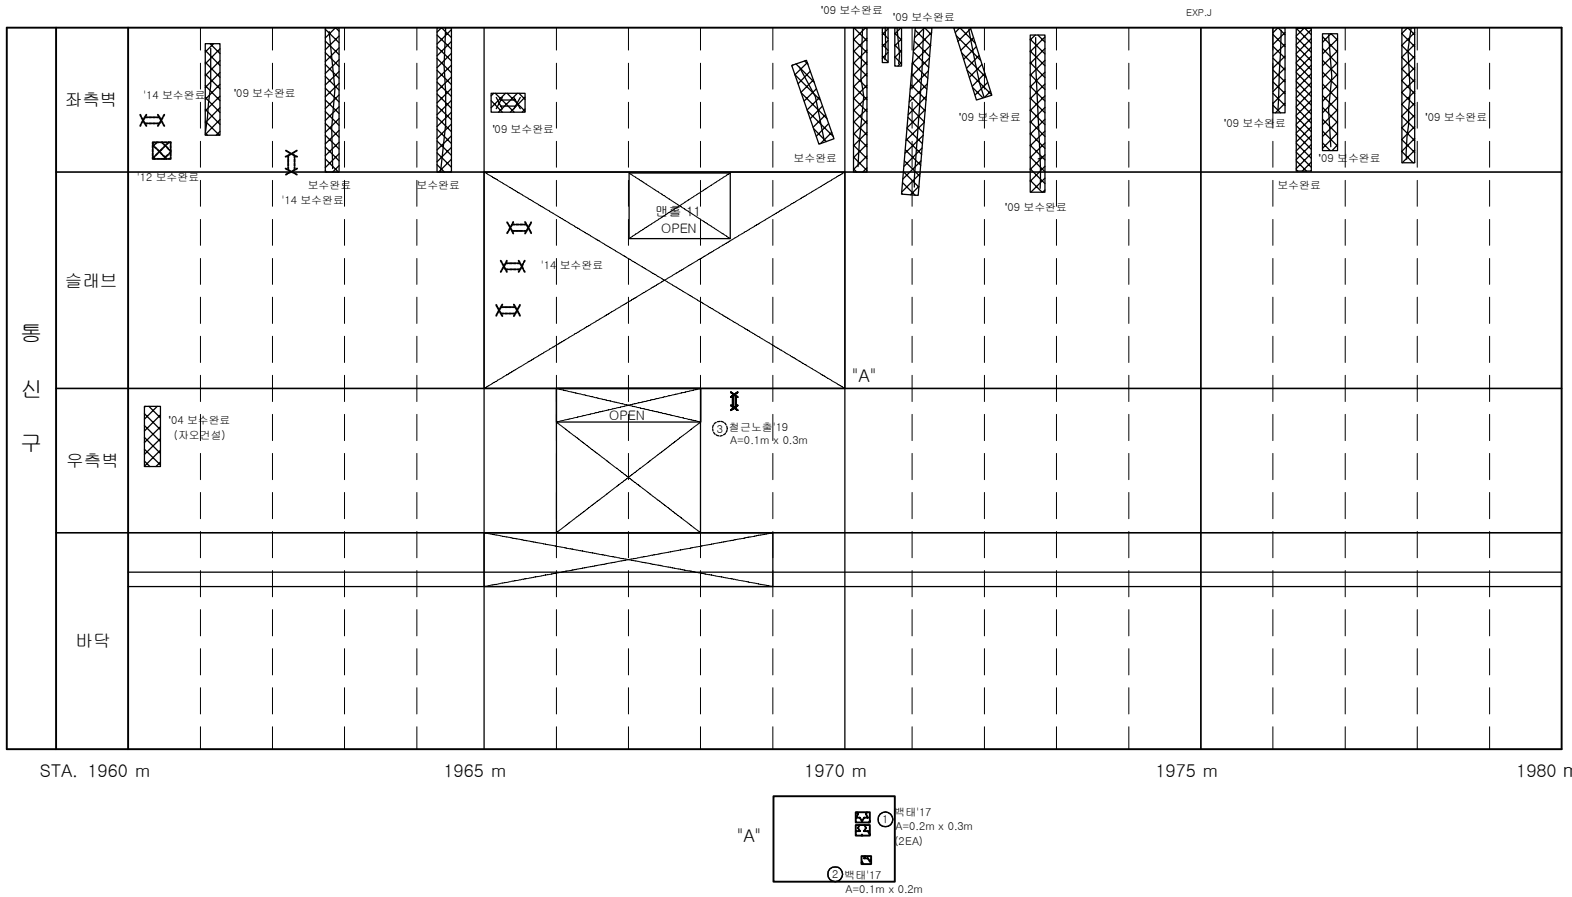

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량		
1	2017	백태	0.20	0.30		0.12	㎡	2				
2	2017	백태	0.10	0.20		0.02	㎡	1				
3	2019	철근노출	0.10	0.50		0.05	㎡	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.1980 m ~2000 m) 통신구 구간





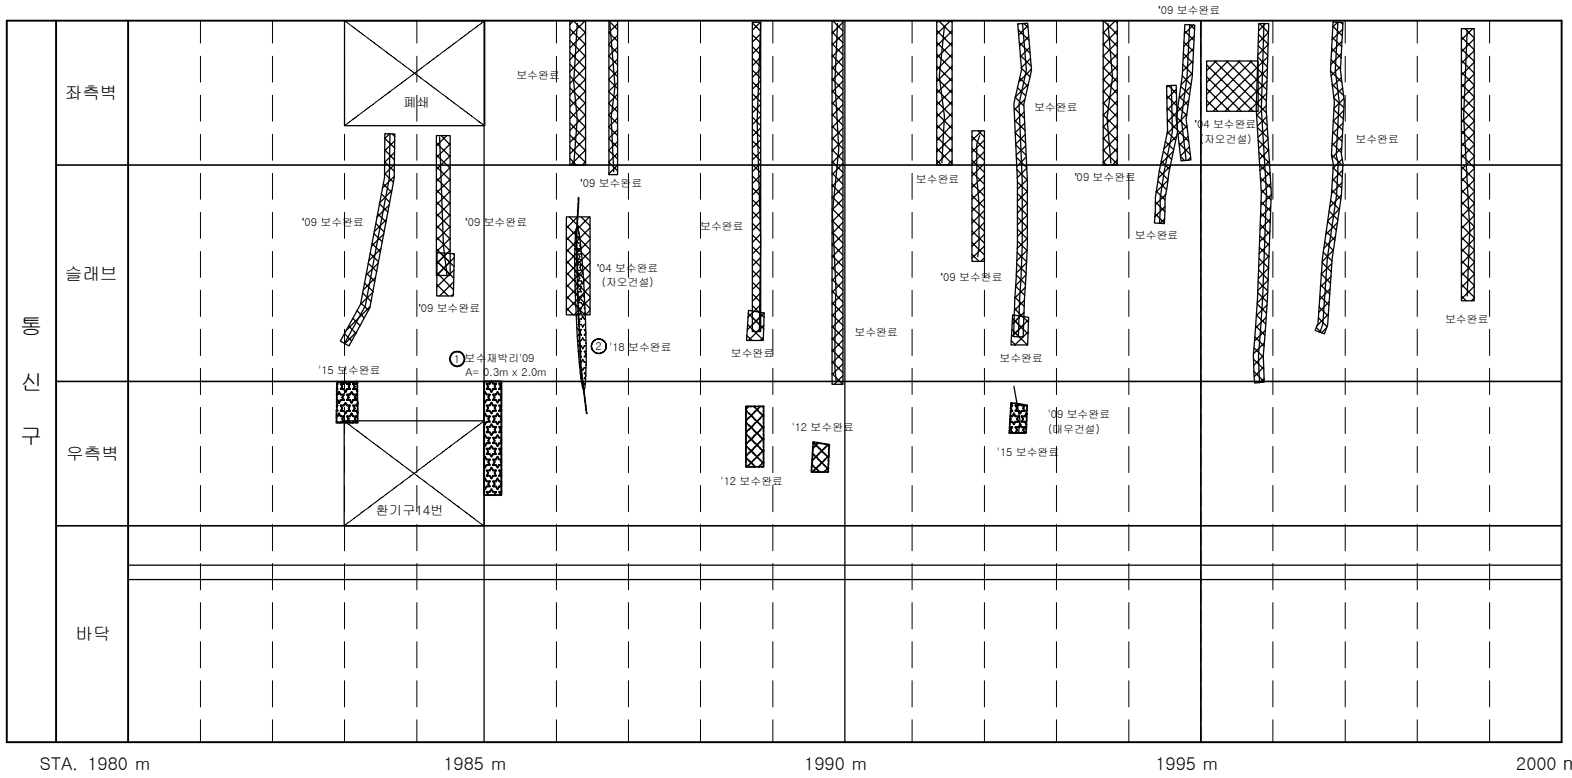

손 상 물 량 표

연번	적용년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	공법명/자재명	물량	
1	2009	보수재박리	0.30	2.00		0.60	㎡	1			재결함
2	2009	백태	0.10	2.00		0.20	㎡	1	2018	단면복구공법	0.24	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락공동구 - 중대로(STA.1984m)환기구 14번

KEYPLAN



SECTION



BOX A

① 좌측벽 ② 슬래브 ③ 우측벽 ④ 바닥

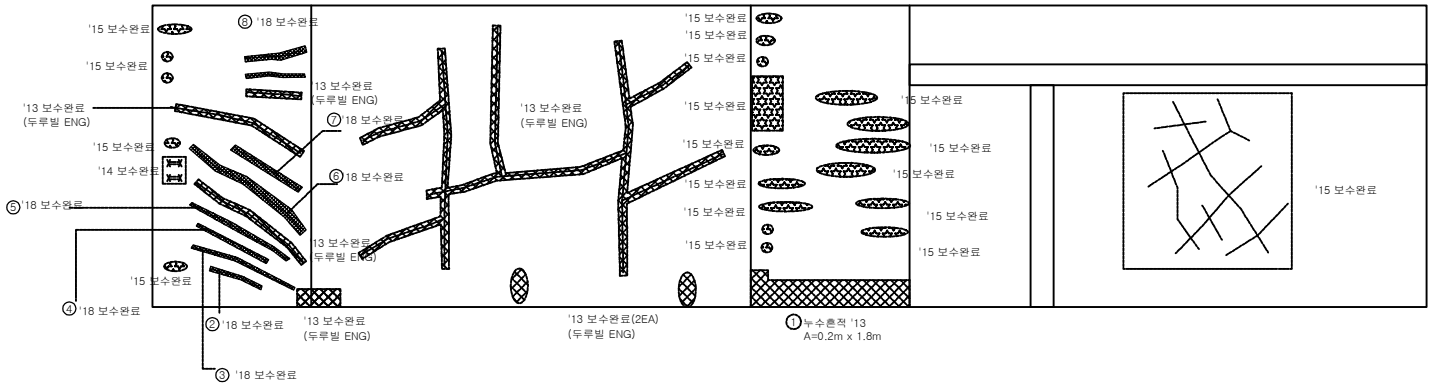

BOX B



손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2015	누수흔적	0.20	1.80		0.36	㎡	1				
2	2013	균열	0.20	1.00		1.00	m	1	2018	표면처리공법	1.20	
3	2013	균열	0.20	2.00		2.00	m	1	2018	표면처리공법	2.40	
4	2013	균열	0.20	1.50		1.50	m	1	2018	표면처리공법	1.80	
5	2013	균열	0.20	2.00		2.00	m	1	2018	표면처리공법	2.40	
6	2013	균열	0.20	2.40		2.40	m	1	2018	표면처리공법	2.88	
7	2013	균열	0.20	1.50		1.50	m	1	2018	표면처리공법	1.80	
8	2013	균열	0.20	2.40		4.80	m	2	2018	표면처리공법	5.76	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 환기구 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.2000 m ~2020 m) 통신구 구간





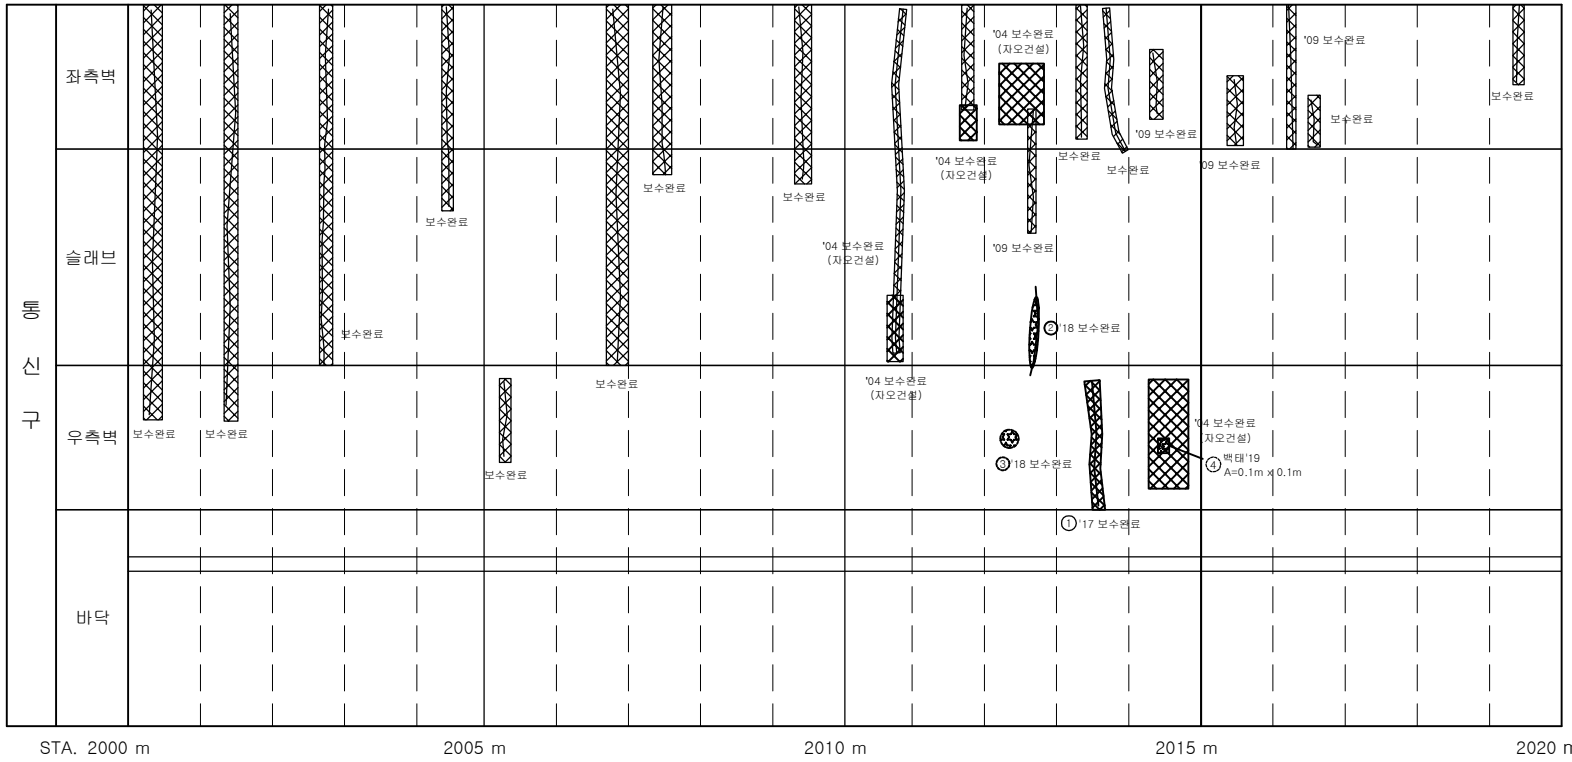

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1	2017	표면처리공법	2.40	
2	2013	균열부백태	0.20	0.10		0.02	㎡	1	2018	표면처리공법	0.02	
3	2013	백태	0.10	0.10		0.01	㎡	1	2018	표면처리공법	0.01	
4	2019	백태	0.10	0.10		0.01						신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.2020 m ~2040 m) 통신구 구간



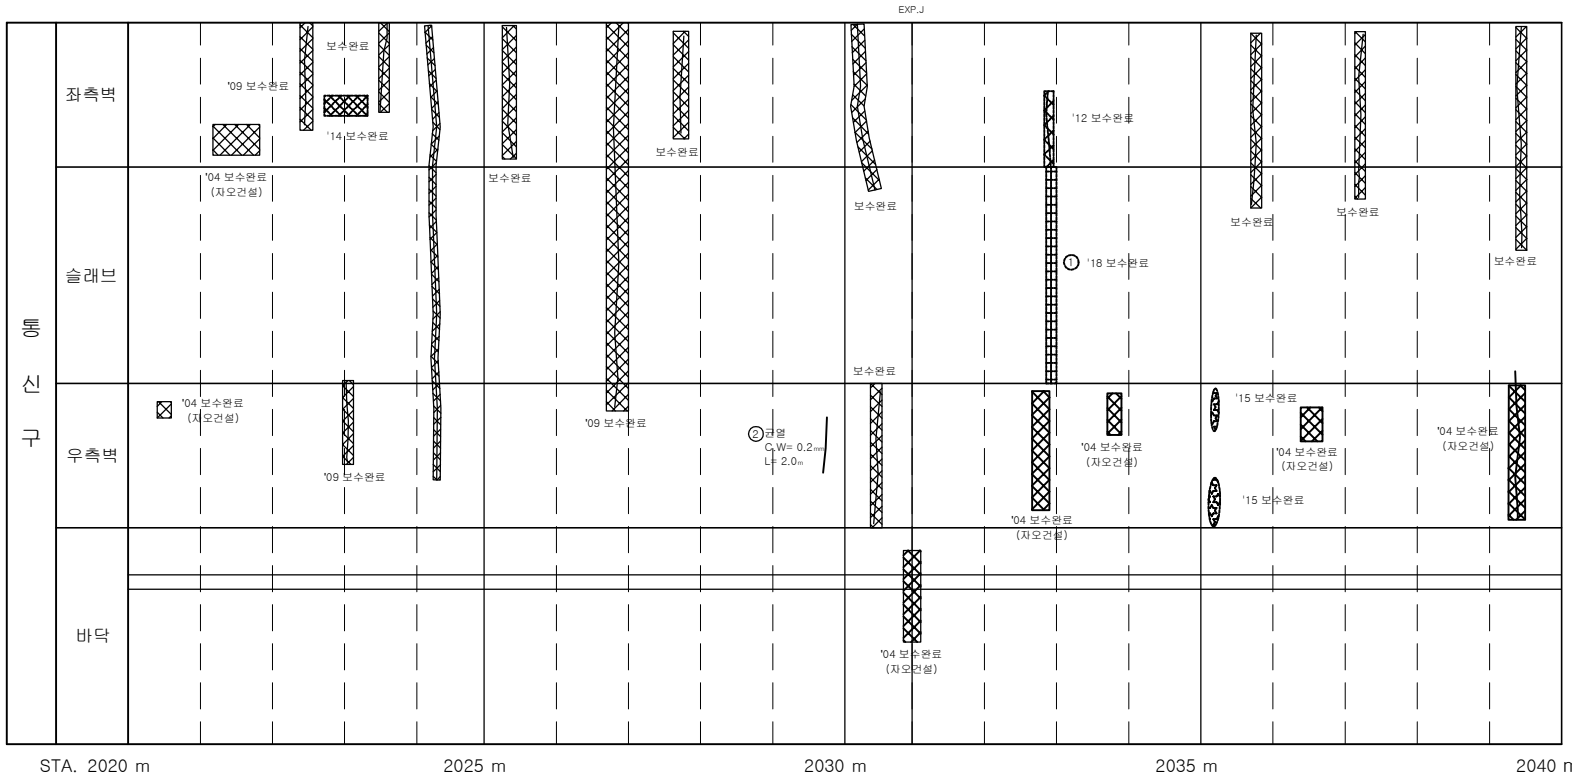

손 상 물 량 표

번호	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2011	보수재박리	0.10	1.50		0.15	㎡	1	2018	단면복구공법	0.18	
2	2017	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.2040 m ~2060 m) 통신구 구간



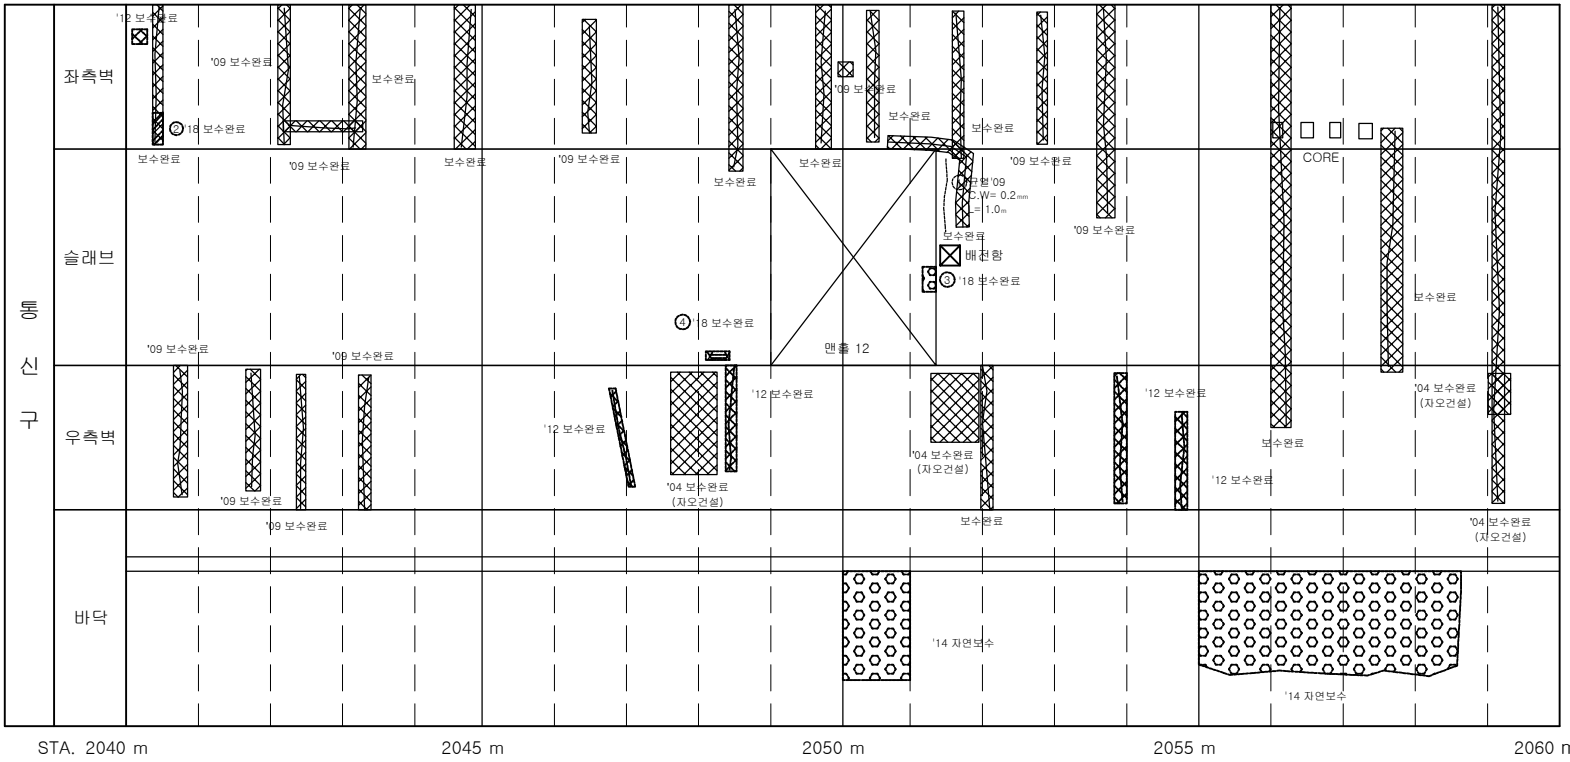

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2009	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
2	2013	보수불량	0.20	0.60		0.12	㎡	1	2018	단면복구공법	0.14	
3	2017	누수		0.60		0.60	m	1	2018	습식누수보수	0.72	
4	2017	철근노출	0.10	0.10		0.01	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.01	중요

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락공동구 - 중대로(STA.2050m)맨홀 12번

KEYPLAN



SECTION

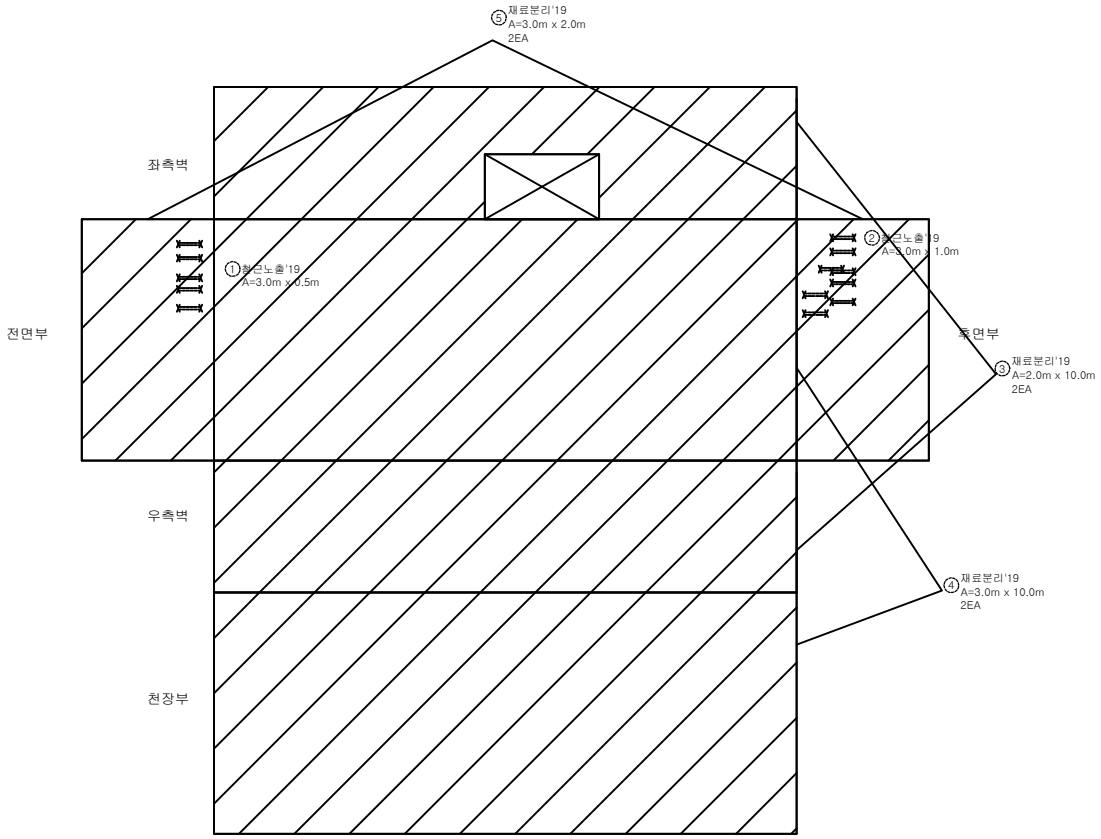

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2019	철근노출	3.00	0.50		1.50	㎡	1				신규
2	2019	철근노출	3.00	1.00		3.00	㎡	1				신규
3	2019	재료분리	2.00	10.0		40.0	㎡	2				신규
4	2019	재료분리	3.00	10.0		60.0	㎡	2				신규
5	2019	재료분리	3.00	2.00		12.0	㎡	2				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 맨홀 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.2060 m ~2080 m) 통신구 구간



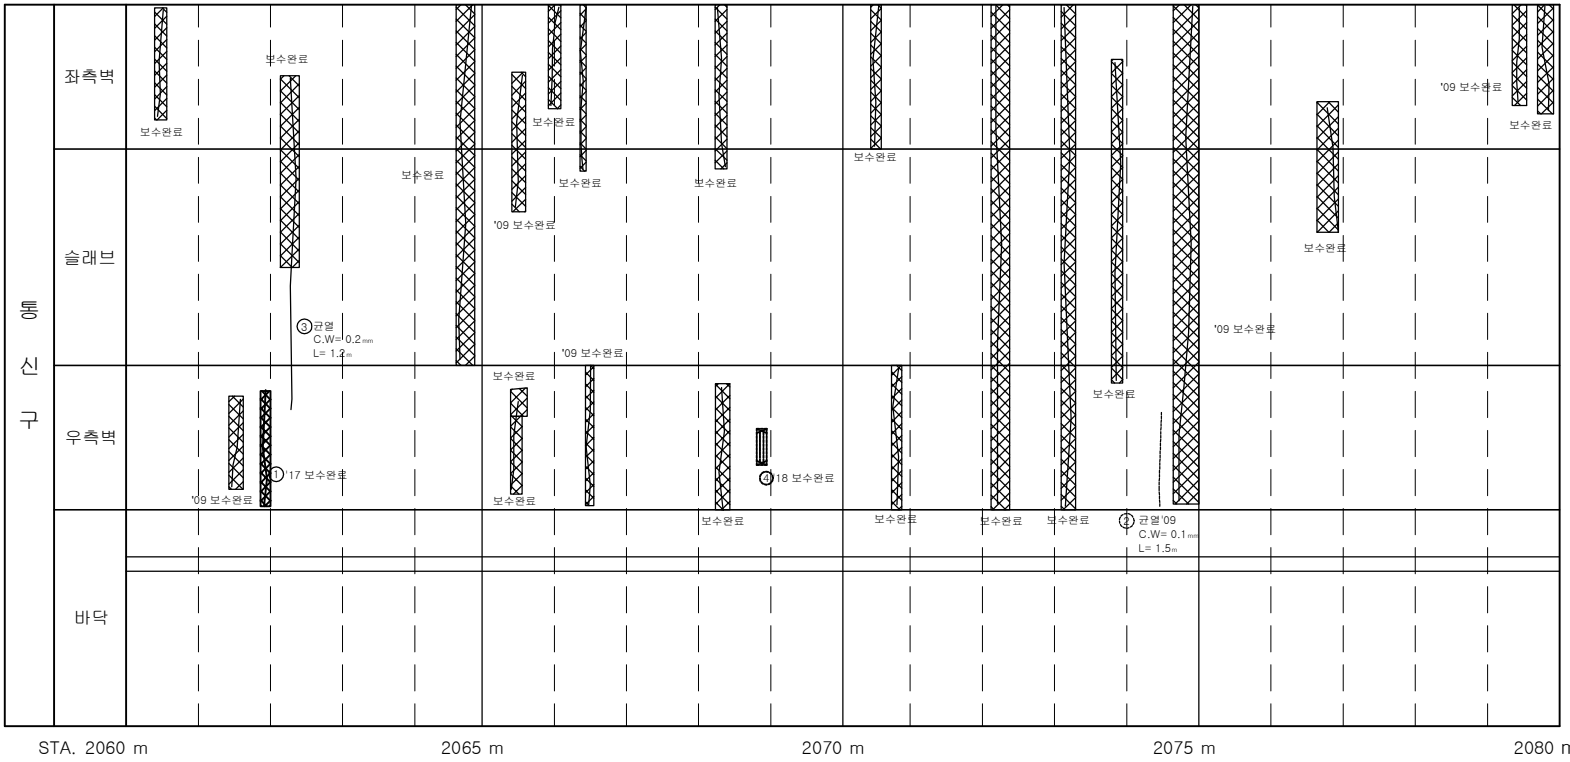

손 상 물 량 표

연번	점용년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1	2017	표면처리공법	2.40	
2	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
3	2007	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
4	2015	철근노출	0.10	0.40		0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.01	중요

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.2080 m ~2100 m) 통신구 구간



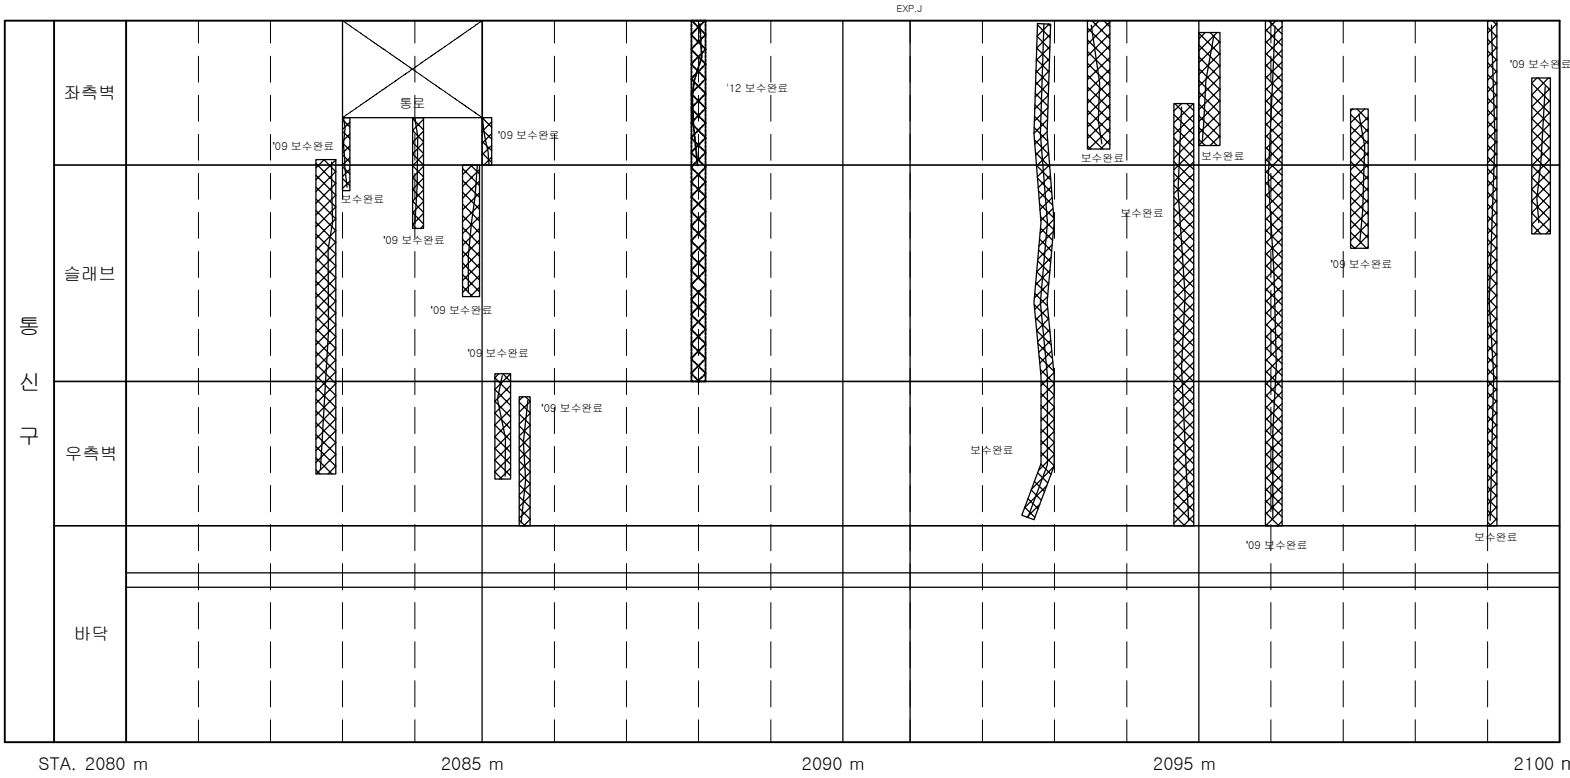

손 상 물 량 표

연번	적용구분	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소보수년도	공법명/자재명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.2100 m ~2120 m) 통신구 구간



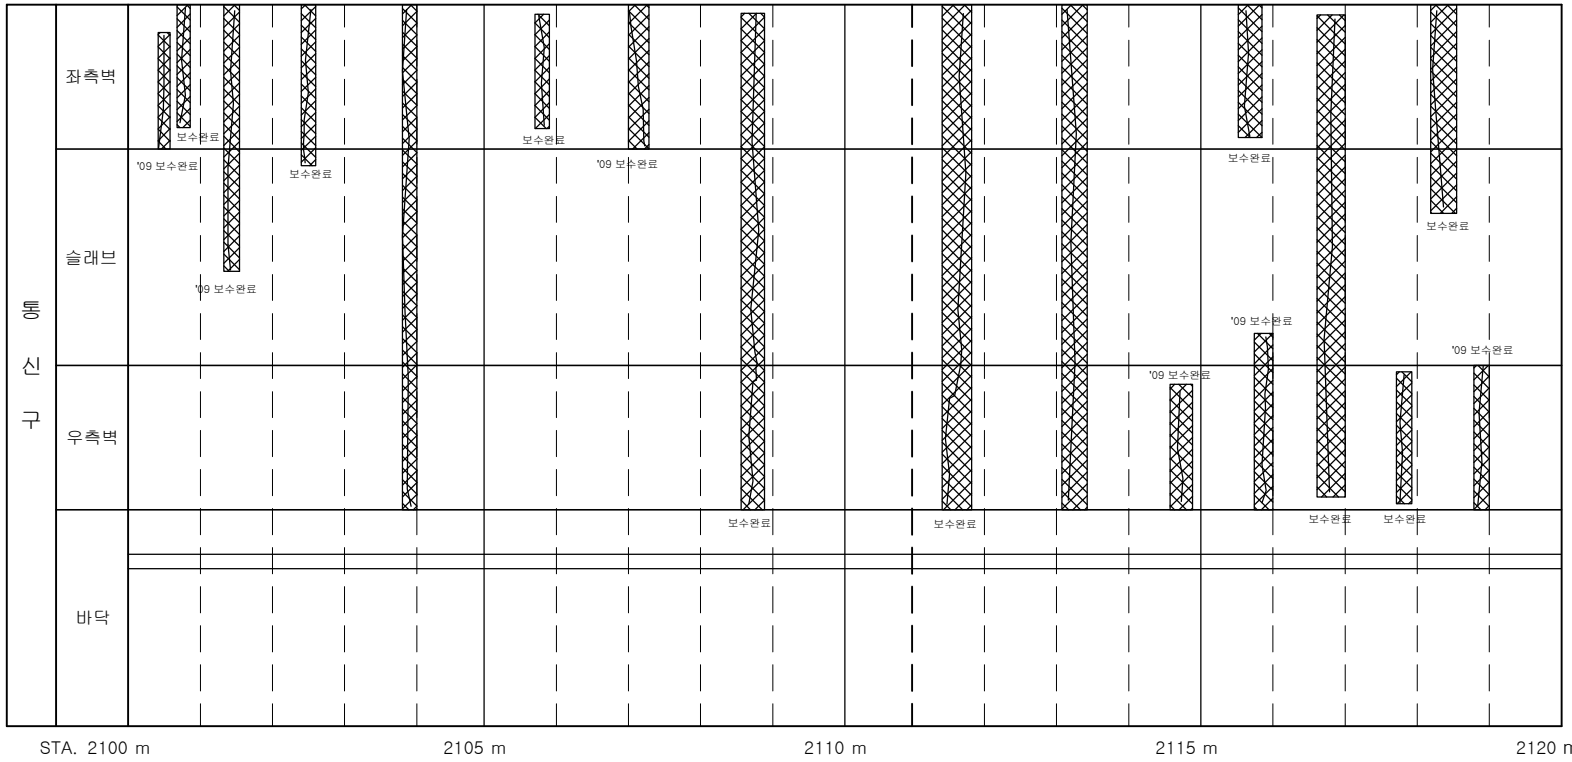

손 상 물 량 표

연번	적용 대분	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소보수년도	공법명/자재명	증량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.2120 m ~2140 m) 통신구 구간

KEY PLAN

SECTION 10-10



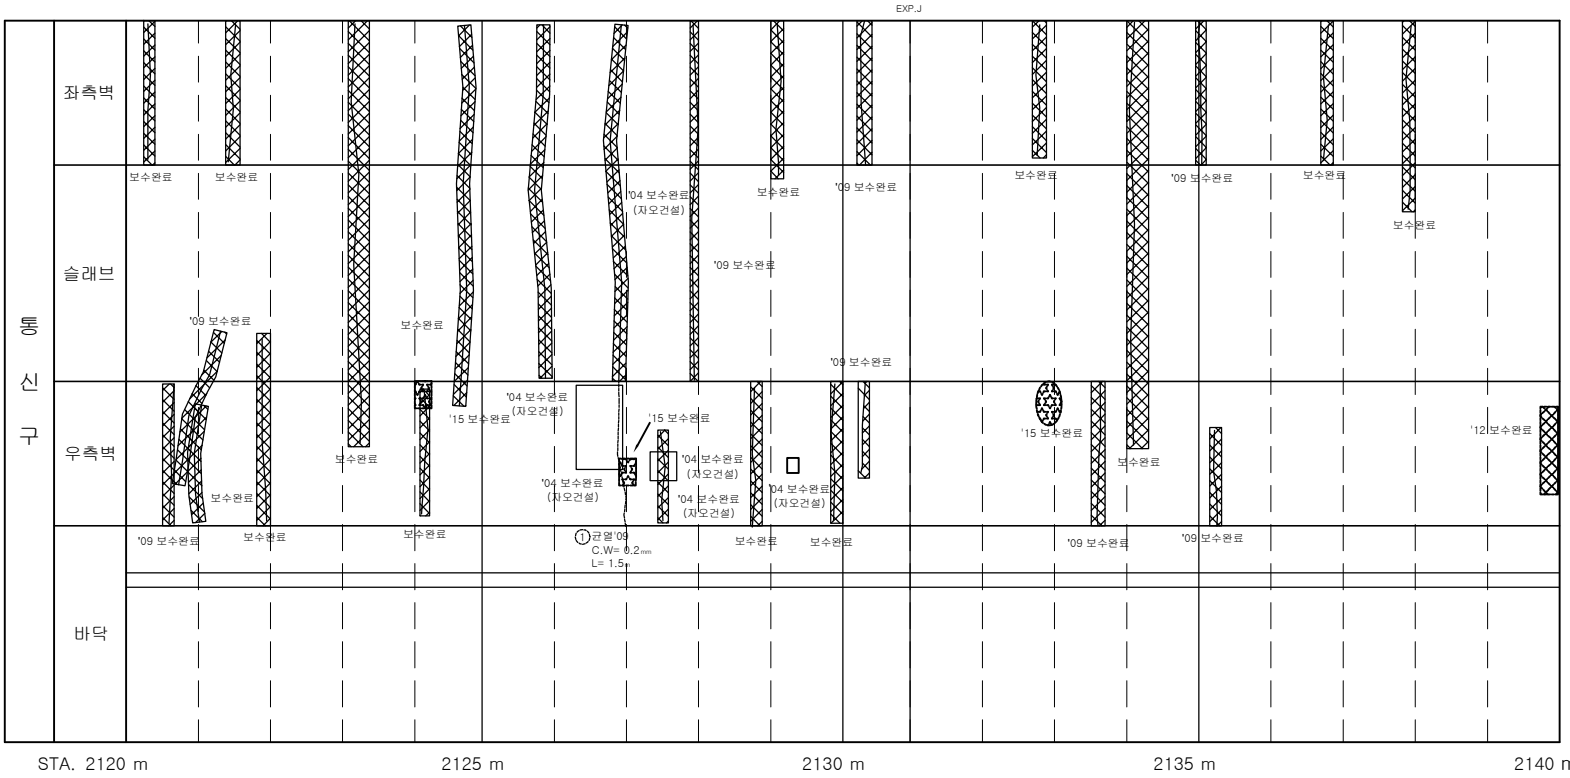

손 상 물 량 표

번호	적용년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2009	균열	0.20	1.50		1.50	m	1			

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.2140 m ~2160 m) 통신구 구간



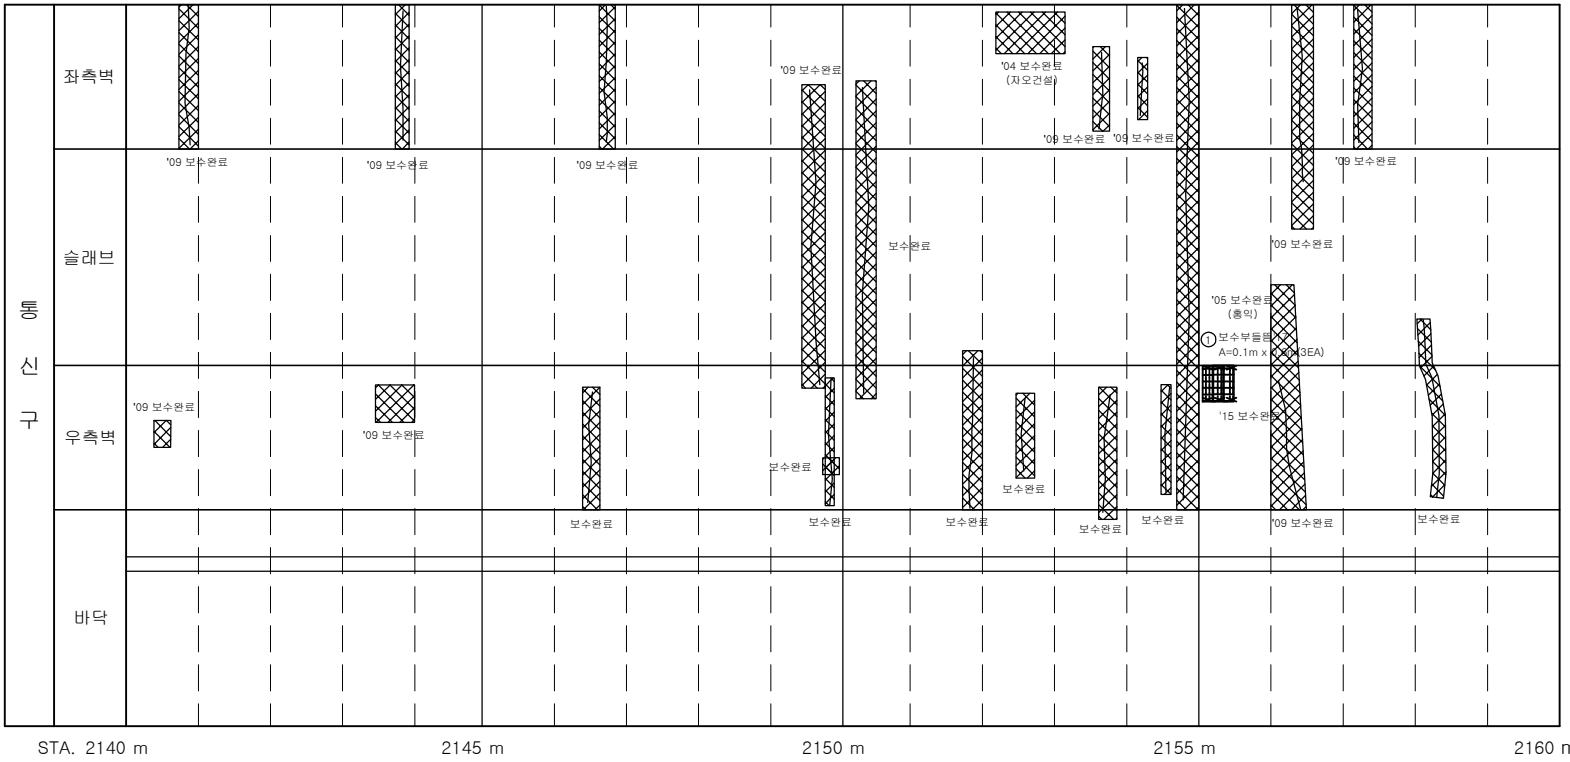

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2017	보수부틀림	0.10	0.60		0.18	㎡	3			재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.2160 m ~2180 m) 통신구 구간



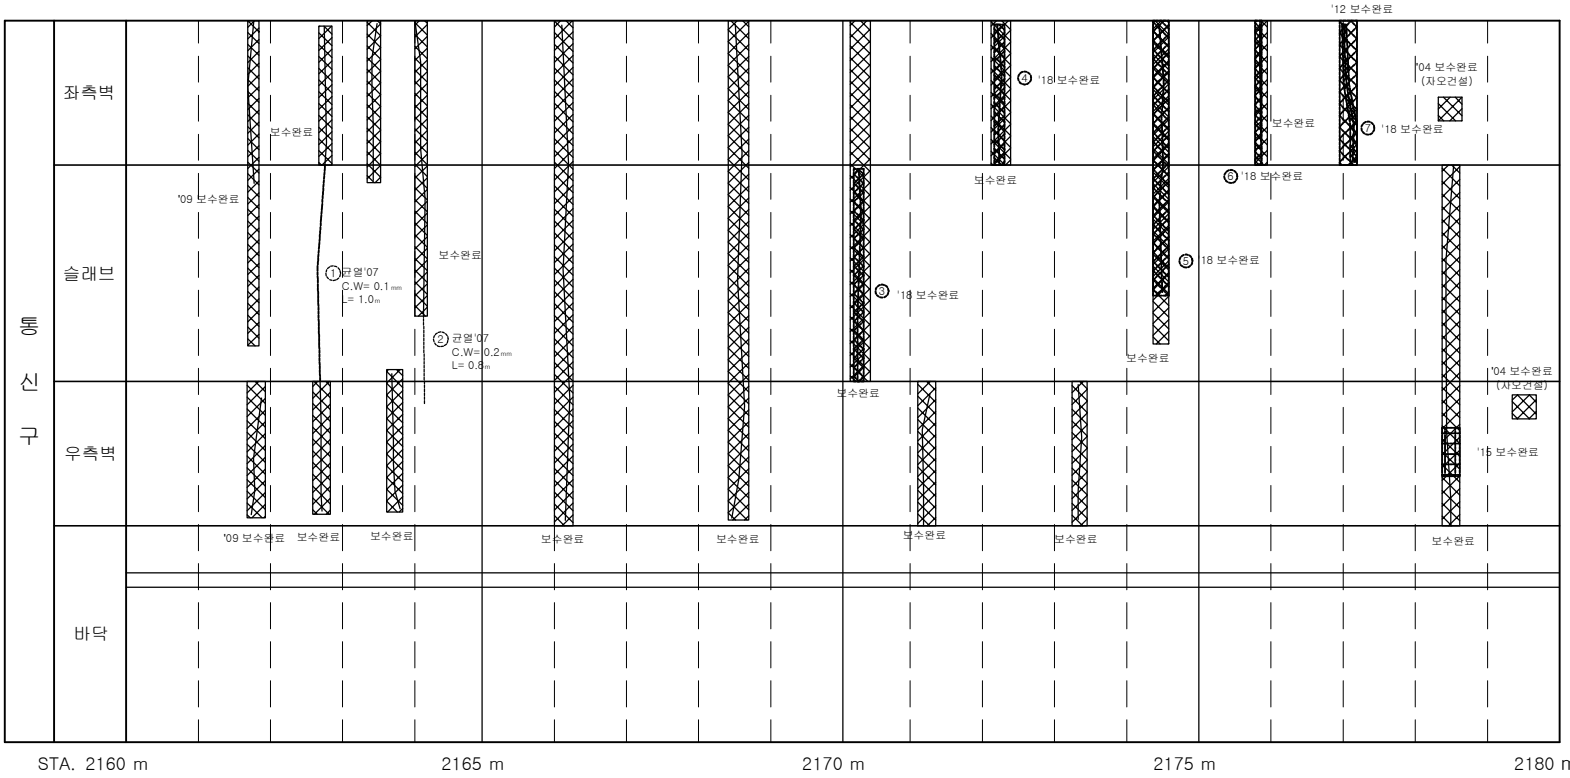

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
2	2007	균열	0.20	0.80		0.80	m	1				
3	2013	보수재박리	0.20	1.30		0.26	㎡	1	2018	단면복구공법	0.31	
4	2013	보수재박리	0.20	2.00		0.40	㎡	1	2018	단면복구공법	0.48	
5	2013	보수재박리	0.20	2.50		0.50	㎡	1	2018	단면복구공법	0.60	
6	2013	보수재박리	0.20	2.00		0.40	㎡	1	2018	단면복구공법	0.48	
7	2013	보수재박리	0.20	2.00		0.40	㎡	1	2018	단면복구공법	0.48	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.2180 m ~2200 m) 통신구 구간



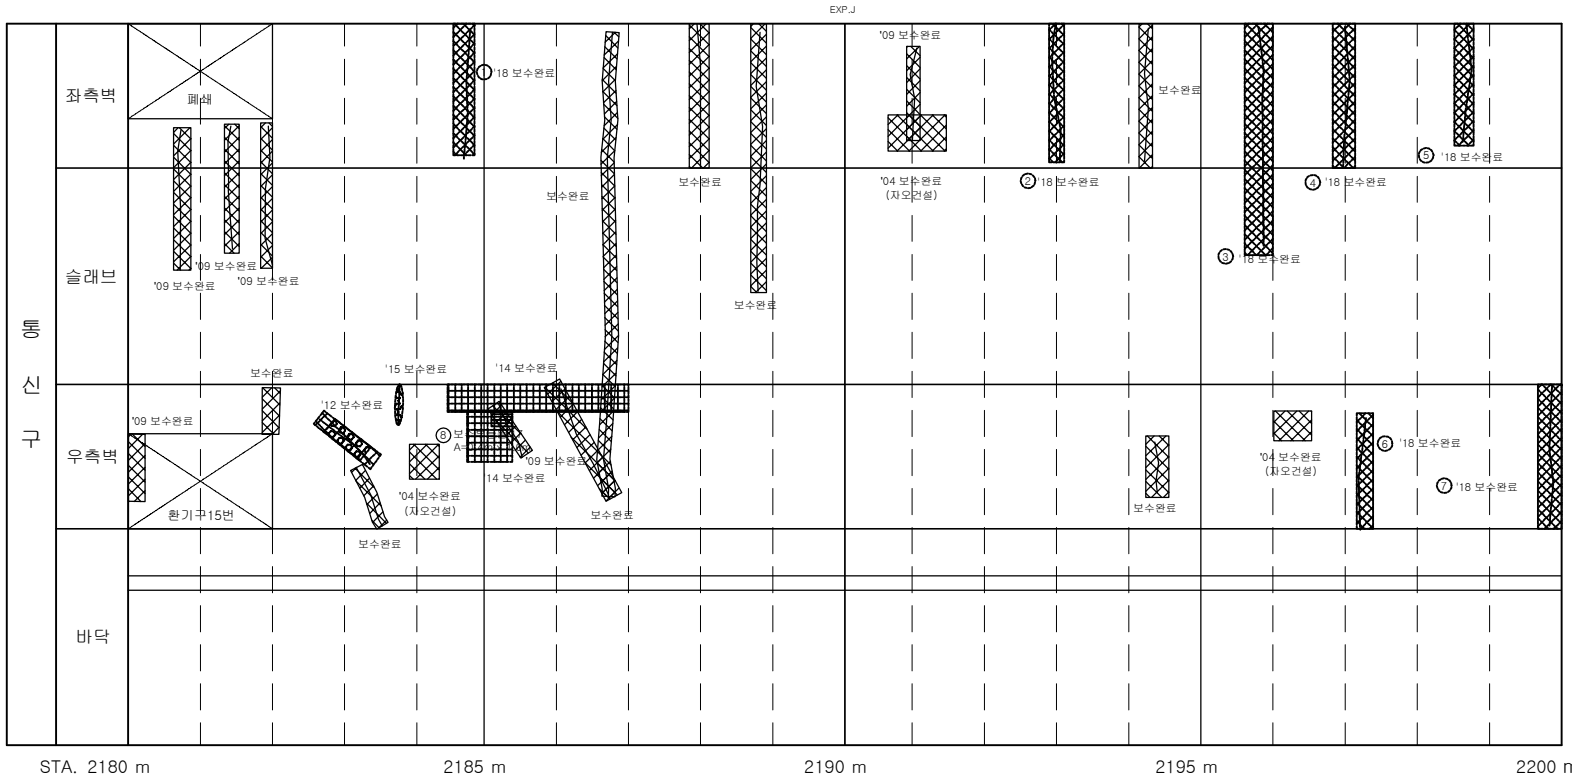

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2009	보수재박리	0.20	2.00		0.40	㎡	1	2018	단면복구공법	0.48	
2	2009	보수재박리	0.20	1.80		0.36	㎡	1	2018	단면복구공법	0.43	
3	2007	보수재박리	0.20	3.00		0.60	㎡	1	2018	단면복구공법	0.72	
4	2009	보수재박리	0.20	2.10		0.42	㎡	1	2018	단면복구공법	0.50	
5	2007	보수재박리	0.20	2.00		0.40	㎡	1	2018	단면복구공법	0.48	
6	2009	보수재박리	0.15	1.70		0.26	㎡	1	2018	단면복구공법	0.31	
7	2007	보수재박리	0.20	2.20		0.44	㎡	1	2018	단면복구공법	0.53	
8	2017	보수부품등	0.40	1.00		0.40	㎡	1				재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락공동구 - 중대로(STA.2181m)환기구 15번

KEYPLAN



SECTION



BOX A

① 좌측벽 ② 슬래브 ③ 우측벽 ④ 바닥

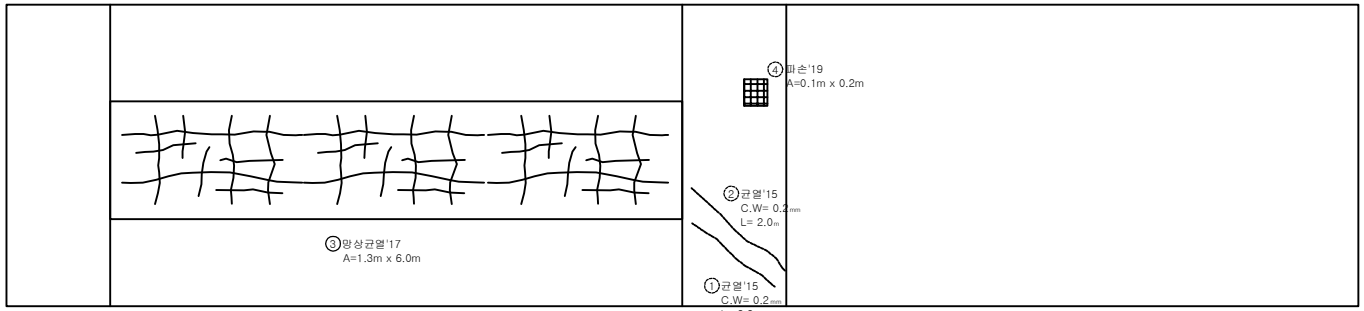

BOX B

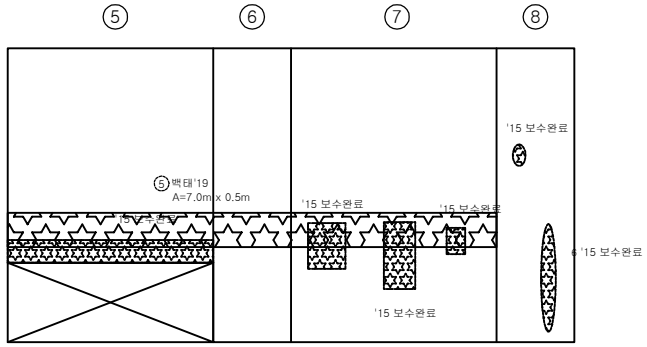



⑥ㄷ빔 부식 '19
L=7.2m

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2015	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
2	2015	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
3	2017	망상균열	1.30	6.00		7.80	㎡	1				
4	2019	파손	0.10	0.20		0.02	㎡	1				신규
5	2019	백태	7.00	0.50		3.50	㎡	1				신규
6	2019	ㄷ빔 부식		7.20		7.20	m	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 맨홀 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.2200 m ~2220 m) 통신구 구간



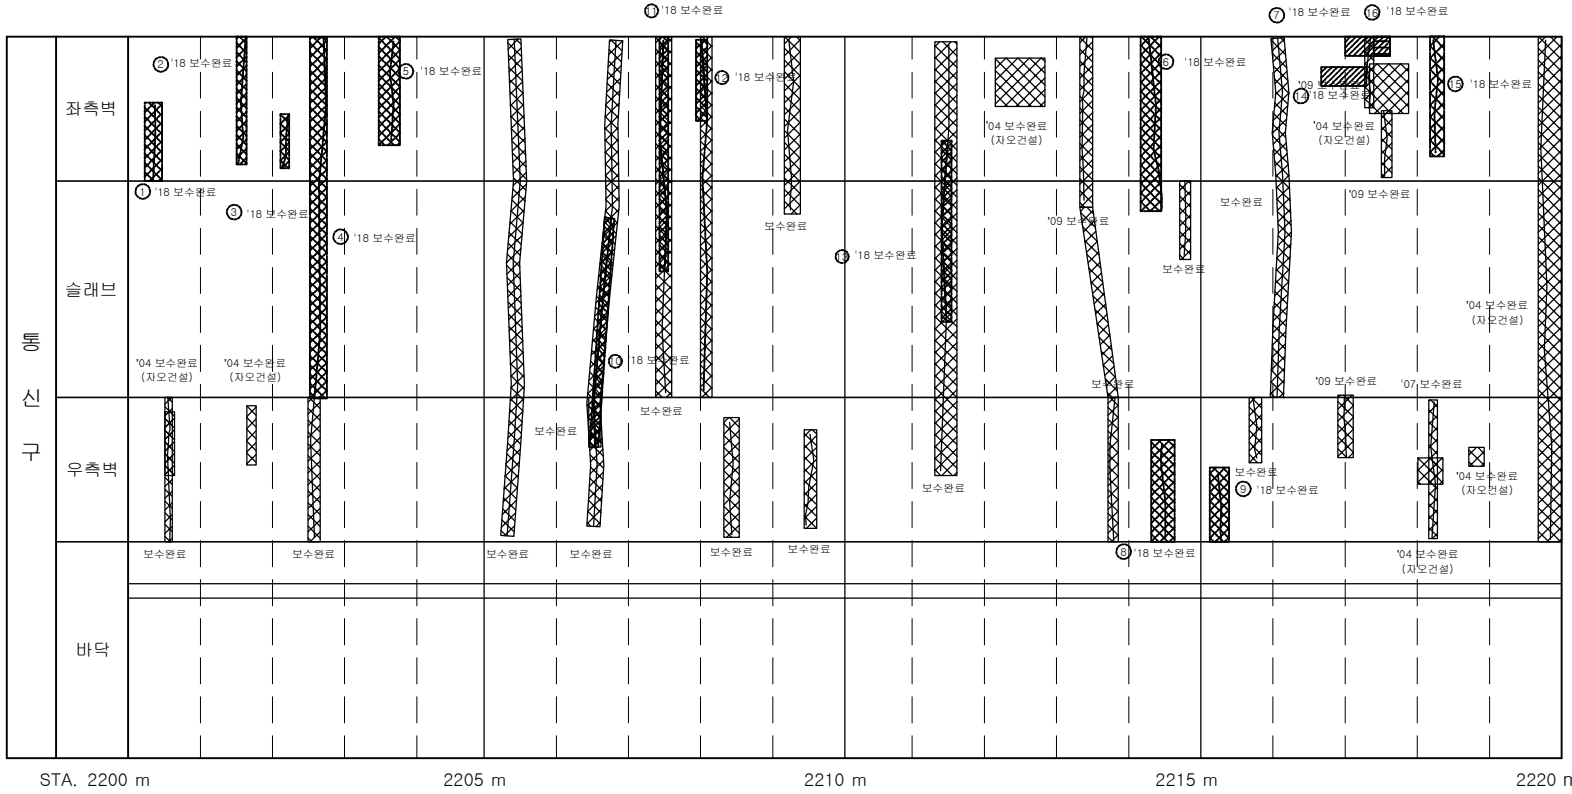

손 상 물 량 표

연번	적용년분	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	보수재박리	0.20	1.00		0.20	㎡	1	2018	단면복구공법	0.24	
2	2009	보수재박리	0.20	2.20		0.44	㎡	1	2018	단면복구공법	0.53	
3	2007	보수재박리	0.20	0.60		0.12	㎡	1	2018	단면복구공법	0.14	
4	2007	보수재박리	0.20	5.10		1.02	㎡	1	2018	단면복구공법	1.22	
5	2007	보수재박리	0.20	1.00		0.20	㎡	1	2018	단면복구공법	0.24	
6	2009	보수재박리	0.20	2.00		0.40	㎡	1	2018	단면복구공법	0.48	
7	2007	재료분리	0.20	0.60		0.12	㎡	1	2018	단면복구공법	0.14	
8	2009	보수재박리	0.20	1.50		0.30	㎡	1	2018	단면복구공법	0.36	
9	2007	보수재박리	0.20	1.10		0.22	㎡	1	2018	단면복구공법	0.26	
10	2013	보수재박리	0.20	2.30		0.46	㎡	1	2018	단면복구공법	0.55	
11	2013	보수재박리	0.20	2.60		0.52	㎡	1	2018	단면복구공법	0.62	
12	2013	보수재박리	0.20	1.50		0.30	㎡	1	2018	단면복구공법	0.36	
13	2013	보수재박리	0.20	1.80		0.36	㎡	1	2018	단면복구공법	0.43	
14	2017	재료분리	0.20	0.60		0.12	㎡	1	2018	단면복구공법	0.14	
15	2017	보수재박리	0.20	1.80		0.36	㎡	1	2018	단면복구공법	0.43	
16	2017	보수부틀림	0.20	0.20		0.04	㎡	1	2018	단면복구공법	0.05	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.2220 m ~2240 m) 통신구 구간



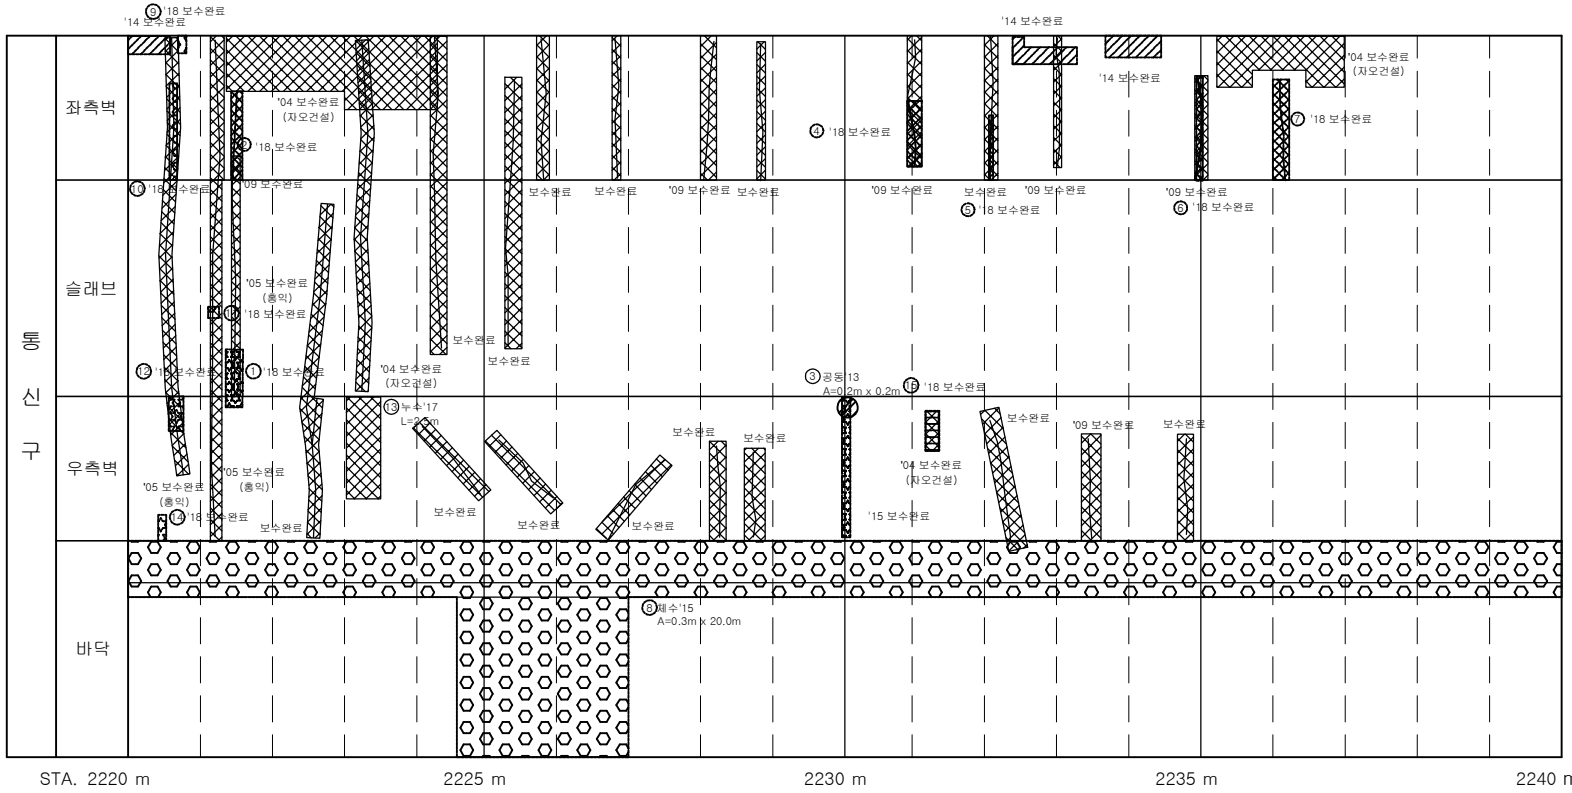

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2009	박태	0.10	1.00		0.10	㎡	1	2018	표면처리공법	0.12	
2	2013	보수재박리	0.20	1.20		0.24	㎡	1	2018	단면복구공법	0.29	
3	2013	공동	0.20	0.20		0.04	㎡	1				
4	2013	보수재박리	0.20	1.00		0.20	㎡	1	2018	단면복구공법	0.05	
5	2013	보수재박리	0.20	0.80		0.16	㎡	1	2018	단면복구공법	0.05	
6	2013	보수재박리	0.20	1.50		0.30	㎡	1	2018	단면복구공법	0.05	
7	2013	보수재박리	0.20	1.50		0.30	㎡	1	2018	단면복구공법	0.05	
8	2015	체수	0.30	20.0		6.00	㎡	1				
9	2017	누수,박태	0.20	0.30		0.06	㎡	1	2018	배면누수보수	0.07	
10	2017	누수흔적	0.20	2.00		0.40	㎡	1	2018	누수보수공법	0.48	
11	2017	누수,박태	0.10	0.10		0.01	㎡	1	2018	배면누수보수	0.01	
12	2017	박태	0.20	0.40		0.08	㎡	1	2018	표면처리공법	0.10	
13	2017	누수		2.50		2.50	m	1				
14	2017	박태	0.10	0.30		0.03	㎡	1	2018	표면처리공법	0.04	
15	2017	보수재박리	0.10	1.00		1.00	m	1	2018	단면복구공법	1.20	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.2240 m ~2260 m) 통신구 구간



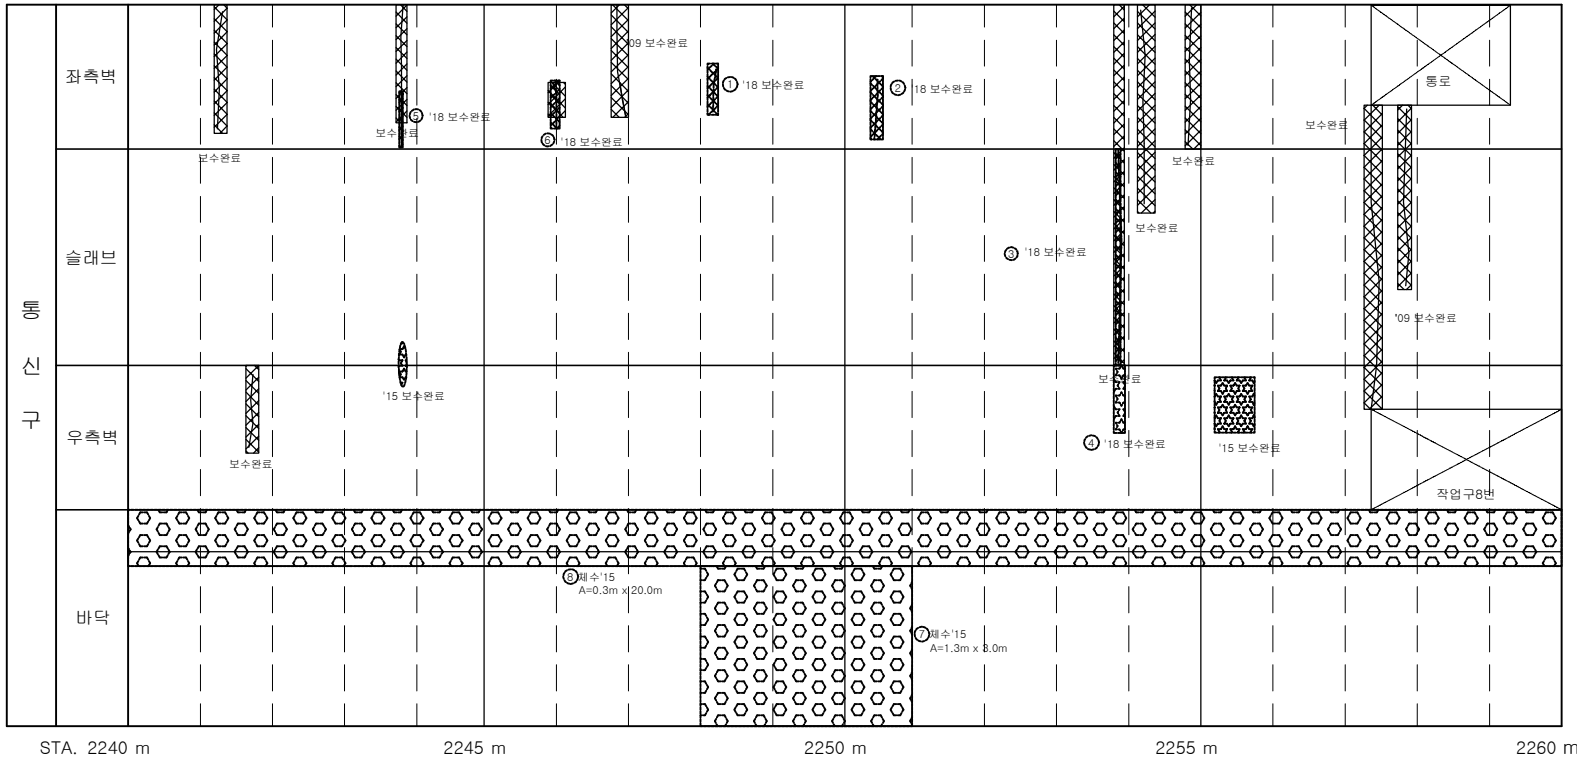

손 상 물 량 표

번호	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소년도	보수공법명/자재명	물량	
1	2009	보수재박리	0.20	0.80		0.16	㎡	1	2018	단면복구공법	0.19	
2	2009	보수재박리	0.20	1.00		0.20	㎡	1	2018	단면복구공법	0.24	
3	2013	보수재박리	0.20	1.50		0.30	㎡	1	2018	단면복구공법	0.36	
4	2017	백태	0.20	1.00		0.20	㎡	1	2018	표면처리공법	0.24	
5	2013	보수재박리	0.20	0.80		0.16	㎡	1	2018	단면복구공법	0.19	
6	2013	보수재박리	0.20	0.60		0.12	㎡	1	2018	단면복구공법	0.14	
7	2015	체수	1.30	3.00		3.90	㎡	1				
8	2015	체수	0.30	20.0		6.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락공동구 - 중대로(STA.2278m)작업구 8번

KEYPLAN



SECTION



BOX A

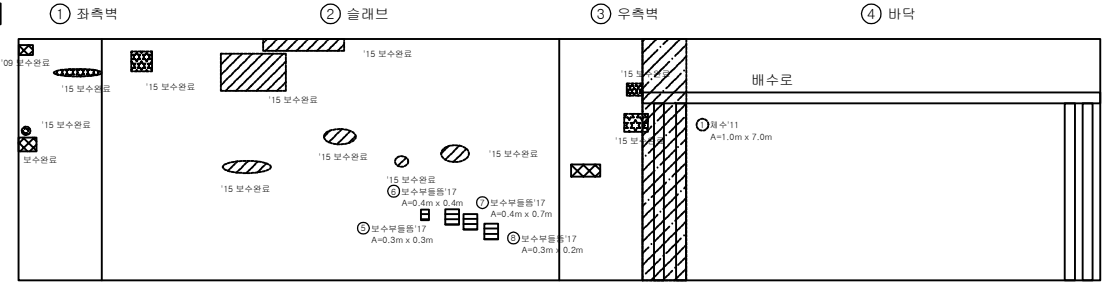

BOX B

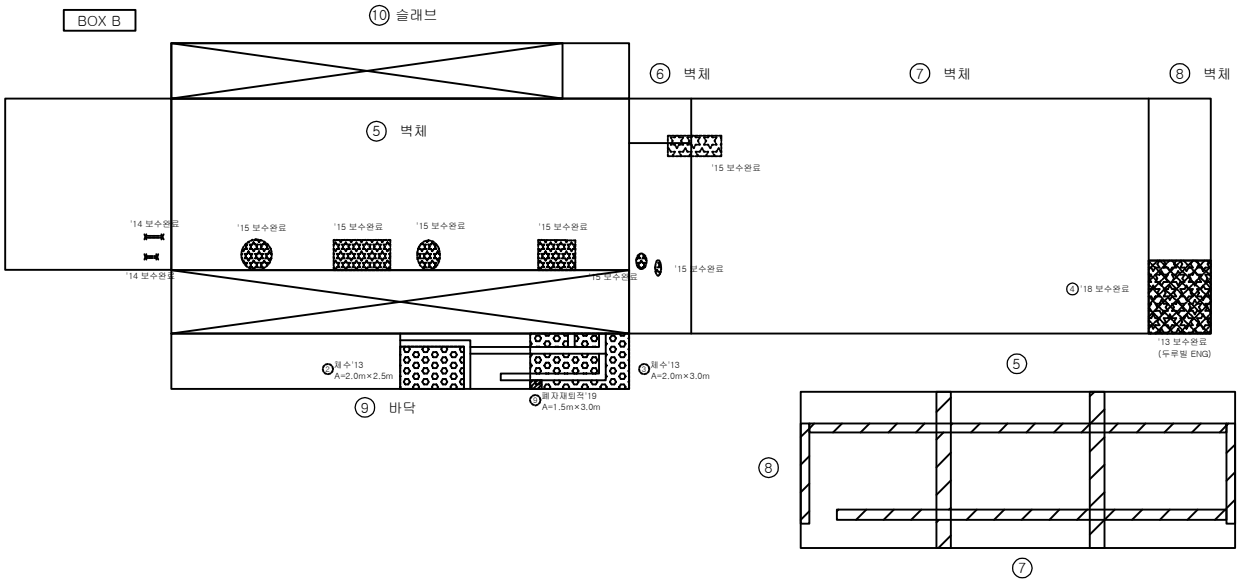

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	중량	
1	2011	채수	1.00	7.00		7.00	㎡	1				
2	2013	채수	2.00	2.50		5.00	㎡	1				
3	2013	채수	2.00	3.00		6.00	㎡	1				
4	2017	박태	1.50	2.00		3.00	㎡	1	2018	표면처리공법	3.60	
5	2017	보수부틀뜸	0.30	0.30		0.09	㎡	1				재결함
6	2017	보수부틀뜸	0.40	0.40		0.16	㎡	1				재결함
7	2017	보수부틀뜸	0.40	0.70		0.28	㎡	1				재결함
8	2017	보수부틀뜸	0.30	0.20		0.06	㎡	1				재결함
9	2019	폐자재임적	1.50	3.00		4.50	㎡	1				신규
10	2019	ㄷ빔 부식		21.0		21.0	m	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 작업구 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 2260ｍ ~ 2280ｍ) 통신구 구간



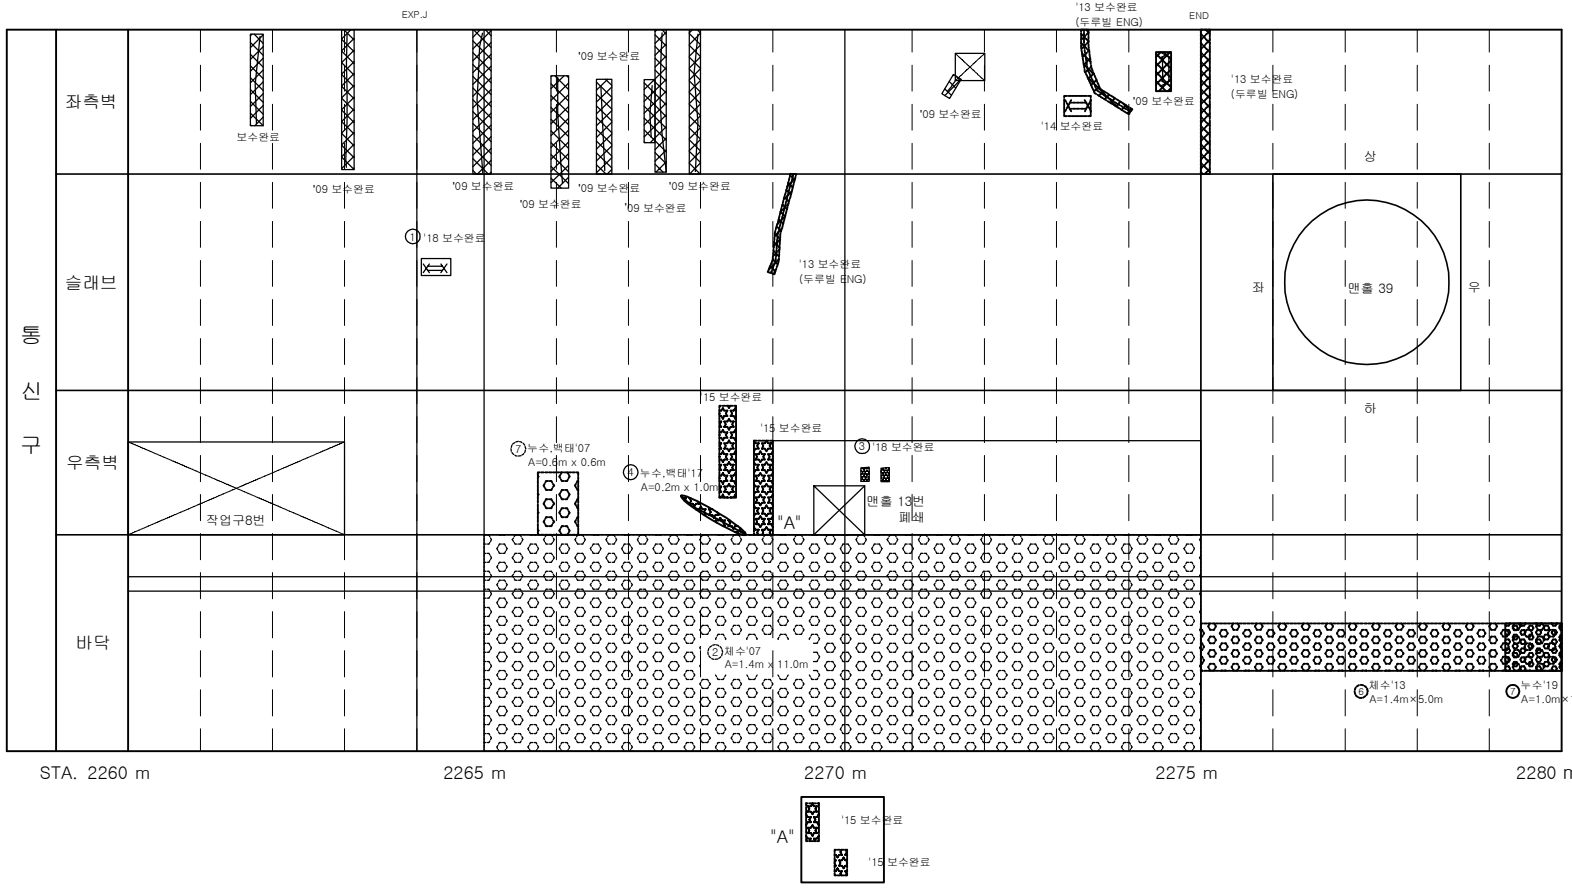

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2017	철근노출	0.10	0.30		0.03	㎡	1	2018	단면복구(방청	0.04	종요
2	2007	체수	1.40	11.0		15.40	㎡	1				
3	2009	백태	0.10	0.20		0.04	㎡	2	2018	표면처리공법	0.05	
4	2013	누수,백태	0.20	1.00		0.20	㎡	1				
5	2013	체수	1.40	5.00		7.00	㎡	1				
6	2015	누수,백태	0.60	0.60		0.36	㎡	1				
7	2019	누수,백태	1.00	1.00		1.00	㎡	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도
