가락 공동구 - 송이로(STA.0.0 m ~ 20.0m) 통신구 구간







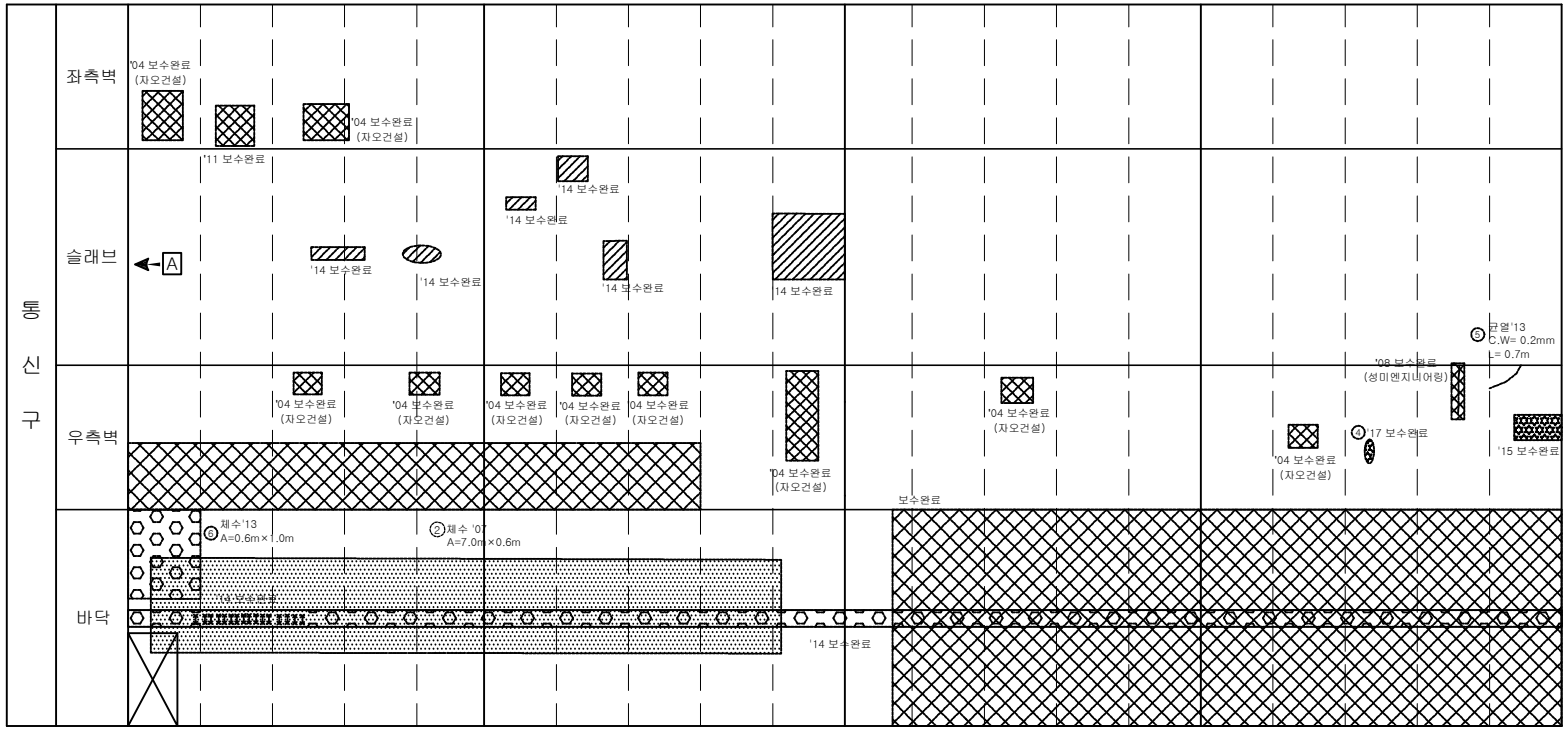

손 상 물 량 표

연번	최종년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2011	누수		0.02		0.02	m	1	2017	누수보수공법	0.02	
2	2007	체수	7.00	0.60		4.20	㎡	1				
3	2015	누수		0.70		0.70	m	1				
4	2013	백태	0.10	0.30		0.03	㎡	1	2017	표면처리공법	0.04	
5	2013	균열	0.20	0.70		0.70	m	1				
6	2013	체수	0.60	1.00		0.60	㎡	1				
7	2017	강판부식	1.00	1.50		1.50	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.20.0 m ~ 40.0m) 통신구 구간





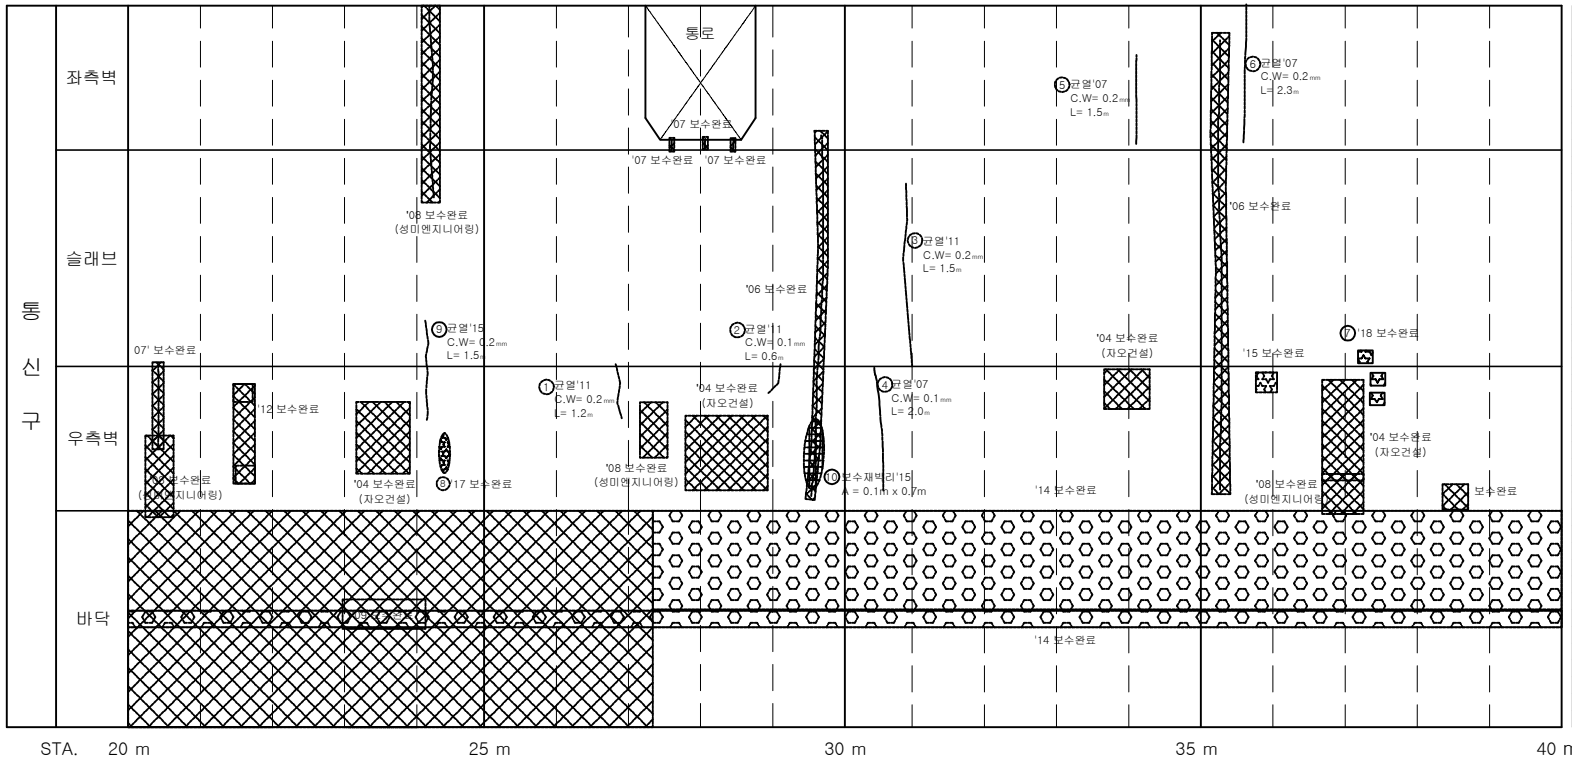

손 상 물 량 표

연번	균열년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2011	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
2	2011	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
3	2011	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
4	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
5	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
7	2009	박대	0.10	0.10		0.03	㎡	3	2018	표면처리공법	0.04	
8	2013	박대	0.10	0.60		0.06	㎡	1	2017	표면처리공법	0.07	
9	2015	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
10	2015	보수재박리	0.10	0.70		0.07	㎡	1				재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.40.0 m ~ 60.0m) 통신구 구간





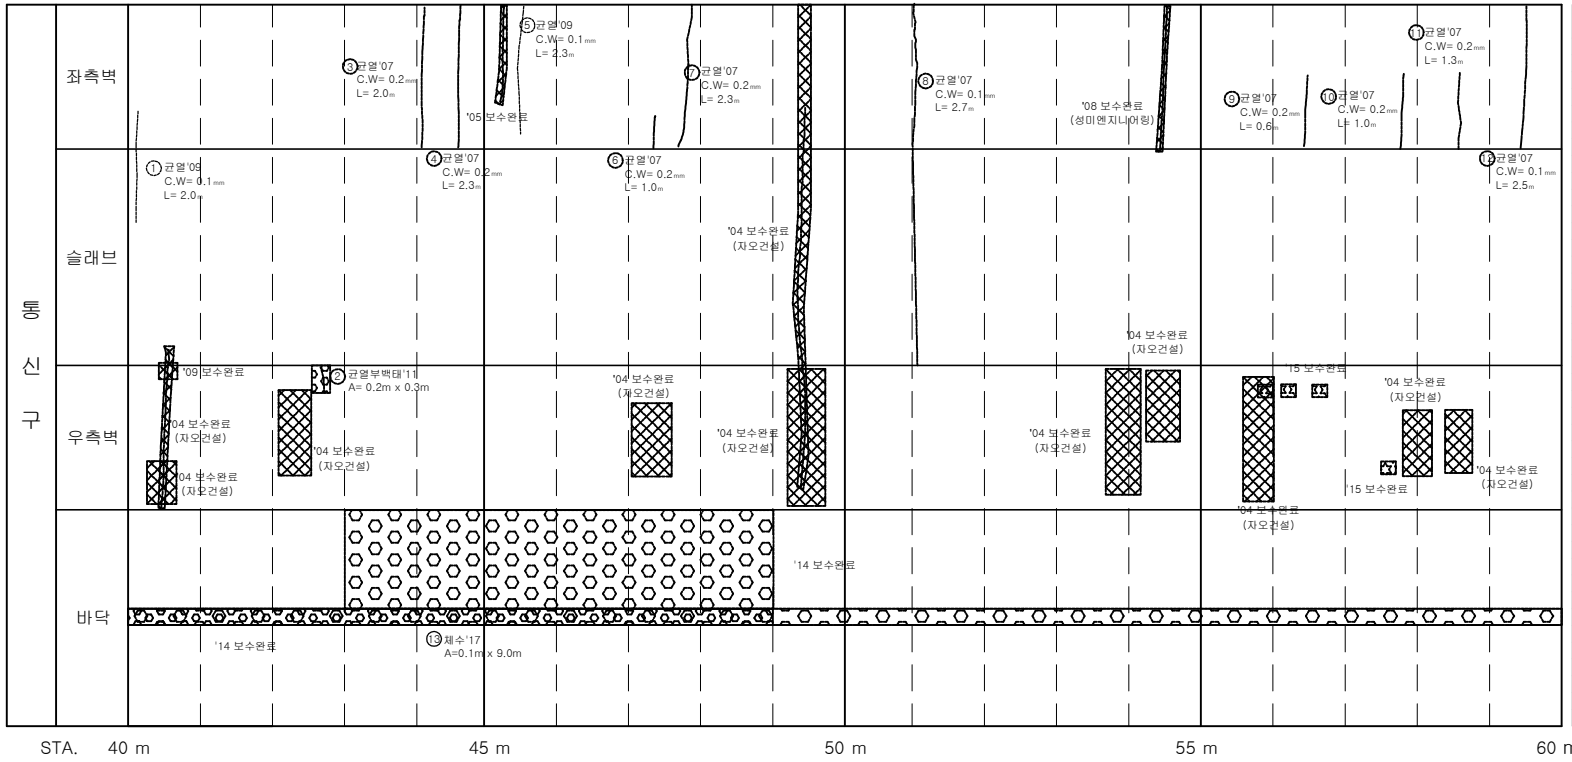

손 상 물 량 표

연번	균열년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
2	2011	균열부백태	0.20	0.30		0.06	㎡	1				
3	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
4	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
5	2009	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
6	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
7	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
8	2007	균열	0.10	2.70		2.70	m	1				
9	2007	균열	0.20	0.60		0.60	m	1				
10	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
11	2007	균열	0.20	1.30		1.30	m	1				
12	2007	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				
13	2017	체수	0.10	9.00		0.90	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.60.0 m ~ 80.0m) 통신구 구간





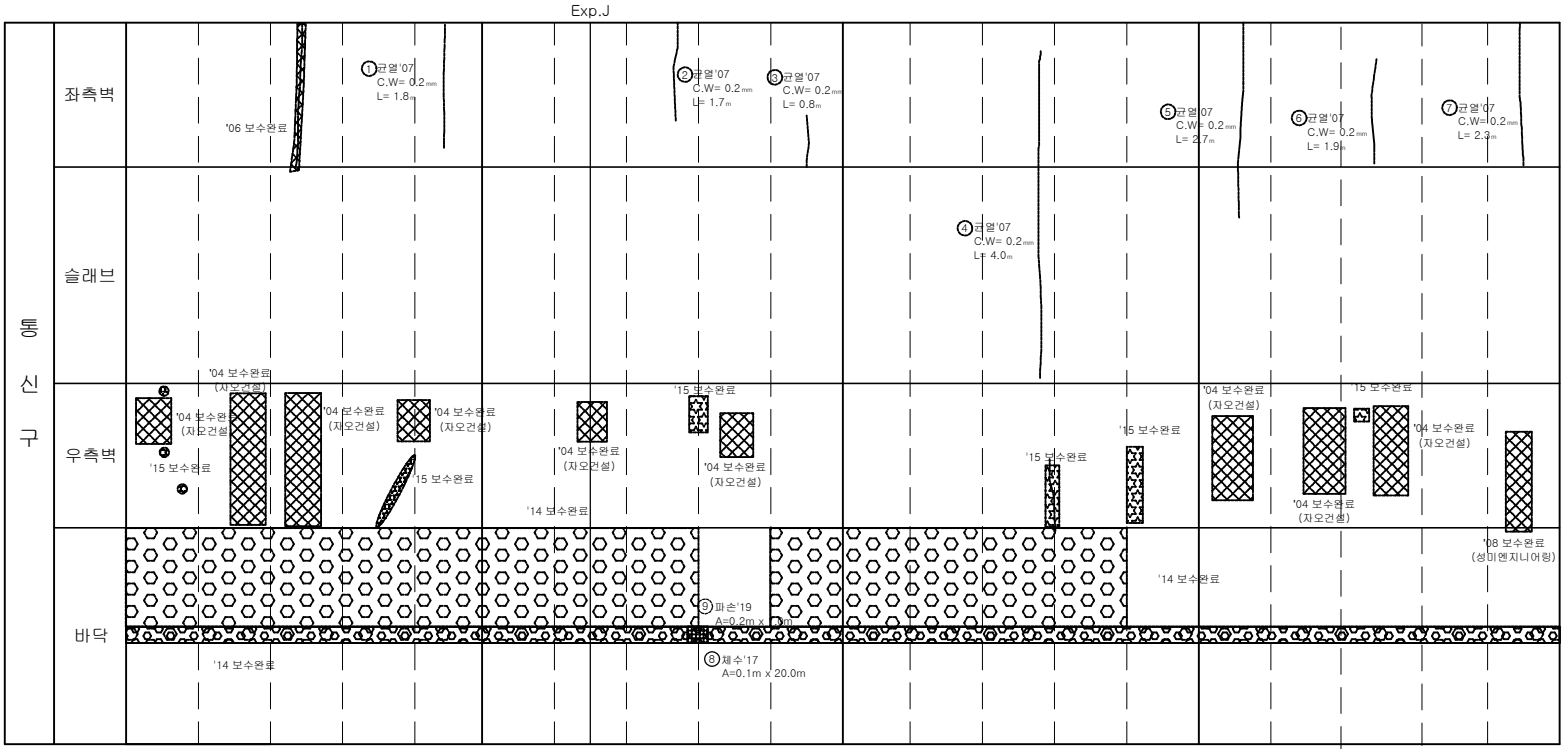

손 상 물 량 표

연번	점검년도	점검내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
2	2007	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
3	2007	균열	0.20	0.80		0.80	m	1				
4	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.70		2.70	m	1				
6	2007	균열	0.20	1.90		1.90	m	1				
7	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
8	2017	체수	0.10	20.00		2.00	㎡	1				
9	2019	파손	0.20	1.00		0.20	㎡	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.80.0 m ~ 100.0m) 통신구 구간





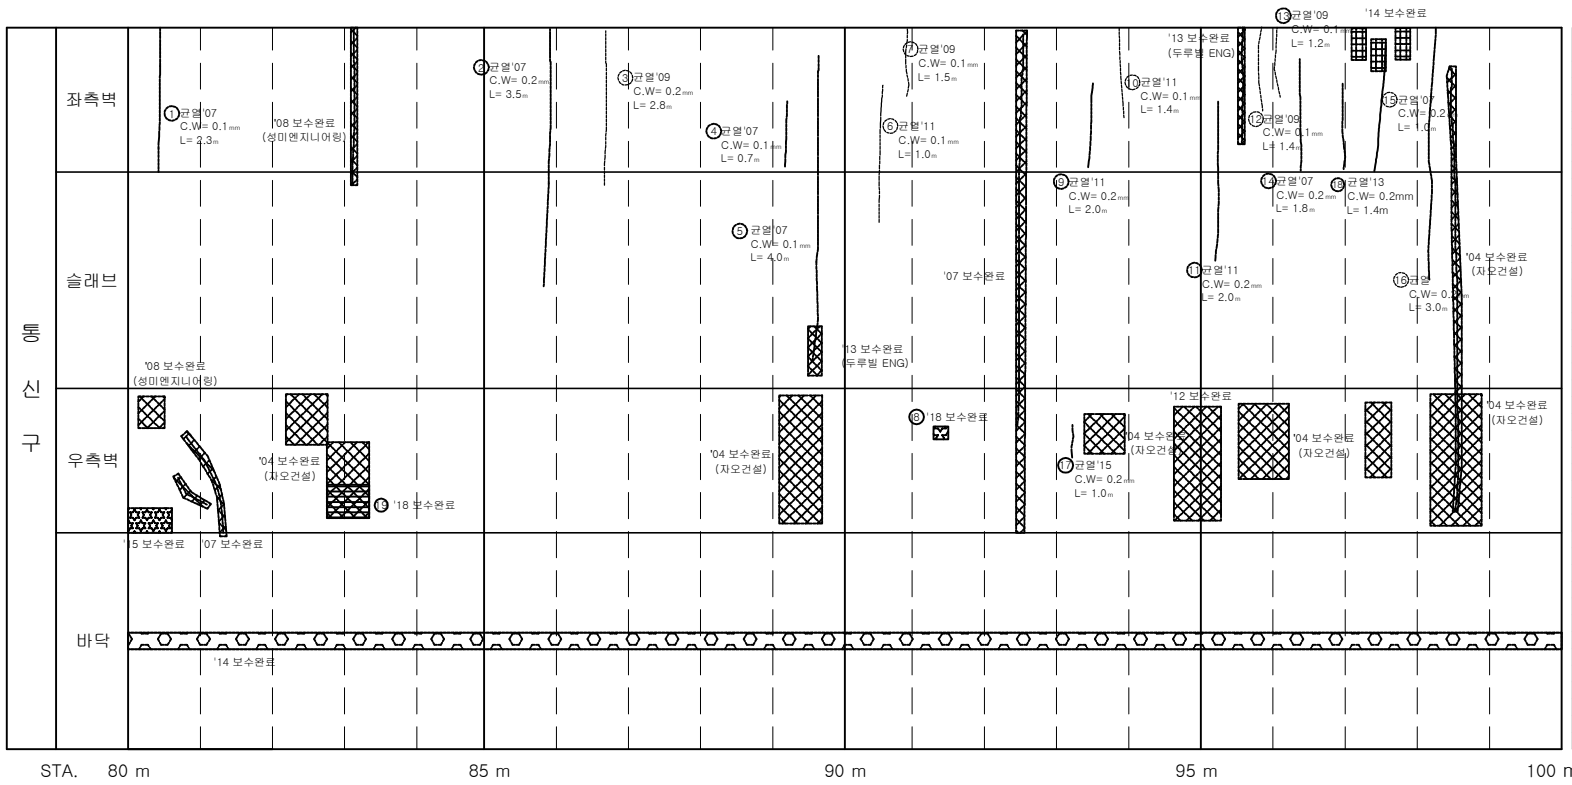

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	수량	단위	계소년도	공법명/자재명	수량		
1	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
2	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.80		2.80	m	1				
4	2007	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
5	2007	균열	0.10	4.00		4.00	m	1				
6	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
7	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
8	2009	백태	0.10	0.10		0.01	㎡	1	2018	표면처리공법	0.01	
9	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
10	2011	균열	0.10	1.40		1.40	m	1				
11	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
12	2009	균열	0.10	1.40		1.40	m	1				
13	2009	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
14	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
15	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
16	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
17	2015	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
18	2013	균열	0.20	1.40		1.40	m	1				
19	2015	보수부들음	0.20	0.50		0.10	㎡	1	2018	단면복구공법	0.12	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.100.0 m ~ 120.0m) 통신구 구간





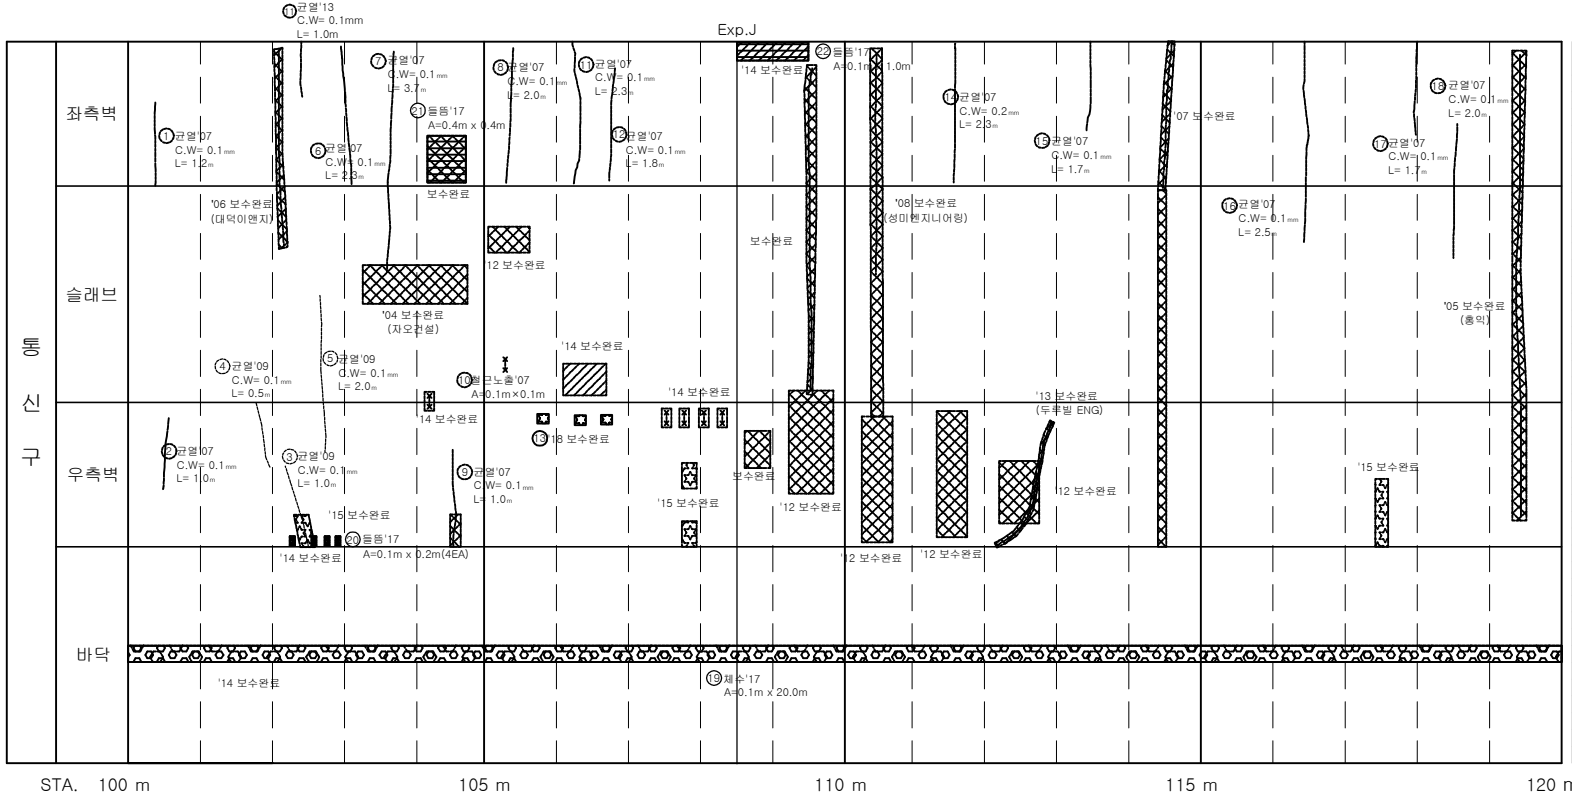

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
2	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
3	2009	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
4	2009	균열	0.10	0.50		1.00	m	2				
5	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
6	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
7	2007	균열	0.10	3.70		3.70	m	1				
8	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
9	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
10	2007	철근노출	0.10	0.10		0.01	㎡	1				
11	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
12	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
13	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
14	2007	박대	0.10	0.10		0.03	㎡	3	2018	표면처리공법	0.04	
15	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
16	2007	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
17	2007	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				
18	2007	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
19	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
20	2017	체수	0.10	20.00		2.00	㎡	1				
21	2017	들뜸	0.10	0.20		0.08	㎡	4				
22	2017	들뜸	0.40	0.40		0.16	㎡	1				
23	2017	들뜸	0.10	1.00		0.10	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.120.0 m ~ 140.0m) 통신구 구간





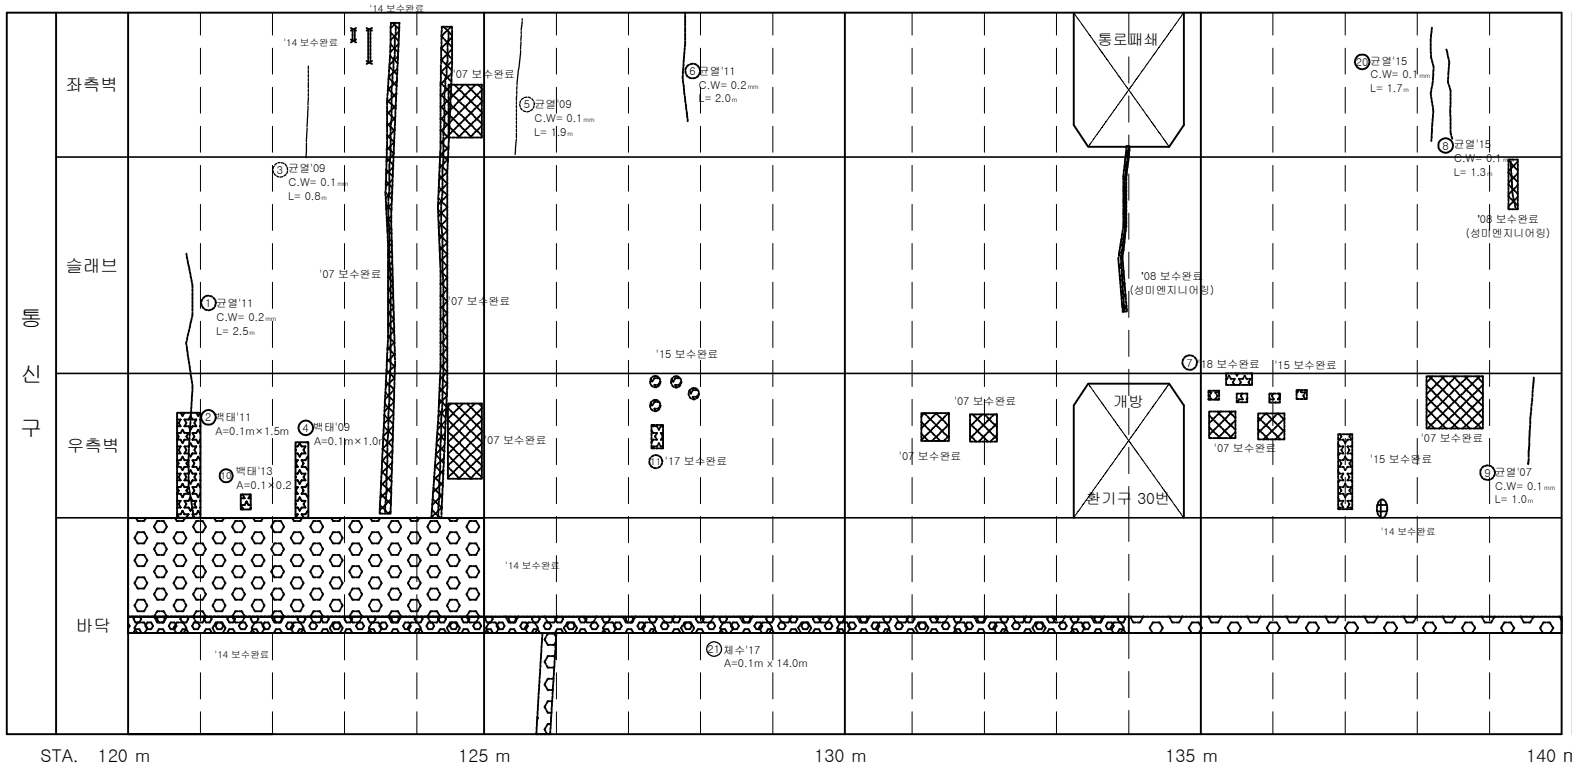

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2011	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
2	2011	백태	0.10	1.50		0.15	㎡	1				
3	2009	균열	0.10	0.80		0.80	m	1				
4	2009	백태	0.10	1.00		0.10	㎡	1				
5	2009	균열	0.10	1.90		1.90	m	1				
6	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
7	2009	백태	0.10	0.40		0.04	㎡	1	2018	표면처리공법	0.05	
8	2015	균열	0.10	1.30		1.30	m	1				
9	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
10	2013	백태	0.10	0.20		0.02	㎡	1				
11	2015	백태	0.10	0.30		0.03	㎡	1	2017	표면처리공법	0.04	
12	2015	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
13	2017	체수	0.10	14.00		1.40	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락공동구 - 송이로(STA.134m)환기구 30번



BOX A

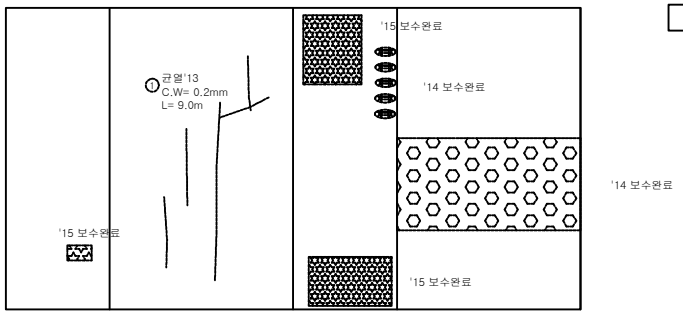

출입구



BOX B

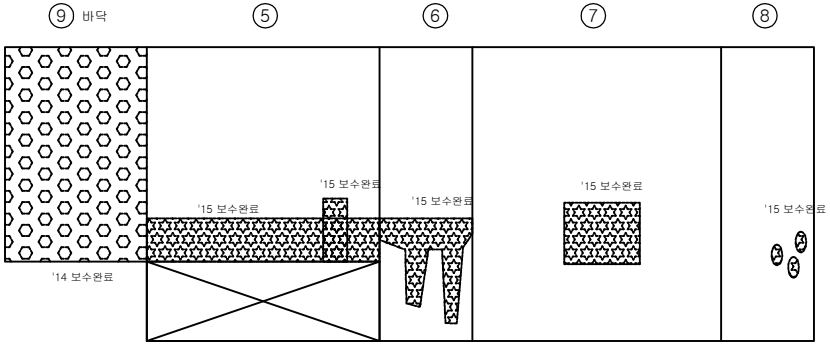

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2013	균열	0.20	9.00		9.00	m	1				
2	2019	ㄷ빔 부식		7.20		7.20	m	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 환기구 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.140.0 m ~ 160.0m) 통신구 구간





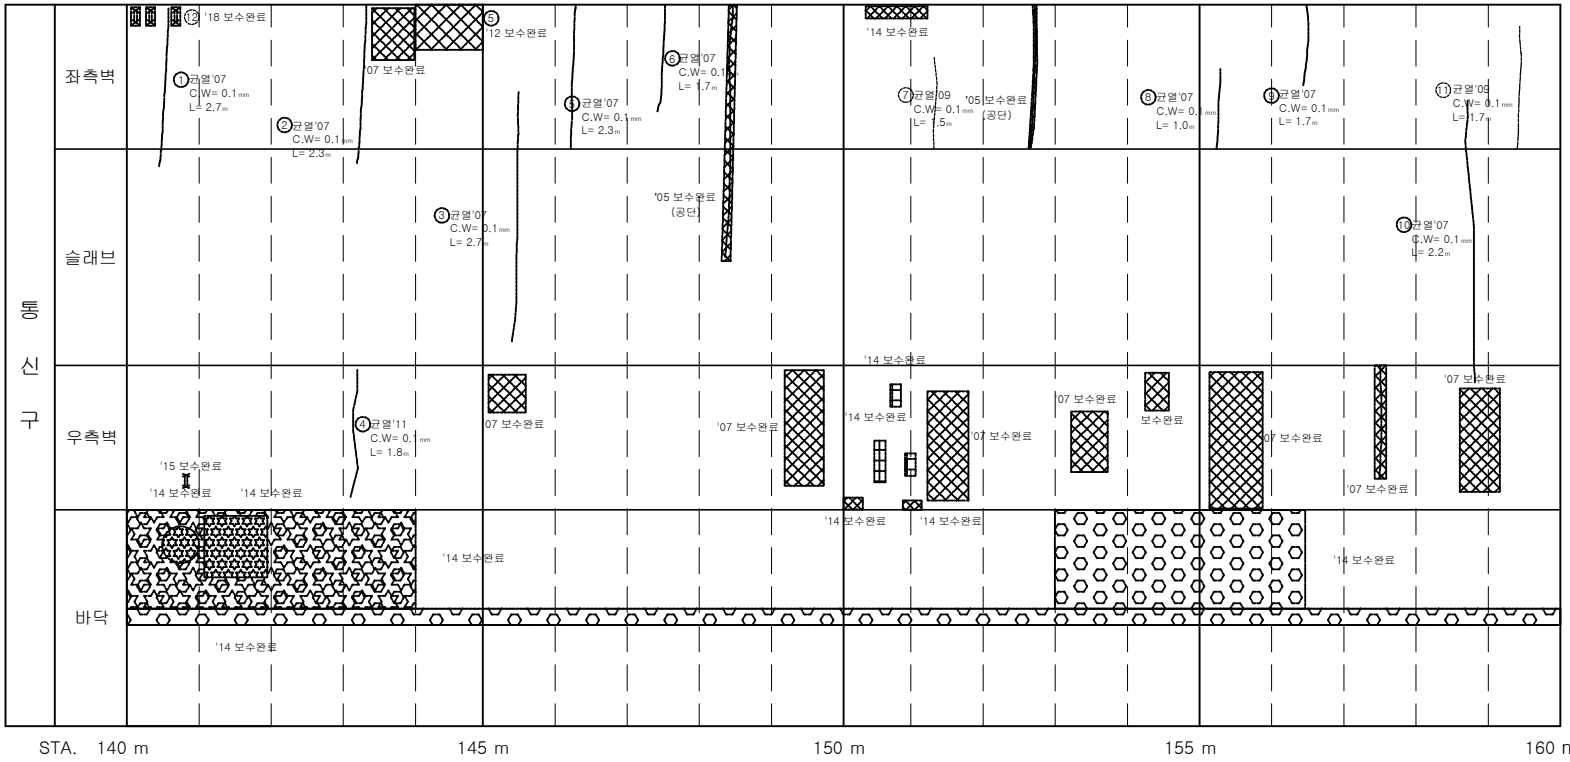

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.10	2.70		2.70	m	1				
2	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
3	2007	균열	0.10	2.70		2.70	m	1				
4	2011	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
5	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
6	2007	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
7	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
8	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
9	2007	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
10	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
11	2009	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
12	2017	철근노출	0.20	0.40		0.24	㎡	3	2018	단면복구(방청)	0.29	중요

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.160.0 m ~ 180.0m) 통신구 구간





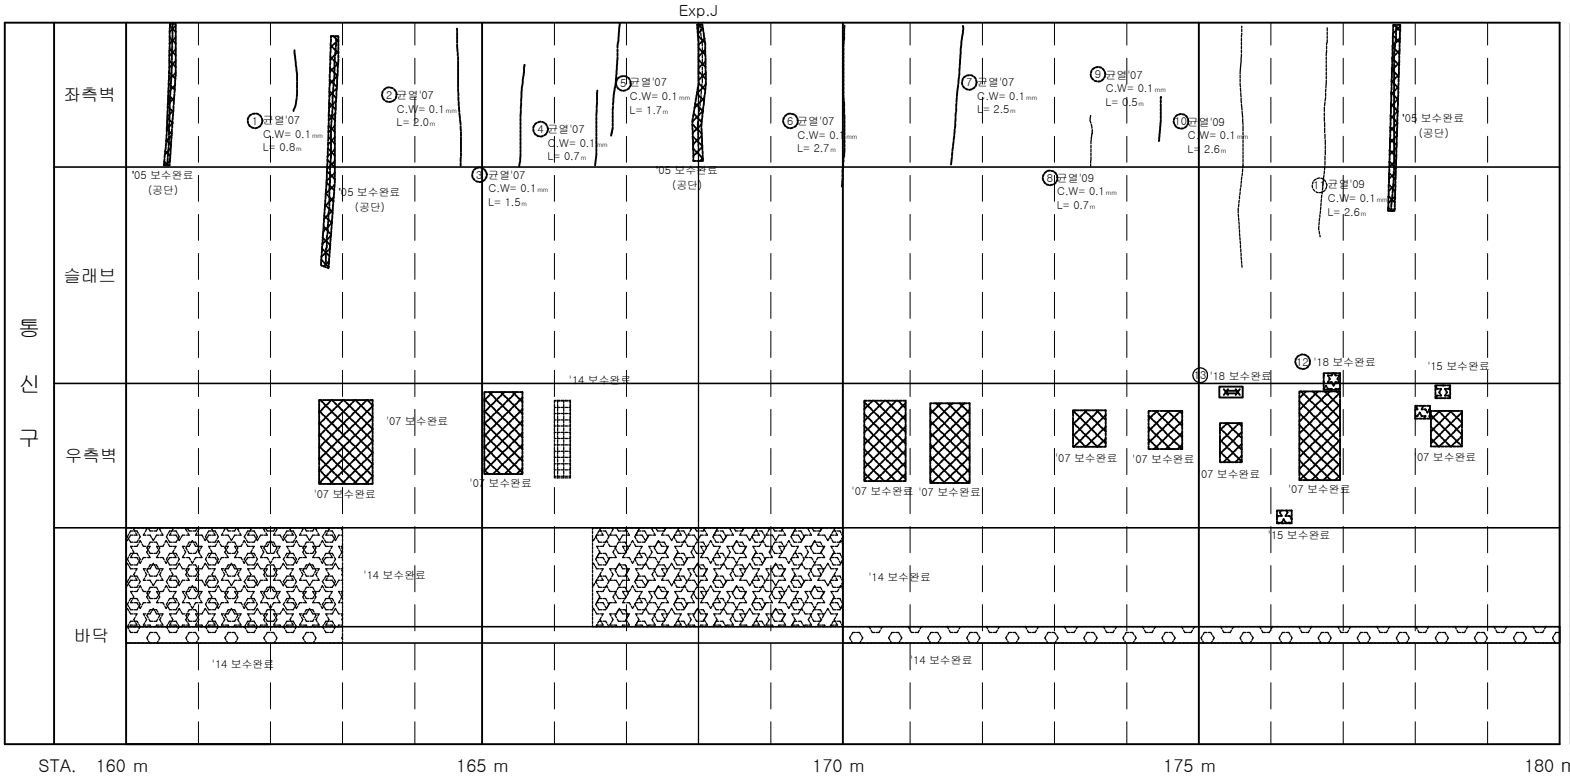

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	균열	0.10	0.80		0.80	m	1				
2	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
3	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
4	2007	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
5	2007	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
6	2007	균열	0.10	2.70		2.70	m	1				
7	2007	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				
8	2009	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
9	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
10	2009	균열	0.10	2.60		2.60	m	1				
11	2009	균열	0.10	2.60		2.60	m	1				
12	2007	백태	0.10	0.20		0.02	㎡	1	2018	표면처리공법	0.02	
13	2017	철근노출	0.20	0.20		0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.05	중요

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.180.0 m ~ 200.0m) 통신구 구간





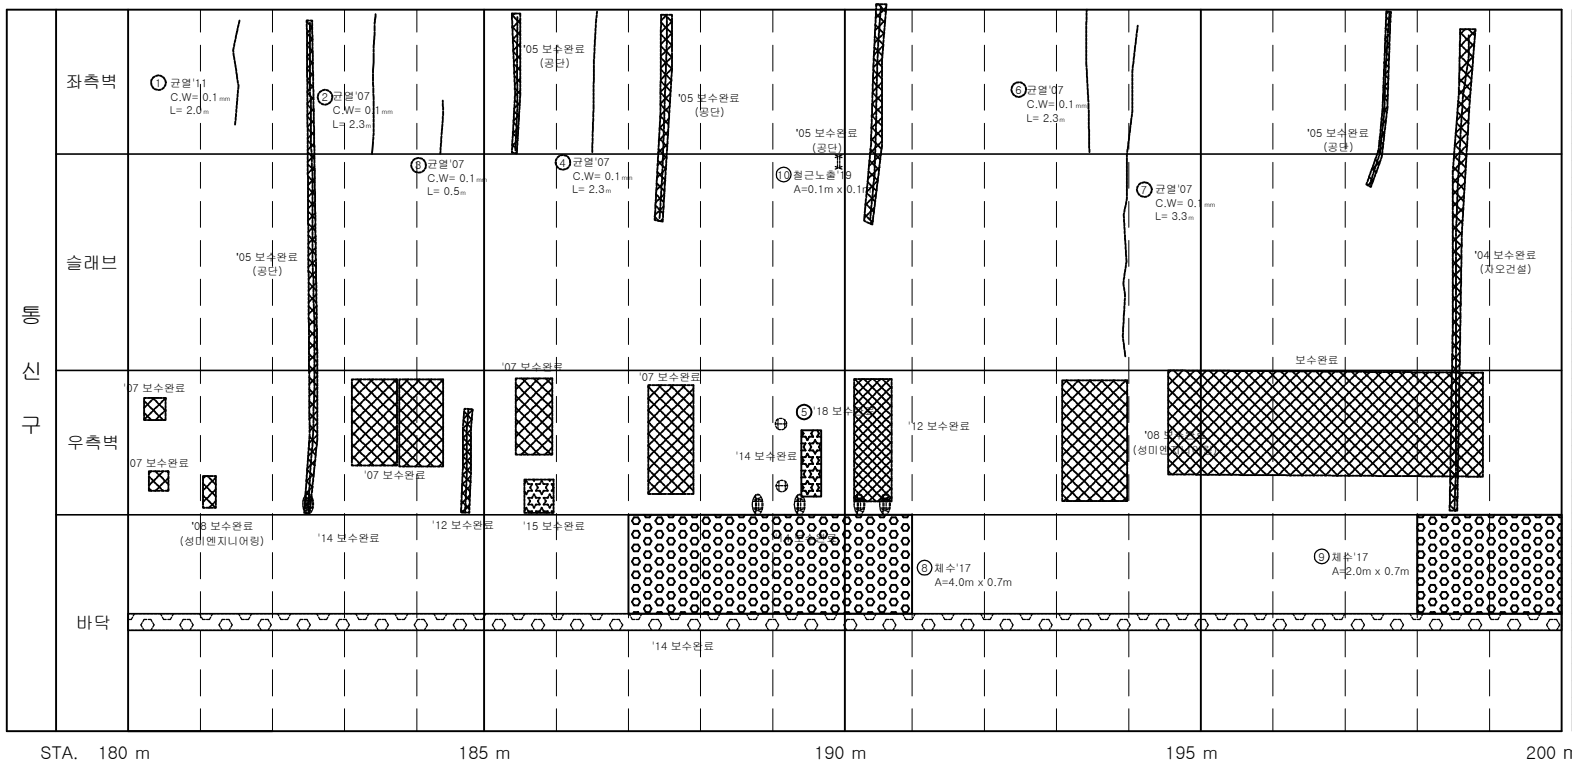

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
2	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
3	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
4	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
5	2007	백태	0.10	1.00		0.10	㎡	1	2018	표면처리공법	0.12	
6	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
7	2007	균열	0.10	3.30		3.30	m	1				
8	2017	체수	4.00	0.70		2.80	㎡	1				
9	2017	체수	2.00	0.70		1.40	㎡	1				
10	2019	철근노출	0.10	0.10		0.01	㎡	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.200.0 m ~ 220.0m) 통신구 구간





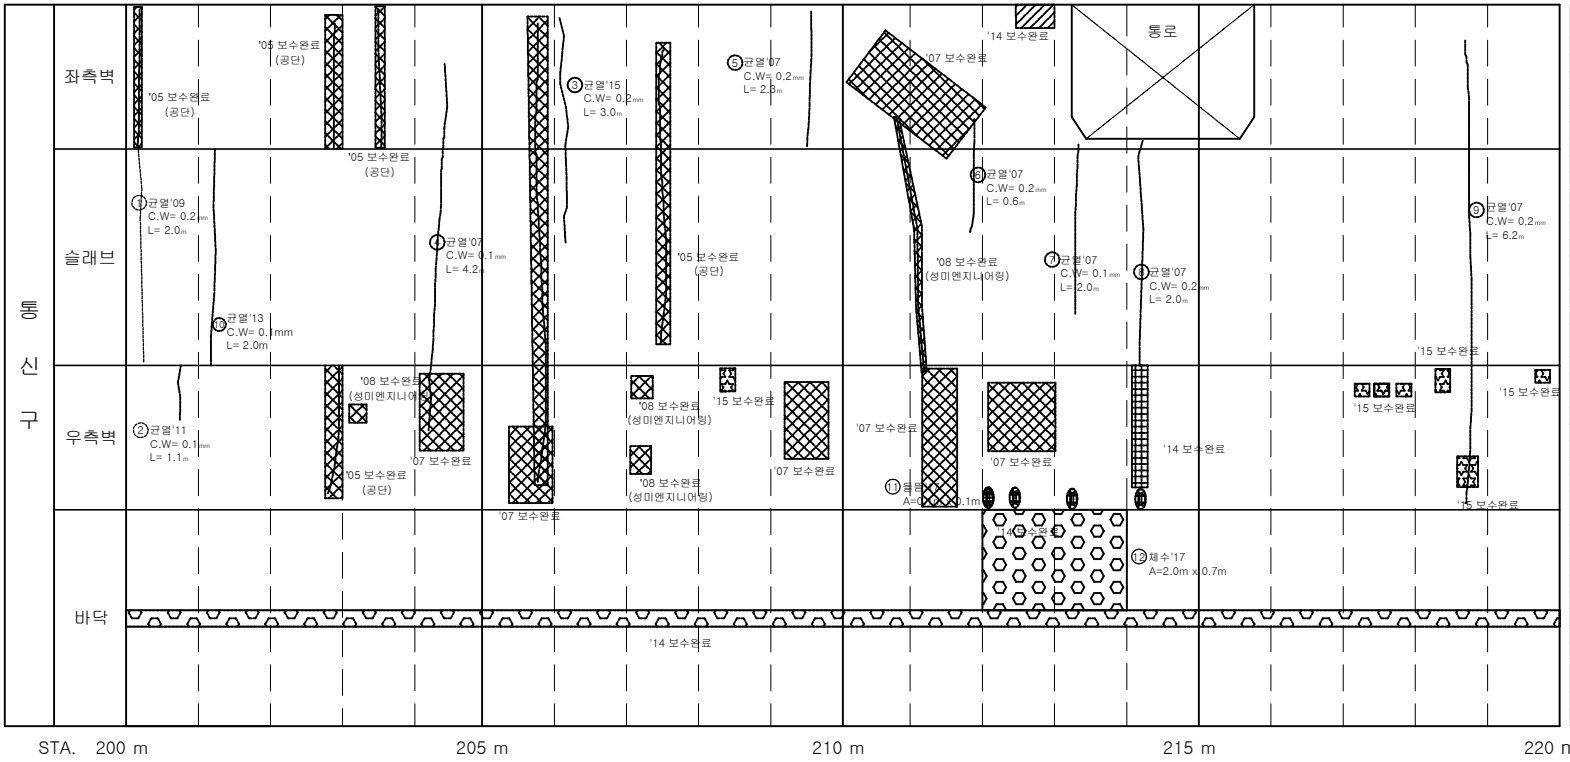

손 상 물 량 표

연번	균열번호	균열내용	균열규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2009	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
2	2011	균열	0.10	1.10		1.10	m	1				
3	2015	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
4	2007	균열	0.10	4.20		4.20	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
6	2007	균열	0.20	0.60		0.60	m	1				
7	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
9	2007	균열	0.20	6.20		6.20	m	1				
10	2013	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
11	2017	들뜸	0.10	0.10		0.01	㎡	1				
12	2017	체수	2.00	0.70		1.40	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.220.0 m ~ 240.0m) 통신구 구간





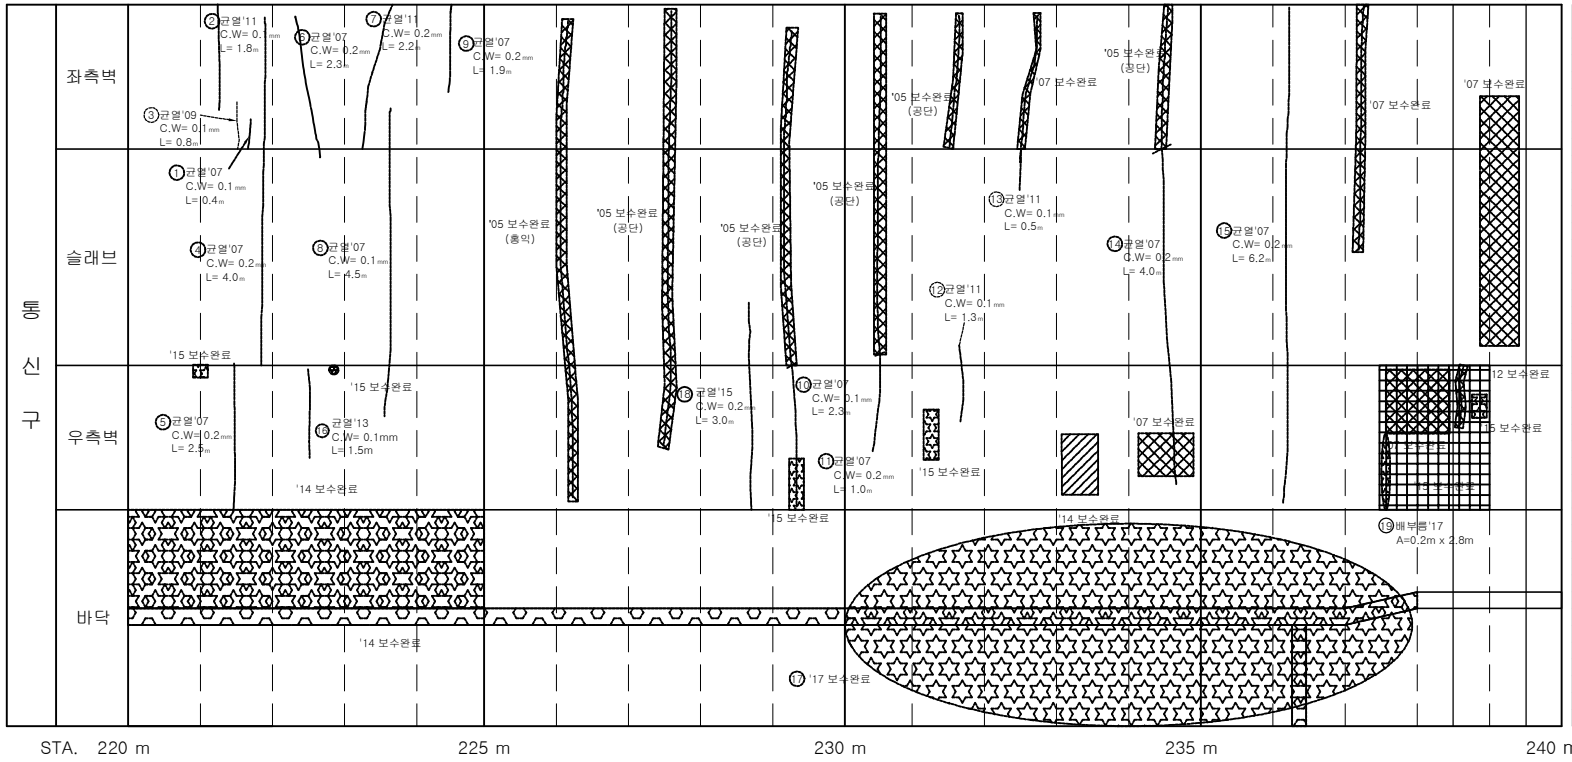

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	균열	0.10	0.40		0.40	m	1				
2	2011	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
3	2009	균열	0.10	0.80		0.80	m	1				
4	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
7	2011	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
8	2007	균열	0.10	4.50		4.50	m	1				
9	2007	균열	0.20	1.90		1.90	m	1				
10	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
11	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
12	2011	균열	0.10	1.30		1.30	m	1				
13	2011	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
14	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
15	2007	균열	0.20	6.20		6.20	m	1				
16	2013	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
17	2015	박대	1.30	9.00		11.70	㎡	1	2017	표면처리공법	14.04	
18	2015	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
19	2017	배부름	0.20	2.80		0.56	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.240.0 m ~ 260.0m) 통신구 구간





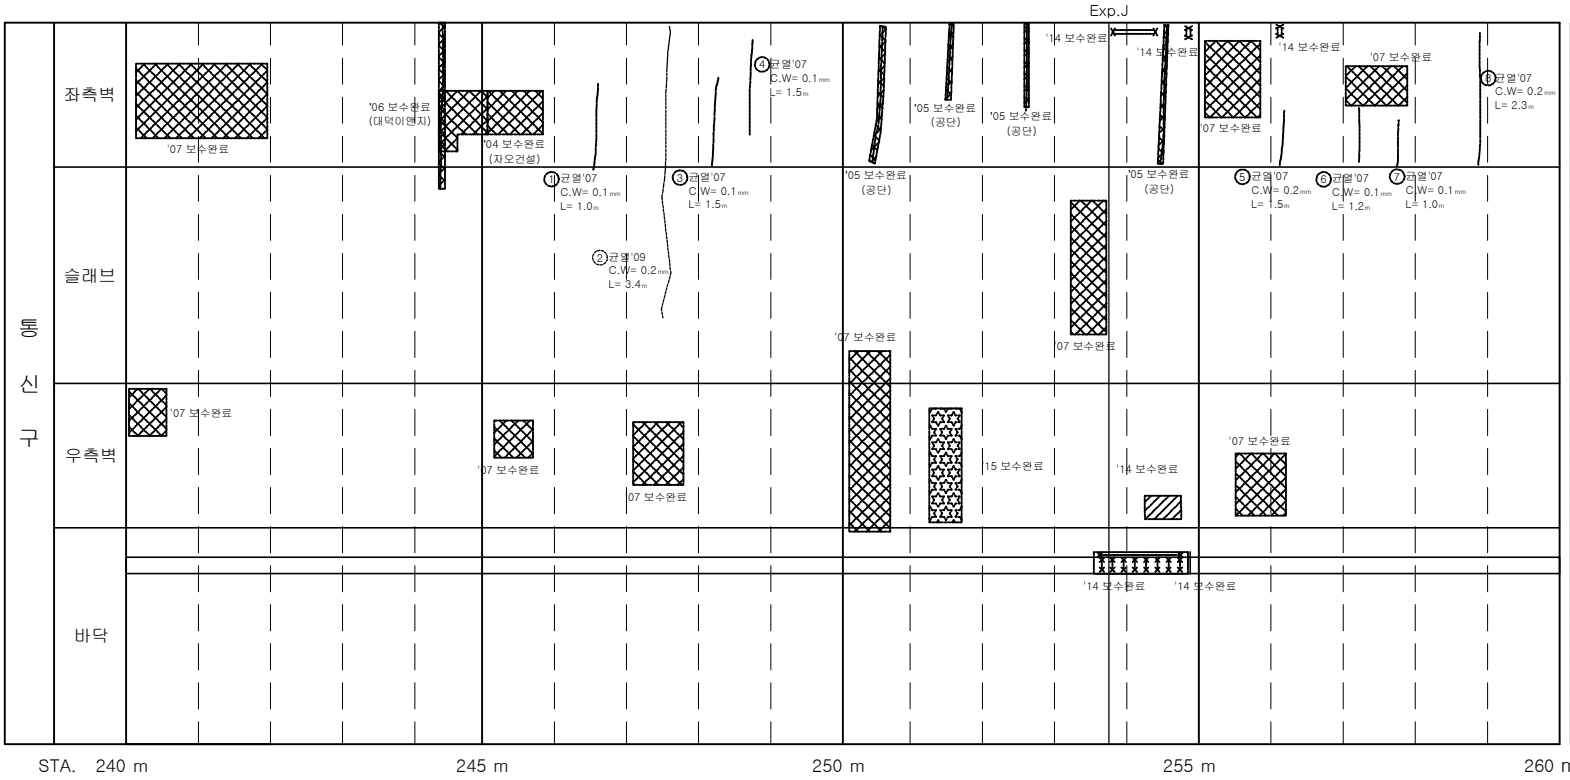

손 상 물 량 표

연번	균열년도	균열내용	균열규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	평탄		
1	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
2	2009	균열	0.20	3.40		3.40	m	1				
3	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
4	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
5	2007	균열	0.10	0.10		0.10	m	1				
6	2007	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
7	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.260.0 m ~ 280.0m) 통신구 구간





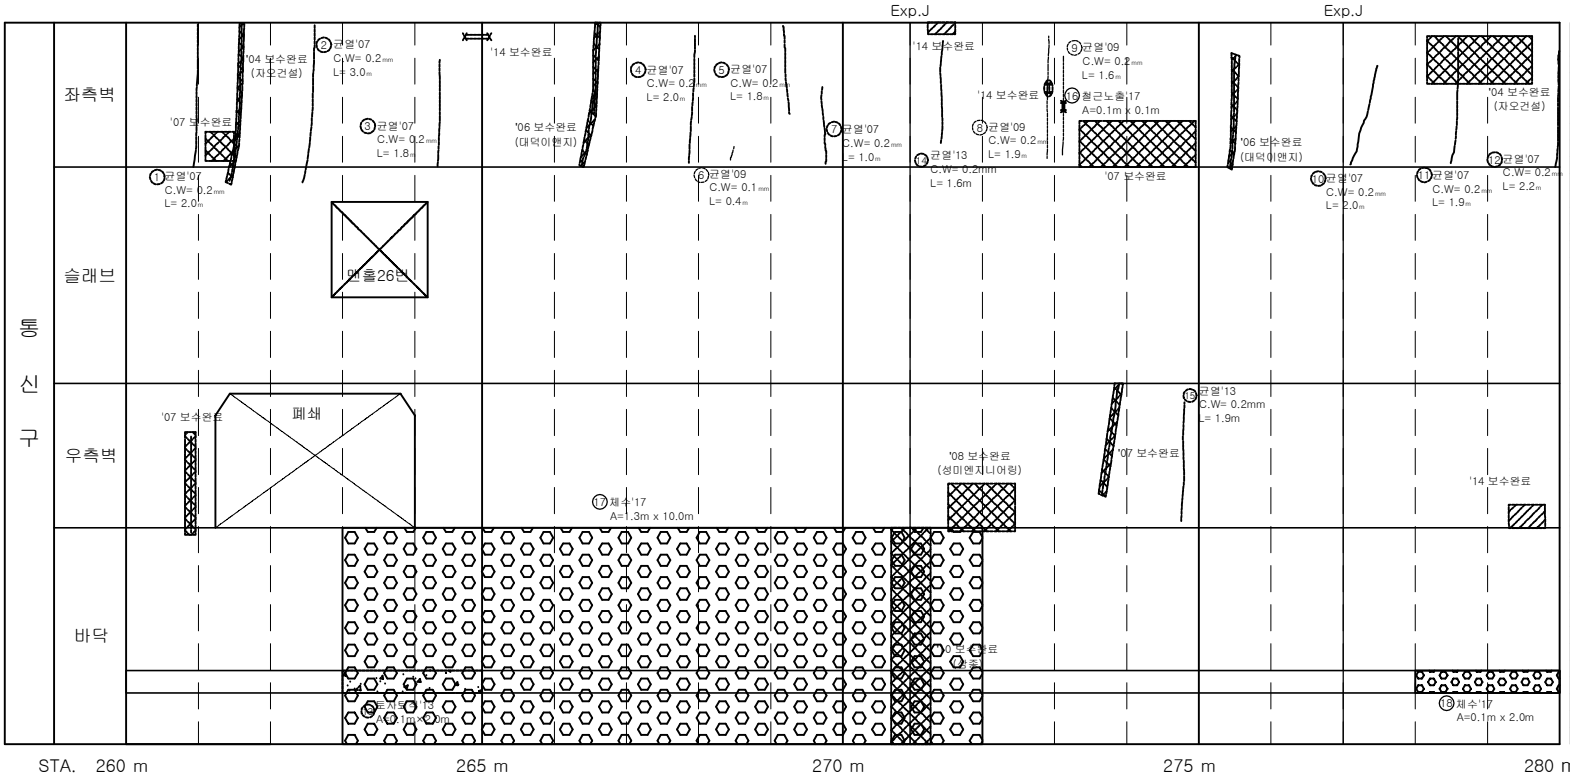

손 상 물 량 표

연번	점검년도	점검내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
2	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
3	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
4	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
5	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
6	2009	균열	0.10	0.40		0.40	m	1				
7	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
8	2009	균열	0.20	1.90		1.90	m	1				
9	2009	균열	0.20	1.60		1.60	m	1				
10	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
11	2007	균열	0.20	1.90		1.90	m	1				
12	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
13	2013	도사퇴적	0.10	2.00		0.20	㎡	1				
14	2013	균열	0.20	1.60		1.60	m	1				
15	2013	균열	0.20	1.90		1.90	m	1				
16	2017	철근노출	0.10	0.10		0.01	㎡	1				중요
17	2017	체수	1.30	10.0		13.0	㎡	1				
18	2017	체수	0.10	2.00		0.20	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.280.0 m ~ 300.0m) 통신구 구간





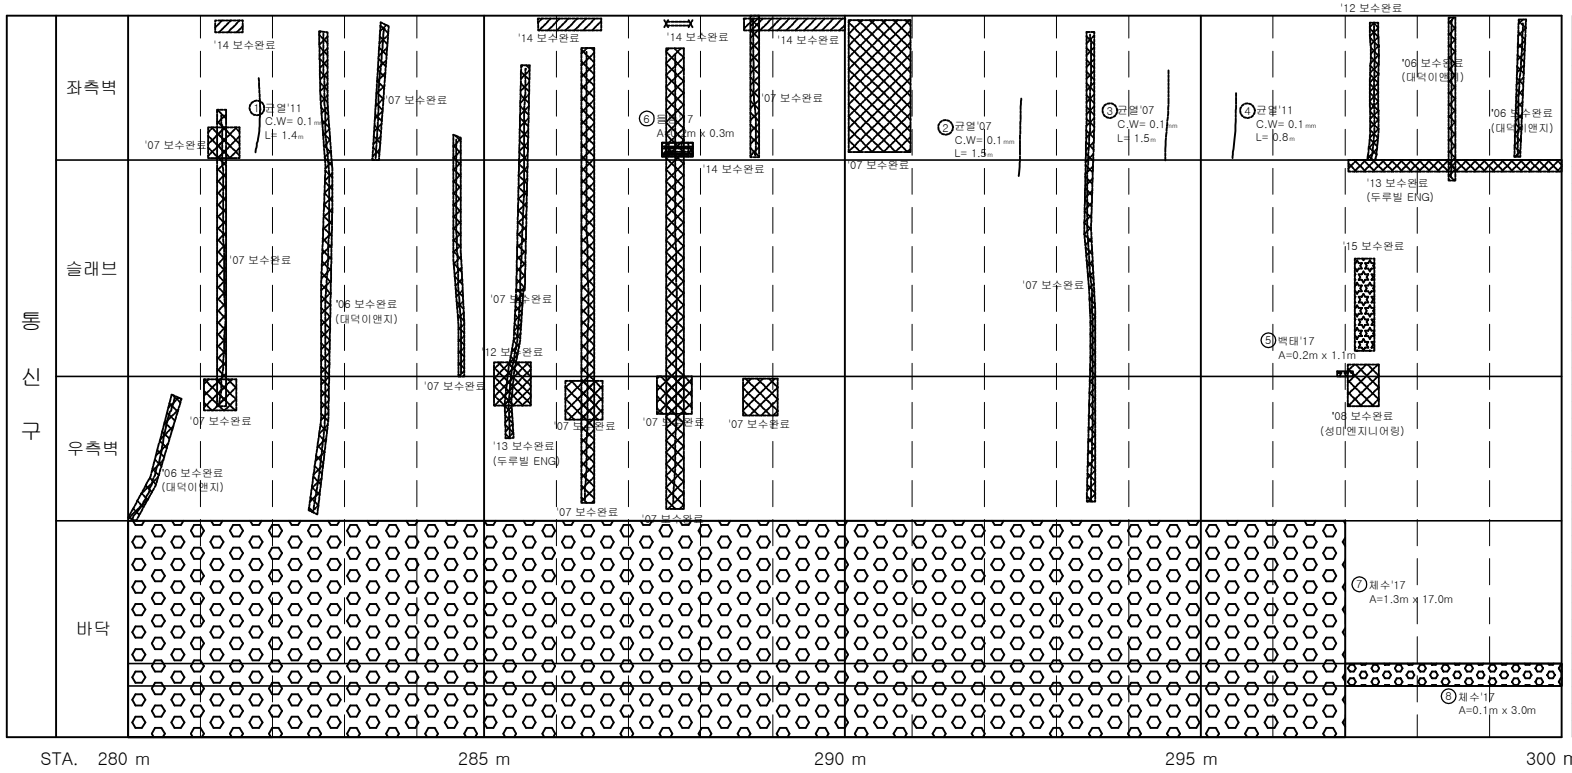

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2011	균열	0.10	1.40		1.40	m	1				
2	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
3	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
4	2011	균열	0.10	0.80		0.80	m	1				
5	2017	백태	0.20	1.10		0.22	㎡	1				
6	2017	들뜸	0.20	0.30		0.06	㎡	1				
7	2017	체수	1.30	17.00		22.10	㎡	1				
8	2017	체수	0.10	3.00		0.30	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.300.0 m ~ 320.0m) 통신구 구간





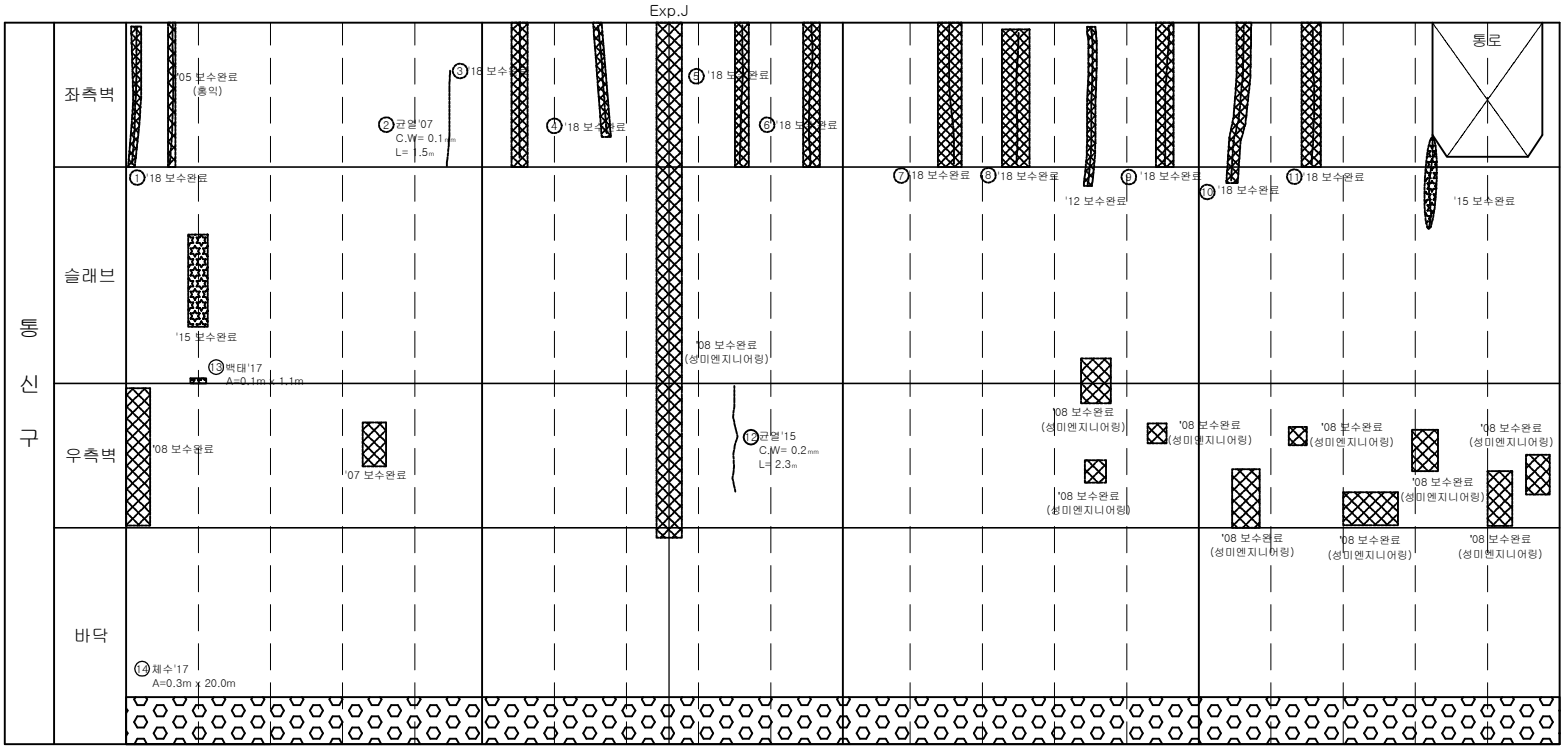

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	결함	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1	2018	표면처리공법	2.76	
2	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1	2018	표면처리공법	2.40	
4	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1	2018	표면처리공법	2.16	
5	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1	2018	표면처리공법	2.40	
6	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1	2018	표면처리공법	2.76	
7	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1	2018	표면처리공법	2.40	
8	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1	2018	표면처리공법	2.40	
9	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1	2018	표면처리공법	2.40	
10	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1	2018	표면처리공법	2.76	
11	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1	2018	표면처리공법	2.40	
12	2015	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
13	2017	백태	0.10	1.10		0.11	㎡	1				
14	2017	체수	0.30	20.00		6.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.320.0 m ~ 340.0m) 통신구 구간





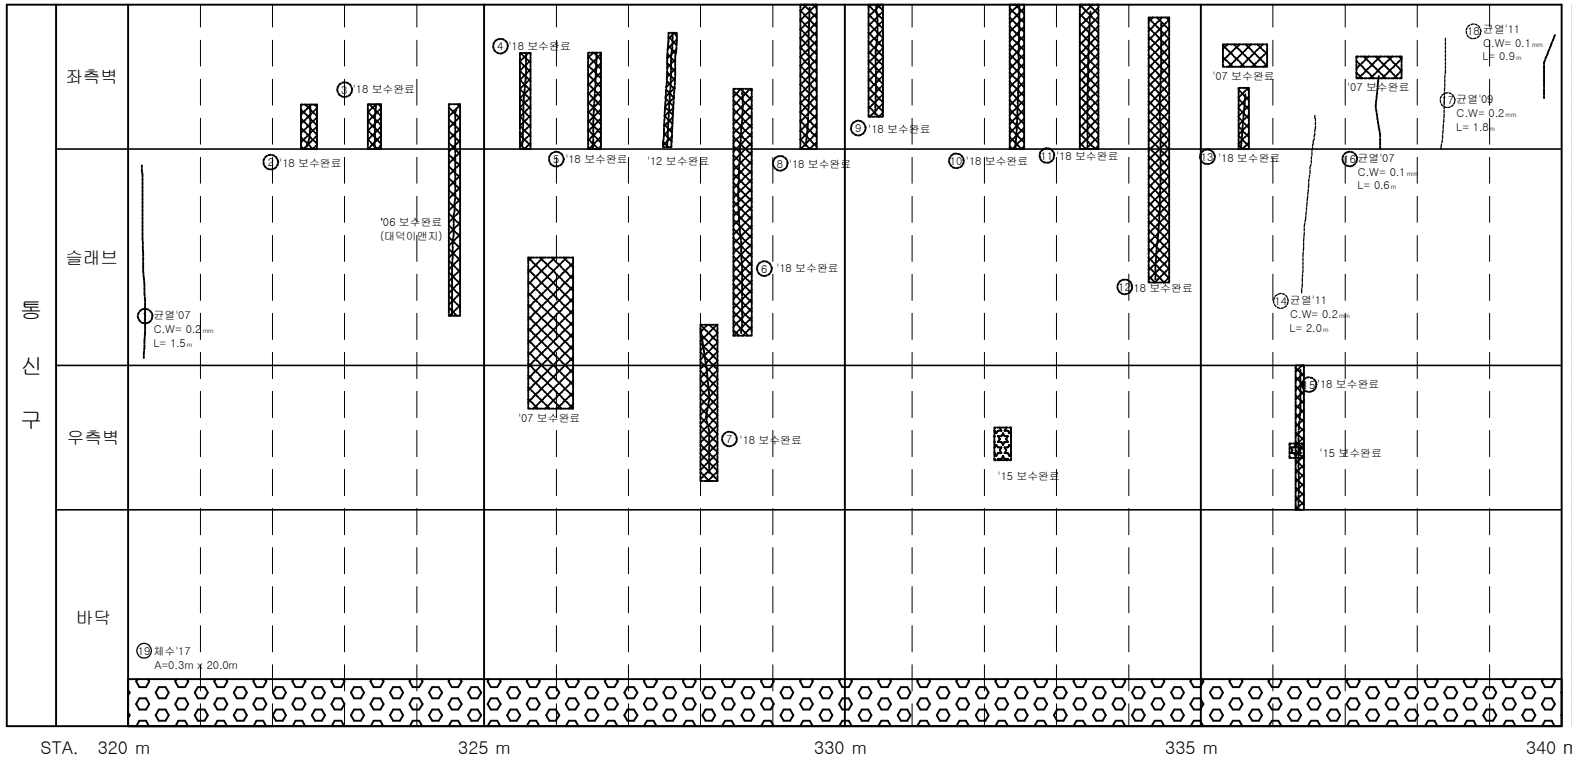

손 상 물 량 표

연번	점검년도	점검내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
2	2007	균열	0.10	0.40		0.40	m	1	2018	표면처리공법	0.48	
3	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1	2018	표면처리공법	0.60	
4	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1	2018	표면처리공법	1.20	
5	2009	균열	0.20	1.20		1.20	m	1	2018	표면처리공법	1.44	
6	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1	2018	표면처리공법	2.40	
7	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1	2018	표면처리공법	2.76	
8	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1	2018	표면처리공법	2.76	
9	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1	2018	표면처리공법	2.16	
10	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1	2018	표면처리공법	2.76	
11	2009	균열	0.20	1.90		1.90	m	1	2018	표면처리공법	2.28	
12	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1	2018	표면처리공법	4.20	
13	2011	균열	0.20	0.50		0.50	m	1	2018	표면처리공법	0.60	
14	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
15	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1	2018	표면처리공법	2.40	
16	2007	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
17	2009	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
18	2011	균열	0.10	0.90		0.90	m	1				
19	2017	체수	0.30	20.00		6.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.340.0 m ~ 360.0m) 통신구 구간





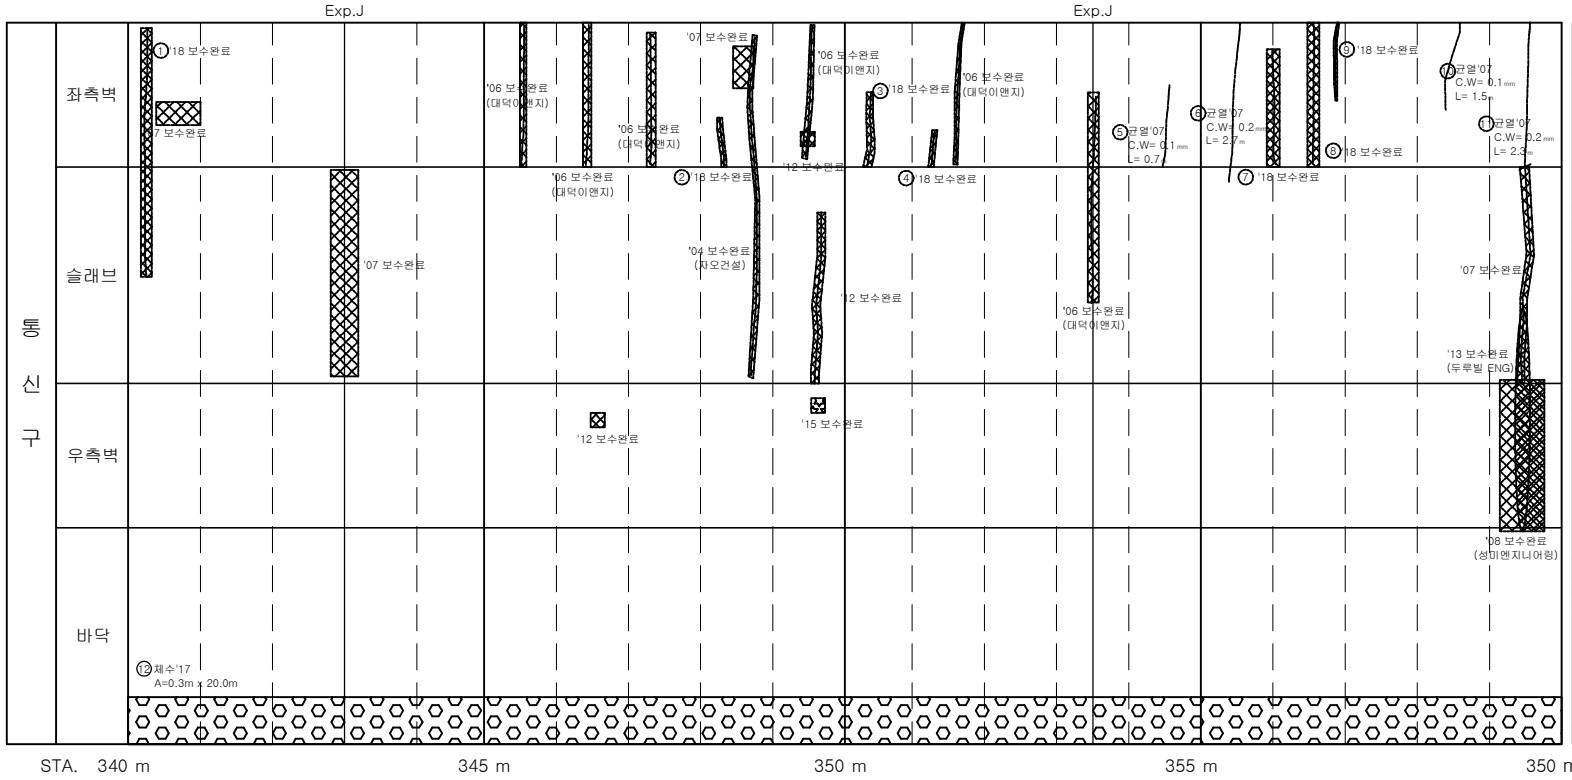

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.10	2.70		2.70	m	1	2018	표면처리공법	3.24	
2	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1	2018	표면처리공법	0.60	
3	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1	2018	표면처리공법	1.20	
4	2007	균열	0.10	0.40		0.40	m	1	2018	표면처리공법	0.48	
5	2007	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.70		2.70	m	1				
7	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1	2018	표면처리공법	1.80	
8	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1	2018	표면처리공법	2.76	
9	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1	2018	표면처리공법	1.80	
10	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
11	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
12	2017	체수	0.30	20.00		6.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.360.0 m ~ 380.0m) 통신구 구간





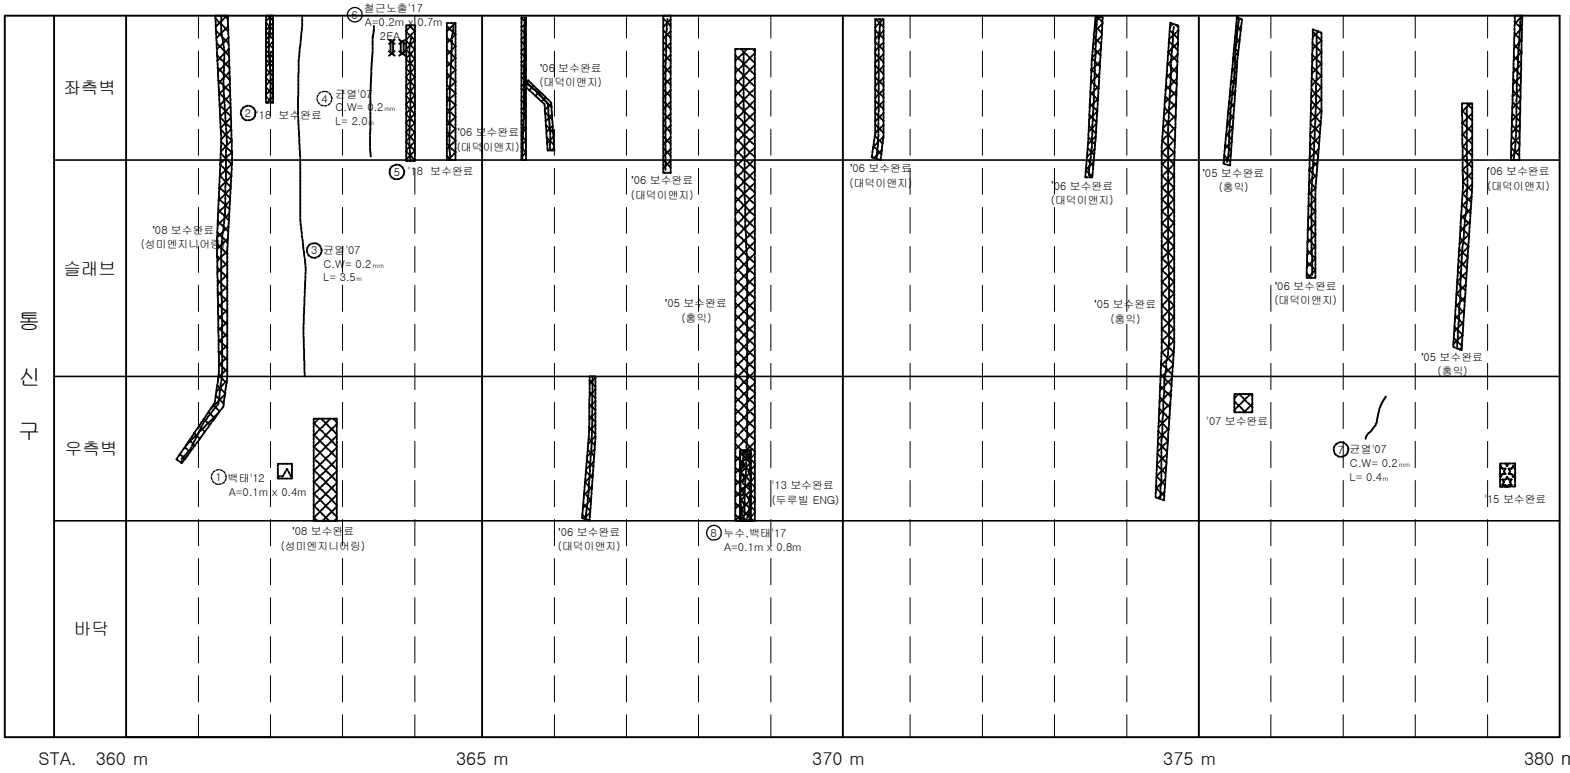

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	백태	0.10	0.40		0.04	㎡	1				
2	2011	균열	0.20	1.50		1.50	m	1	2018	표면처리공법	1.80	
3	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
4	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
5	2009	균열	0.20	2.00		2.00	m	1	2018	표면처리공법	2.40	
6	2017	철근노출	0.20	0.70		0.28	㎡	2				중요
7	2007	균열	0.20	0.40		0.40	m	1				
8	2017	누수,백태	0.10	0.80		0.08	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.380.0 m ~ 400.0m) 통신구 구간





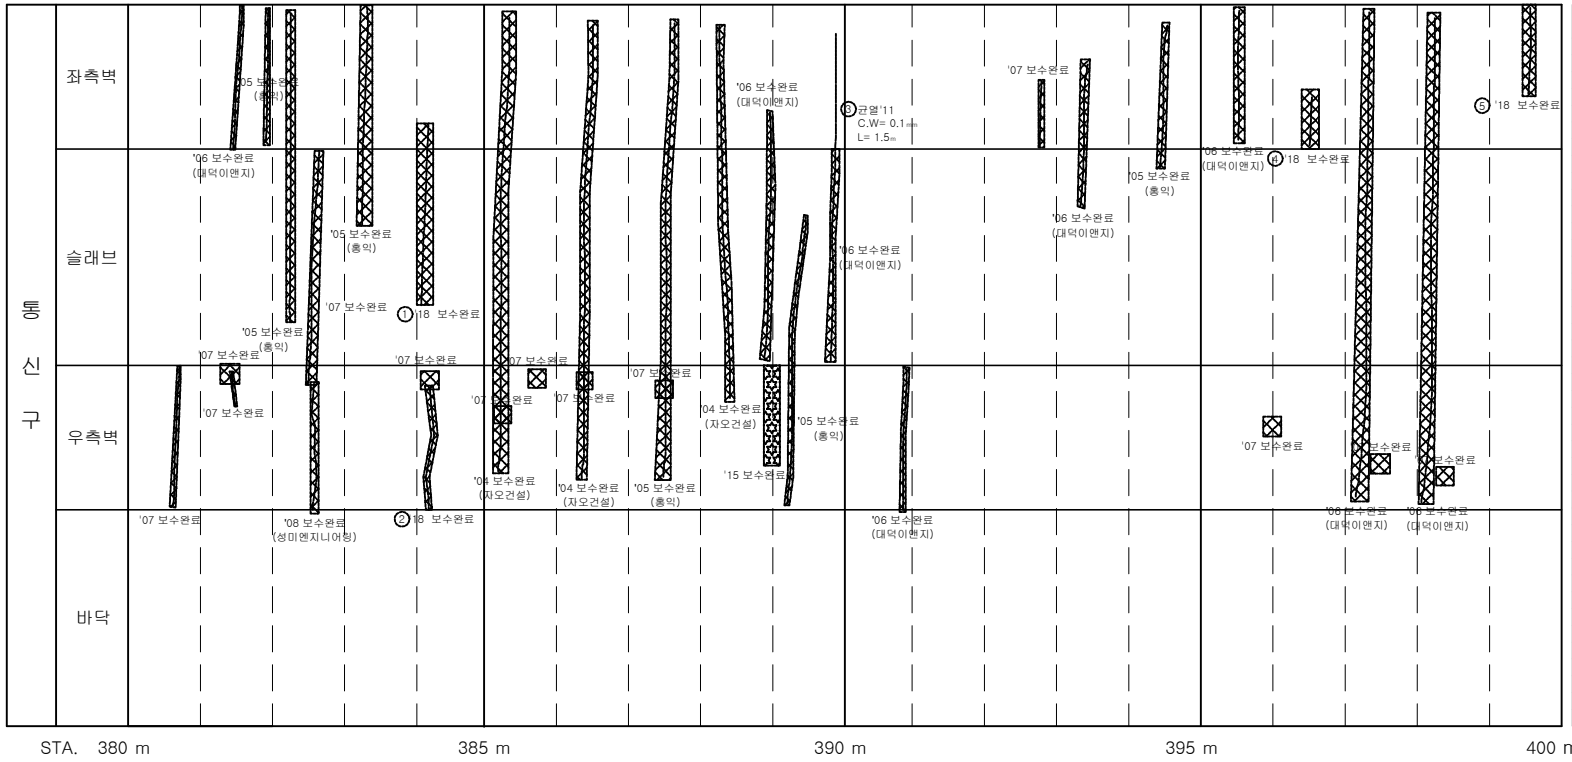

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1	2018	표면처리공법	2.40	
2	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1	2018	표면처리공법	2.64	
3	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
4	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1	2018	표면처리공법	0.60	
5	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1	2018	표면처리공법	1.80	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.400.0 m ~ 420.0m) 통신구 구간





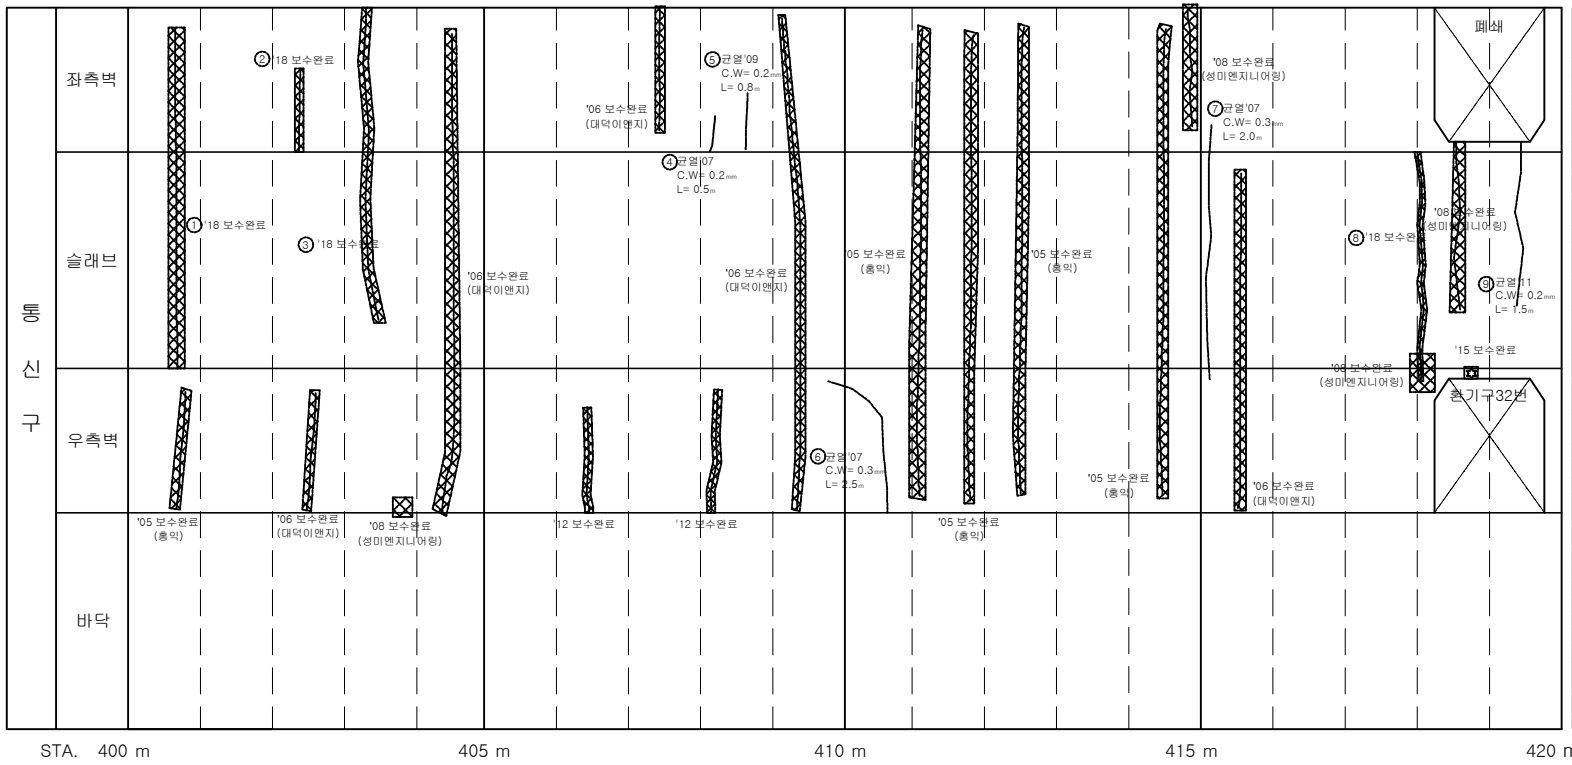

손 상 물 량 표

연번	균열년도	균열내용	균열규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.10	3.50		3.50	m	1	2018	표면처리공법	4.20	
2	2011	균열	0.20	1.30		1.30	m	1	2018	표면처리공법	1.56	
3	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1	2018	표면처리공법	3.60	
4	2007	균열	0.20	0.50		0.50	m	1				
5	2009	균열	0.20	0.80		0.80	m	1				
6	2007	균열	0.30	2.50		2.50	m	1				중요
7	2007	균열	0.30	2.00		2.00	m	1				중요
8	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1	2018	표면처리공법	1.80	
9	2011	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.420.0 m ~ 440.0m) 통신구 구간





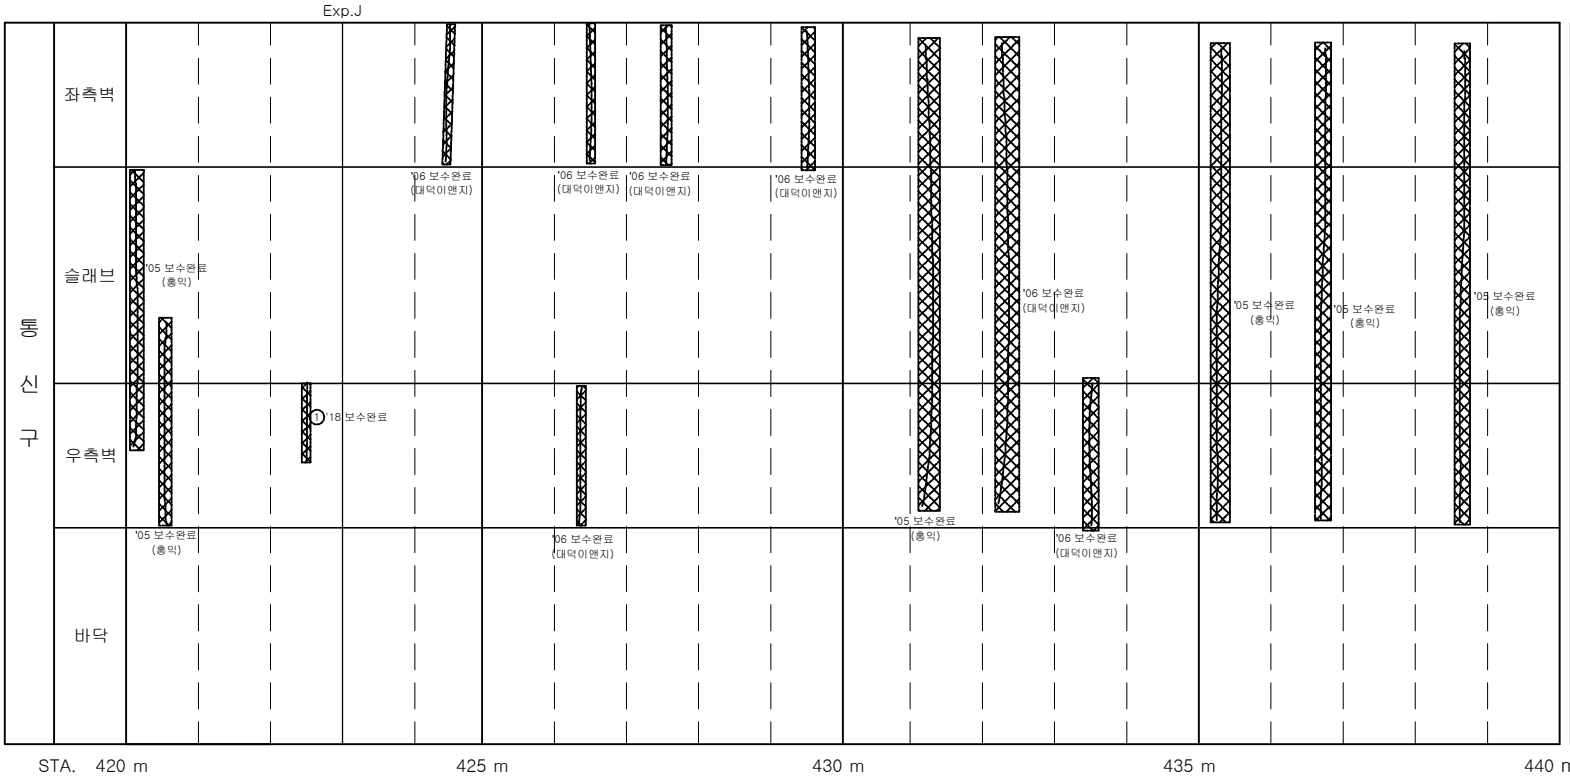

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.10	1.20		1.20	m	1	2018	표면처리공법	1.44	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락공동구 - 송이로(STA.420m)환기구 32번

KEYPLAN



SECTION



BOX A

BOX B

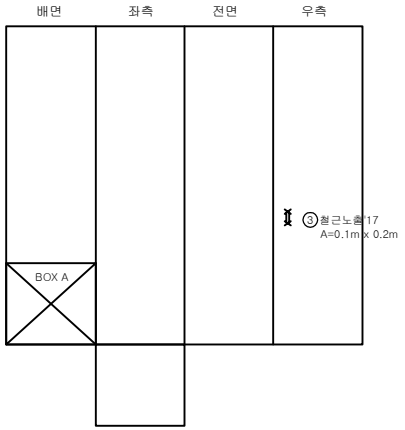

출입구



손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2011	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
2	2011	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
3	2017	철근노출	0.10	0.20		0.02	㎡	1				중요
4	2019	ㄷ빔 부식		7.20		7.20	m	1				신규

서울시?시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2015?? ??? ??? ??(??)공동구)	TITLE OF SHIFT 환기구 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.440.0 m ~ 460.0m) 통신구 구간





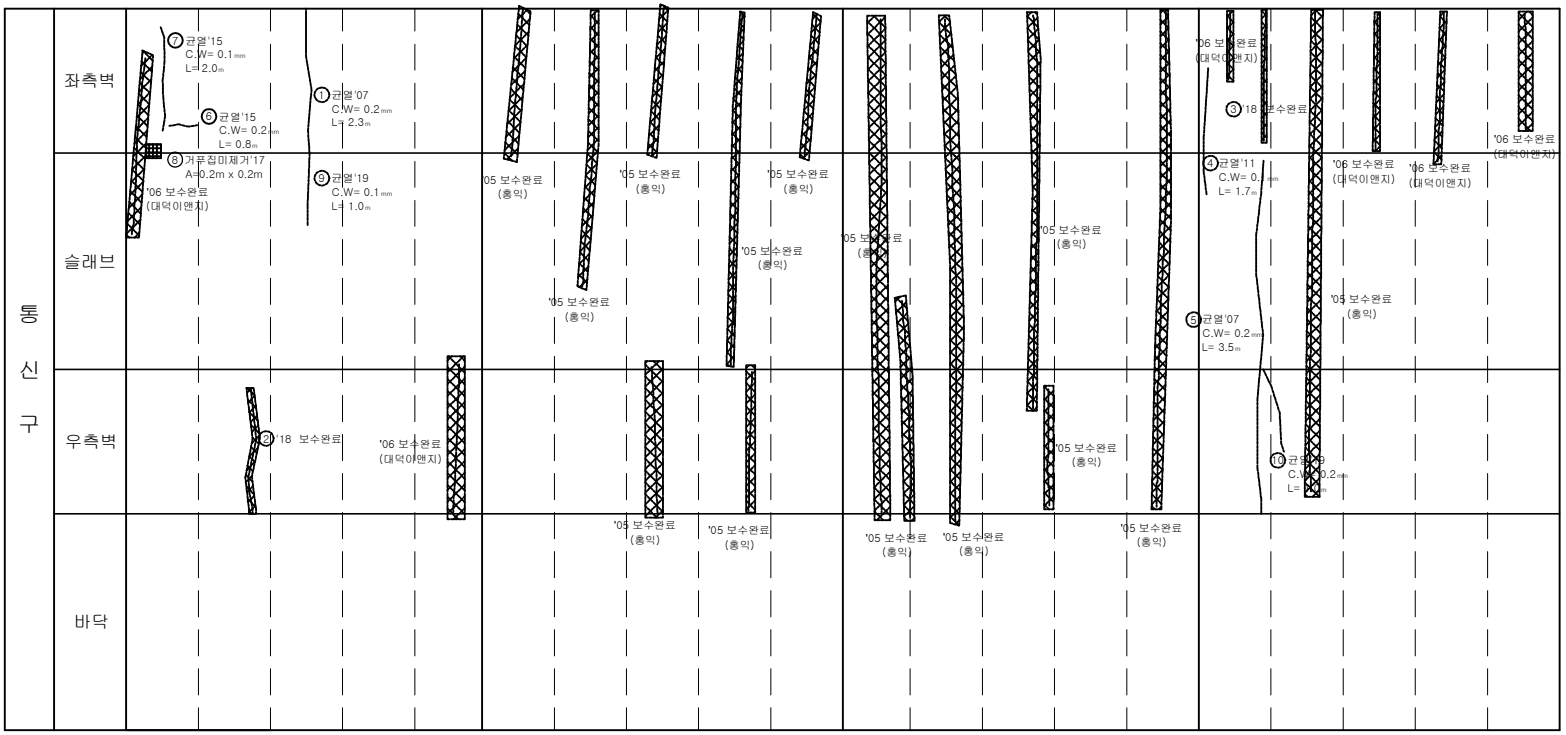

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
2	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1	2018	표면처리공법	2.40	
3	2007	균열	0.10	1.70		1.70	m	1	2018	표면처리공법	2.04	
4	2011	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
5	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
6	2015	균열	0.20	0.80		0.80	m	1				
7	2015	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
8	2017	거푸집미제거	0.20	0.20		0.04	㎡	1				
9	2019	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				신규
10	2019	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.460.0 m ~ 480.0m) 통신구 구간





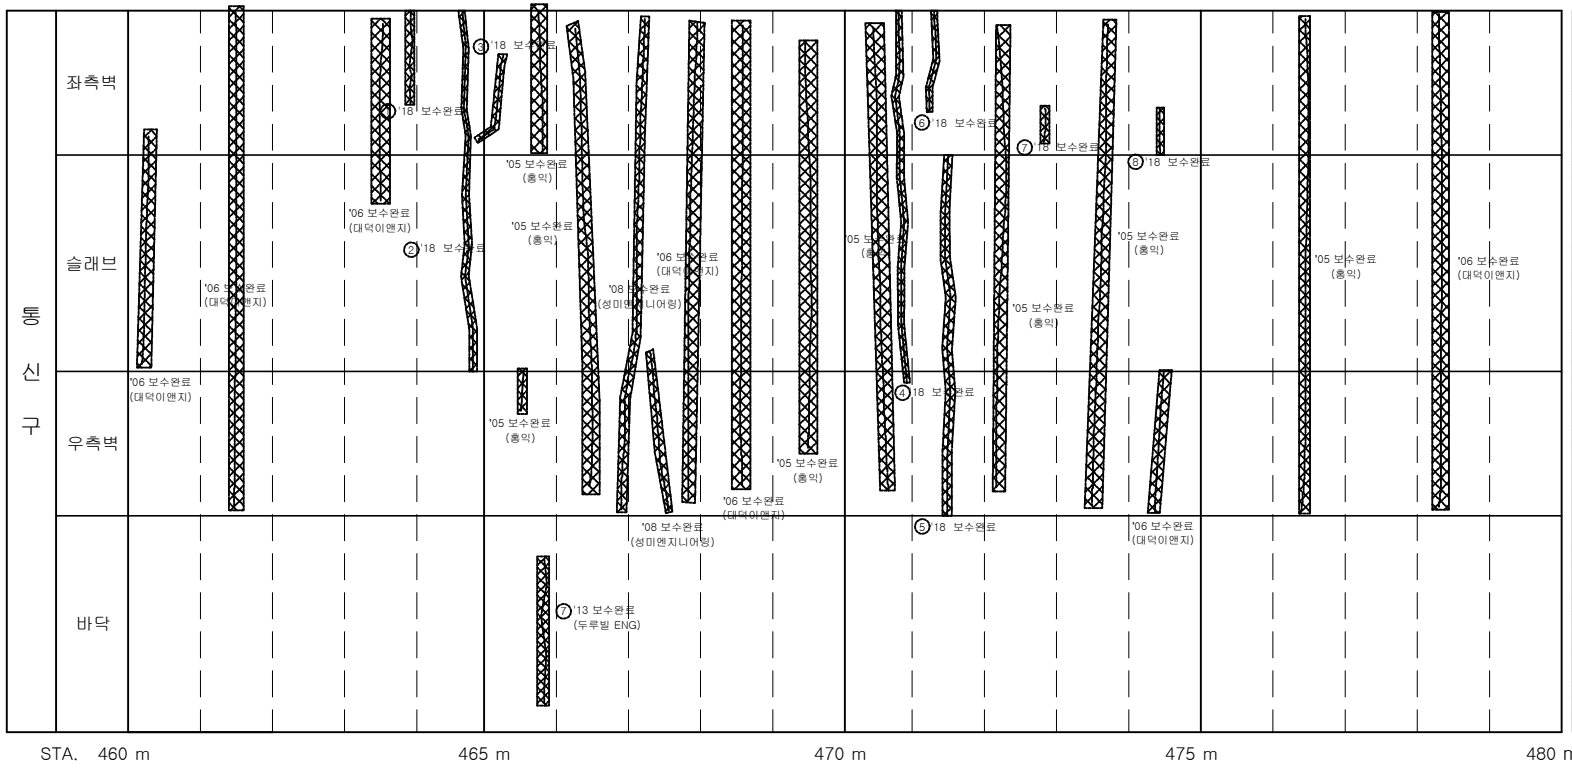

손 상 물 량 표

연번	점검년도	점검내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1	2018	표면처리공법	2.16	
2	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1	2018	표면처리공법	4.20	
3	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1	2018	표면처리공법	1.80	
4	2011	균열	0.10	3.50		3.50	m	1	2018	표면처리공법	4.20	
5	2011	균열	0.20	3.00		3.00	m	1	2018	표면처리공법	3.60	
6	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1	2018	표면처리공법	2.16	
7	2007	균열	0.10	0.60		0.60	m	1	2018	표면처리공법	0.72	
8	2007	균열	0.20	0.30		0.30	m	1	2018	표면처리공법	0.36	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.480.0 m ~ 500.0m) 통신구 구간





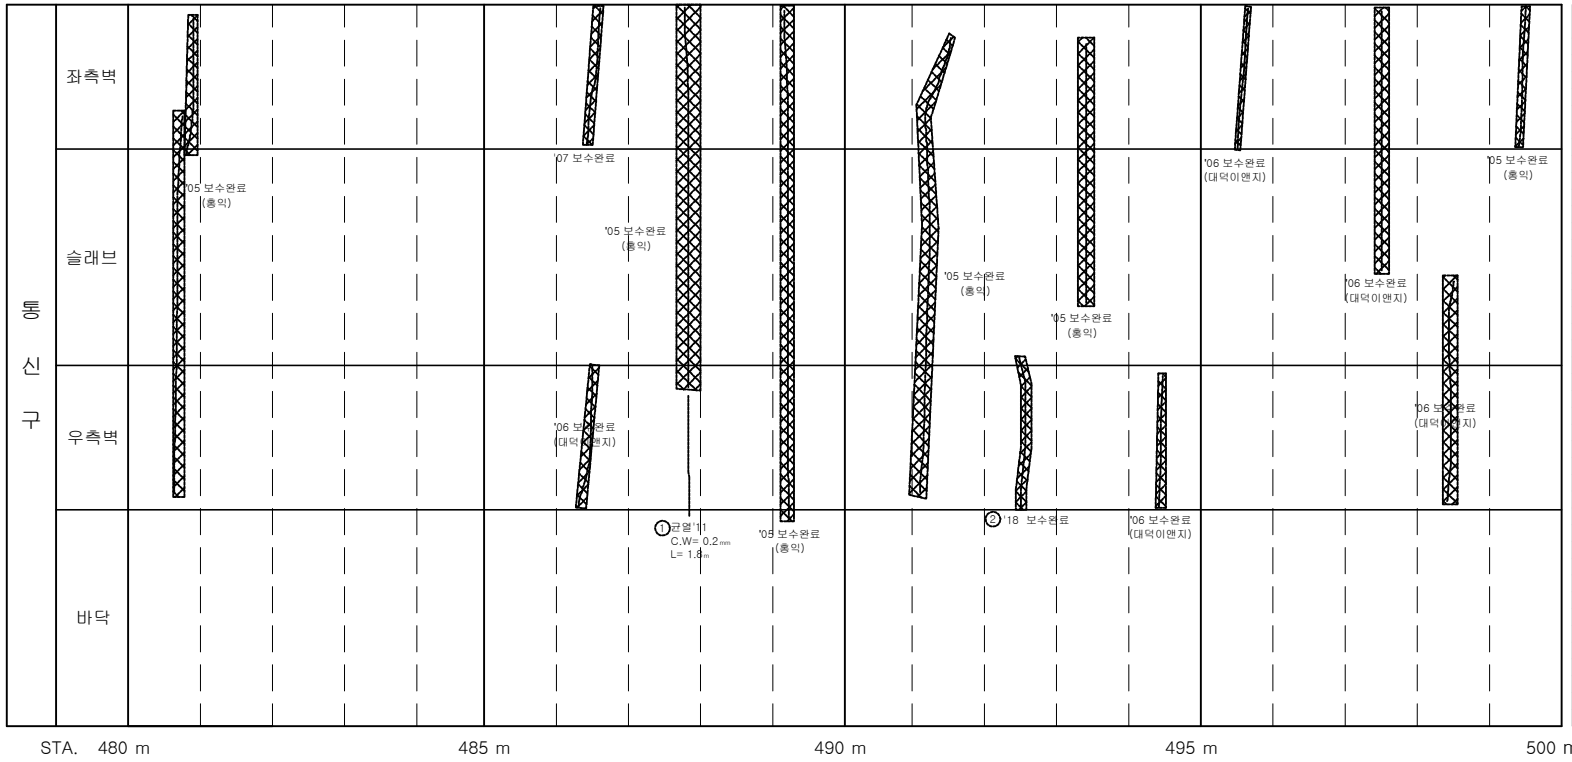

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2011	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
2	2011	균열	0.20	2.50		2.50	m	1	2018	표면처리공법	3.00	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.500.0 m ~ 520.0m) 통신구 구간



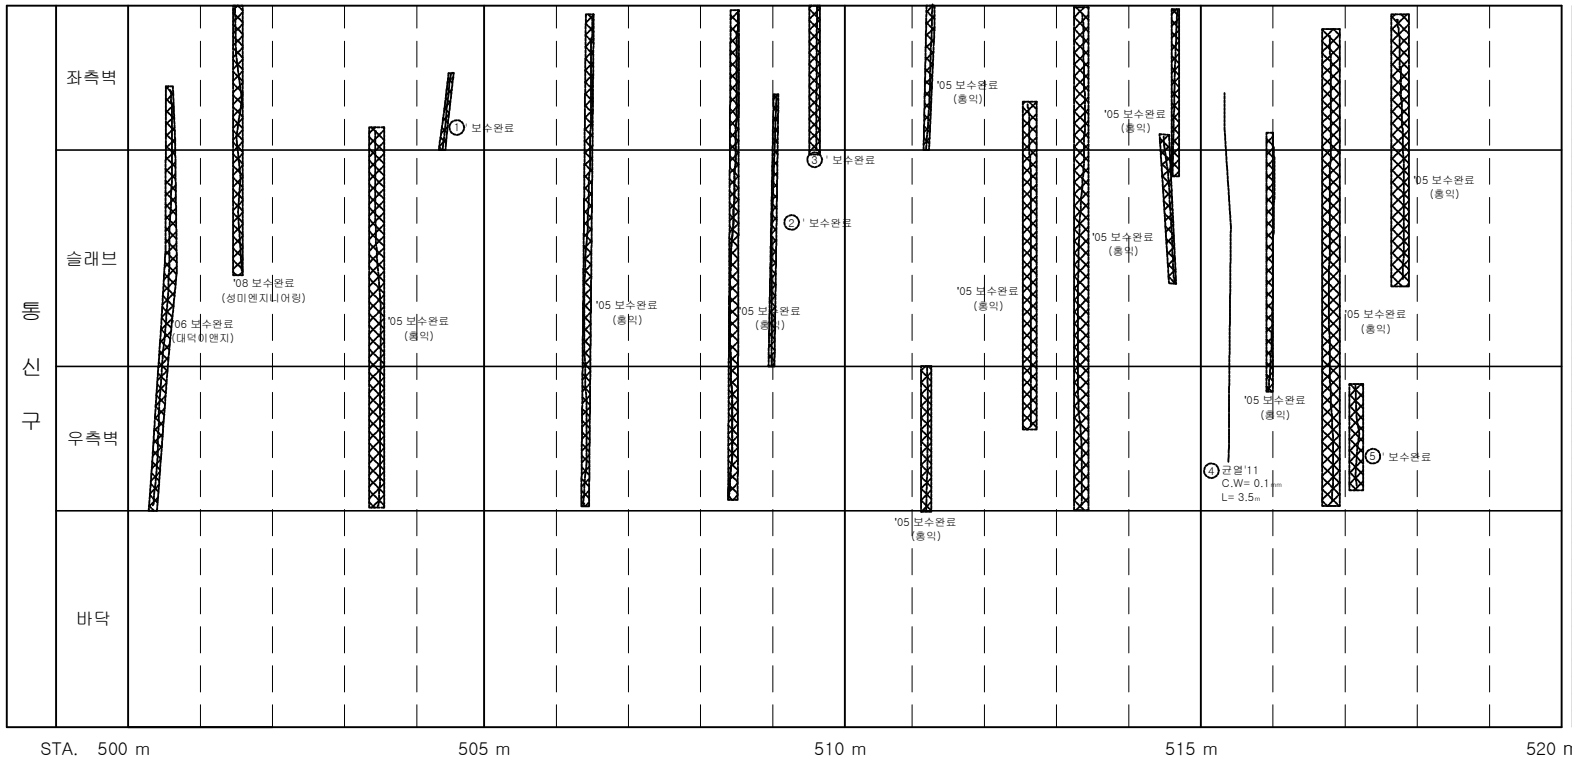

손 상 물 량 표

연번	계측년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1	2018	표면처리공법	1.80	
2	2011	균열	0.10	2.30		2.30	m	1	2018	표면처리공법	2.76	
3	2011	균열	0.10	2.30		2.30	m	1	2018	표면처리공법	2.76	
4	2011	균열	0.10	3.50		3.50	m	1				
5	2015	균열	0.20	1.80		1.80	m	1	2018	표면처리공법	2.16	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.520.0 m ~ 540.0m) 통신구 구간





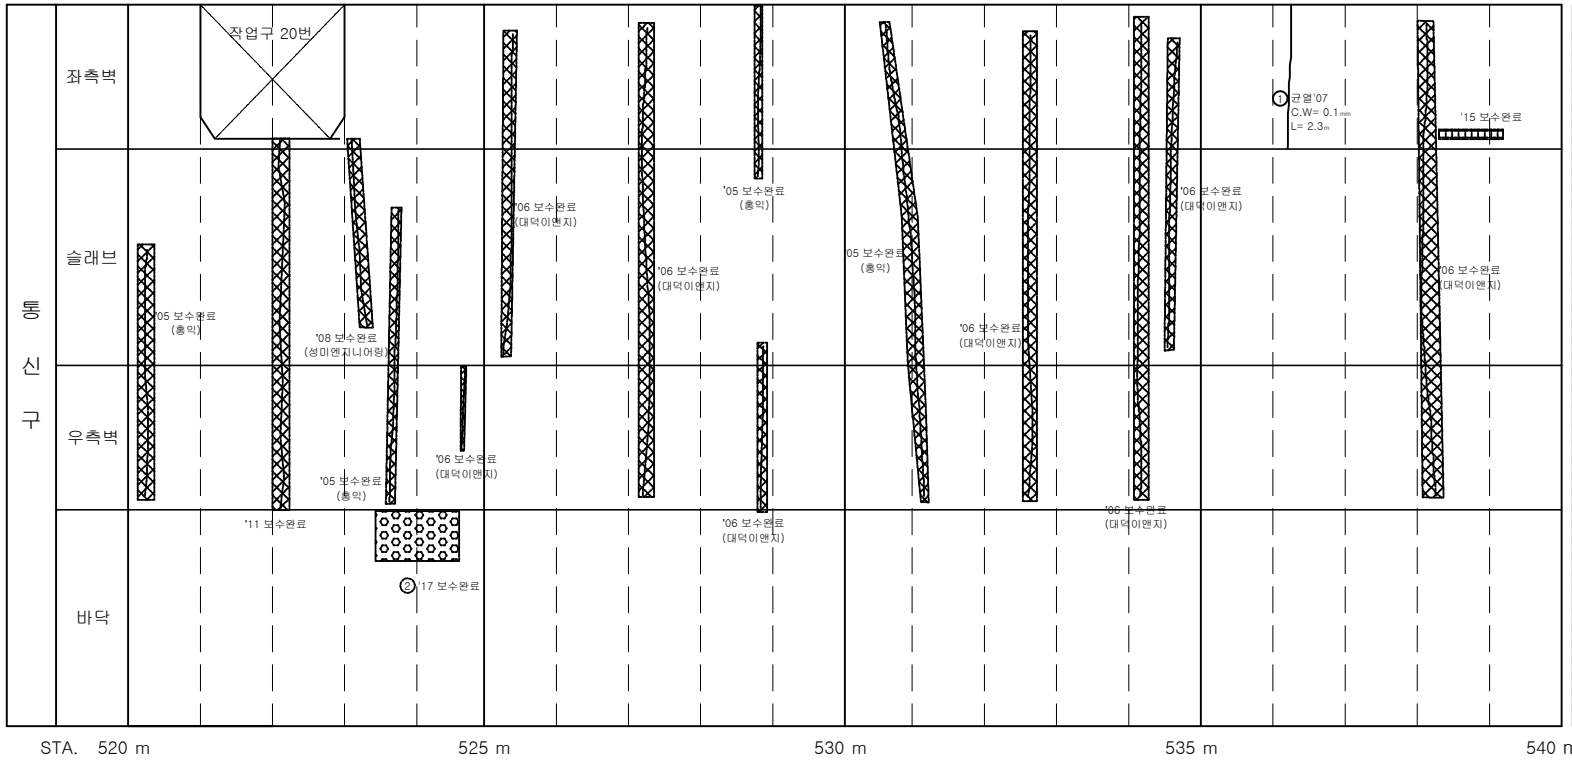

손 상 물 량 표

연번	점검년도	점검내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
2	2015	누수		0.26		0.26	m	1	2017	누수보수공법	0.31	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.540.0 m ~ 560.0m) 통신구 구간



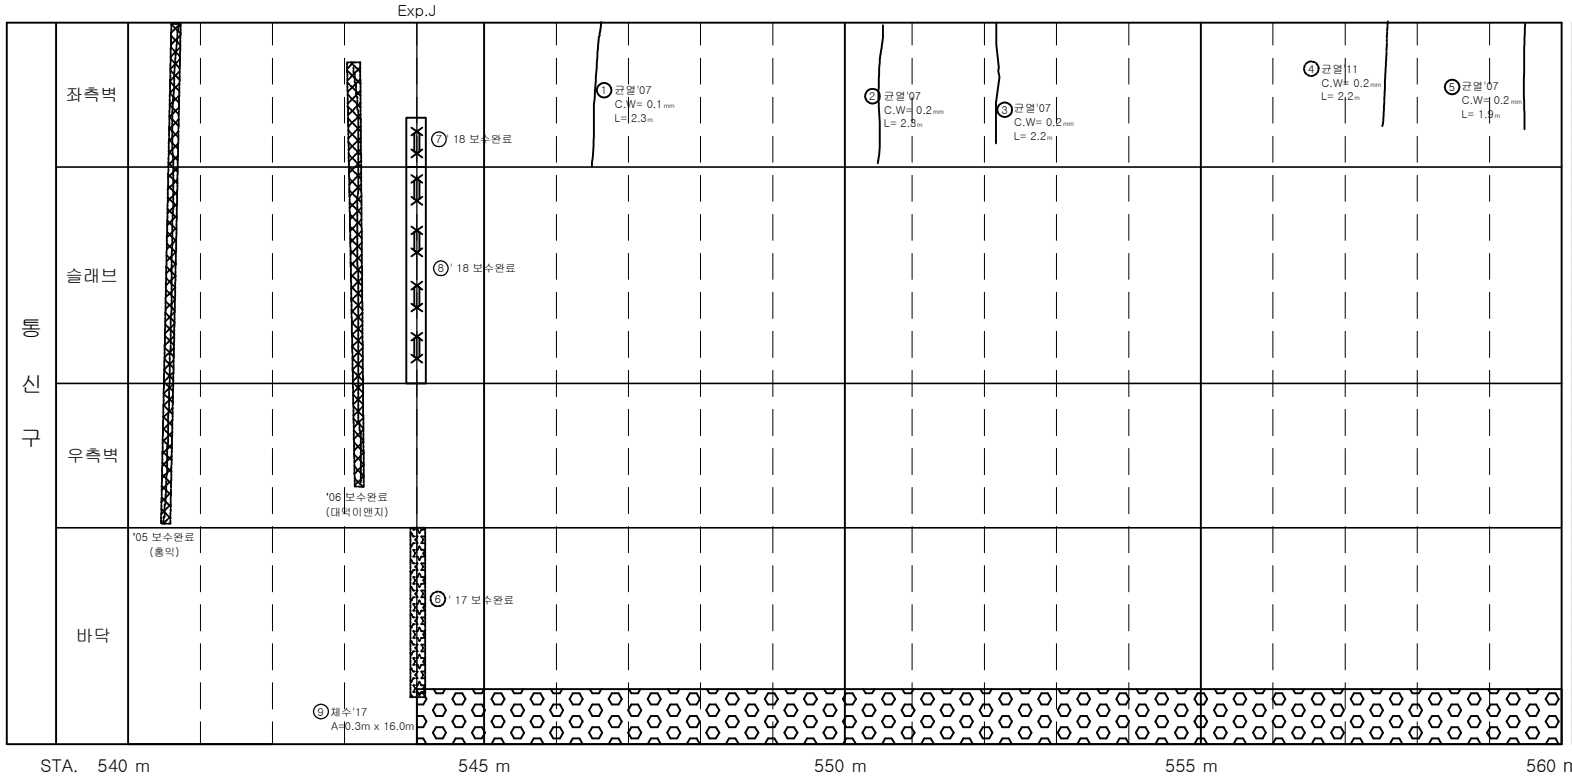

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
2	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
4	2011	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
5	2007	균열	0.20	1.90		1.90	m	1				
6	2015	박태	0.10	1.40		0.14	㎡	1	2017	표면처리공법	0.17	
7	2017	철근노출	0.10	0.40		0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.05	중요
8	2017	철근노출	0.10	1.30		0.13	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.16	중요
9	2017	체수	0.30	16.00		4.80	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.560.0 m ~ 580.0m) 통신구 구간



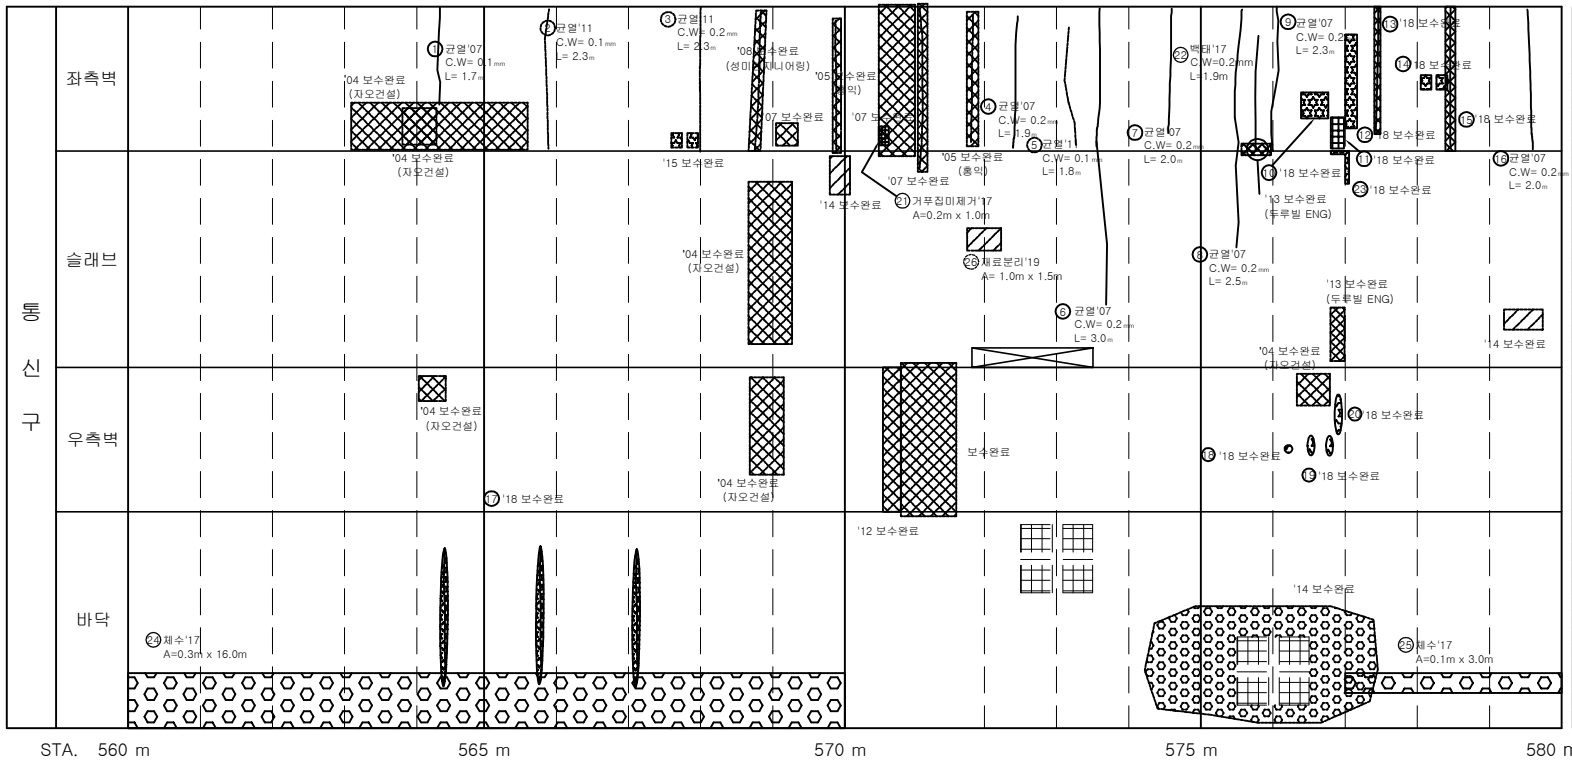

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량		
1	2007	균열	0.10	1.70		m	1					
2	2011	균열	0.10	2.30		m	1					
3	2011	균열	0.20	2.30		m	1					
4	2007	균열	0.20	1.90		m	1					
5	2011	균열	0.10	1.80		m	1					
6	2007	균열	0.20	3.00		m	1					
7	2007	균열	0.20	2.00		m	1					
8	2007	균열	0.20	2.50		m	1					
9	2007	균열	0.20	2.30		m	1					
10	2007	백태	0.10	0.10		㎡	1	2018	표면처리공법	0.01		
11	2011	박리	0.10	0.50		㎡	1	2018	단면복구공법	0.06		
12	2007	백태	0.20	2.00		㎡	1	2018	표면처리공법	0.48		
13	2007	균열	0.20	2.00		m	1	2018	표면처리공법	2.40		
14	2011	백태	0.10	0.10		㎡	2	2018	표면처리공법	0.02		
15	2007	균열	0.20	2.30		m	1	2018	표면처리공법	2.76		
16	2007	균열	0.20	2.00		m	1					
17	2013	백태	0.20	1.50		㎡	3	2018	표면처리공법	0.36		
18	2013	백태	0.10	0.10		㎡	1	2018	표면처리공법	0.01		
19	2013	백태	0.10	0.30		㎡	2	2018	표면처리공법	0.04		
20	2013	백태	0.10	0.70		㎡	1	2018	표면처리공법	0.08		
21	2017	거푸집미제거	0.20	1.00		㎡	1					
22	2017	백태	0.20	1.90		㎡	1					
23	2017	백태	0.20	0.50		㎡	1	2018	표면처리공법	0.01		
24	2017	체수	0.30	16.00		㎡	1					
25	2017	체수	0.10	3.00		㎡	1					
26	2019	채료분리	1.00	1.50		㎡	1					신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.580.0 m ~ 600.0m) 통신구 구간





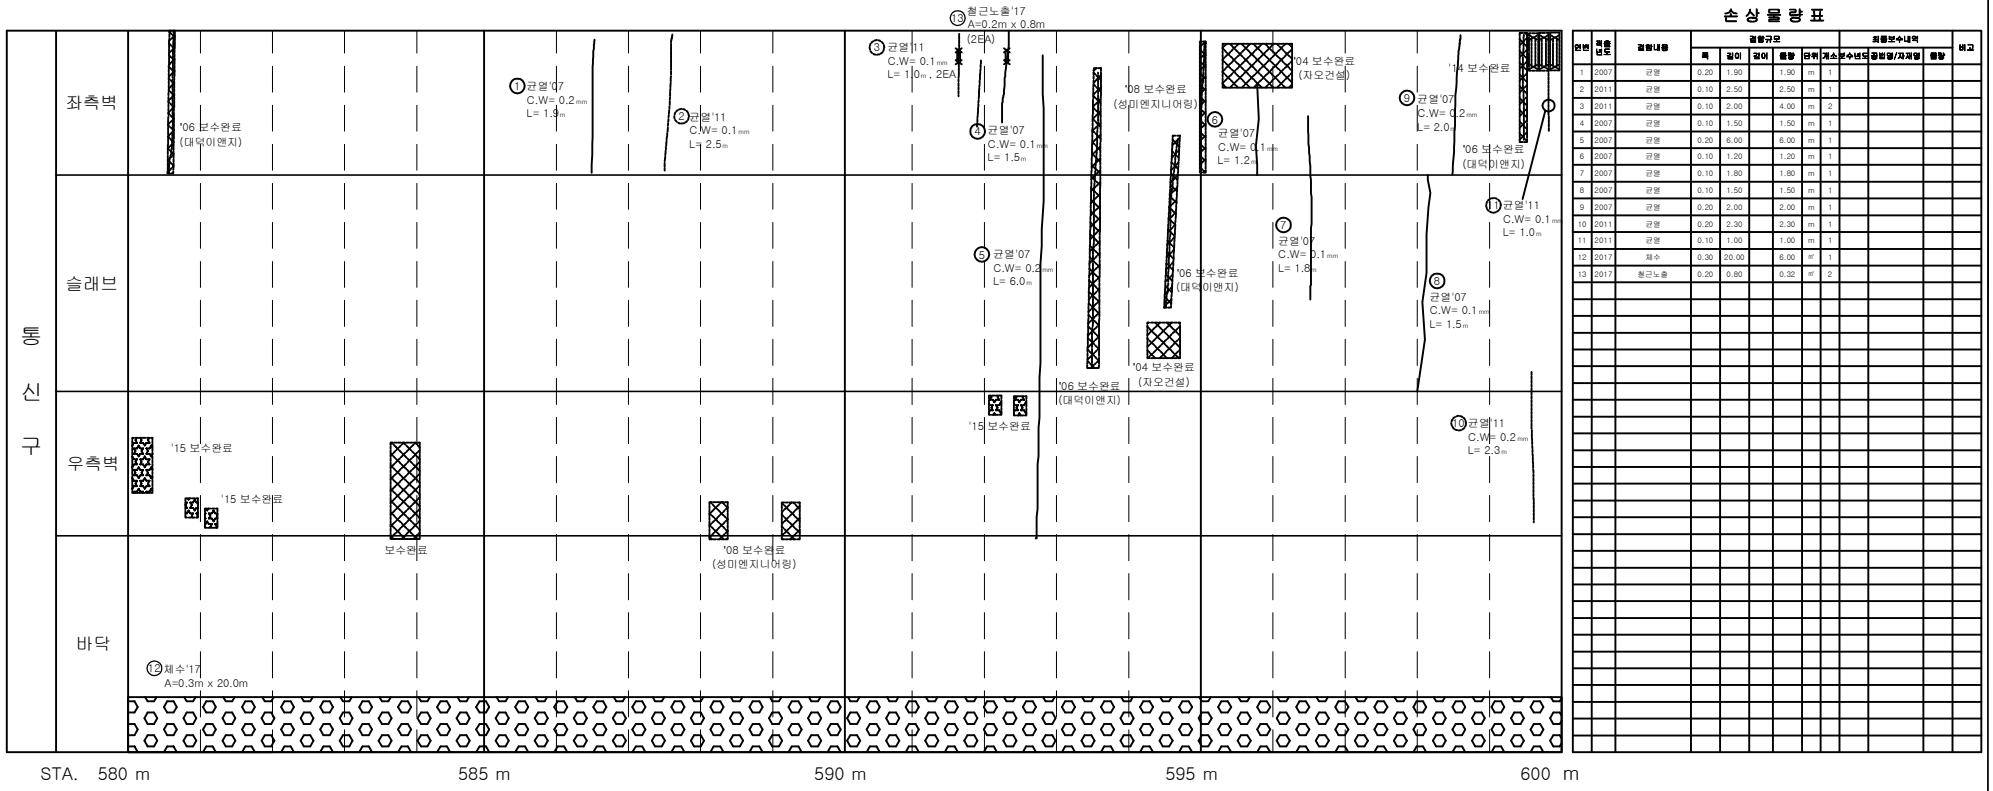

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.20	1.90		1.90	m	1				
2	2011	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				
3	2011	균열	0.10	2.00		4.00	m	2				
4	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
5	2007	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
6	2007	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
7	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
8	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
9	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
10	2011	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
11	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
12	2017	체수	0.30	20.00		6.00	㎡	1				
13	2017	철근노출	0.20	0.80		0.32	㎡	2				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.600.0 m ~ 620.0m) 통신구 구간



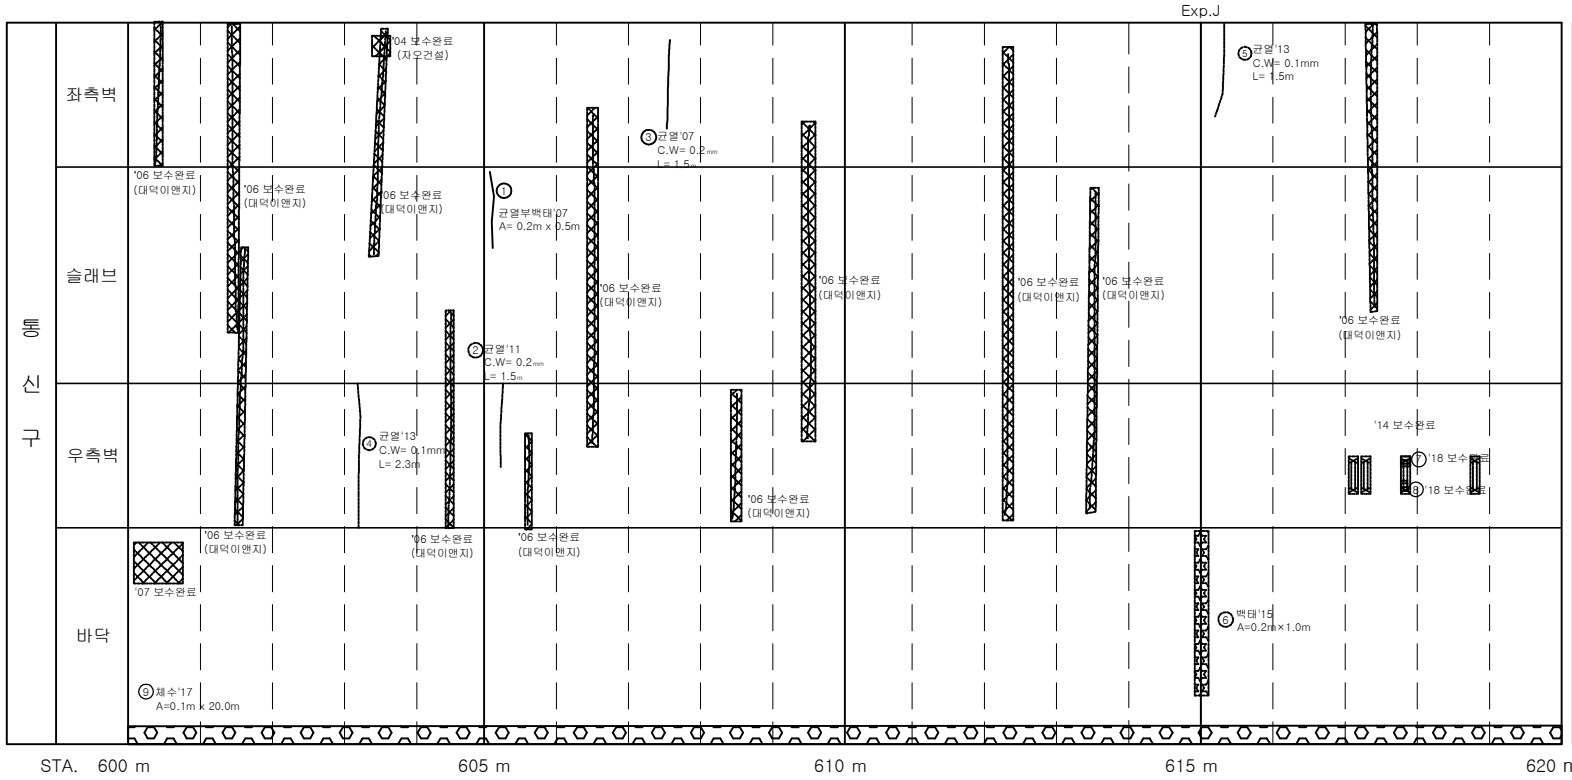

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	비고
1	2007	균열부백태	0.20	0.50		0.10	㎡	1				
2	2011	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
3	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
4	2013	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
5	2013	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
6	2015	백태	0.20	1.00		0.20	㎡	1				
7	2017	들뜸	0.10	0.30		0.03	㎡	1	2018	단면복구공법	0.04	
8	2017	들뜸	0.10	0.20		0.02	㎡	1	2018	단면복구공법	0.02	
9	2017	체수	0.10	20.00		2.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.620.0 m ~ 640.0m) 통신구 구간





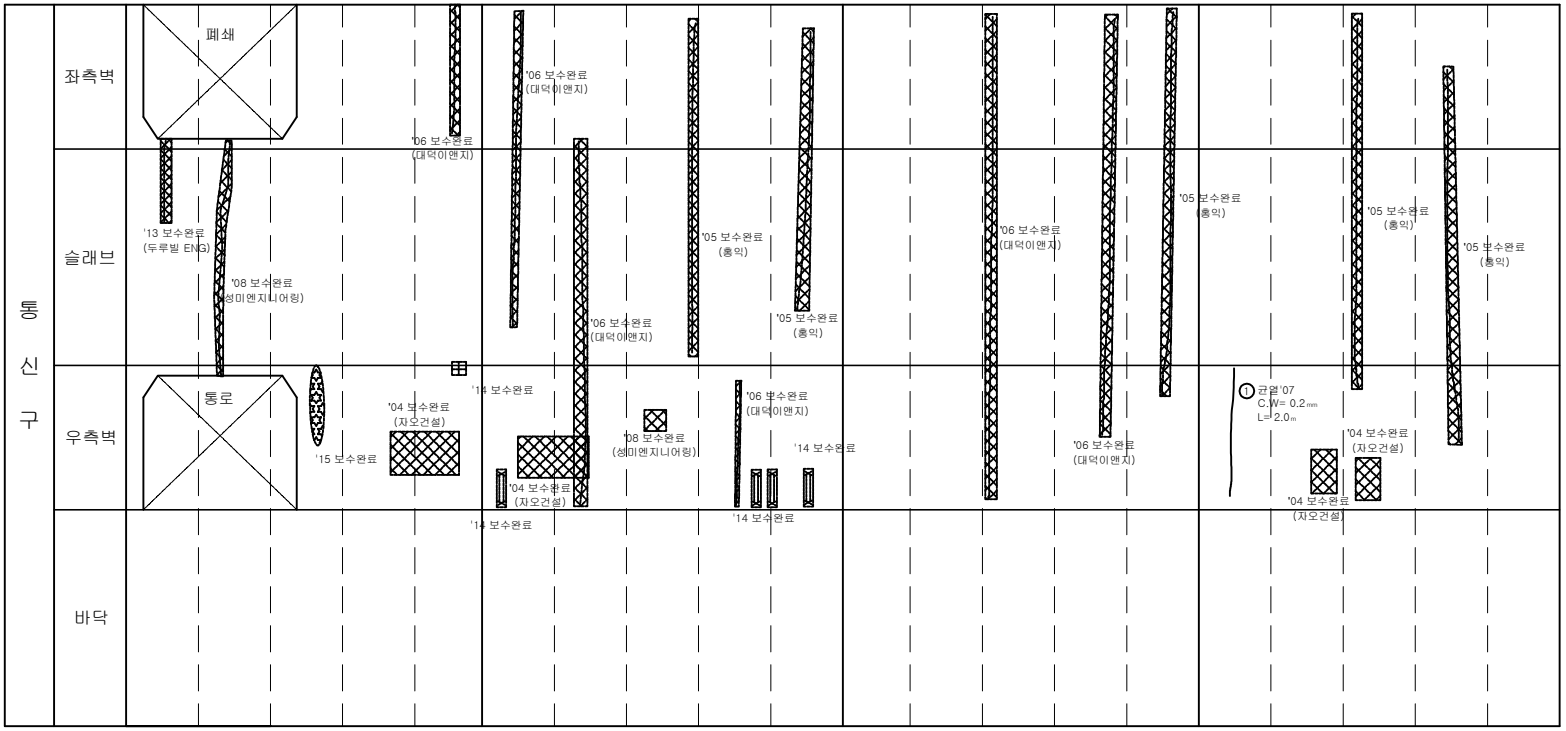

손 상 물 량 표

연번	점검년도	점검내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락공동구 - 송이로(STA.621m)환기구 33번

KEYPLAN



SECTION



BOX A

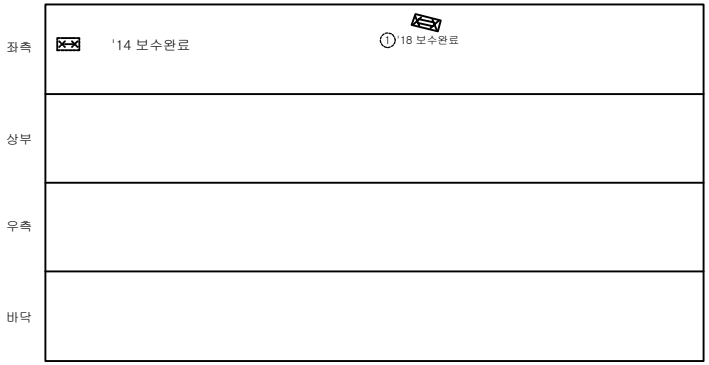

BOX B

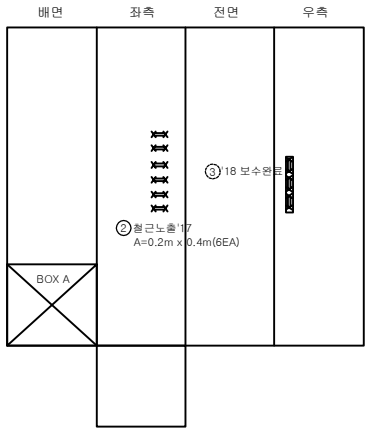

출입구



손 상 물 량 표

연번	점출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2017	철근노출	0.20	1.00		0.20	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.24	중요
2	2017	철근노출	0.20	0.40		0.48	㎡	6				중요
3	2017	철근노출	0.20	1.50		0.30	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.36	
4	2019	ㄷ빙 부식		7.20		7.20	m	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 환기구 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.640.0 m ~ 660.0m) 통신구 구간





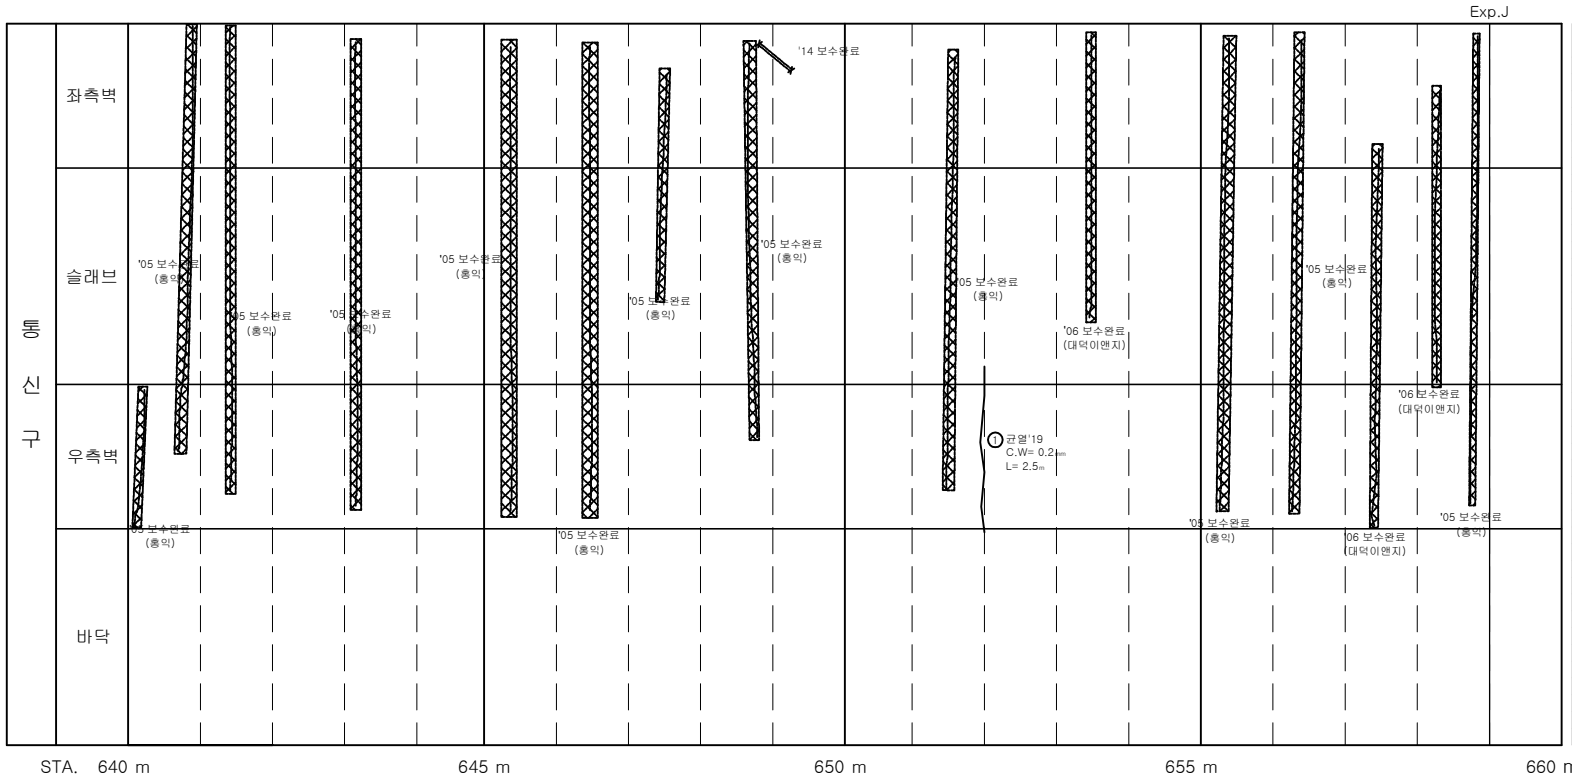

손 상 물 량 표

연번	점검년도	점검내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	종량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	종량	
1	2019	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.660.0 m ~ 680.0m) 통신구 구간





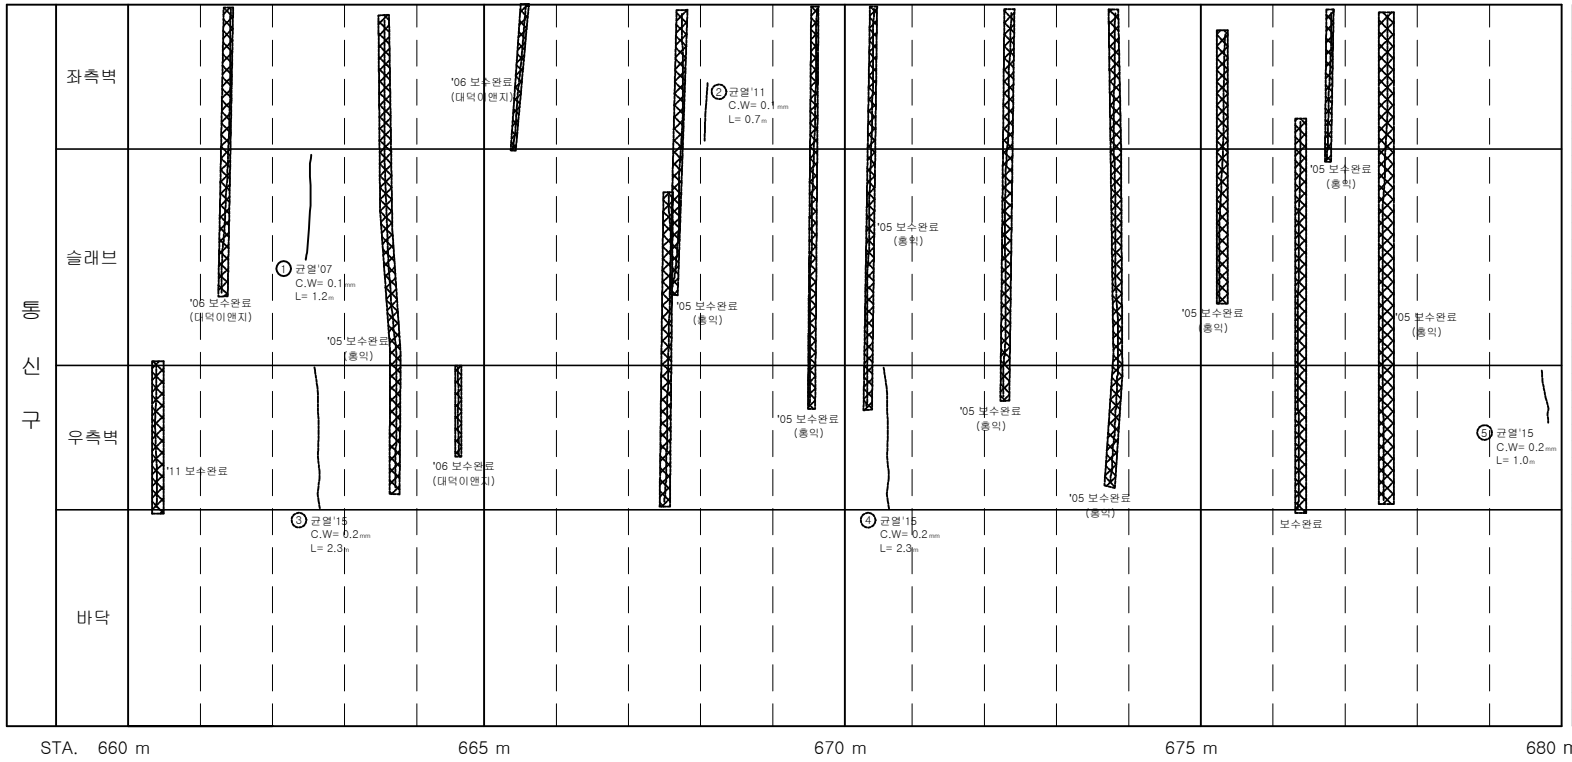

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
2	2011	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
3	2015	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
4	2015	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
5	2015	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.680.0 m ~ 700.0m) 통신구 구간





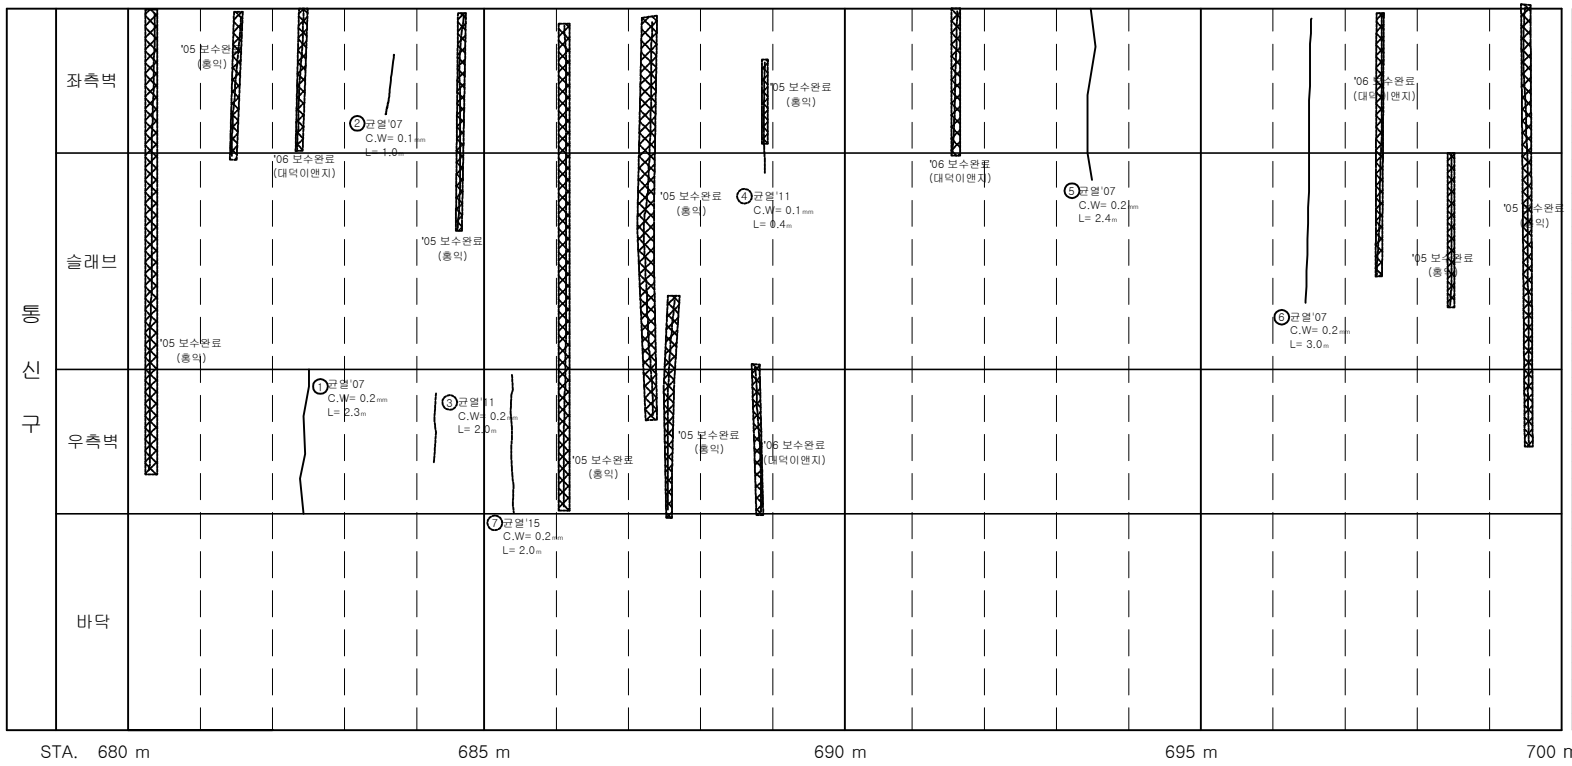

손 상 물 량 표

연번	균열년도	균열내용	균열규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
2	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
3	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
4	2011	균열	0.10	0.40		0.40	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
6	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
7	2015	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.700.0 m ~ 720.0m) 통신구 구간





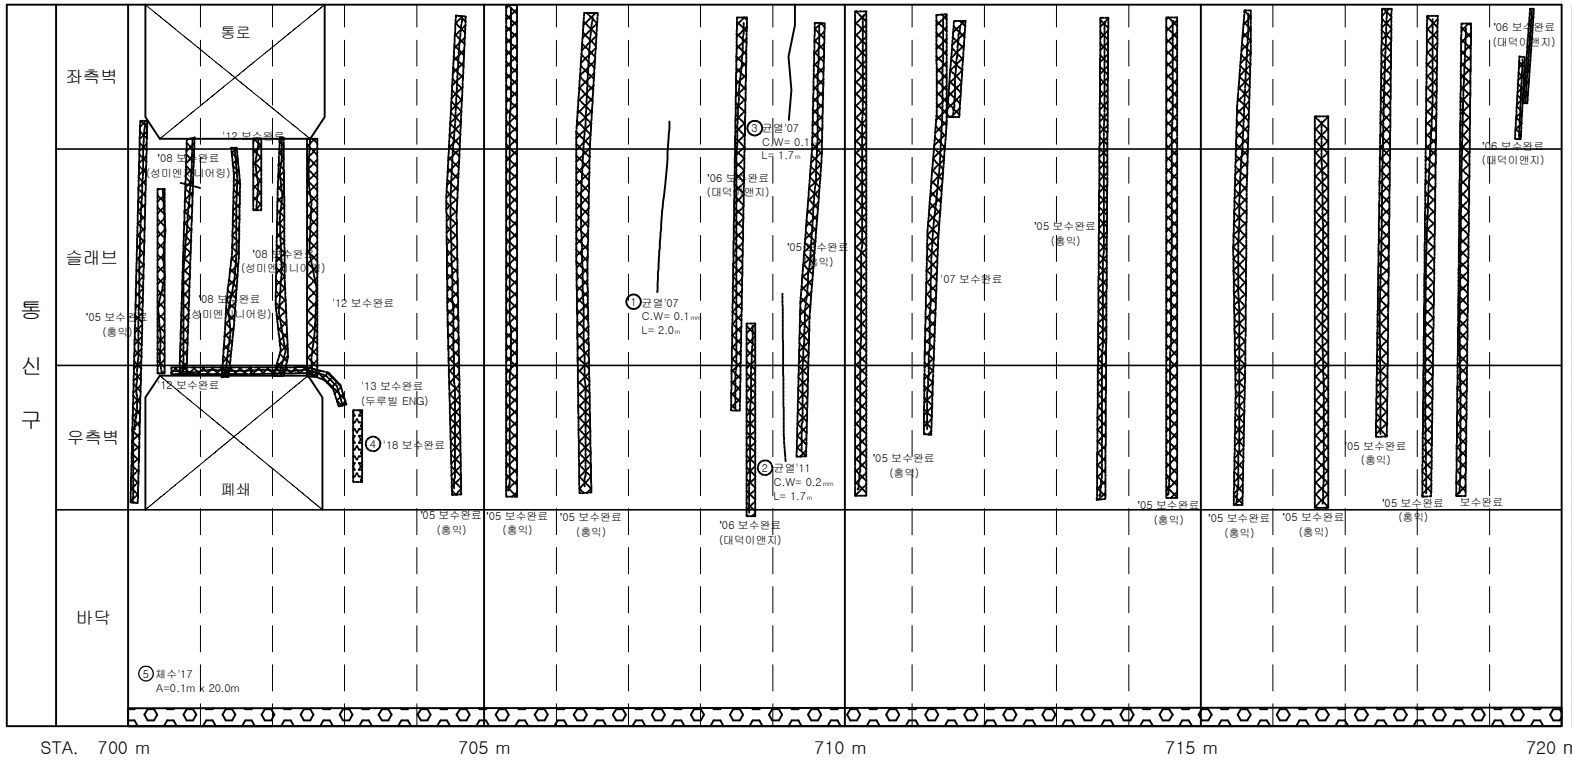

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
2	2011	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
3	2007	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
4	2015	박대	0.10	1.00		0.10	㎡	1	2018	표면처리공법	0.12	
5	2017	체수	0.10	20.00		2.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락공동구 - 송이로(STA.701m)환기구 34번

KEYPLAN



SECTION



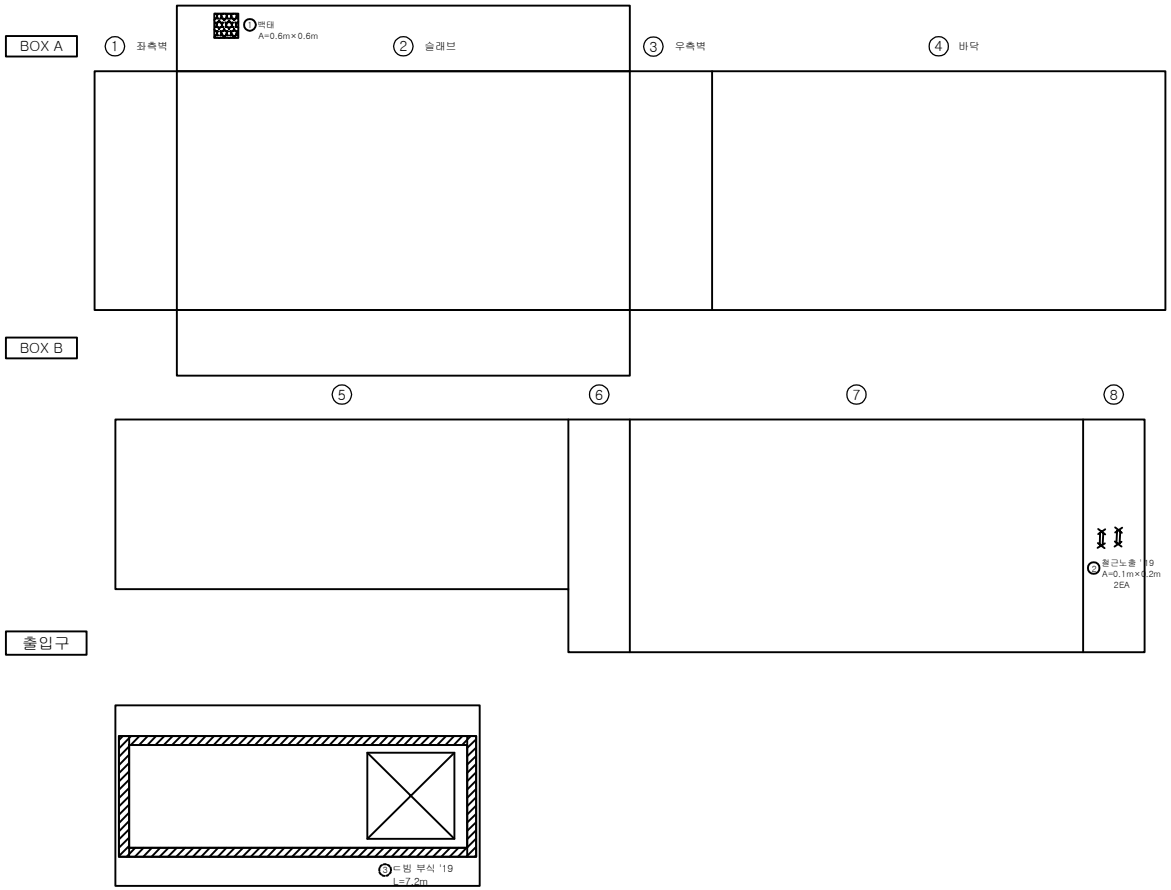

손 상 물 량 표

연번	최종년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	벽태	0.60	0.60		0.36	㎡	1				
2	2019	철근노출	0.10	0.20		0.04	㎡	2				신규
3	2019	ㄷ범 부식		7.20		7.20	m	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 환기구 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.720.0 m ~ 740.0m) 통신구 구간





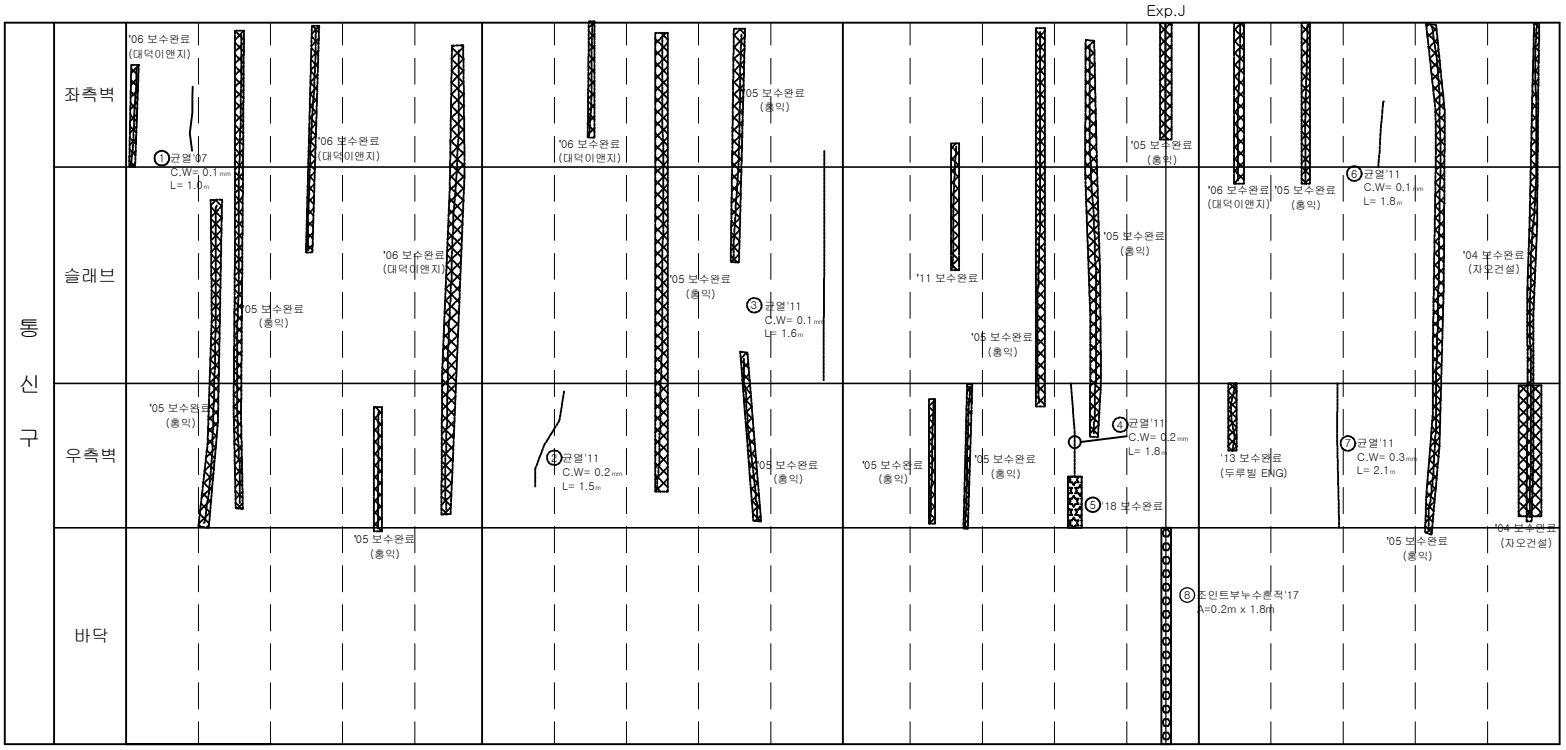

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
2	2011	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
3	2011	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
4	2011	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
5	2011	백태	0.10	0.50		0.05	㎡	1	2018	표면처리공법	0.06	
6	2011	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
7	2011	균열	0.30	2.10		2.10	m	1				
8	2017	누수흔적	0.20	1.80		0.36	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.740.0 m ~ 760.0m) 통신구 구간





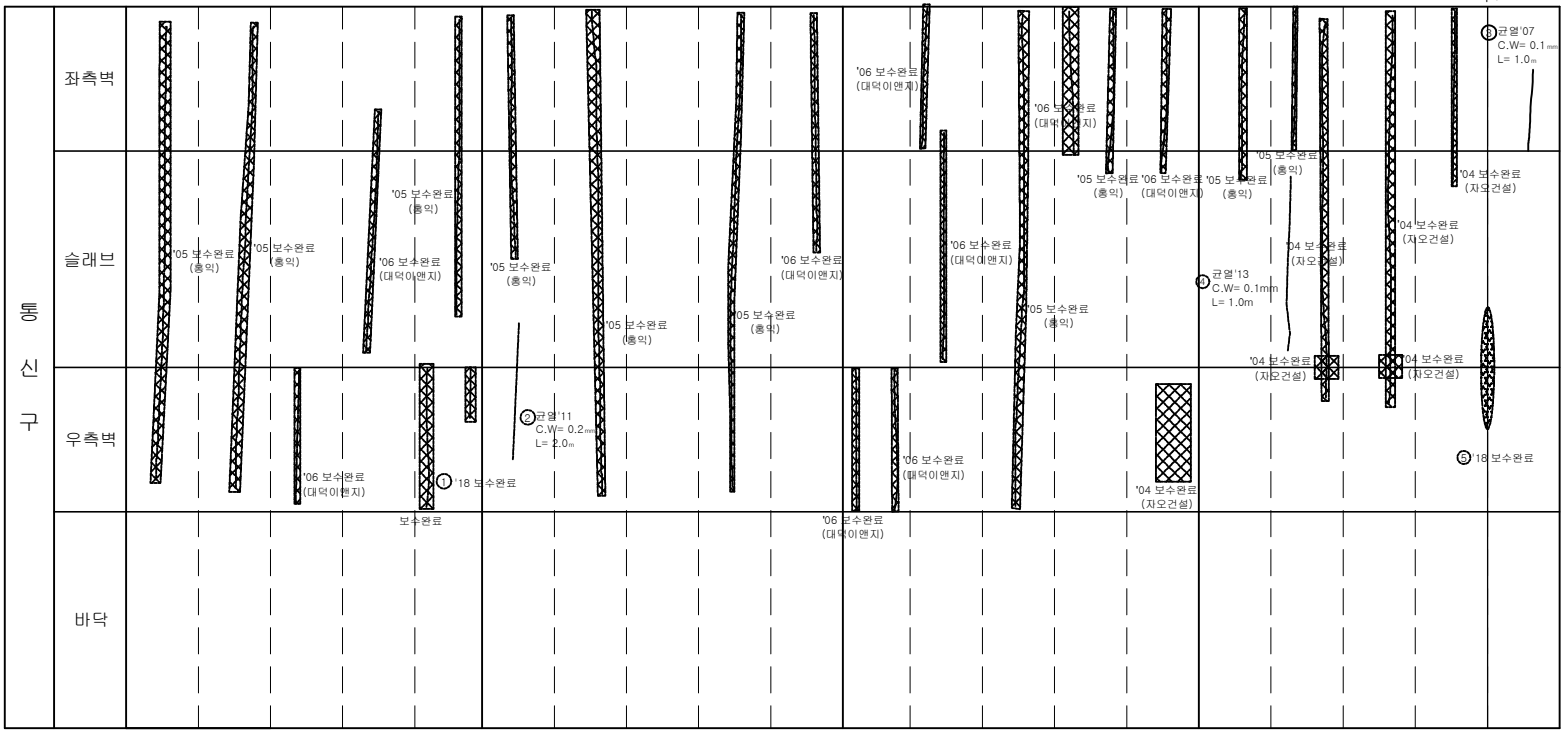

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2011	균열	0.20	1.00		1.00	m	1	2018	표면처리공법	1.20	
2	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
3	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
4	2013	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
5	2013	백태	0.10	1.00		0.10	㎡	1	2018	표면처리공법	0.12	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.760.0 m ~ 780.0m) 통신구 구간





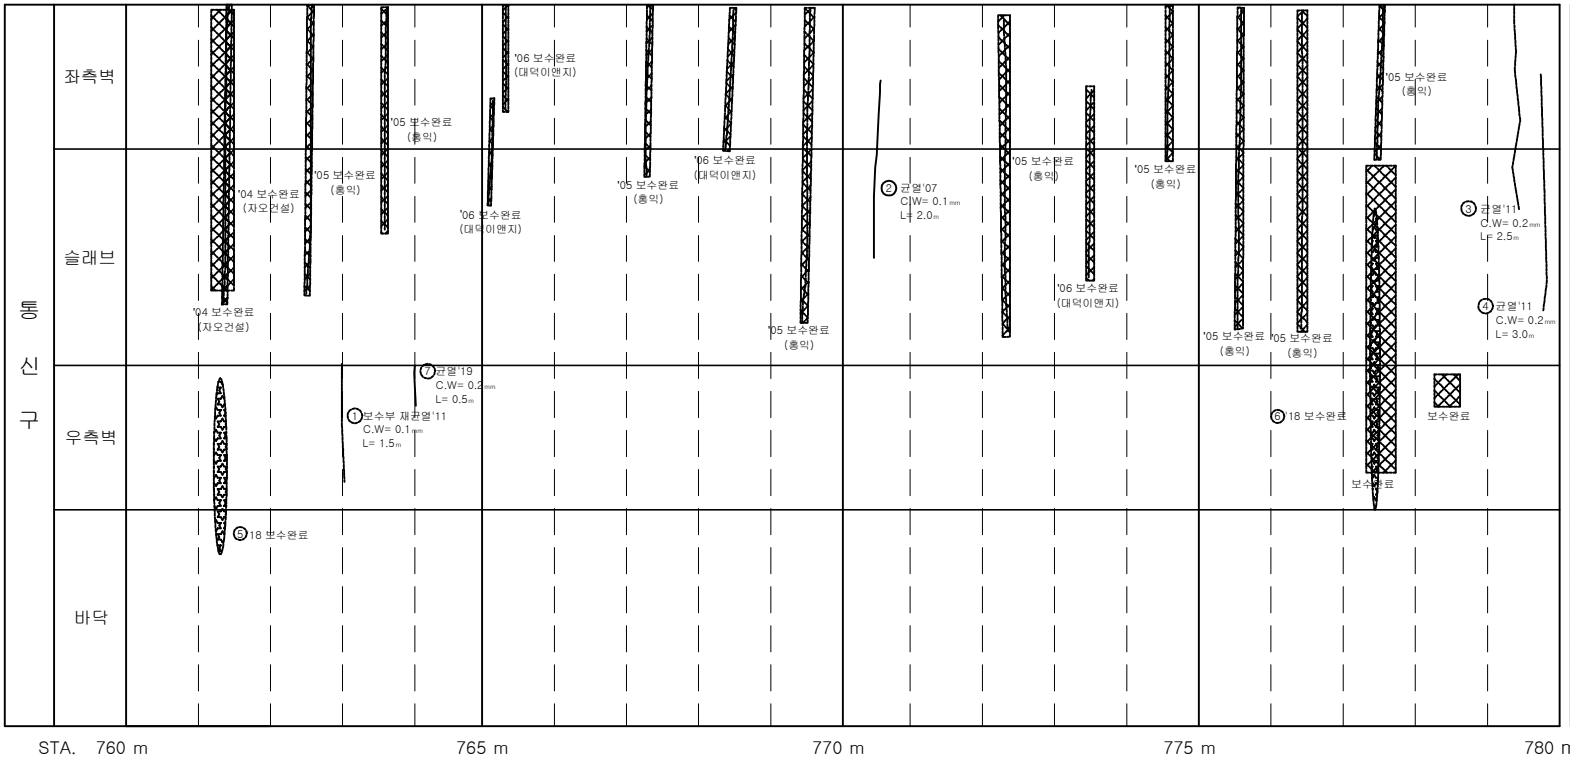

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	비고
1	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
2	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
3	2011	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
4	2011	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
5	2013	박태	0.10	2.00		0.20	㎡	1	2018	표면처리공법	0.24	
6	2013	박태	0.10	3.50		0.35	㎡	1	2018	표면처리공법	0.42	
7	2019	균열	0.20	0.50		0.50	m	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.780.0 m ~ 800.0m) 통신구 구간





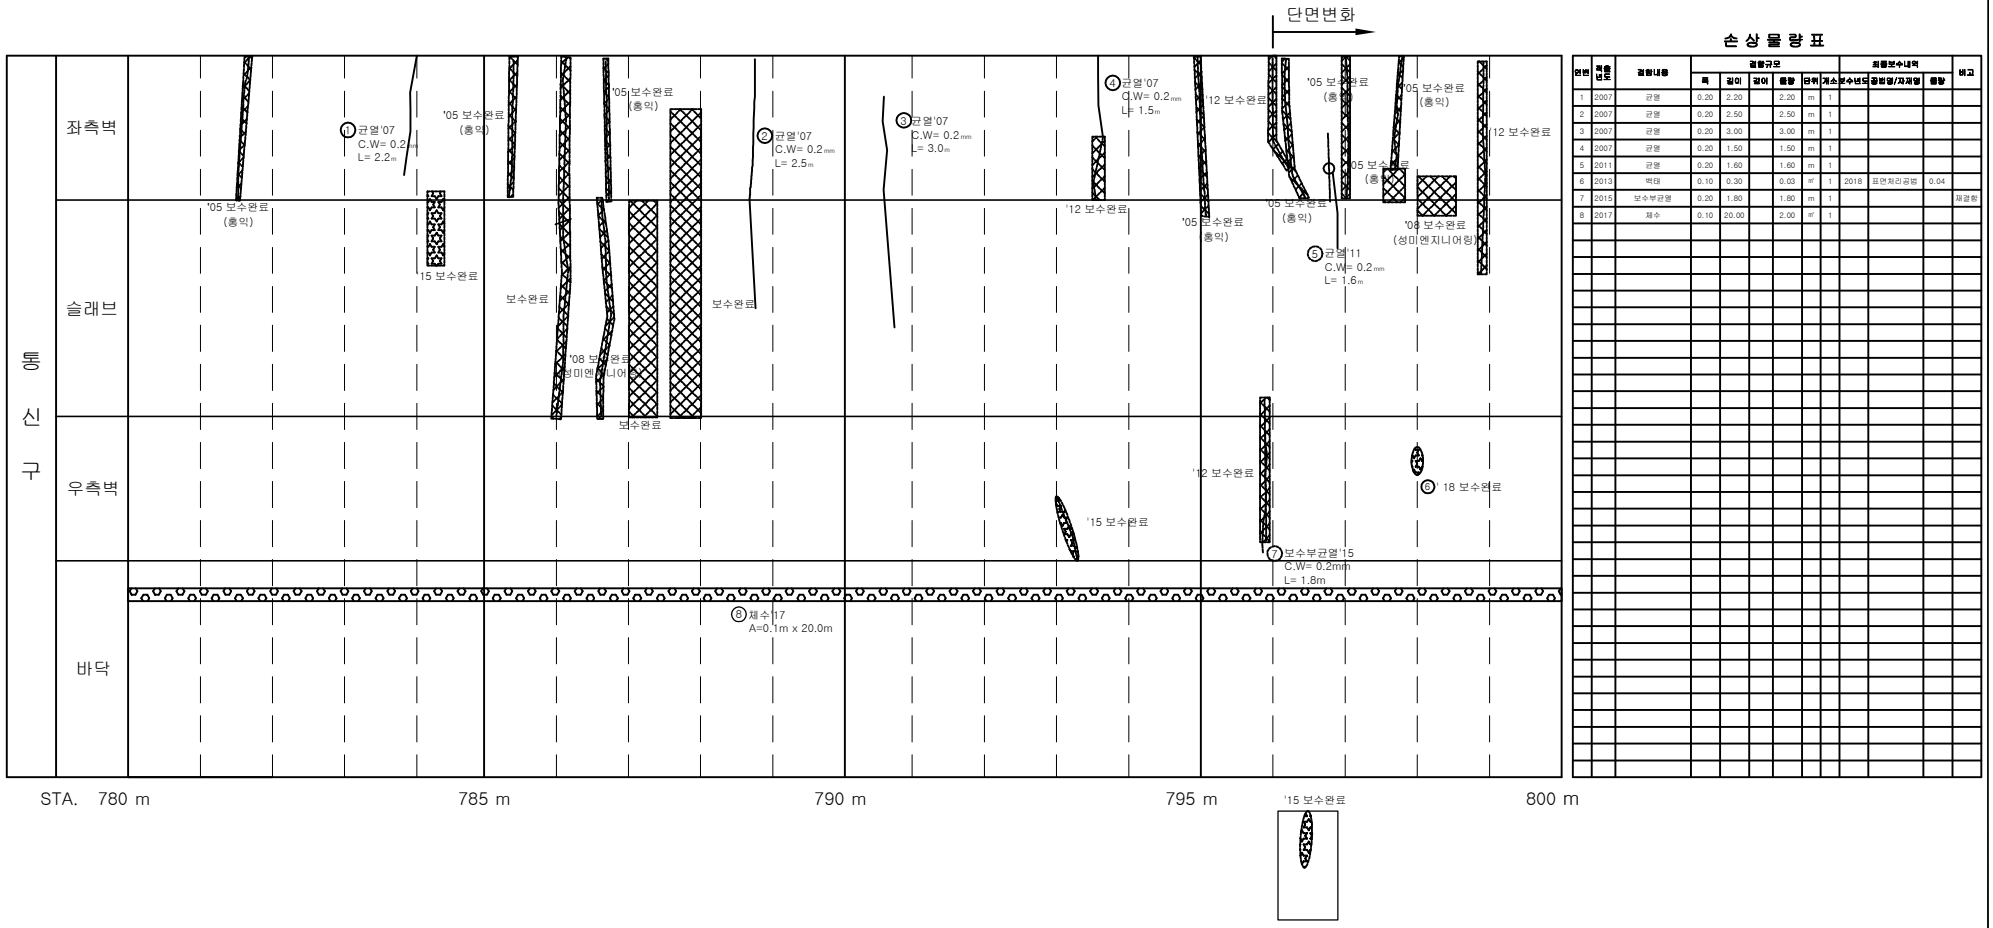

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
2	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
3	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
4	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
5	2011	균열	0.20	1.60		1.60	m	1				
6	2013	박태	0.10	0.30		0.03	㎡	1	2018	표면처리공법	0.04	
7	2015	보수부균열	0.20	1.80		1.80	m	1				재결함
8	2017	체수	0.10	20.00		2.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.800.0 m ~ 820.0m) 통신구 구간





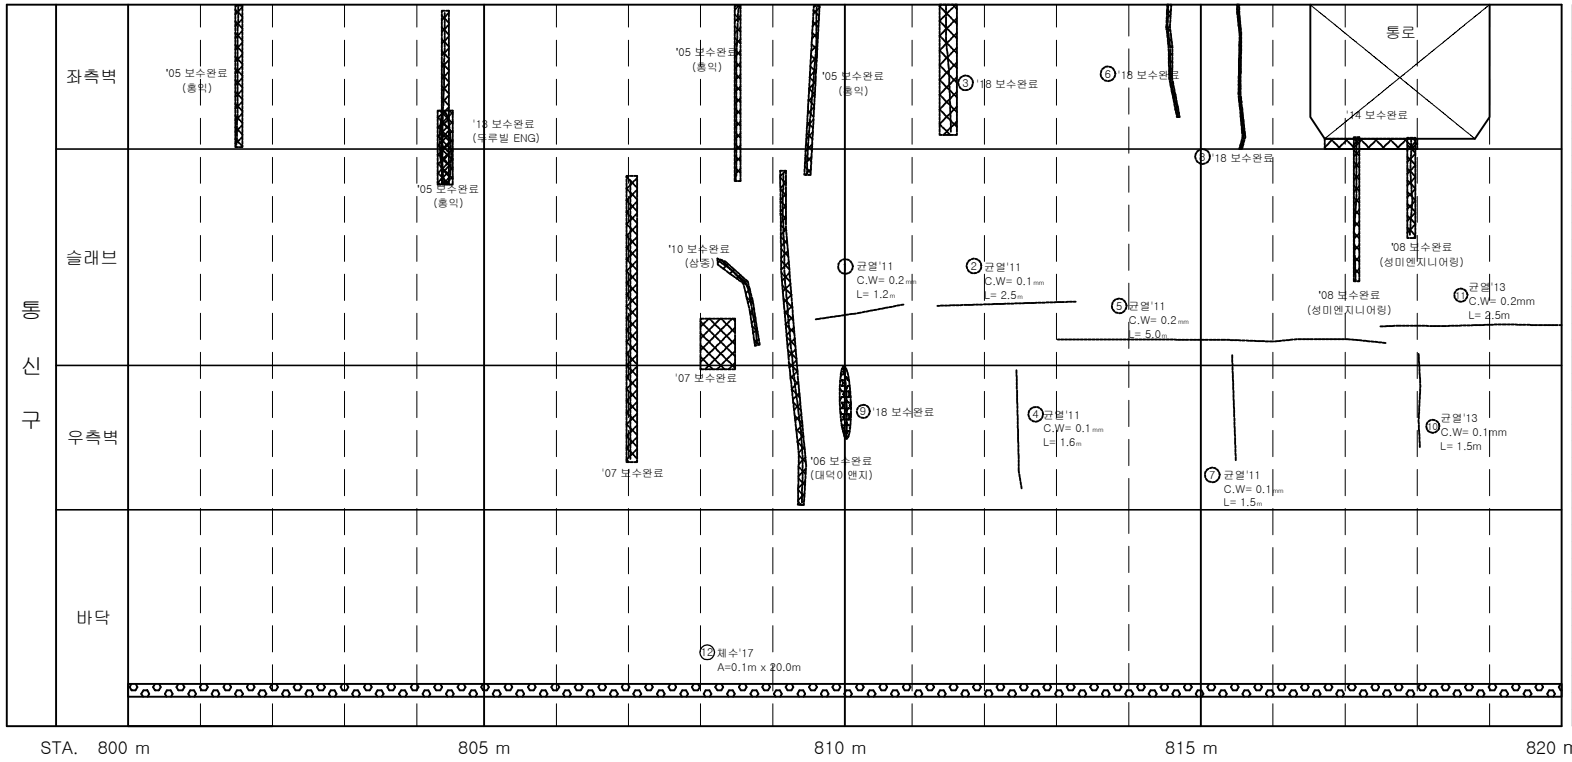

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2011	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
2	2011	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.10		2.10	m	1	2018	표면처리공법	2.52	
4	2011	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
5	2011	균열	0.20	5.00		5.00	m	1				
6	2007	균열	0.20	1.90		1.90	m	1	2018	표면처리공법	2.28	
7	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
8	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1	2018	표면처리공법	2.76	
9	2013	균열부백태	0.10	1.00		0.10	㎡	1	2018	표면처리공법	0.12	
10	2013	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
11	2013	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
12	2017	체수	0.10	20.00		2.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.820.0 m ~ 840.0m) 통신구 구간





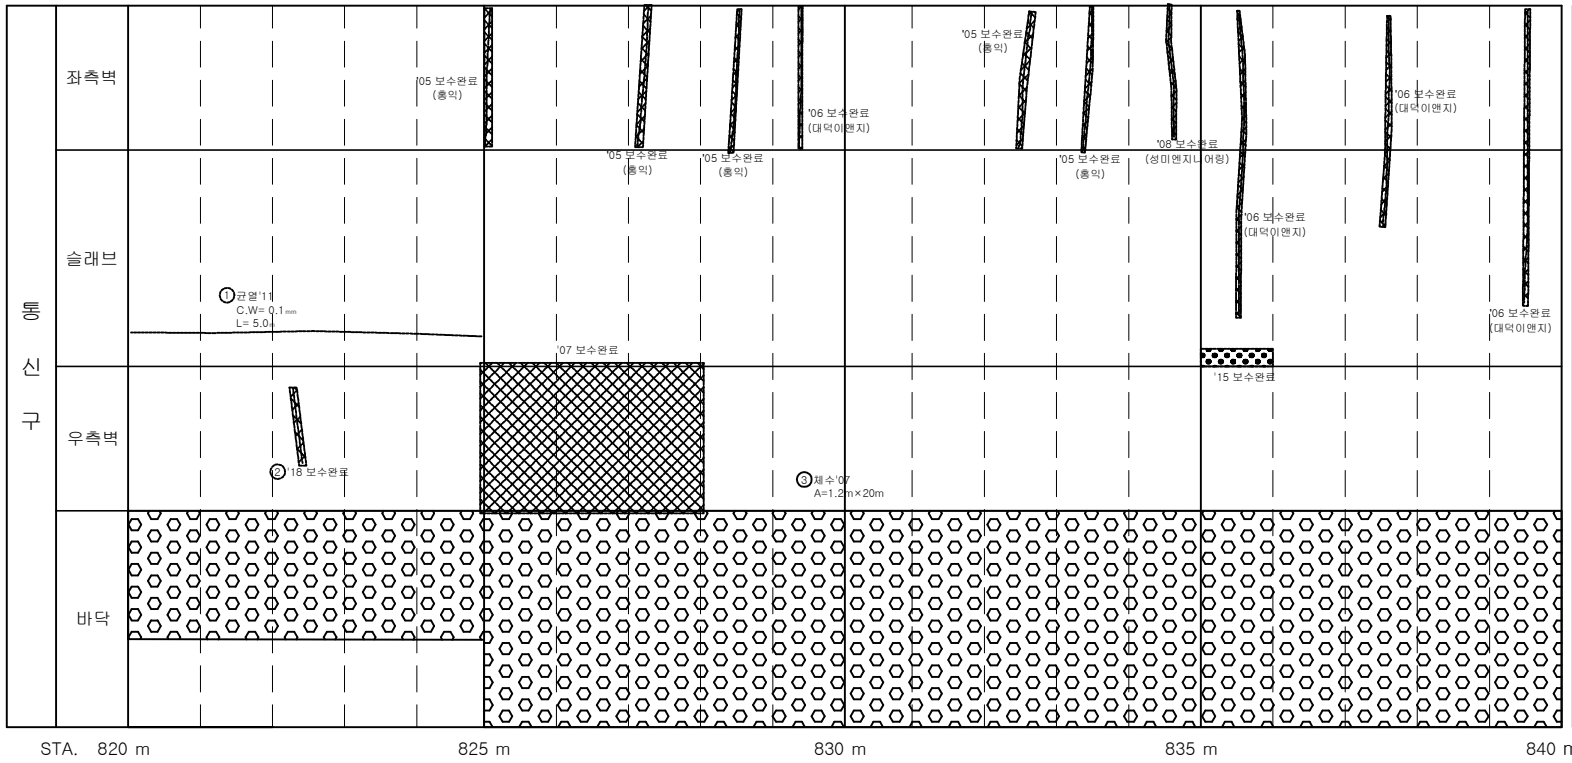

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2011	균열	0.10	5.00		5.00	m	1				
2	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1	2018	표면처리공법	1.80	
3	2007	체수	1.20	20.0		24.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.840.0 m ~ 860.0m) 통신구 구간





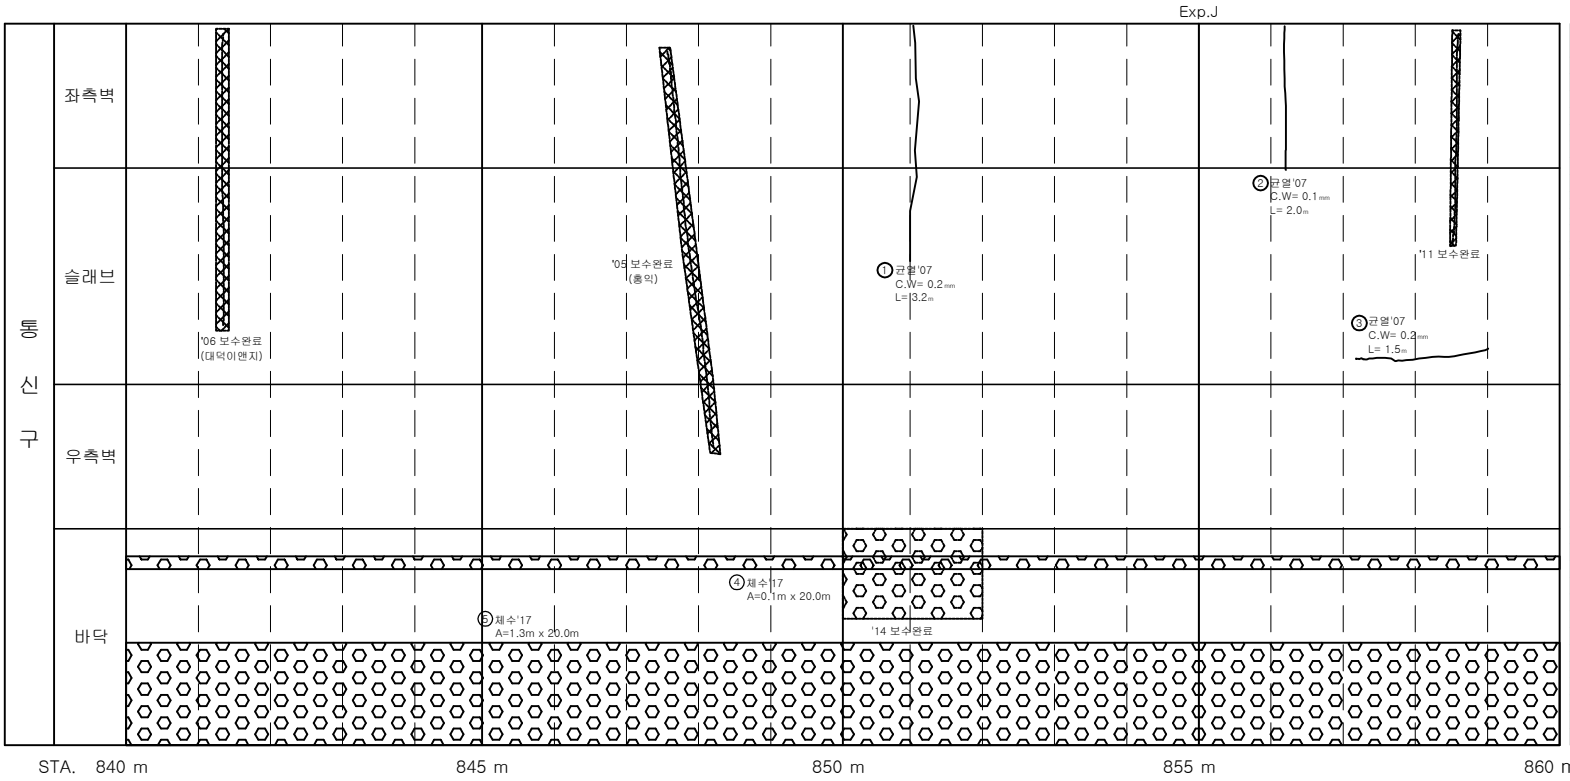

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	평장	
1	2007	균열	0.20	3.20		m	1				
2	2007	균열	0.10	2.00		m	1				
3	2007	균열	0.20	1.50		m	1				
4	2017	체수	0.10	20.00		㎡	1				
5	2017	체수	1.30	20.00		㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.860.0 m ~ 880.0m) 통신구 구간





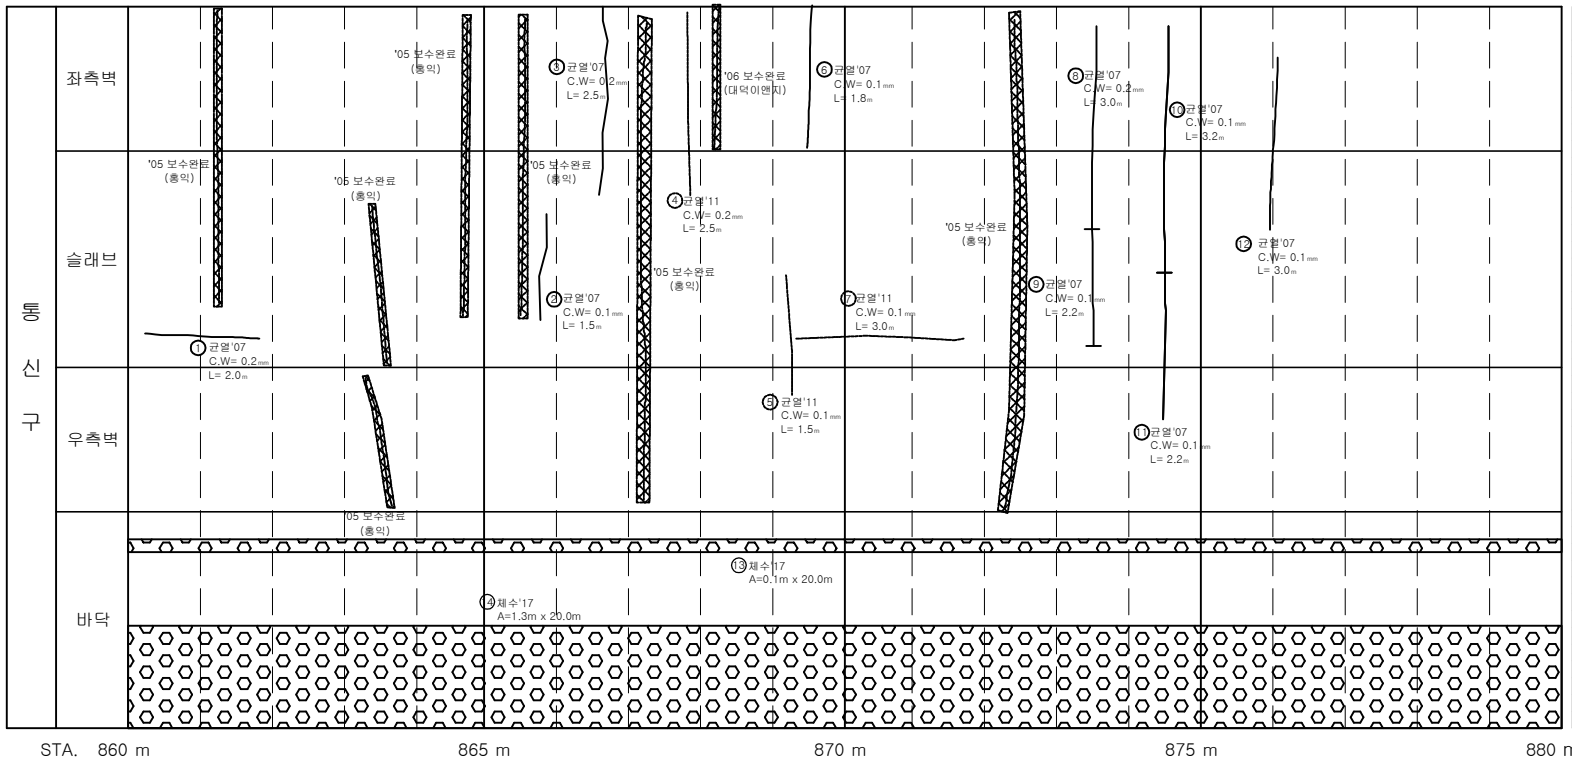

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
2	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
4	2011	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
5	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
6	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
7	2011	균열	0.10	3.00		3.00	m	1				
8	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
9	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
10	2007	균열	0.10	3.20		3.20	m	1				
11	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
12	2007	균열	0.10	3.00		3.00	m	1				
13	2017	체수	0.10	20.00		2.00	㎡	1				
14	2017	체수	1.30	20.00		26.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.880.0 m ~ 900.0m) 통신구 구간





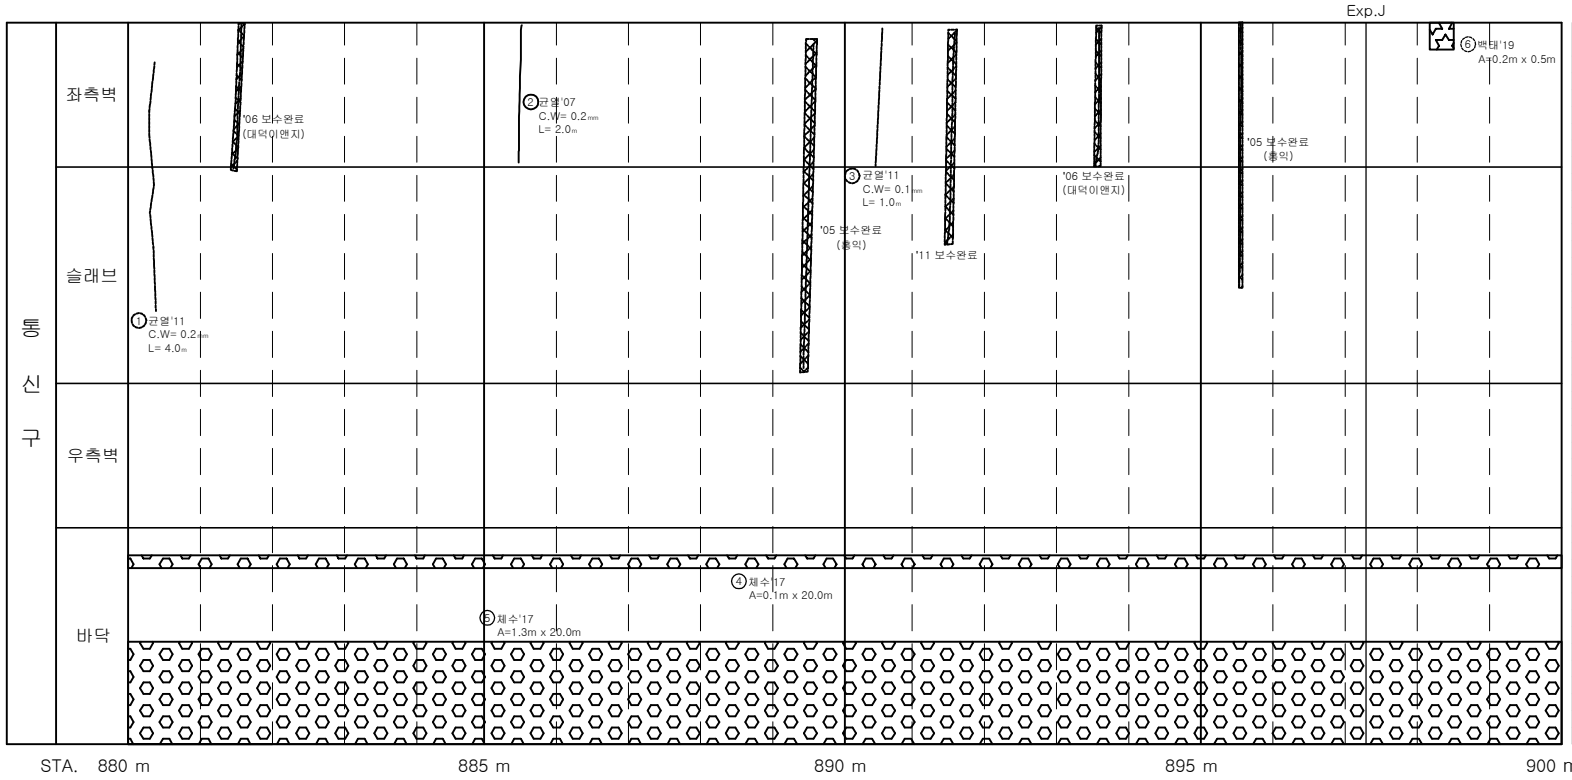

손 상 물 량 표

연번	점용년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2011	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
2	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
3	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
4	2017	체수	0.10	20.00		2.00	㎡	1				
5	2017	체수	1.30	20.00		26.00	㎡	1				
6	2019	박태	0.20	0.50		0.10	㎡	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.900.0 m ~ 920.0m) 통신구 구간





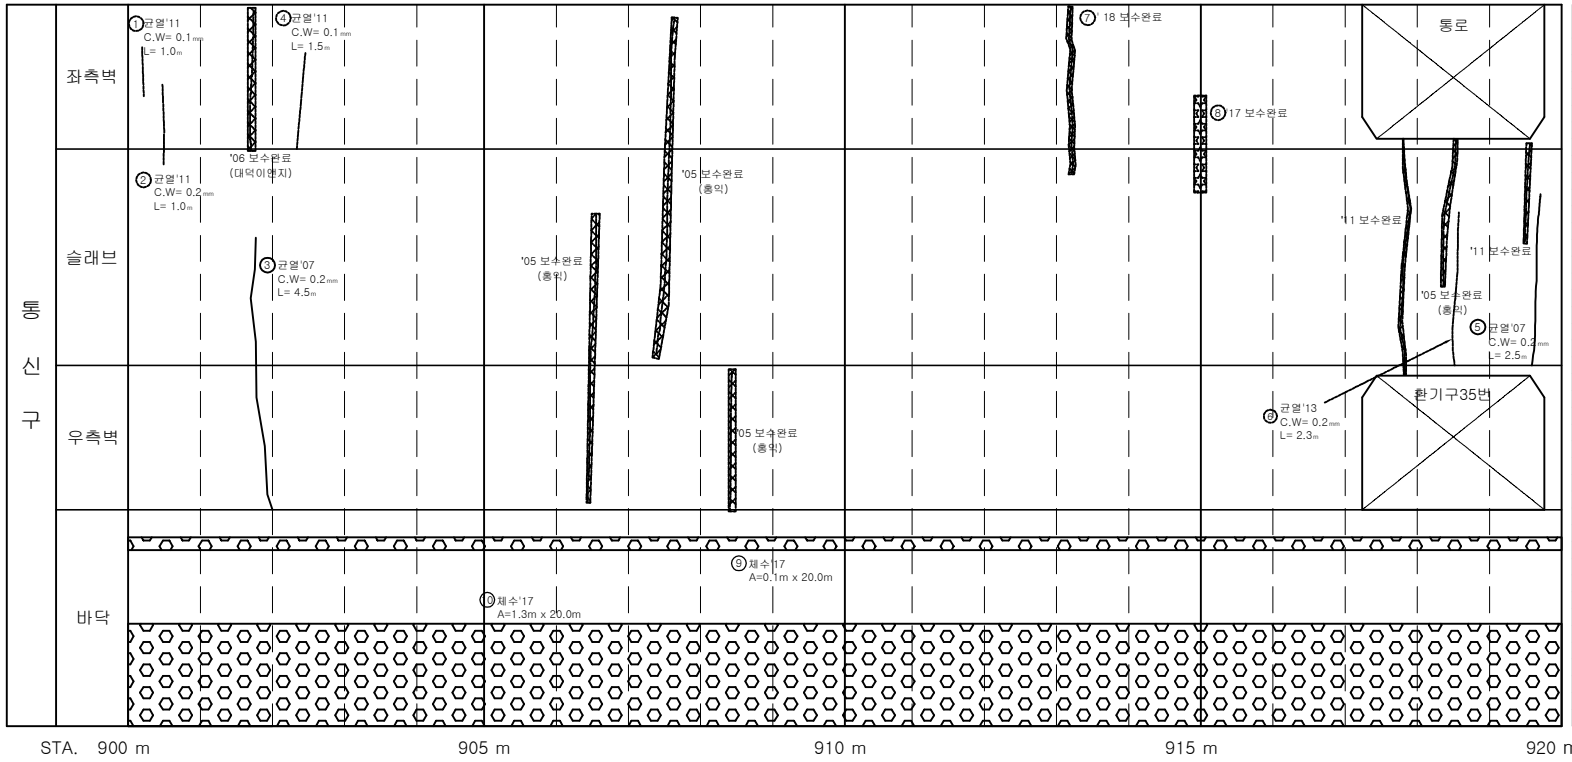

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	결함	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
2	2011	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
3	2007	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
4	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
6	2013	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
7	2015	균열	0.20	3.00		3.00	m	1	2018	표면처리공법	3.60	
8	2015	박대	0.10	1.50		0.15	㎡	1	2017	표면처리공법	0.18	
9	2017	체수	0.10	20.00		2.00	㎡	1				
10	2017	체수	1.30	20.00		26.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락공동구 - 송이로(STA.918m)환기구 35번

KEYPLAN



SECTION



BOX A

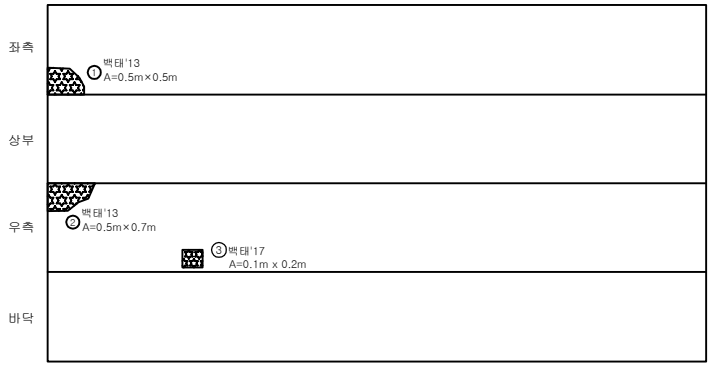

BOX B

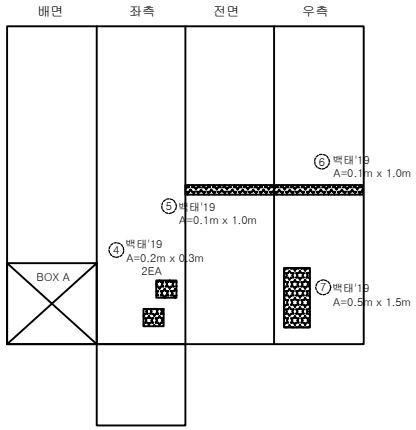

출입구



손 상 물 량 표

연번	점출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2013	백태	0.50	0.50	0.25	㎡	1				
2	2013	백태	0.50	0.70	0.35	㎡	1				
3	2017	백태	0.10	0.20	0.02	㎡	1				
4	2019	백태	0.20	0.30	0.12	㎡	2				신규
5	2019	백태	0.10	1.00	0.10	㎡	1				신규
6	2019	백태	0.10	1.00	0.10	㎡	1				신규
7	2019	백태	0.50	1.50	0.75	㎡	1				신규
8	2019	ㄷ빔 부식		7.20	7.20	m	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 환기구 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.920.0 m ~ 940.0m) 통신구 구간





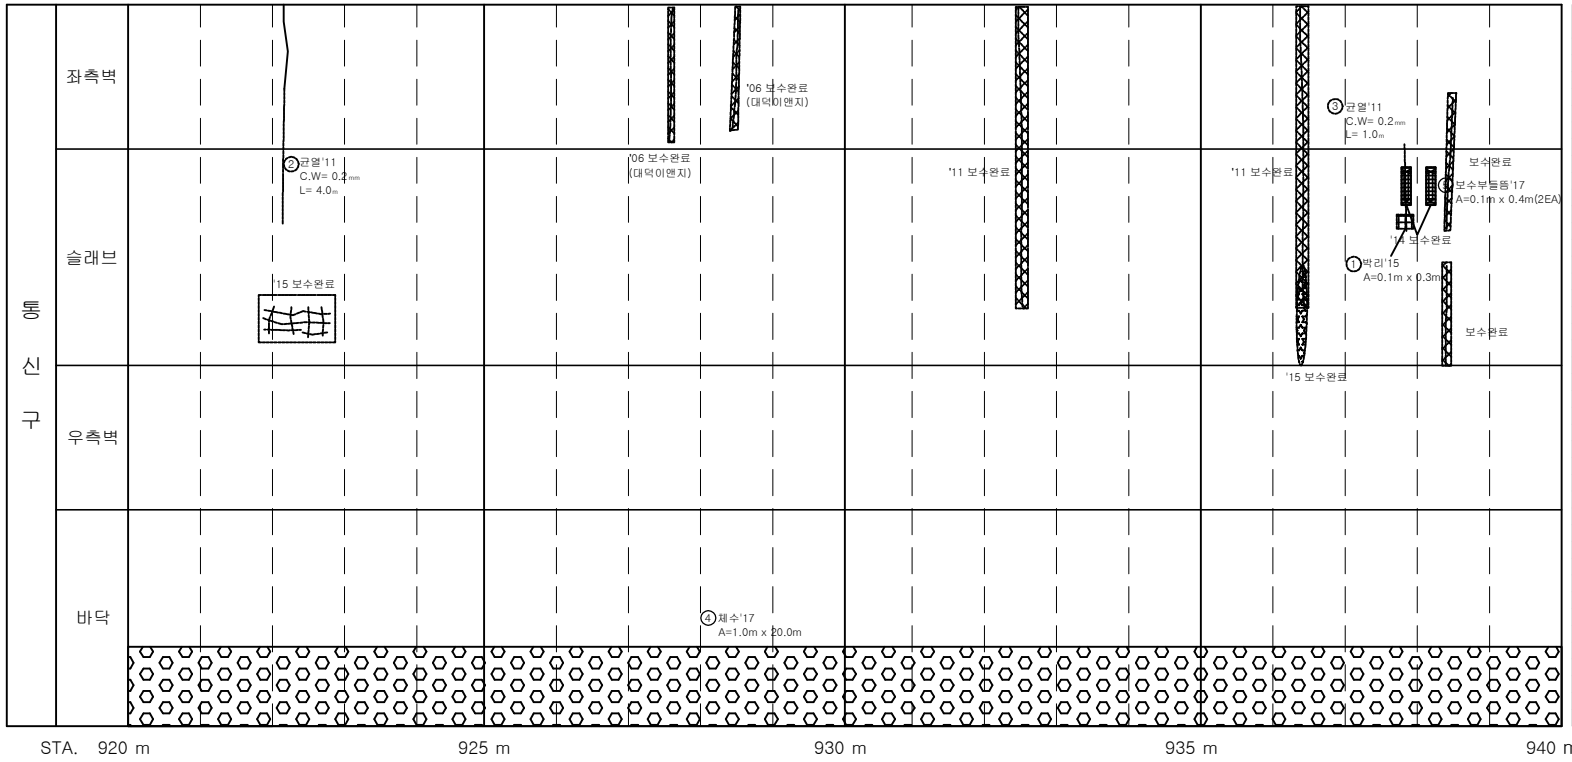

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2015	박리	0.10	0.30		0.03	㎡	1				
2	2011	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
3	2011	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
4	2017	체수	1.00	20.00		20.00	㎡	1				
5	2017	보수부틈	0.10	0.40		0.08	㎡	2				재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.940.0 m ~ 960.0m) 통신구 구간





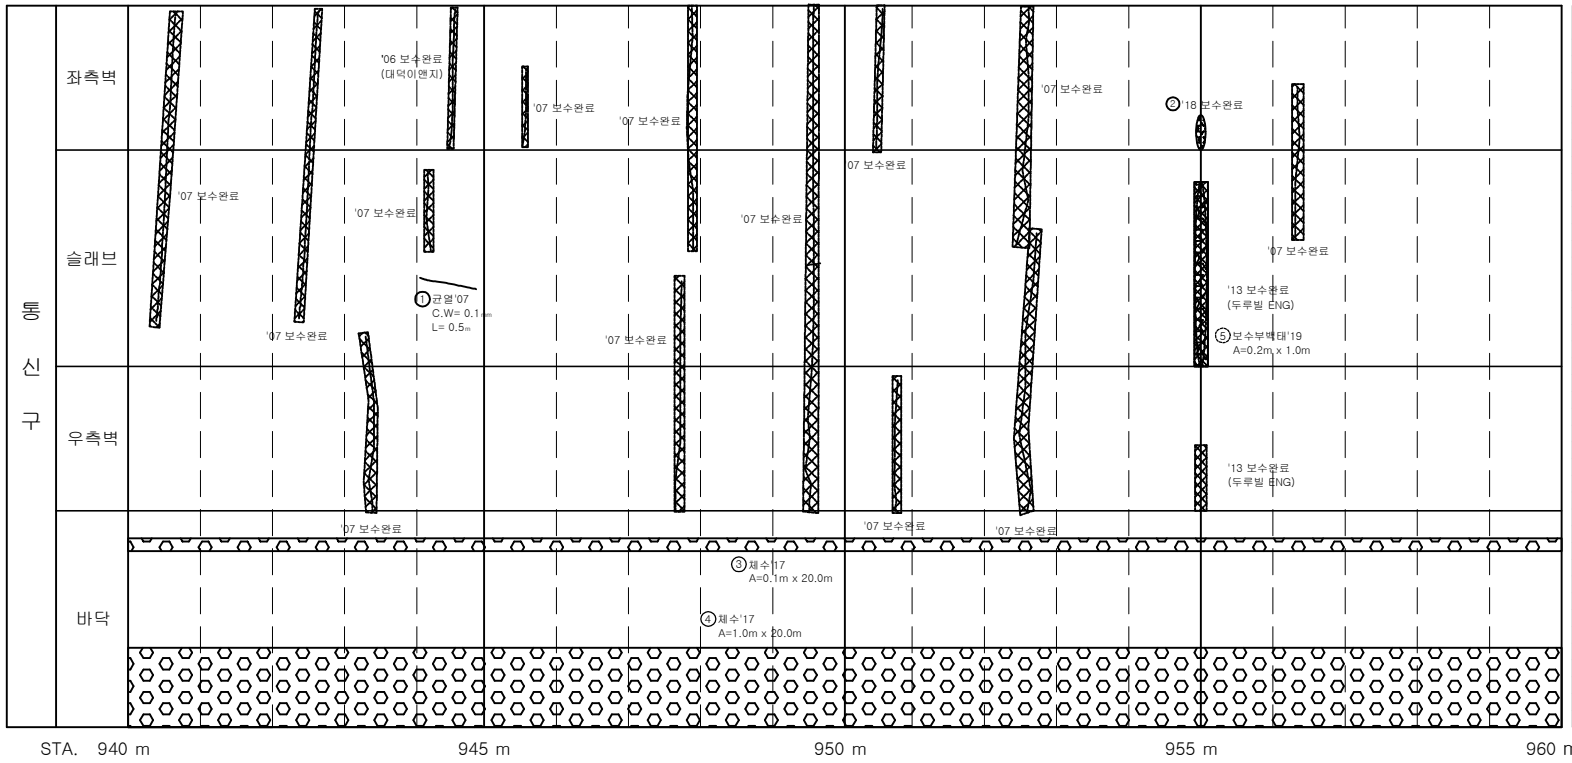

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
2	2013	백태	0.10	0.30		0.03	㎡	1	2018	표면처리공법	0.04	
3	2017	체수	0.10	20.00		2.00	㎡	1				
4	2017	체수	1.00	20.00		20.00	㎡	1				
5	2019	보수부백태	0.20	1.00		0.20	㎡	1				재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.960.0 m ~ 980.0m) 통신구 구간





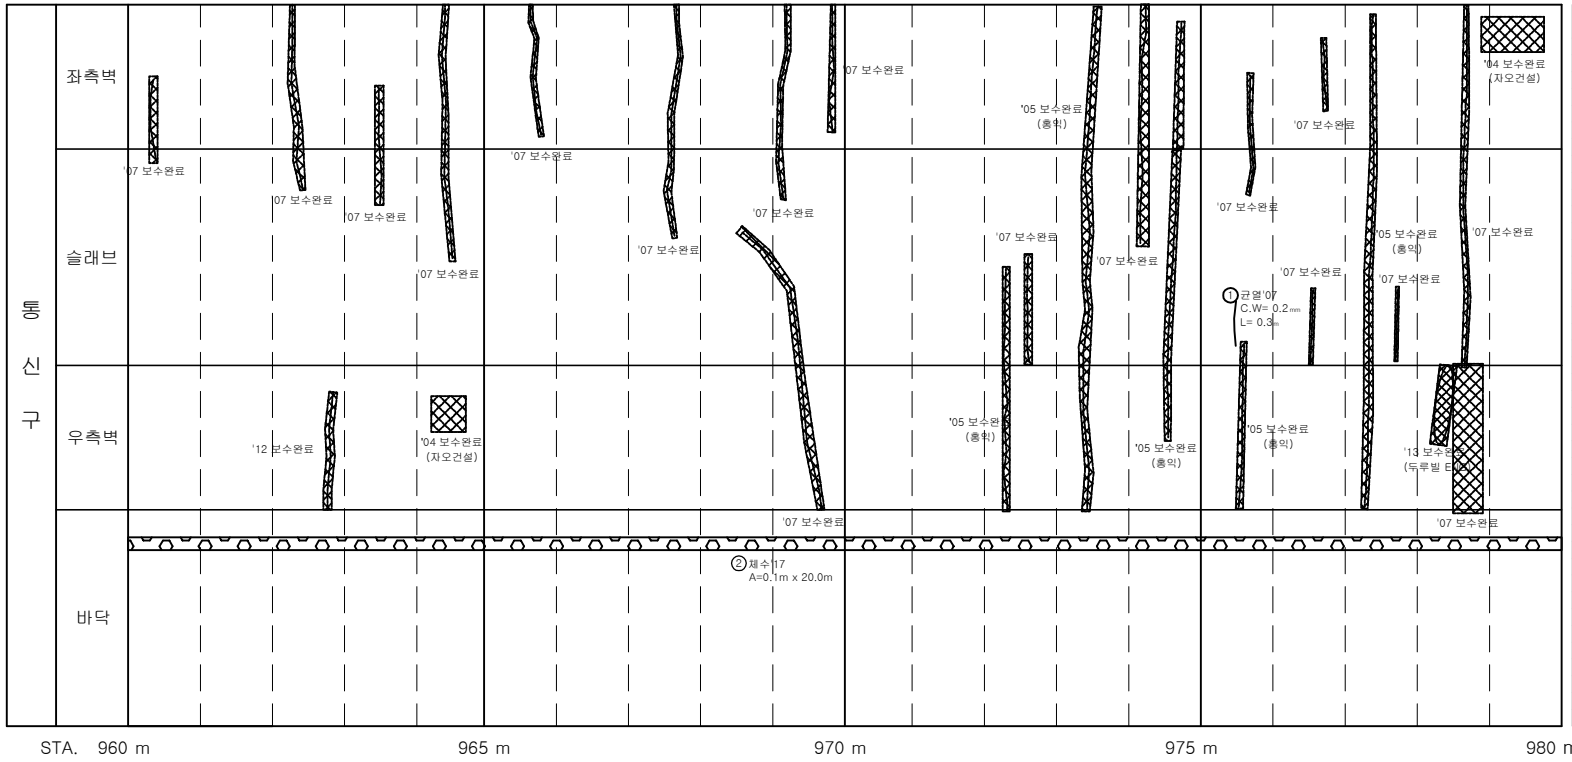

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	균열	0.20	0.30		0.30	m	1				
2	2017	체수	0.10	20.00		2.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.980.0 m ~ 1000.0m) 통신구 구간





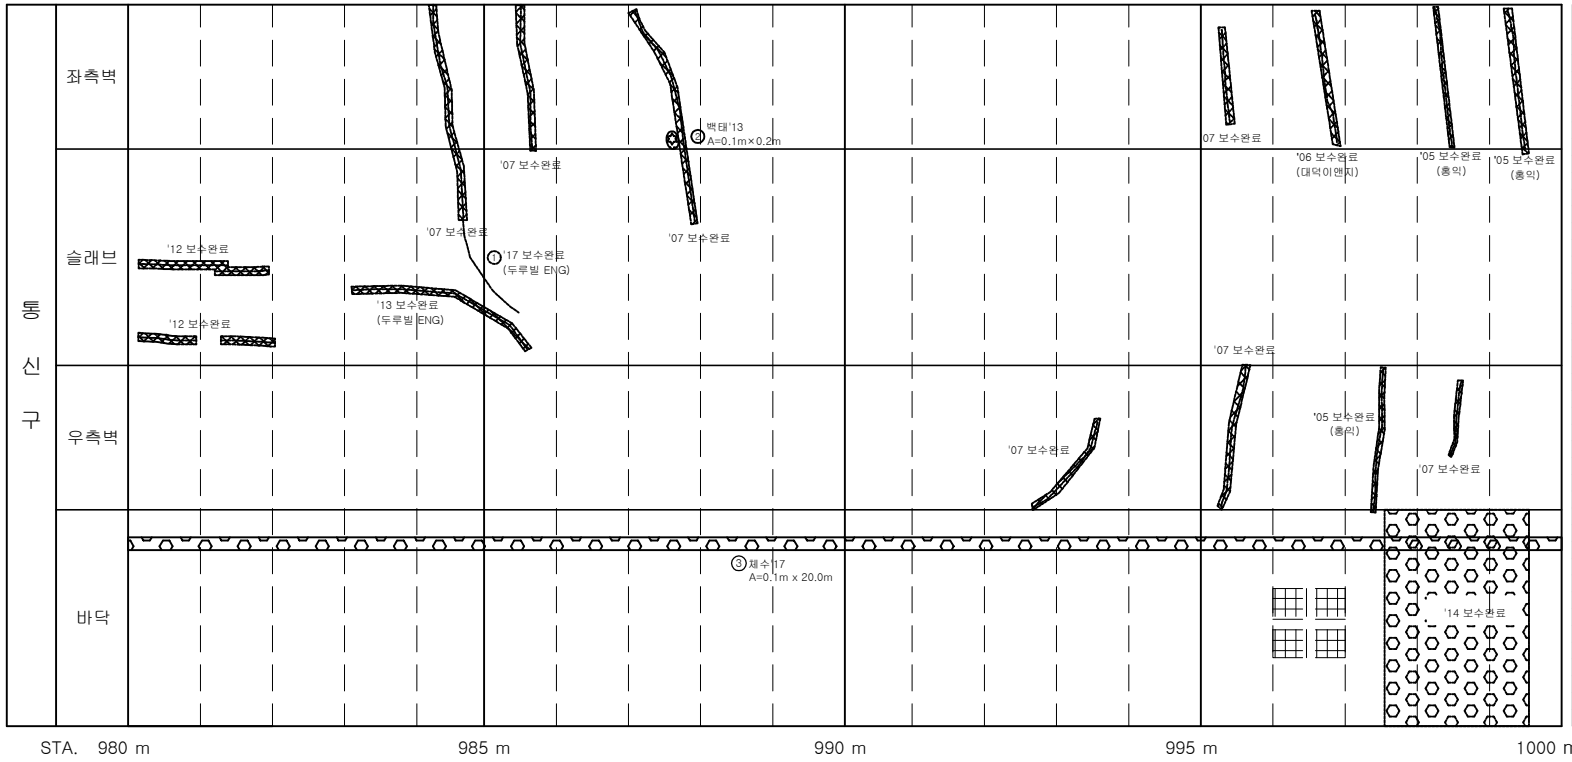

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2013	균열	0.20	1.50		m	1	2017	표면처리공법	1.80	
2	2013	박태	0.10	0.20		㎡	1				
3	2017	체수	0.10	20.00		㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1000.0 m ~ 1020.0m) 통신구 구간



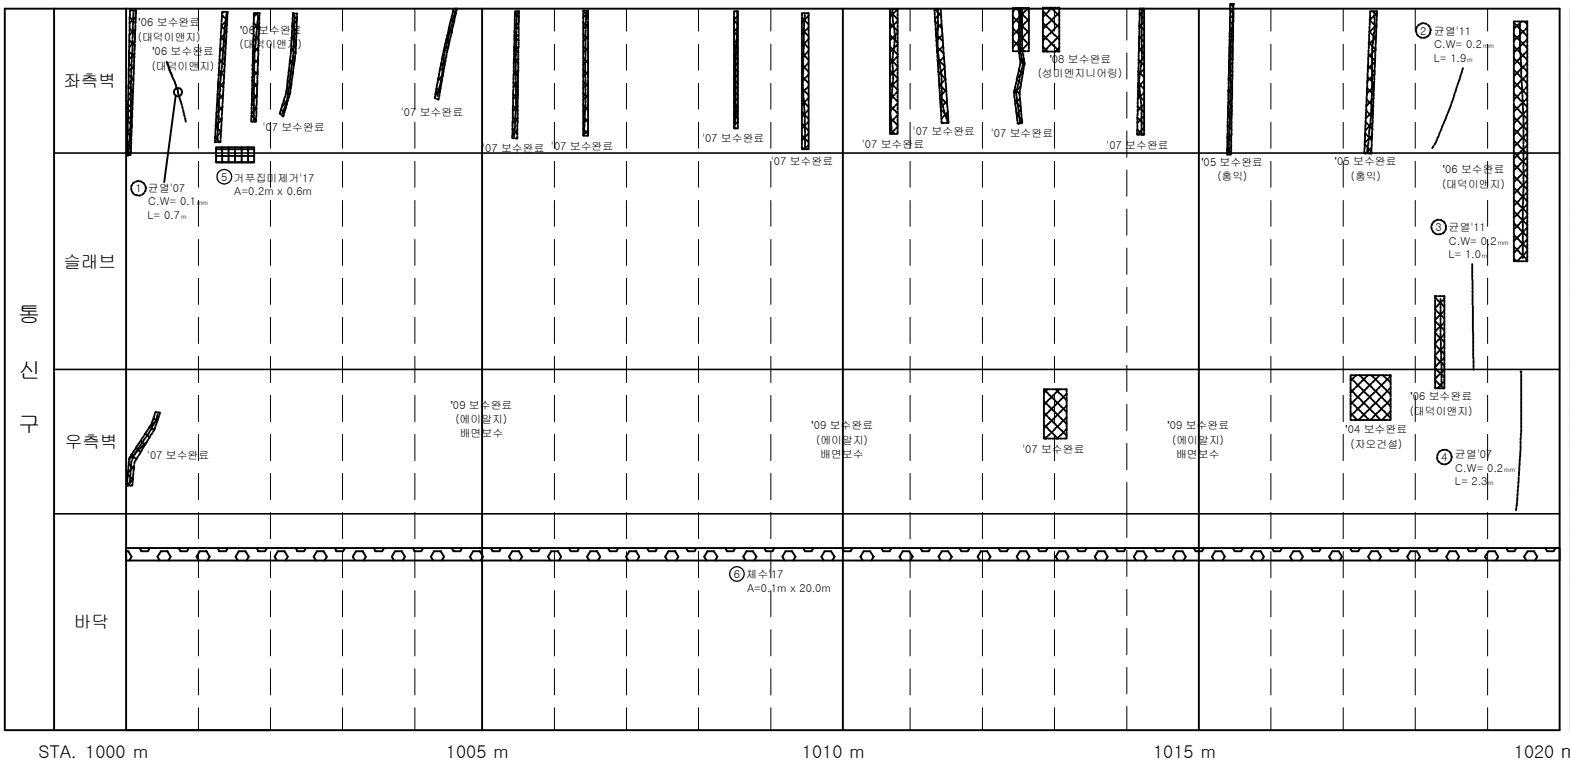

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
2	2011	균열	0.20	1.90		1.90	m	1				
3	2011	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
4	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
5	2017	거푸집미제거	0.20	0.60		0.12	㎡	1				
6	2017	체수	0.10	20.00		2.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1020.0 m ~ 1040.0m) 통신구 구간



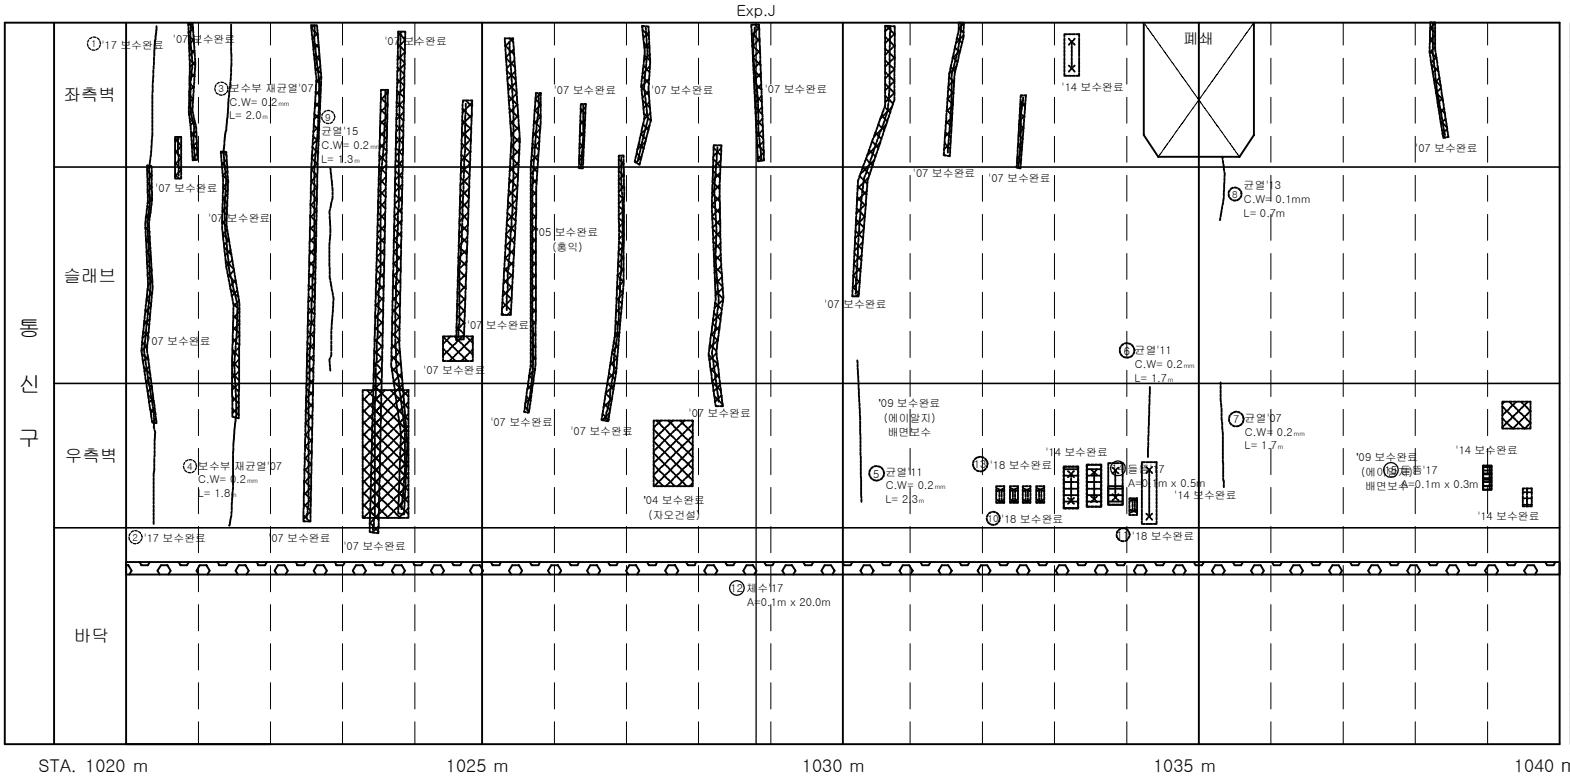

손 상 물 량 표

연번	균열년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1	2017	표면처리공법	2.88	
2	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1	2017	표면처리공법	2.16	
3	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
4	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
5	2011	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
6	2011	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
7	2007	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
8	2013	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
9	2015	균열	0.20	1.30		1.30	m	1				
10	2015	철근노출	0.10	0.10		0.04	㎡	4	2018	단면복구(방청)	0.05	중요
11	2015	철근노출	0.10	0.40		0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.05	중요
12	2017	제수	0.10	20.00		2.00	㎡	1				
13	2017	들뜸	0.10	1.50		0.30	㎡	2	2018	단면복구공법	0.36	
14	2017	들뜸	0.10	0.50		0.05	㎡	1				
15	2017	들뜸	0.10	0.30		0.03	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1040.0 m ~ 1060.0m) 통신구 구간



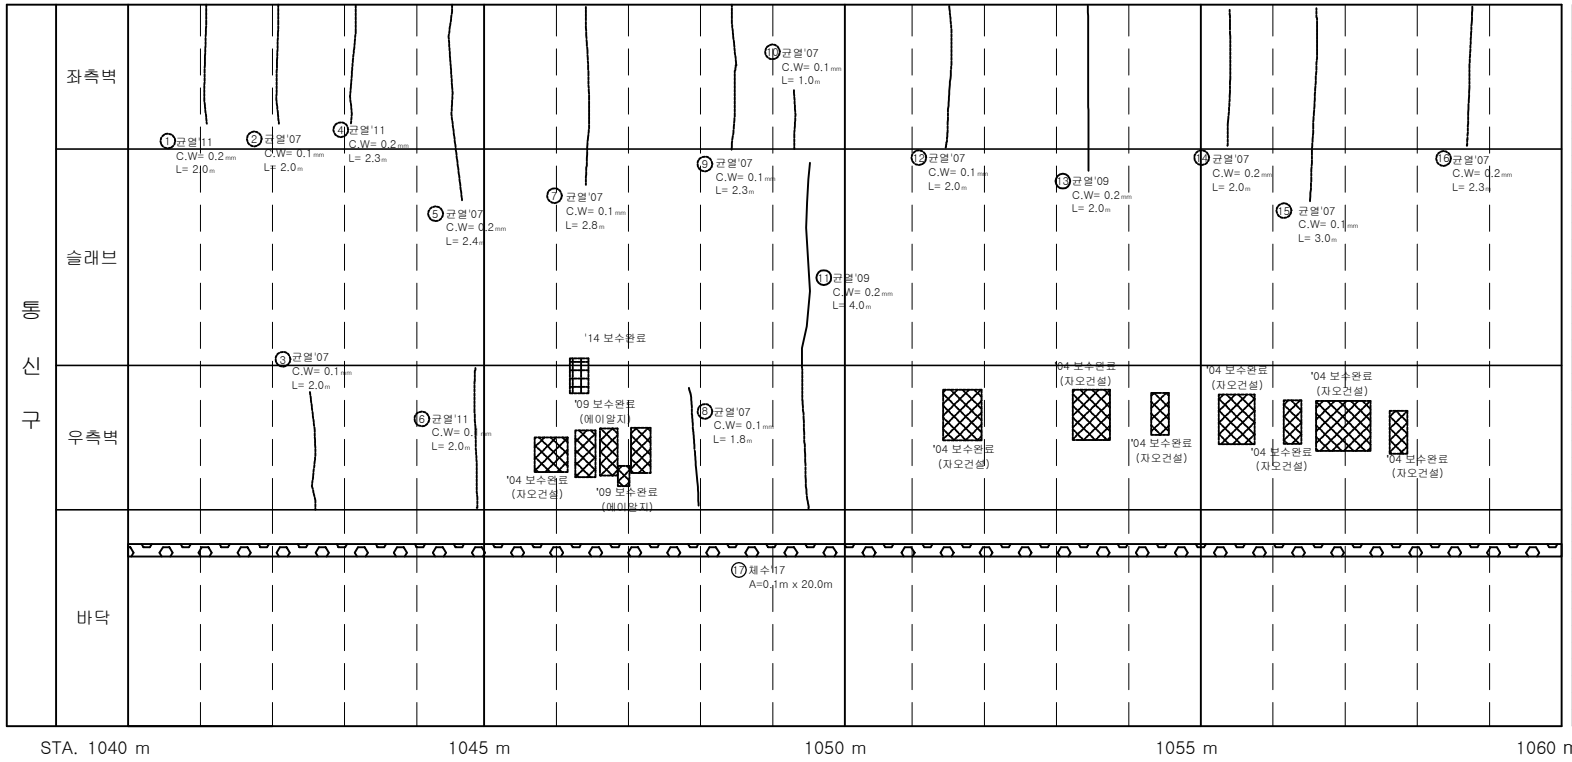

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량		
1	2011	균열	0.20	2.00		m	1					
2	2007	균열	0.10	2.00		m	1					
3	2007	균열	0.10	2.00		m	1					
4	2011	균열	0.20	2.30		m	1					
5	2007	균열	0.20	2.40		m	1					
6	2011	균열	0.10	2.00		m	1					
7	2007	균열	0.10	2.80		m	1					
8	2007	균열	0.10	1.80		m	1					
9	2007	균열	0.10	2.30		m	1					
10	2007	균열	0.10	1.00		m	1					
11	2009	균열	0.20	4.00		m	1					
12	2007	균열	0.10	2.00		m	1					
13	2009	균열	0.20	2.00		m	1					
14	2007	균열	0.20	2.00		m	1					
15	2007	균열	0.10	3.00		m	1					
16	2007	균열	0.20	2.30		m	1					
17	2017	체수	0.10	20.00		㎡	1					

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1060.0 m ~ 1080.0m) 통신구 구간



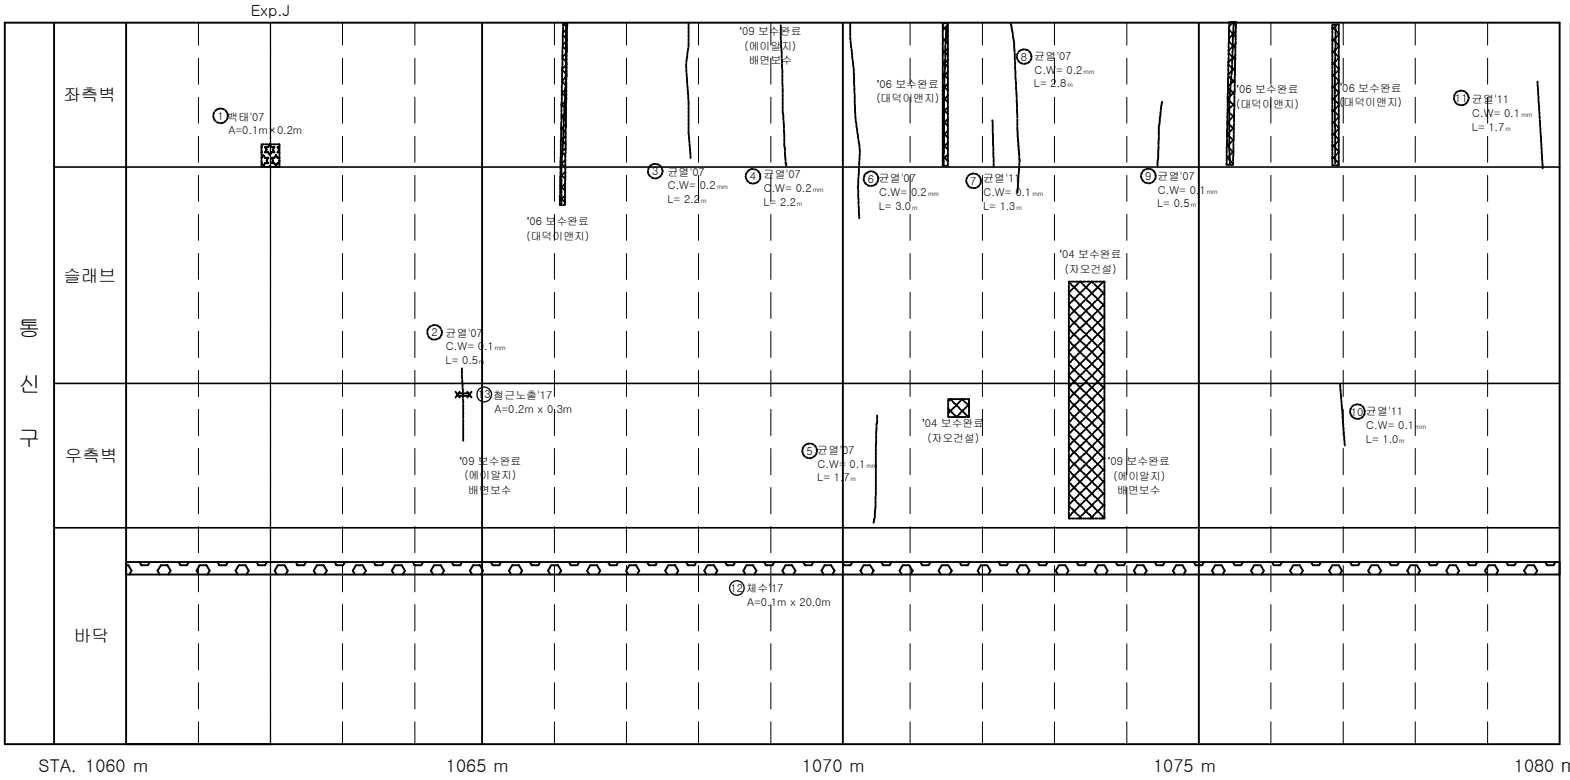

손 상 물 량 표

연번	균열년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	박태	0.10	0.20		0.02	㎡	1				
2	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
4	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
5	2007	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
6	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
7	2011	균열	0.10	1.30		1.30	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.80		2.80	m	1				
9	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
10	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
11	2011	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
12	2017	체수	0.10	20.00		2.00	㎡	1				
13	2017	철근노출	0.20	0.30		0.06	㎡	1				중요

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1080.0 m ~ 1100.0m) 통신구 구간



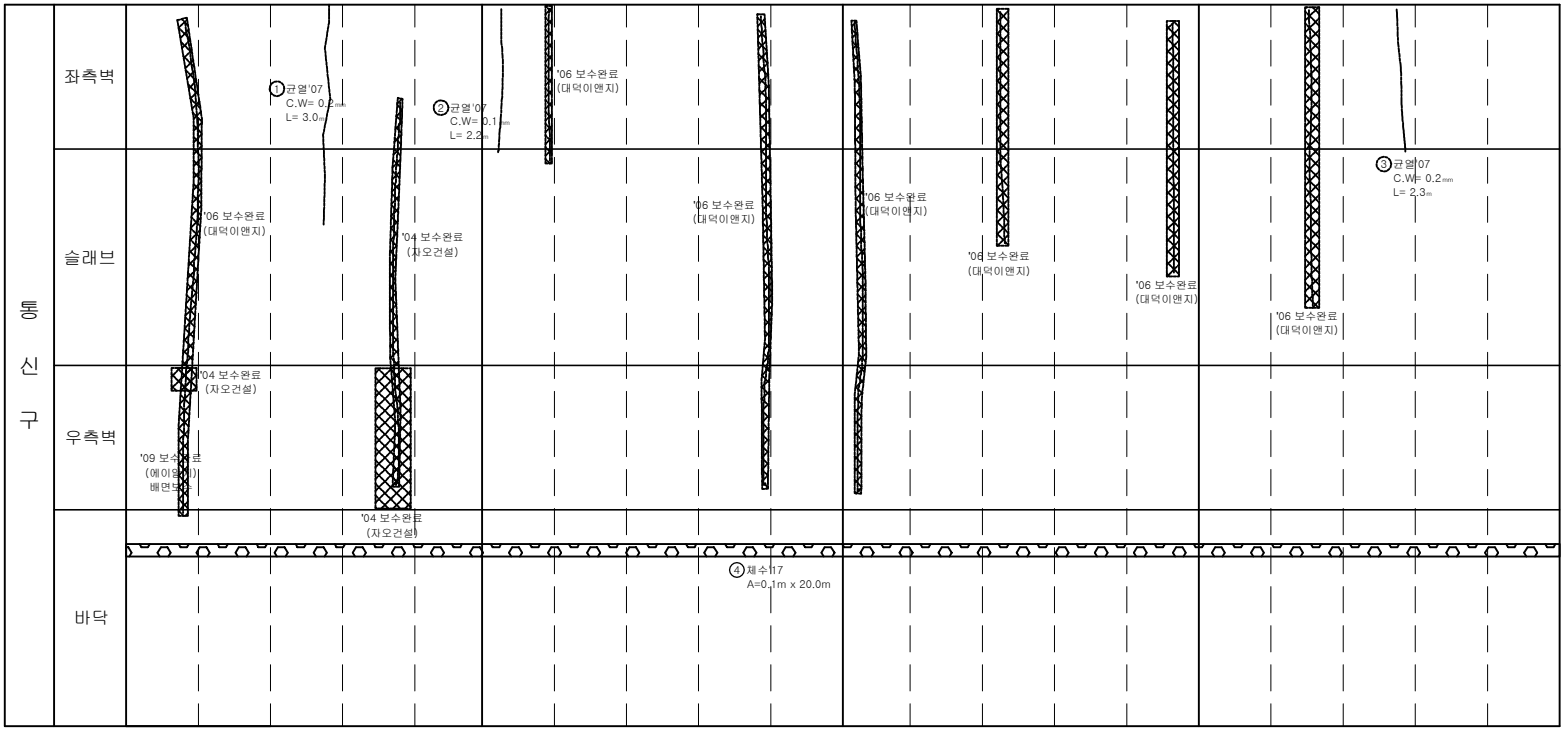

손 상 물 량 표

연번	점검년도	점검내용	결함규모					최종보수내역			
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	비고
1	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
2	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
4	2017	체수	0.10	20.00		2.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1100.0 m ~ 1120.0m) 통신구 구간



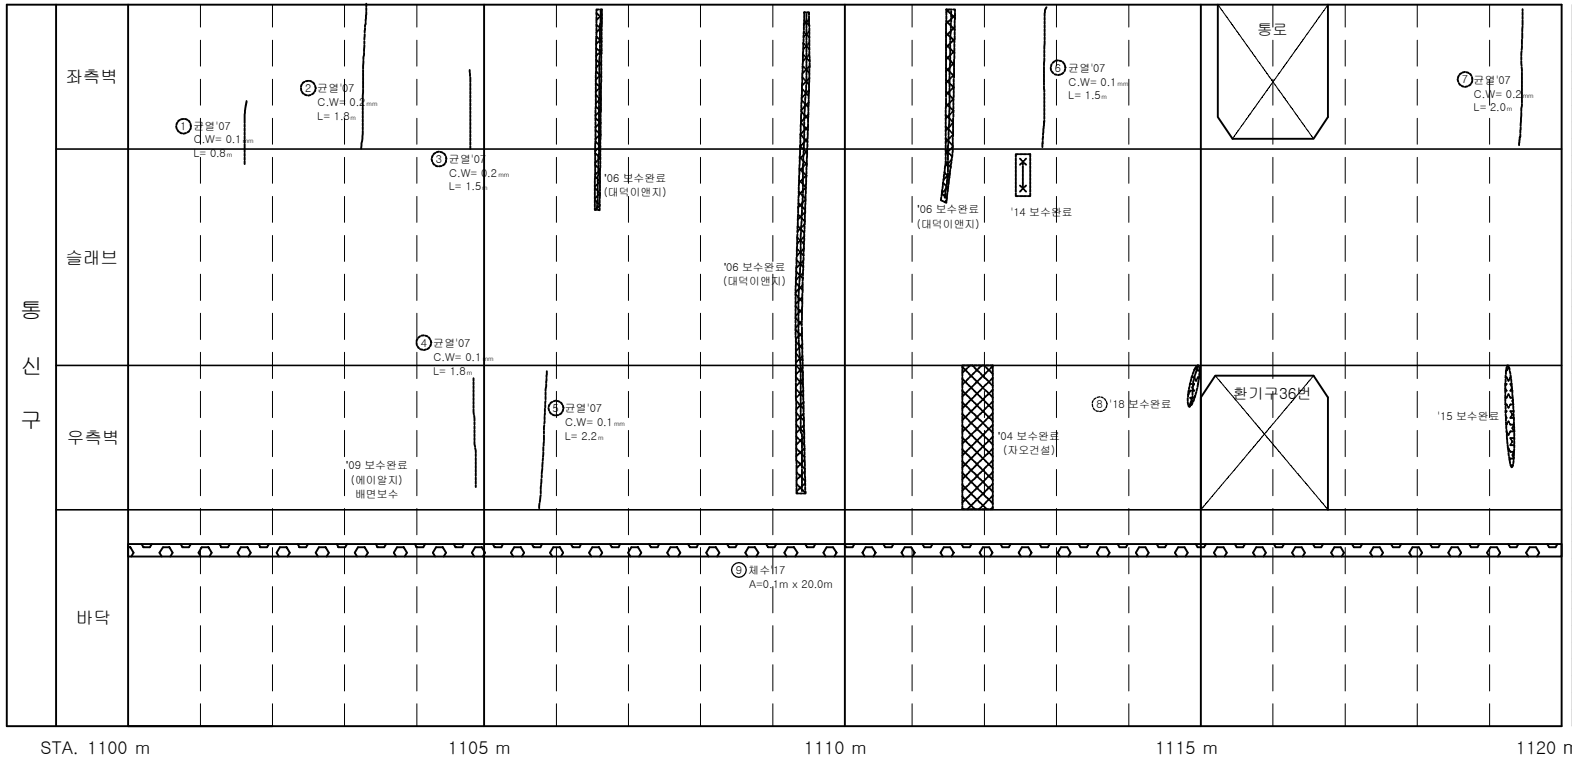

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	물량	비고
1	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
2	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
3	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
4	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
5	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
6	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
7	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
8	2013	백태	0.10	0.50		0.05	㎡	1	2018	표면처리공법	0.06	
9	2017	체수	0.10	20.00		2.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락공동구 - 송이로(STA.1116m)환기구 36번

KEYPLAN



SECTION



BOX A

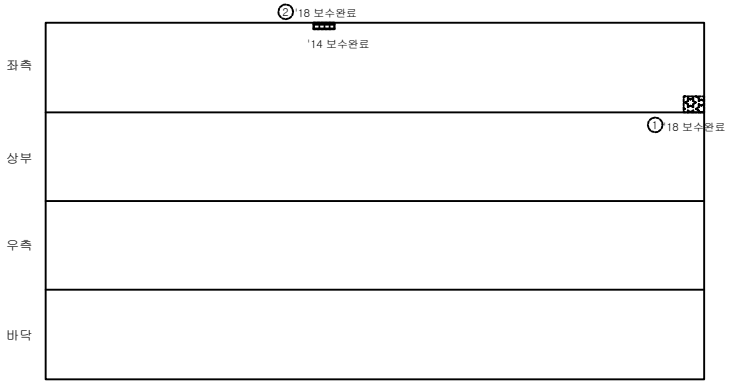

BOX B

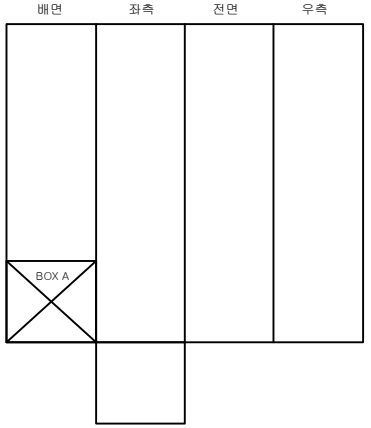

손 상 물 량 표

연번	최초년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2011	백태	0.20	0.40		0.08	㎡	1	2018	표면처리공법	0.10	
2	2017	보수부들림	0.10	0.30		0.03	㎡	1	2018	단면복구공법	0.04	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 환기구 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1120.0 m ~ 1140.0m) 통신구 구간



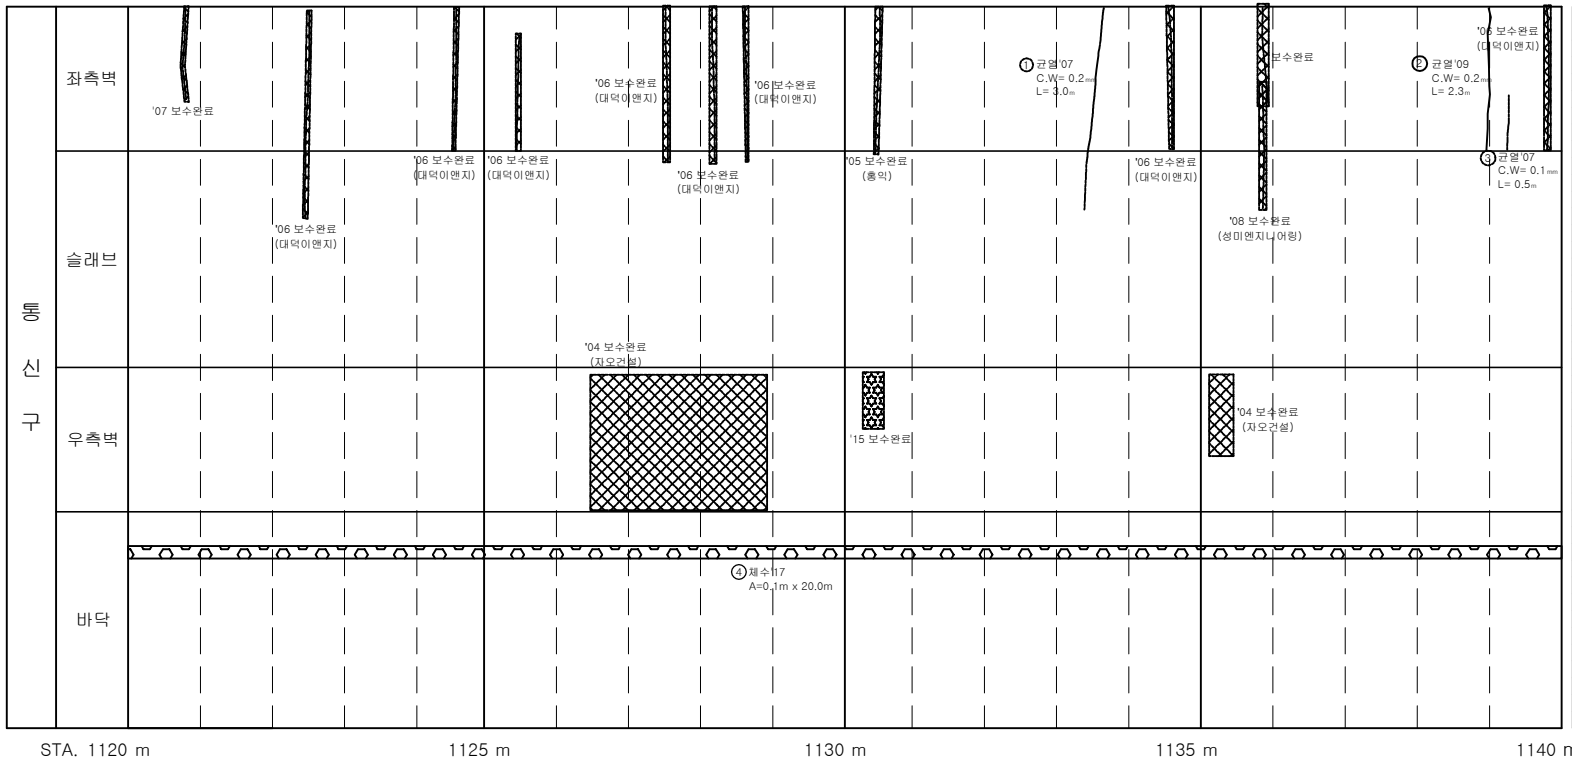

손 상 물 량 표

연번	점검년도	점검내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
2	2009	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
3	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
4	2017	체수	0.10	20.00		2.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1140.0 m ~ 1160.0m) 통신구 구간



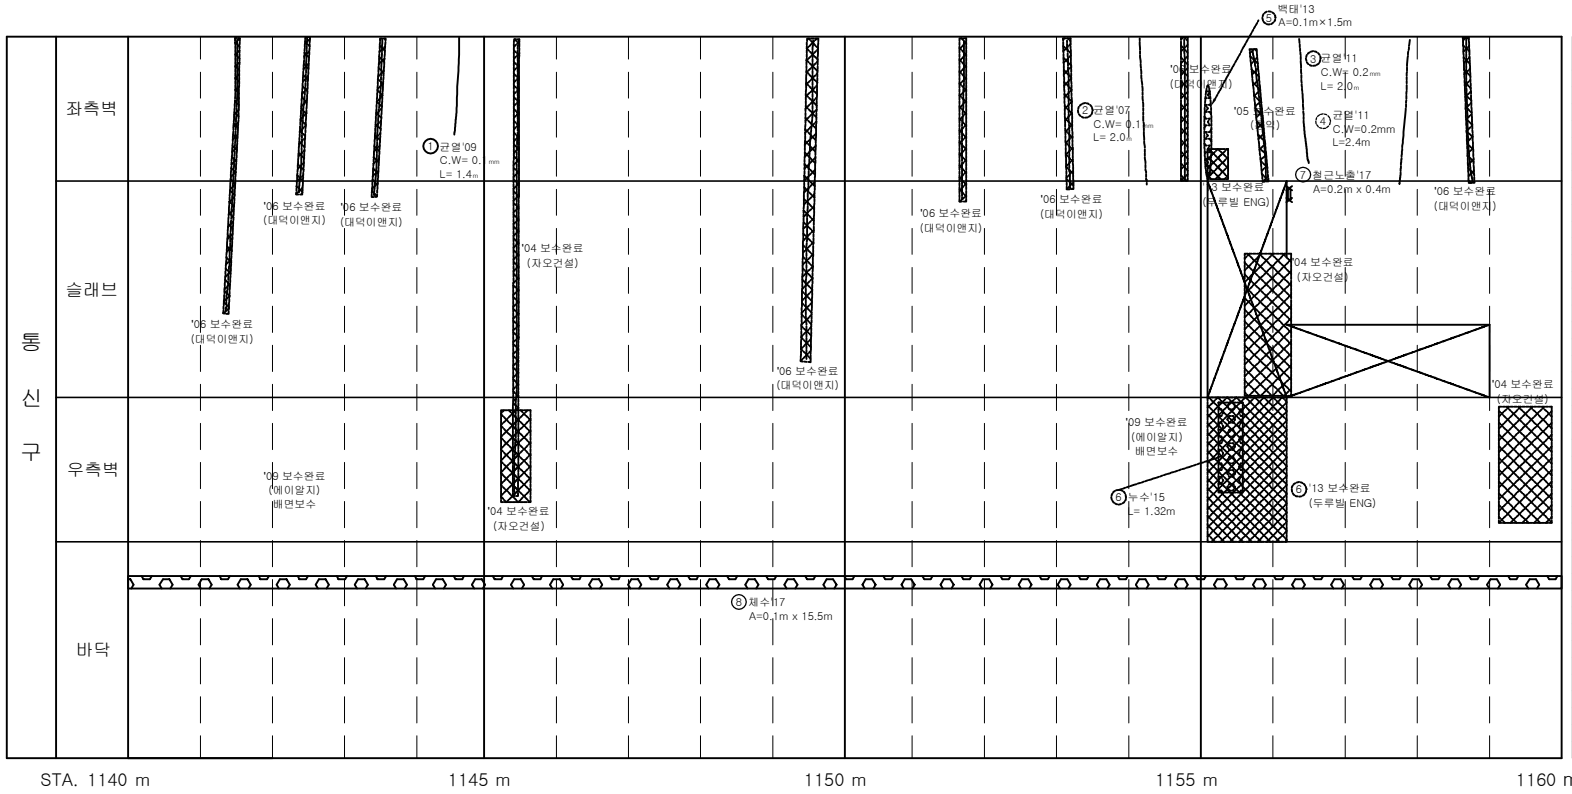

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	물량	비고
1	2009	균열	0.10	1.40		1.40	m	1				
2	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
3	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
4	2009	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
5	2013	백태	0.10	1.50		0.15	㎡	1				
6	2015	누수		1.32		1.32	m	1				
7	2017	철근노출	0.20	0.40		0.08	㎡	1				중요
8	2017	체수	0.10	15.50		1.55	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1160.0 m ~ 1180.0m) 통신구 구간



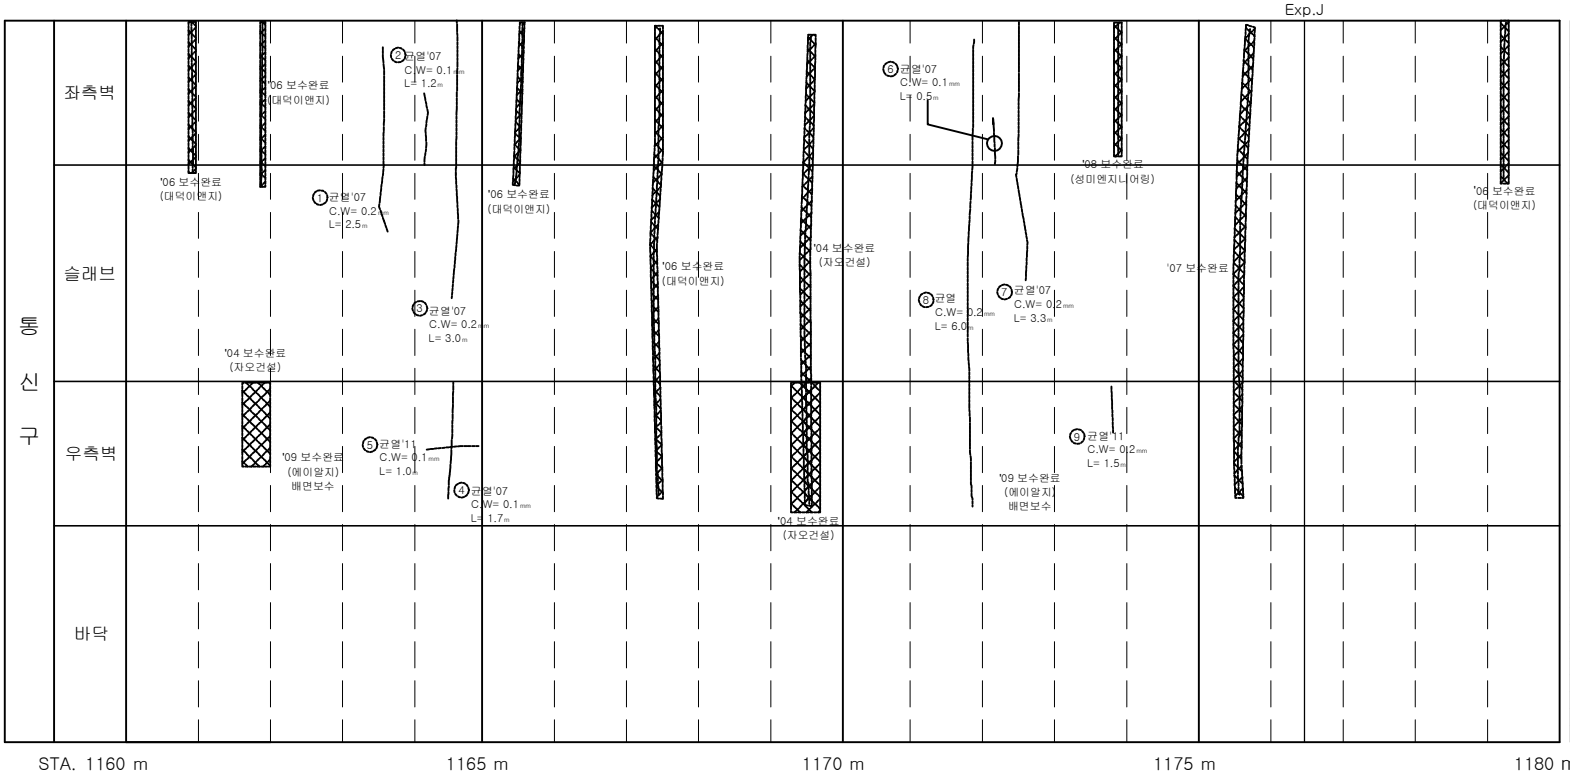

손 상 물 량 표

연번	균열년도	균열내용	균열규모					최종보수내역			
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량
1	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1			
2	2007	균열	0.10	1.20		1.20	m	1			
3	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1			
4	2007	균열	0.10	1.70		1.70	m	1			
5	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1			
6	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1			
7	2007	균열	0.20	3.30		3.30	m	1			
8	2007	균열	0.20	6.00		6.00	m	1			
9	2011	균열	0.20	1.50		1.50	m	1			

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1180.0 m ~ 1200.0m) 통신구 구간



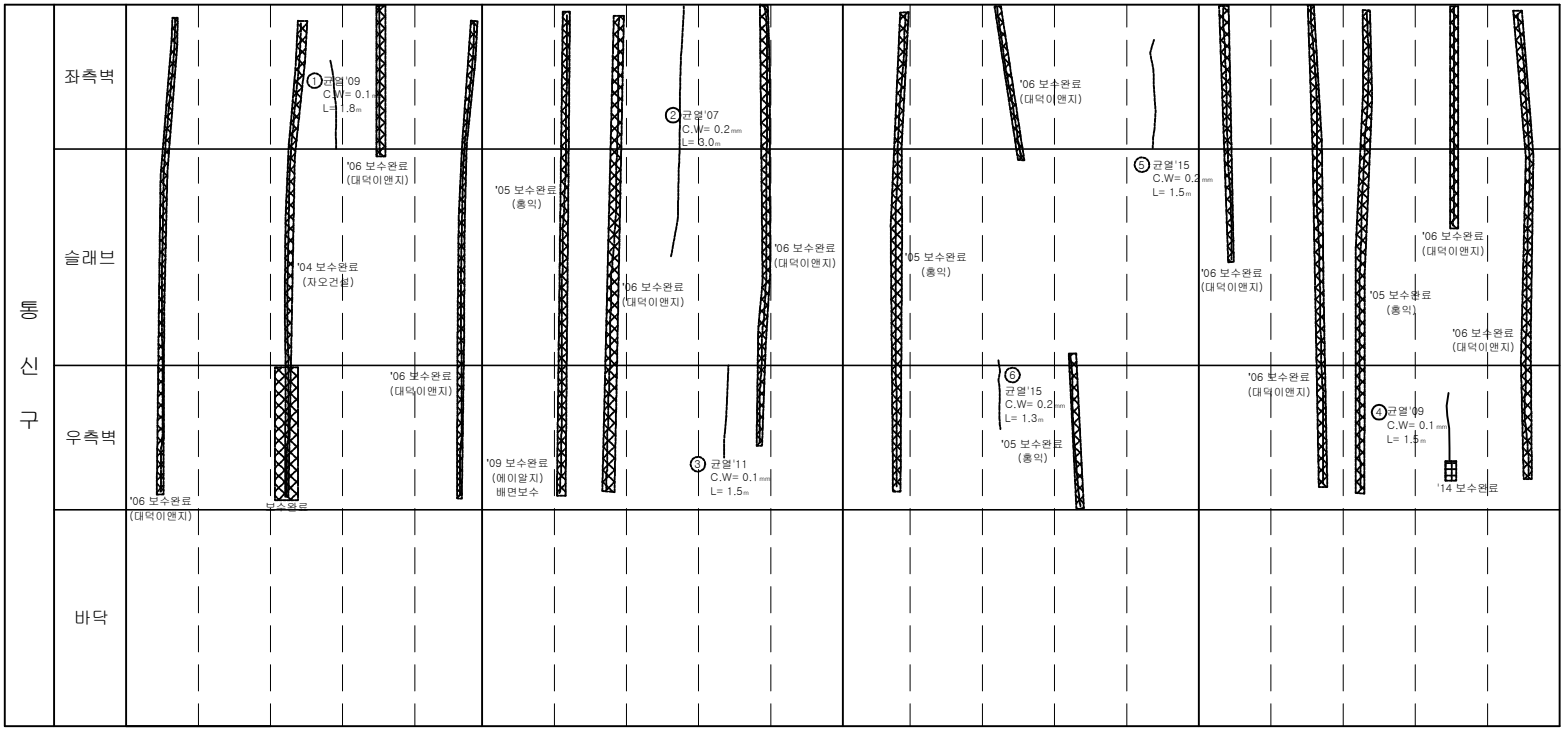

손 상 물 량 표

연번	균열년도	균열내용	균열규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	균열	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	균열	
1	2011	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
2	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
3	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
4	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
5	2015	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
6	2015	균열	0.20	1.30		1.30	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1200.0 m ~ 1220.0m) 통신구 구간



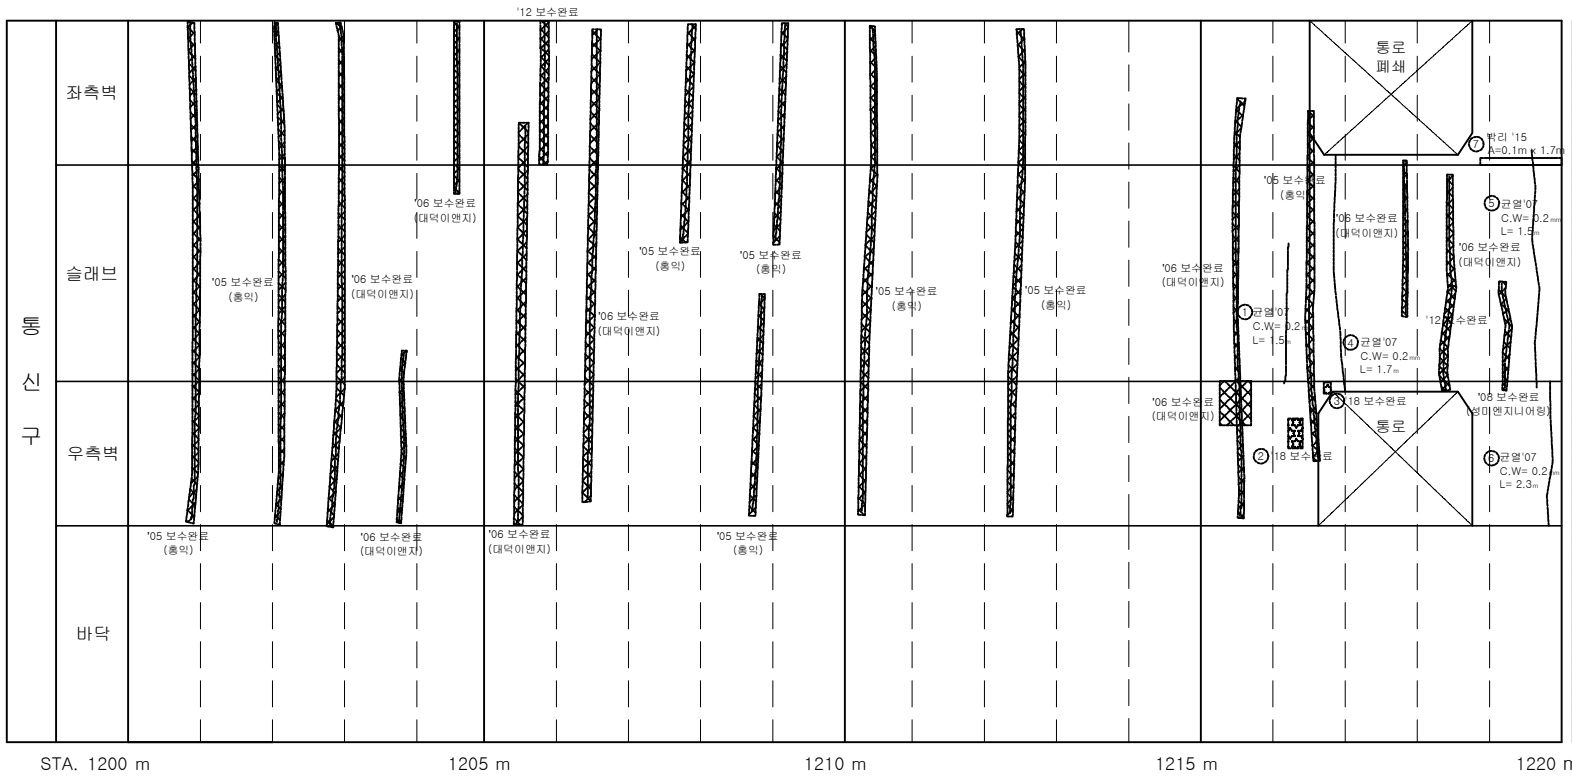

손 상 물 량 표

연번	점검년도	점검내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
2	2011	박대	0.10	0.40		0.04	㎡	1	2018	표면처리공법	0.05	
3	2011	박대	0.10	0.05		0.05	㎡	1	2018	표면처리공법	0.06	
4	2007	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
5	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
7	2015	박리	0.10	1.70		0.17	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락공동구 - 송이로(STA.1218m)환기구 37번

KEYPLAN



SECTION



BOX A

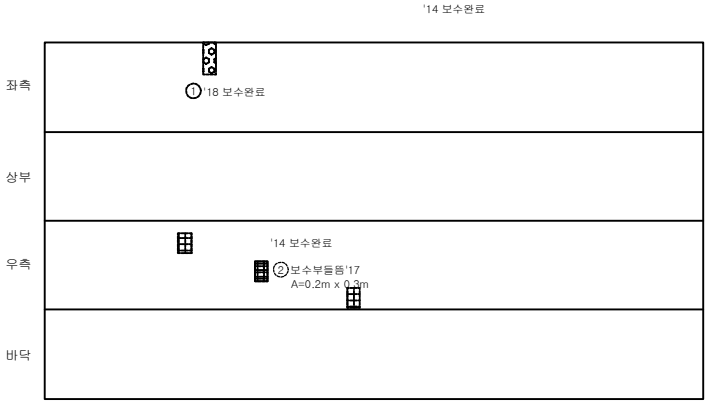

BOX B

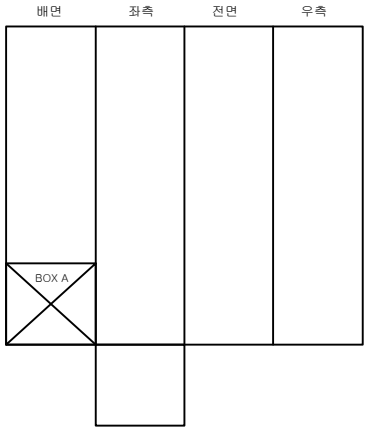

손 상 물 량 표

연번	최종년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2011	박태	0.10	0.60		0.06	㎡	1	2018	표면처리공법	0.07	
2	2017	보수부들뜸	0.20	0.30		0.06	㎡	1	2018	단면복구공법	0.07	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 환기구 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1220.0 m ~ 1240.0m) 통신구 구간



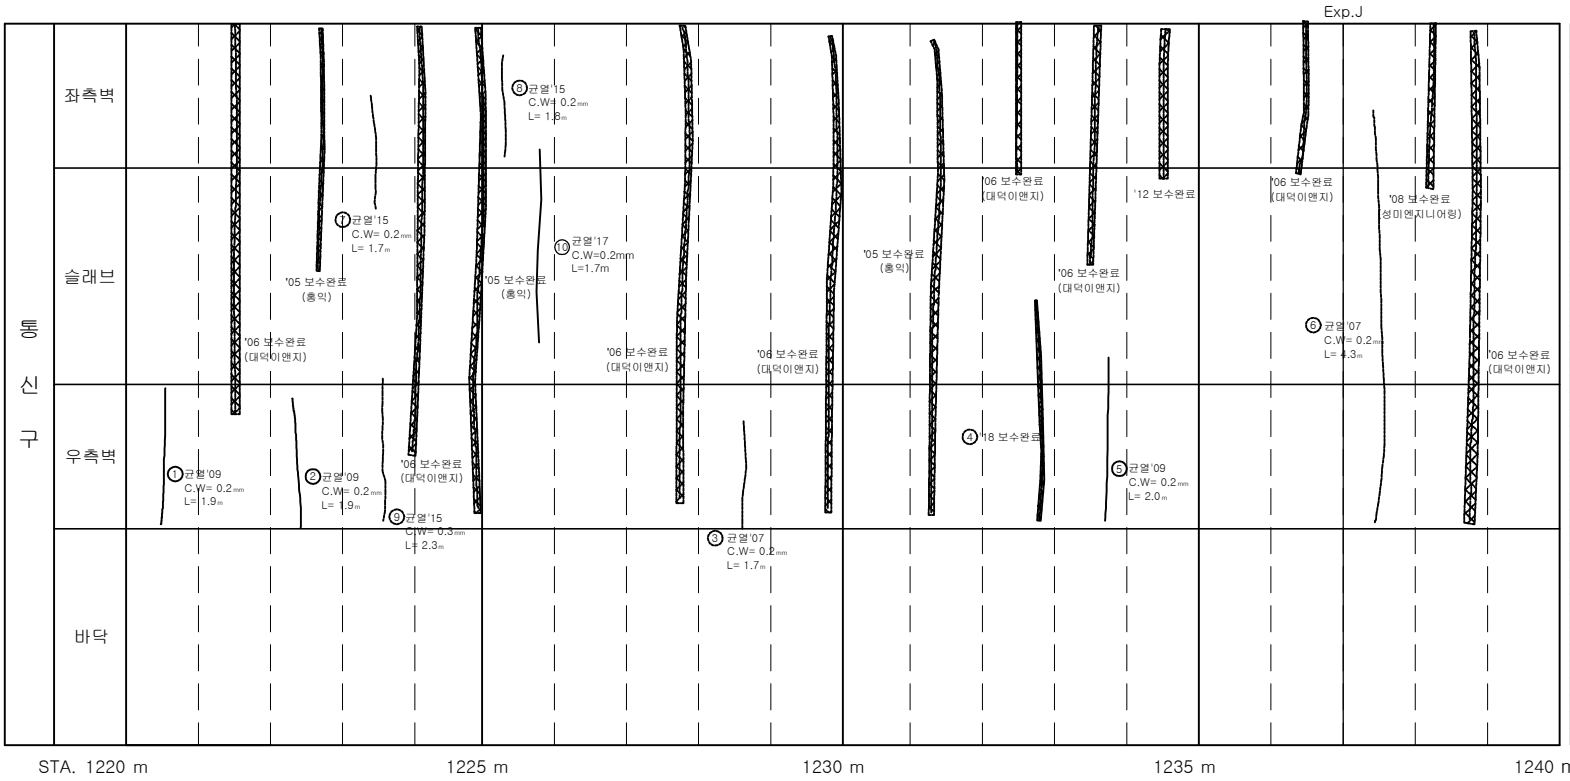

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	비고
1	2009	균열	0.20	1.90		1.90	m	1				
2	2009	균열	0.20	1.90		1.90	m	1				
3	2007	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
4	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1	2018	표면처리공법	3.60	
5	2009	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
6	2007	균열	0.20	4.30		4.30	m	1				
7	2015	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
8	2015	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
9	2015	균열	0.30	2.30		2.30	m	1				중요
10	2017	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1240.0 m ~ 1260.0m) 통신구 구간



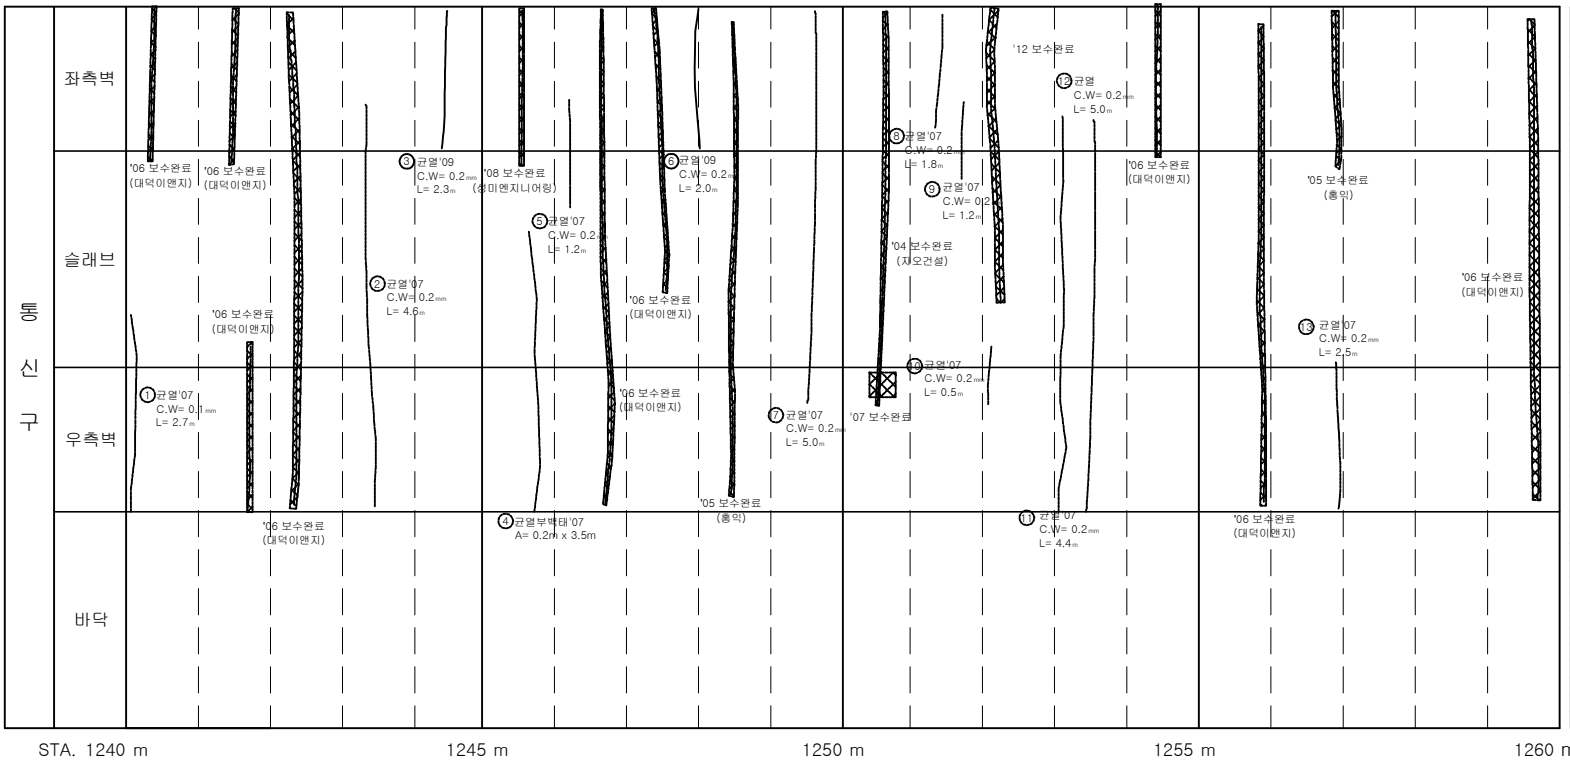

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	갯수	총량	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.20	2.70		2.70	m	1				
2	2007	균열	0.20	4.60		4.60	m	1				
3	2009	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
4	2007	균열부박태	0.20	3.50		0.70	㎡	1				
5	2007	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
6	2009	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
7	2007	균열	0.20	5.00		5.00	m	1				
8	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
9	2007	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
10	2007	균열	0.20	0.50		0.50	m	1				
11	2007	균열	0.20	4.40		4.40	m	1				
12	2007	균열	0.20	5.00		5.00	m	1				
13	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1260.0 m ~ 1280.0m) 통신구 구간



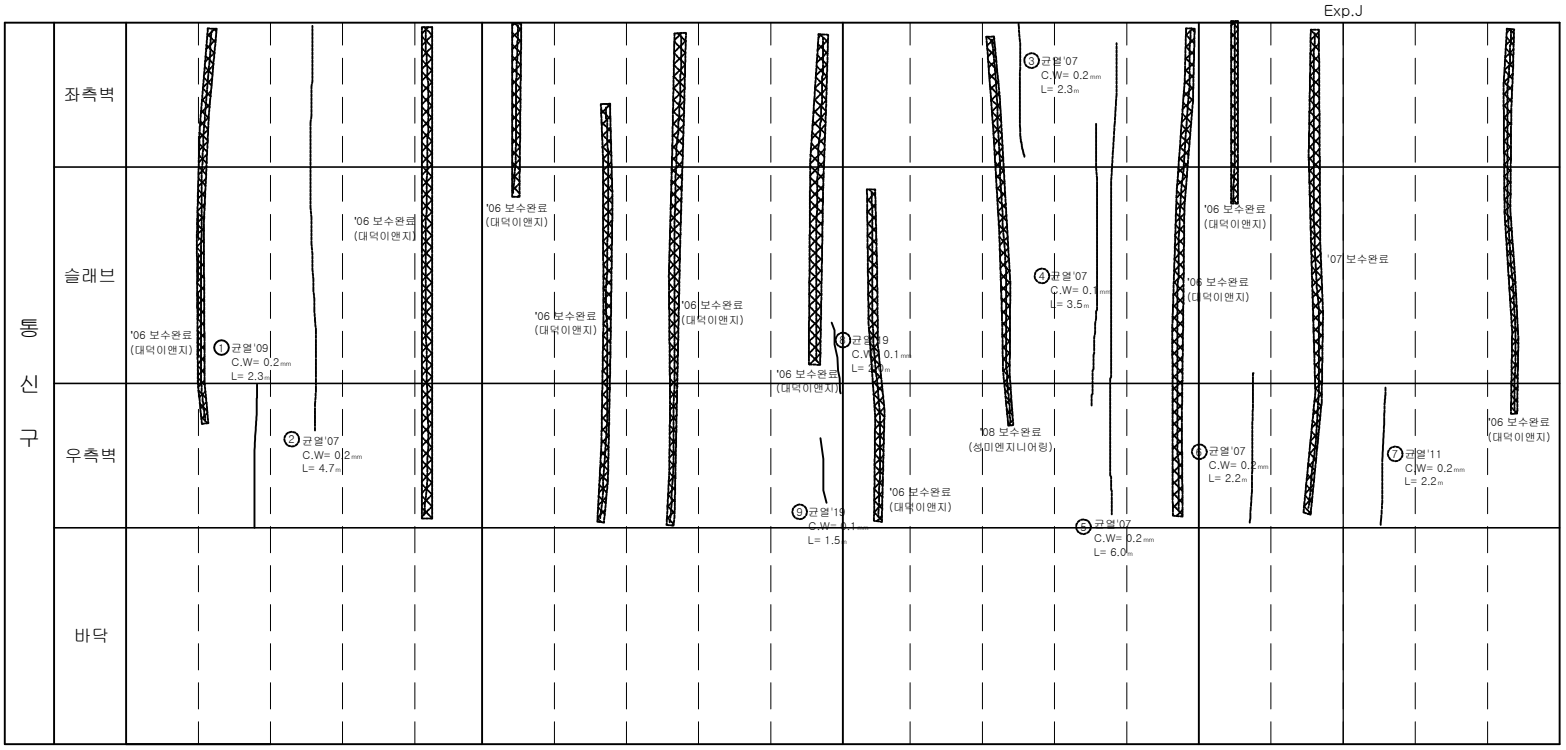

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2009	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
2	2007	균열	0.20	4.70		4.70	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
4	2007	균열	0.10	3.50		3.50	m	1				
5	2007	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
7	2011	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
8	2019	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				신규
9	2019	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1280.0 m ~ 1300.0m) 통신구 구간





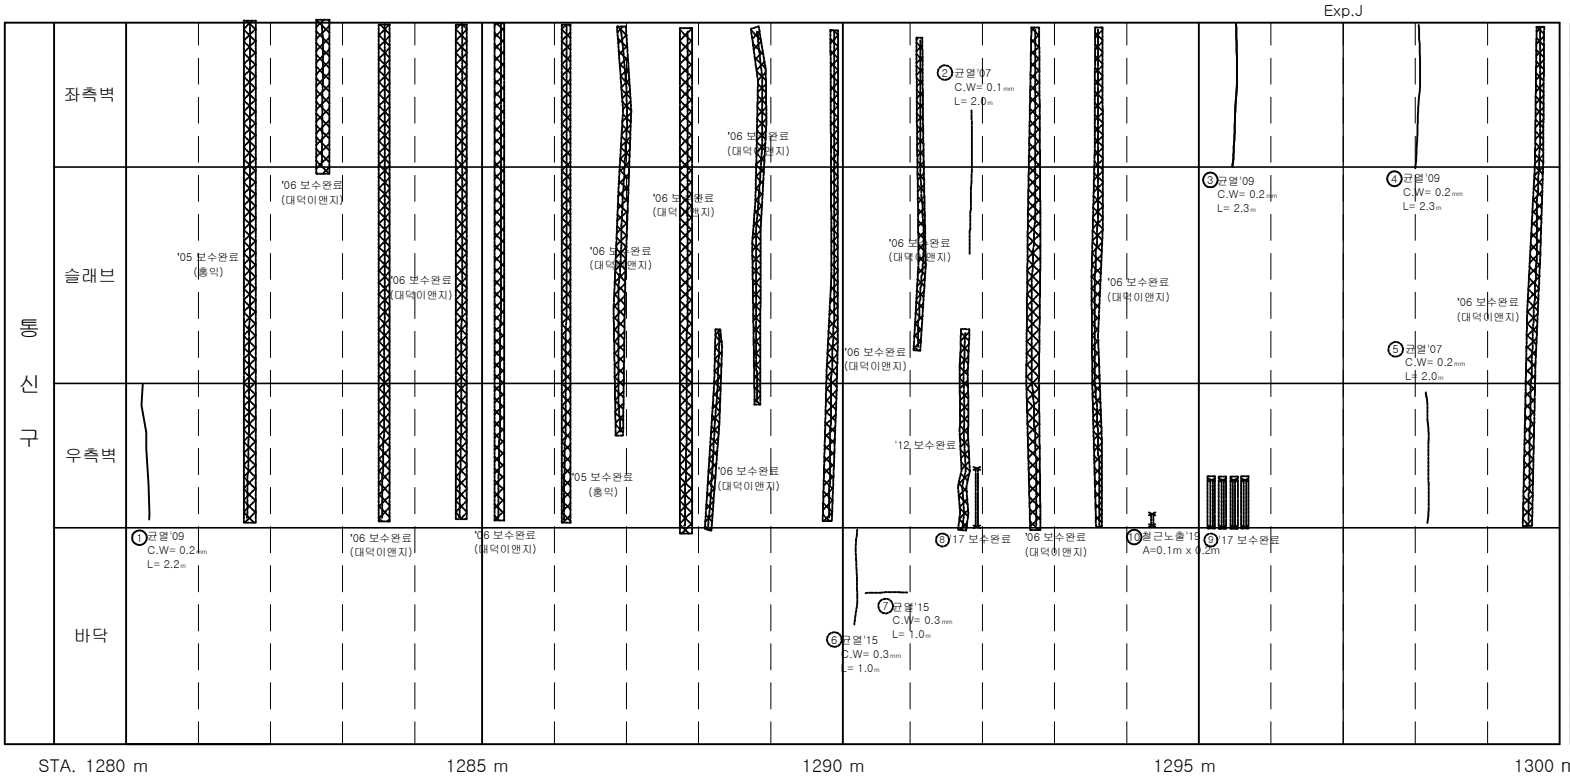

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	길이	총량	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2009	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
2	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
3	2009	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
4	2009	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
6	2015	균열	0.30	1.00		1.00	m	1				중요
7	2015	균열	0.30	1.00		1.00	m	1				중요
8	2015	철근노출	0.10	1.50		0.15	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.18	
9	2015	철근노출	0.10	1.30		0.52	㎡	4	2017	단면복구(방청)	0.62	
10	2019	철근노출	0.10	0.20		0.02	㎡	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1300.0 m ~ 1320.0m) 통신구 구간



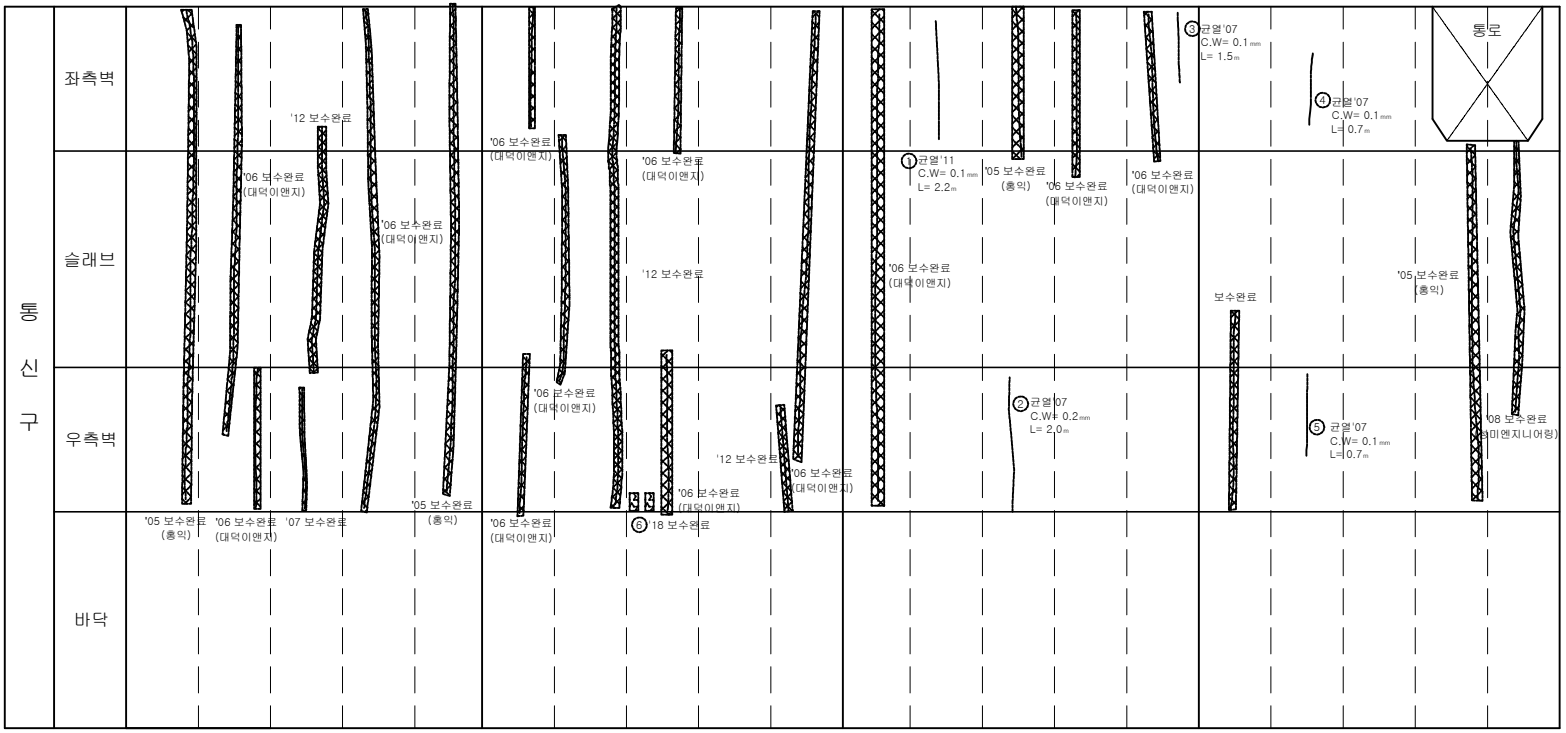

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			
			폭	길이	깊이	결함	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	비고
1	2011	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
2	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
3	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
4	2007	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
5	2007	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
6	2015	박태	0.10	0.30		0.06	㎡	2	2018	표면처리공법	0.07	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1320.0 m ~ 1340.0m) 통신구 구간



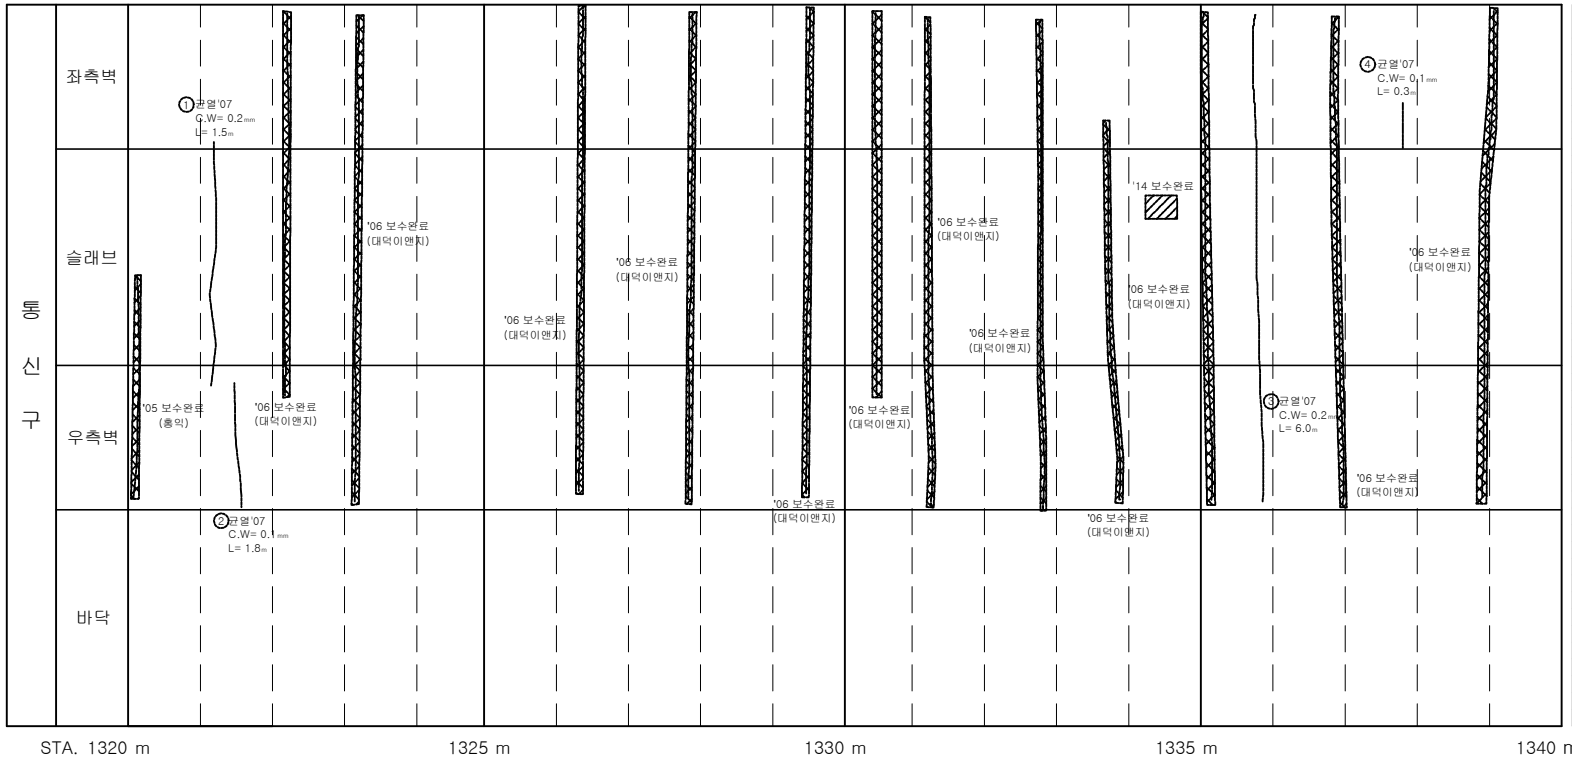

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	틈량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	량	
1	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
2	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
3	2007	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
4	2007	균열	0.10	0.30		0.30	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1340.0 m ~ 1360.0m) 통신구 구간



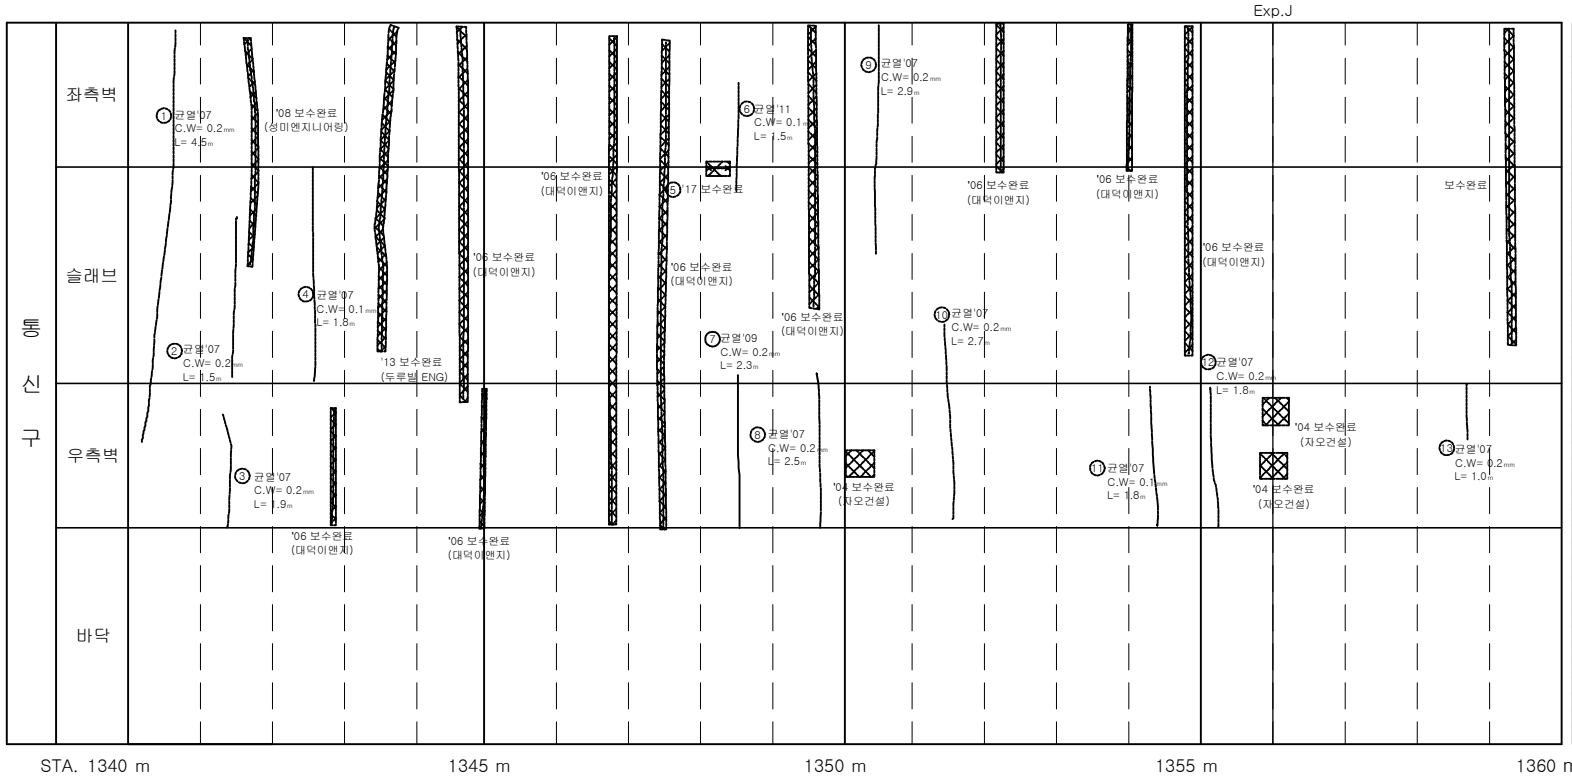

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	비고
1	2007	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
2	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
3	2007	균열	0.20	1.90		1.90	m	1				
4	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
5	2011	철근노출,재료분리	0.10	0.40		0.04	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.05	
6	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
7	2009	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
9	2007	균열	0.20	2.90		2.90	m	1				
10	2007	균열	0.20	2.70		2.70	m	1				
11	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
12	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
13	2011	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1360.0 m ~ 1380.0m) 통신구 구간



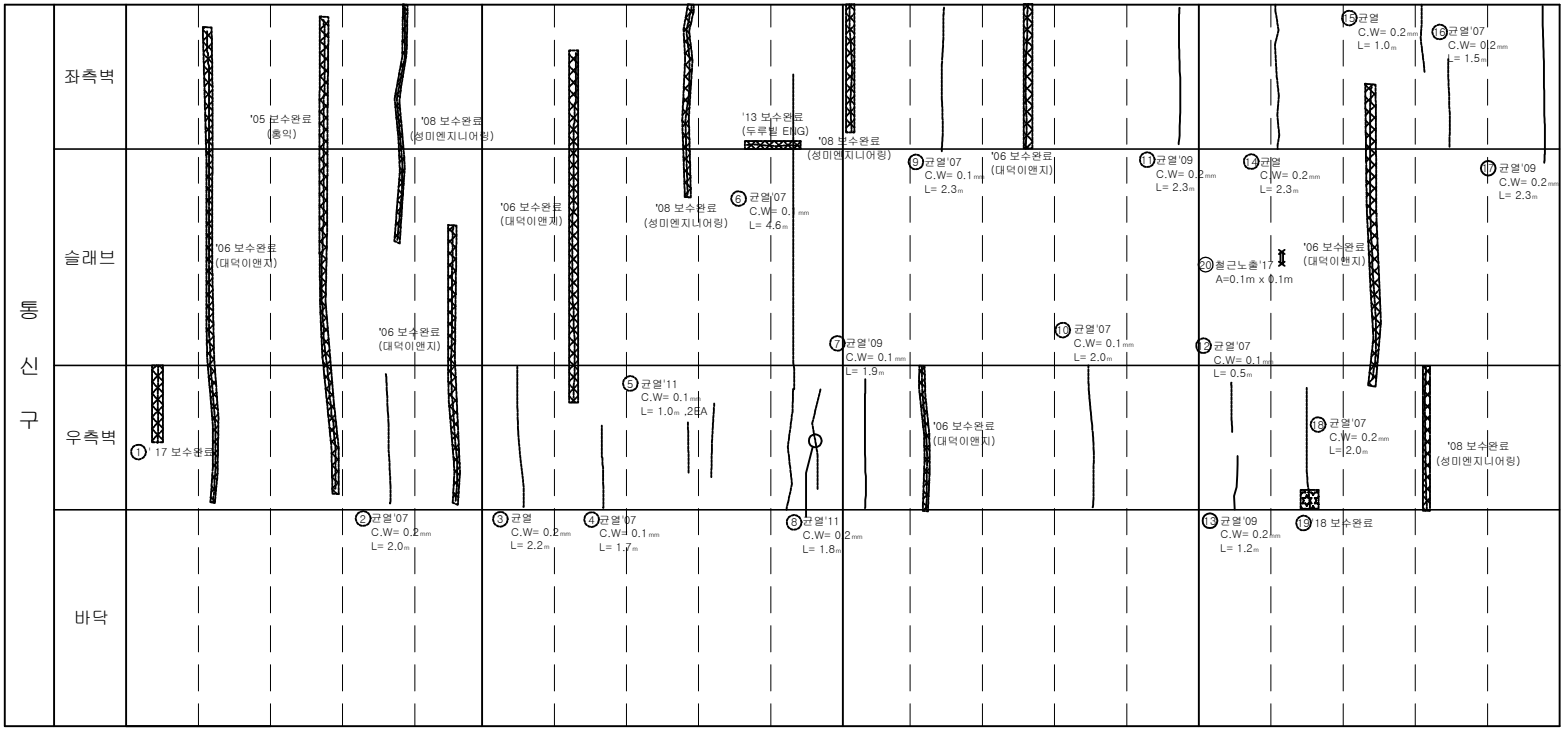

손 상 물 량 표

연번	균열년도	균열내용	균열규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	갯수	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1	2017	표면처리공법	1.20	
2	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
4	2007	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
5	2011	균열	0.10	2.00		4.00	m	2				
6	2007	균열	0.10	4.60		4.60	m	1				
7	2009	균열	0.10	1.90		1.90	m	1				
8	2011	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
9	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
10	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
11	2009	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
12	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
13	2009	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
14	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
15	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
16	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
17	2009	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
18	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
19	2011	백태	0.10	0.30		0.03	㎡	1	2018	표면처리공법	0.04	
20	2017	철근노출	0.10	0.10		0.01	㎡	1				종요

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1380.0 m ~ 1400.0m) 통신구 구간



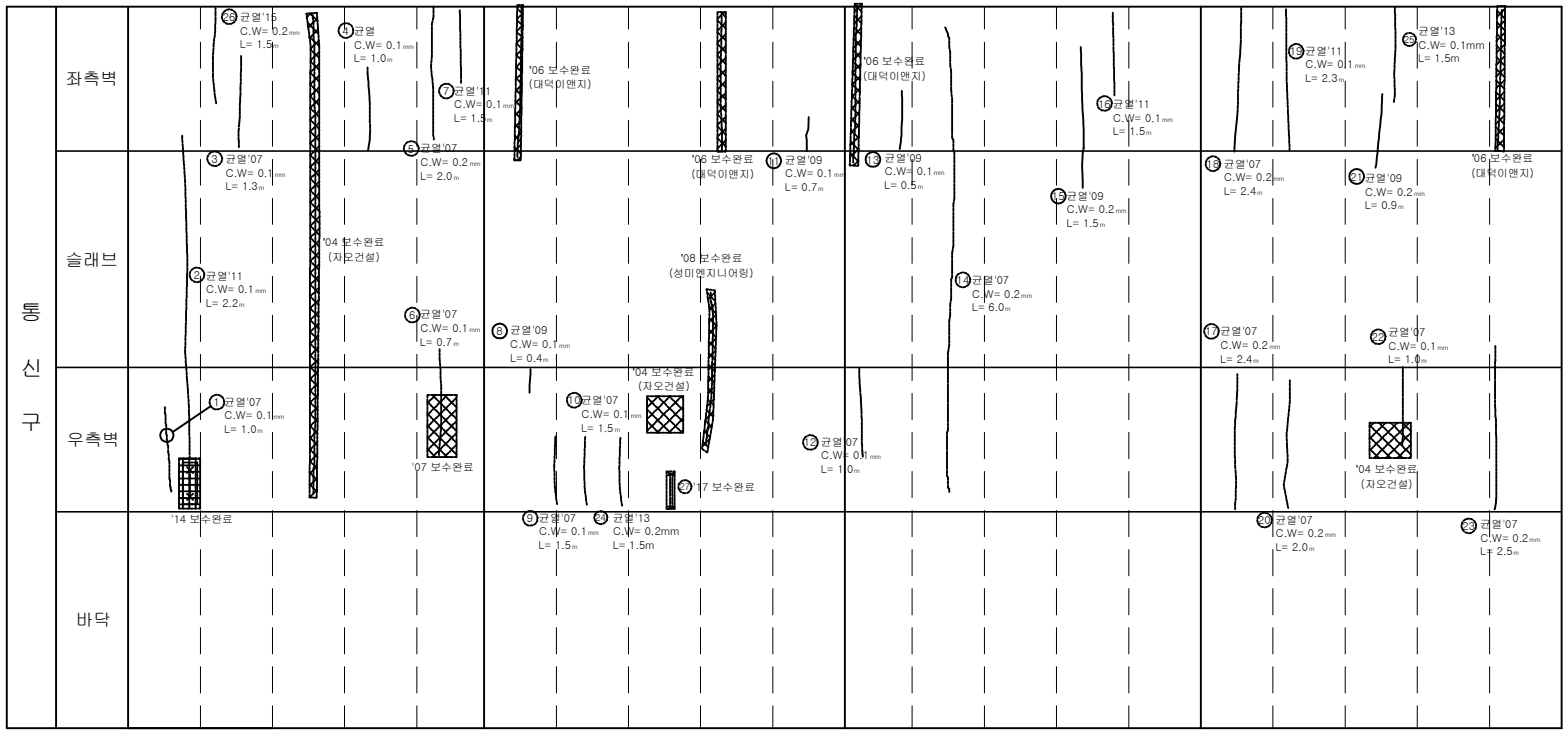

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	물량	비고
1	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
2	2011	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
3	2007	균열	0.10	1.30		1.30	m	1				
4	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
6	2007	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
7	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
8	2009	균열	0.10	0.40		0.40	m	1				
9	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
10	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
11	2009	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
12	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
13	2009	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
14	2007	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
15	2009	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
16	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
17	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
18	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
19	2011	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
20	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
21	2009	균열	0.20	0.90		0.90	m	1				
22	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
23	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
24	2013	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
25	2013	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
26	2015	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
27	2015	철근노출	0.20	1.40		0.28	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.34	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1400.0 m ~ 1420.0m) 통신구 구간



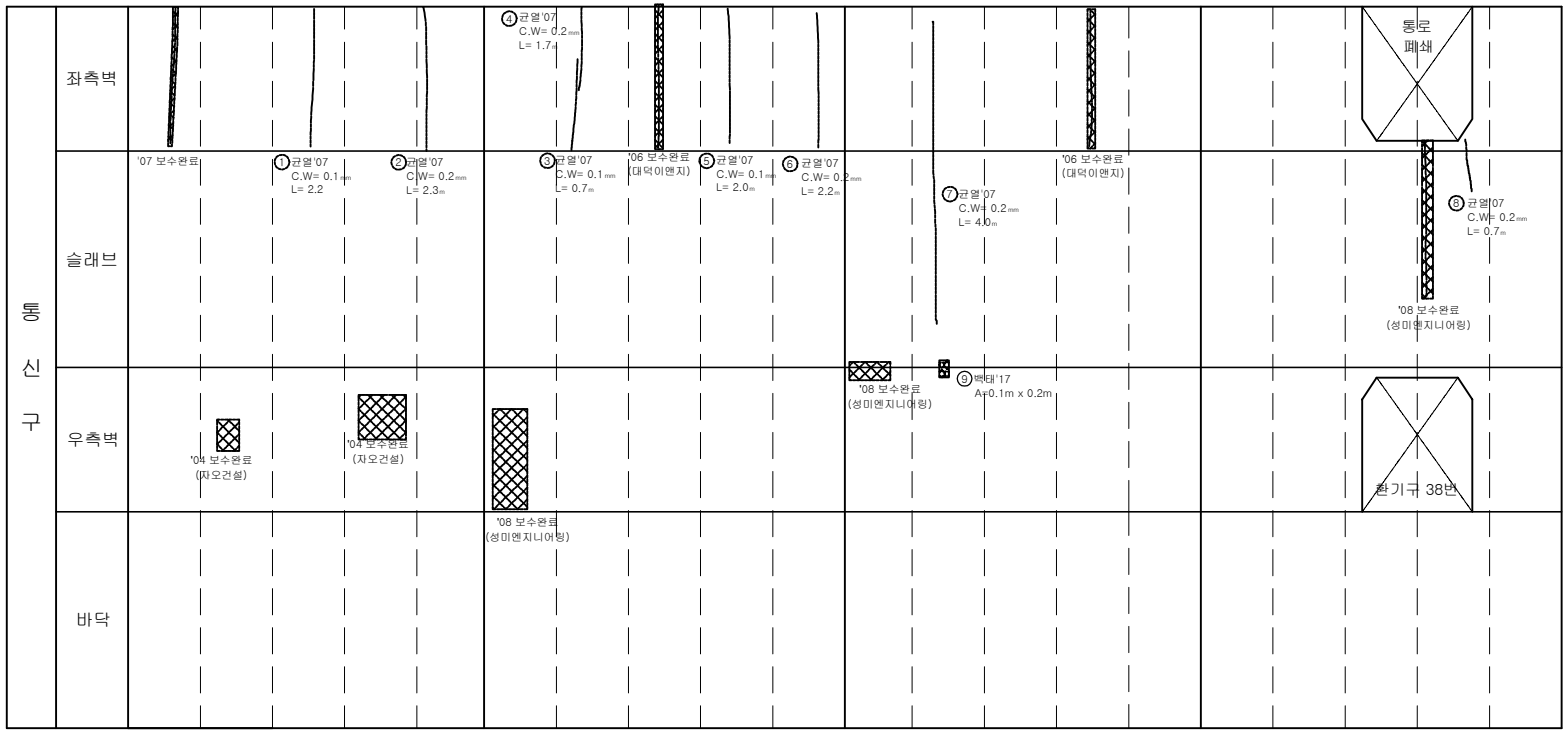

손 상 물 량 표

연번	점검년도	점검내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
2	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
3	2007	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
4	2007	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
5	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
7	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
8	2007	균열	0.20	0.70		0.70	m	1				
9	2017	박태	0.10	0.20		0.02	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락공동구 - 송이로(STA.1418m)환기구 38번

KEYPLAN



SECTION



BOX A

BOX B

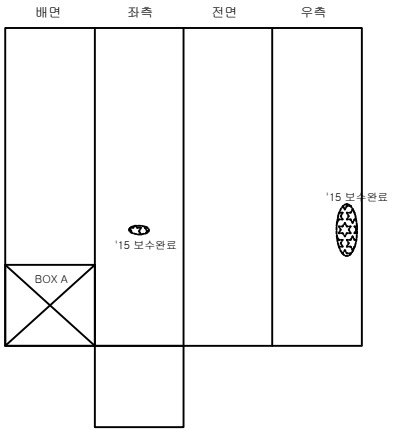

손 상 물 량 표

연번	적용년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	종방	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	종방	

가락 공동구 - 송이로(STA.1420.0 m ~ 1440.0m) 통신구 구간





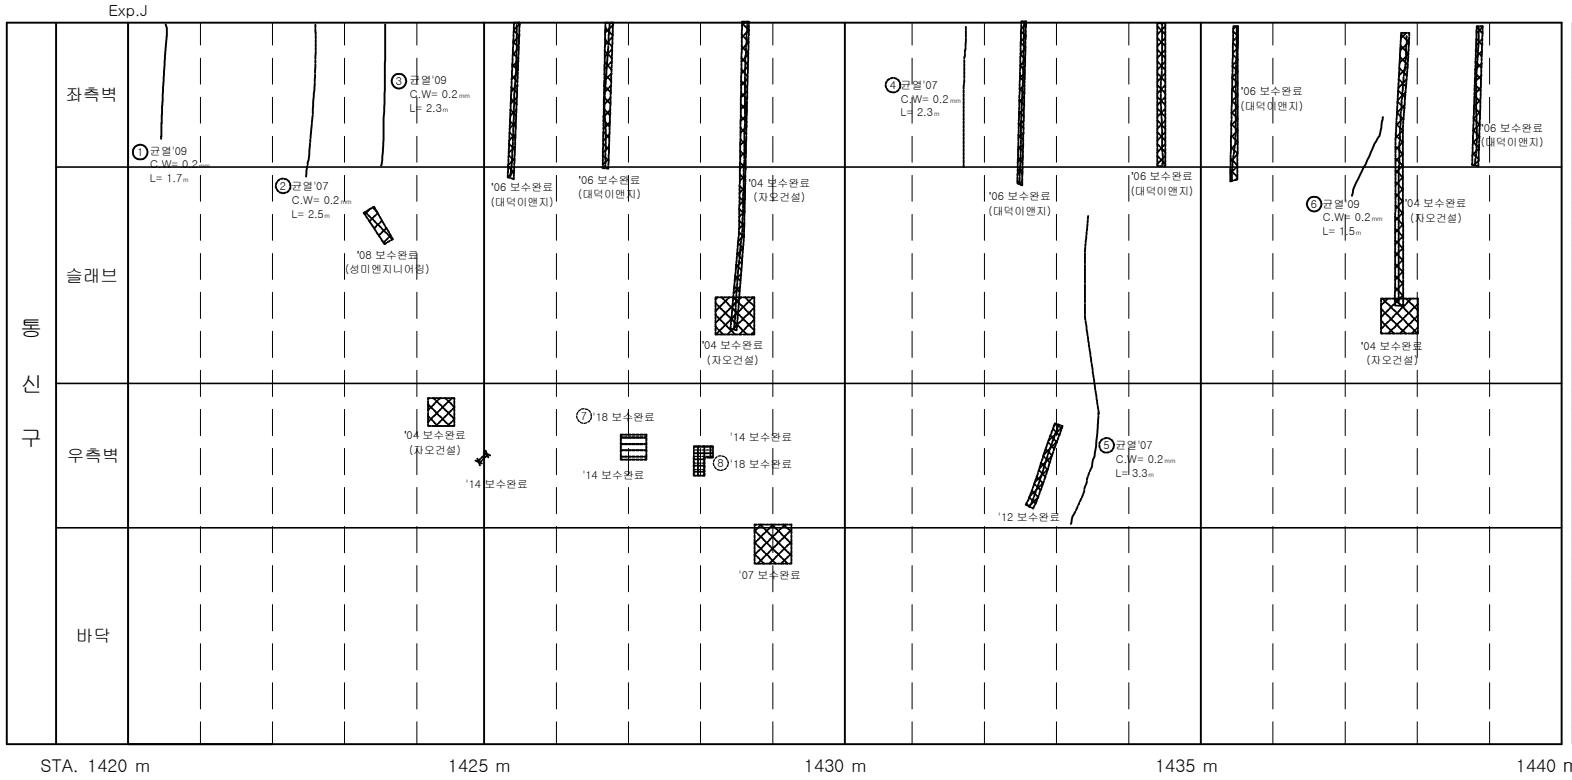

손 상 물 량 표

연번	균열년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	길이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2009	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
2	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
3	2009	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
4	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
5	2007	균열	0.20	3.30		3.30	m	1				
6	2009	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
7	2017	보수부들종	0.50	0.50		0.25	㎡	1	2018	단면복구공법	0.30	
8	2017	보수부들종	0.20	0.40		0.08	㎡	1	2018	단면복구공법	0.10	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1440.0 m ~ 1460.0m) 통신구 구간



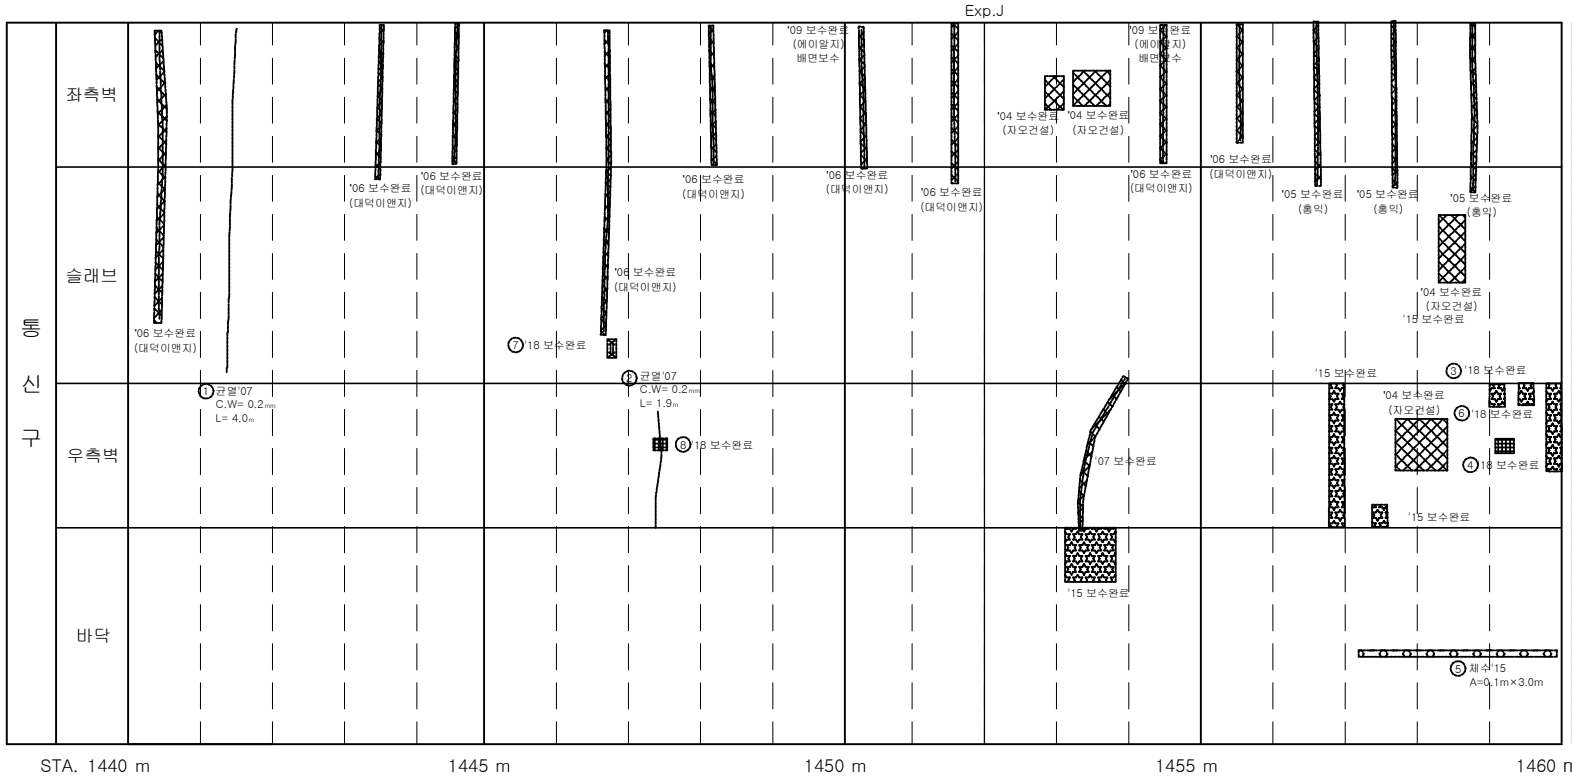

손 상 물 량 표

연번	점검년도	점검내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
2	2007	균열	0.20	1.90		1.90	m	1				
3	2009	박대	0.20	0.30		0.12	㎡	2	2018	표면처리공법	0.14	
4	2009	박대	0.30	1.00		0.30	㎡	1	2018	표면처리공법	0.36	
5	2015	체수	0.10	3.00		0.30	㎡	1				
6	2017	보수부들음	0.40	0.50		0.20	㎡	1	2018	단면복구공법	0.24	
7	2017	철근노출	0.20	0.50		0.10	㎡	1	2018	단면복구(땜질)	0.12	중요
8	2017	들뜸	0.20	0.30		0.06	㎡	1	2018	단면복구공법	0.07	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1460.0 m ~ 1480.0m) 통신구 구간



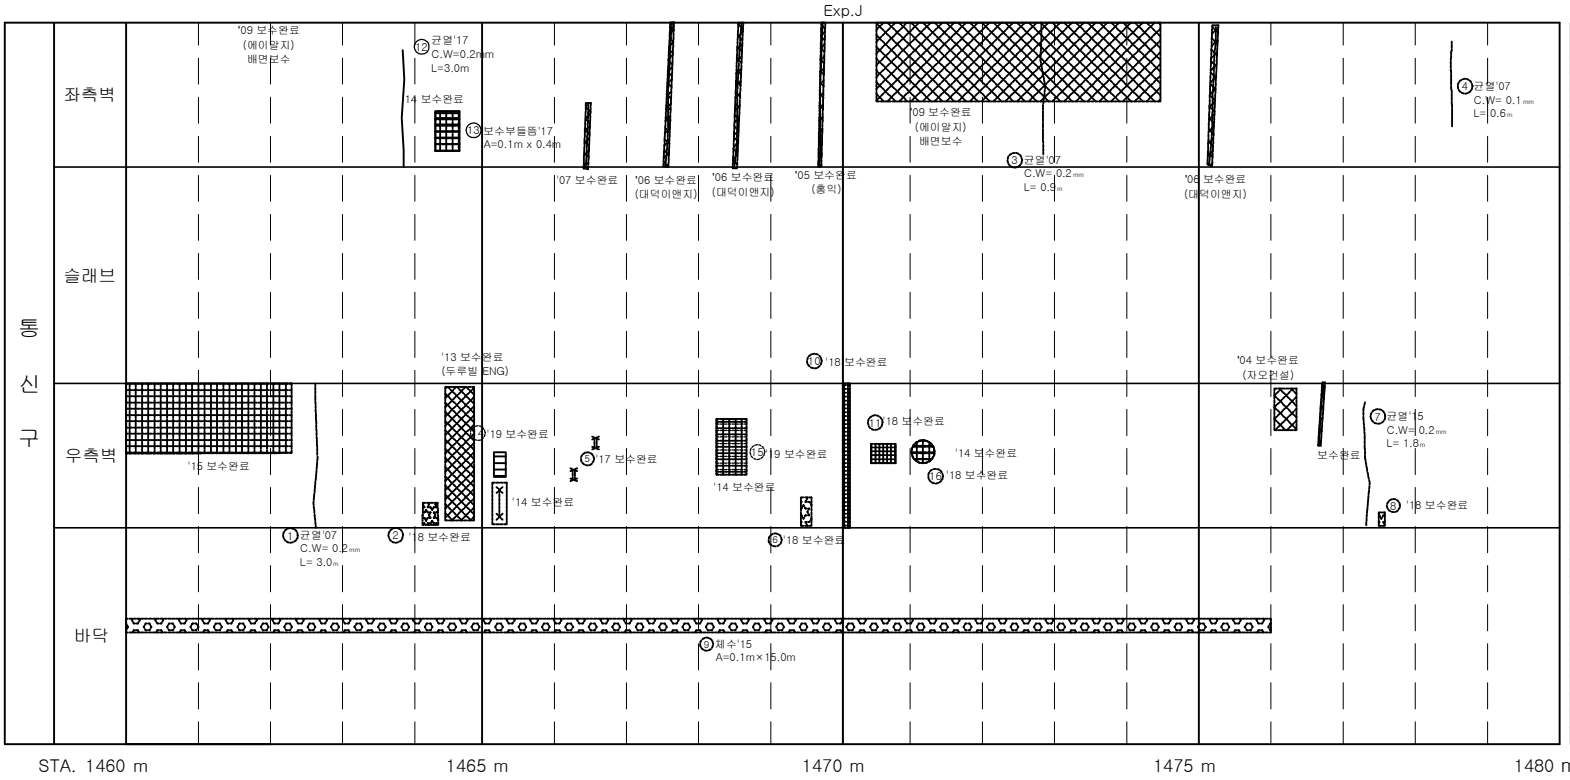

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
2	2009	박대	0.30	0.30		0.09	㎡	1	2018	표면처리공법	0.11	
3	2007	균열	0.20	0.90		0.90	m	1				
4	2007	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
5	2015	철근노출	0.20	0.20		0.08	㎡	2	2017	단면복구(방청)	0.10	
6	2015	박대	0.10	0.60		0.06	㎡	1	2018	표면처리공법	0.07	
7	2015	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
8	2015	박대	0.10	0.30		0.03	㎡	1	2018	표면처리공법	0.04	
9	2015	체수	0.10	15.00		1.50	㎡	1				
10	2017	보수재들뜸,박락	0.20	2.00		0.40	㎡	1	2018	단면복구공법	0.48	
11	2017	보수재박리	0.40	0.60		0.24	㎡	1	2018	단면복구공법	0.29	
12	2017	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
13	2017	보수부들뜸	0.10	0.40		0.04	㎡	1				재결함
14	2017	보수부들뜸	0.20	0.50		0.10	㎡	1	2018	단면복구공법	0.12	
15	2017	보수부들뜸	0.30	1.00		0.30	㎡	1	2018	단면복구공법	0.36	
16	2017	보수부들뜸	0.20	0.30		0.06	㎡	1	2018	단면복구공법	0.07	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1480.0 m ~ 1500.0m) 통신구 구간



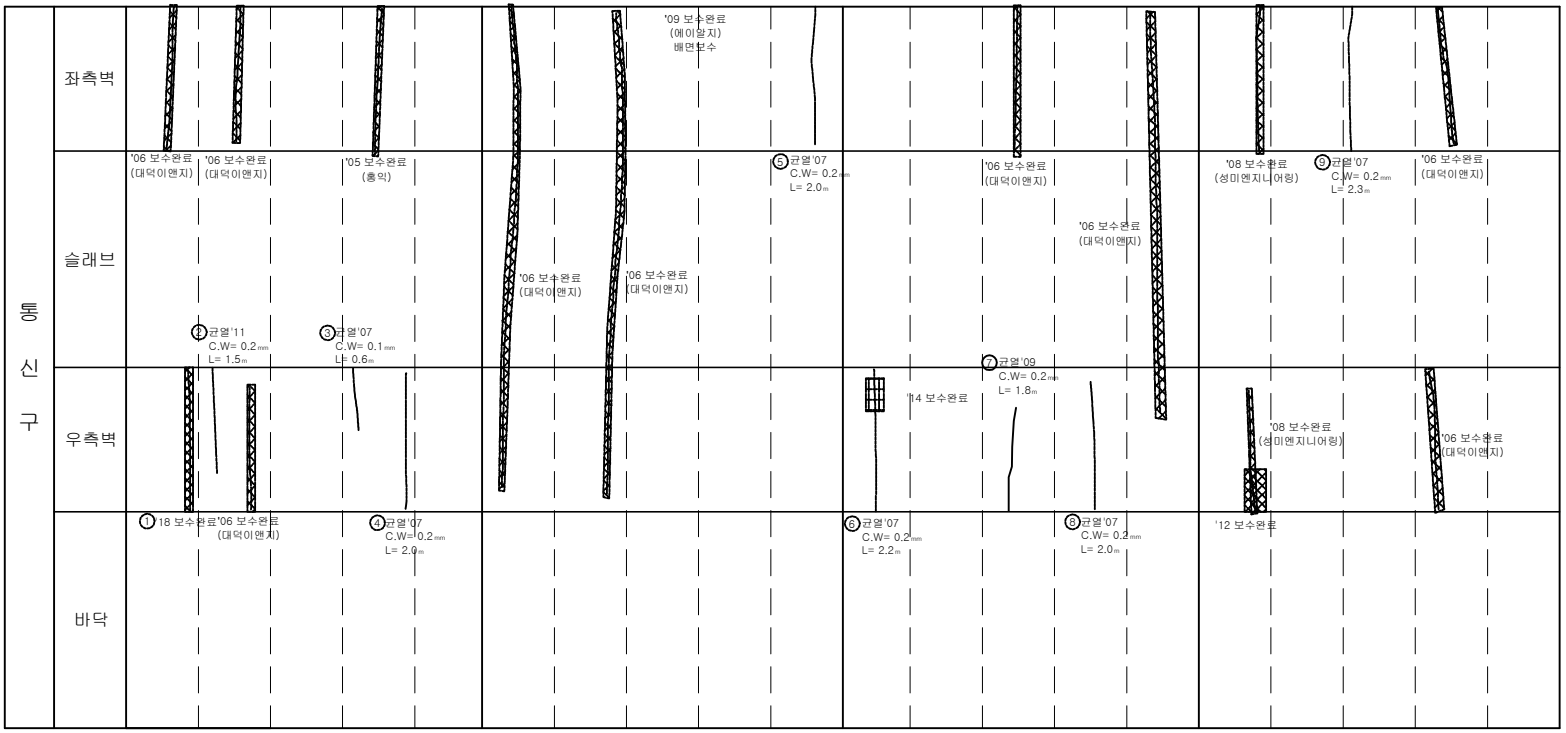

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1	2018	표면처리공법	2.40	
2	2011	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
3	2007	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
4	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
7	2009	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
9	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1500.0 m ~ 1520.0m) 통신구 구간



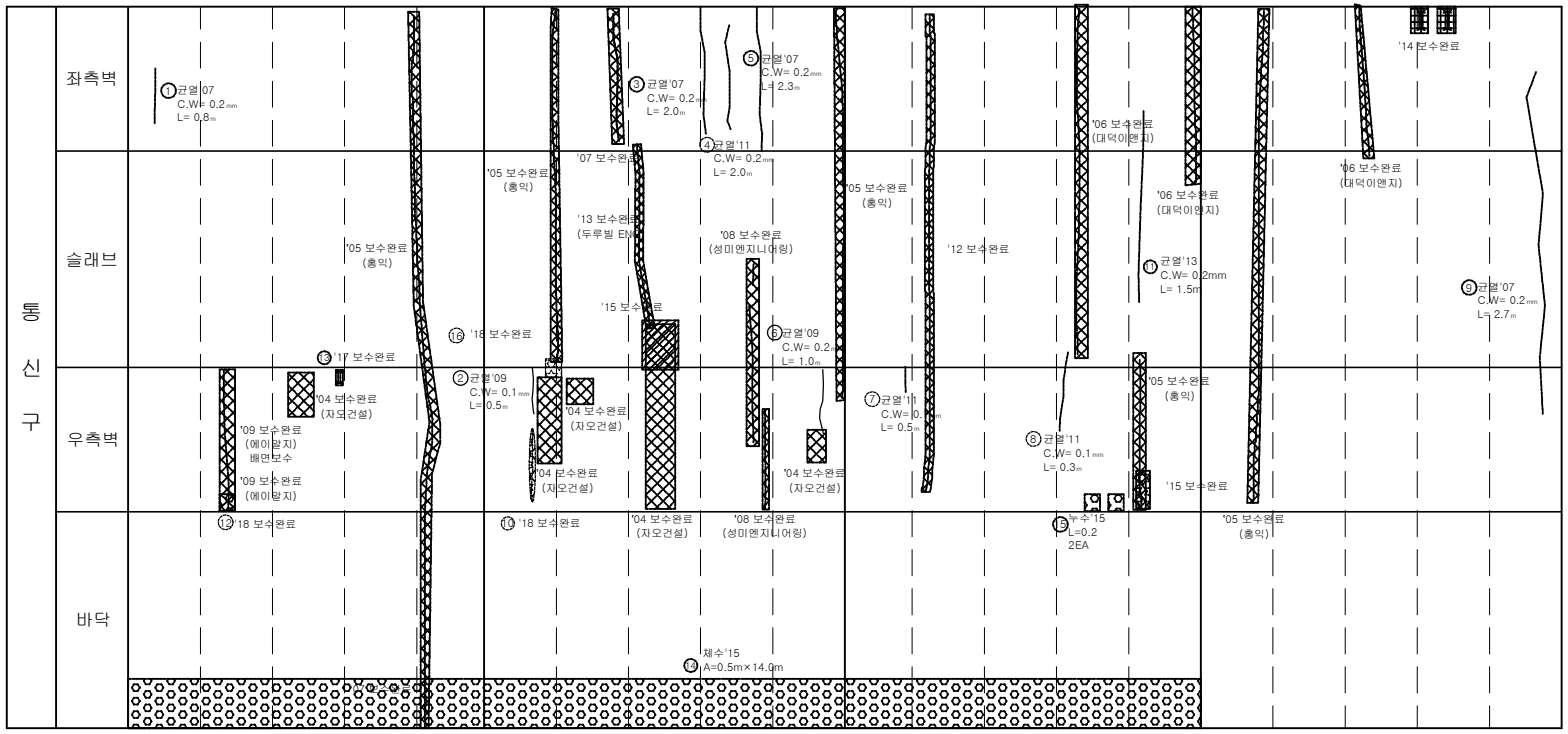

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	균열	0.20	0.80		0.80	m	1				
2	2009	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
4	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
6	2009	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
7	2011	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
8	2011	균열	0.10	0.30		0.30	m	1				
9	2007	균열	0.20	2.70		2.70	m	1				
10	2013	균열부백태	0.10	1.00		0.10	㎡	1	2018	표면처리공법	0.12	
11	2013	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
12	2015	누수,백태	0.20	0.20		0.04	㎡	1	2018	배면누수보수	0.05	
13	2015	철근노출	0.10	0.30		0.03	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.04	
14	2015	체수	0.50	14.00		7.00	㎡	1				
15	2015	누수		0.20		0.40	m	2				
16	2017	백태	0.40	0.80		0.32	㎡	1	2017	표면처리공법	0.38	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1520.0 m ~ 1540.0m) 통신구 구간



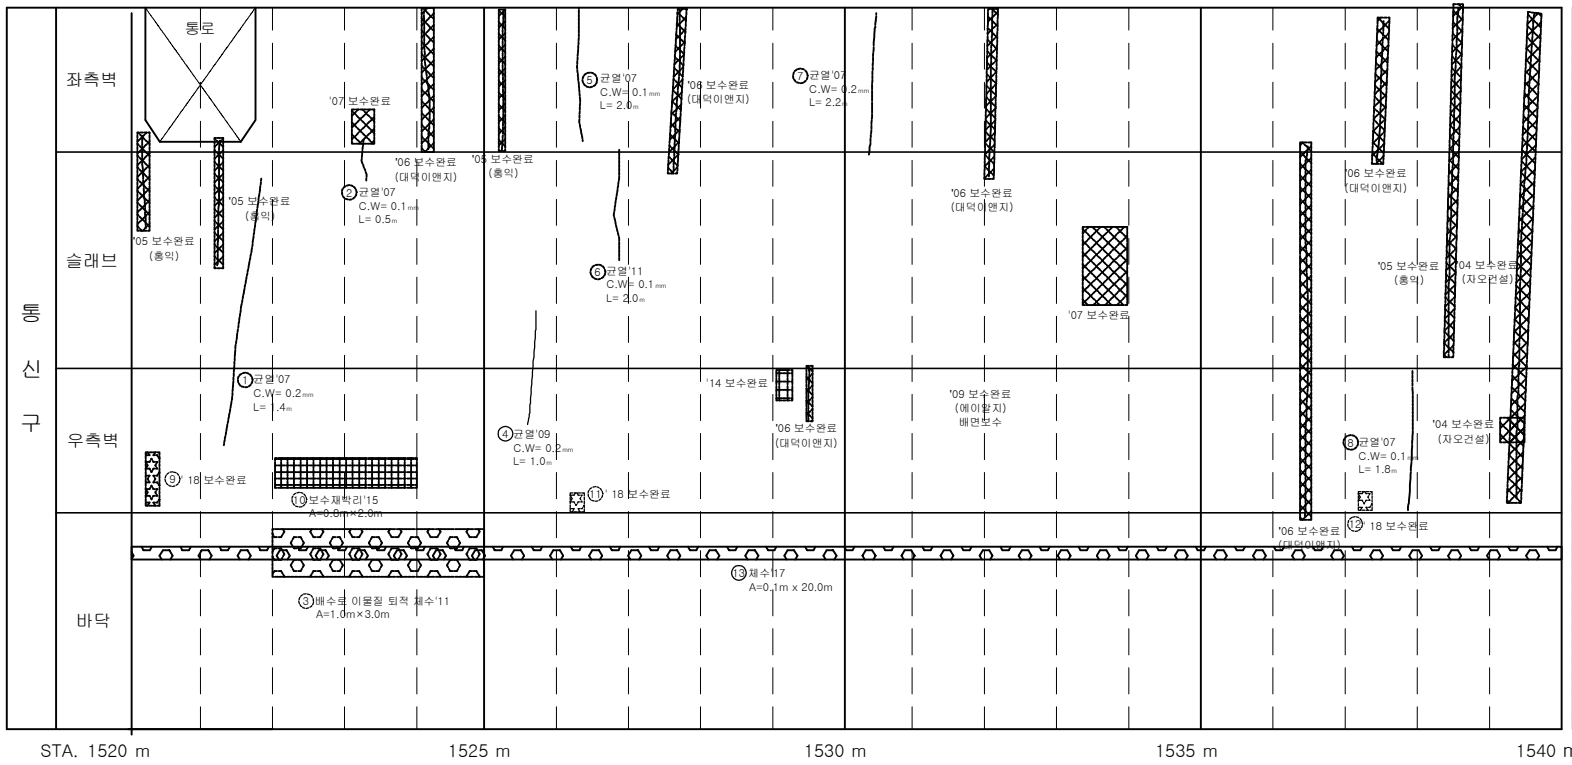

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	균열	0.20	1.40		1.40	m	1				
2	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
3	2011	제수	1.00	3.00		3.00	㎡	1				
4	2009	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
5	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
6	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
7	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
8	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
9	2015	균열부백태	0.10	0.70		0.07	㎡	1	2018	표면처리공법	0.08	
10	2015	보수부박리	0.80	2.00		1.60	㎡	1				재결함
11	2015	보수부백태	0.10	0.30		0.03	㎡	1	2018	표면처리공법	0.04	
12	2015	백태	0.10	0.40		0.04	㎡	1	2018	표면처리공법	0.05	
13	2017	제수	1.00	20.00		20.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1540.0 m ~ 1560.0m) 통신구 구간





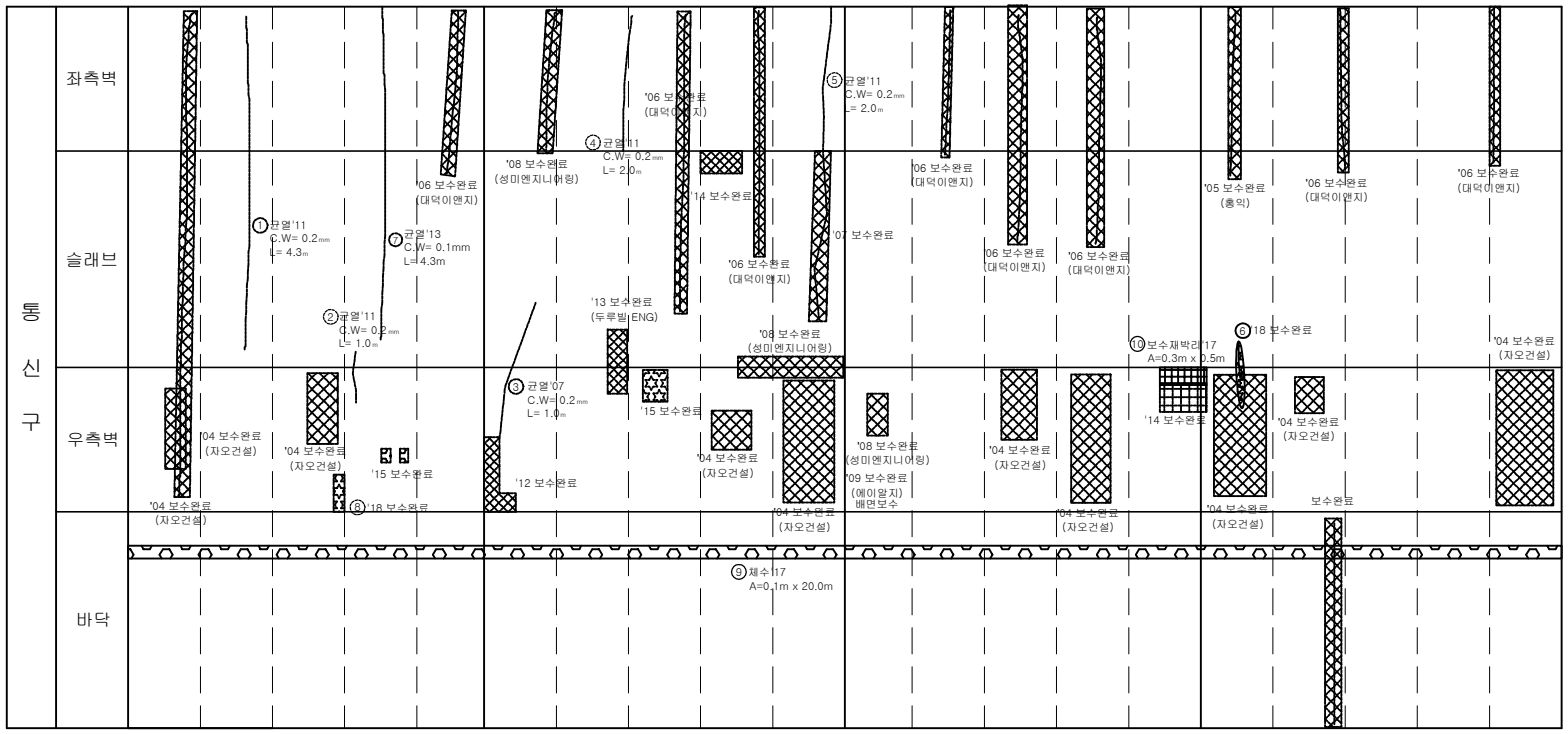

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2011	균열	0.20	4.30		4.30	m	1				
2	2011	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
3	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
4	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
5	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
6	2007	균열부백태	0.20	1.00		0.20	㎡	1	2018	표면처리공법	0.24	
7	2013	균열	0.10	4.30		4.30	m	1				
8	2015	백태	0.30	0.80		0.24	㎡	1	2018	표면처리공법	0.29	
9	2017	체수	0.10	20.00		2.00	㎡	1				
10	2017	보수재박리	0.30	0.50		0.15	㎡	1				재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1560.0 m ~ 1580.0m) 통신구 구간





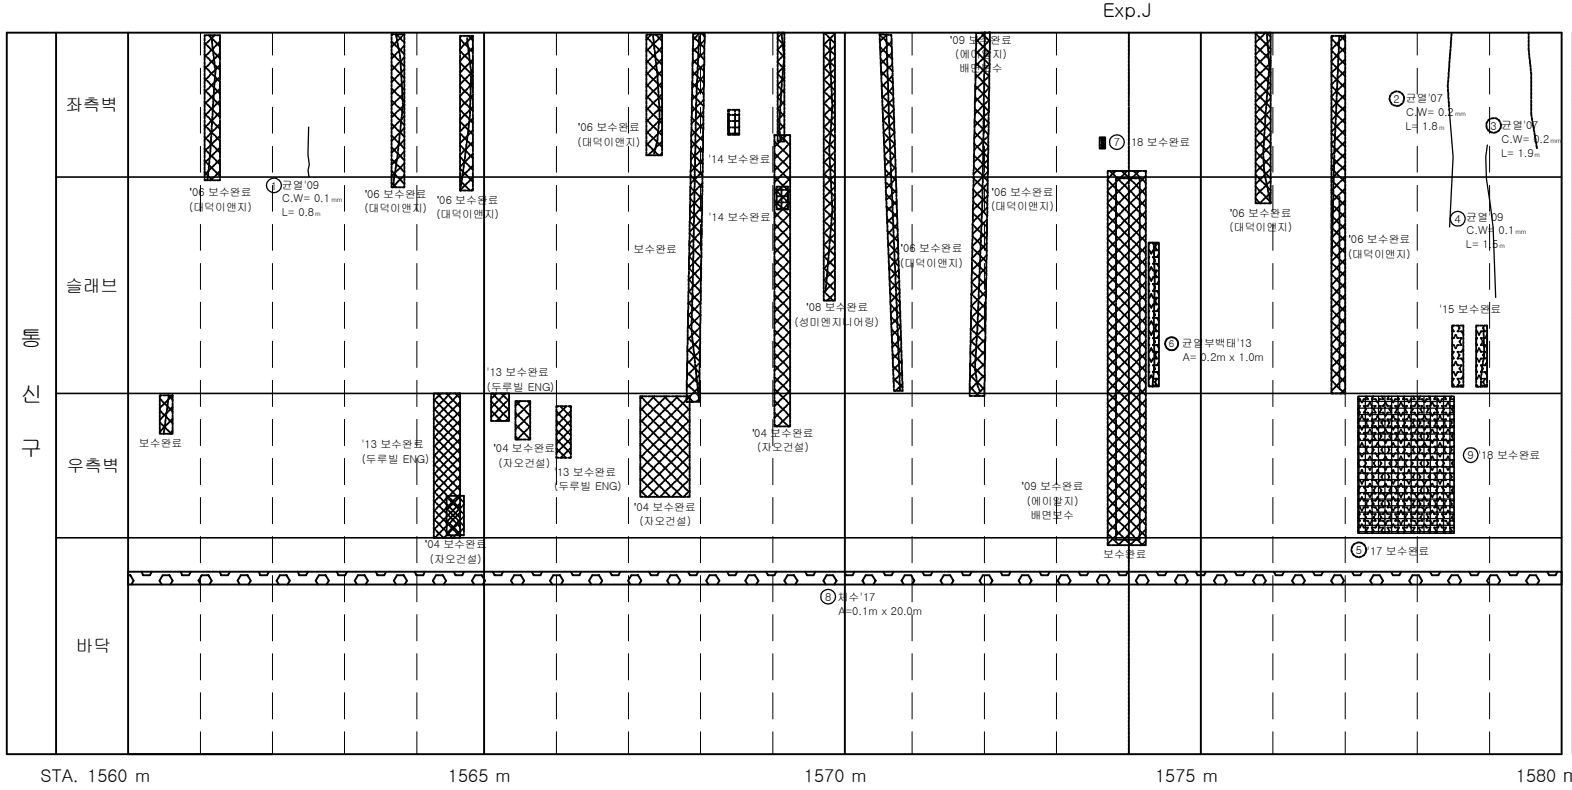

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	비고
1	2009	균열	0.10	0.80		0.80	m	1				
2	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
3	2007	균열	0.20	1.90		1.90	m	1				
4	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
5	2007	백태	1.50	2.00		3.00	㎡	1	2017	표면처리공법	3.60	
6	2013	균열부백태	0.20	1.00		0.20	㎡	1				
7	2017	철근노출	0.10	0.10		0.01	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.01	중요
8	2017	채수	0.10	20.00		2.00	㎡	1				
9	2017	보수재박리	1.50	2.00		3.00	㎡	1	2018	단면복구공법	3.60	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1580.0 m ~ 1600.0m) 통신구 구간





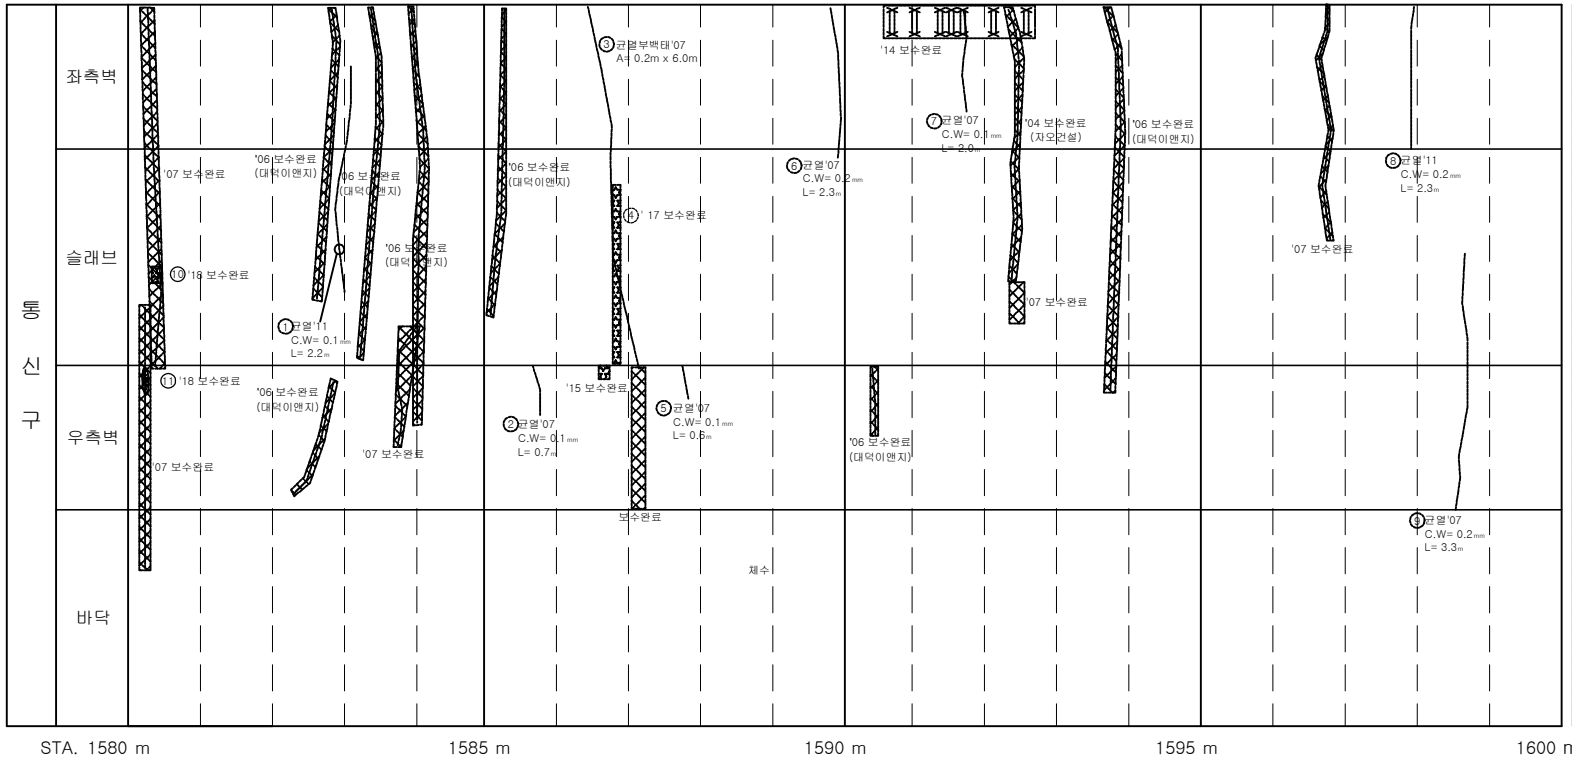

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2011	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
2	2007	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
3	2007	균열부백태	0.20	6.00		1.20	㎡	1				
4	2009	백태	0.10	1.50		0.15	㎡	1	2017	표면처리공법	0.18	
5	2007	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
7	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
8	2011	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
9	2007	균열	0.20	3.30		3.30	m	1				
10	2017	백태	0.10	0.20		0.02	㎡	1	2018	표면처리공법	0.02	
11	2017	균열부백태	0.10	0.60		0.06	㎡	1	2018	표면처리공법	0.07	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1600.0 m ~ 1620.0m) 통신구 구간



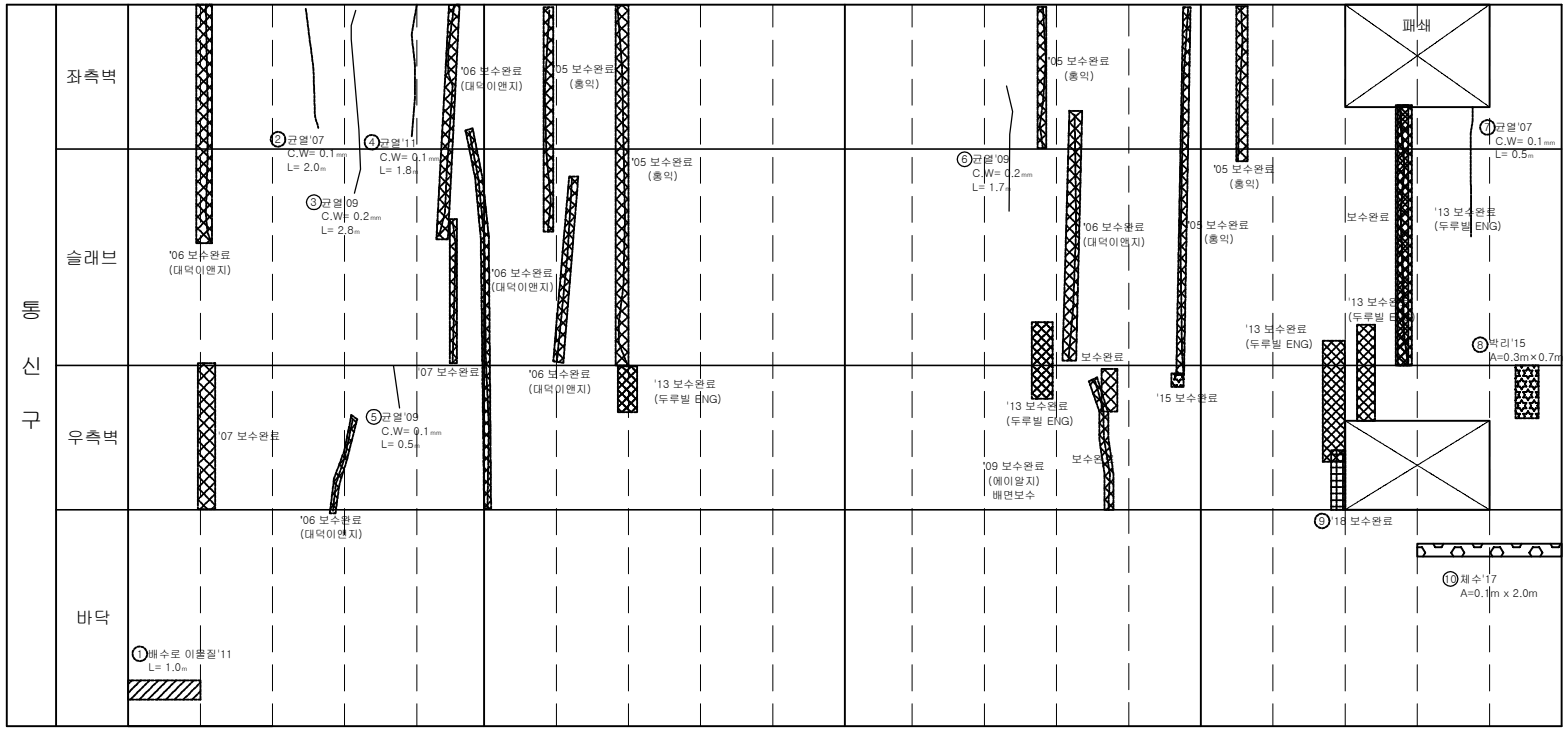

손 상 물 량 표

연번	점검년도	점검내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2011	이물질		1.00		1.00	m	1				
2	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
3	2009	균열	0.20	2.80		2.80	m	1				
4	2011	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
5	2009	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
6	2009	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
7	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
8	2011	박대	0.30	0.70		0.21	㎡	1				
9	2015	박리	0.50	1.00		0.50	㎡	1	2018	단면복구공법	0.60	
10	2017	체수	0.10	2.00		0.20	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락공동구 - 송이로(STA.1618m)환기구 39번

KEYPLAN



SECTION



BOX A

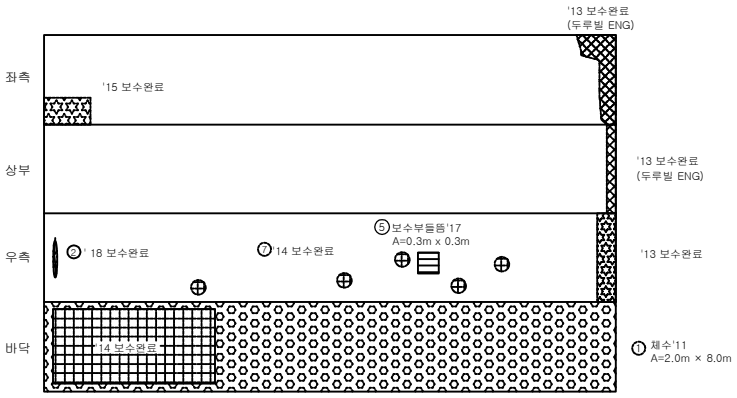

BOX B

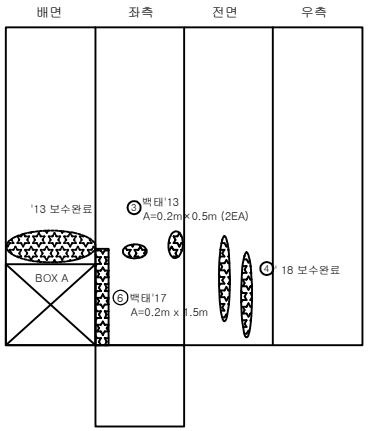

손 상 물 량 표

연번	최종년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2011	체수	2.00	8.00		16.00	㎡	1				
2	2013	균열부백태	0.10	0.70		0.07	㎡	1				
3	2013	벽태	0.20	0.50		0.20	㎡	2				
4	2013	벽태	0.20	2.00		0.80	㎡	2	2018	표면처리공법	0.96	
5	2017	보수부들뜸	0.30	0.30		0.09	㎡	1				재결함
6	2017	벽태	0.20	1.50		0.30	㎡	1				

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

환기구 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1620.0 m ~ 1640.0m) 통신구 구간





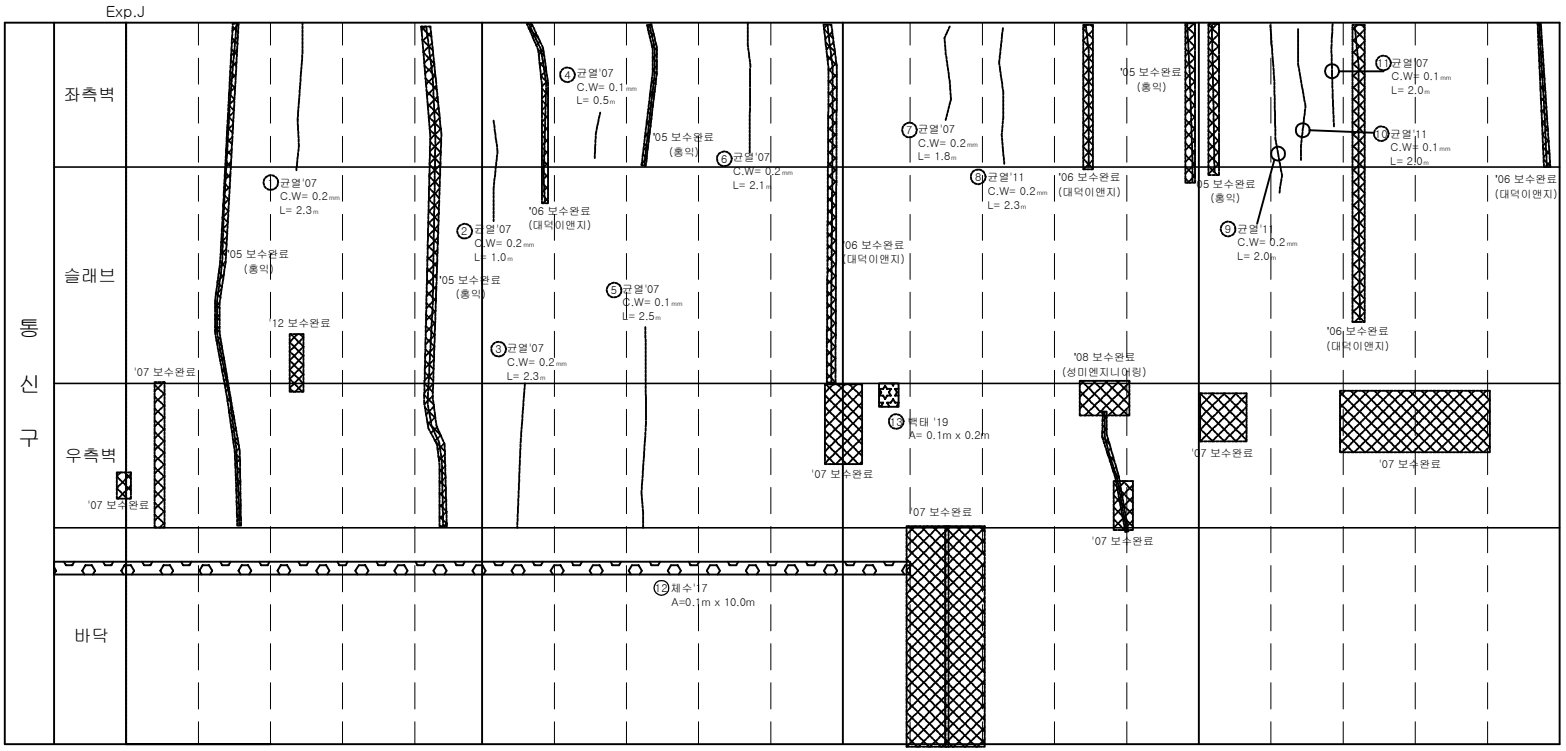

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
2	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
4	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
5	2007	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.10		2.10	m	1				
7	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
8	2011	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
9	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
10	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
11	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
12	2017	체수	0.10	10.00		1.00	㎡	1				
13	2018	백태	0.10	0.20		0.02	㎡	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1640.0 m ~ 1660.0m) 통신구 구간



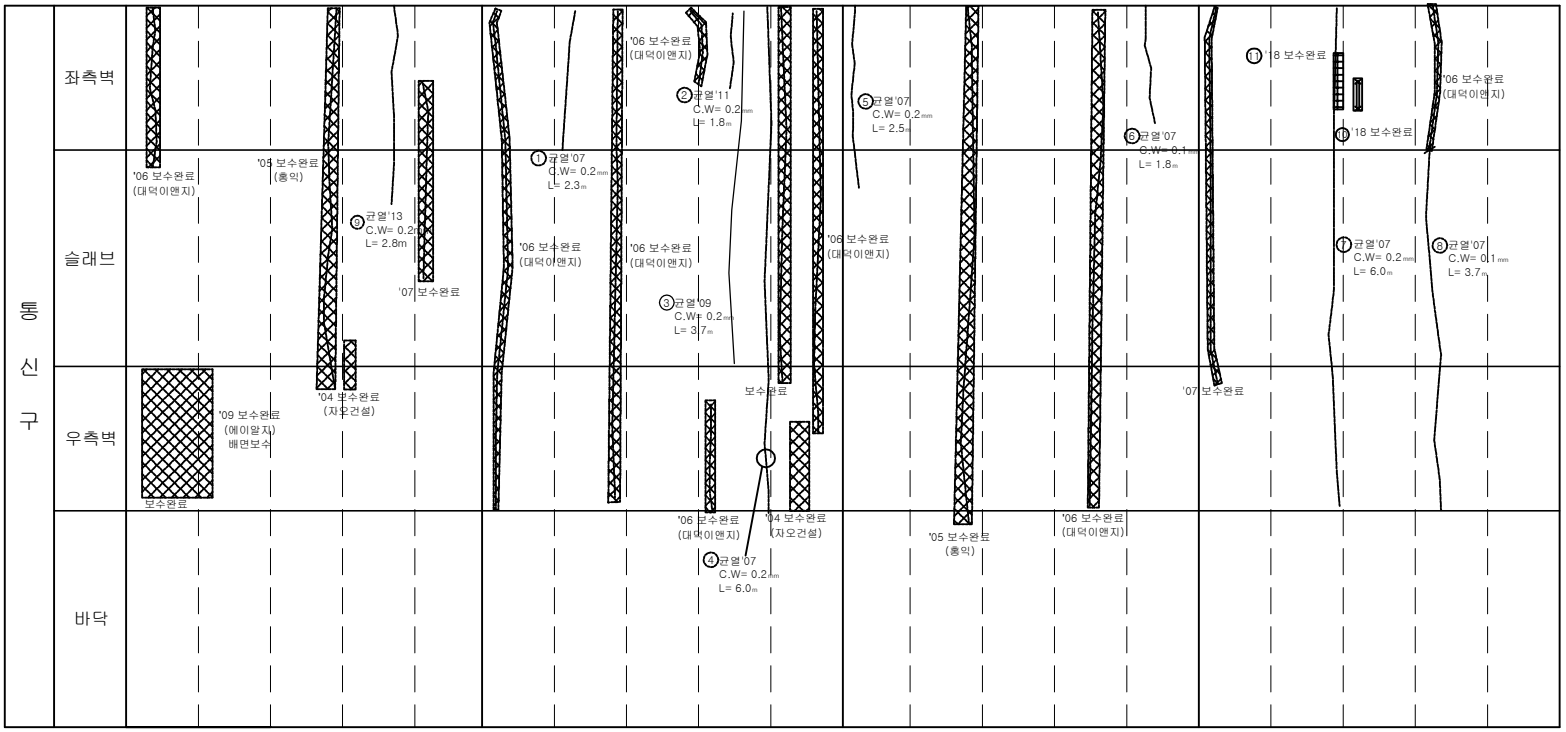

손 상 물 량 표

연번	균열년도	균열내용	균열규모					최종보수내역			
			폭	길이	깊이	균열	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	균열	비고
1	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
2	2011	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
3	2009	균열	0.20	3.70		3.70	m	1				
4	2007	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
5	2009	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
6	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
7	2007	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
8	2007	균열	0.10	3.70		3.70	m	1				
9	2013	균열	0.20	2.80		2.80	m	1				
10	2013	철근노출	0.20	0.80		0.16	㎡	1	2018	단면복구(덧창)	0.19	중요
11	2017	박리	0.20	1.00		0.20	㎡	1	2018	단면복구공법	0.24	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1660.0 m ~ 1680.0m) 통신구 구간



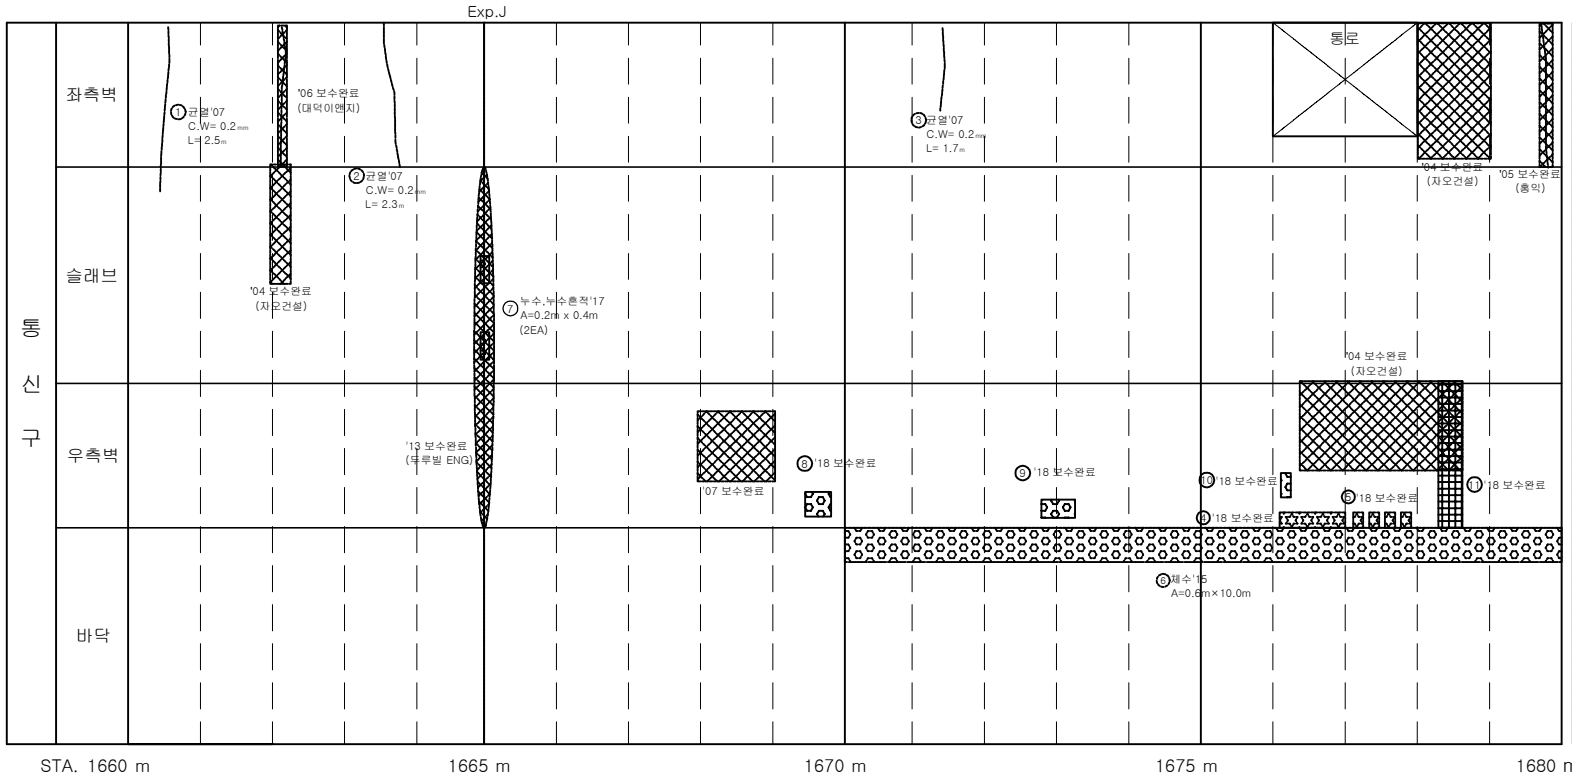

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
2	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
3	2007	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
4	2015	백태	0.30	1.00		0.30	㎡	1	2018	표면처리공법	0.36	
5	2015	백태	0.30	0.10		0.12	㎡	4	2018	표면처리공법	0.14	
6	2015	체수	0.60	10.00		6.00	㎡	1				
7	2017	누수흔적	0.20	0.40		0.16	㎡	2				
8	2017	누수,백태	0.40	0.40		0.16	㎡	1	2018	배면누수보수	0.19	
9	2017	누수,백태	0.40	0.80		0.32	㎡	1	2018	배면누수보수	0.38	
10	2017	백태	0.20	0.50		0.10	㎡	1	2018	표면처리공법	0.12	
11	2017	보수부들림	0.50	2.30		1.15	㎡	1	2018	단면복구공법	1.38	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1680.0 m ~ 1700.0m) 통신구 구간



Exp.J

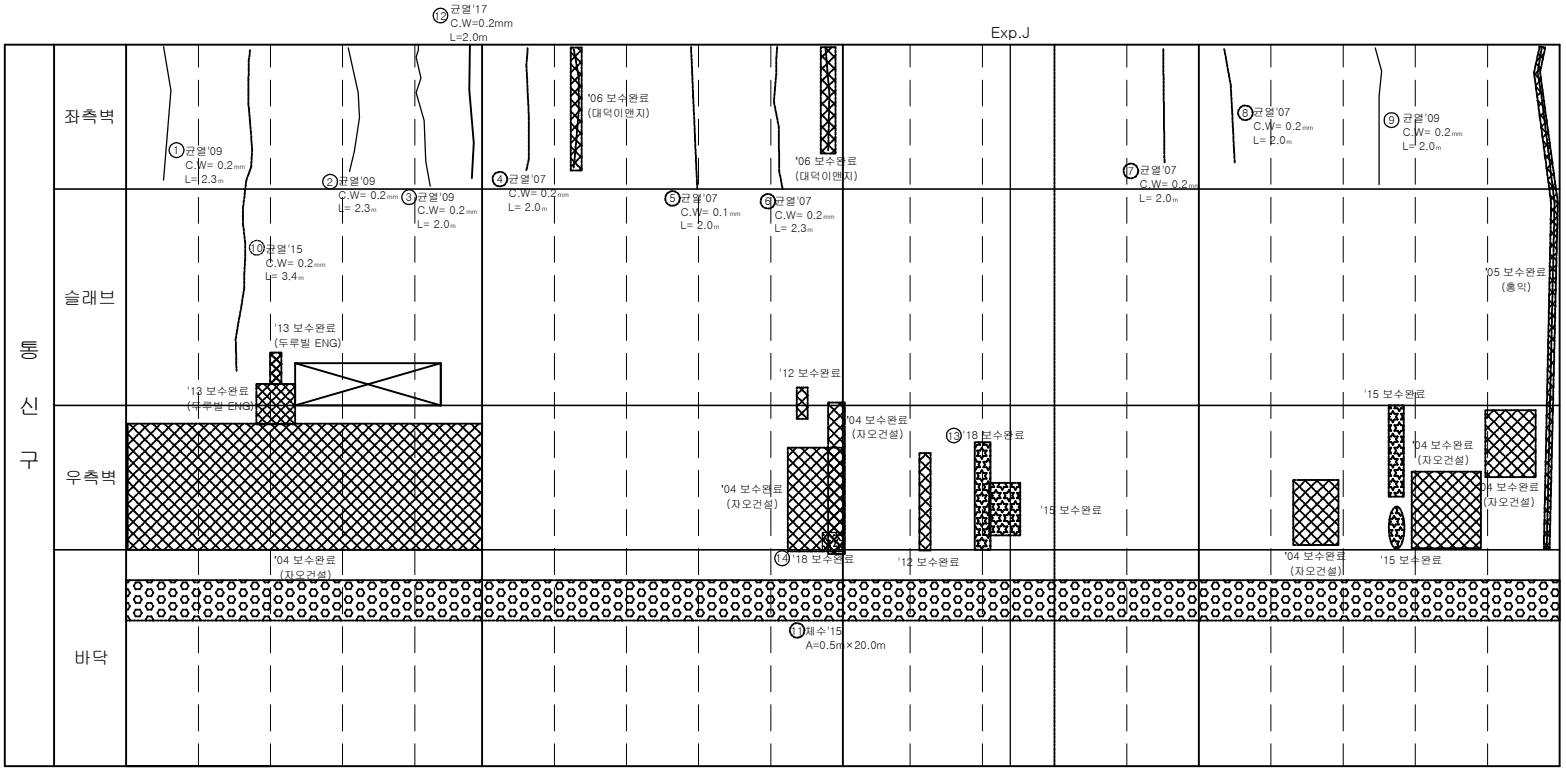

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	비고
1	2009	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
2	2009	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
3	2009	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
4	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
5	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
7	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
9	2009	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
10	2015	균열	0.20	3.40		3.40	m	1				
11	2015	체수	0.50	20.0		10.00	㎡	1				
12	2017	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
13	2017	보수재들뜸	0.50	2.00		1.00	㎡	1	2018	단면복구공법	1.20	
14	2017	누수,백태	0.20	0.20		0.04	㎡	1	2018	배면누수보수	0.05	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1700.0 m ~ 1720.0m) 통신구 구간



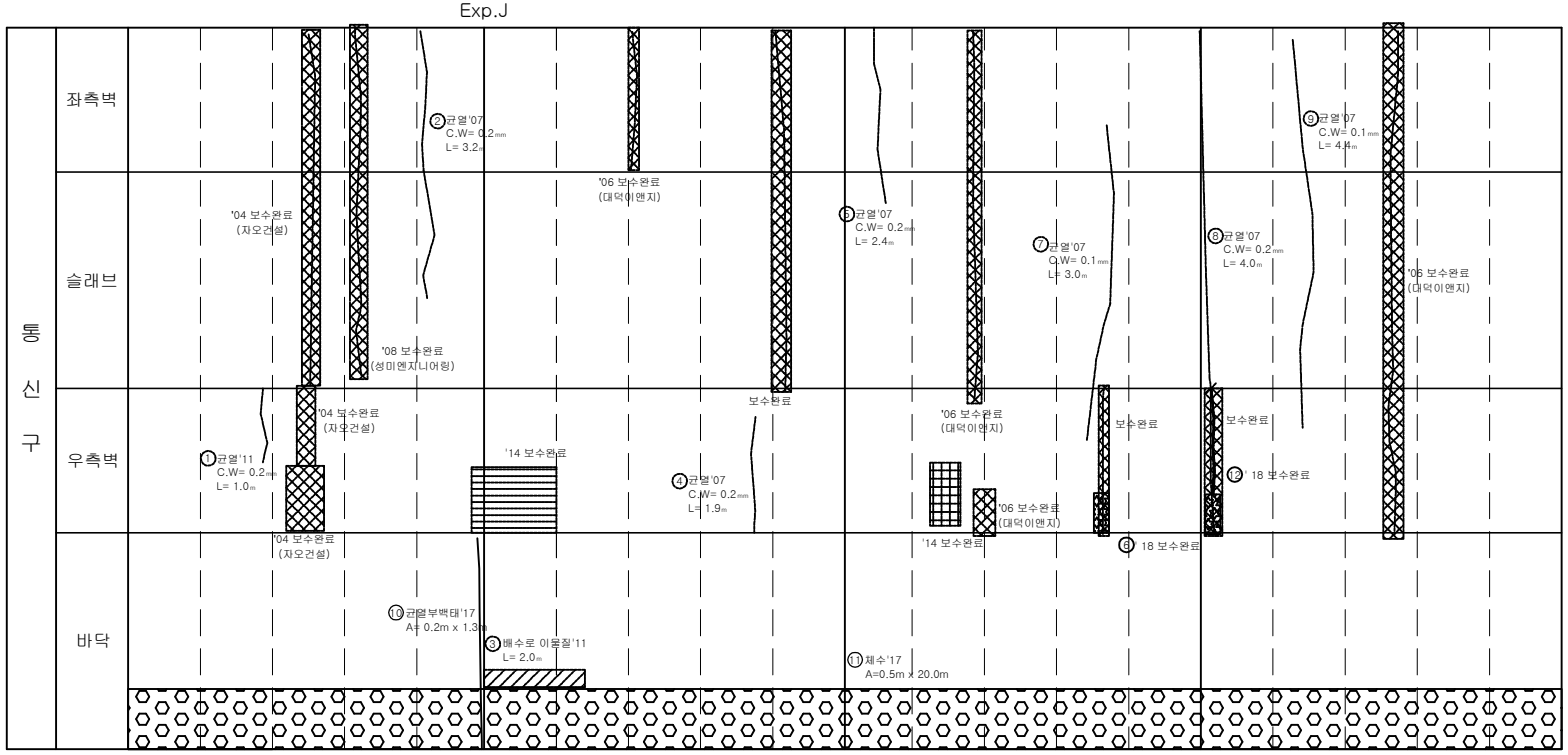

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2011	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
2	2007	균열	0.20	3.20		3.20	m	1				
3	2011	이물질		2.00		2.00	m	1				
4	2007	균열	0.20	1.90		1.90	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
6	2011	백태	0.10	0.30		0.06	㎡	2	2018	표면처리공법	0.07	
7	2007	균열	0.10	3.00		3.00	m	1				
8	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
9	2007	균열	0.10	4.40		4.40	m	1				
10	2017	균열부백태	0.20	1.30		0.26	㎡	1				
11	2017	체수	0.50	20.00		10.00	㎡	1				
12	2017	보수부균열	0.20	1.50		1.50	m	1	2018	표면처리공법	1.80	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1720.0 m ~ 1740.0m) 통신구 구간



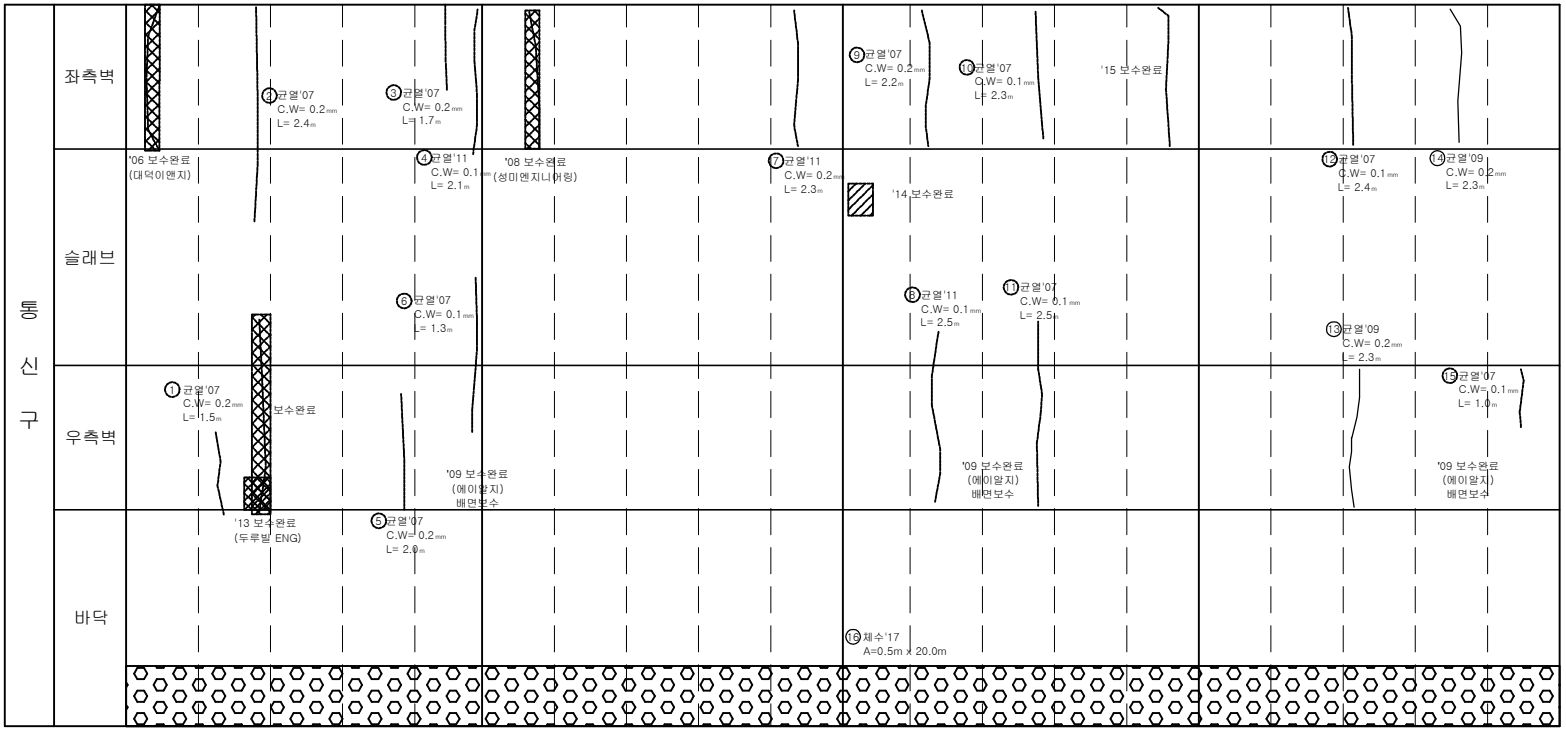

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모				최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	1.50		m	1				
2	2007	균열	0.20	2.40		m	1				
3	2007	균열	0.20	1.70		m	1				
4	2011	균열	0.10	2.10		m	1				
5	2007	균열	0.20	2.00		m	1				
6	2007	균열	0.10	1.30		m	1				
7	2011	균열	0.20	2.30		m	1				
8	2011	균열	0.10	2.50		m	1				
9	2007	균열	0.20	2.20		m	1				
10	2007	균열	0.10	2.30		m	1				
11	2007	균열	0.10	2.50		m	1				
12	2007	균열	0.10	2.40		m	1				
13	2009	균열	0.20	2.30		m	1				
14	2009	균열	0.20	2.30		m	1				
15	2007	균열	0.10	1.00		m	1				
16	2017	체수	0.50	20.00		㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1740.0 m ~ 1760.0m) 통신구 구간



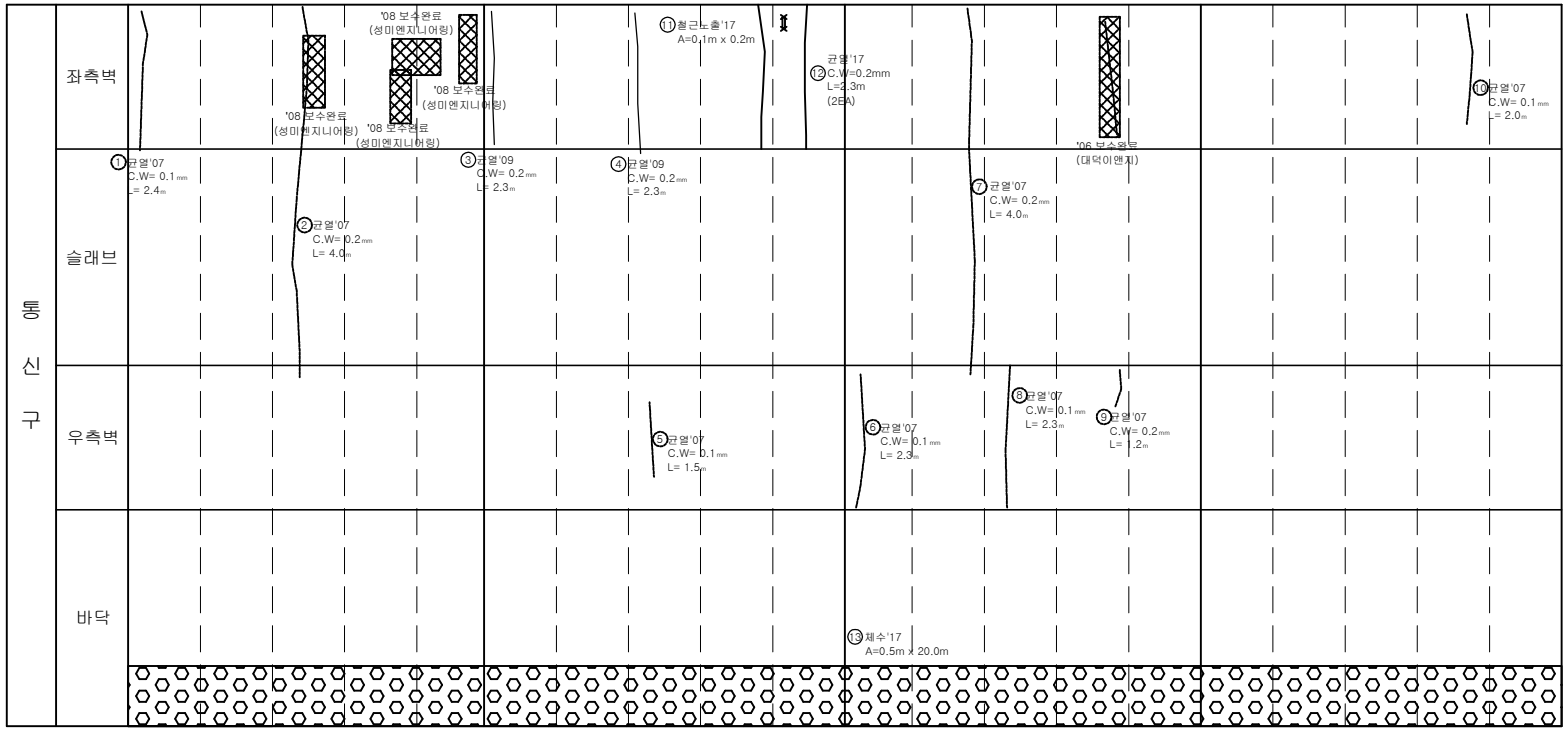

손 상 물 량 표

연번	균열년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.10	2.40		2.40	m	1				
2	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
3	2009	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
4	2009	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
5	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
6	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
7	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
8	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
9	2007	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
10	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
11	2017	철근노출	0.10	0.20		0.02	㎡	1				중요
12	2017	균열	0.20	2.30		4.60	m	2				
13	2017	체수	0.50	20.00		10.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1760.0 m ~ 1780.0m) 통신구 구간



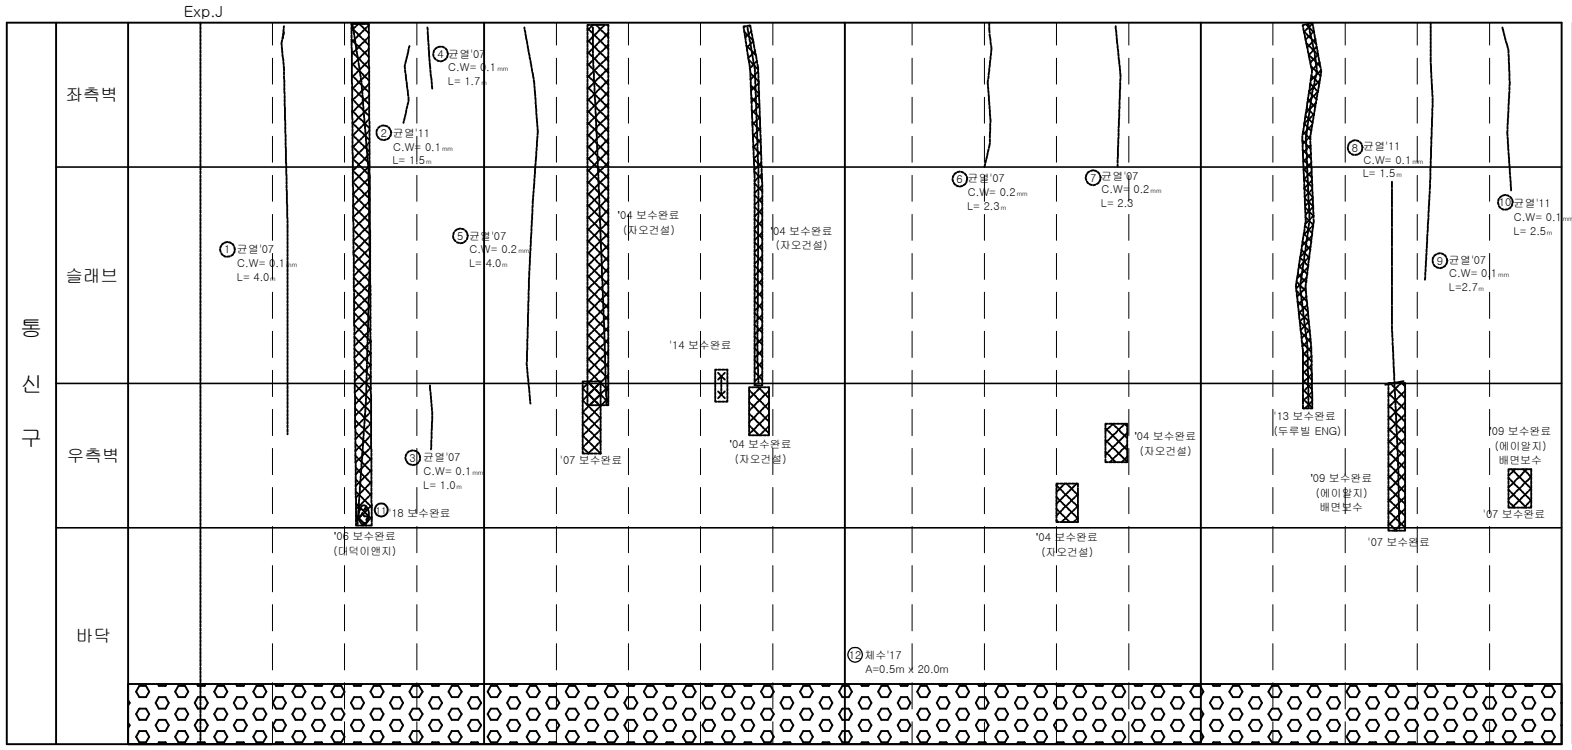

손 상 물 량 표

연번	균열년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	갯수	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.10	4.00		m	1				
2	2011	균열	0.10	1.50		m	1				
3	2007	균열	0.10	1.00		m	1				
4	2007	균열	0.10	0.70		m	1				
5	2007	균열	0.20	4.00		m	1				
6	2007	균열	0.20	2.30		m	1				
7	2007	균열	0.20	2.30		m	1				
8	2011	균열	0.10	1.50		m	1				
9	2007	균열	0.10	2.70		m	1				
10	2011	균열	0.10	2.50		m	1				
11	2013	박태	0.20	0.30		㎡	1	2018	표면처리공법	0.07	
12	2017	체수	0.50	20.00		㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1780.0 m ~ 1800.0m) 통신구 구간



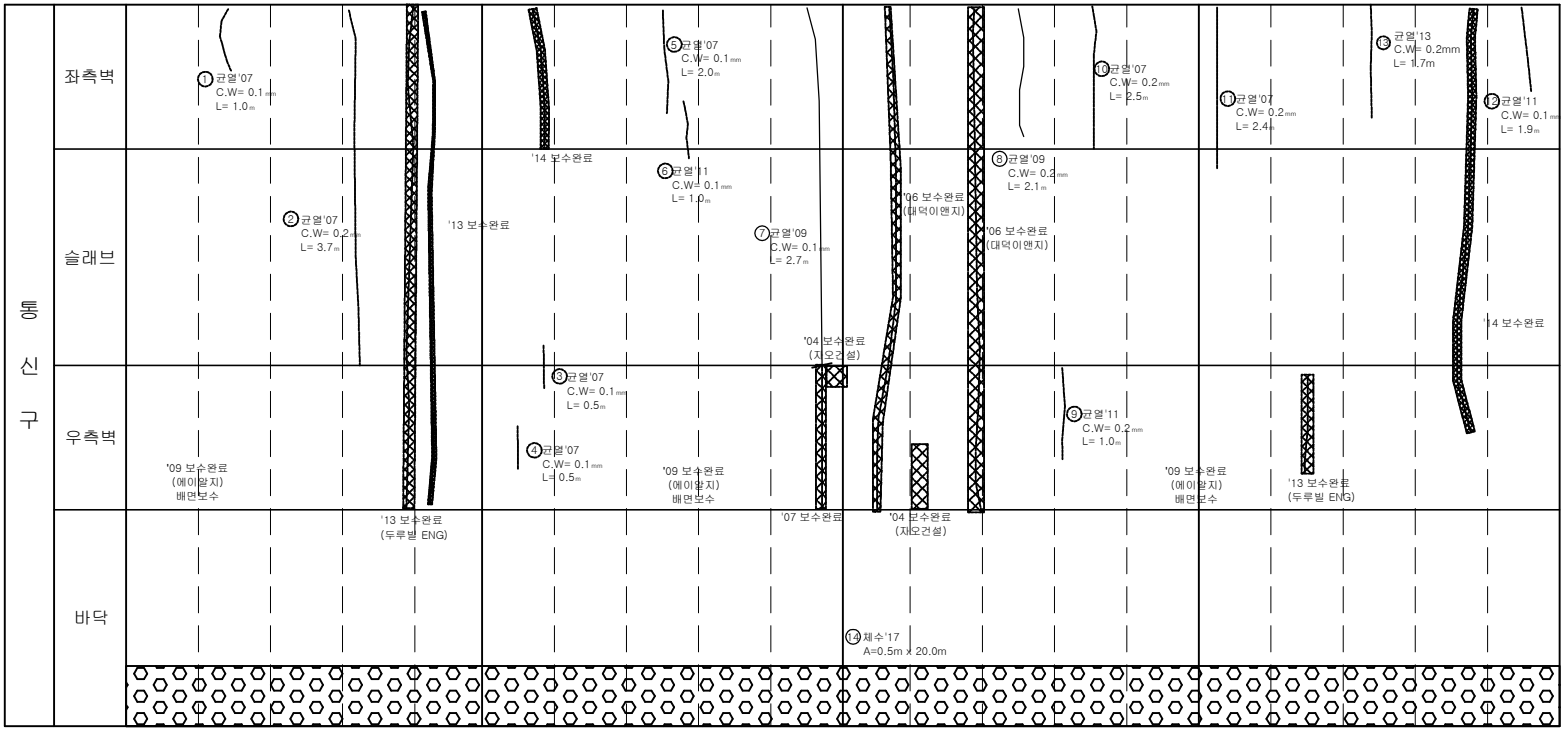

손 상 물 량 표

연번	균열년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	길이	총량	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
2	2007	균열	0.20	3.70		3.70	m	1				
3	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
4	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
5	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
6	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
7	2009	균열	0.10	2.70		2.70	m	1				
8	2009	균열	0.20	2.10		2.10	m	1				
9	2011	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
10	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
11	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
12	2011	균열	0.10	1.90		1.90	m	1				
13	2013	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
14	2017	체수	0.50	20.00		10.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1800.0 m ~ 1820.0m) 통신구 구간



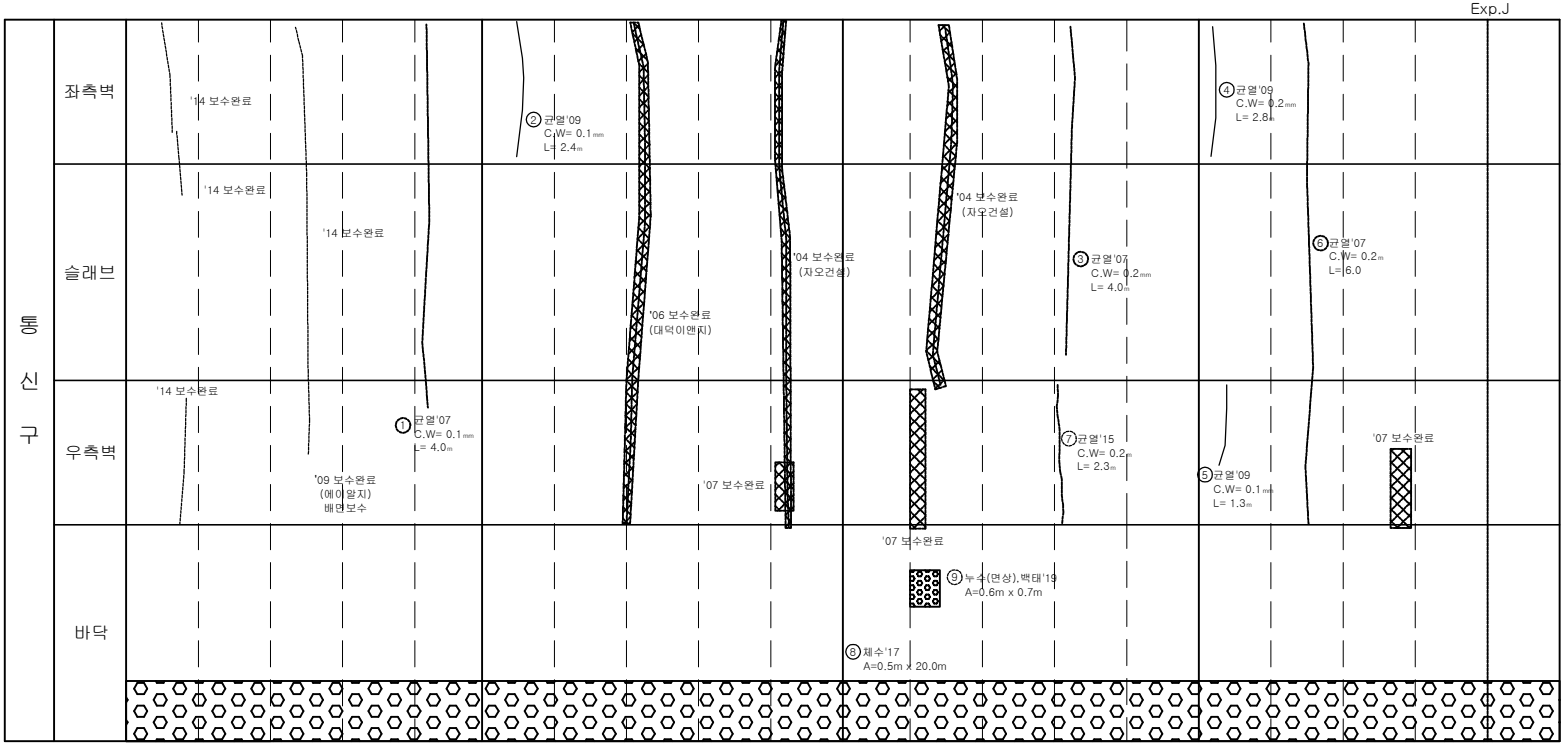

손 상 물 량 표

연번	균열년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	비고
1	2007	균열	0.10	4.00		4.00	m	1				
2	2009	균열	0.10	2.40		2.40	m	1				
3	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
4	2009	균열	0.20	2.80		2.80	m	1				
5	2009	균열	0.10	1.30		1.30	m	1				
6	2007	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
7	2015	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
8	2017	체수	0.50	20.00		10.00	㎡	1				
9	2019	누수(면상),백태	0.60	0.70		0.42	㎡	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1820.0 m ~ 1840.0m) 통신구 구간



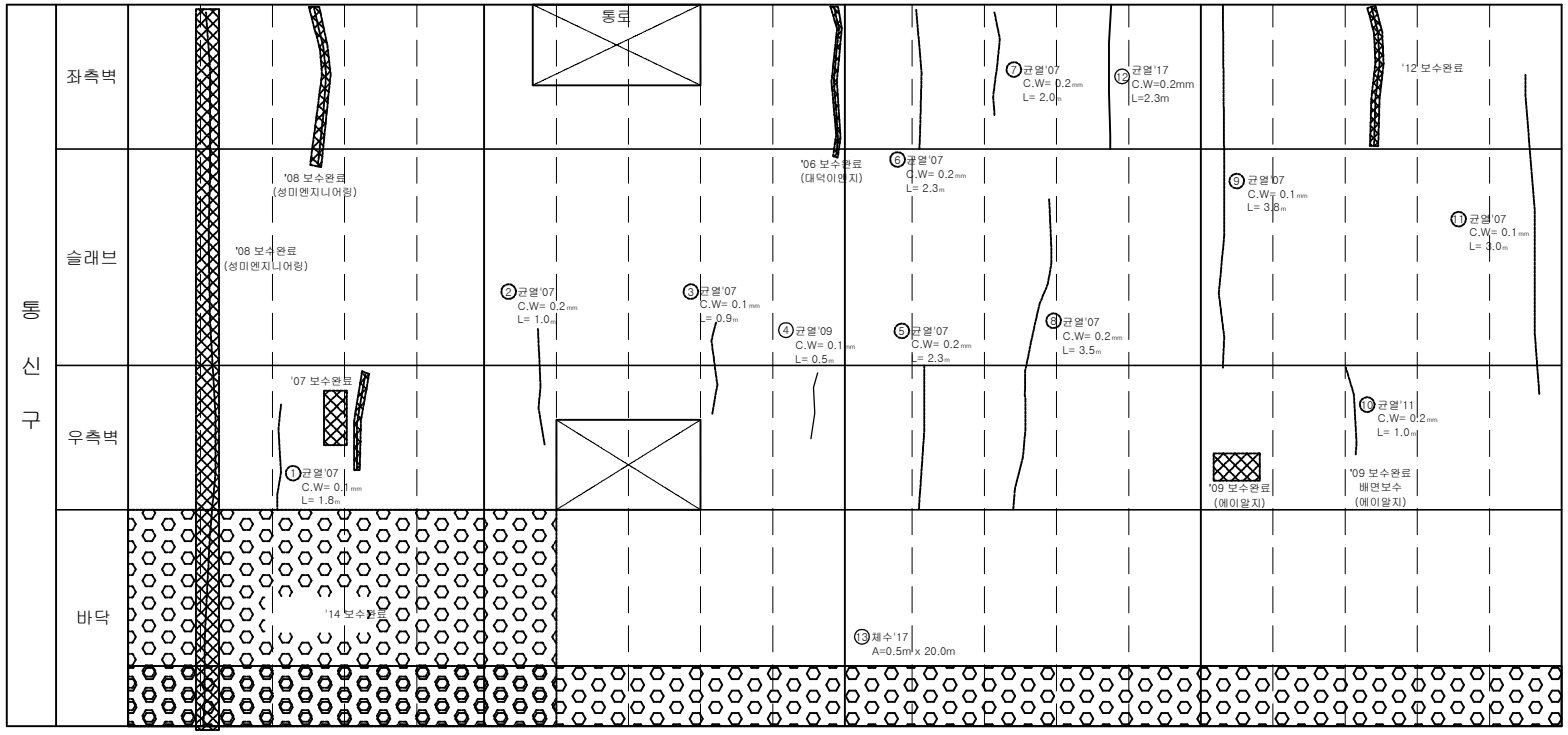

손 상 물 량 표

연번	균열년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	결함	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
2	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
3	2007	균열	0.10	0.90		0.90	m	1				
4	2009	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
7	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
8	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
9	2007	균열	0.10	3.80		3.80	m	1				
10	2011	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
11	2007	균열	0.10	3.00		3.00	m	1				
12	2017	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
13	2017	체수	0.50	20.00		10.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락공동구 - 송이로(STA.1827m)환기구 40번

KEYPLAN



SECTION



BOX A

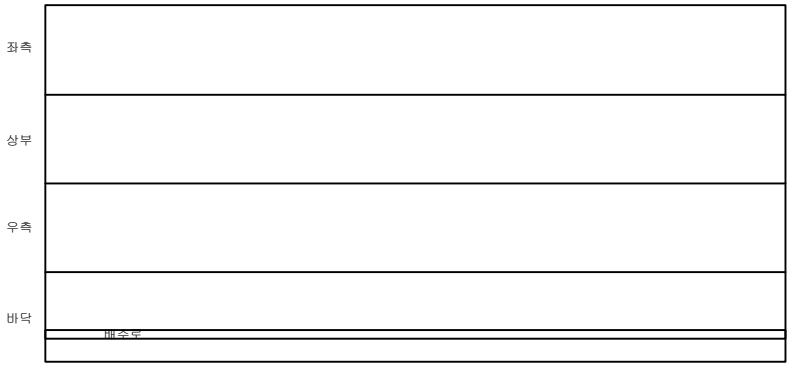

BOX B

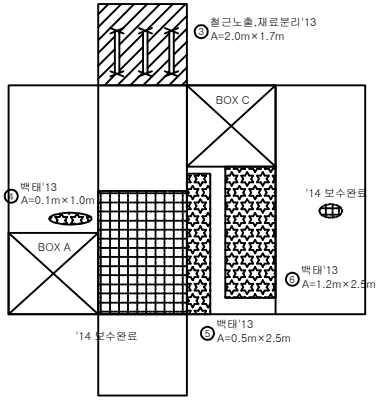

BOX C

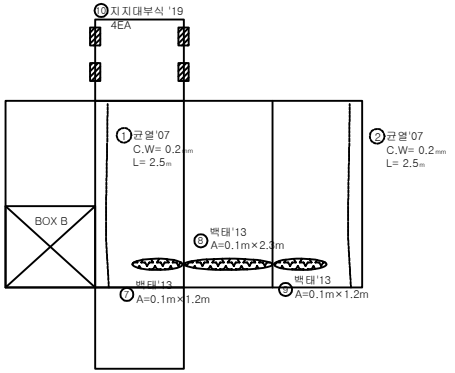

손 상 물 량 표

연번	점출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
2	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
3	2013	철근노출,재료분리	2.00	1.70		3.40	㎡	1				중요
4	2013	백태	0.10	1.00		0.10	㎡	1				
5	2013	백태	0.50	2.50		1.25	㎡	1				
6	2013	백태	1.20	2.50		3.00	㎡	1				
7	2013	백태	0.10	1.20		0.12	㎡	1				
8	2013	백태	0.10	2.30		0.23	㎡	1				
9	2013	백태	0.10	1.20		0.12	㎡	1				
10	2019	지지대부식				4.00	EA	1				신규

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

환기구 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1840.0 m ~ 1860.0m) 통신구 구간



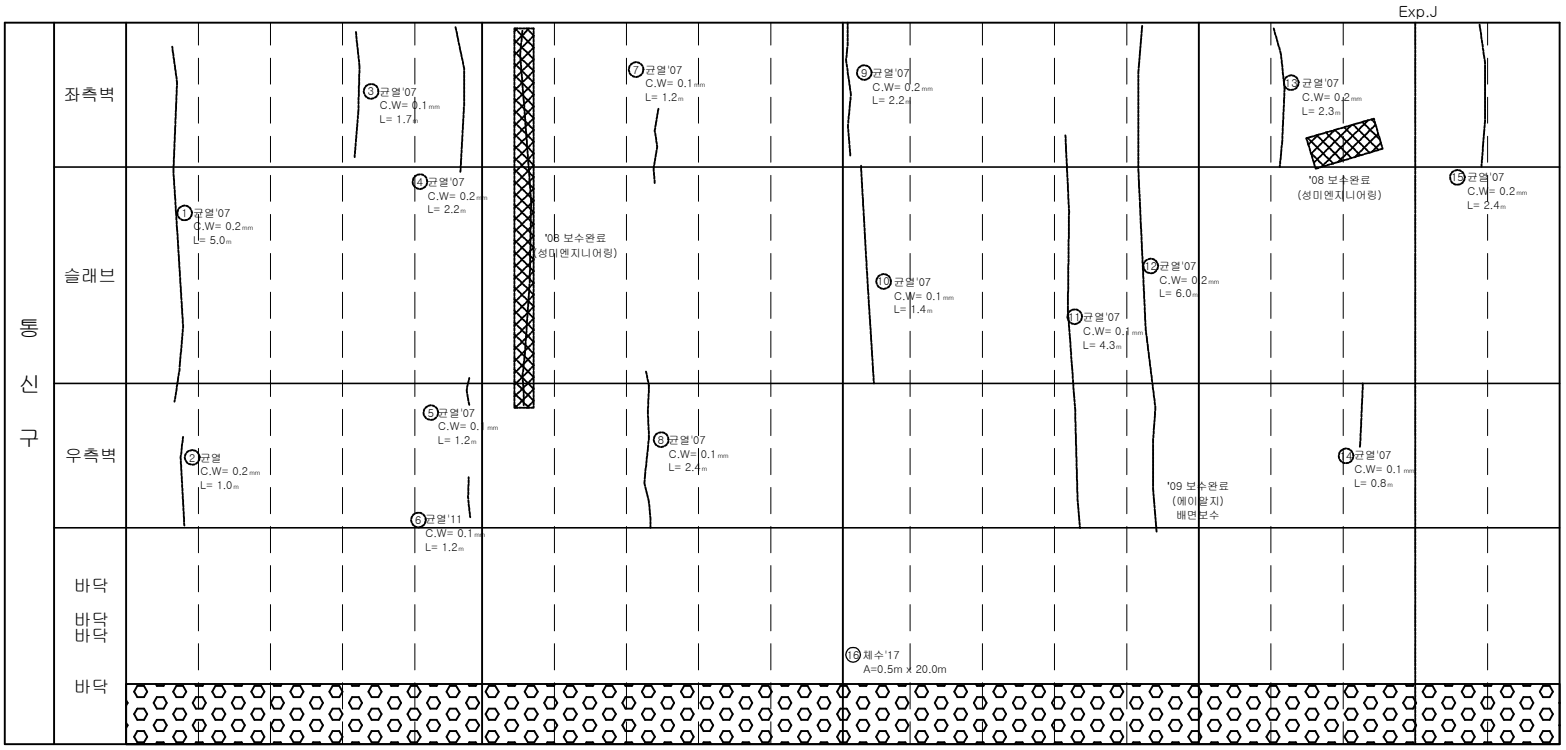

손 상 물 량 표

연번	균열년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.20	5.00		5.00	m	1				
2	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
3	2007	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
4	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
5	2007	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
6	2011	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
7	2007	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
8	2007	균열	0.10	2.40		2.40	m	1				
9	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
10	2007	균열	0.10	1.40		1.40	m	1				
11	2007	균열	0.10	4.30		4.30	m	1				
12	2007	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
13	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
14	2007	균열	0.10	0.80		0.80	m	1				
15	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
16	2017	체수	0.50	20.00		10.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1860.0 m ~ 1880.0m) 통신구 구간



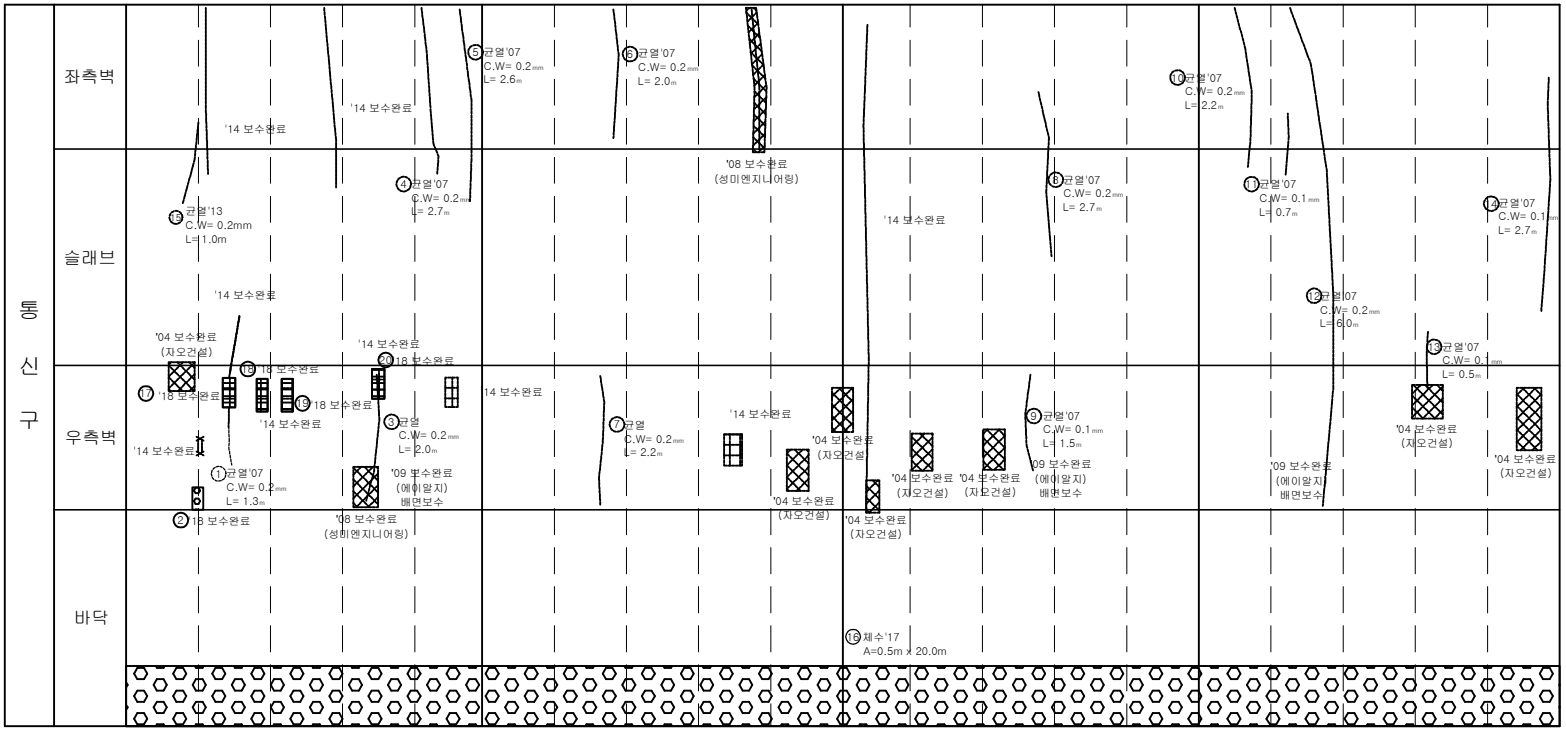

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	1.30		m	1				
2	2009	박대	0.06	0.06		㎡	1	2018	표면처리공법	0.07	
3	2007	균열	0.20	2.00		m	1				
4	2007	균열	0.20	2.70		m	1				
5	2007	균열	0.20	2.60		m	1				
6	2007	균열	0.20	2.00		m	1				
7	2007	균열	0.20	2.20		m	1				
8	2007	균열	0.20	2.70		m	1				
9	2007	균열	0.10	1.50		m	1				
10	2007	균열	0.20	2.20		m	1				
11	2007	균열	0.10	0.70		m	1				
12	2007	균열	0.20	6.00		m	1				
13	2007	균열	0.10	0.50		m	1				
14	2007	균열	0.10	2.70		m	1				
15	2013	균열	0.20	1.00		m	1				
16	2017	체수	0.50	20.00		㎡	1				
17	2017	보수부들음	0.10	0.30		㎡	1	2018	단면복구공법	0.04	
18	2017	보수부들음	0.30	0.70		㎡	1	2018	단면복구공법	0.25	
19	2017	보수부들음	0.20	0.60		㎡	1	2018	단면복구공법	0.14	
20	2017	보수부들음	0.20	0.40		㎡	1	2018	단면복구공법	0.10	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1880.0 m ~ 1900.0m) 통신구 구간



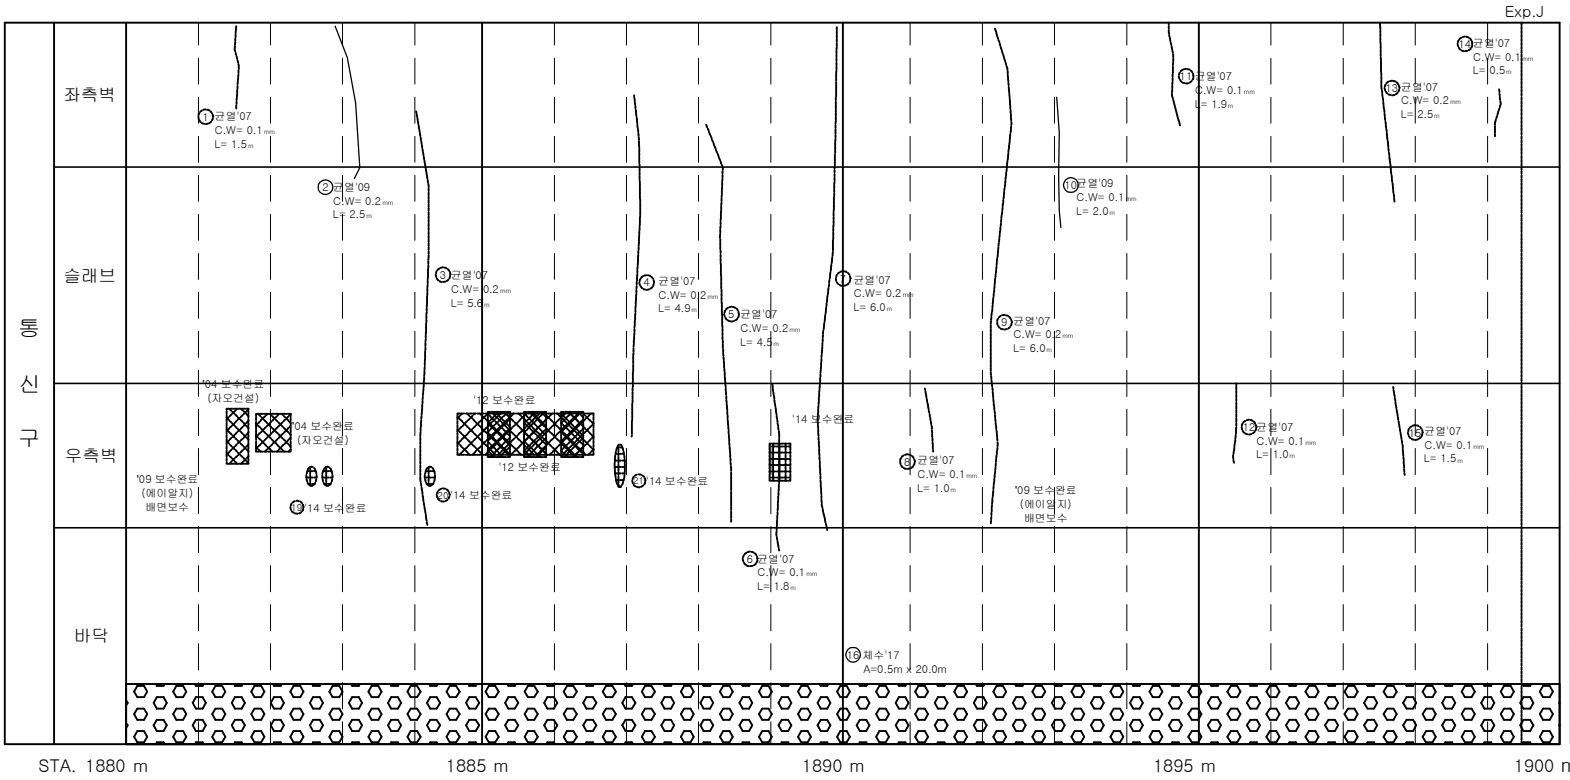

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모				최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.10	1.50		m	1				
2	2009	균열	0.20	2.50		m	1				
3	2007	균열	0.20	5.60		m	1				
4	2007	균열	0.20	4.90		m	1				
5	2007	균열	0.20	4.50		m	1				
6	2007	균열	0.10	1.80		m	1				
7	2007	균열	0.20	6.00		m	1				
8	2007	균열	0.10	1.00		m	1				
9	2007	균열	0.20	6.00		m	1				
10	2009	균열	0.10	2.00		m	1				
11	2007	균열	0.10	1.90		m	1				
12	2007	균열	0.10	1.00		m	1				
13	2007	균열	0.20	2.50		m	1				
14	2007	균열	0.10	0.50		m	1				
15	2007	균열	0.10	1.50		m	1				
16	2017	체수	0.50	20.00		㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1900.0 m ~ 1920.0m) 통신구 구간



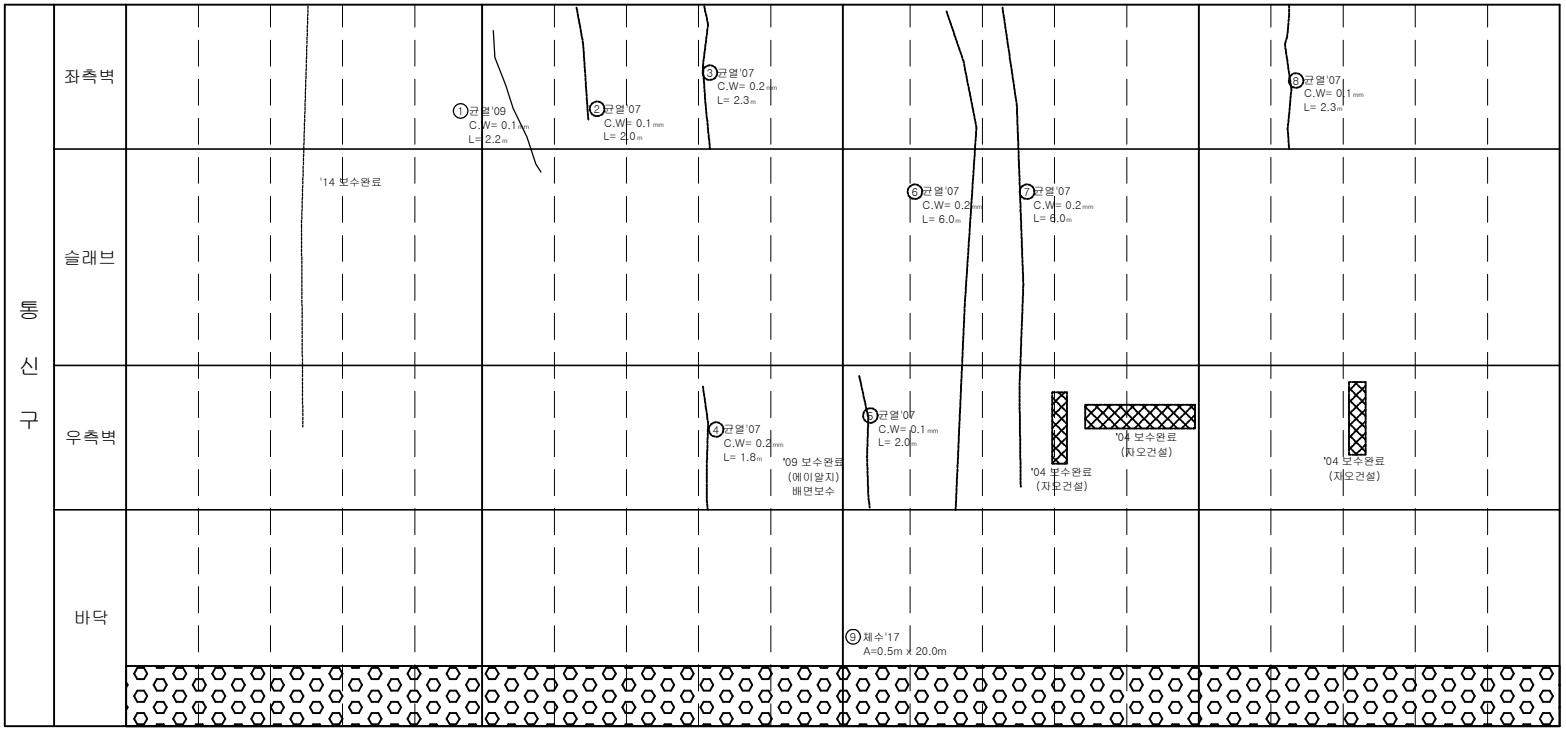

손 상 물 량 표

연번	점검년도	점검내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	수량	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	수량	
1	2009	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
2	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
4	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
5	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
6	2007	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
7	2007	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
8	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
9	2017	체수	0.50	20.00		10.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1920.0 m ~ 1940.0m) 통신구 구간



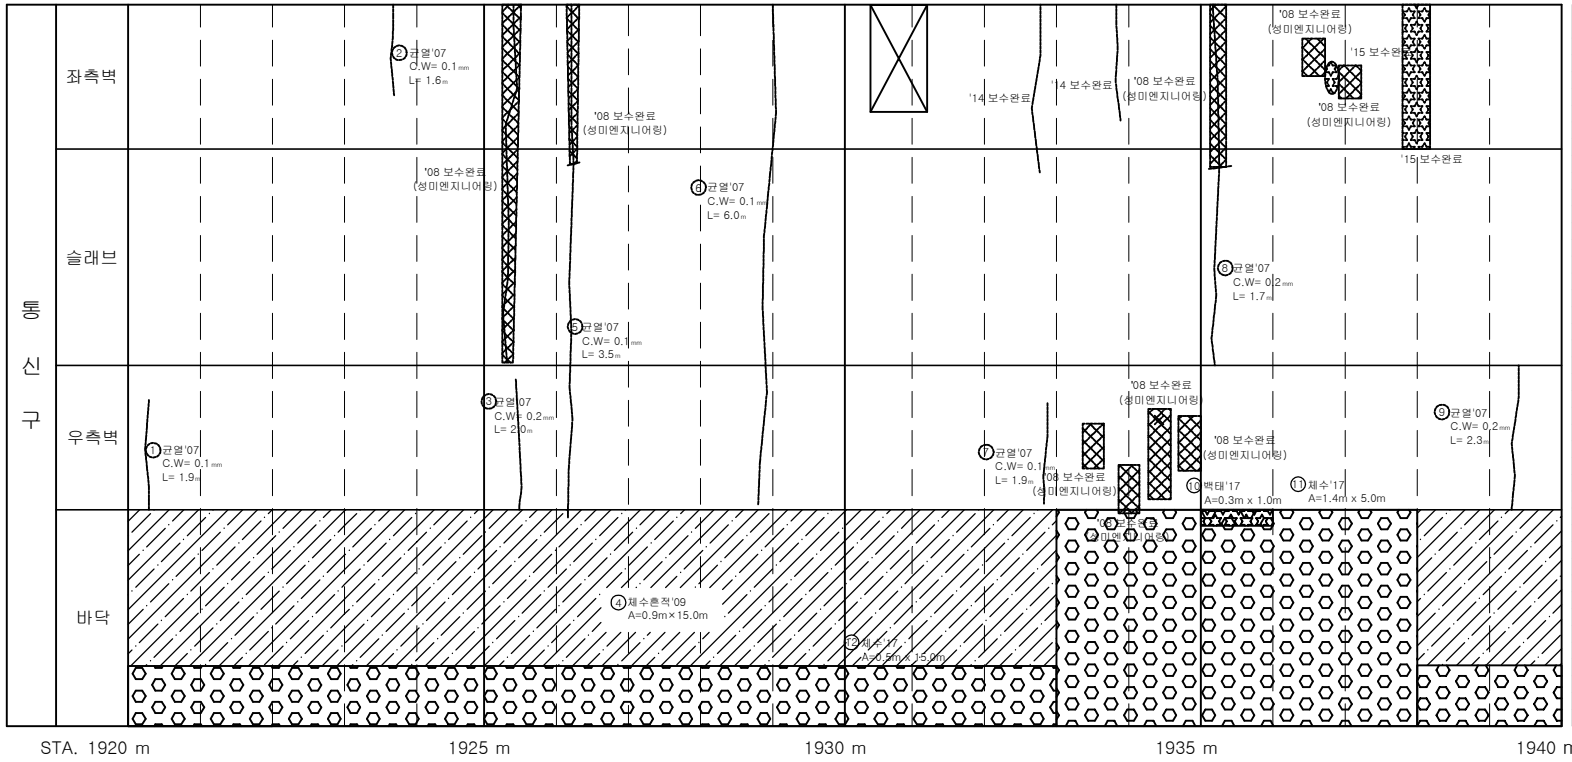

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	균열	0.10	1.90		1.90	m	1				
2	2007	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
4	2009	체수흔적	0.90	15.00		13.50	㎡	1				
5	2007	균열	0.10	3.50		3.50	m	1				
6	2007	균열	0.10	6.00		6.00	m	1				
7	2007	균열	0.10	1.90		1.90	m	1				
8	2011	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
9	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
10	2017	백태	0.30	1.00		0.30	㎡	1				
11	2017	체수	1.40	5.00		7.00	㎡	1				
12	2017	체수	0.50	15.00		7.50	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1940.0 m ~ 1960.0m) 통신구 구간



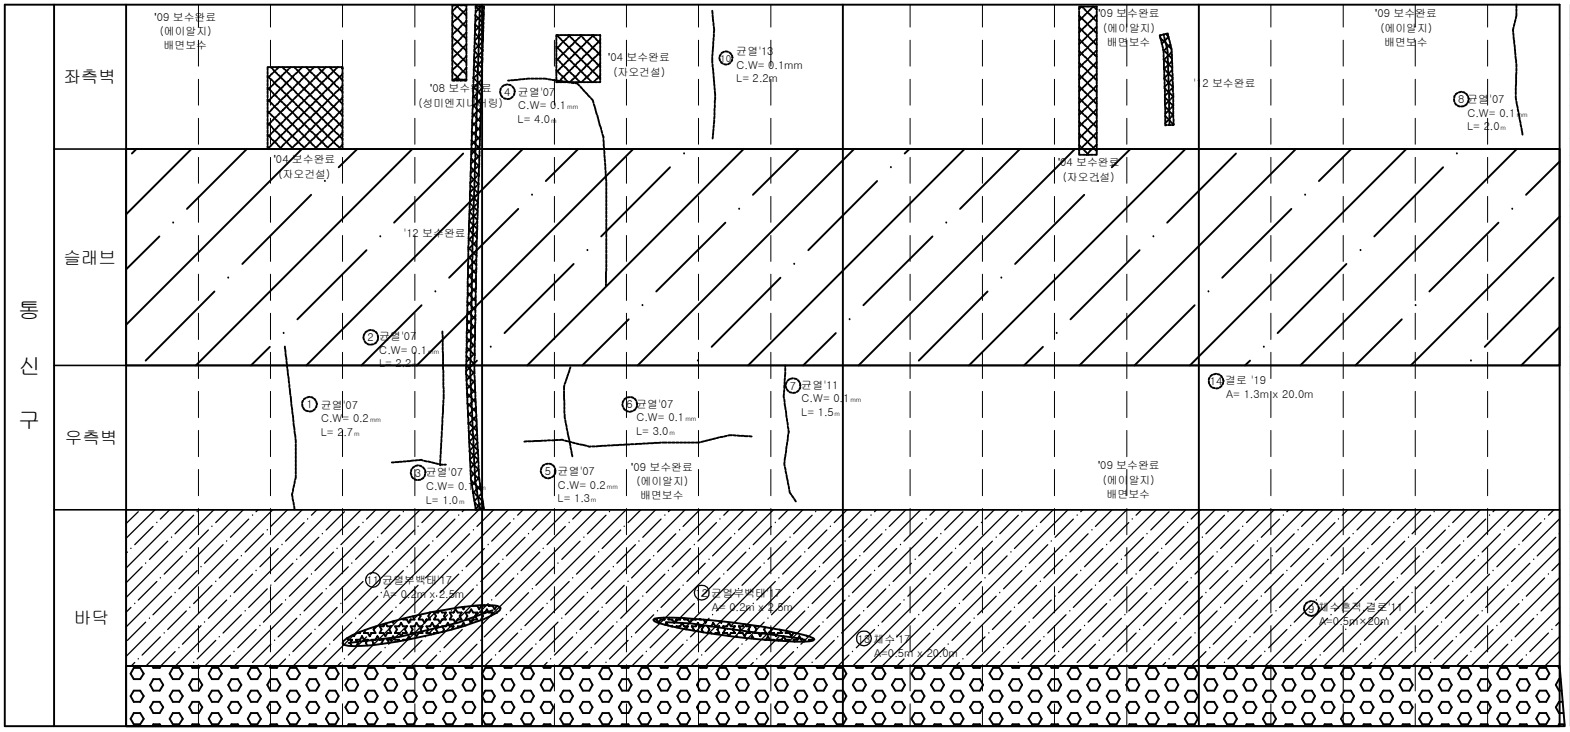

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	균열	0.20	2.70		2.70	m	1				
2	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
3	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
4	2007	균열	0.10	4.00		4.00	m	1				
5	2007	균열	0.20	1.30		1.30	m	1				
6	2007	균열	0.10	3.00		3.00	m	1				
7	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
8	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
9	2011	체수흔적,결로	0.50	20.00		10.00	㎡	1				
10	2013	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
11	2017	균열부백타	0.20	2.50		0.50	㎡	1				
12	2017	균열부백타	0.20	2.50		0.50	㎡	1				
13	2017	체수	0.50	20.0		10.0	㎡	1				
14	2019	결로	1.30	20.0		26.00	㎡	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락공동구 - 송이로(STA.1952m)환기구 41번

KEYPLAN



SECTION



① 바닥

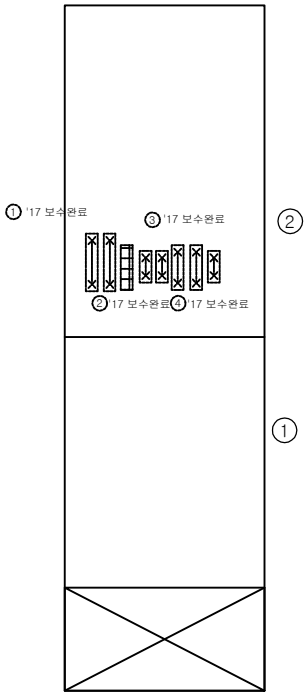

③ 슬래브

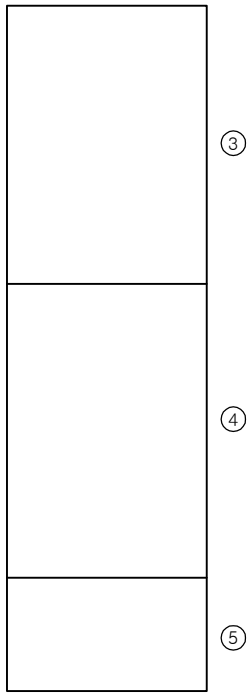

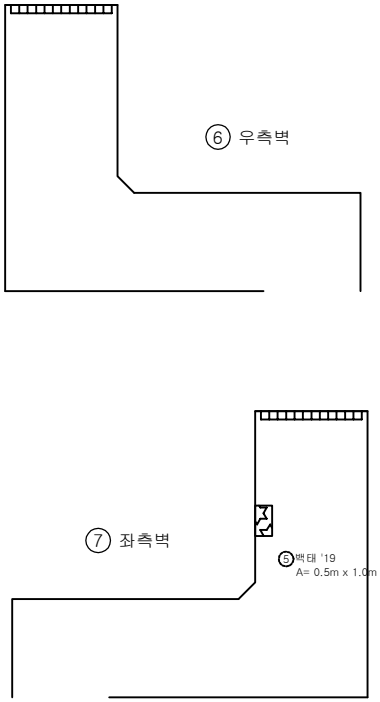

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	철근노출	0.10	0.50		0.10	㎡	2	2017	단면복구(방청)	0.12	
2	2007	박리	0.10	0.40		0.04	㎡	1	2017	단면복구공법	0.05	
3	2007	철근노출	0.10	0.20		0.06	㎡	3	2017	단면복구(방청)	0.07	
4	2007	철근노출	0.10	0.40		0.08	㎡	2	2017	단면복구(방청)	0.10	
5	2019	백태	0.50	1.00		0.50	㎡	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 환기구 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1960.0 m ~ 1980.0m) 통신구 구간



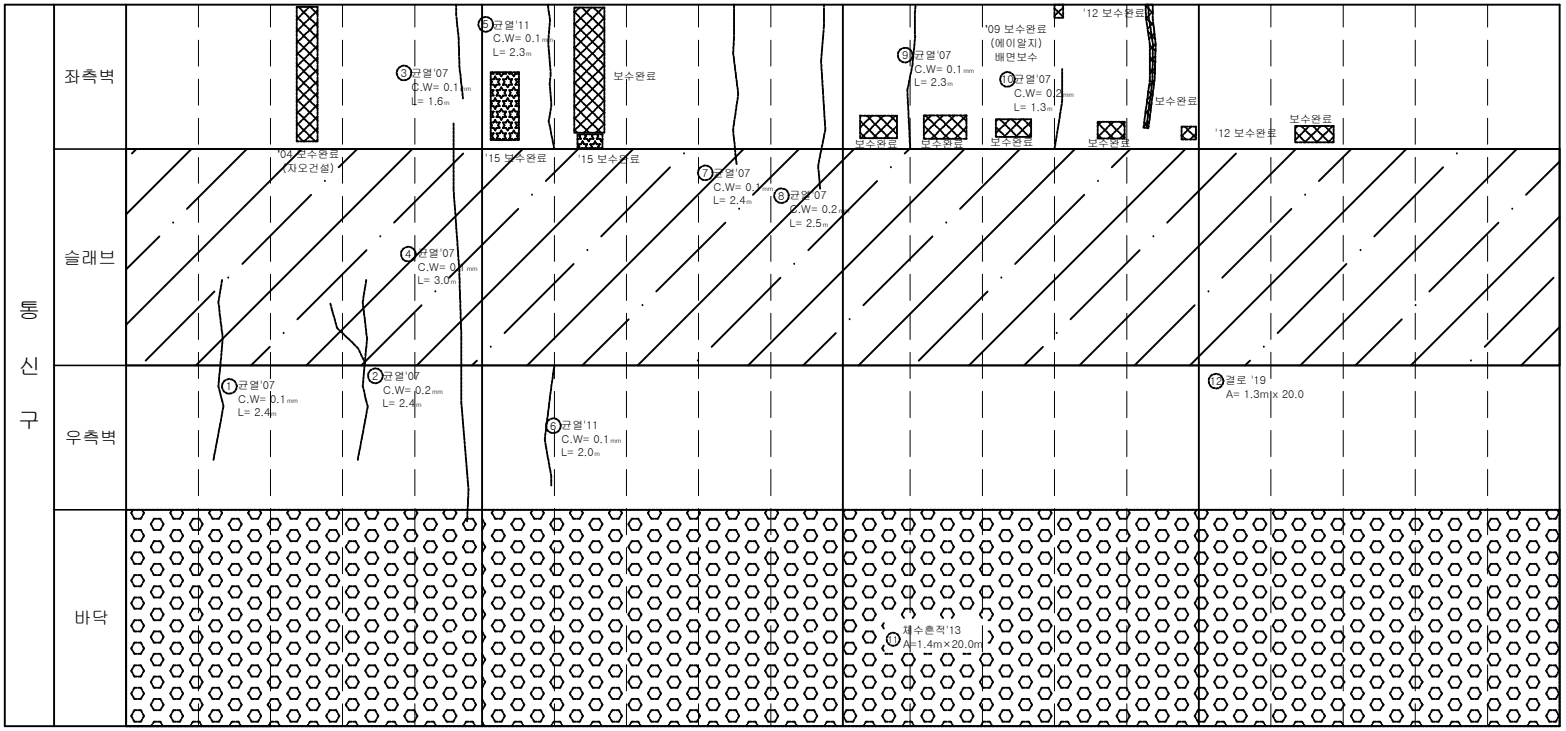

손 상 물 량 표

연번	균열년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.10	2.40		2.40	m	1				
2	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
3	2007	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
4	2007	균열	0.10	3.00		3.00	m	1				
5	2011	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
6	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
7	2007	균열	0.10	2.40		2.40	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
9	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
10	2007	균열	0.20	1.30		1.30	m	1				
11	2013	채수흔적	1.40	20.0		28.00	㎡	1				
12	2019	결로	1.30	20.0		26.00	㎡	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.1980.0 m ~ 2000.0m) 통신구 구간



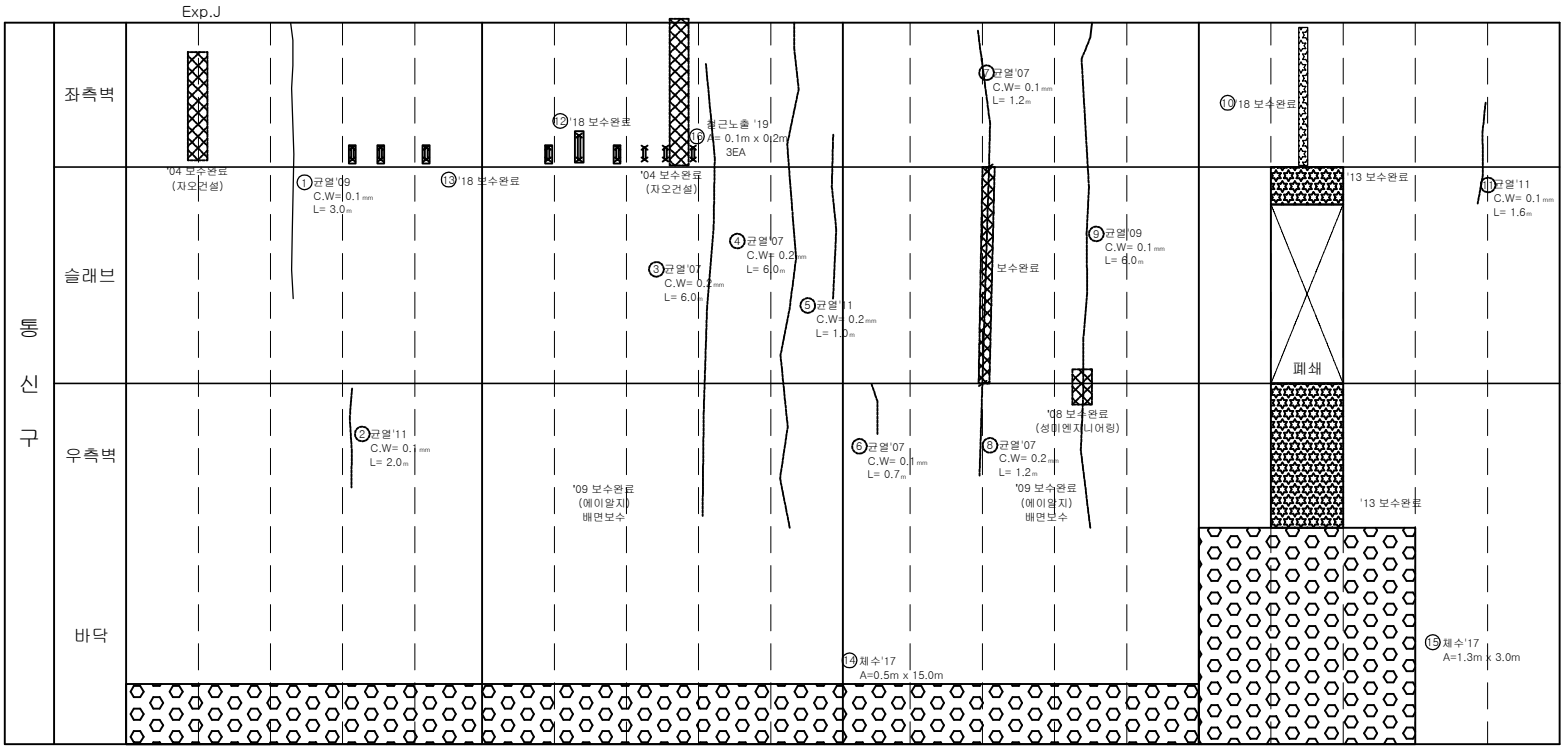

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			
			폭	길이	깊이	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	비고
1	2009	균열	0.10	3.00		m	1				
2	2011	균열	0.10	2.00		m	1				
3	2007	균열	0.20	6.00		m	1				
4	2007	균열	0.20	6.00		m	1				
5	2011	균열	0.20	1.00		m	1				
6	2007	균열	0.10	0.70		m	1				
7	2007	균열	0.10	1.20		m	1				
8	2007	균열	0.20	1.20		m	1				
9	2009	균열	0.10	6.00		m	1				
10	2004	백태	0.20	2.00		㎡	1	2018	표면처리공법	0.48	
11	2011	균열	0.10	1.60		m	1				
12	2017	철근노출	0.10	0.30		㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.04	중요
13	2017	철근노출	0.10	0.10		㎡	5	2018	단면복구(방청)	0.06	중요
14	2017	체수	0.50	15.00		㎡	1				
15	2017	체수	1.30	3.00		㎡	1				
16	2017	철근노출	0.10	0.20		㎡	3				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.2000.0 m ~ 2020.0m) 통신구 구간



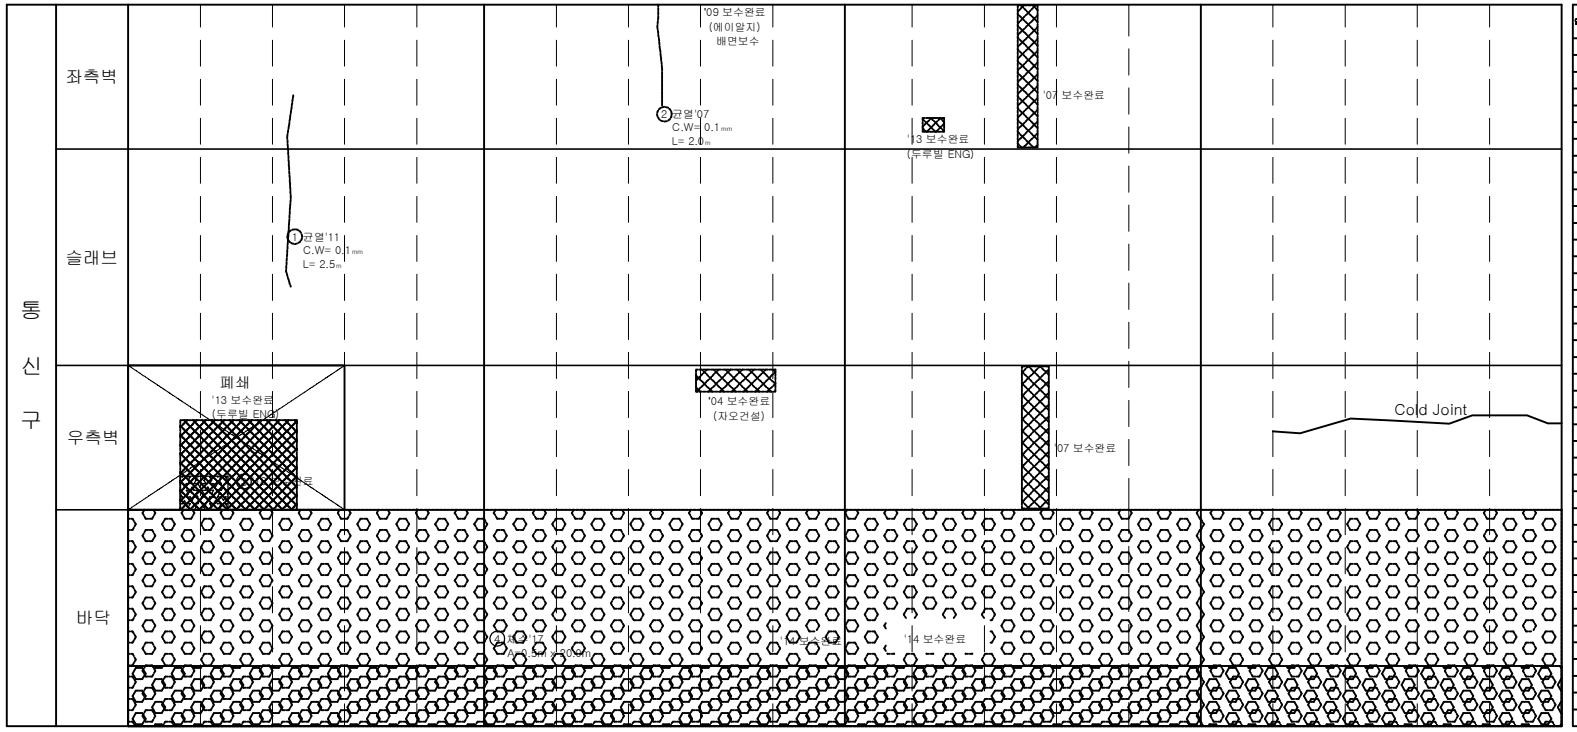

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2011	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				
2	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
3	2017	박대	1.00	1.00		1.00	㎡	1	2018	표면처리공법	1.20	
4	2017	체수	0.50	20.00		10.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.2020.0 m ~ 2040.0m) 통신구 구간



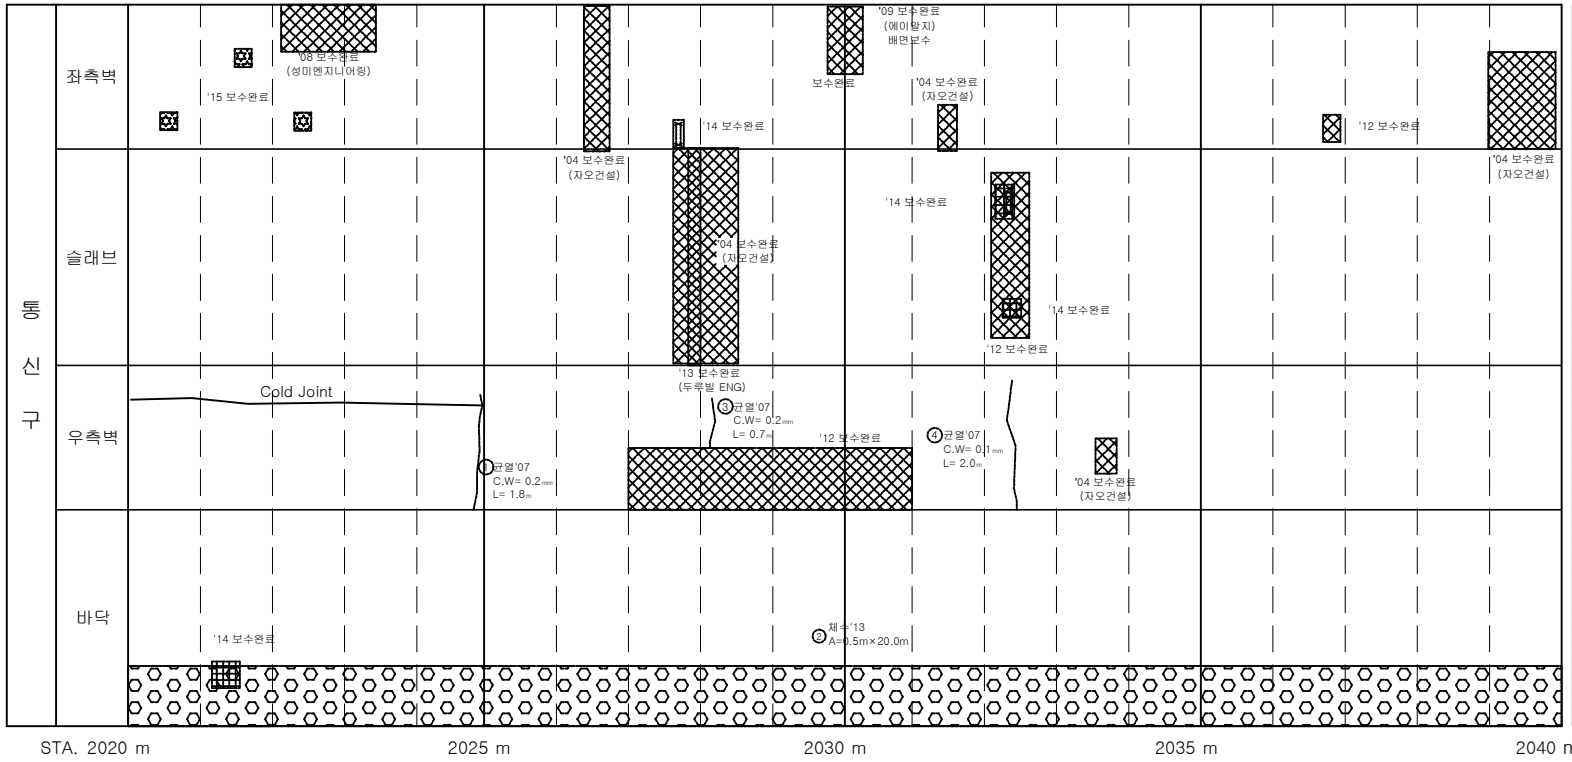

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	계소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
2	2013	체수	0.50	20.00		10.00	㎡	1				
3	2007	균열	0.20	0.70		0.70	m	1				
4	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락공동구 - 송이로(STA.2038m)작업구 26번

KEYPLAN



SECTION



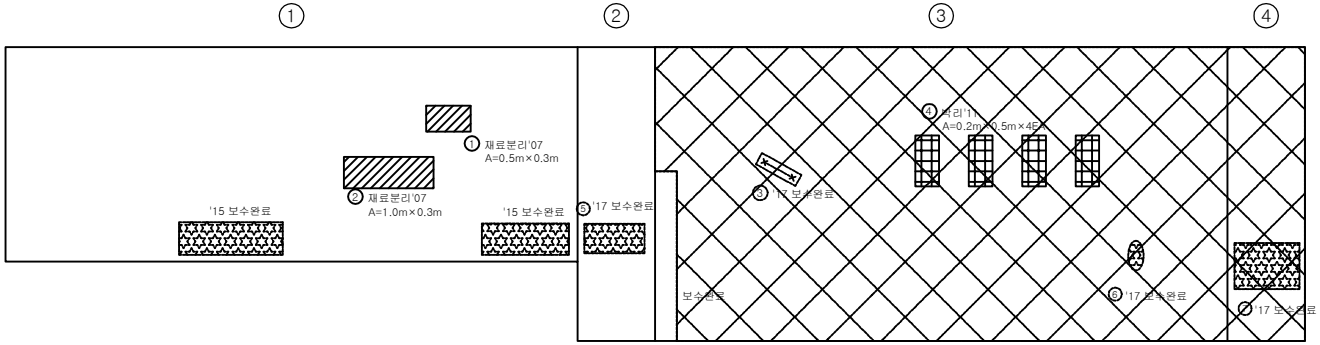

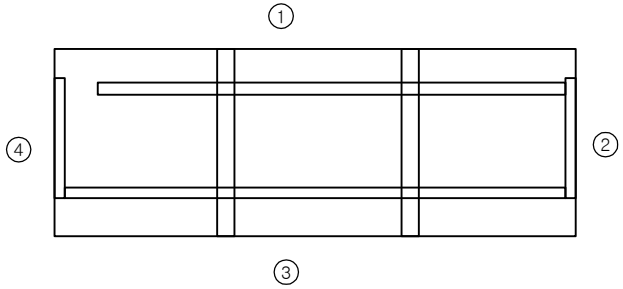

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적	
1	2007	재료분리	0.50	0.30		0.15	㎡	1				
2	2007	재료분리	1.00	0.30		0.30	㎡	1				
3	2011	철근노출	0.10	1.00		0.10	㎡	1	2017	단면복구(땜질)	0.12	
4	2011	박리	0.20	0.50		0.40	㎡	4				
5	2013	백태	0.30	0.80		0.24	㎡	1	2017	표면처리공법	0.29	
6	2013	백태	0.10	0.30		0.03	㎡	1	2017	표면처리공법	0.04	
7	2013	백태	0.50	1.00		0.50	㎡	1	2017	표면처리공법	0.60	

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2015년 공동구 정밀점검용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

작업구 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.2040.0 m ~ 2060.0m) 통신구 구간



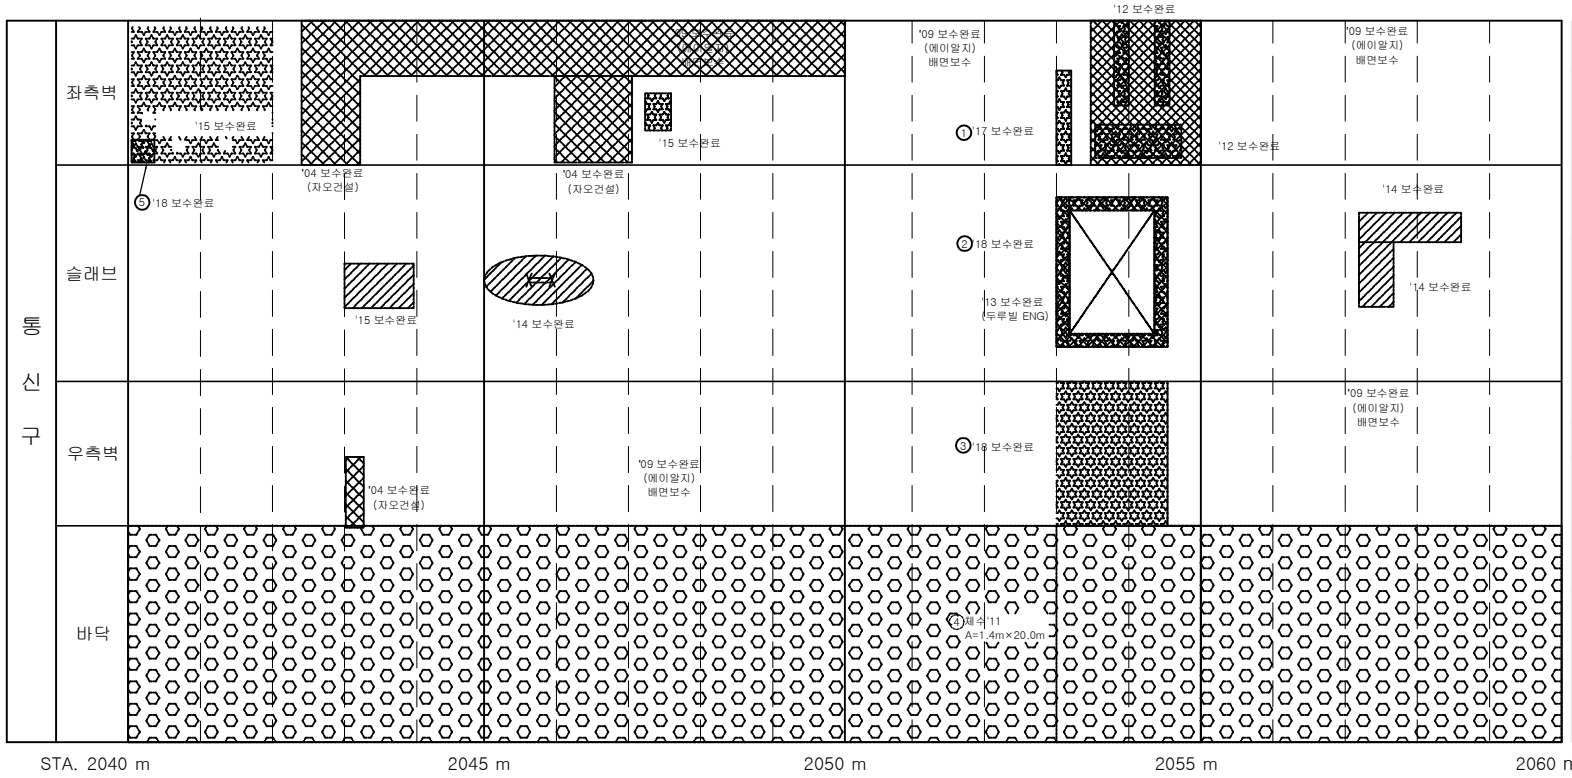

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	백태	0.10	1.60		0.16	㎡	1	2017	표면처리공법	0.19	
2	2007	백태	0.30	2.50		0.75	㎡	1	2018	표면처리공법	0.90	
3	2007	백태	1.50	2.30		3.45	㎡	1	2018	표면처리공법	4.14	
4	2011	체수	1.40	20.0		28.00	㎡	1				
5	2017	백태	0.30	0.30		0.09	㎡	1	2018	표면처리공법	0.11	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도

가락 공동구 - 송이로(STA.2060.0 m ~ 2065.0m) 통신구 구간



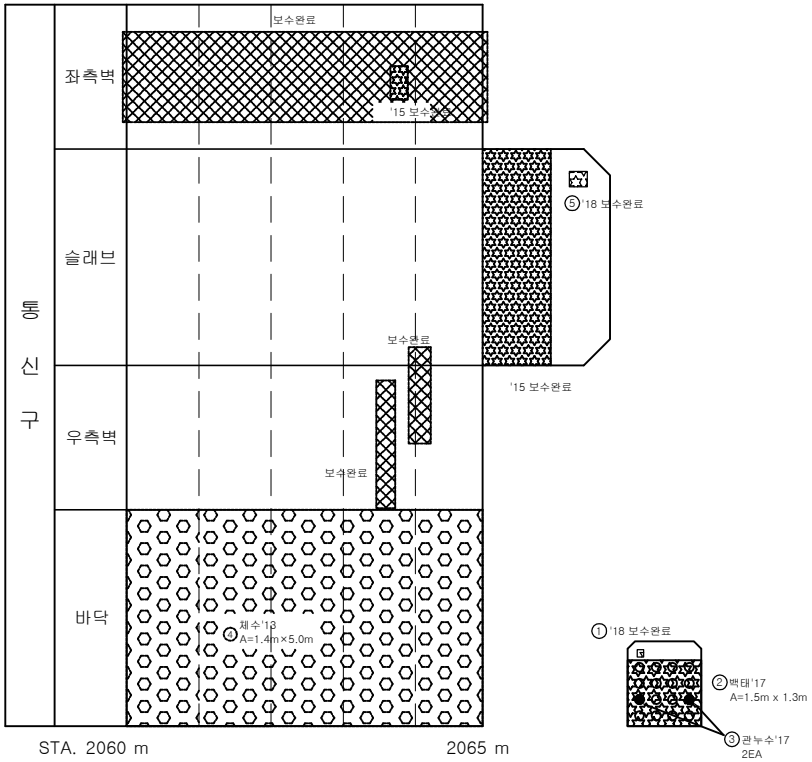

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2017	누수,백태	0.10	0.10		0.01	㎡	1	2018	배면누수보수	0.01	
2	2017	백태	1.50	1.30		1.95	㎡	1				
3	2017	관누수				2.00	EA	2				
4	2013	체수	1.40	5.00		7.00	㎡	1				
5	2017	누수,백태	0.10	0.10		0.01	㎡	1	2018	배면누수보수	0.01	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 송이로 외관조사망도
