가락공동구
(양재대로)

가락 공동구 - 양재대로(STA. 0 m ~ 20 m) 통신구 구간





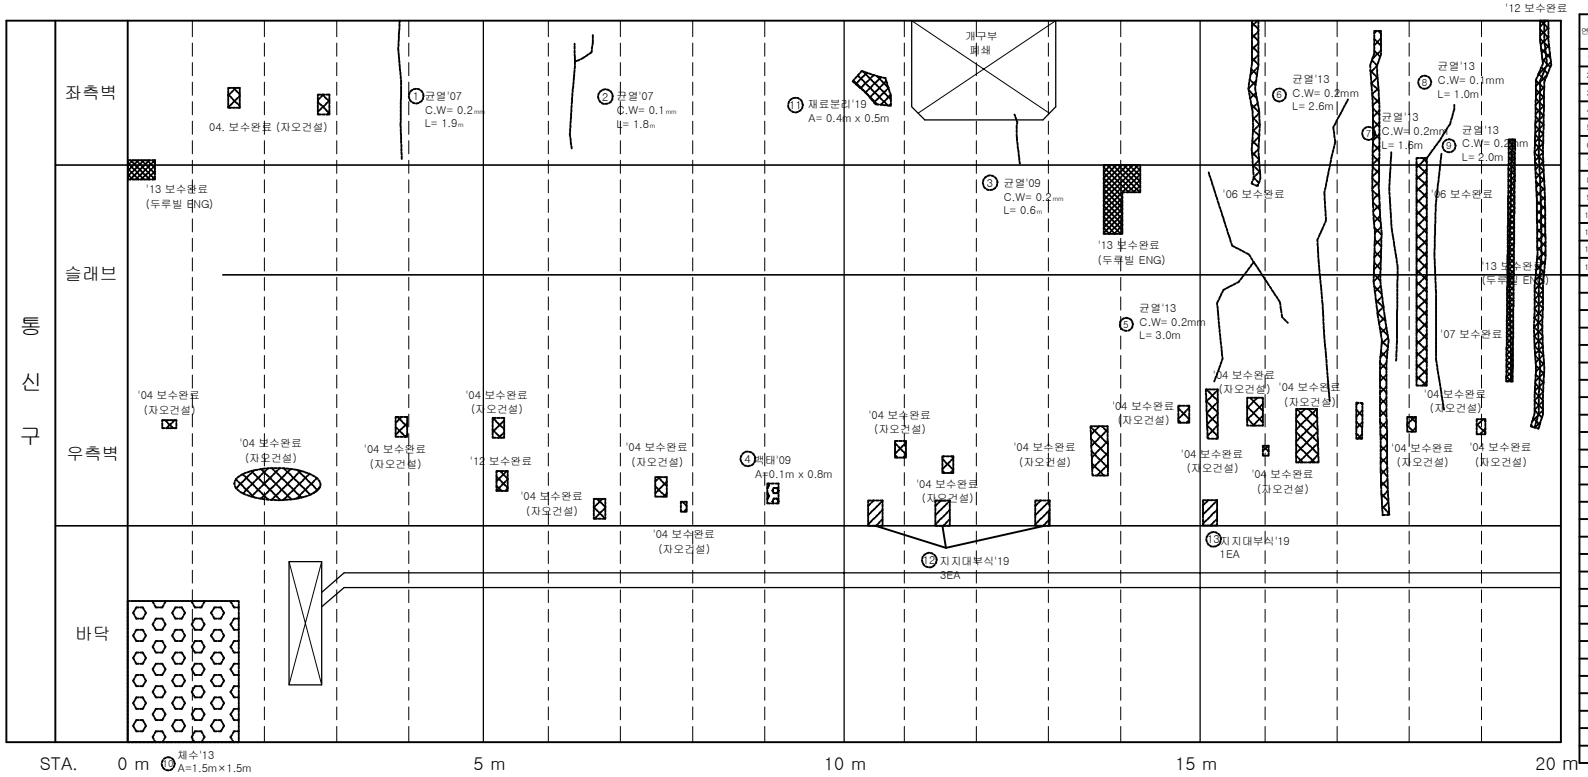

손 상 물 량 표

연번	발견년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	1.90		1.90	m	1				
2	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
3	2009	균열	0.20	0.60		0.60	m	1				
4	2009	백태	0.10	0.80		0.08	㎡	1				
5	2013	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
6	2013	균열	0.20	2.60		2.60	m	1				
7	2013	균열	0.20	1.60		1.60	m	1				
8	2013	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
9	2013	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
10	2013	채수	1.50	1.50		2.25	㎡	1				
11	2019	재료분리	0.40	0.50		0.20	㎡	1				신규
12	2019	지지대부식				3.00	EA	3				신규
13	2019	지지대부식				1.00	EA	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -양재대로 외관조사망도

가락 공동구 - 양재대로(STA.20 m ~40 m) 통신구 구간





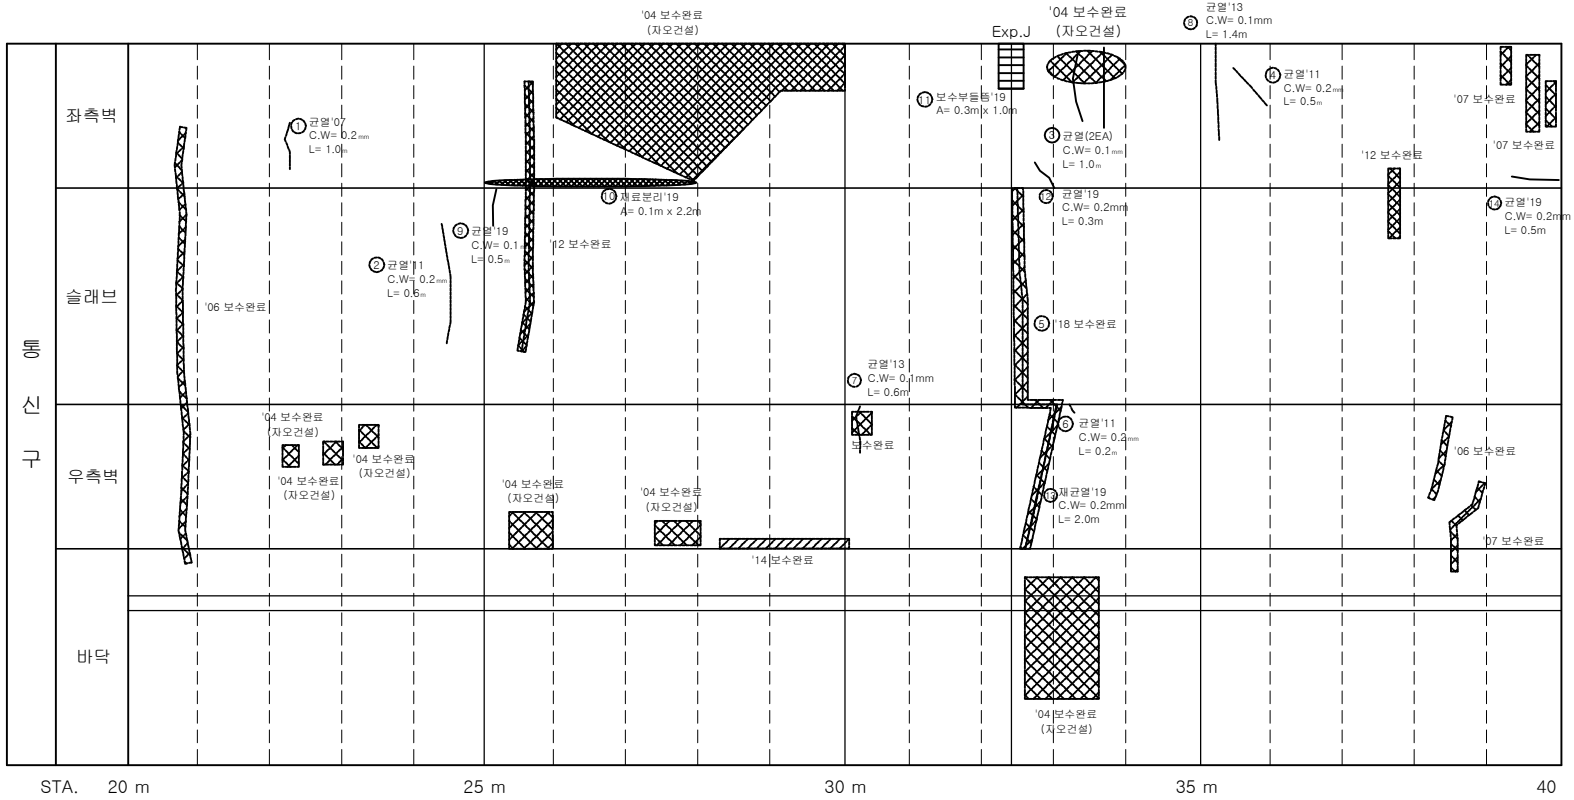

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
2	2011	균열	0.20	0.60		0.60	m	1				
3	2013	균열	0.10	2.00		4.00	m	2				
4	2011	균열	0.20	0.50		0.50	m	1				
5	2011	균열	0.20	6.80		6.80	m	1	2018	표면처리공법	8.16	
6	2011	균열	0.20	0.20		0.20	m	1				
7	2013	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
8	2013	균열	0.10	1.40		1.40	m	1				
9	2019	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				신규
10	2019	재료분리	0.10	2.20		0.22	㎡	1				신규
11	2019	보수부들림	0.30	1.00		0.30	㎡	1				신규
12	2019	균열	0.20	0.30		0.30	m	1				신규
13	2019	재균열	0.20	2.00		2.00	m	1				신규
14	2019	균열	0.20	0.50		0.50	m	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -양재대로 외관조사망도

가락 공동구 - 양재대로(STA.40 m ~60 m) 통신구 구간





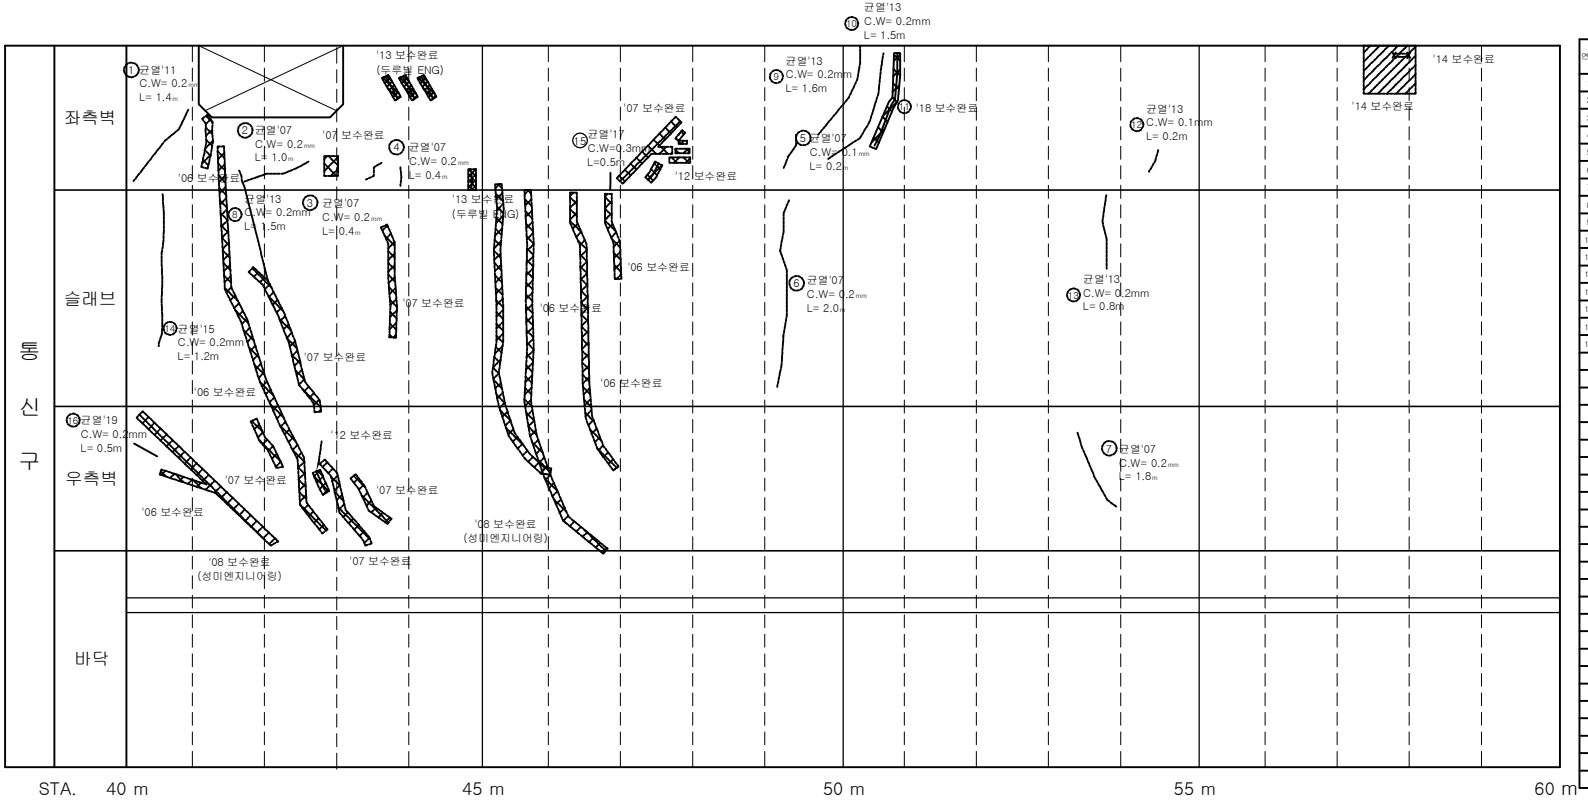

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량		
1	2011	균열	0.20	1.40		1.40	m	1					
2	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1					
3	2007	균열	0.20	0.40		0.40	m	1					
4	2007	균열	0.20	0.40		0.40	m	1					
5	2007	균열	0.10	0.20		0.20	m	1					
6	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1					
7	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1					
8	2013	균열	0.20	1.50		1.50	m	1					
9	2013	균열	0.20	1.60		1.60	m	1					
10	2013	균열	0.20	1.50		1.50	m	1					
11	2013	균열	0.20	1.50		1.50	m	1	2018	표면처리공법	1.80		
12	2013	균열	0.10	0.20		0.20	m	1					
13	2013	균열	0.20	0.80		0.80	m	1					
14	2015	균열	0.20	1.20		1.20	m	1					
15	2017	균열	0.30	0.50		0.50	m	1					
16	2019	균열	0.20	0.50		0.50	m	1					신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -양재대로 외관조사망도

가락공동구 - 양재대로(STA.46m)작업구 30번

KEYPLAN



SECTION



BOX A

① 좌측벽 ② 슬래브 ③ 우측벽 ④ 바닥

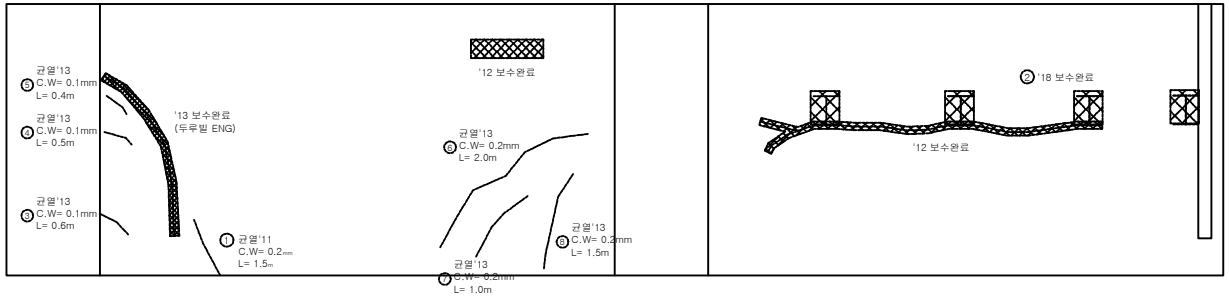

BOX B

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

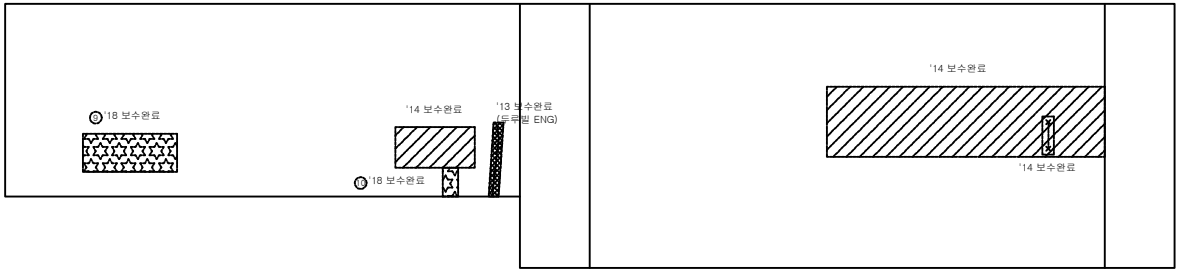

출입구



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2011	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
2	2011	H빔노출		4.00		4.00	EA	4	2018	단면복구공법	4.80	
3	2013	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
4	2013	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
5	2013	균열	0.10	0.40		0.40	m	1				
6	2013	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
7	2013	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
8	2013	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
9	2013	백태	0.50	1.00		0.50	㎡	1	2018	표면처리공법	0.60	
10	2013	백태	0.30	0.60		0.18	㎡	1	2018	표면처리공법	0.22	
11	2019	ㄷ빔 부식		21.0		21.0	m	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 작업구 외관조사망도

가락공동구 - 양재대로(STA.00m)작업구 28-1번





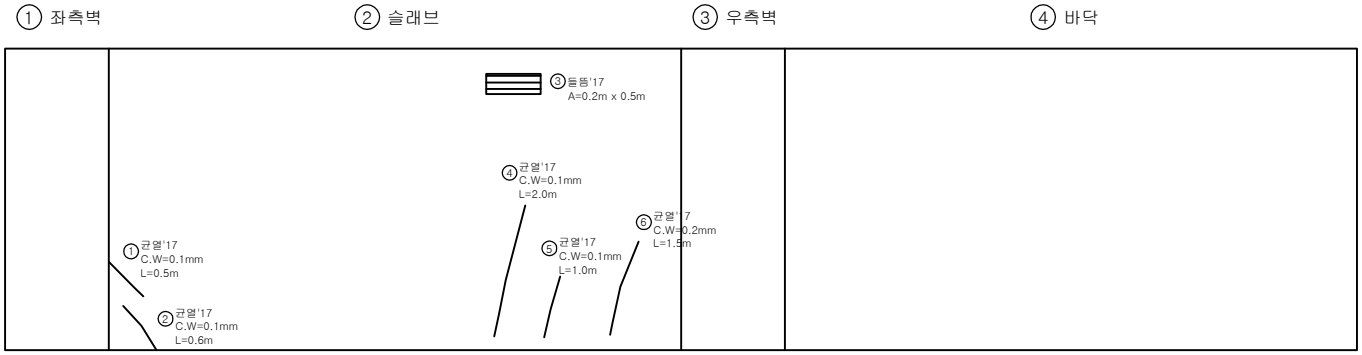

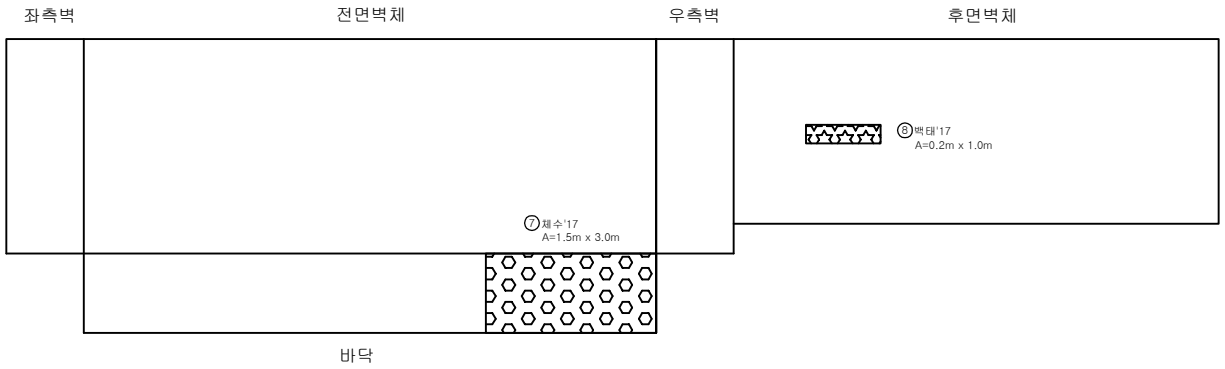

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량		
1	2017	균열	0.10	0.50		0.50	m	1					
2	2017	균열	0.10	0.60		0.60	m	1					
3	2017	들뜸	0.20	0.50		0.10	㎡	1					
4	2017	균열	0.10	2.00		2.00	m	1					
5	2017	균열	0.10	1.00		1.00	m	1					
6	2017	균열	0.20	1.50		1.50	m	1					
7	2017	체수	1.50	3.00		4.50	㎡	1					
8	2017	백태	0.20	1.00		0.20	㎡	1					

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 작업구 외관조사망도

가락공동구 - 양재대로(STA.00m)작업구 28-2번

KEYPLAN



SECTION



① 좌측벽 ② 슬래브 ③ 우측벽 ④ 바닥



좌측벽 전면벽체 우측벽 후면벽체

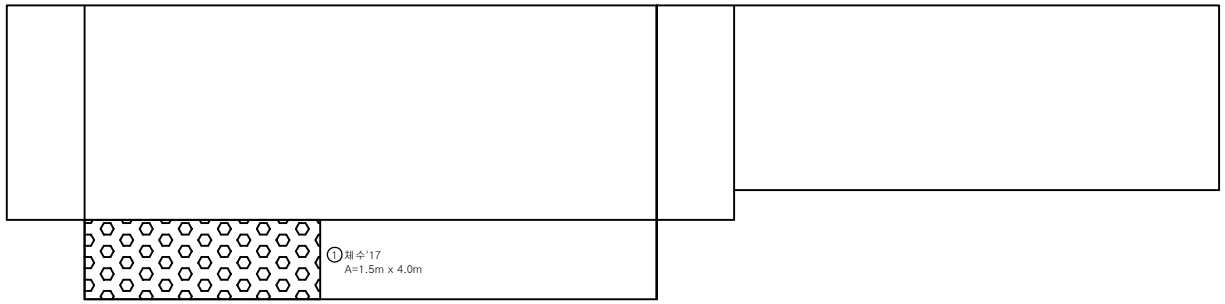

바닥

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2017	체수	1.50	4.00		6.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 작업구 외관조사망도

가락 공동구 - 양재대로(STA.0 m ~ 20 m) 전력, 상수구 구간





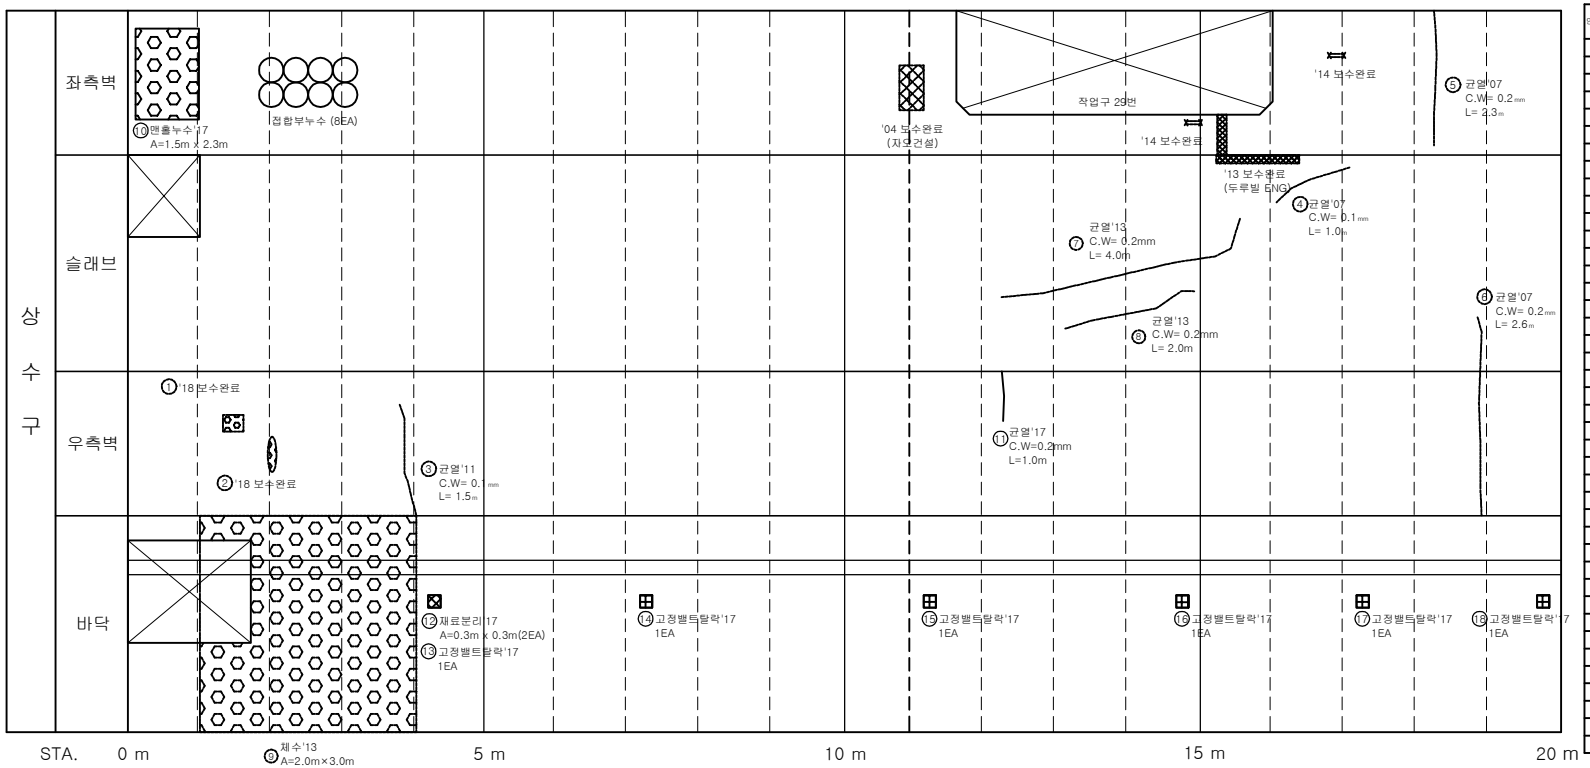

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2011	백태	0.20	0.20		0.04	㎡	1	2018	표면처리공법	0.05	
2	2011	백태	0.10	0.30		0.03	㎡	1	2018	표면처리공법	0.04	
3	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
4	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
6	2013	균열	0.20	2.60		2.60	m	1				
7	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
8	2013	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
9	2013	채수	2.00	3.00		6.00	㎡	1				
10	2017	맨홀누수	1.50	2.30		3.45	㎡	1				
11	2017	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
12	2017	재료분리	0.30	0.30		0.18	㎡	2				
13	2017	고정볼트탈락				1.00	EA	1				
14	2017	고정볼트탈락				1.00	EA	1				
15	2017	고정볼트탈락				1.00	EA	1				
16	2017	고정볼트탈락				1.00	EA	1				
17	2017	고정볼트탈락				1.00	EA	1				
18	2017	고정볼트탈락				1.00	EA	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -양재대로 외관조사망도

가락공동구 - 양재대로(STA.13m)작업구 29번

KEYPLAN



SECTION



① 좌측벽 ② 슬래브 ③ 우측벽 ④ 바닥



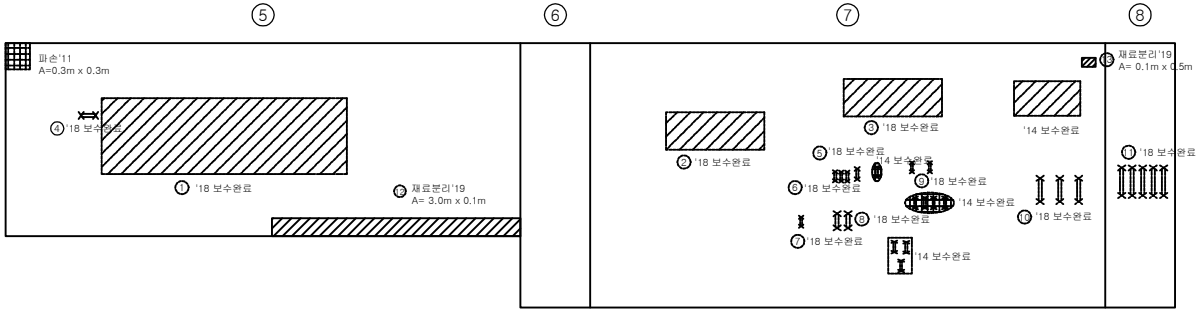



⑭ ㄷ빔 부식'19
L= 21m

손 상 물 량 표

연번	건설년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	재료분리	1.00	3.00		3.00	㎡	1	2018	단면복구공법	3.60	
2	2011	재료분리	0.50	1.20		0.60	㎡	1	2018	단면복구공법	0.72	
3	2011	재료분리	0.50	1.20		0.60	㎡	1	2018	단면복구공법	0.72	
4	2017	철근노출	0.20	0.50		0.10	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.12	
5	2017	철근노출	0.20	0.30		0.06	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.07	
6	2017	철근노출	0.20	0.20		0.12	㎡	3	2018	단면복구(방청)	0.14	
7	2017	철근노출	0.20	0.20		0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.05	
8	2017	철근노출	0.50	0.50		0.50	㎡	2	2018	단면복구(방청)	0.60	
9	2017	철근노출	0.20	0.20		0.08	㎡	2	2018	단면복구(방청)	0.10	
10	2017	철근노출	0.30	0.80		0.72	㎡	3	2018	단면복구(방청)	0.86	
11	2017	철근노출	0.30	0.80		1.20	㎡	5	2018	단면복구(방청)	1.44	
12	2019	재료분리	3.00	0.10		0.30	㎡	1				신규
13	2019	재료분리	0.10	0.50		0.05	㎡	1				신규
14	2019	ㄷ빔 부식		21.0		21.0	m	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 작업구 외관조사망도

가락 공동구 - 양재대로(STA.20 m ~ 40 m) 전력, 상수구 구간





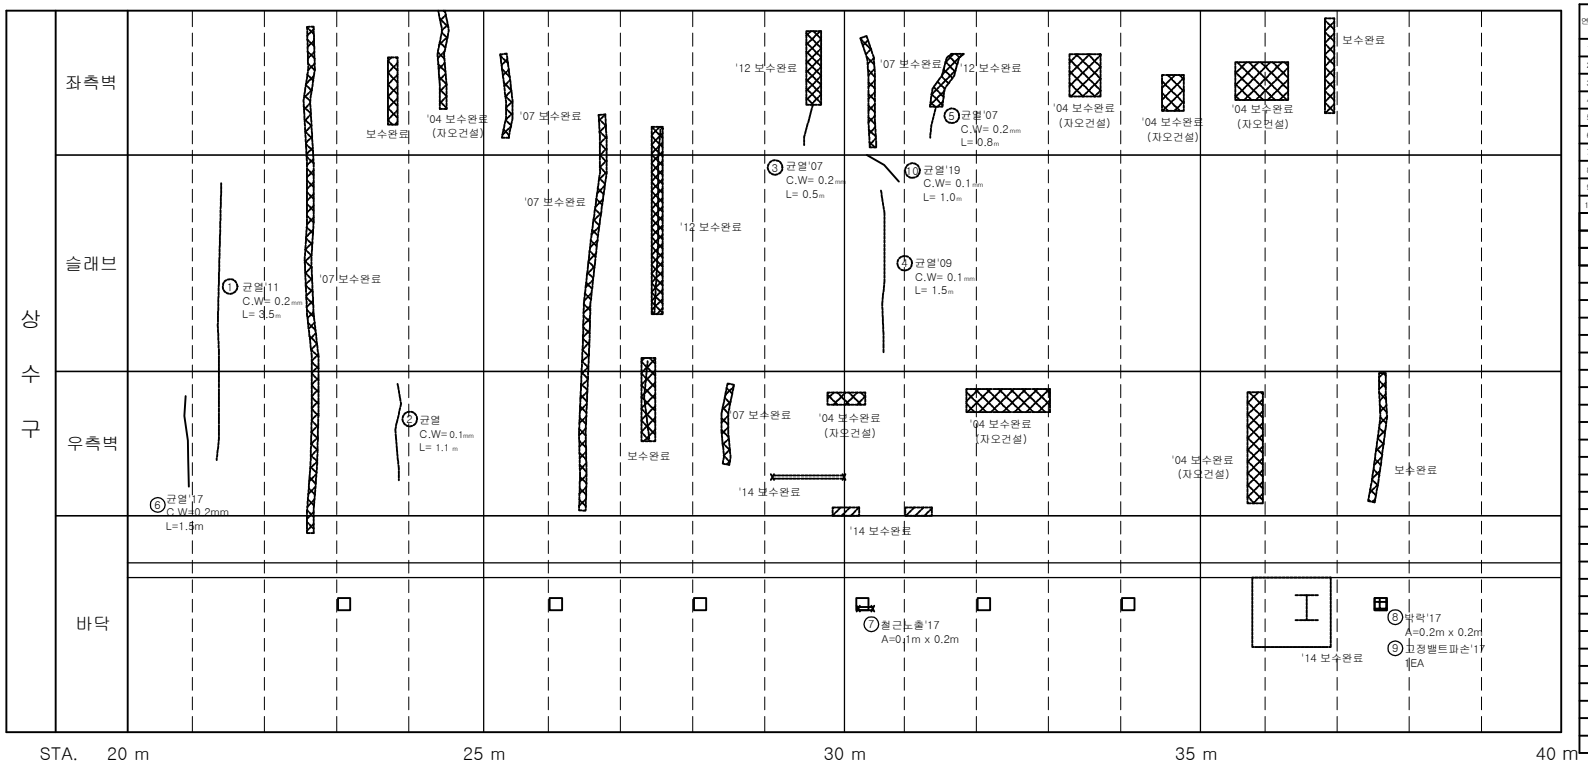

손 상 물 량 표

연번	발견년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
2	기존	균열	0.10	1.10		1.10	m	1				
3	2007	균열	0.20	0.50		0.50	m	1				
4	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
5	2007	균열	0.20	0.80		0.80	m	1				
6	2017	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
7	2017	철근노출	0.10	0.20		0.02	㎡	1				
8	2017	박락	0.20	0.20		0.04	㎡	1				
9	2017	고정볼트파손				1.00	EA	1				
10	2019	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -양재대로 외관조사망도

가락 공동구 - 양재대로(STA. 40 m ~ 60 m) 전력, 상수구 구간





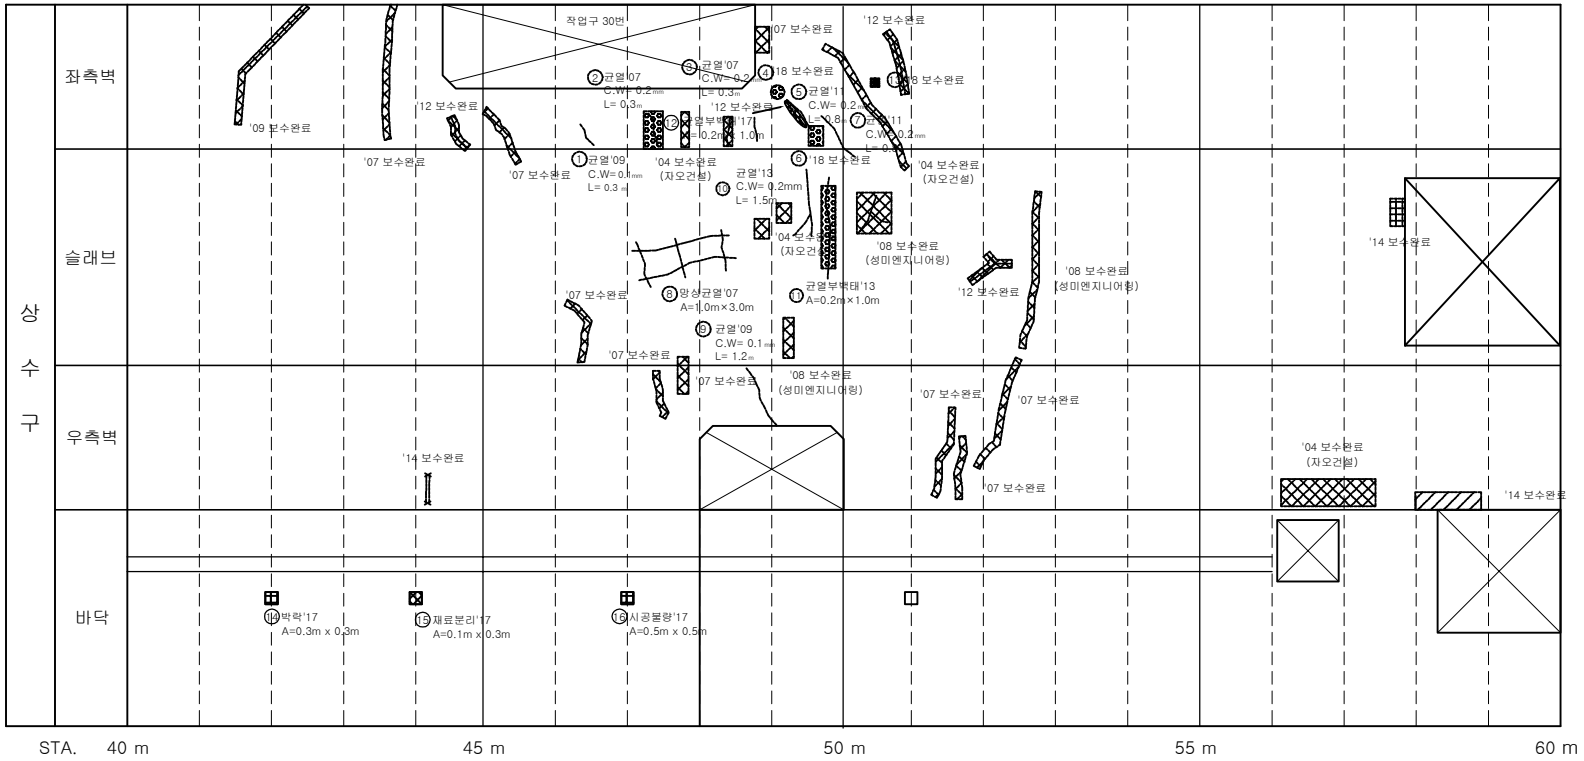

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량		
1	2009	균열	0.10	0.30		0.30	m	1					
2	2007	균열	0.20	0.30		0.30	m	1					
3	2007	균열	0.20	0.30		0.30	m	1					
4	2011	백태	0.10	0.10		0.01	㎡	1	2018	표면처리공법	0.01		
5	2011	균열	0.20	0.80		0.80	m	1					
6	2011	백태	0.30	0.30		0.09	㎡	1	2018	표면처리공법	0.11		
7	2011	균열	0.20	0.80		0.80	m	1					
8	2007	망상균열	1.00	3.00		3.00	㎡	1					
9	2009	균열	0.10	1.20		1.20	m	1					
10	2013	균열	0.20	1.50		1.50	m	1					
11	2013	균열부백태	0.20	1.00		0.20	㎡	1					
12	2017	균열부백태	0.20	1.00		0.20	㎡	1					
13	2017	백태	0.10	0.10		0.01	㎡	1	2018	표면처리공법	0.01		
14	2017	박락	0.30	0.30		0.09	㎡	1					
15	2017	재료분리	0.10	0.30		0.03	㎡	1					
16	2017	시공불량	0.50	0.50		0.25	㎡	1					

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 -양재대로 외관조사망도

가락공동구 - 양재대로(STA.60m) 맨홀 38m

KEYPLAN

SECTION 1-1



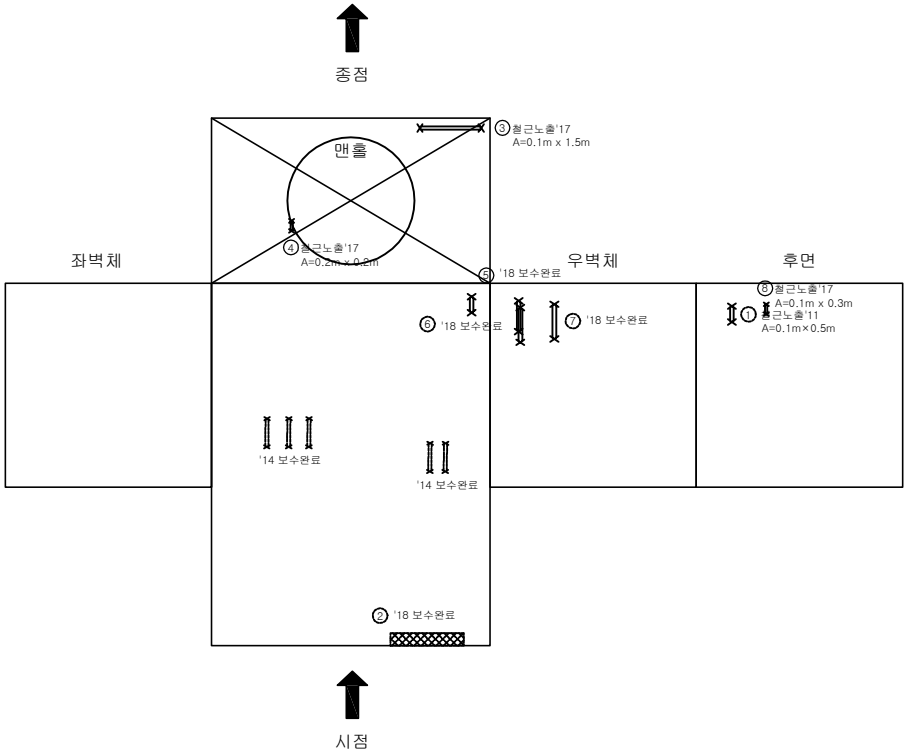

손 상 물 량 표

연번	발견년도	결함내용	결함규모						최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	불량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	불량		
1	2011	철근노출	0.10	0.50		0.05	㎡	1					
2	2011	재료분리	0.20	1.00		0.20	㎡	1	2018	단면복구공법	0.24		
3	2017	철근노출	0.10	1.50		0.15	㎡	1					
4	2017	철근노출	0.20	0.20		0.04	㎡	1					
5	2017	철근노출	0.10	1.00		0.10	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.12		
6	2017	철근노출	0.10	0.50		0.05	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.06		
7	2017	철근노출	0.10	1.30		0.26	㎡	2	2018	단면복구(방청)	0.31		
8	2017	철근노출	0.10	0.30		0.03	㎡	1					

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 양재대로 외관조사망도
