경사/방향	50/290
연　　장	460 m
높　　이	85 m
소 단 수	7

범 례

벌목제근요망(수목) | 개 비 온 | 숏크리트 | 몰탈격자블럭 | 누 수

· 평면파괴에 의해 붕괴된 사면

· 숏크리트와 격자식 앵커로 보강, 붕괴하부에는 흙쌓기를 해서 사면구배 완화

· 사면 좌우측 부분 녹화공법 적용

· 흙쌓기 부분과 암사면 부분에서는 이완암방지망 설치

· 사면방향으로 각도 30~50의 절리 및 단층들이 많이 분포

· 사면 우측부 1소단 하부의 파쇄와 풍화가 심함

· 단층들은 틈새에 점토가 충전되어 있음

· 층리면을 따라 풍화가 심함

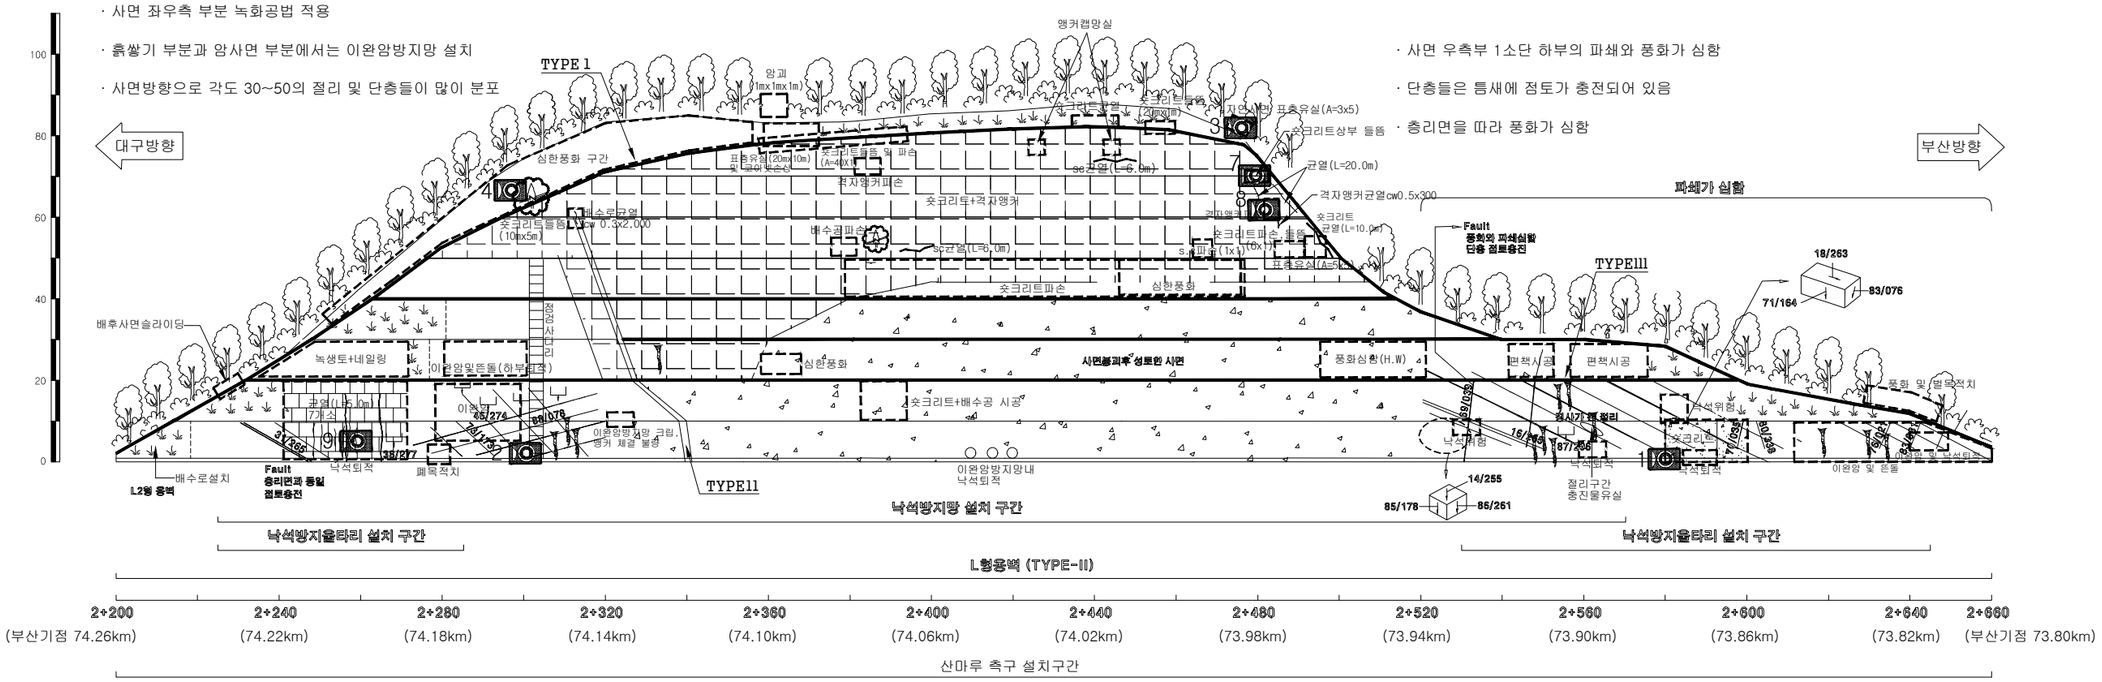

배 수 로 제 원 (단 위 : m)		
TYPE I (산마루측구)	TYPE II (수직배수로)	TYPE III (소단배수로)
		

대구절토 19 / 부산기점 73.80~74.26km (4공구 STA.2+200~2+660)

(주)아워브레인 OUR BRAIN CO.,LTD	Project Title **2015년 하반기 시설물 안전점검용역(3구간 정밀점검)**	Drawing Title **대구절토 19 외관조사망도**	Note
