당진교 S2 SLAB 상면

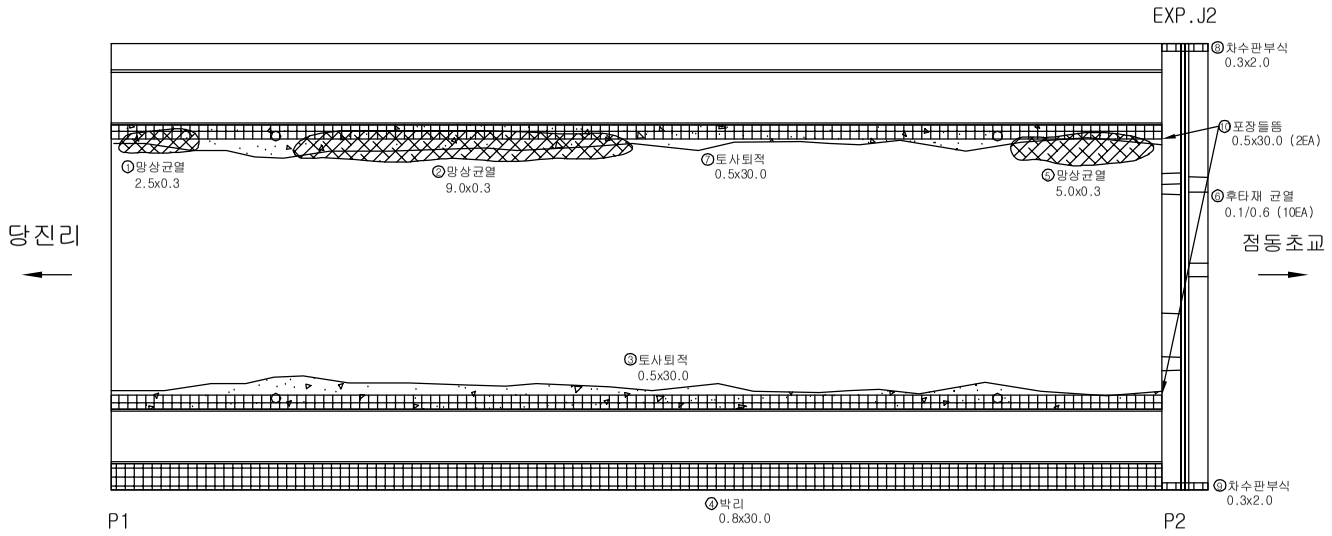

연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		m, mm	m		물량	단위
1	포장망상균열	2.5	0.3	1EA	0.75	㎡
2	포장망상균열	9.0	0.3	1EA	2.70	㎡
3	토사퇴적	0.5	30.0	1EA	15.00	㎡
4	박리	0.8	30.0	1EA	24.00	㎡
5	포장망상균열	5.0	0.3	1EA	1.50	㎡
6	후타재균열	0.1	0.6	10EA	6.00	m
7	토사퇴적	0.5	30.0	1EA	15.00	㎡
8	차수판부식			1EA	1	EA
9	차수판부식			1EA	1	EA
10	포장들뜸	0.5	30.0	2EA	30.00	㎡

KEY PLAN

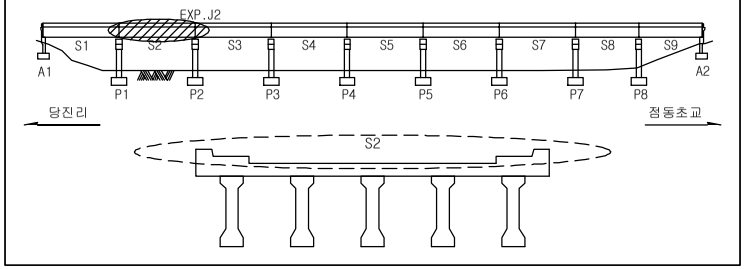

손상범례



과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	품질자	검토자	도 면 명
당진교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				당진교 S2 SLAB 상면
