삼합교 S2 SLAB 상면

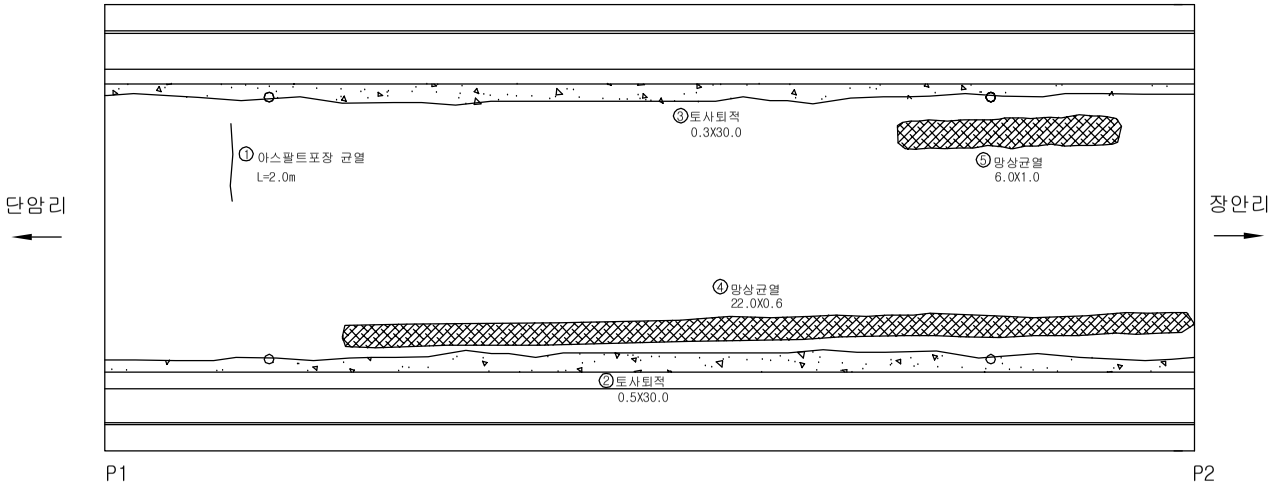

연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		mm, m	m		물량	단위
1	포장균열		2.0	1EA	2.00	m
2	토사퇴적	0.5	30.0	1EA	15.00	㎡
3	토사퇴적	0.3	30.0	1EA	9.00	㎡
4	포장망상균열	22.0	0.6	1EA	13.20	㎡
5	포장망상균열	6.0	1.0	1EA	6.00	㎡

KEY PLAN



손상범례



과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	품질자	검토자	도 면 명
삼합교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				삼합교 S2 SLAB 상면
