삼합교 S3 SLAB 상면

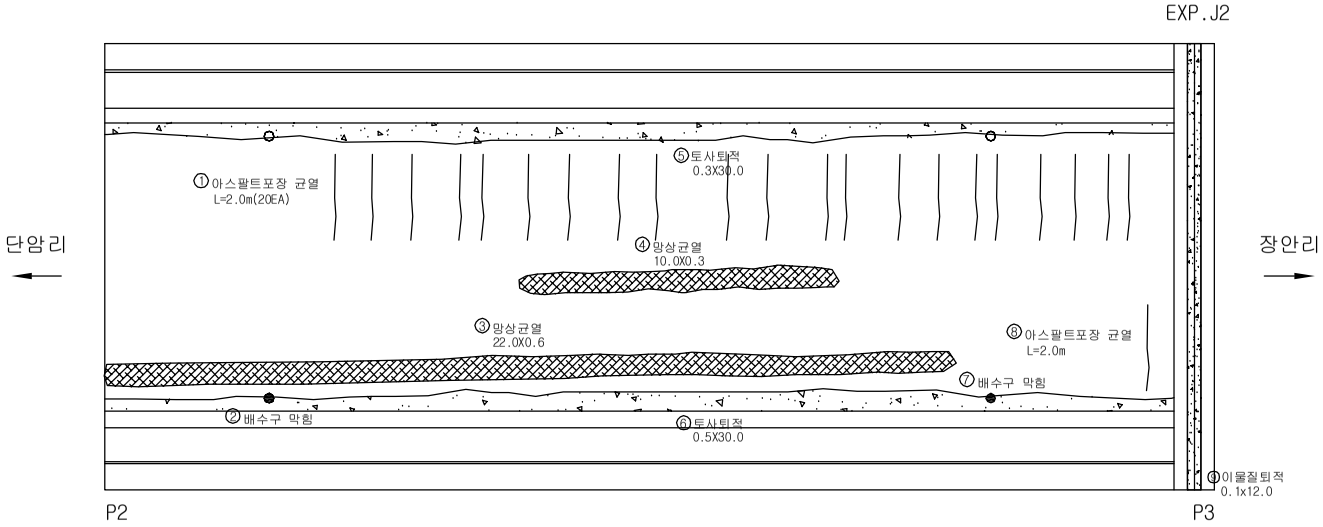

연번	손상내용	폭	연장	개소	총량	
		mm, m	m		물량	단위
1	포장균열		2.0	20EA	40.00	m
2	배수구막힘			1EA	1	EA
3	포장망상균열	22.0	0.6	1EA	13.20	㎡
4	포장망상균열	10.0	0.3	1EA	3.00	㎡
5	토사퇴적	0.3	30.0	1EA	9.00	㎡
6	토사퇴적	0.5	30.0	1EA	15.00	㎡
7	배수구막힘			1EA	1	EA
8	포장균열		2.0	1EA	2.00	m
9	이물질퇴적	0.1	12.0	1EA	12.00	m

KEY PLAN

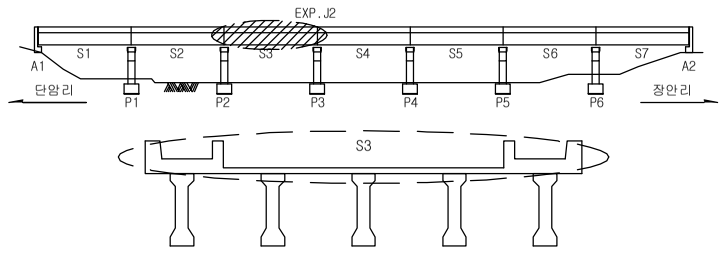

손상범례



과 업 명	시 행 청	점 검 기 관	축 척	점검일자	과업책임자	품질자	검토자	도 면 명
삼합교 정기점검	여주시청	(주)명성엔지니어링	Non-Scale	2016.02				삼합교 S3 SLAB 상면
