

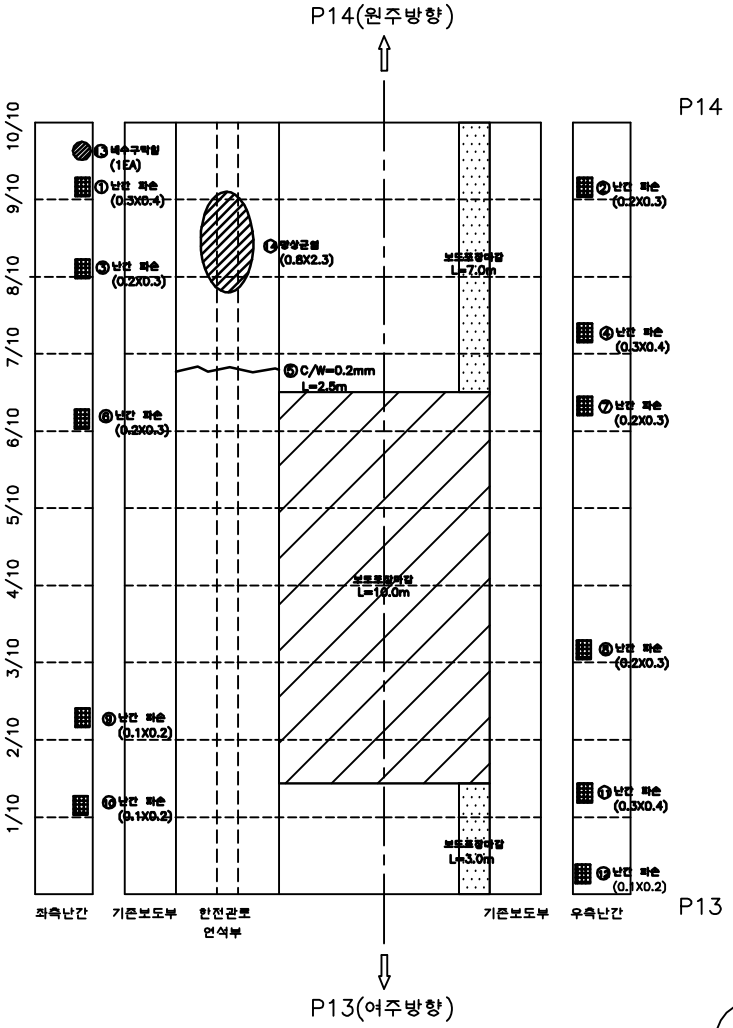

S14 SLAB 상면

현황조사결과표

번호	위치,구조 (마감철대)	손상형태	손상규모				사진 번호	비고
			W(mm,m)	L(m)	개소	계(m,m²,EA)		
1	난간	파손	0.3	0.4	1	0.12		
2	난간	파손	0.2	0.3	1	0.06		
3	난간	파손	0.2	0.3	1	0.06		
4	난간	파손	0.3	0.4	1	0.12		
5	한전관 보호구체	균열	0.2	2.5	1	2.50		
6	난간	파손	0.2	0.3	1	0.06		
7	난간	파손	0.2	0.3	1	0.06		
8	난간	파손	0.2	0.3	1	0.06		
9	난간	파손	0.1	0.2	1	0.02		
10	난간	파손	0.1	0.2	1	0.02		
11	난간	파손	0.3	0.4	1	0.12		
12	난간	파손	0.1	0.2	1	0.02		
13	배수시설	배수구막힘	-	-	1	1	13	
14	포장부	방상균열	0.8	2.3	1	1.84	14	
