

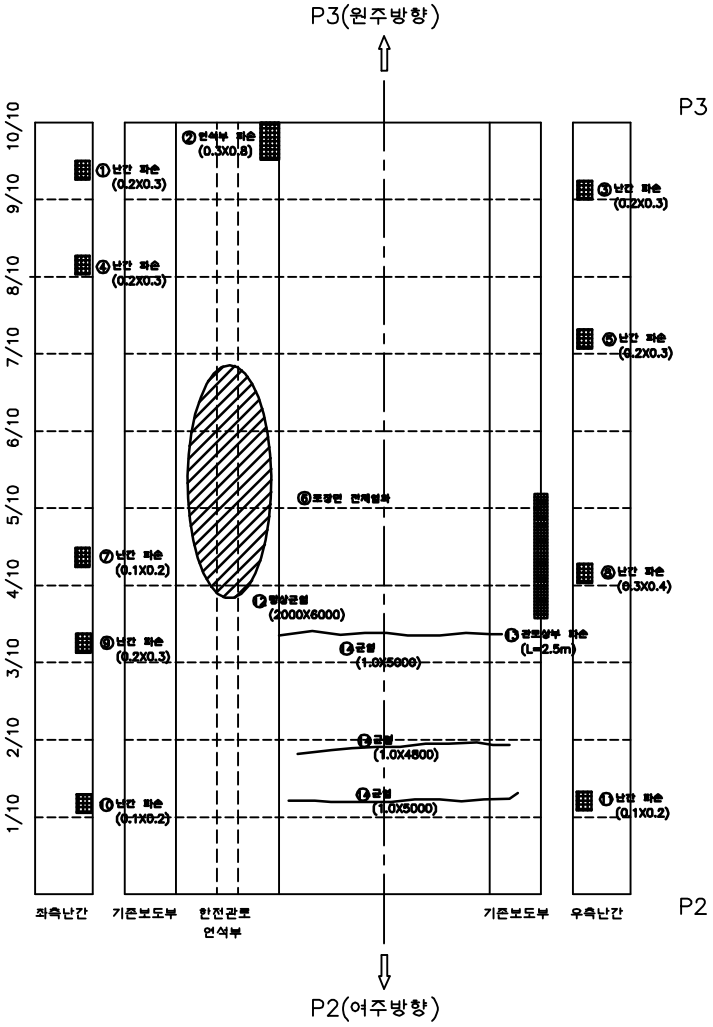

S3 SLAB 상면

현황조사결과표

번호	위치,구조 (마감철대)	손상형태	손상규모				사진 번호	비고
			W(mm,m)	L(m)	개소	계(m,m²,EA)		
1	난간	파손	0.2	0.3	1	0.06		
2	연석부	파손	0.3	0.8	1	0.24	2	재손상
3	난간	파손	0.2	0.3	1	0.06		
4	난간	파손	0.2	0.3	1	0.06		
5	난간	파손	0.2	0.3	1	0.06		
6	포장부	열화			1	-		
7	난간	파손	0.1	0.2	1	0.02		
8	난간	파손	0.3	0.4	1	0.12		
9	난간	파손	0.2	0.3	1	0.06		
10	난간	파손	0.1	0.2	1	0.02		
11	난간	파손	0.1	0.2	1	0.02		
12	한전관 보호구체	방상균열	2.0	6.0	1	12.00		
13	기타시설	관로상부 파손	-	2.5	1	2.50		
14	포장부	아스콘균열	1.0	5.0	1	5.00		
15	포장부	아스콘균열	1.0	4.8	1	4.80		
16	포장부	아스콘균열	1.0	5.0	1	5.00		
