

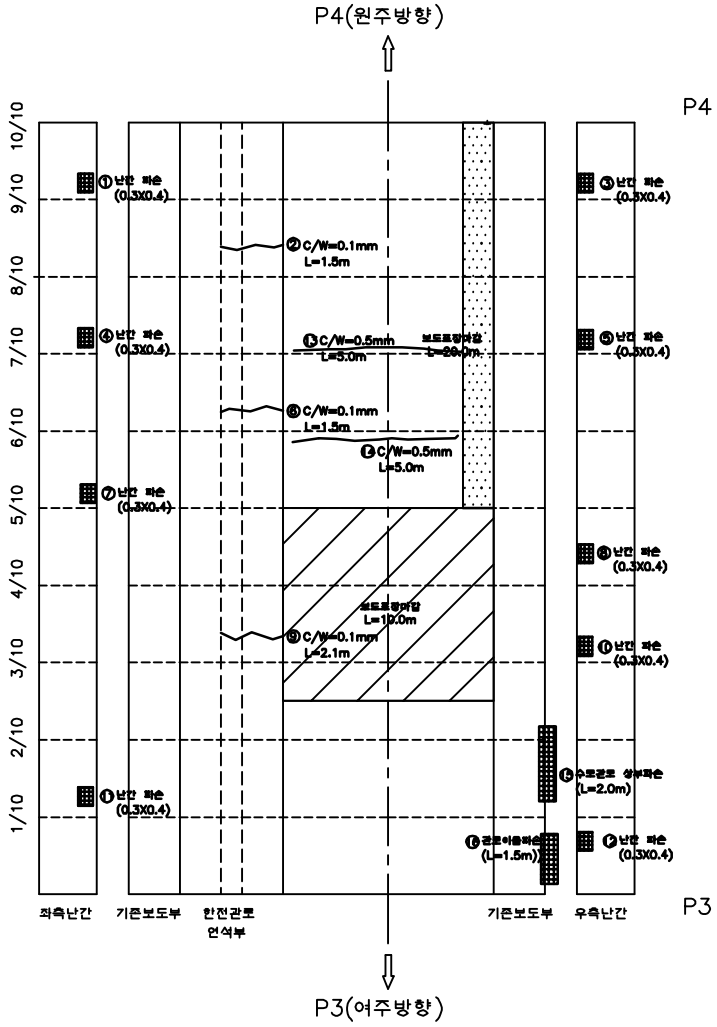

S4 SLAB 상면

현황조사결과표

번호	위치,구조 (마감형태)	손상형태	손상규모				사진 번호	비고
			W(mm,m)	L(m)	개소	계(m,m²,EA)		
1	난간	파손	0.3	0.4	1	0.12		
2	한전관 보호구체	균열						보수
3	난간	파손	0.3	0.4	1	0.12		
4	난간	파손	0.3	0.4	1	0.12		
5	난간	파손	0.3	0.4	1	0.12		
6	한전관 보호구체	균열						보수
7	난간	파손	0.3	0.4	1	0.12		
8	난간	파손	0.3	0.4	1	0.12		
9	한전관 보호구체	균열						보수
10	난간	파손	0.3	0.4	1	0.12		
11	난간	파손	0.3	0.4	1	0.12		
12	난간	파손	0.3	0.4	1	0.12		
13	포장부	아스콘균열	0.5	5.0	1	5.00		
14	포장부	아스콘균열	0.5	5.0	1	5.00		
15	기타시설	수로관로 상부 파손	-	2.0	1	2.00	3	
16	기타시설	관로 이음파손	-	1.5	1	1.50		
