도림천4복개 외 2개소
정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역

도림천 4복개 보 수 보 강 도

2019. 12

서울특별시 남부도로사업소

(주)세안안전진단 · (주)명성엔지니어링

보수보강도


구 분	도면번호	비 고
1. 보수보강도		
1.1 1련 (1순위,2순위)		
가. 바닥판상면	001 ~ 014	
나. 바닥판하면	015 ~ 028	
다. 교대	029 ~ 042	
라. 교각	043 ~ 056	
1.2 1련 (1순위)		
가. 바닥판상면	001 ~ 014	
나. 바닥판하면	015 ~ 028	
다. 교대	029 ~ 042	
라. 교각	043 ~ 056	
1.3 1련 (2순위)		
가. 바닥판상면	001 ~ 014	
나. 바닥판하면	015 ~ 028	
다. 교대	029 ~ 042	
라. 교각	043 ~ 056	

구 분	도면번호	비 고
1.4 2련 (1순위,2순위)		
가. 바닥판상면	001 ~ 035	
나. 바닥판하면	036 ~ 069	
다. 교대	070 ~ 104	
라. 교각	105 ~ 141	
1.5 2련 (1순위)		
가. 바닥판상면	001 ~ 035	
나. 바닥판하면	036 ~ 069	
다. 교대	070 ~ 104	
라. 교각	105 ~ 141	
1.6 2련 (2순위)		
가. 바닥판상면	001 ~ 035	
나. 바닥판하면	036 ~ 069	
다. 교대	070 ~ 104	
라. 교각	105 ~ 141	
2. 보수공법		

1. 보수·보강도

1.1 1련 [1순위,2순위]

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

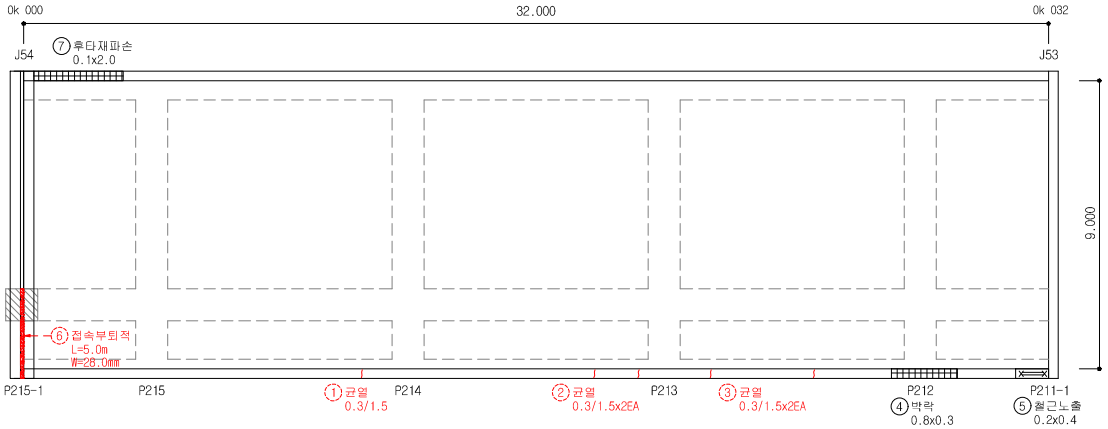


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		3.00	m	2.00					1
2	2016	균열	0.30	1.50		3.00	m	2.00					1
3	2016	균열	0.30	1.50		0.90	㎡	2.00					1
4	2019	박락	0.80	0.30		0.24	㎡	1.00				신규	1
5	2019	철근노출	0.20	0.40		0.08	㎡	1.00				신규	1
6	2016	접속부 토사퇴적		5.00		5.00	m	1.00					2
7	2019	후타재파손	0.10	2.00		0.20	㎡	1.00				신규	2
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	001

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

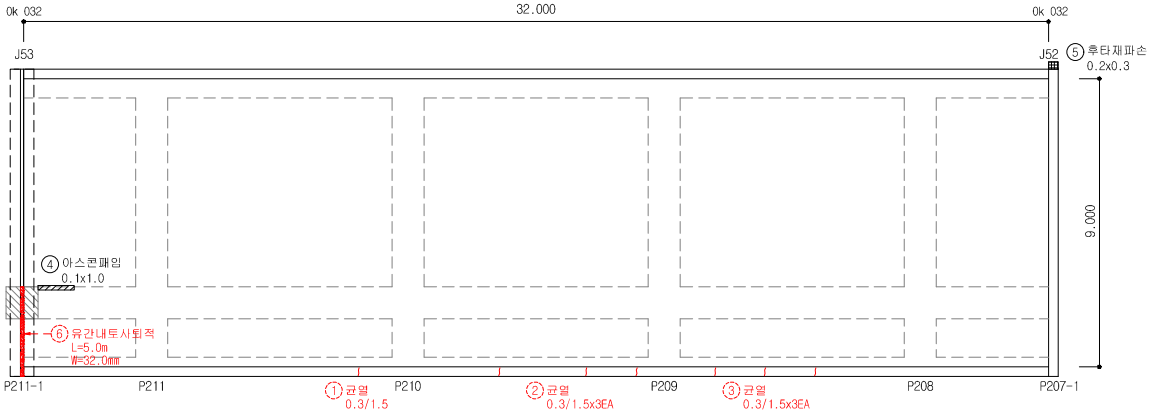


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
2	2016	균열	0.30	1.50		4.50	m	3.00					1
3	2016	균열	0.30	1.50		4.50	m	3.00					1
4	2019	아스콘패임	0.10	1.00		0.10	㎡	1.00				신규	2
5	2019	후타재파손	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00				신규	2
6	2016	유간내 토사퇴적		5.00		5.00	m	1.00					2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	002

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

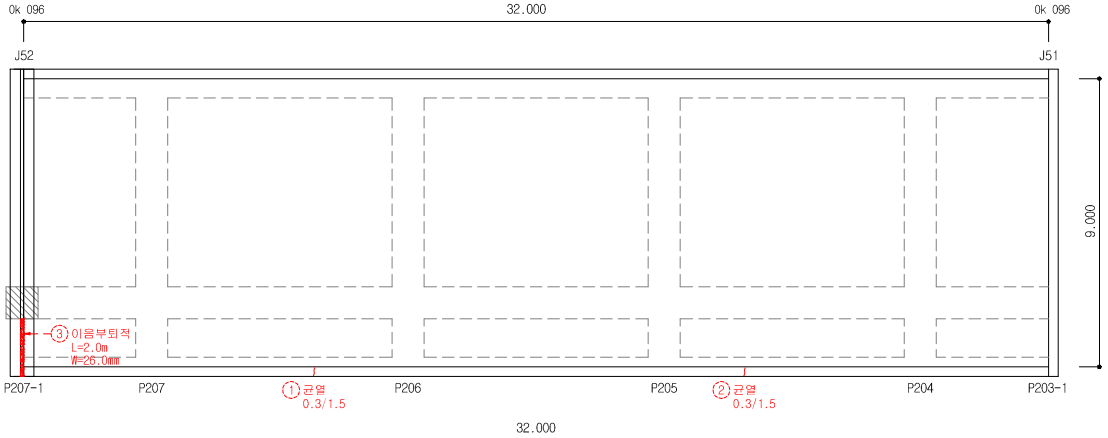


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
2	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
3	2016	이음부 퇴적		2.00		2.00	m	1.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	003

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면


손 상 물 량 표

연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	철근노출	0.20	0.20		0.08	㎡	2.00				신규	1
2	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
3	2016	박리, 박락, 철근노출	8.00	0.20		1.60	㎡	1.00					1
4	2016	균열	0.30	1.50		3.00	m	2.00					1
5	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
6	2016	유간내 토사퇴적		1.50		1.50	m	1.00					2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

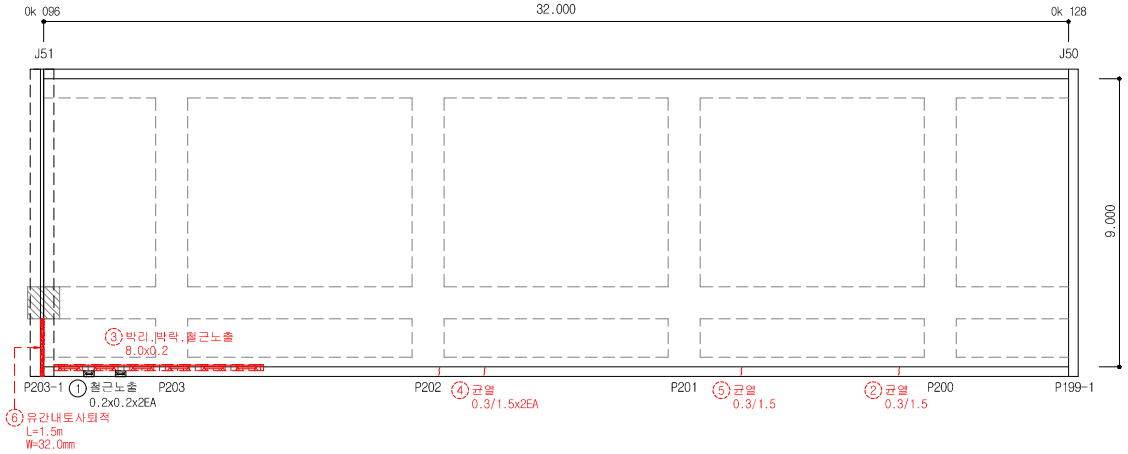


점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	004

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

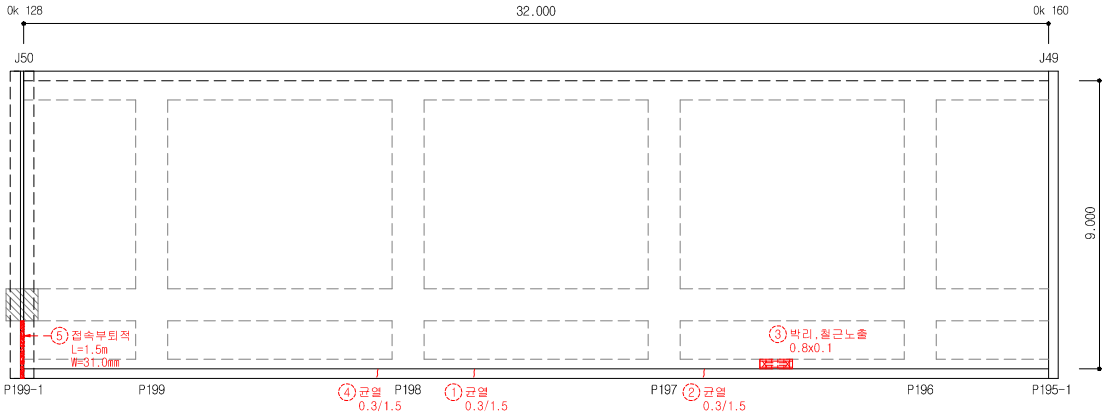


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
2	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
3	2016	박리, 철근노출	0.80	0.10		0.08	㎡	1.00					1
4	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
5	2016	접속부 토사퇴적		1.50		1.50	m	1.00					2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	005

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

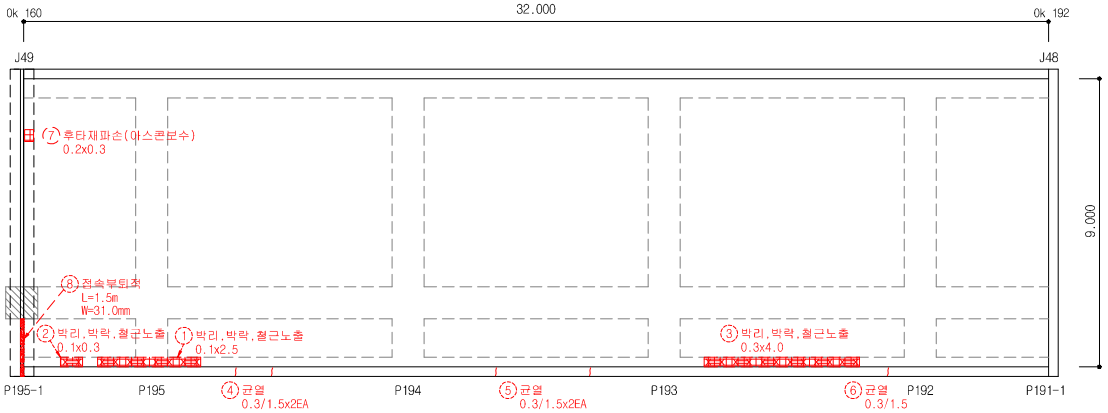


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	박리, 박락, 철근노출	0.10	2.50		0.25	㎡	1.00					1
2	2016	박리, 박락, 철근노출	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00					1
3	2016	박리, 박락, 철근노출	0.30	4.00		1.20	㎡	1.00					1
4	2016	균열	0.30	1.50		3.00	m	2.00					1
5	2016	균열	0.30	1.50		3.00	m	2.00					1
6	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
7	2014	후타재 파손	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00					2
8	2016	접속부 퇴적		1.50		1.50	m	1.00					2
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	006

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

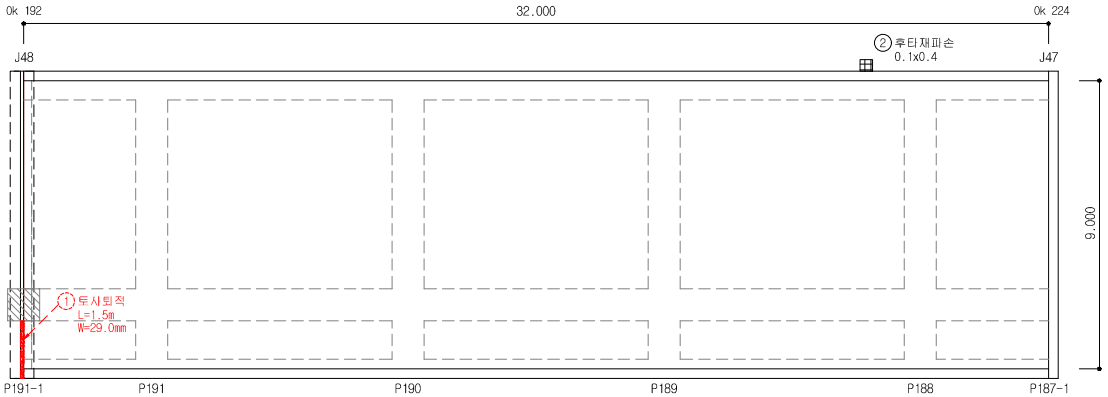


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (mm)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	도사퇴적		1.50		1.50	m	1.00					2
2	2019	후타재파손	0.10	0.40		0.04	㎡	1.00				신규	2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	007

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

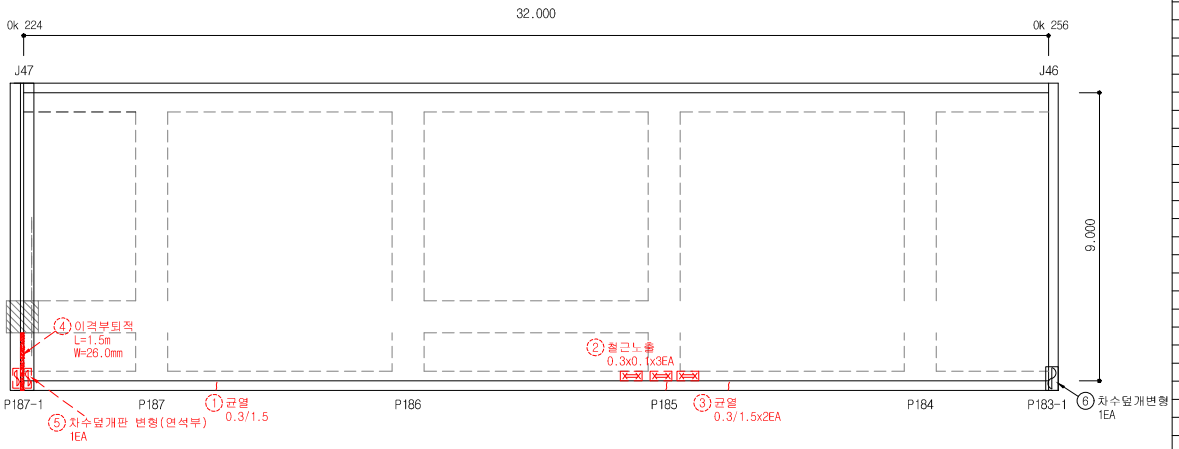


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
2	2016	철근노출	0.30	0.10		0.09	㎡	3.00					1
3	2016	균열	0.30	1.50		3.00	m	2.00					1
4	2016	이격부 퇴적		1.50		1.50	m	1.00					2
5	2016	차수덮개판 변형				1.00	EA	1.00					2
6	2019	차수덮개변형	-	-		1.00	EA	1.00				신규	2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	008

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

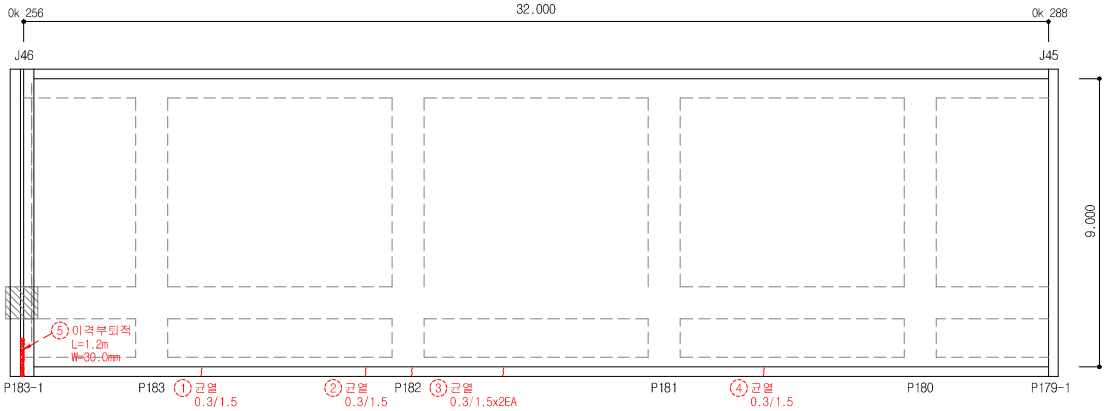


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
2	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
3	2016	균열	0.30	1.50		3.00	m	2.00					1
4	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
5	2016	이격부 퇴적		1.20		1.20	m	1.00					2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	009

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

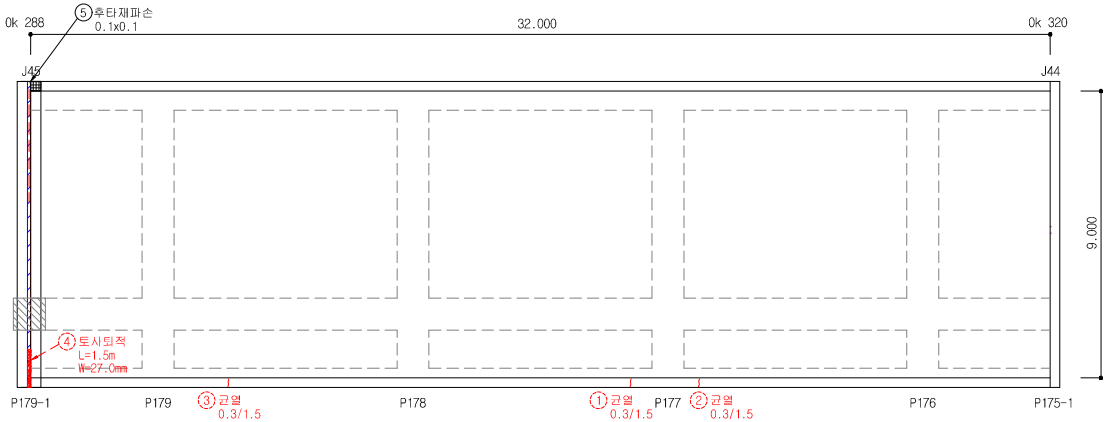


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
2	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
3	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
4	2016	토사퇴적		1.50		1.50	m	1.00					2
5	2019	후타재파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00				신규	2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	010

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

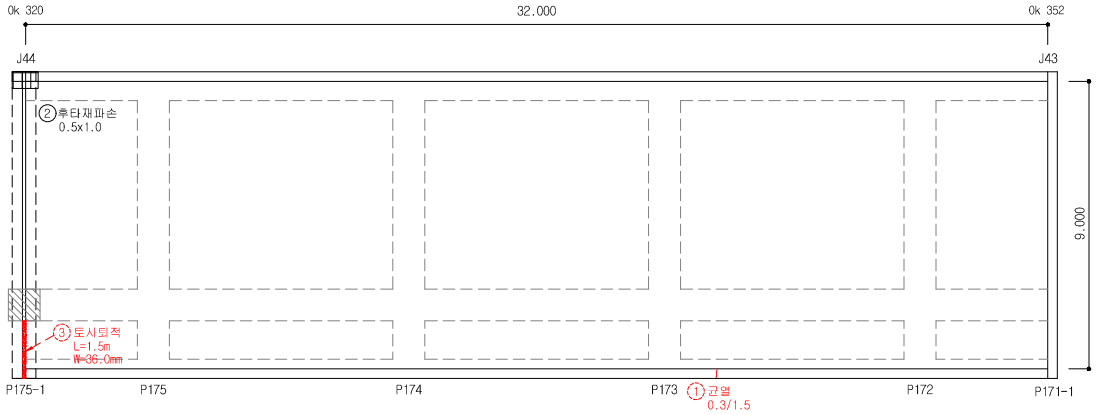


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
2	2019	후타재파손	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00				신규	2
3	2016	토사퇴적		1.50		1.50	m	1.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	011

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

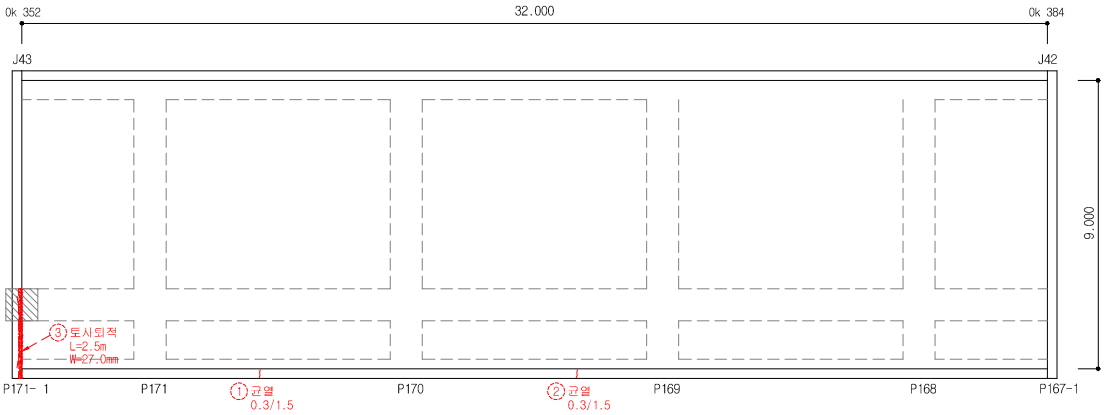


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
2	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
3	2016	도사퇴적		2.50		2.50	m	1.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	012

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

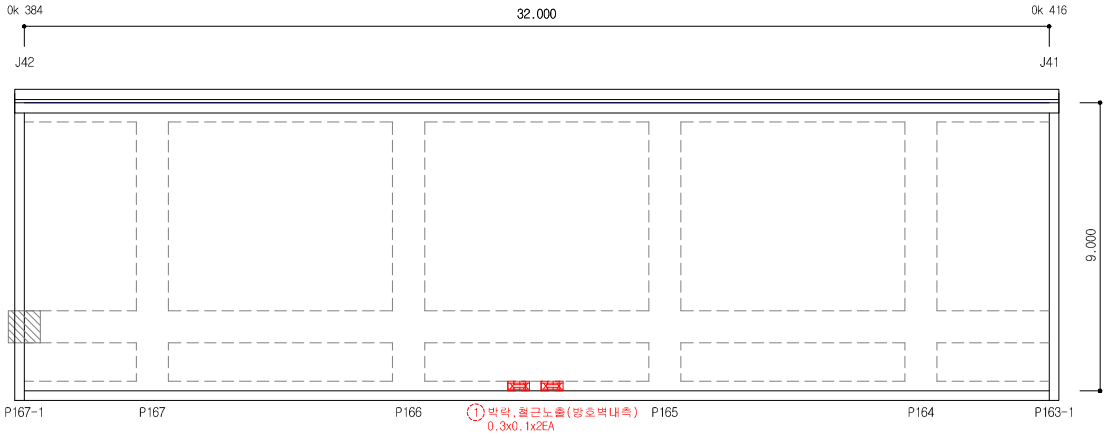


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (mm)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	박락, 철근노출	0.30	0.10		0.06	㎡	2.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기을
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승훈
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	013

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

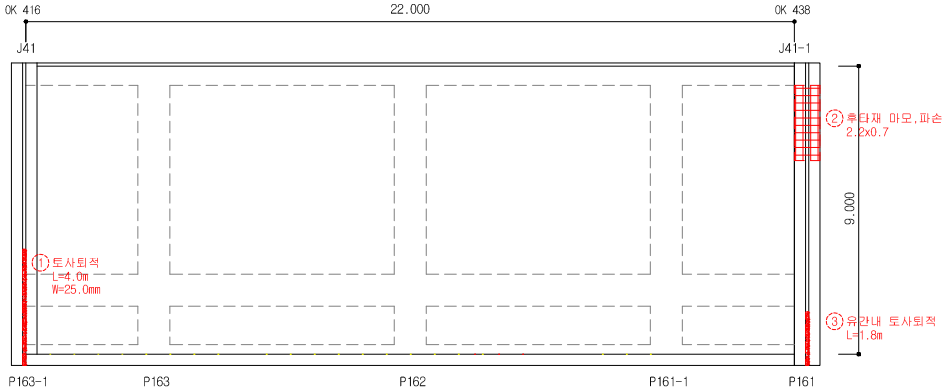


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	토사퇴적		4.00		4.00	m	1.00					2
2	2016	후타재 마모, 파손	2.20	0.70		1.54	㎡	1.00					2
3	2016	유간내 토사퇴적		1.80		1.80	m	1.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



범례						
	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	014

용 역 명 : 도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

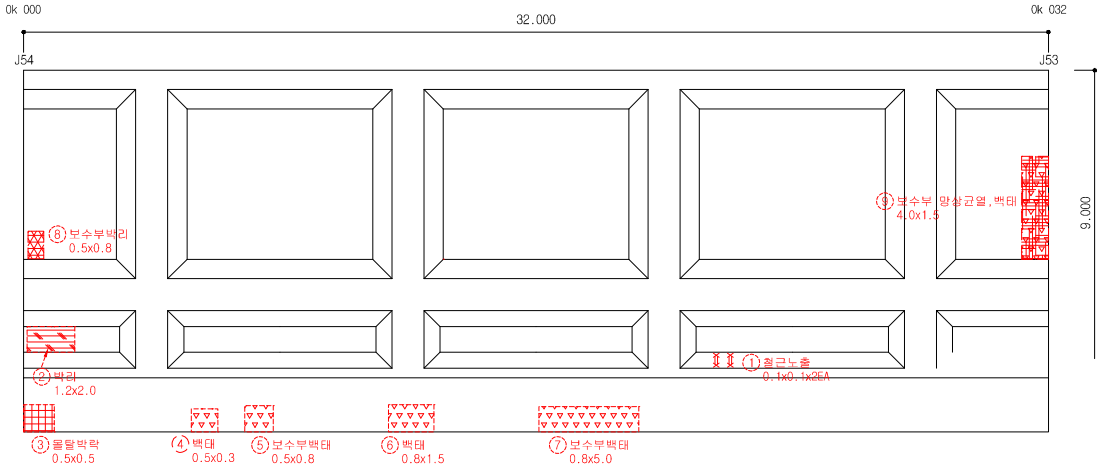


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	철근노출				0.02	㎡	2.00					1
2	2011	박리	1.20	2.00		2.40	㎡	1.00					2
3	2011	몰탈박락	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
4	2014	백태	0.50	0.30		0.15	㎡	1.00					2
5	2011	보수부 백태	0.50	0.80		0.40	㎡	1.00					2
6	2011	백태	0.80	1.50		1.20	㎡	1.00					2
7	2011	보수부 백태	0.80	5.00		4.00	㎡	1.00					2
8	2016	보수부박리	0.50	0.80		0.40	㎡	1.00					2
9	2016	보수부 망상균열, 백태	4.00	1.50		6.00	㎡	1.00					2
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	015

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

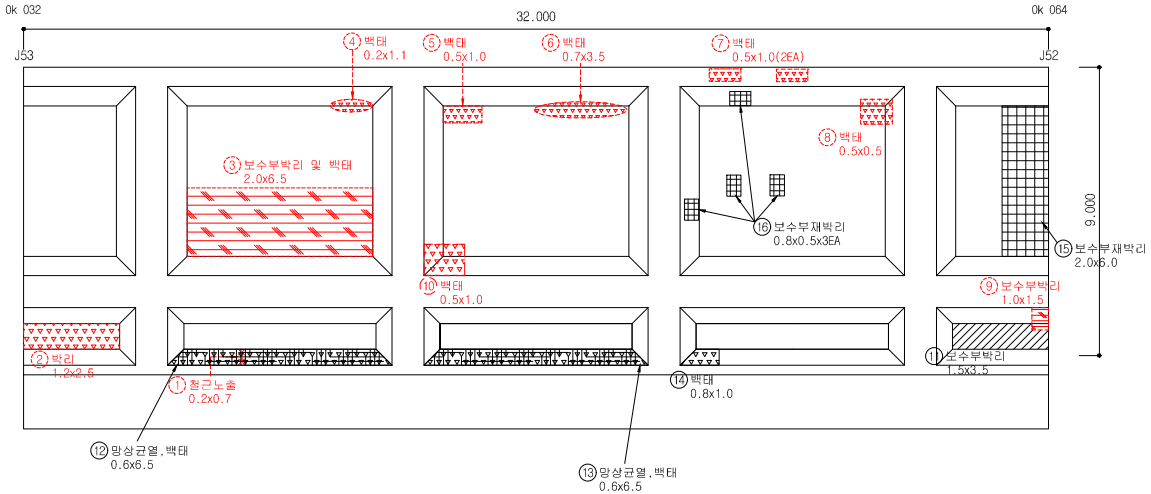


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	철근노출	0.20	0.70		0.14	㎡	1.00					1
2	2011	박리	1.20	2.50		3.00	㎡	1.00					2
3	2011	보수부 박리 및 백태	2.00	6.50		13.00	㎡	1.00					2
4	2011	백태	0.20	1.10		0.22	㎡	1.00					2
5	2011	백태	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					2
6	2011	백태	0.70	3.50		2.45	㎡	1.00					2
7	2013	백태	0.50	1.00		1.00	㎡	2.00					2
8	2011	백태	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
9	2011	보수부 박리	1.00	1.50		1.50	㎡	1.00					2
10	2018	백태	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					2
11	2019	보수부 박리	1.50	3.50		5.25	㎡	1.00				신규	2
12	2019	망상균열,백태	0.60	6.50		3.90	㎡	1.00				신규	2
13	2019	망상균열,백태	0.60	6.50		3.90	㎡	1.00				신규	2
14	2019	백태	0.80	1.00		0.80	㎡	1.00				신규	2
15	2019	보수부재박리	2.00	6.00		12.00	㎡	1.00				신규	2
16	2019	보수부재박리	0.80	0.50		1.60	㎡	4.00				신규	2
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	016

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

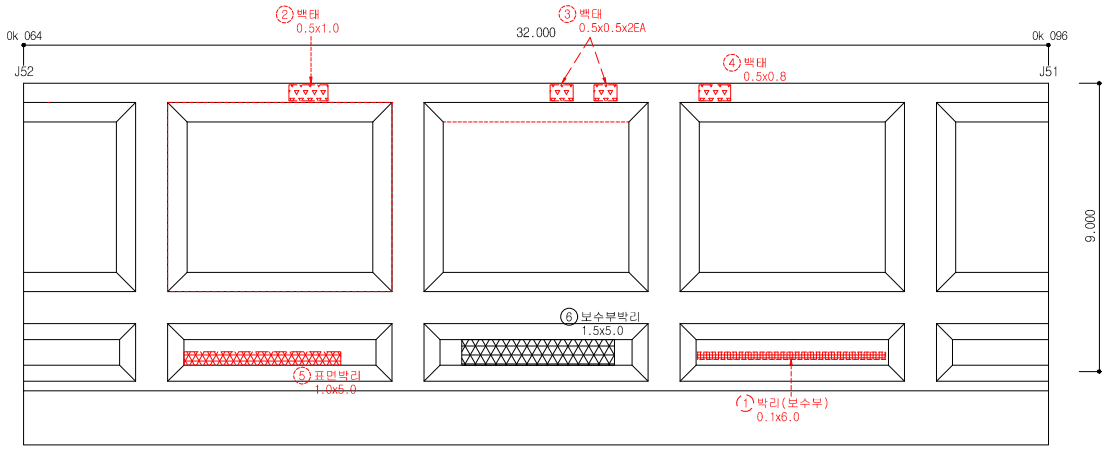


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	박리	0.10	6.00		0.60	㎡	1.00					2
2	2016	백태	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					2
3	2016	백태	0.50	0.50		0.50	㎡	2.00					2
4	2016	백태	0.50	0.80		0.40	㎡	1.00					2
5	2016	표면박리	1.00	5.00		5.00	㎡	1.00					2
6	2019	보수부박리	1.50	5.00		7.50	㎡	1.00				신규	2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	017

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

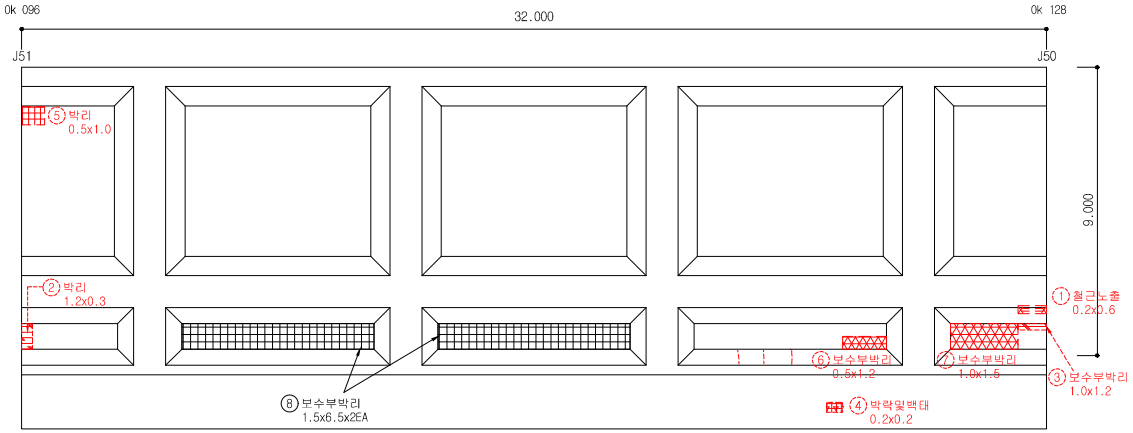


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	철근노출	0.20	0.60		0.12	㎡	1.00					1
2	2011	박리	1.20	0.30		0.36	㎡	1.00					2
3	2011	보수부 박리	1.00	1.20		1.20	㎡	1.00					2
4	2011	박락및백태	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					2
5	2016	박리	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					2
6	2016	보수부박리	0.50	1.20		0.60	㎡	1.00					2
7	2016	보수부박리	1.00	1.50		1.50	㎡	1.00					2
8	2019	보수부박리	1.50	6.50		19.50	㎡	2.00				신규	2
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	018

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

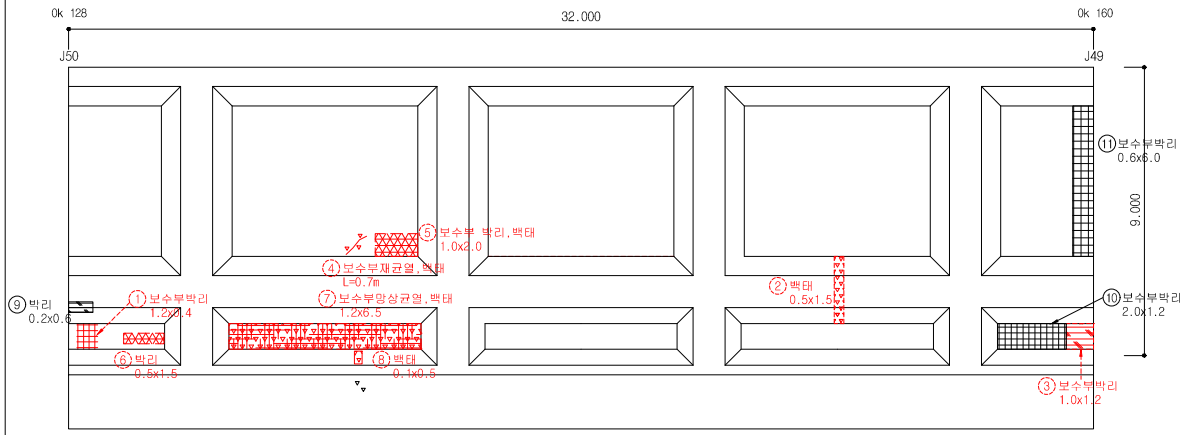


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭(㎜)	길이(m)	깊이(㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	보수부 박리	1.20	0.40		0.48	㎡	1.00					2
2	2011	백태	0.50	1.50		0.75	㎡	1.00					2
3	2011	보수부 박리	1.00	1.20		1.20	㎡	1.00					2
4	2016	보수부 재균열, 백태		0.70		0.70	m	1.00					2
5	2016	보수부 박리, 백태	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					2
6	2016	박리	0.50	1.50		0.75	㎡	1.00					2
7	2016	보수부 망상균열, 백태	1.20	6.50		7.80	㎡	1.00					2
8	2016	백태	0.10	0.50		0.05	㎡	1.00					2
9	2019	박리	0.20	0.60		0.12	㎡	1.00				신규	2
10	2019	보수부박리	2.00	1.20		2.40	㎡	1.00				신규	2
11	2019	보수부박리	0.60	6.00		3.60	㎡	1.00				신규	2
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	019

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

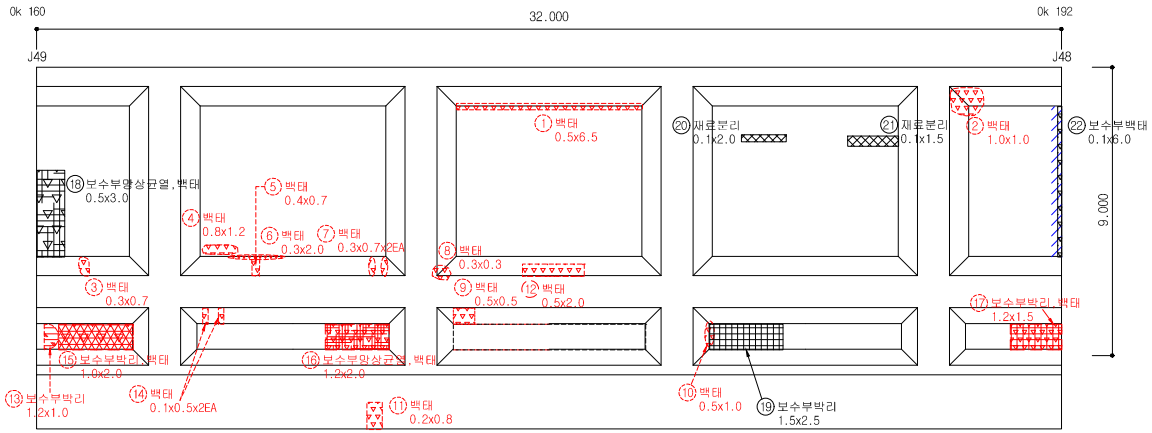


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.50	6.50		0.75	㎡	1.00					2
2	2011	백태	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00					2
3	2011	백태	0.30	0.70		0.21	㎡	1.00					2
4	2011	백태	0.80	1.20		0.96	㎡	1.00					2
5	2011	백태	0.40	0.70		0.28	㎡	1.00					2
6	2011	백태	0.30	2.00		0.60	㎡	1.00					2
7	2011	백태	0.30	0.70		0.42	㎡	2.00					2
8	2011	백태	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					2
9	2011	백태	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
10	2011	백태	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					2
11	2016	백태	0.20	0.80		0.16	㎡	1.00					2
12	2014	백태	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
13	2011	보수부 박리	1.20	1.00		1.20	㎡	1.00					2
14	2011	백태	0.10	0.50		0.10	㎡	2.00					2
15	2016	보수부박리, 백태	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					2
16	2016	보수부 망상균열, 백태	1.20	2.00		2.40	㎡	1.00					2
17	2016	보수부박리, 백태	1.20	1.50		1.80	㎡	1.00					2
18	2019	보수부 망상균열, 백태	0.50	3.00		1.50	㎡	1.00				신규	2
19	2019	보수부박리	1.50	2.50		3.75	㎡	1.00				신규	2
20	2019	재료분리	0.10	2.00		0.20	㎡	1.00				신규	2
21	2019	재료분리	0.10	1.50		0.15	㎡	1.00				신규	2
22	2019	보수부백태	0.10	6.00		0.60	㎡	1.00				신규	2
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	020

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

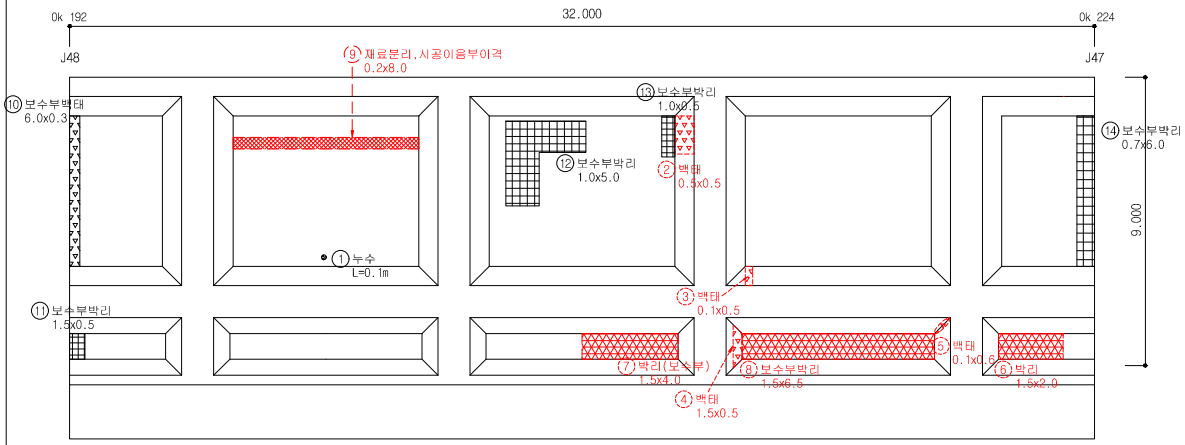


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	누수		0.10		0.10	m	1.00				신규	1
2	2011	백태	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
3	2011	백태	0.10	0.50		0.05	㎡	1.00					2
4	2011	백태	1.50	0.50		0.75	㎡	1.00					2
5	2011	백태	0.10	0.60		0.06	㎡	1.00					2
6	2011	박리	1.50	2.00		3.00	㎡	1.00					2
7	2016	박리(보수부)	1.50	4.00		6.00	㎡	1.00					2
8	2016	보수부박리	1.50	6.50		9.75	㎡	1.00					2
9	2018	재료분리,시공이음부이격	0.20	8.00		1.60	㎡	1.00					2
10	2019	보수부백태	6.00	0.30		1.80	㎡	1.00				신규	2
11	2019	보수부박리	1.50	0.50		0.75	㎡	1.00				신규	2
12	2019	보수부박리	1.00	5.00		5.00	㎡	1.00				신규	2
13	2019	보수부박리	1.00	0.50		0.50	㎡	1.00				신규	2
14	2019	보수부박리	0.70	6.00		4.20	㎡	1.00				신규	2
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	021

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

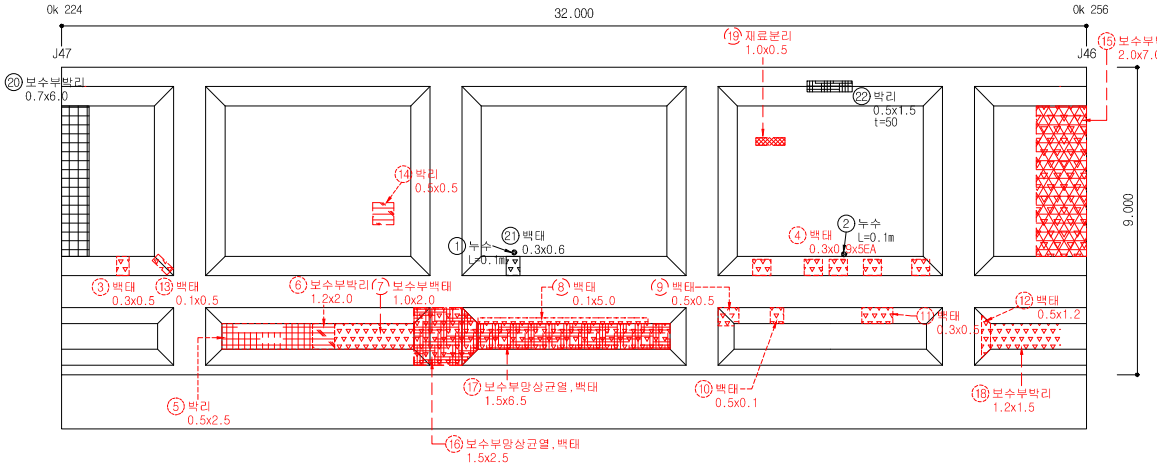


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	누수		0.10		0.10	m	1.00				신규	1
2	2019	누수		0.10		0.10	m	1.00				신규	1
3	2011	백태	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					2
4	2011	백태	0.30	0.90		1.35	㎡	5.00					2
5	2011	박리	0.50	2.50		1.25	㎡	1.00					2
6	2011	보수부 박리	1.20	2.00		2.40	㎡	1.00					2
7	2014	보수부 백태	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					2
8	2014	백태	0.10	5.00		0.50	㎡	1.00					2
9	2014	백태	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
10	2011	백태	0.50	0.10		0.05	㎡	1.00					2
11	2011	백태	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					2
12	2011	백태	0.50	1.20		0.60	㎡	1.00					2
13	2016	백태	0.10	0.50		0.05	㎡	1.00					2
14	2016	박리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
15	2016	보수부 박리, 백태	2.00	7.00		14.00	㎡	1.00					2
16	2016	보수부 망상균열, 백태	1.50	2.50		3.75	㎡	1.00					2
17	2016	보수부 망상균열, 백태	1.50	6.50		9.75	㎡	1.00					2
18	2016	보수부 박리	1.20	1.50		1.80	㎡	1.00					2
19	2018	재료분리	1.00	0.50		0.50	㎡	1.00					2
20	2019	보수부박리	0.70	6.00		4.20	㎡	1.00				신규	2
21	2019	백태	0.30	0.60		0.18	㎡	1.00				신규	2
22	2019	박리	0.50	1.50		0.75	㎡	1.00				신규	2
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	022

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

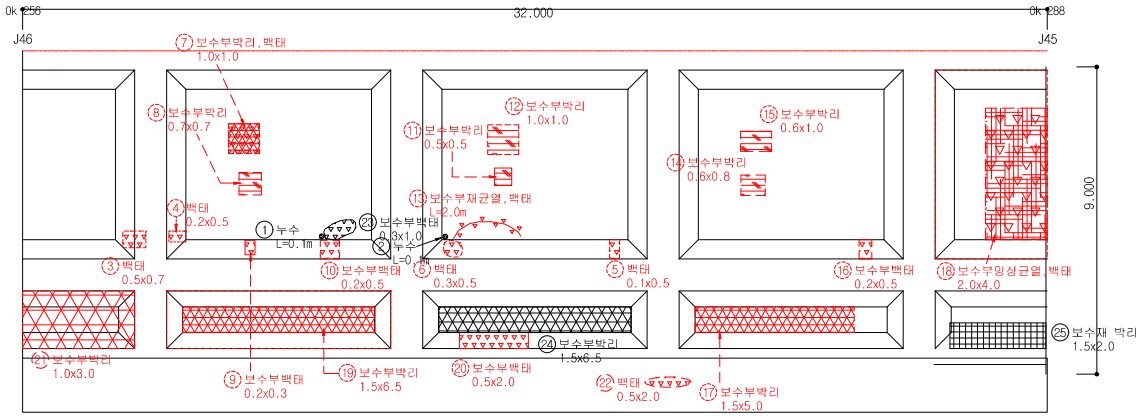


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	누수		0.10		0.10	m	1.00				신규	1
2	2019	누수		0.10		0.10	m	1.00				신규	1
3	2011	백태	0.50	0.70		0.35	㎡	1.00					2
4	2011	백태	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
5	2011	백태	0.10	0.50		0.05	㎡	1.00					2
6	2011	백태	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					2
7	2016	보수부 박리, 백태	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00					2
8	2016	보수부 박리	0.70	0.70		0.49	㎡	1.00					2
9	2016	보수부 백태	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00					2
10	2016	보수부 백태	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
11	2016	보수부 박리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
12	2016	보수부 박리	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00					2
13	2016	보수부 재균열, 백태		2.00		2.00	m	1.00					2
14	2016	보수부 박리	0.60	0.80		0.48	㎡	1.00					2
15	2016	보수부 박리	0.60	1.00		0.60	㎡	1.00					2
16	2016	보수부 백태	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
17	2016	보수부박리	1.50	5.00		7.50	㎡	1.00					2
18	2016	보수부 망상균열, 백태	2.00	4.00		8.00	㎡	1.00					2
19	2016	보수부박리	1.50	6.50		9.75	㎡	1.00					2
20	2016	보수부 백태	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
21	2018	보수부박리	1.00	3.00		3.00	㎡	1.00					2
22	2018	백태	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
23	2019	보수부백태	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00				신규	2
24	2019	보수부박리	1.50	6.50		9.75	㎡	1.00				신규	2
25	2019	보수재 박리	1.50	2.00		3.00	㎡	1.00				신규	2
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	023

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

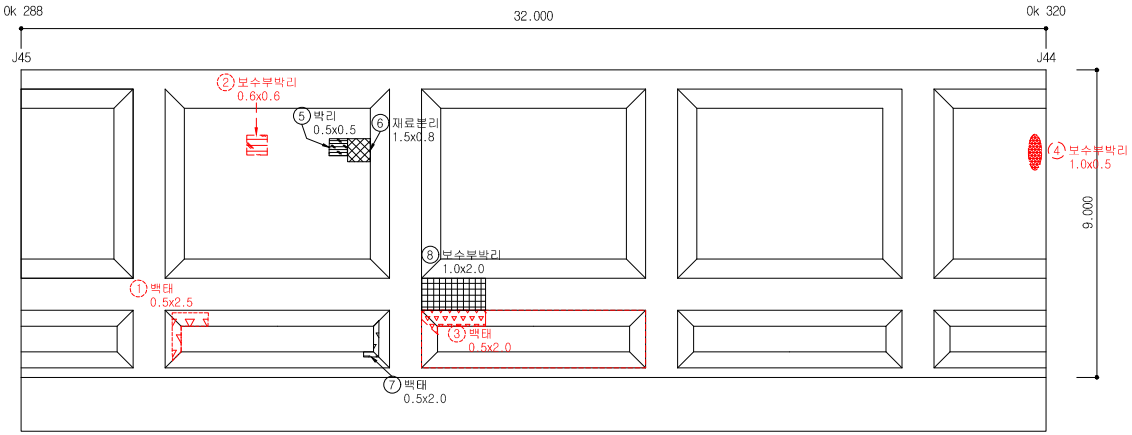

손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (mm)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.50	2.50		1.25	㎡	1.00					2
2	2016	보수부 박리	0.60	0.60		0.36	㎡	1.00					2
3	2016	백태	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
4	2018	보수부박리	1.00	0.50		0.50	㎡	1.00					2
5	2019	박리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00				신규	2
6	2019	재료분리	1.50	0.80		1.20	㎡	1.00				신규	2
7	2019	백태	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00				신규	2
8	2019	보수부박리	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00				신규	2
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범 례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	024

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭(mm)	길이(m)	깊이(mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	누수		0.10		0.10	m	1.00				신규	1
2	2019	철근노출	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00				신규	1
3	2019	누수		0.10		0.10	m	1.00				신규	1
4	2011	백태	0.10	0.50		0.10	㎡	2.00					2
5	2016	박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					2
6	2019	교대박리	0.30	1.50		0.45	㎡	1.00				신규	2
7	2019	백태	1.50	0.70		1.05	㎡	1.00				신규	2
8	2019	재료분리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00				신규	2
9	2019	박리	0.40	0.40		0.16	㎡	1.00				신규	2
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

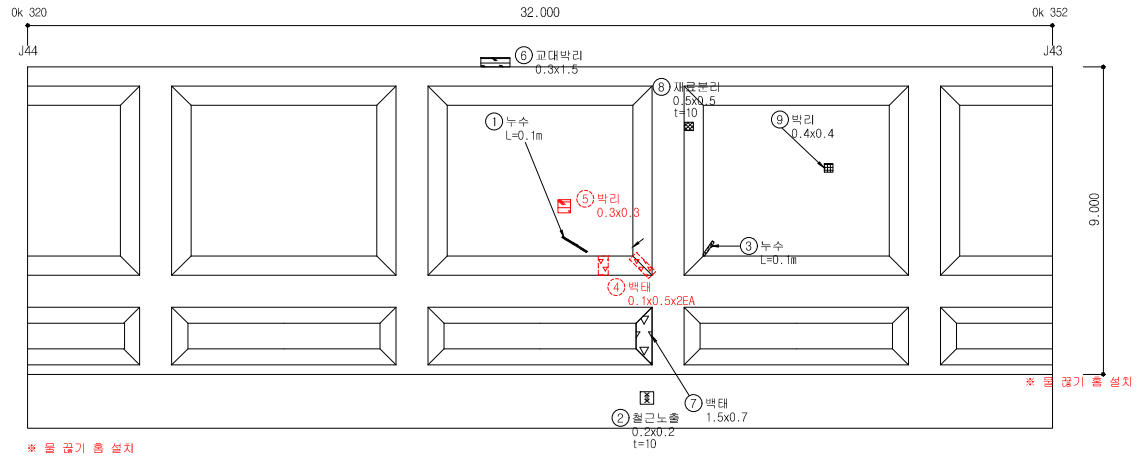


점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	025

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면


손 상 물 량 표

연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	균열	0.30	0.60		0.60	m	1.00					1
2	2019	철근노출	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00				신규	1
3	2014	백태	1.00	9.00		9.00	㎡	1.00					2
4	2011	백태	0.50	1.20		0.60	㎡	1.00					2
5	2014	보수부박리	0.60	9.50		5.70	㎡	1.00					2
6	2016	보수부 박리	0.10	0.50		0.05	㎡	1.00					2
7	2019	파손	0.40	1.00		0.40	㎡	1.00				신규	2
8	2019	파손	0.80	0.40		0.32	㎡	1.00				신규	2
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

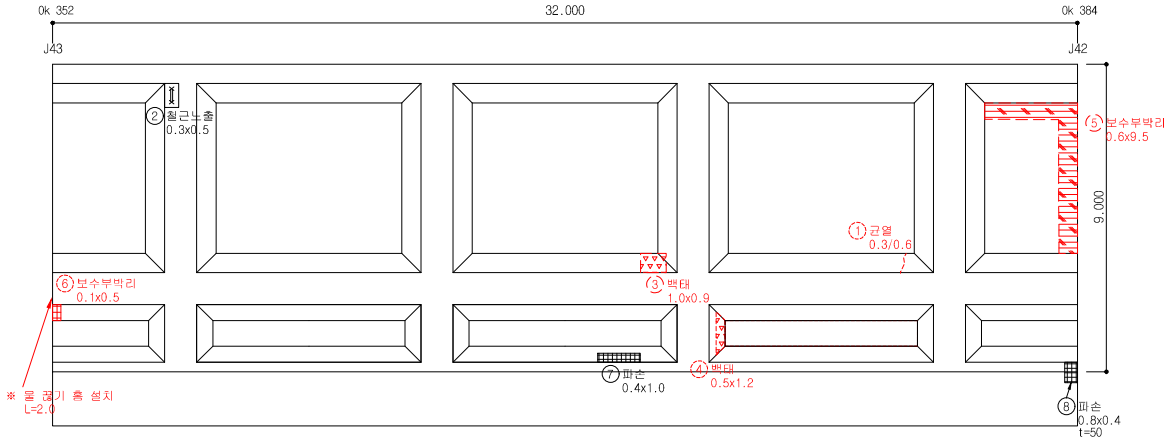


점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	026

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

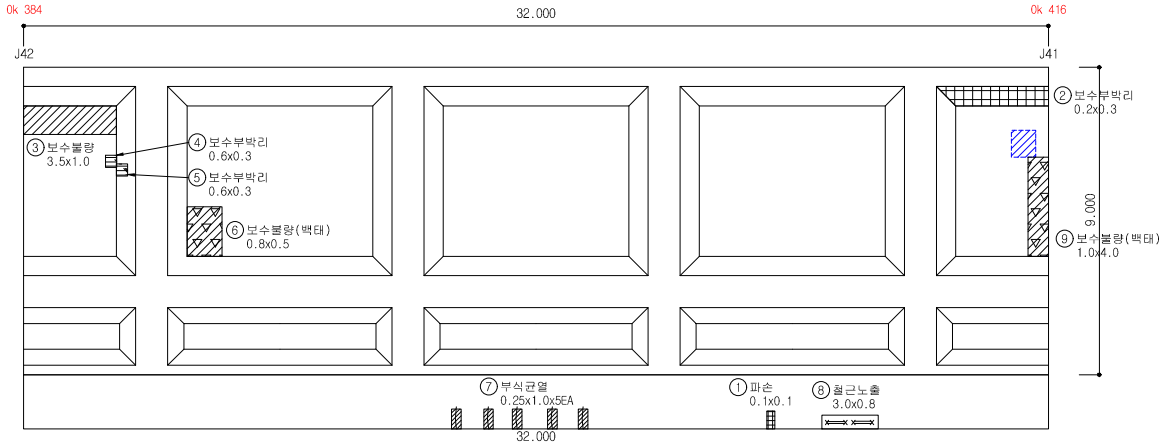


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00				신규	1
2	2019	보수부박리	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00				신규	2
3	2019	보수불량	3.50	1.00		3.50	㎡	1.00				신규	2
4	2019	보수부박리	0.60	0.30		0.18	㎡	1.00				신규	2
5	2019	보수부박리	0.60	0.30		0.18	㎡	1.00				신규	2
6	2019	보수불량	0.80	0.50		0.40	㎡	1.00				신규	2
7	2019	부식균열	0.25	1.00		1.25	㎡	5.00				신규	2
8	2019	철근노출	3.00	0.80		2.40	㎡	1.00				신규	2
9	2019	보수불량	1.00	4.00		4.00	㎡	1.00				신규	2
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	027

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

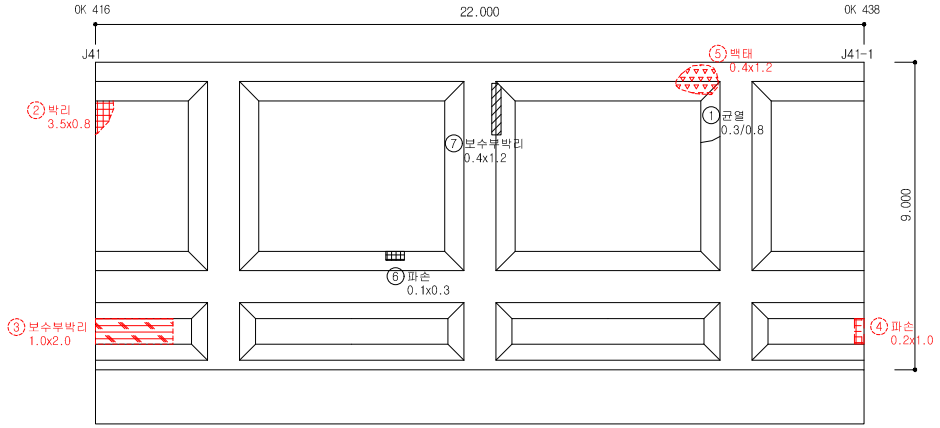


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00				신규	1
2	2011	박리	3.50	0.80		2.80	㎡	1.00					2
3	2011	보수부 박리	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					2
4	2013	파손	0.20	1.00		0.20	㎡	1.00					2
5	2011	백태	0.40	1.20		0.48	㎡	1.00					2
6	2019	파손	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00				신규	2
7	2019	보수부박리	0.40	1.20		0.48	㎡	1.00				신규	2
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	028

ID : 도림천4복개 1련 / 교대


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2	2016	박리	20.00	0.30		6.00	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

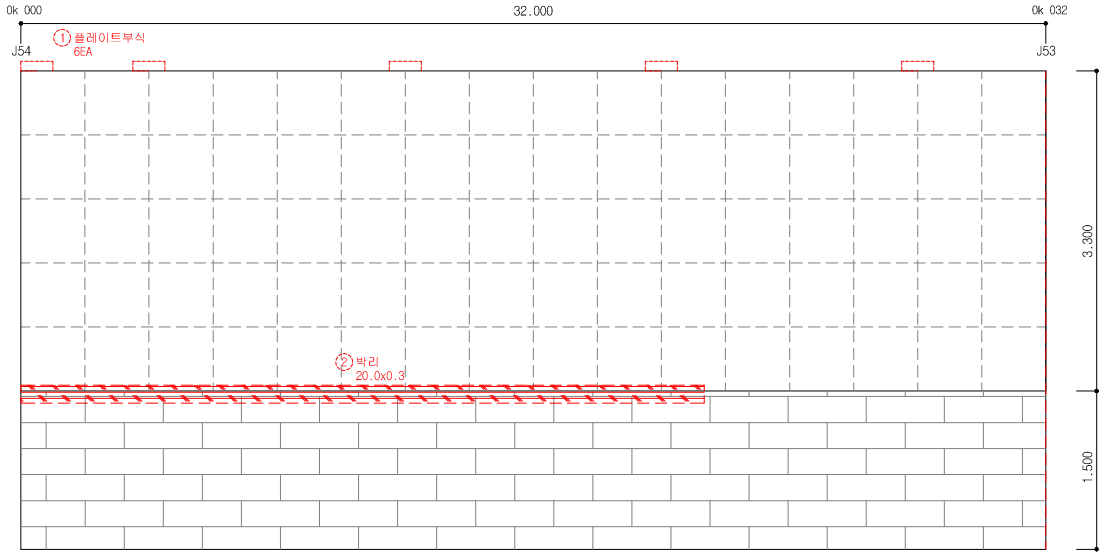


점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	029

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

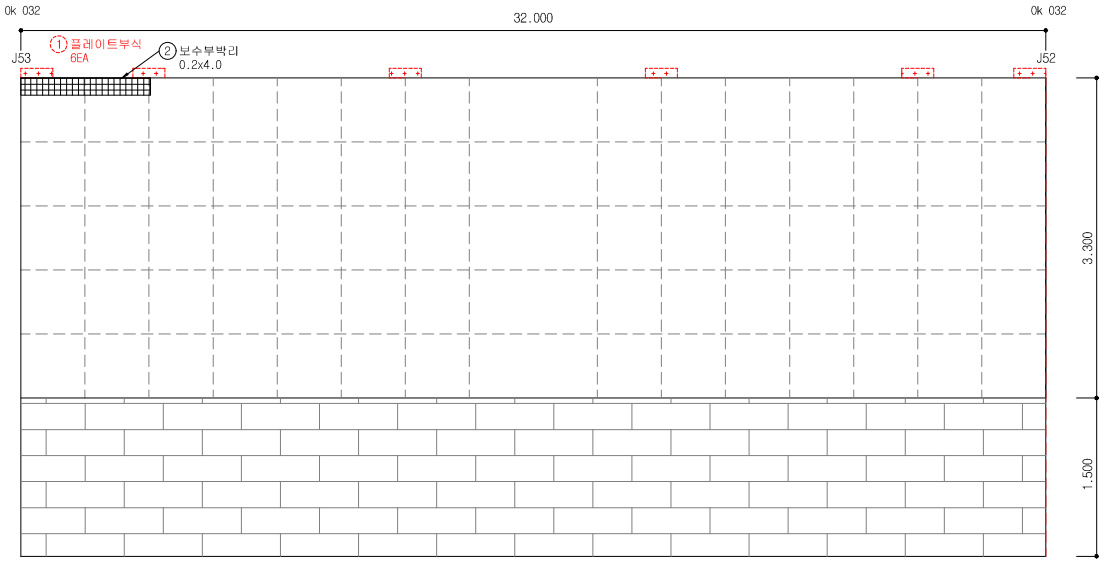


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2	2019	보수부박리	0.20	4.00		0.80	㎡	1.00				신규	2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	030

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

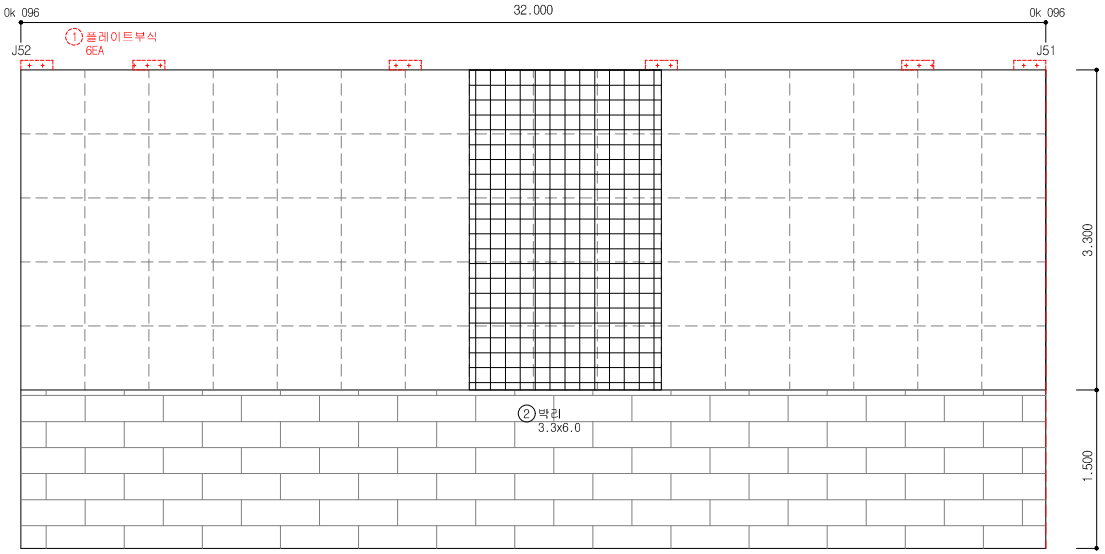


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2	2019	박리	3.30	6.00		19.80	㎡	1.00				신규	2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	031

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

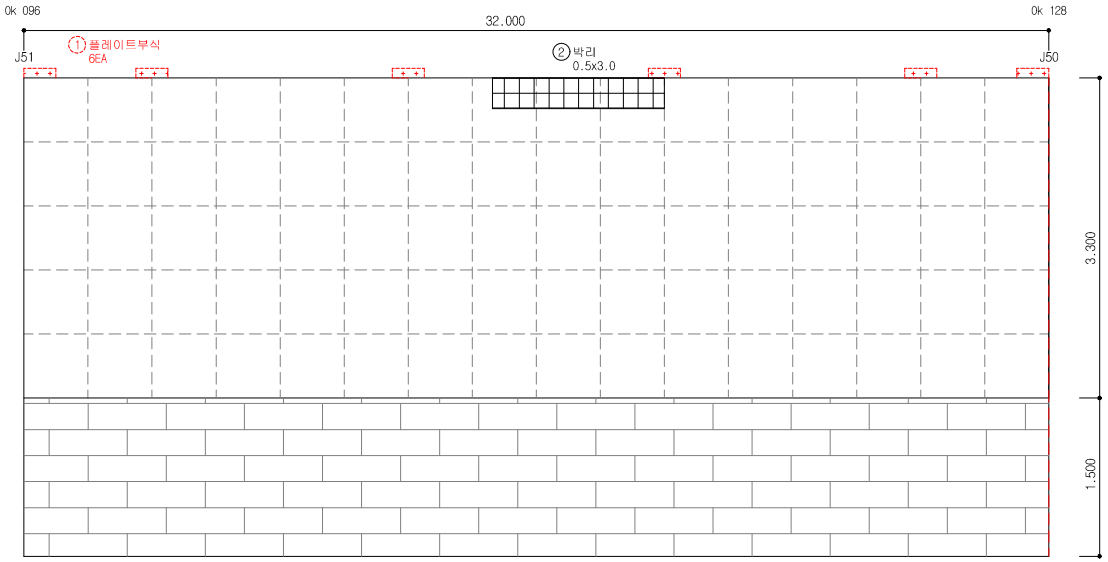


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2	2019	박리	0.50	3.00		1.50	㎡	1.00				신규	2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	032

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

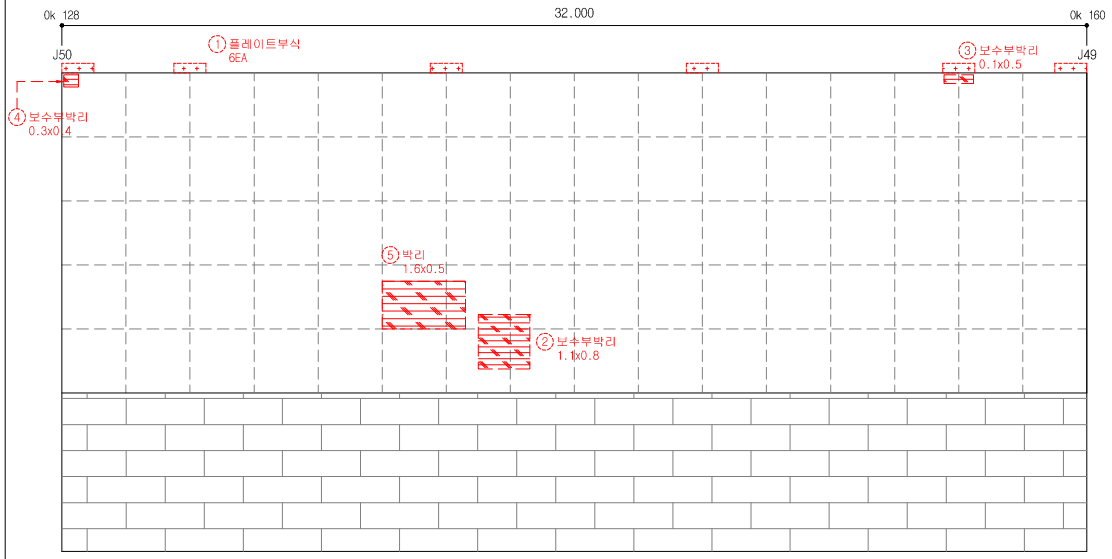


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2	2016	보수부 박리	1.10	0.80		0.88	㎡	1.00					2
3	2016	보수부 박리	0.10	0.50		0.05	㎡	1.00					2
4	2016	보수부 박리	0.30	0.40		0.12	㎡	1.00					2
5	2016	박리	1.60	0.50		0.80	㎡	1.00					2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	033

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

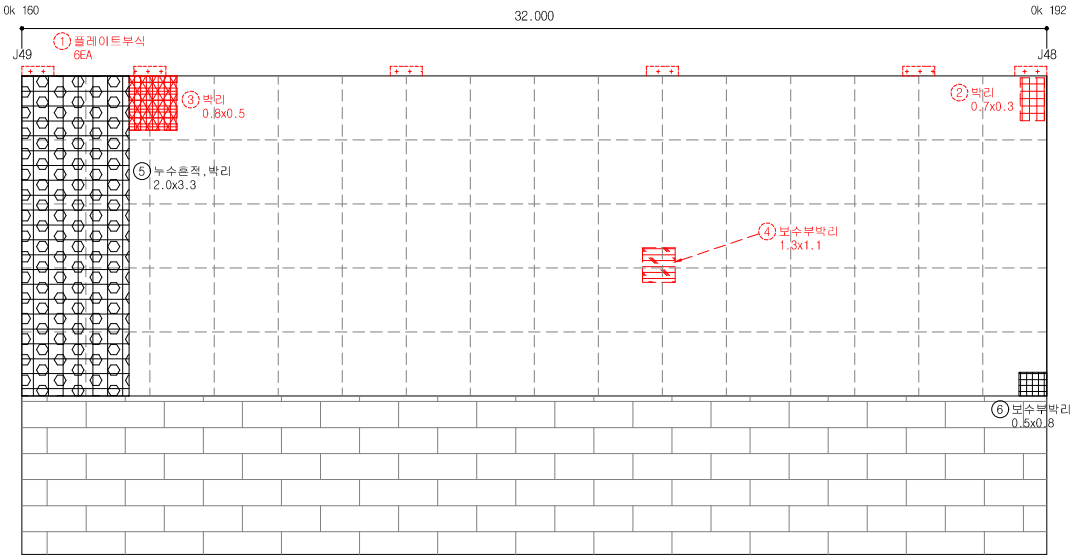


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2	2016	박리	0.70	0.30		0.21	㎡	1.00					2
3	2016	박리	0.80	0.50		0.40	㎡	1.00					2
4	2016	보수부 박리	1.30	1.10		1.43	㎡	1.00					2
5	2019	누수흔적,박리	2.00	3.30		6.60	㎡	1.00				신규	2
6	2019	보수부박리	0.50	0.80		0.40	㎡	1.00				신규	2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	034

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

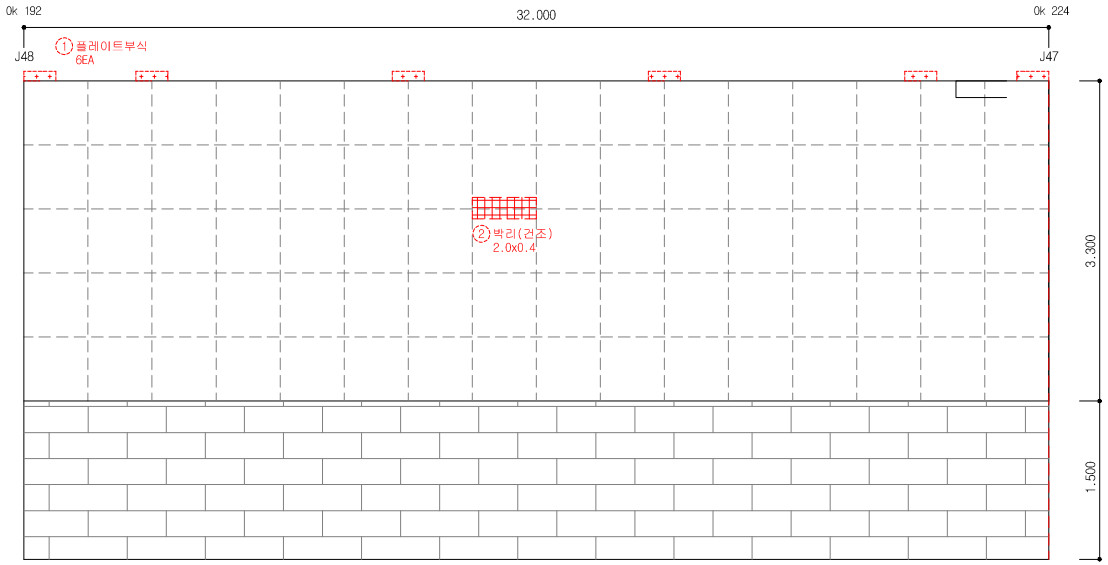


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2	2016	박리	2.00	0.40		0.80	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	035

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

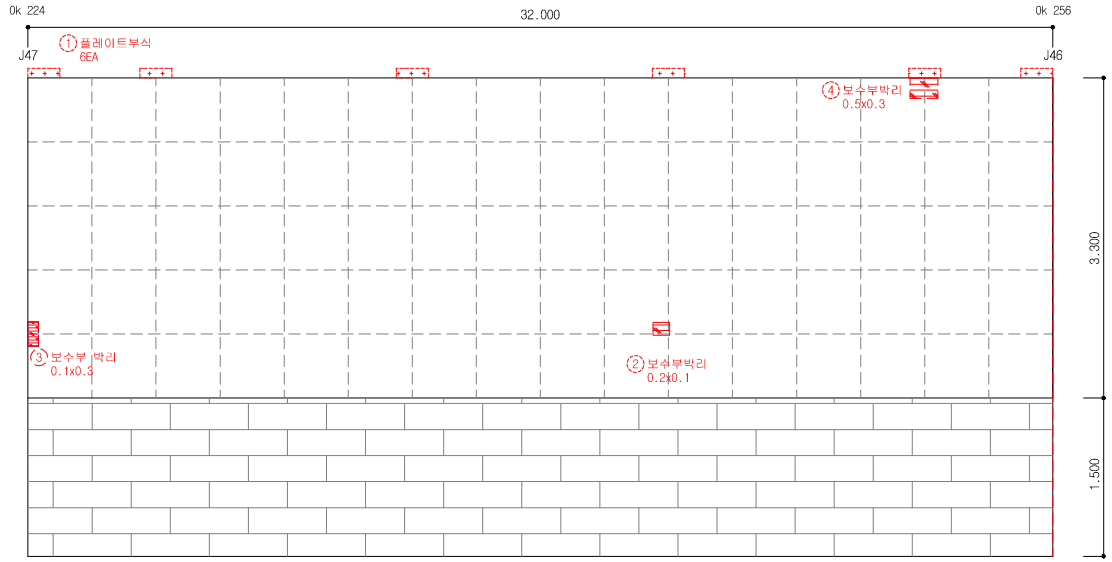


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2	2016	보수부 박리	0.20	0.10		0.02	㎡	1.00					2
3	2018	보수부 박리	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00					2
4	2016	보수부 박리	0.50	0.30		0.15	㎡	1.00					2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	036

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

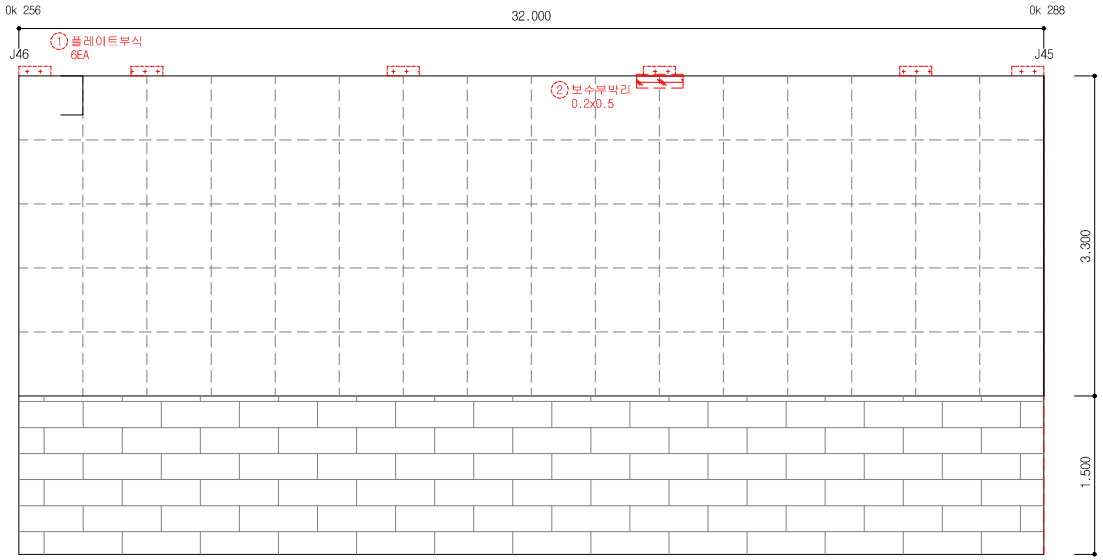


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2	2016	보수부 박리	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	037

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

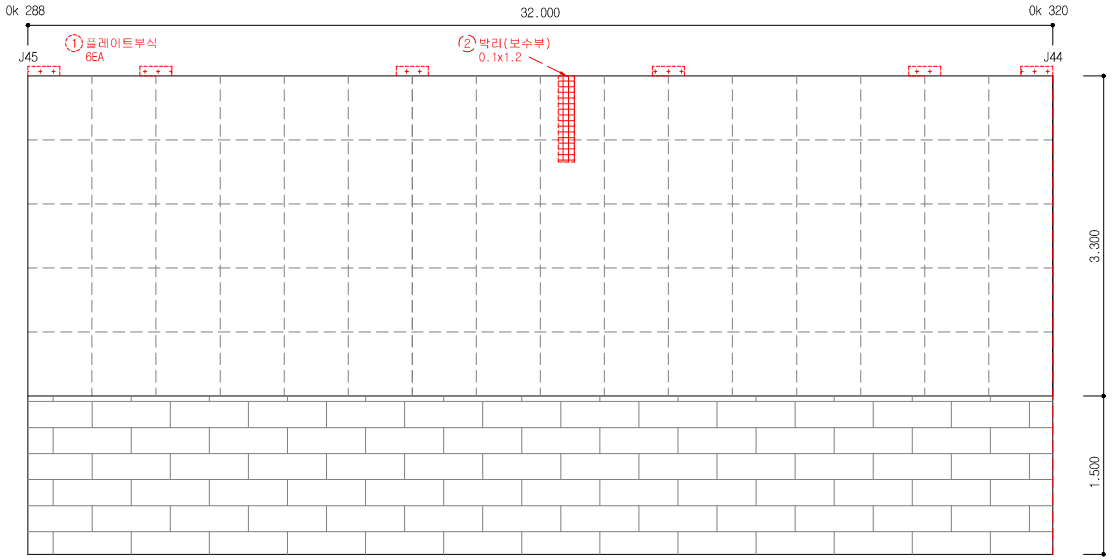


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2	2014	박리	0.10	1.20		1.20	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	038

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

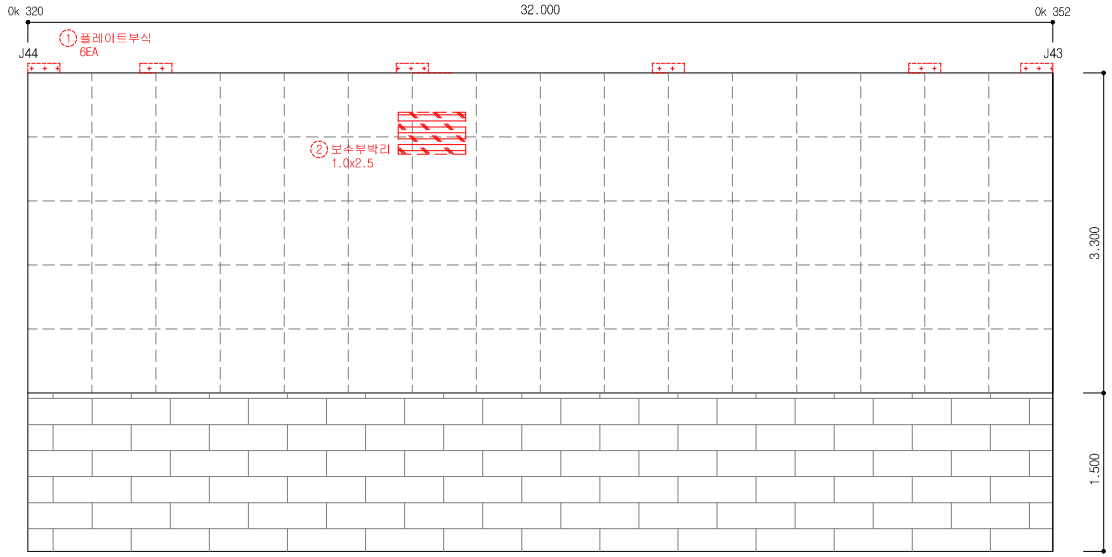


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2	2016	보수부박리	1.00	2.50		2.50	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	039

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

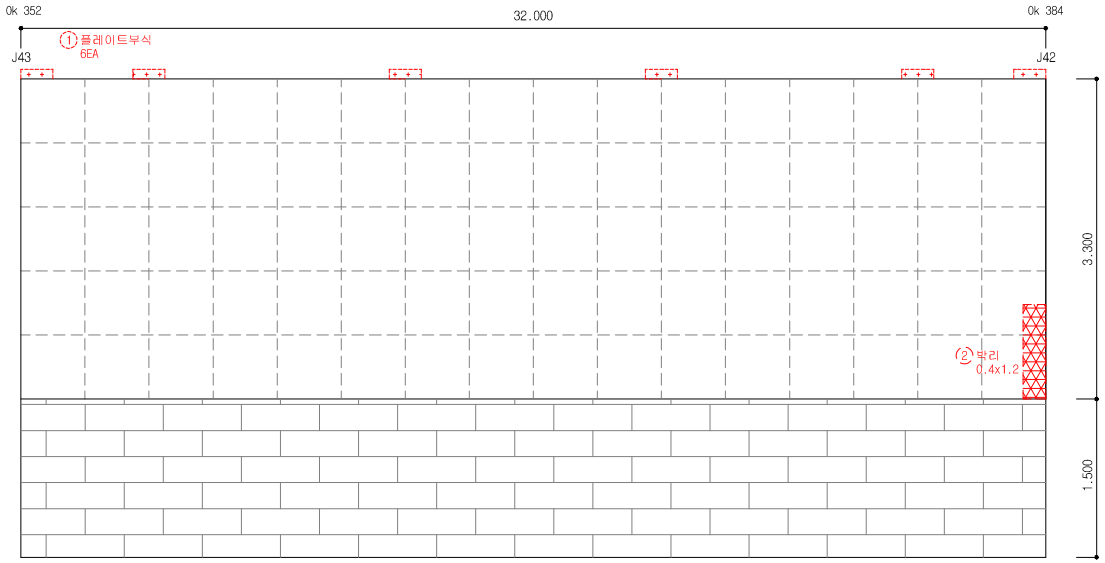


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2	2018	박리	0.40	1.20		0.48	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	040

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

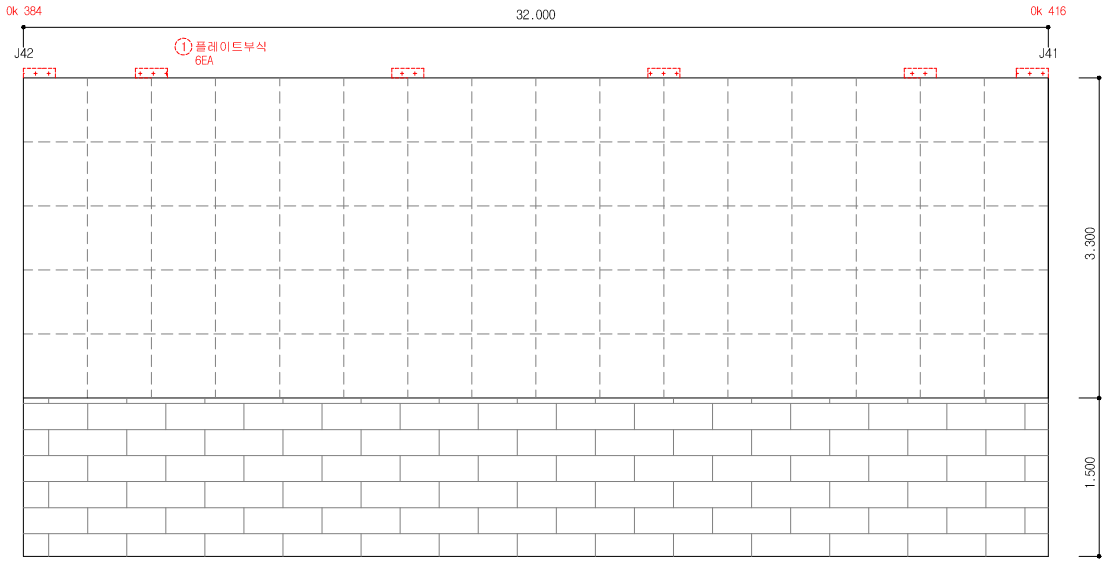


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (mm)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	041

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

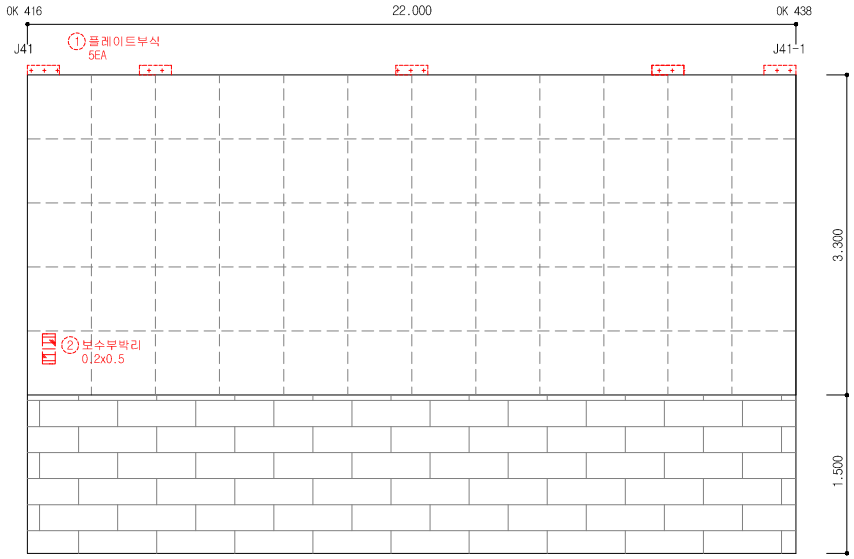


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	5.00					2
2	2016	보수부박리	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	042

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

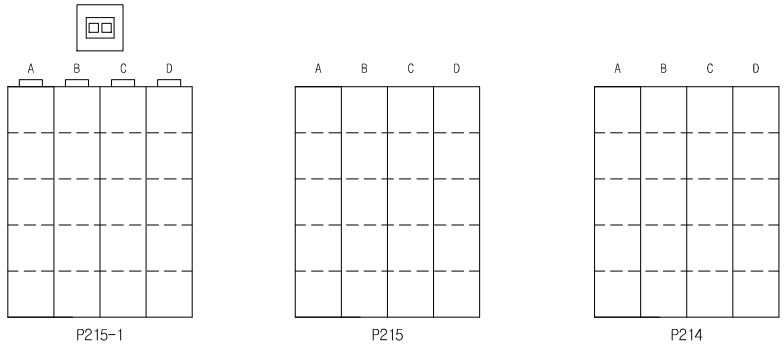


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	043

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

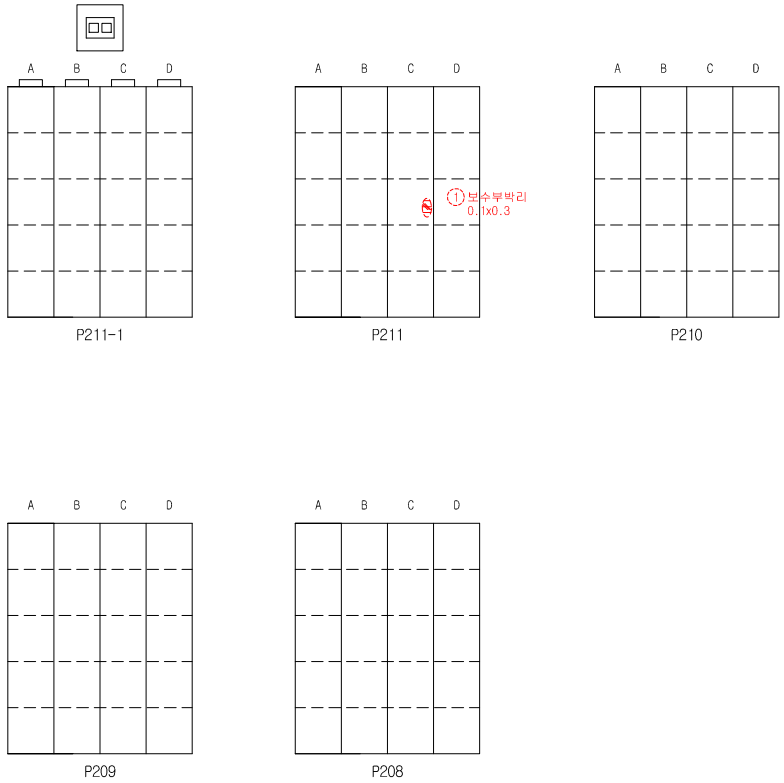


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	보수부 박리	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	044

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

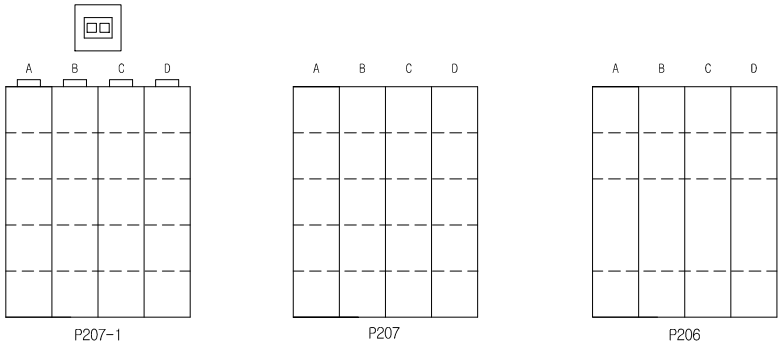


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	045

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

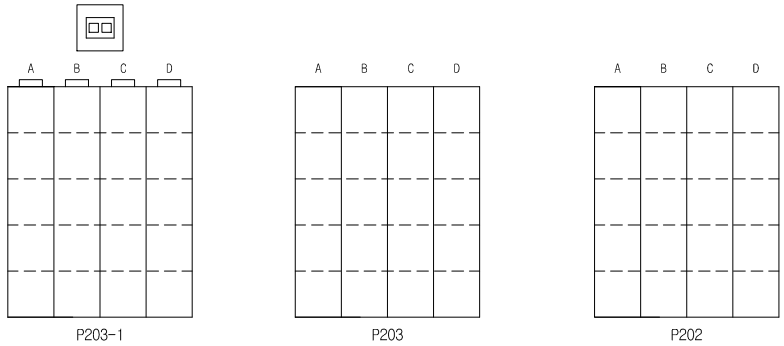


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	046

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

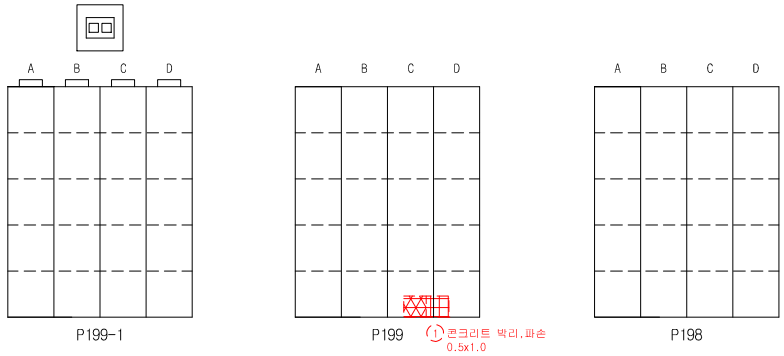


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	콘크리트 박리,파손	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	047

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

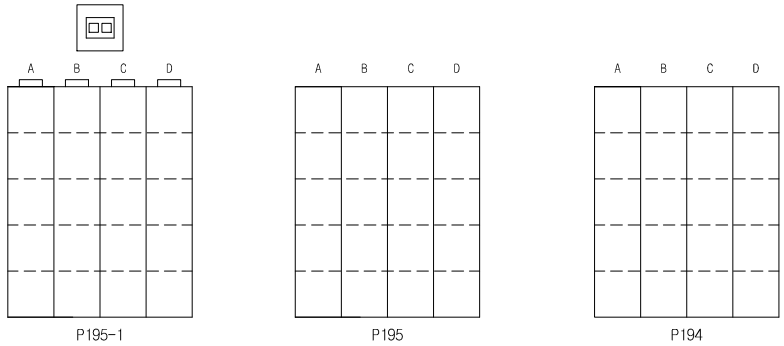


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	048

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

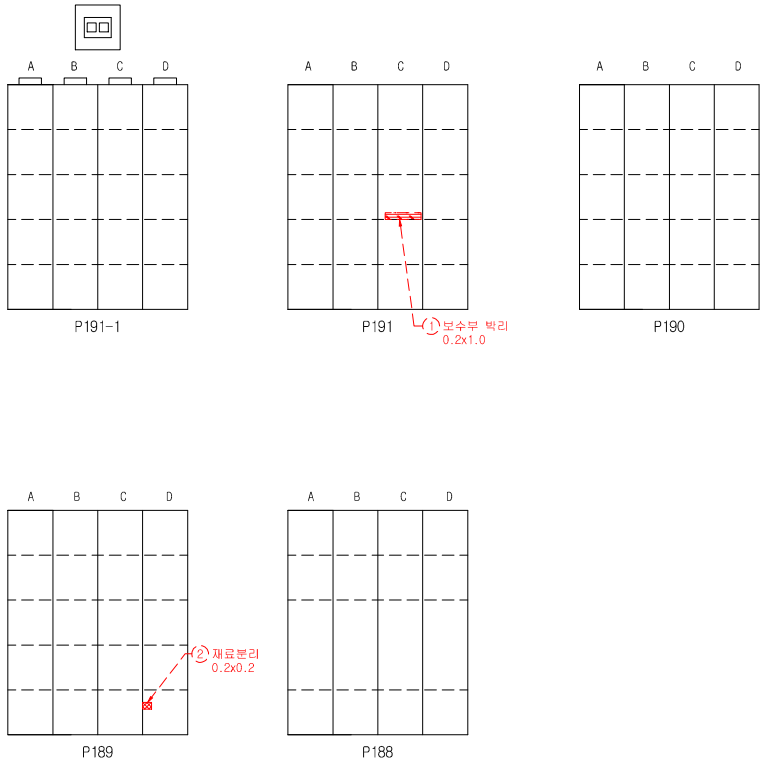


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	보수부 박리	0.20	1.00		0.20	㎡	1.00					2
2	2018	재료분리	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	049

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

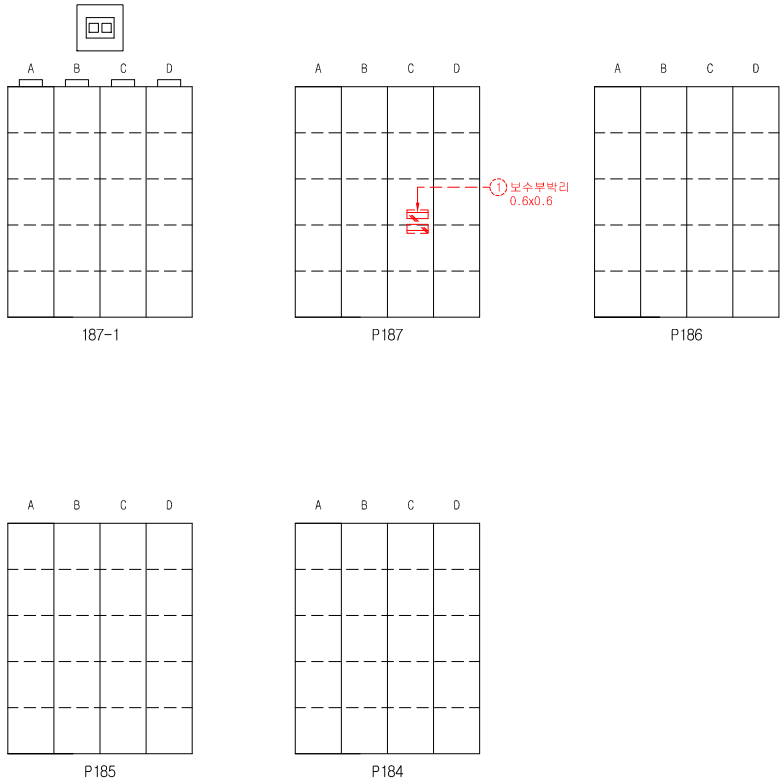


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	보수부 박리	0.60	0.60		0.36	㎡	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	050

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

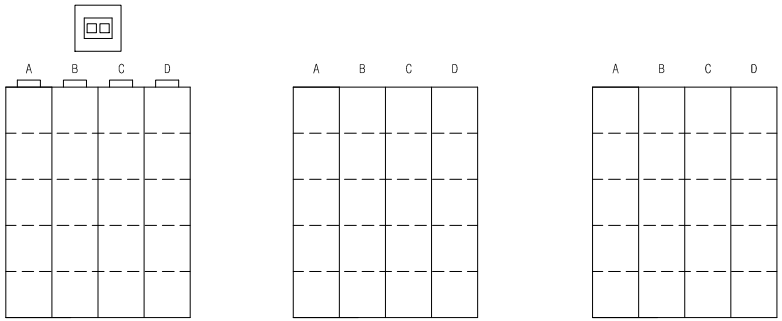


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	051

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

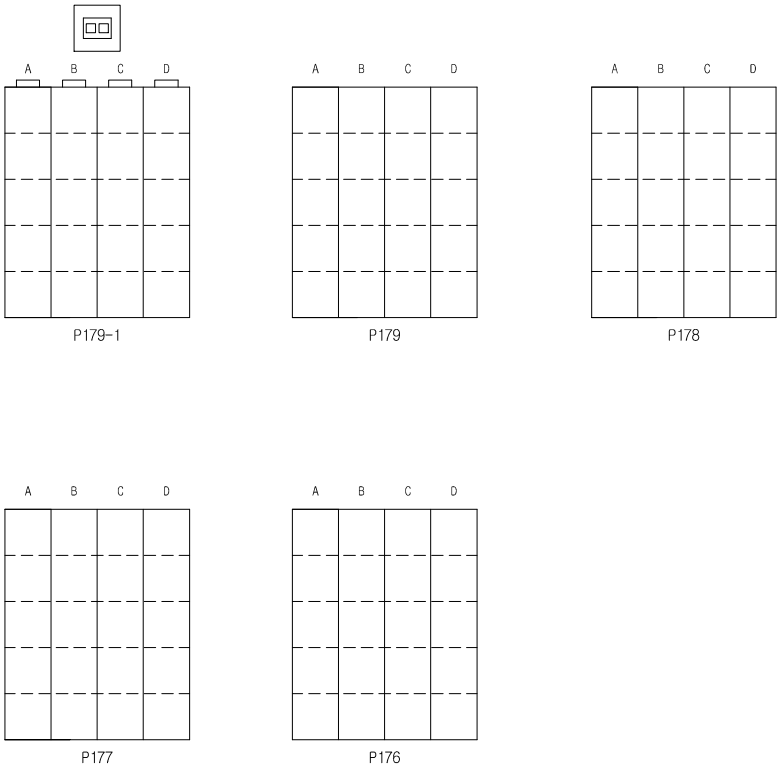


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	052

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

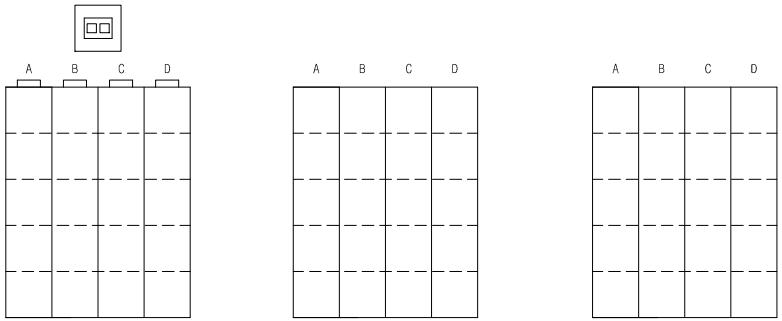


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	053

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

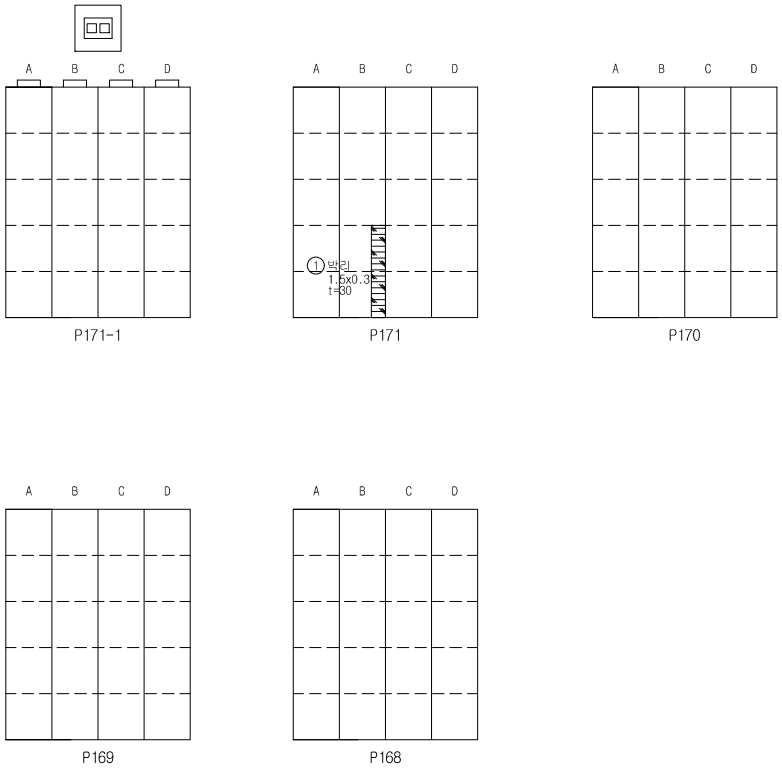


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	박리	1.50	0.30		0.45	㎡	1.00				신규	2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	054

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

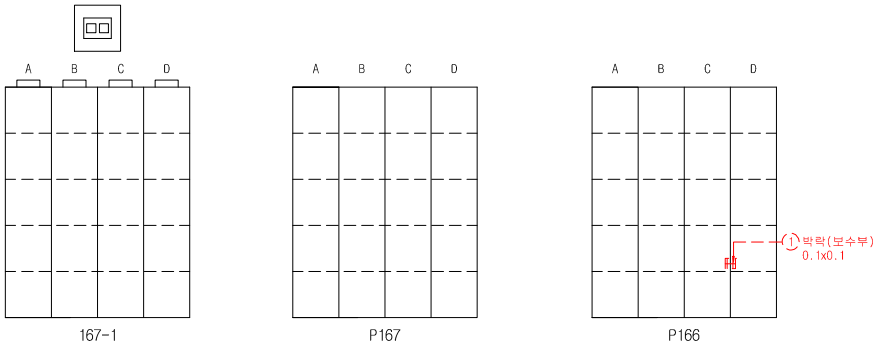


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (mm)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	박락	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기을
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승훈
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	055

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

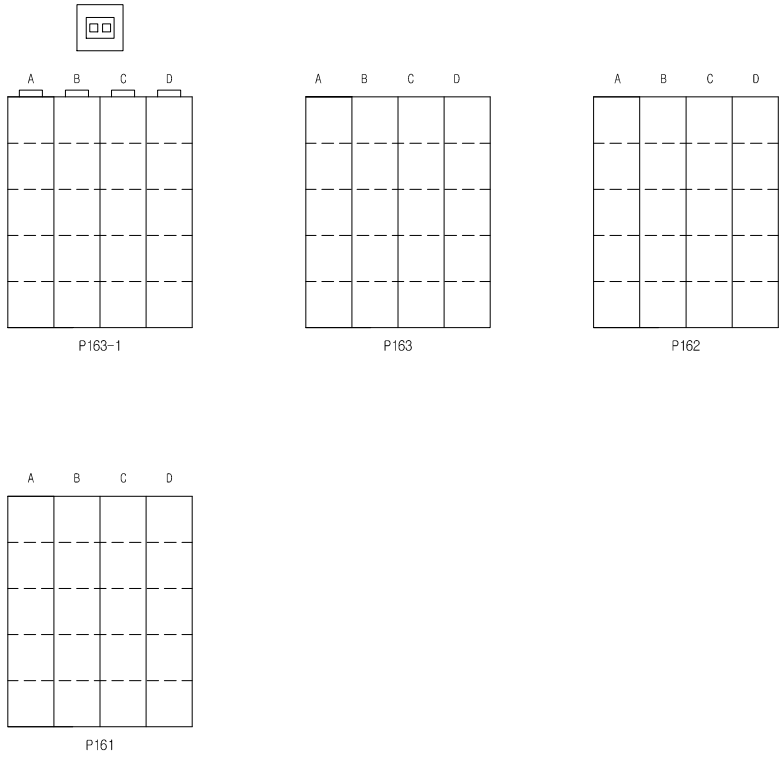


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	056

1.2 1련 [1순위]

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

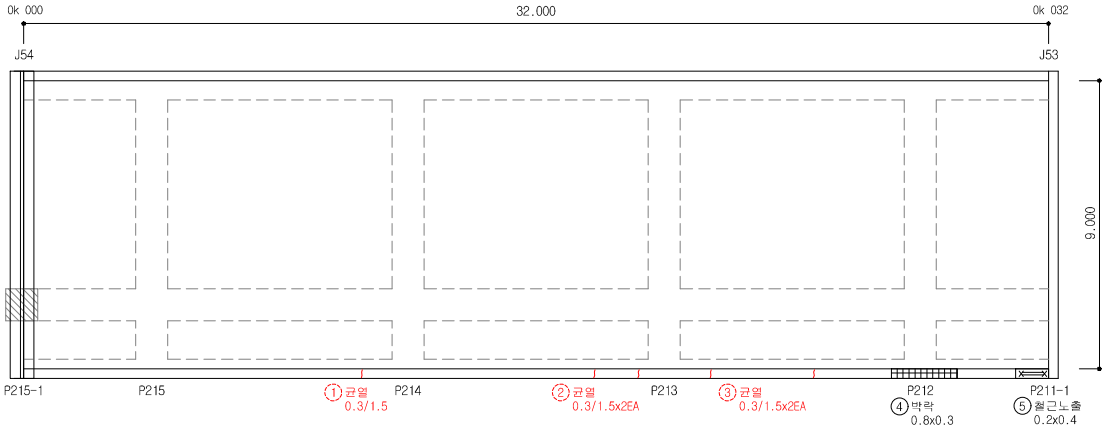


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		3.00	m	2.00					1
2	2016	균열	0.30	1.50		3.00	m	2.00					1
3	2016	균열	0.30	1.50		0.90	㎡	2.00					1
4	2019	박락	0.80	0.30		0.24	㎡	1.00				신규	1
5	2019	철근노출	0.20	0.40		0.08	㎡	1.00				신규	1
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	001

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

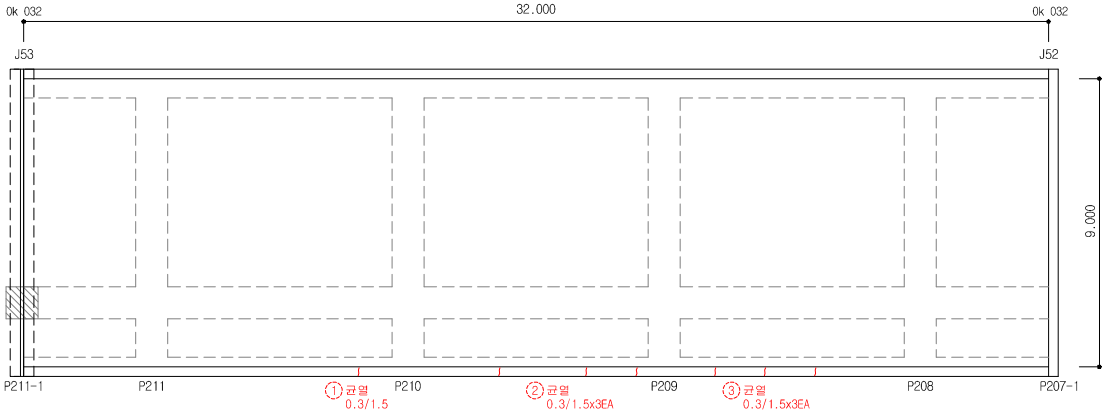


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
2	2016	균열	0.30	1.50		4.50	m	3.00					1
3	2016	균열	0.30	1.50		4.50	m	3.00					1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	002

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

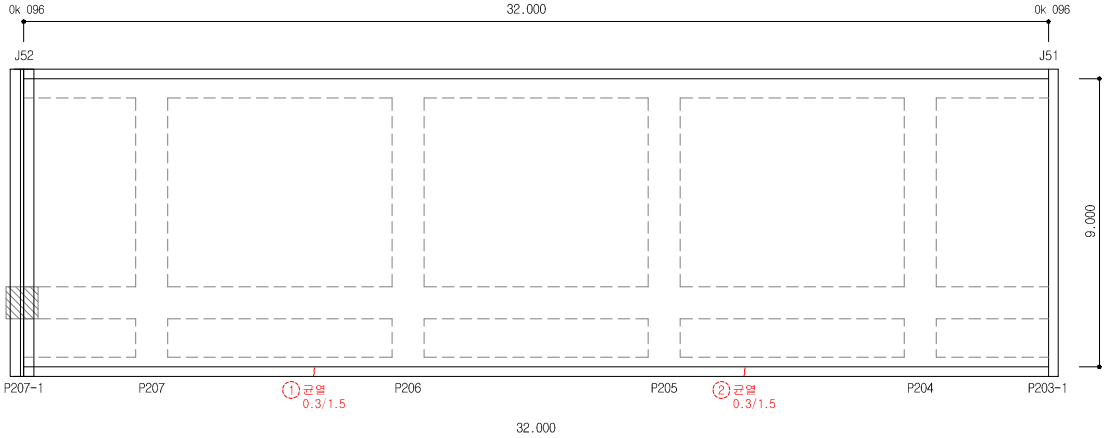


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
2	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	003

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

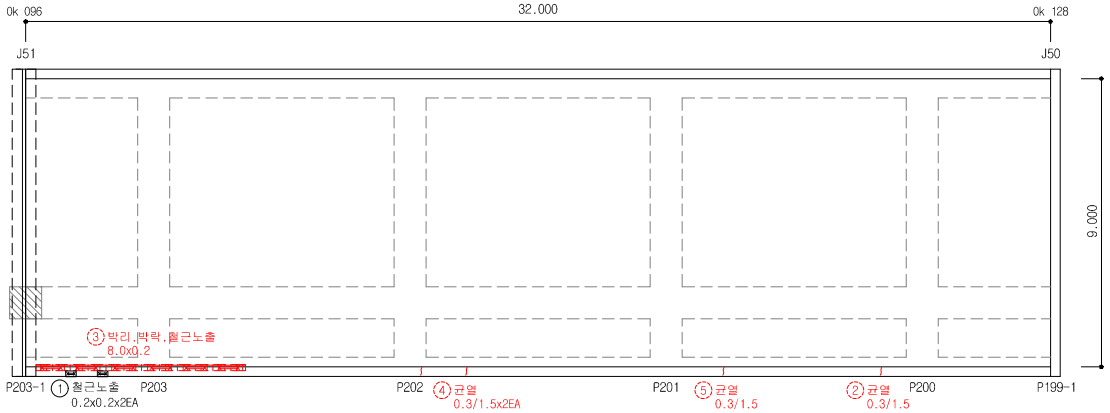


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	철근노출	0.20	0.20		0.08	㎡	2.00				신규	1
2	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
3	2016	박리, 박락, 철근노출	8.00	0.20		1.60	㎡	1.00					1
4	2016	균열	0.30	1.50		3.00	m	2.00					1
5	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	004

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

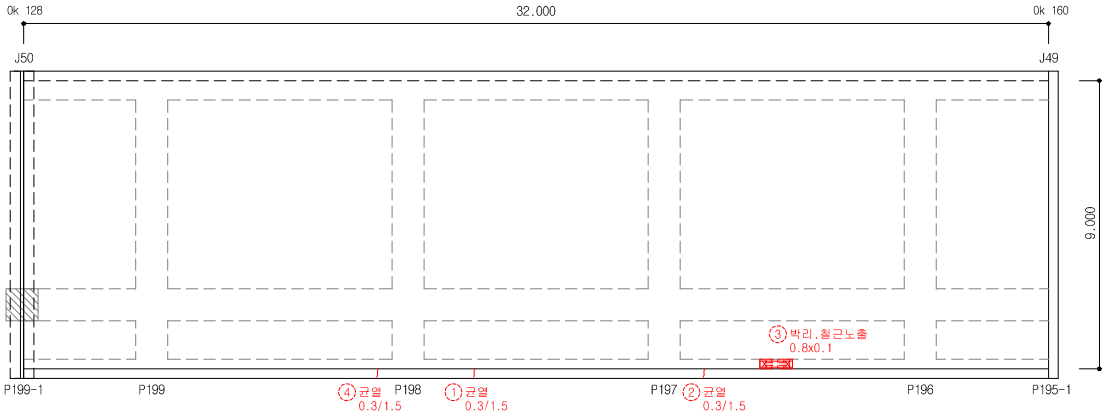


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
2	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
3	2016	박리, 철근노출	0.80	0.10		0.08	㎡	1.00					1
4	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	005

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

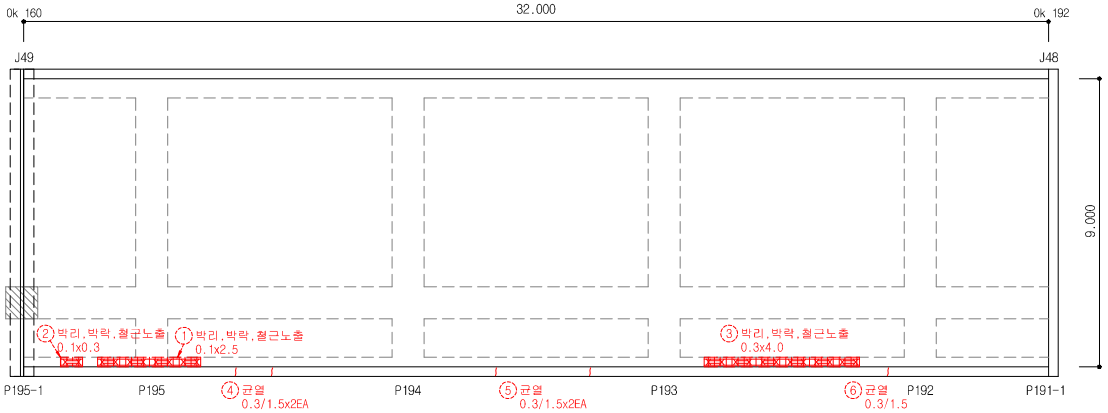


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	박리, 박락, 철근노출	0.10	2.50		0.25	㎡	1.00					1
2	2016	박리, 박락, 철근노출	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00					1
3	2016	박리, 박락, 철근노출	0.30	4.00		1.20	㎡	1.00					1
4	2016	균열	0.30	1.50		3.00	m	2.00					1
5	2016	균열	0.30	1.50		3.00	m	2.00					1
6	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	006

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

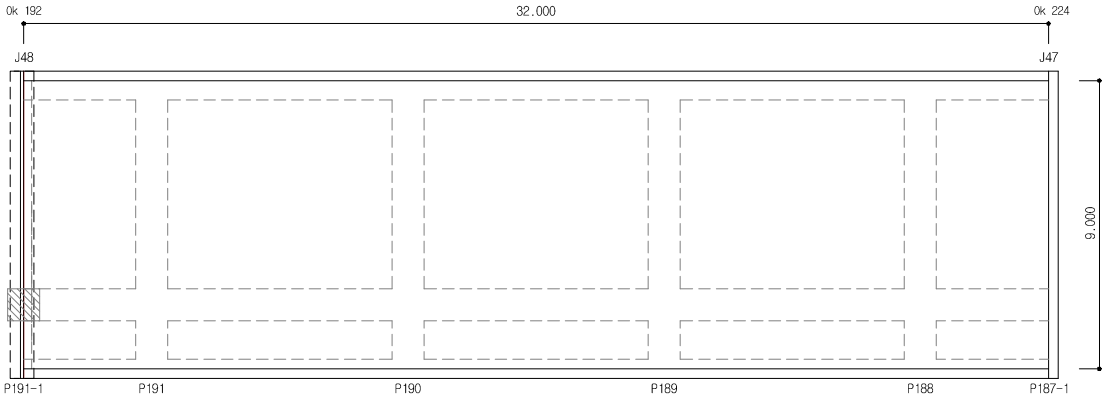


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	007

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

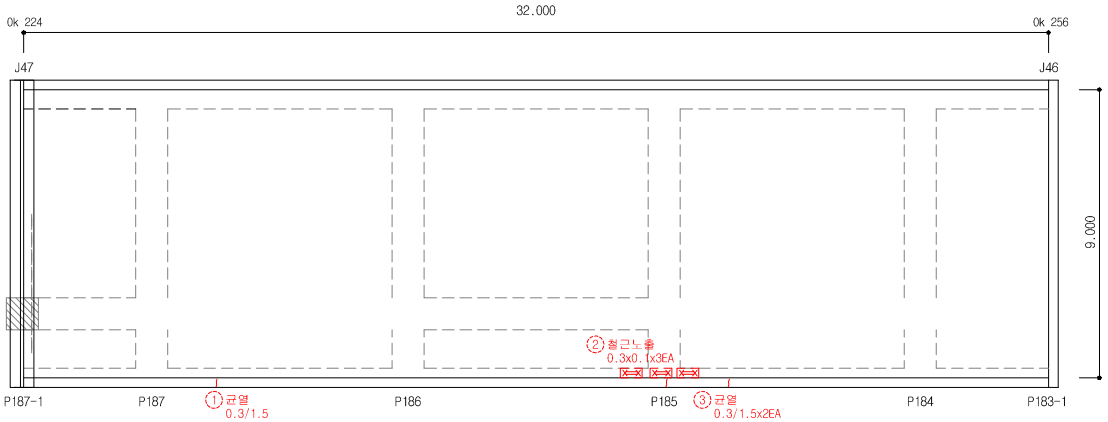


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
2	2016	철근노출	0.30	0.10		0.09	㎡	3.00					1
3	2016	균열	0.30	1.50		3.00	m	2.00					1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	008

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

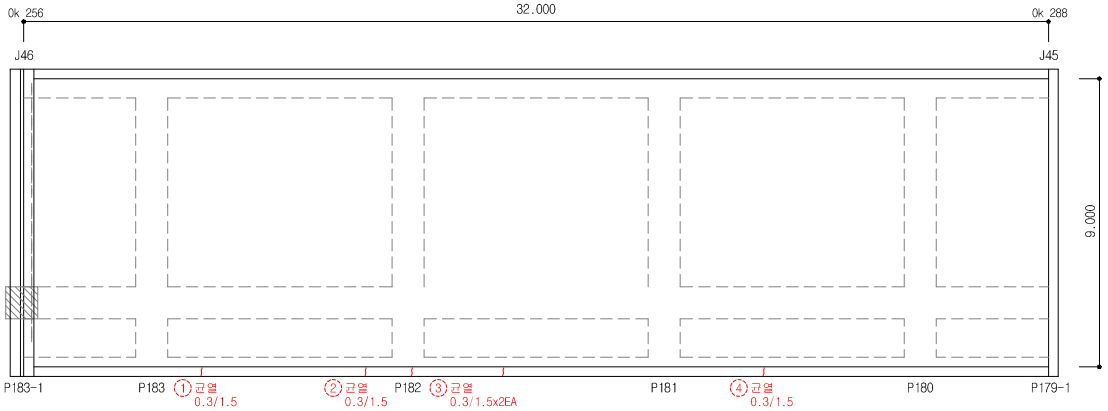


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
2	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
3	2016	균열	0.30	1.50		3.00	m	2.00					1
4	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	009

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

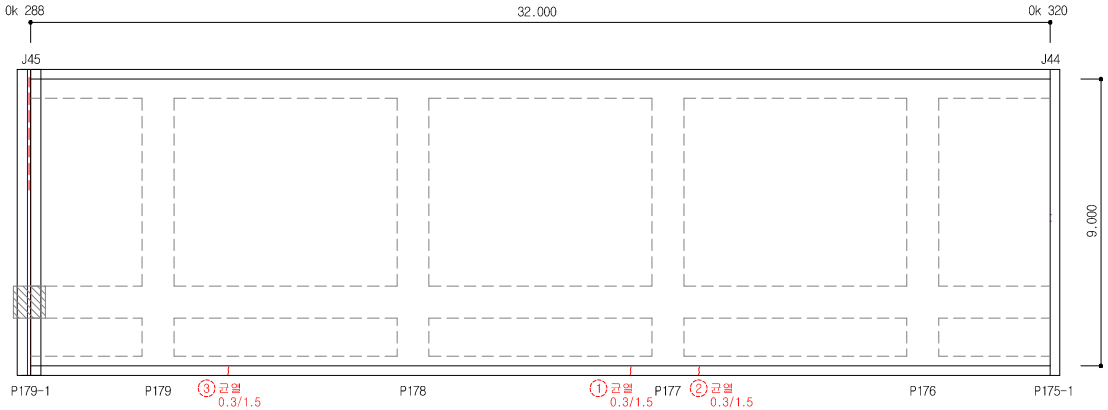


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
2	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
3	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	010

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

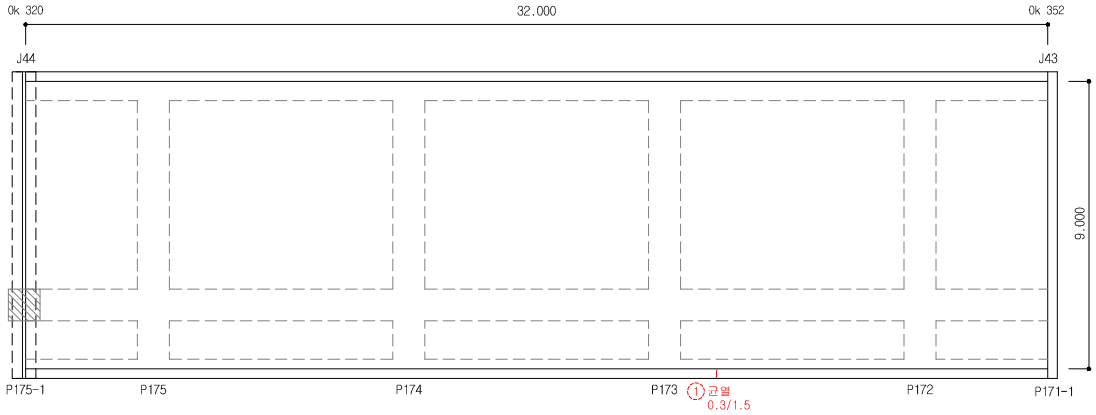


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	011

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

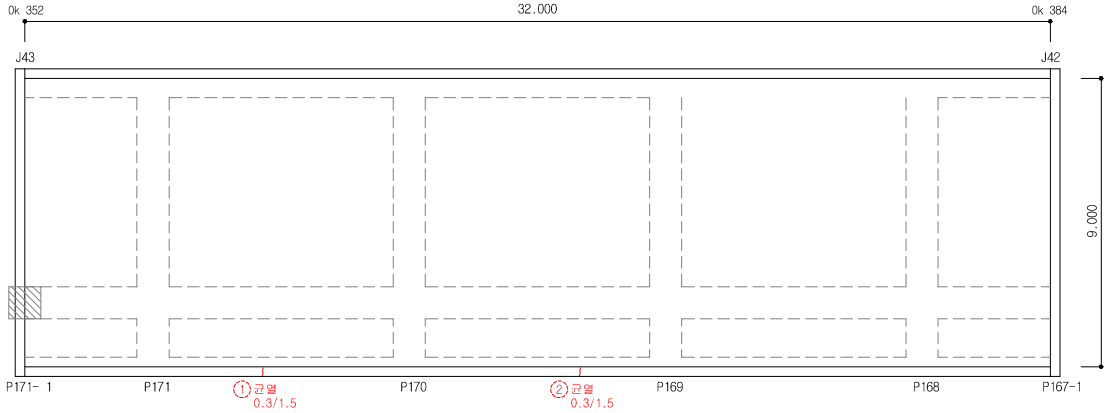


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
2	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	012

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

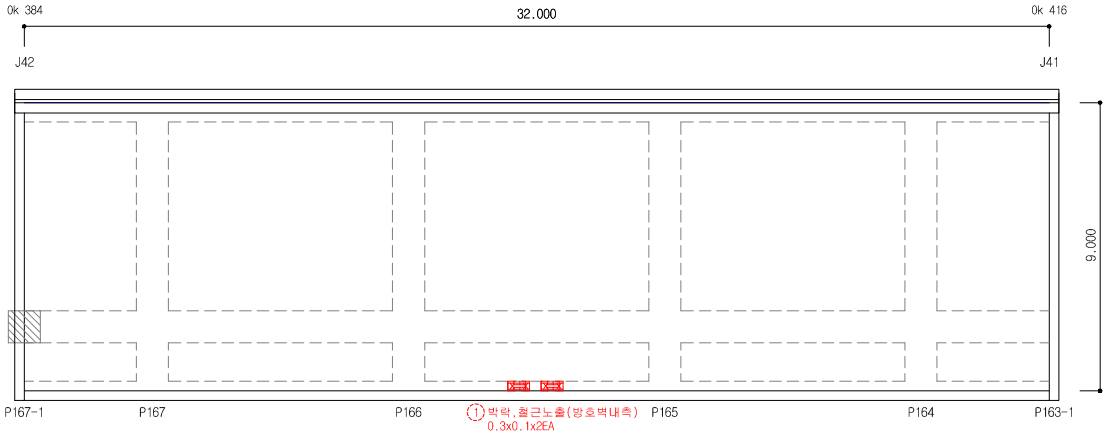


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (mm)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	박락, 철근노출	0.30	0.10		0.06	㎡	2.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기을
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승훈
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	013

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

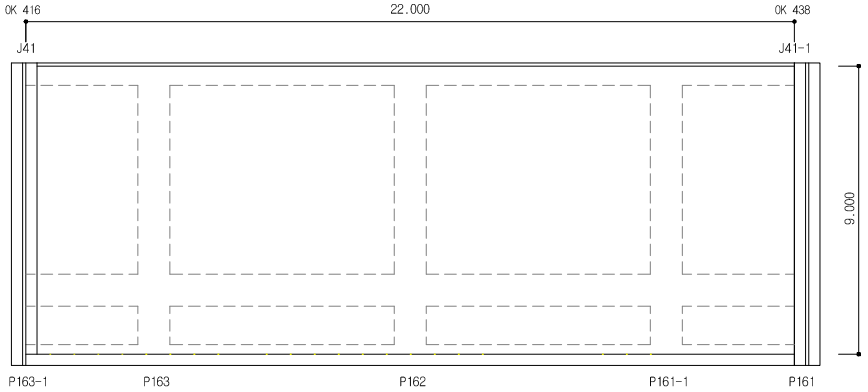


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	014

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

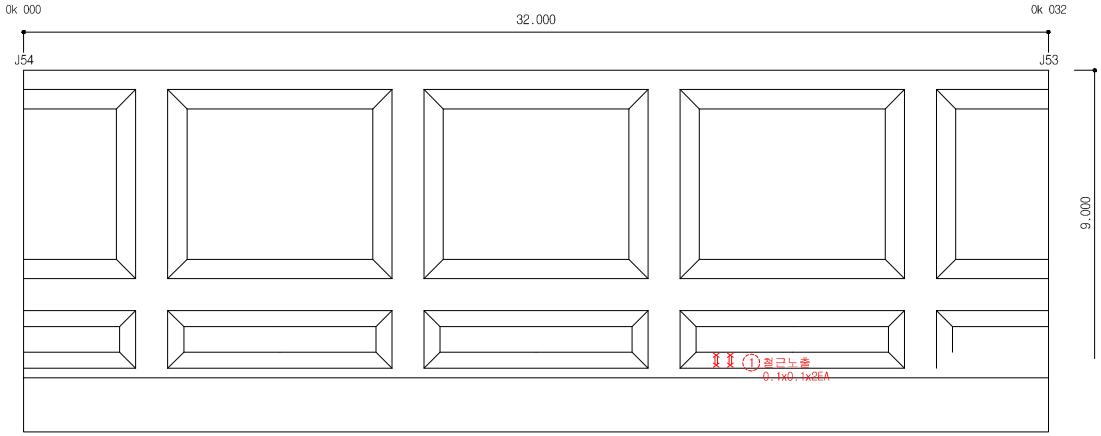


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	철근노출				0.02	㎡	2.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	015

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

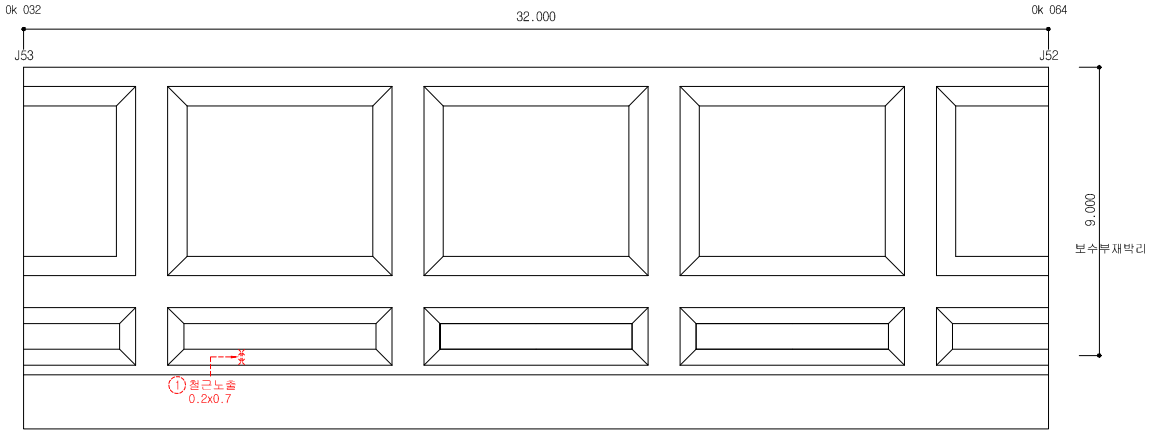


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	철근노출	0.20	0.70		0.14	㎡	1.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	016

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

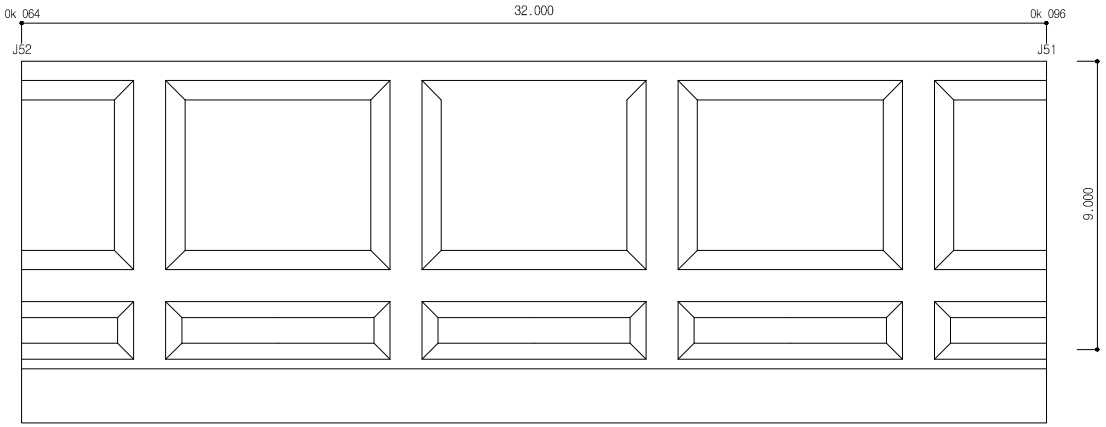


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	017

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

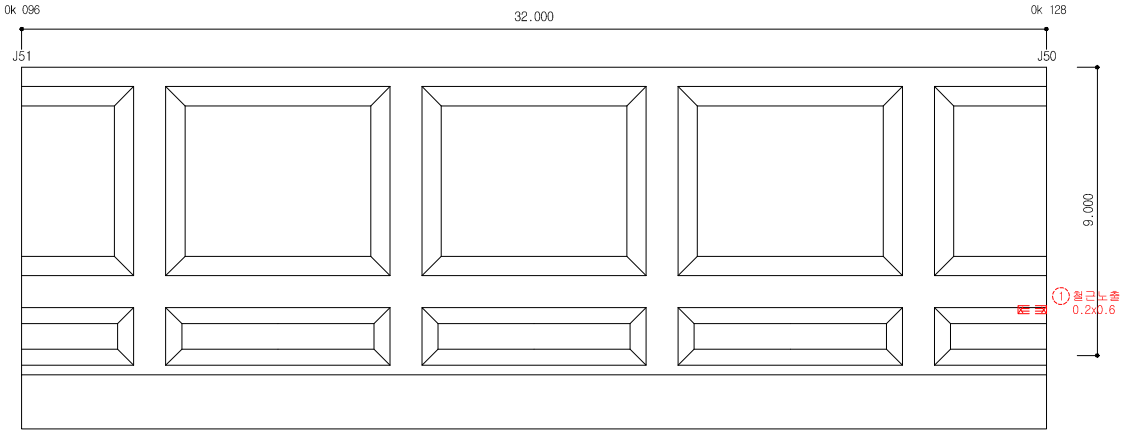


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	철근노출	0.20	0.60		0.12	㎡	1.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	018

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

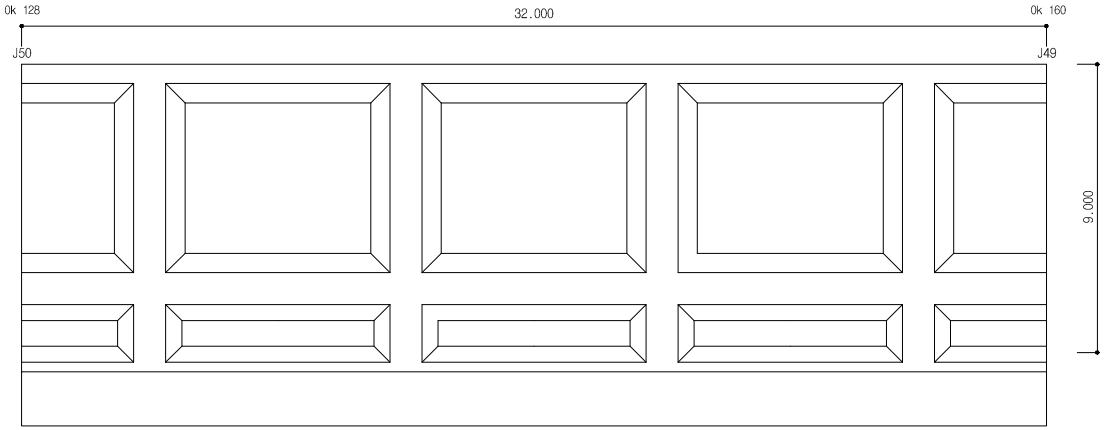


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	019

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

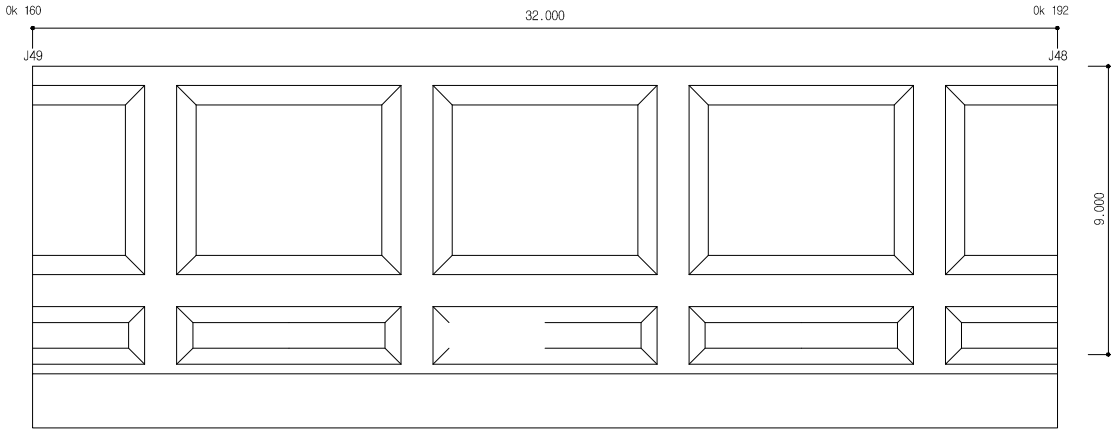


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	020

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

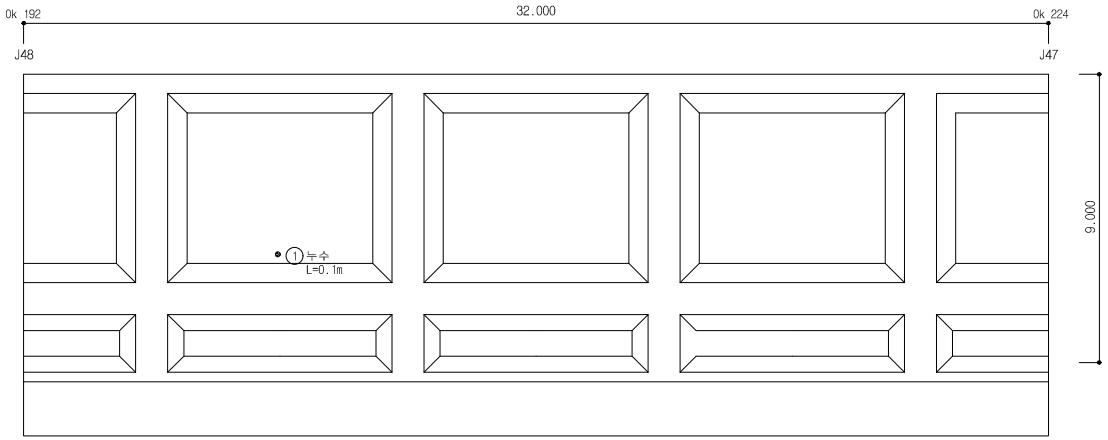


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	누수		0.10		0.10	m	1.00				신규	1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	021

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

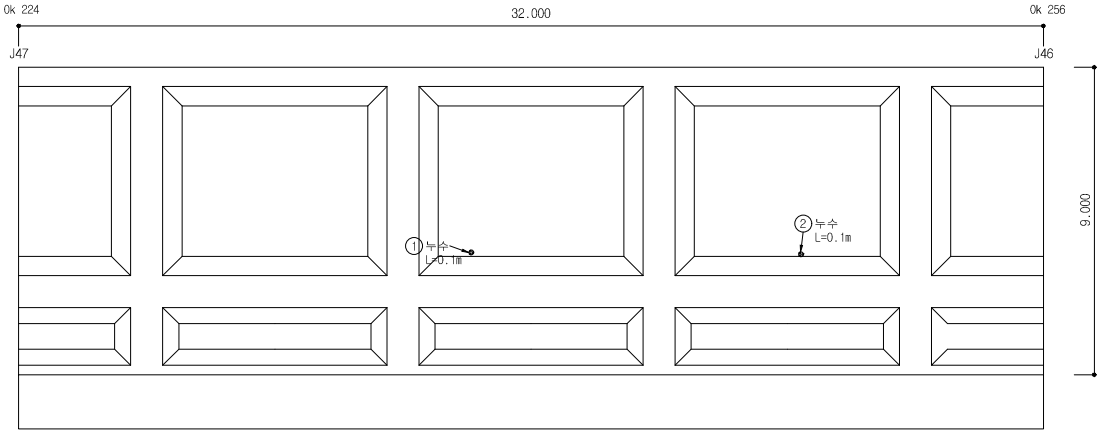


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (mm)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	누수		0.10		0.10	m	1.00				신규	1
2	2019	누수		0.10		0.10	m	1.00				신규	1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	022

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

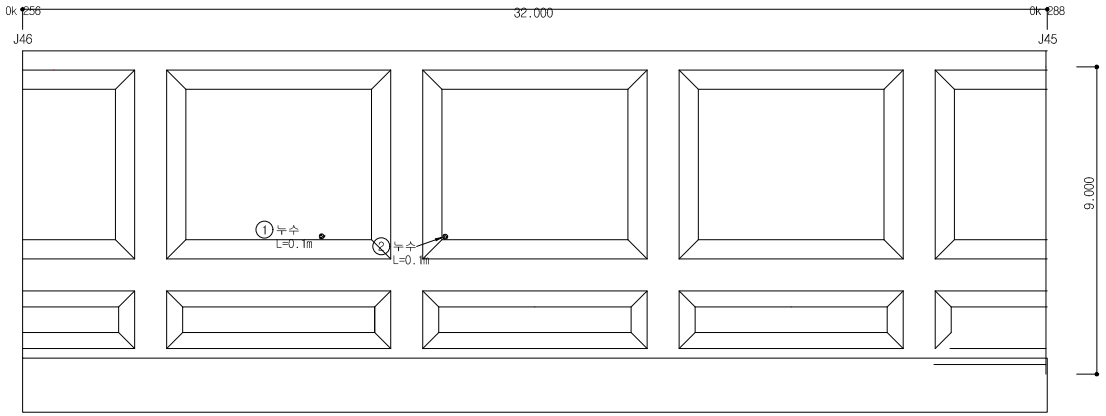


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	누수		0.10		0.10	m	1.00				신규	1
2	2019	누수		0.10		0.10	m	1.00				신규	1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	023

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

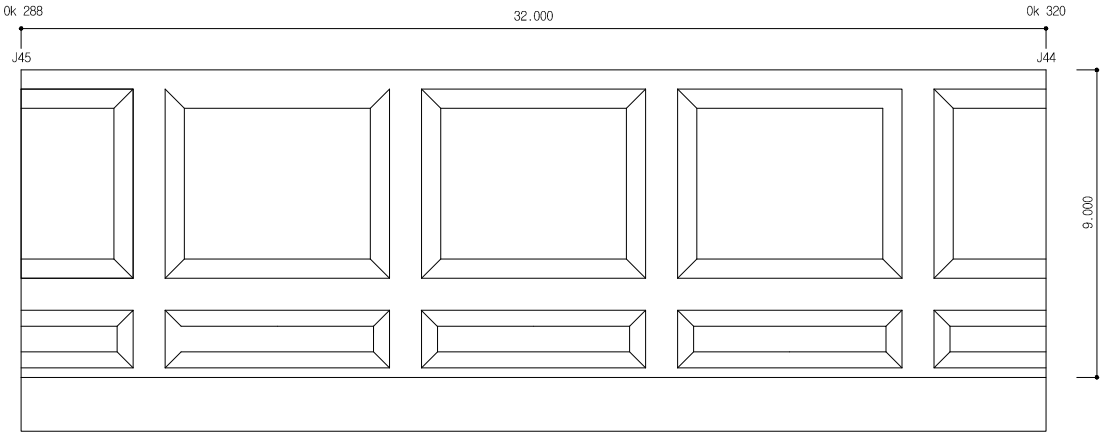


손 상 물 량 표


연번	적용년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전정검 용역					
범 례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	024

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	누수		0.10		0.10	m	1.00				신규	1
2	2019	철근노출	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00				신규	1
3	2019	누수		0.10		0.10	m	1.00				신규	1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

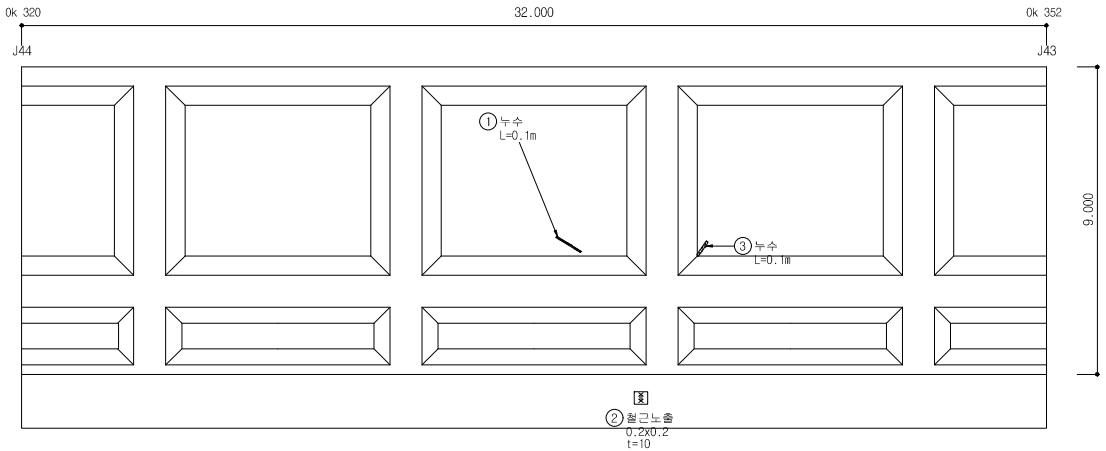


점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범 례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	025

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

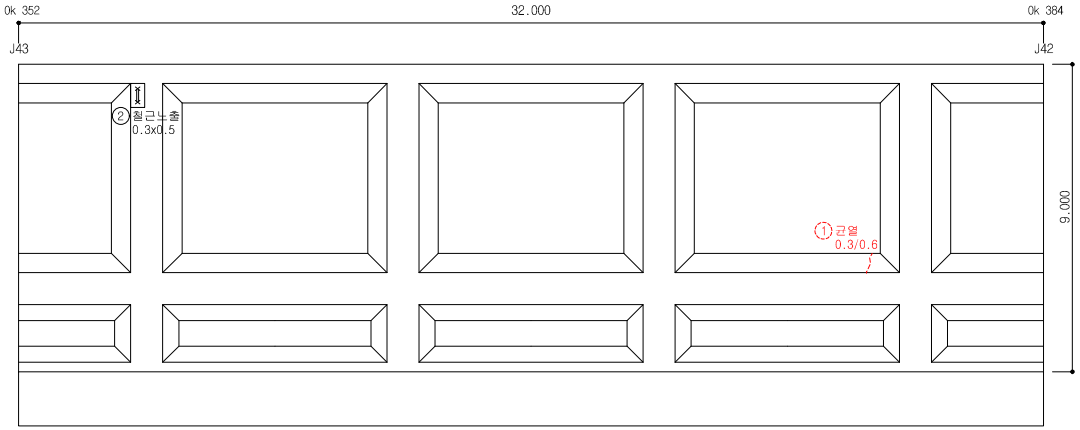


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	균열	0.30	0.60		0.60	m	1.00					1
2	2019	철근노출	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00				신규	1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열 (인)
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환 (인)
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	026

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

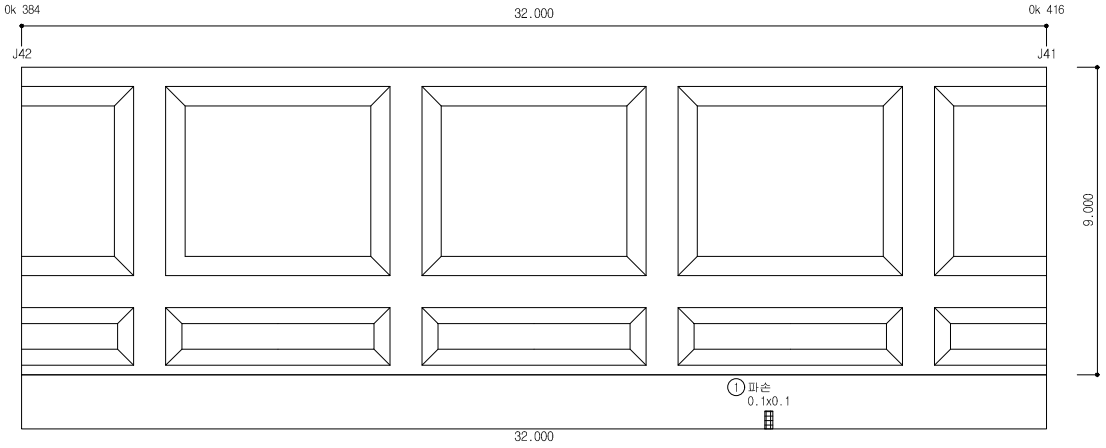


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00				신규	1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열 (인)
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환 (인)
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	027

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

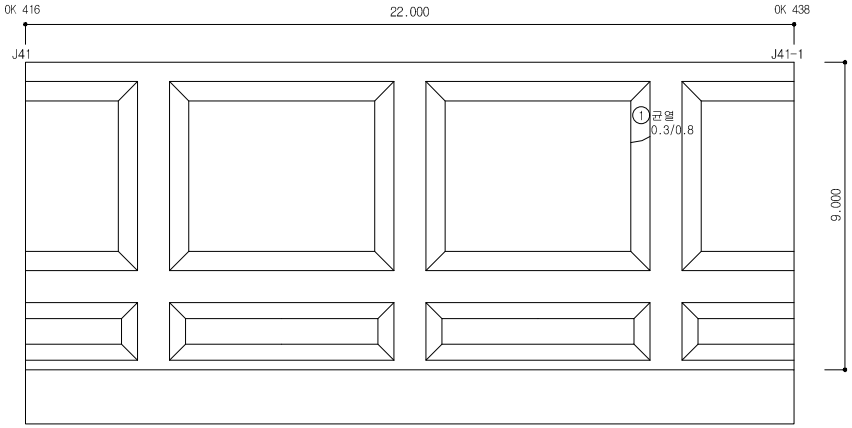


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00				신규	1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열 (인)
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환 (인)
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	028

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

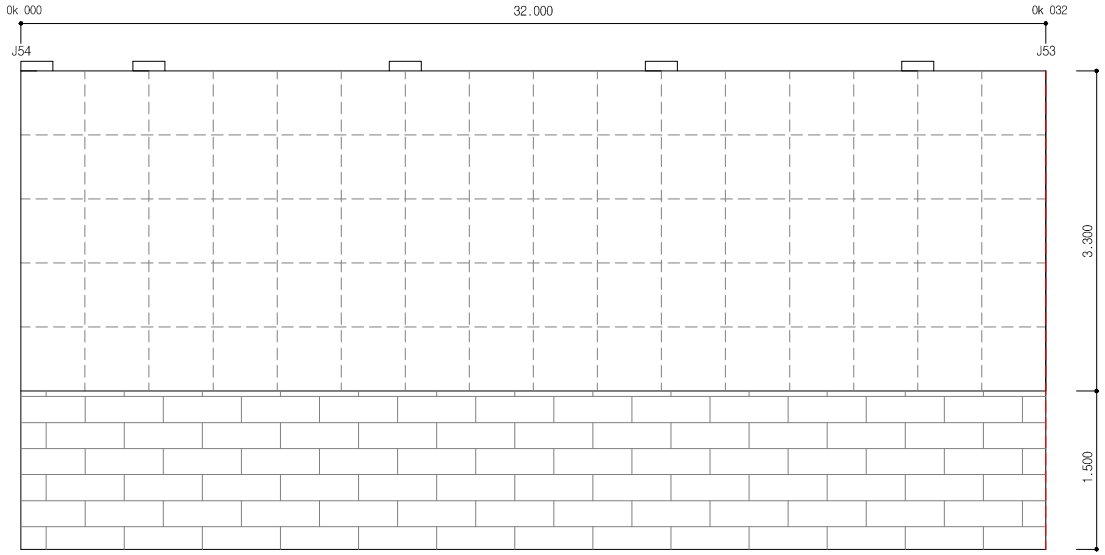


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	029

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

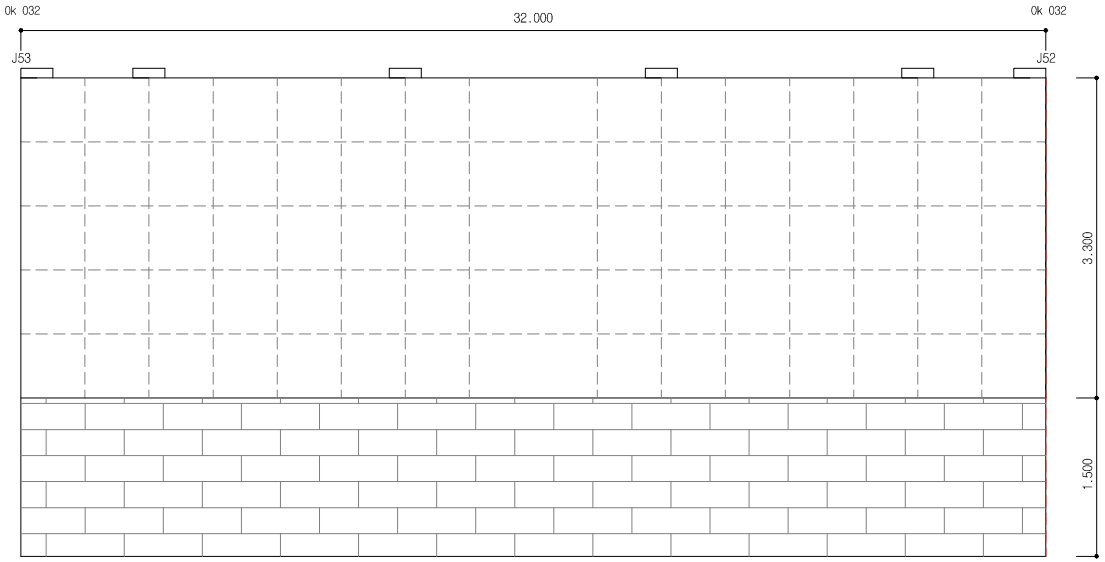


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	030

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

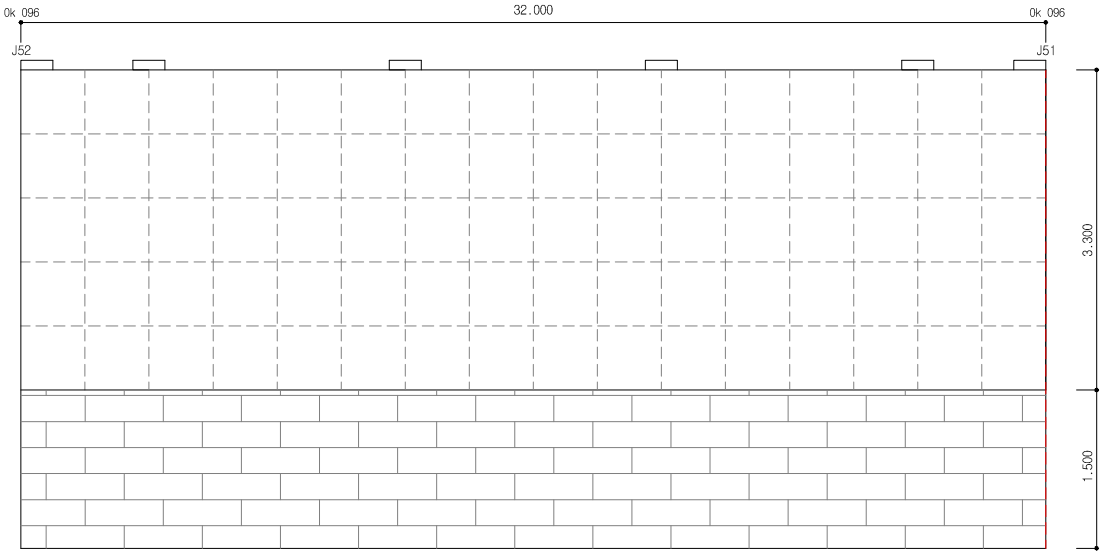


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	031

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

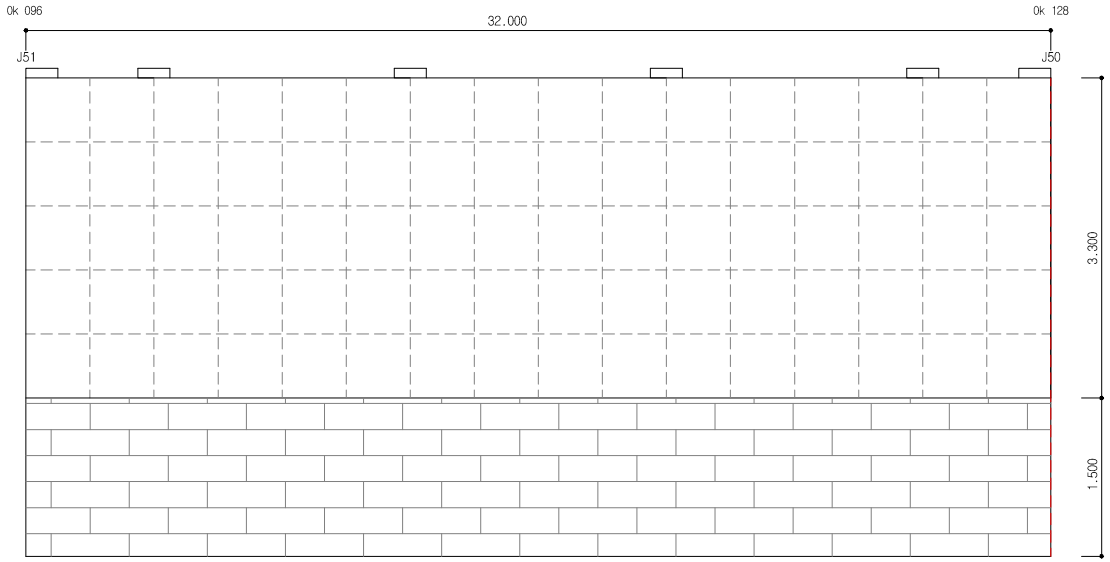


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	032

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

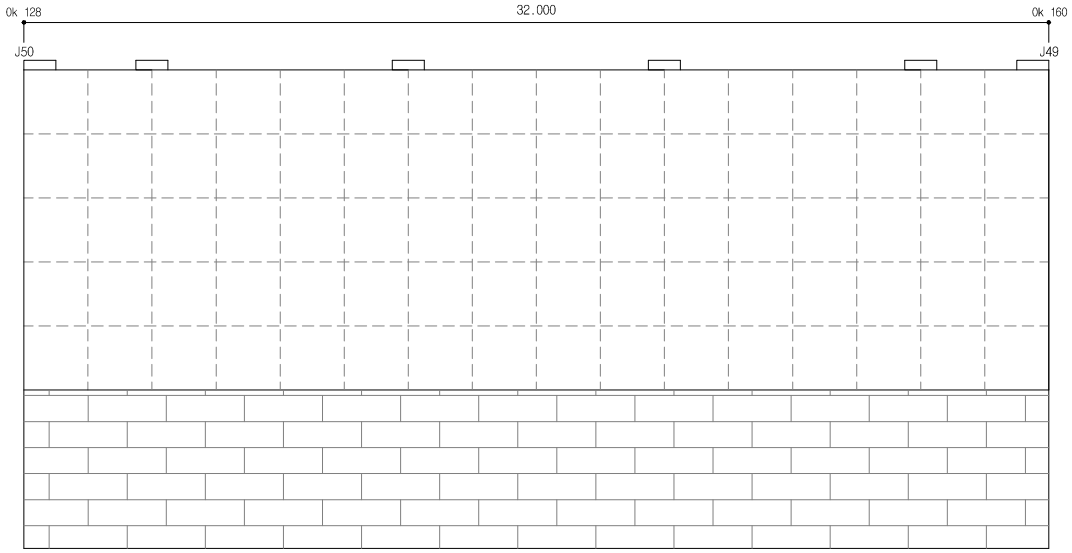


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	033

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

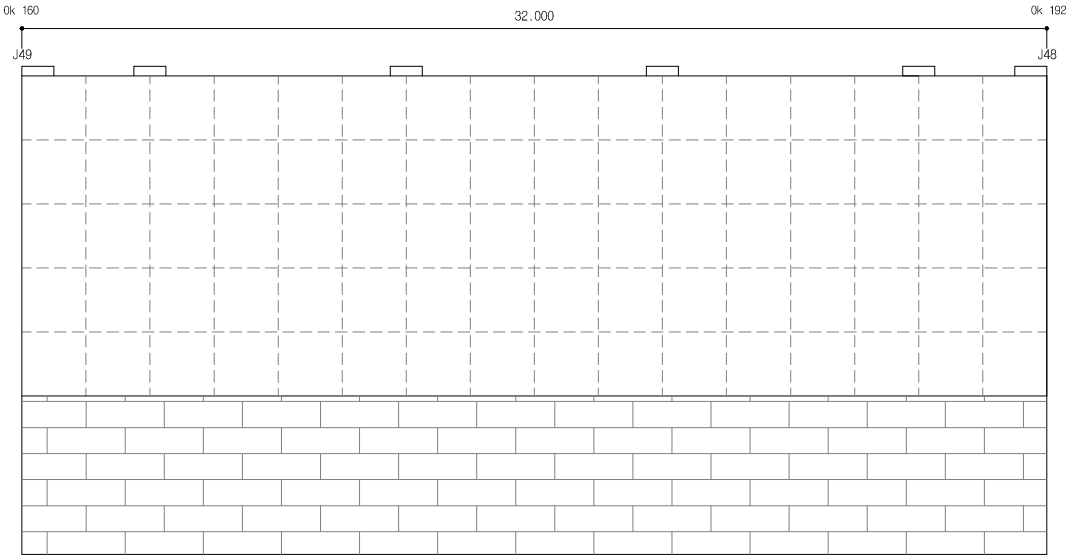


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	034

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

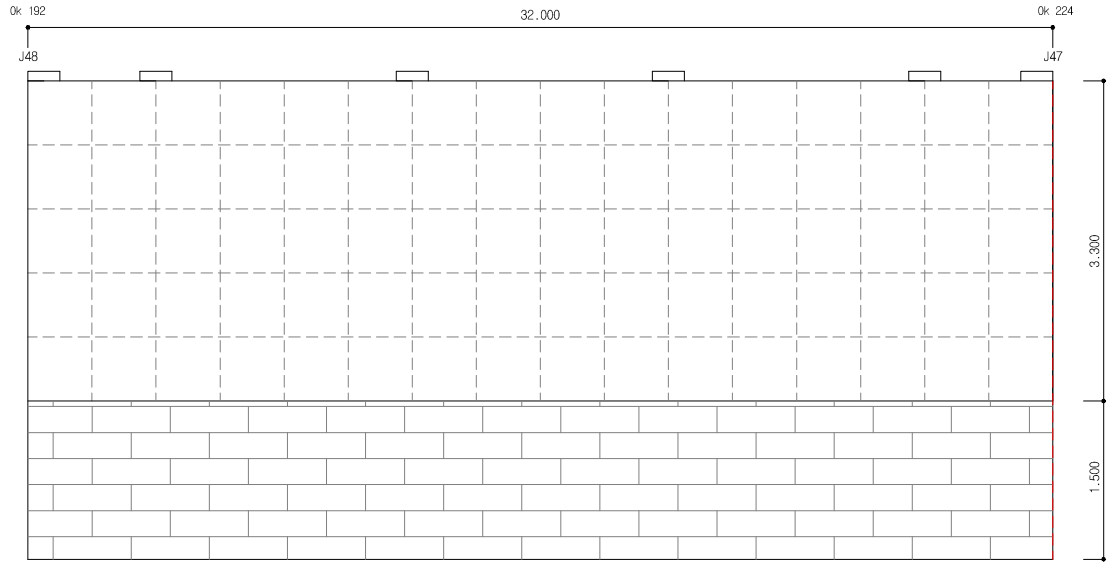


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	035

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

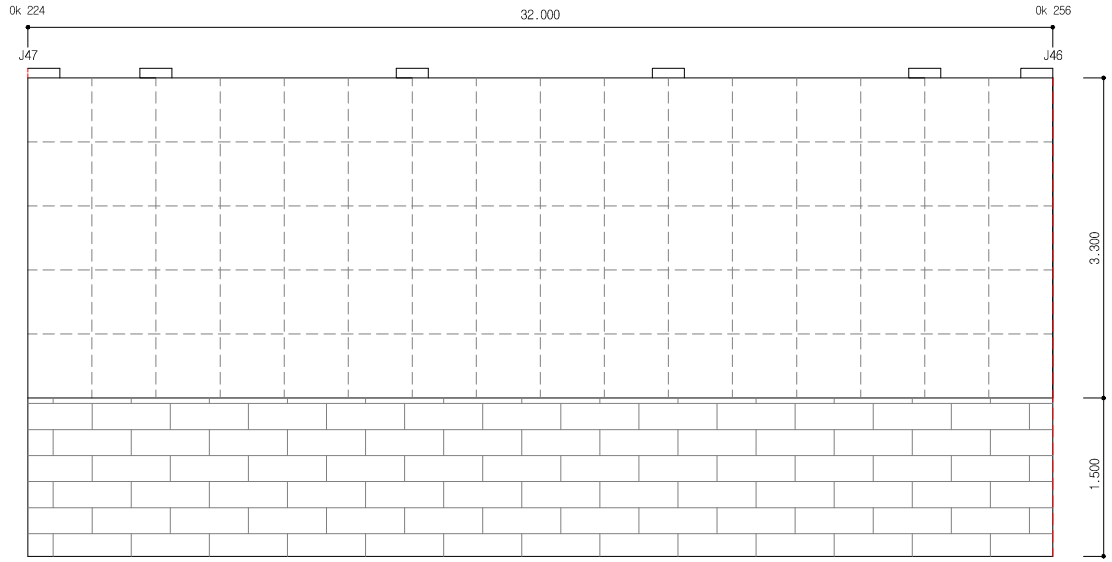


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	036

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

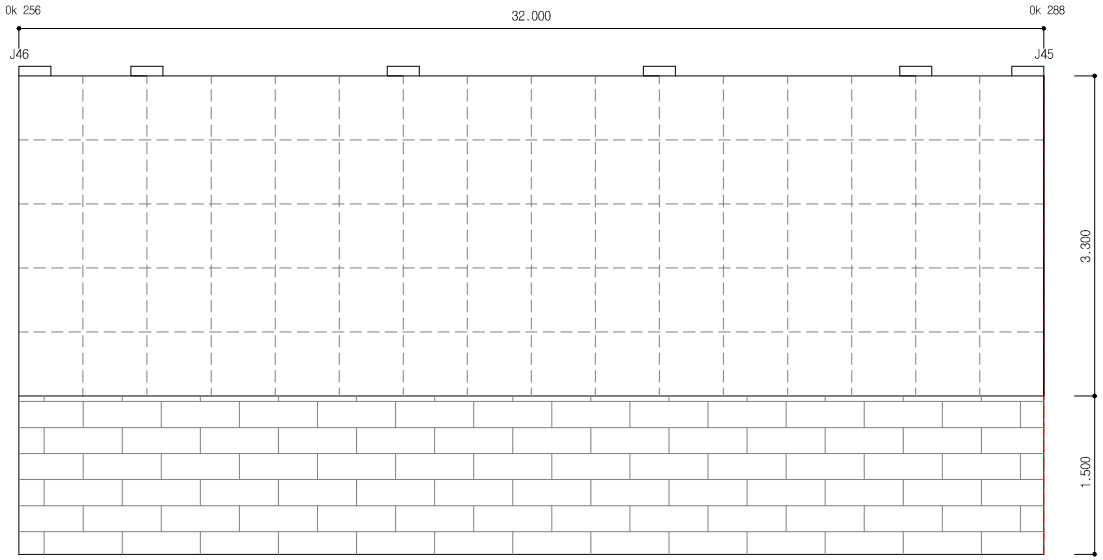


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	037

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

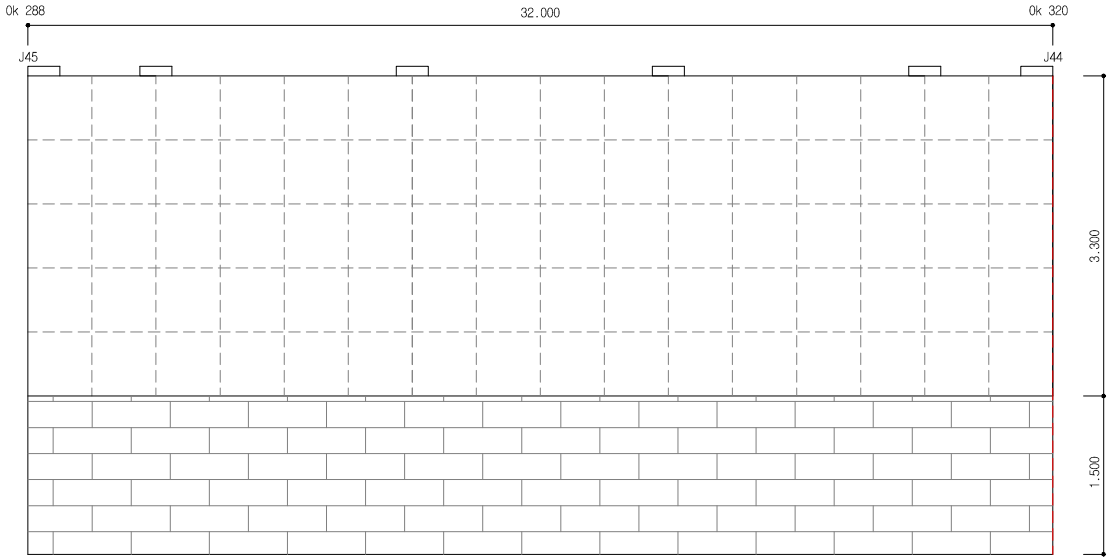


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	038

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

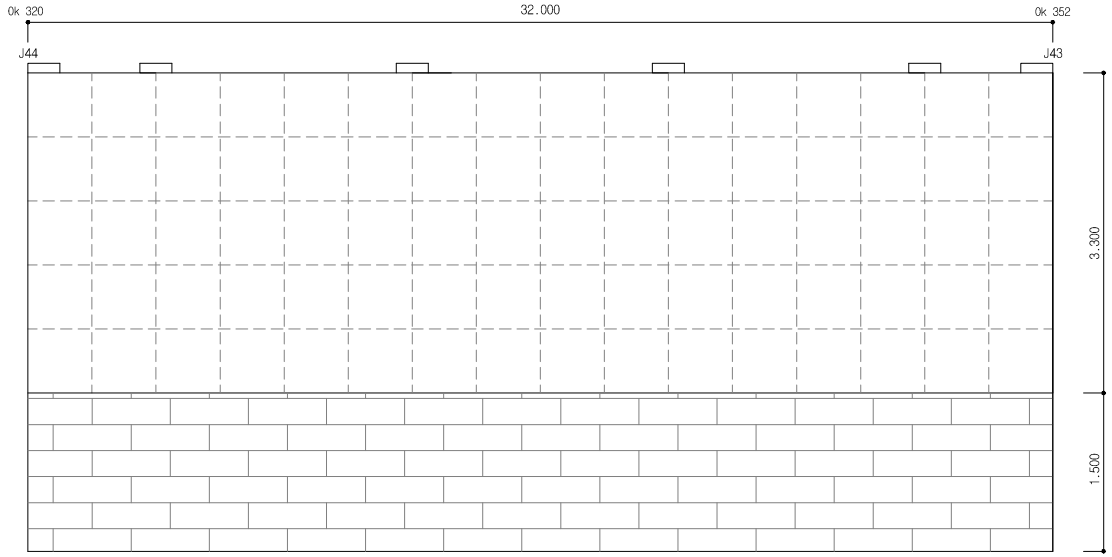


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결함종류	결함규모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭(㎜)	길이(m)	깊이(㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점검·보수범례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용역명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락,박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	039

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

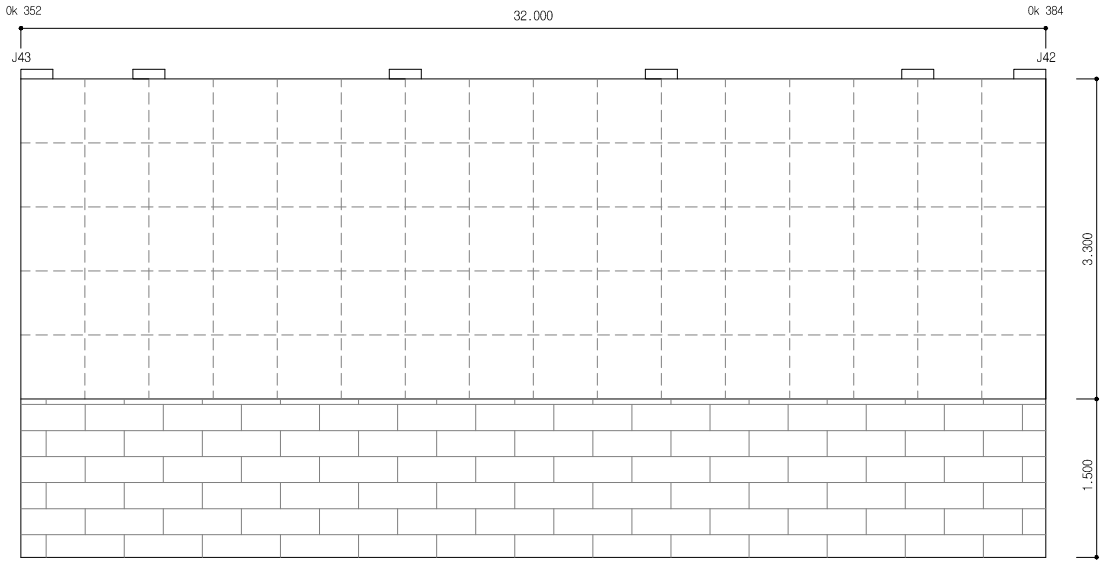


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	040

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

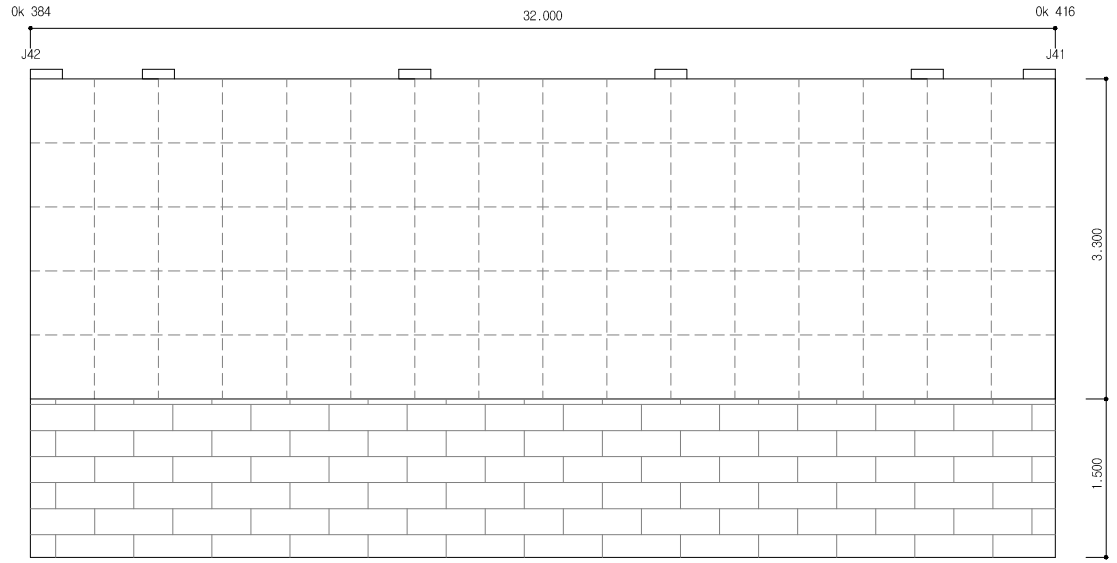


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수우선
			폭 (mm)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	041

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

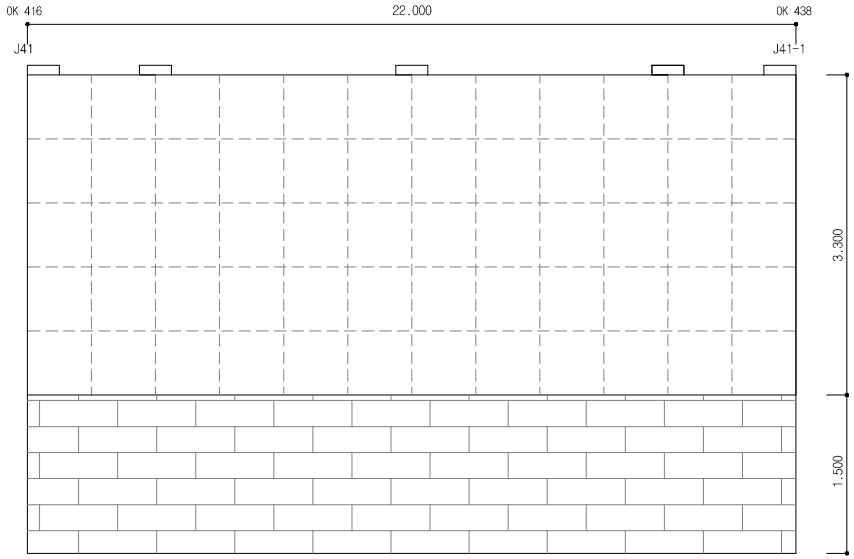


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	042

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

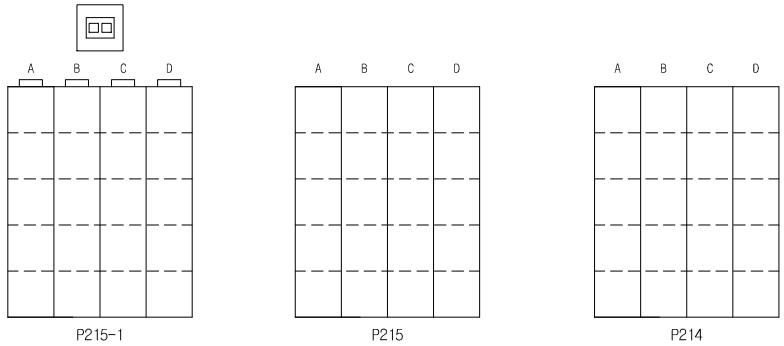


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	043

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

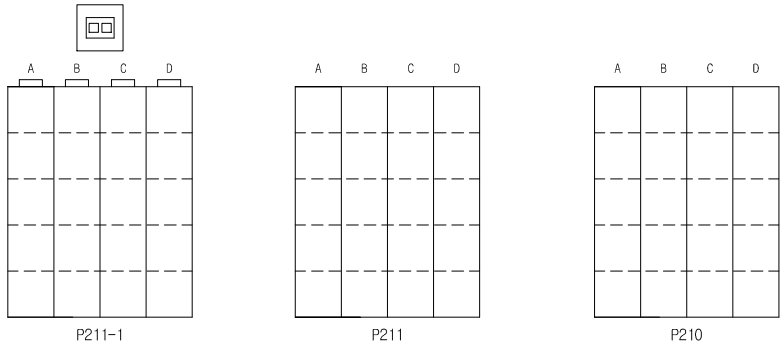


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	044

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

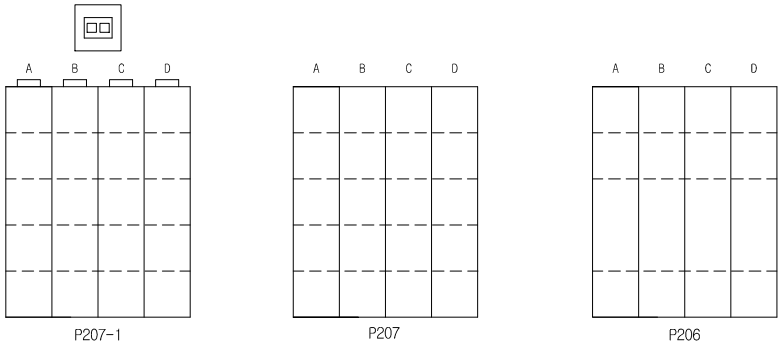


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	045

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

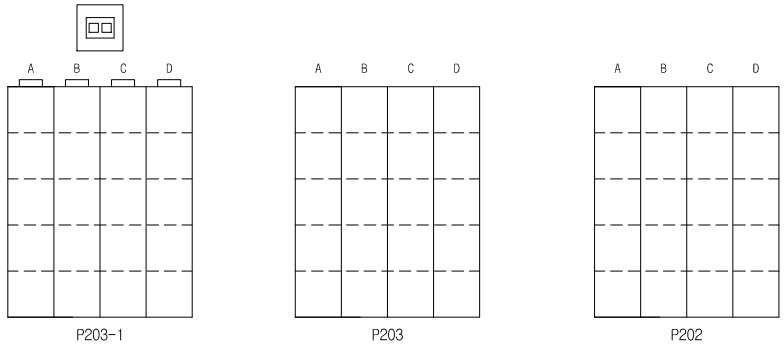


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	046

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

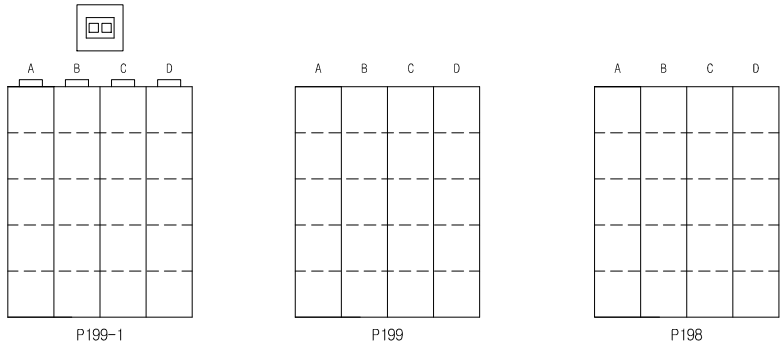


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	047

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

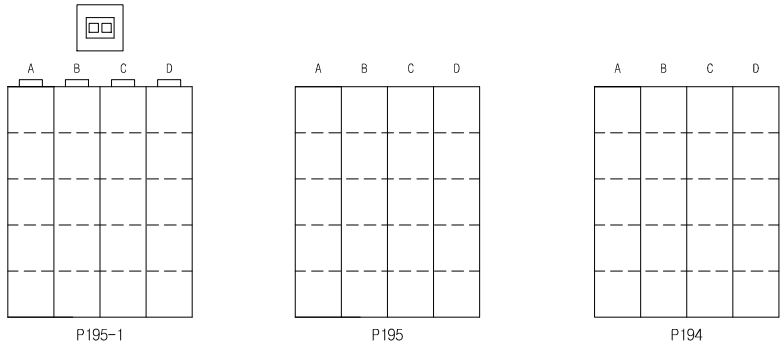


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	048

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

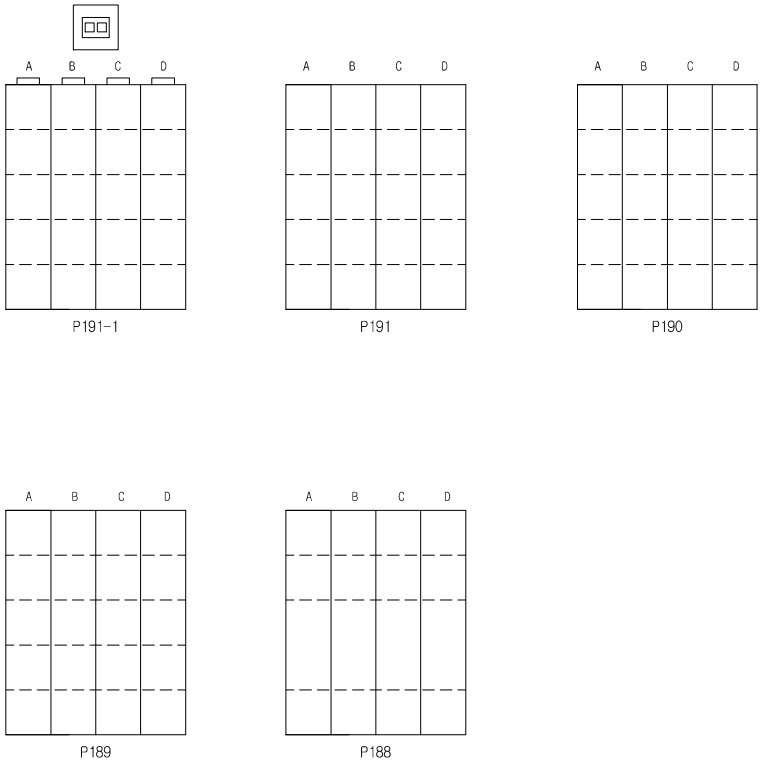


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	049

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

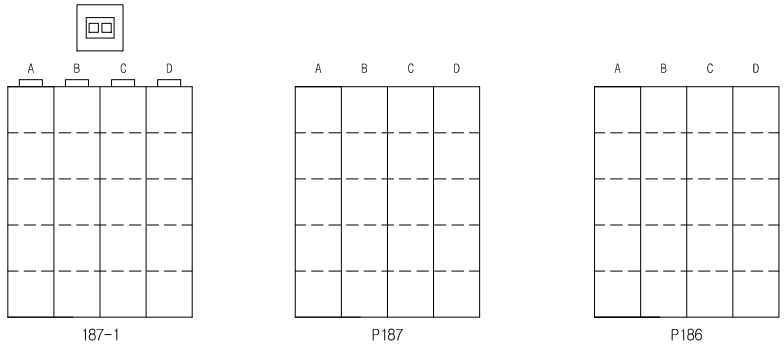


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	050

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

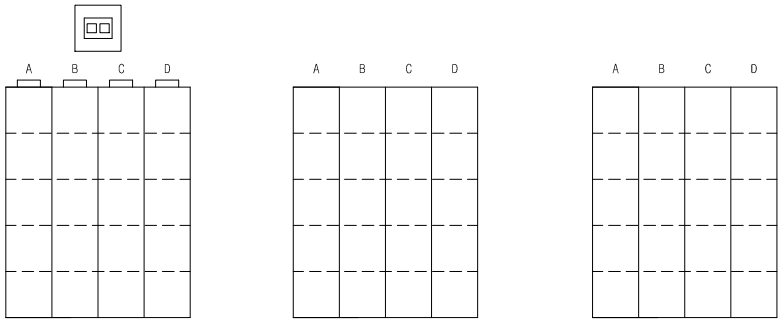


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	051

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

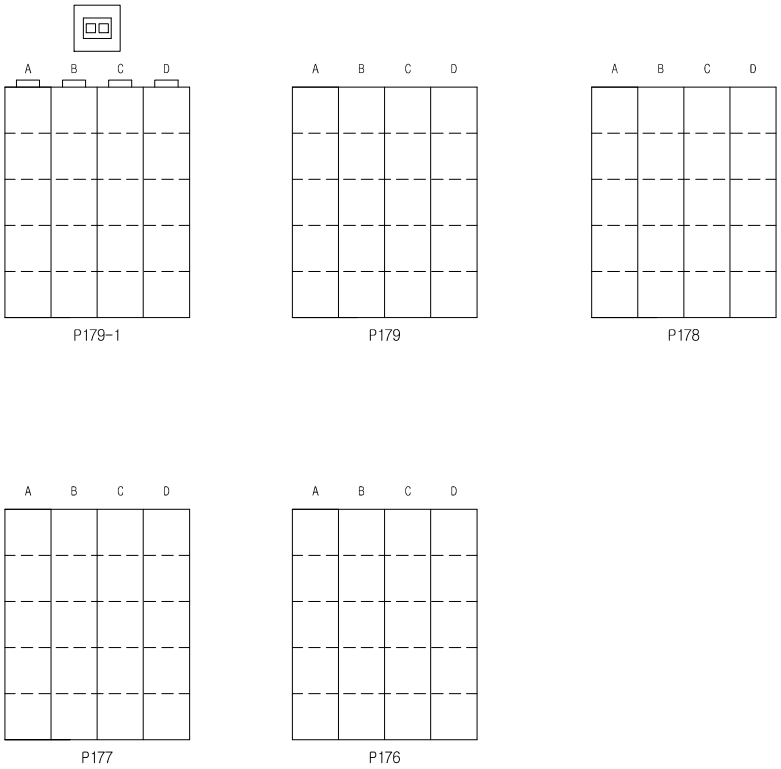


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	052

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

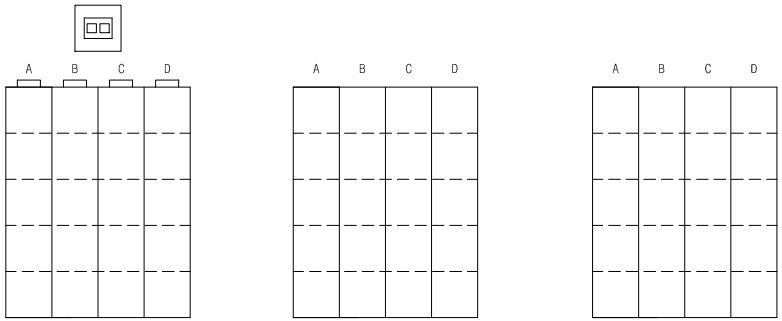


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	053

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

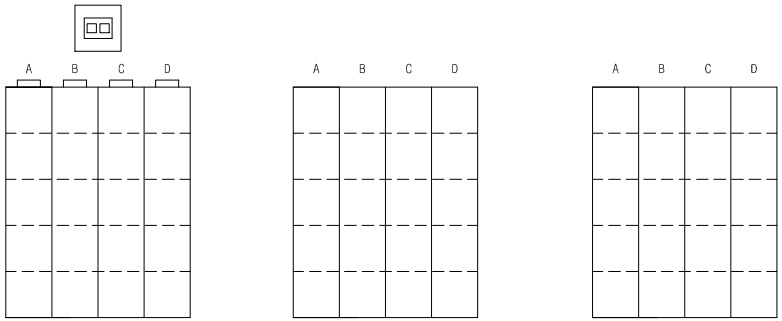


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	054

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

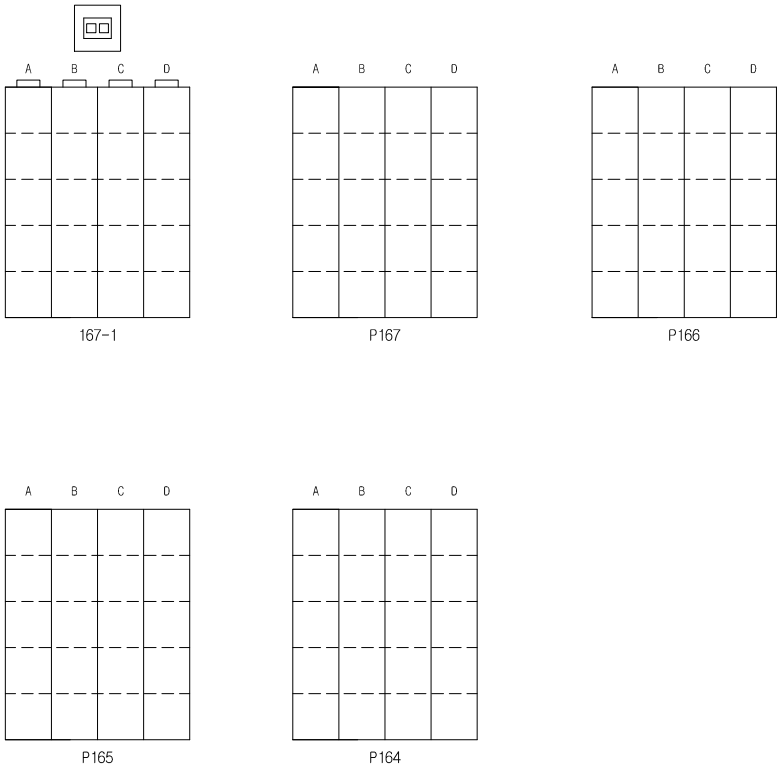


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수우선
			폭 (mm)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기을
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승훈
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	055

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

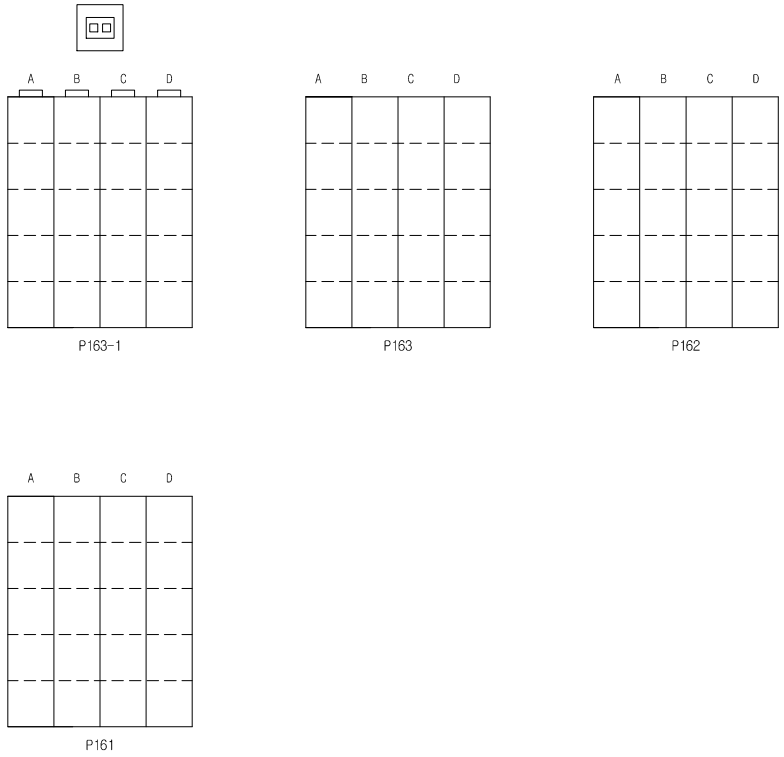


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	056

1.3 1련 (2순위)

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

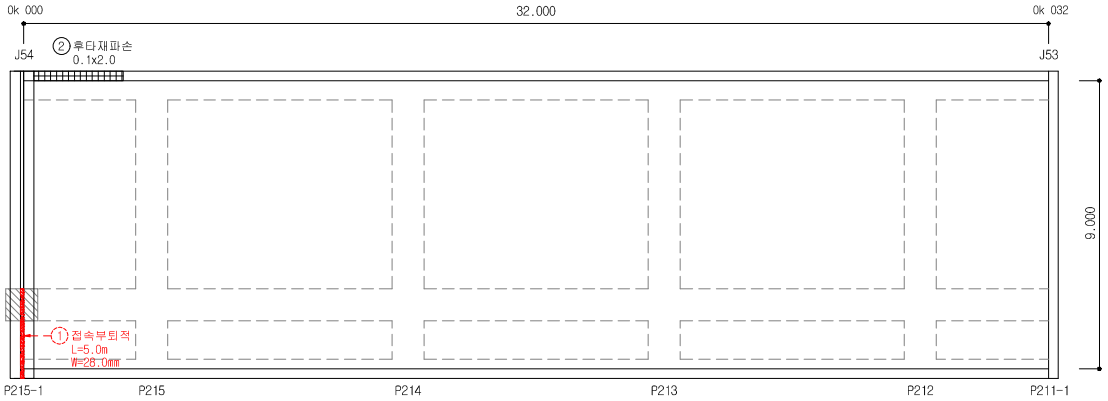


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	접속부 토사퇴적		5.00		5.00	m	1.00					2
2	2019	후타재파손	0.10	2.00		0.20	㎡	1.00				신규	2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	001

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

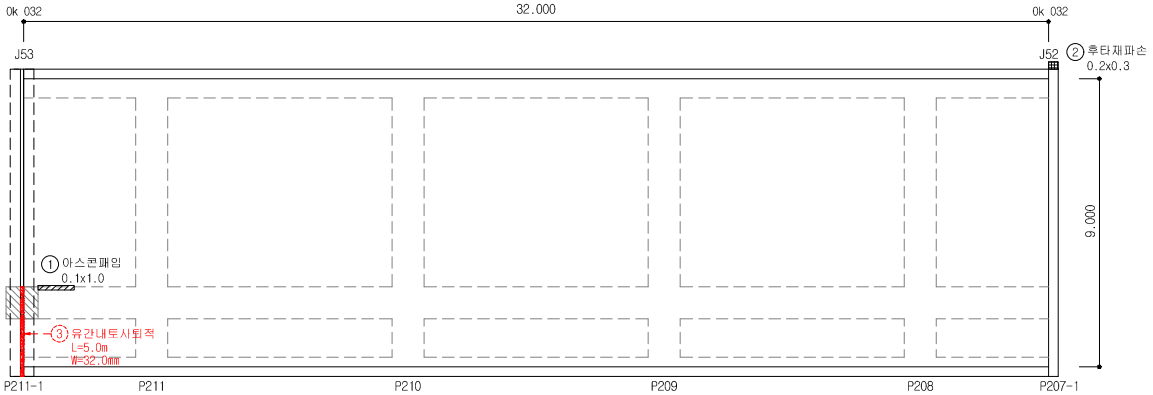


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	아스콘패임	0.10	1.00		0.10	㎡	1.00				신규	2
2	2019	후타재파손	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00				신규	2
3	2016	유간내 토사퇴적		5.00		5.00	m	1.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	002

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

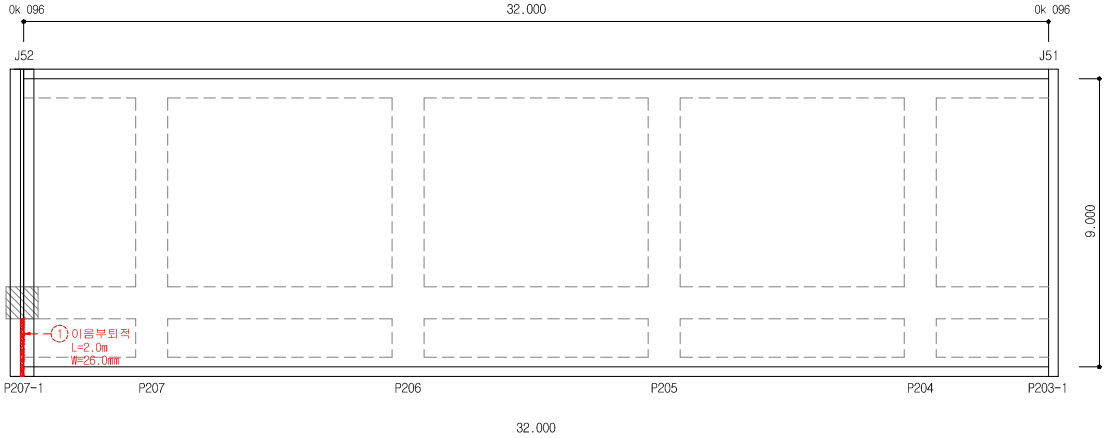


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (mm)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	이음부 퇴적		2.00		2.00	m	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	003

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

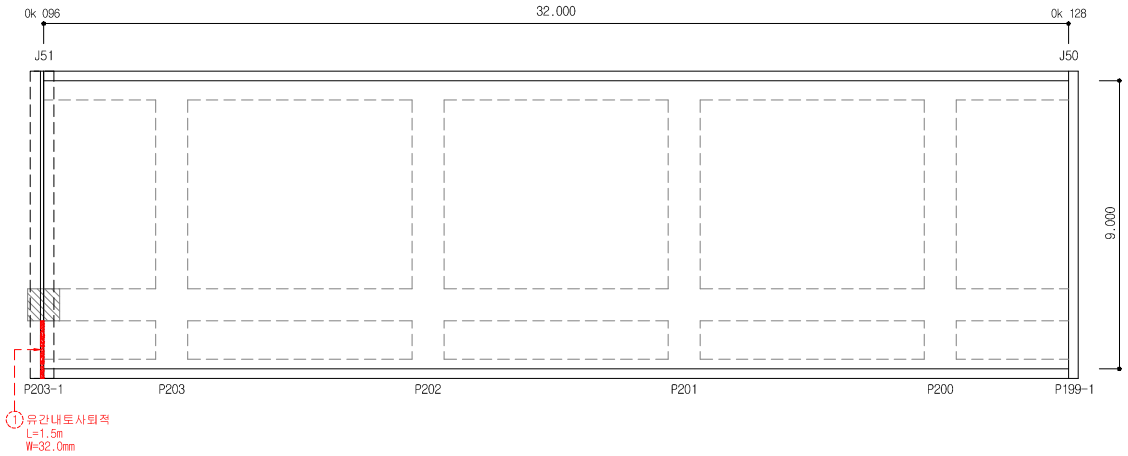


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	유간내 토사퇴적		1.50		1.50	m	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	004

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

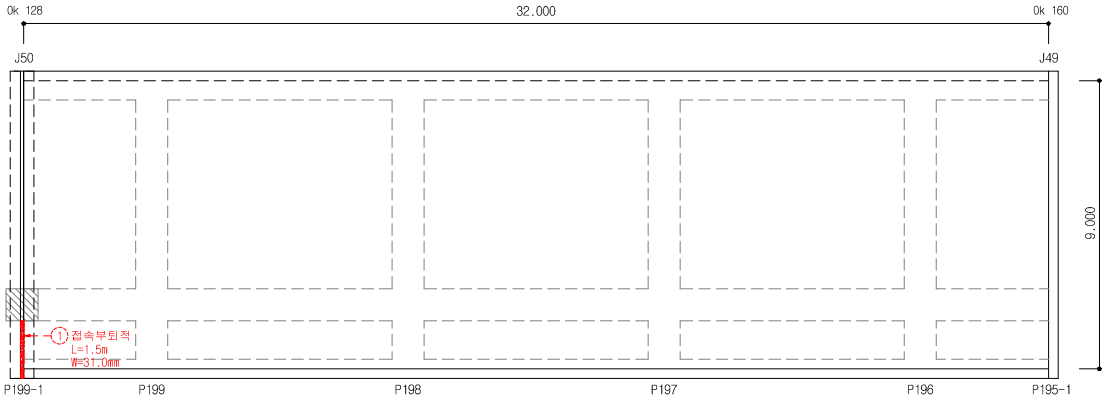


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	접속부 토사퇴적		1.50		1.50	m	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	005

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

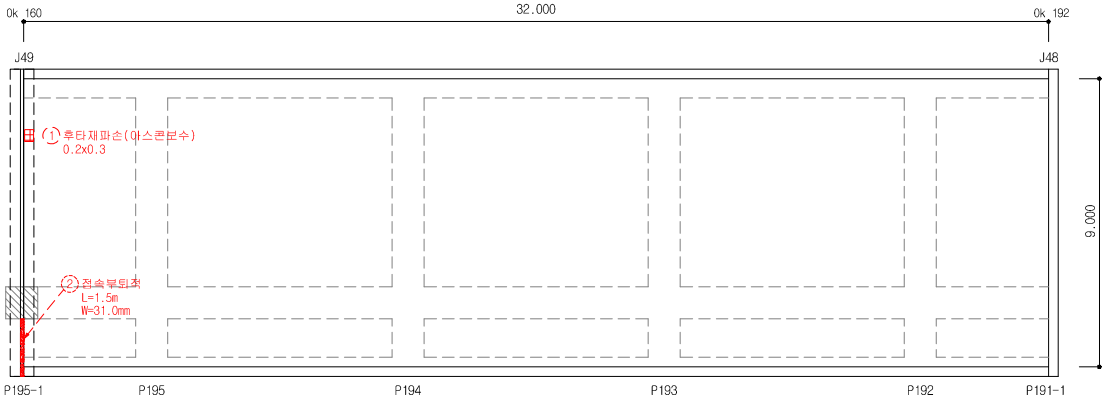


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	후타재 파손	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00					2
2	2016	접속부 퇴적		1.50		1.50	m	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	006

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

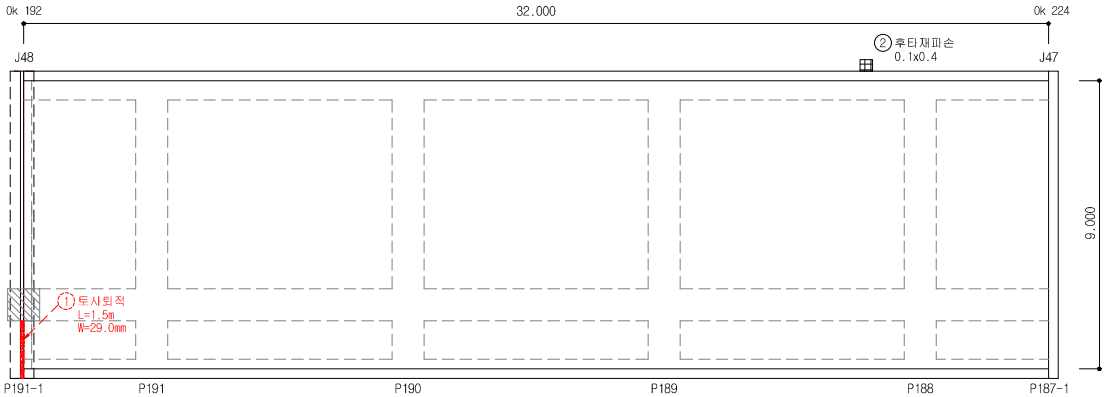


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (mm)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	도사퇴적		1.50		1.50	m	1.00					2
2	2019	후타재파손	0.10	0.40		0.04	㎡	1.00				신규	2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	007

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

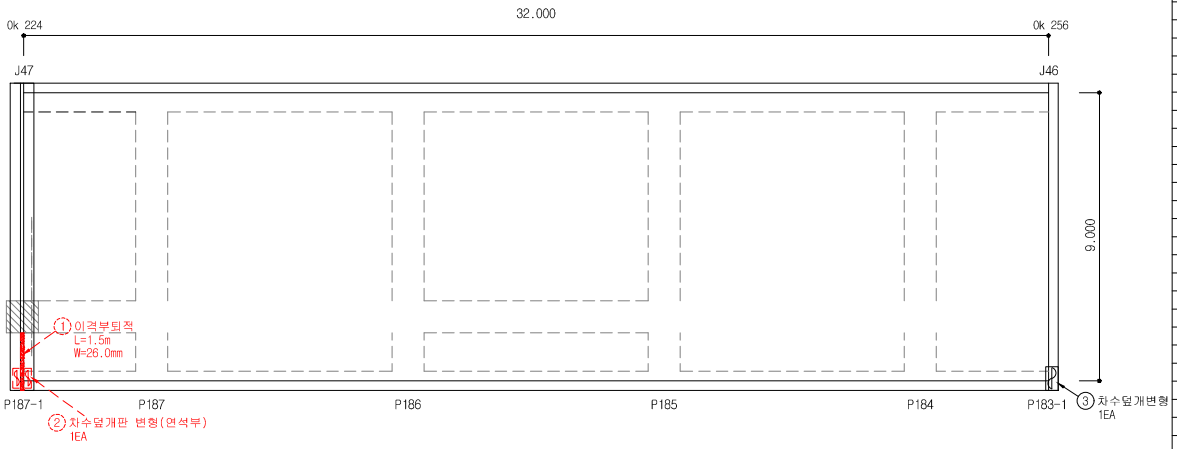


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (mm)	깊이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	이격부 퇴적		1.50		1.50	m	1.00					2
2	2016	차수덮개판 변형				1.00	EA	1.00					2
3	2019	차수덮개변형	-	-		1.00	EA	1.00				신규	2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	008

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

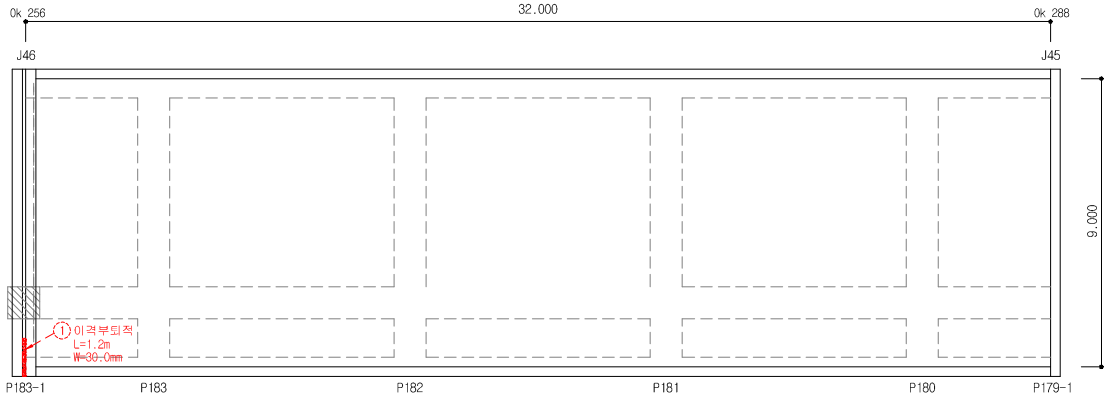


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	이격부 되적		1.20		1.20	m	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	009

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

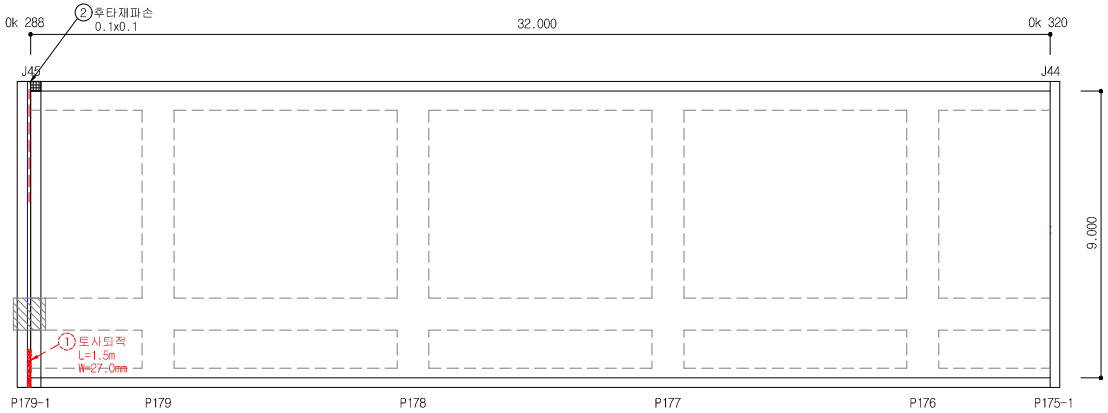


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	토사퇴적		1.50		1.50	m	1.00					2
2	2019	후타재파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00				신규	2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	010

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

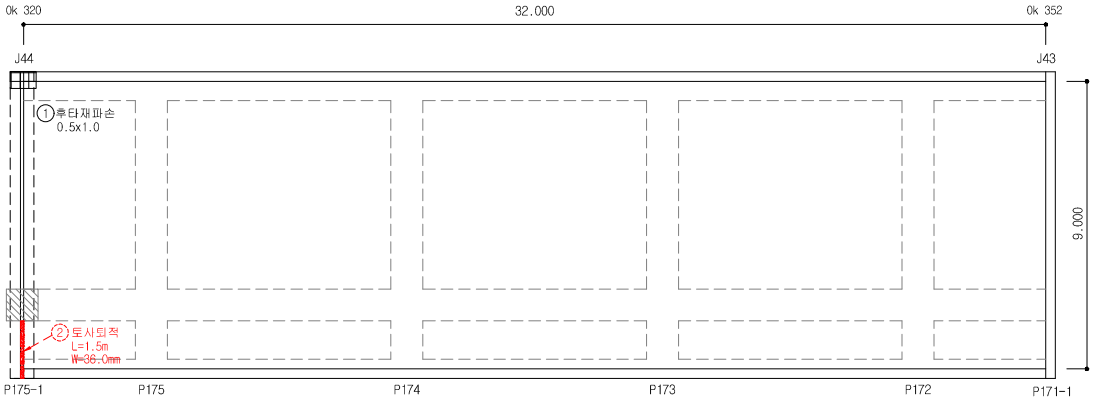


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	후타재파손	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00				신규	2
2	2016	토사퇴적		1.50		1.50	m	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	011

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

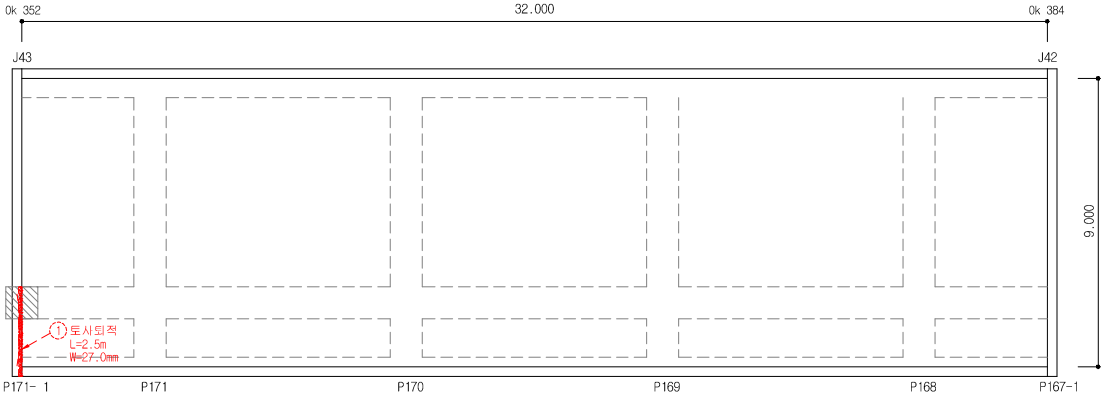


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	토사퇴적		2.50		2.50	m	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	012

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

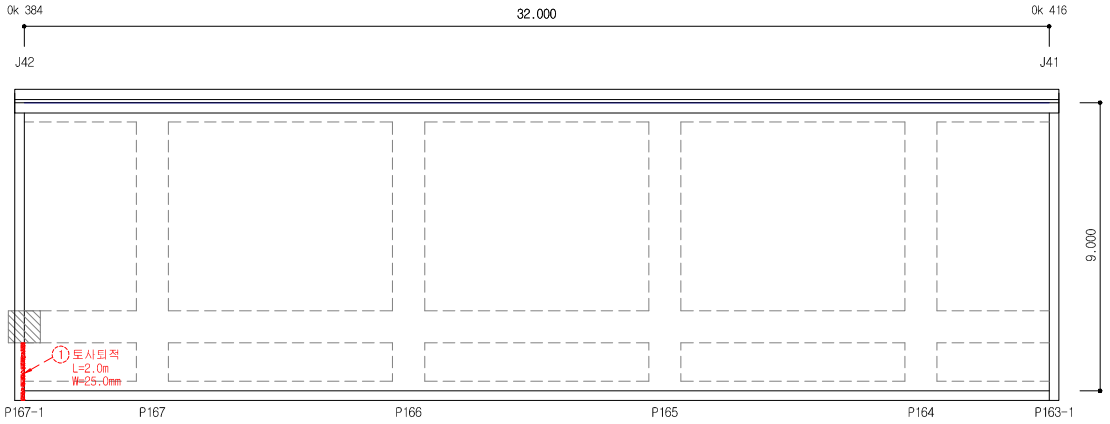


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (mm)	길이 (m)	길이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	토사퇴적		2.00		2.00	m	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	013

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판상면

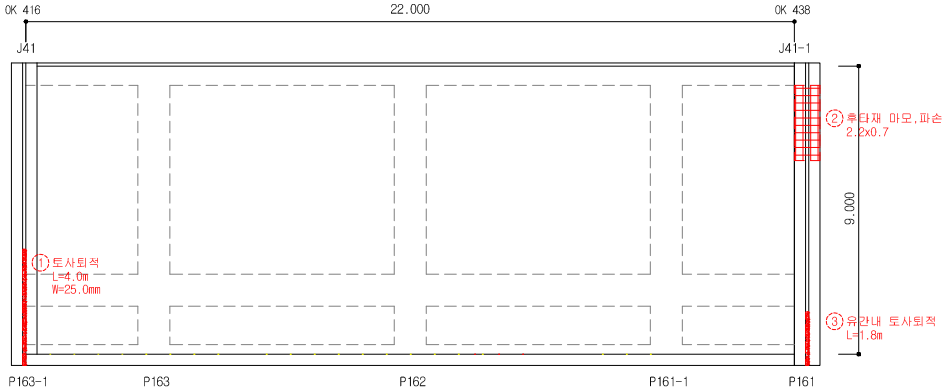


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	토사퇴적		4.00		4.00	m	1.00					2
2	2016	후타재 마모, 파손	2.20	0.70		1.54	㎡	1.00					2
3	2016	유간내 토사퇴적		1.80		1.80	m	1.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



범례						
	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	014

용 역 명 : 도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

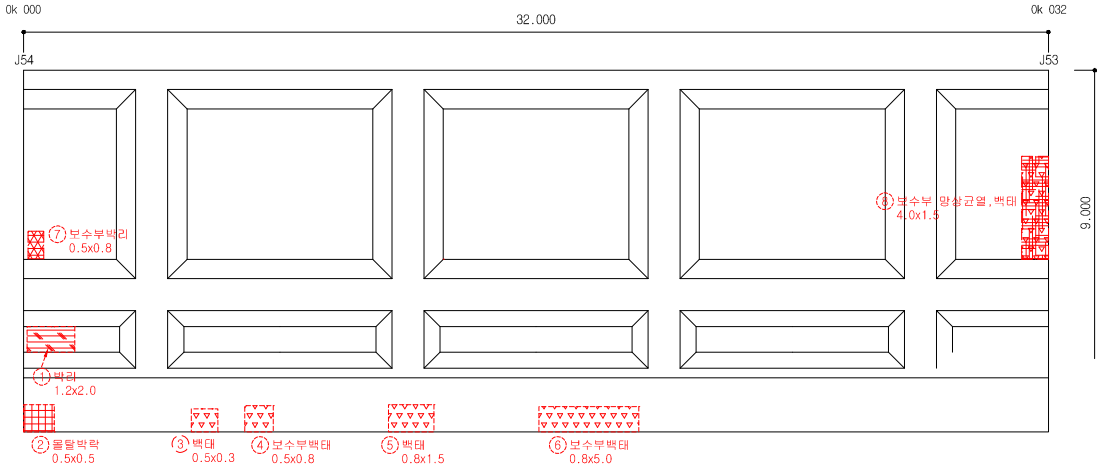


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	박리	1.20	2.00		2.40	㎡	1.00					2
2	2011	몰탈박락	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
3	2014	백태	0.50	0.30		0.15	㎡	1.00					2
4	2011	보수부 백태	0.50	0.80		0.40	㎡	1.00					2
5	2011	백태	0.80	1.50		1.20	㎡	1.00					2
6	2011	보수부 백태	0.80	5.00		4.00	㎡	1.00					2
7	2016	보수부박리	0.50	0.80		0.40	㎡	1.00					2
8	2016	보수부 망상균열, 백태	4.00	1.50		6.00	㎡	1.00					2
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	015

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

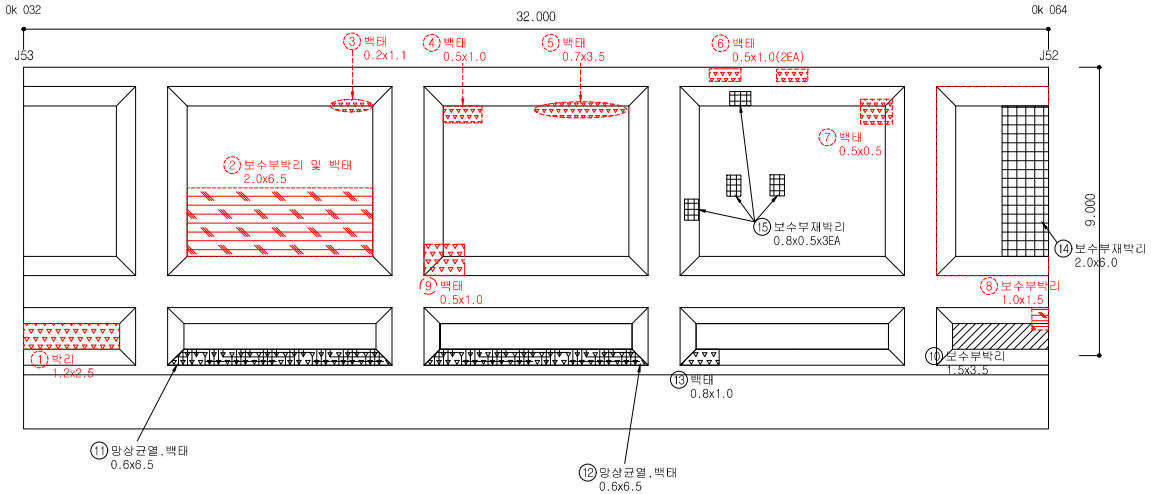


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	박리	1.20	2.50		3.00	㎡	1.00					2
2	2011	보수부 박리 및 백태	2.00	6.50		13.00	㎡	1.00					2
3	2011	백태	0.20	1.10		0.22	㎡	1.00					2
4	2011	백태	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					2
5	2011	백태	0.70	3.50		2.45	㎡	1.00					2
6	2013	백태	0.50	1.00		1.00	㎡	2.00					2
7	2011	백태	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
8	2011	보수부 박리	1.00	1.50		1.50	㎡	1.00					2
9	2018	백태	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					2
10	2019	보수부 박리	1.50	3.50		5.25	㎡	1.00				신규	2
11	2019	망상균열,백태	0.60	6.50		3.90	㎡	1.00				신규	2
12	2019	망상균열,백태	0.60	6.50		3.90	㎡	1.00				신규	2
13	2019	백태	0.80	1.00		0.80	㎡	1.00				신규	2
14	2019	보수부재박리	2.00	6.00		12.00	㎡	1.00				신규	2
15	2019	보수부재박리	0.80	0.50		1.60	㎡	4.00				신규	2
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	016

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

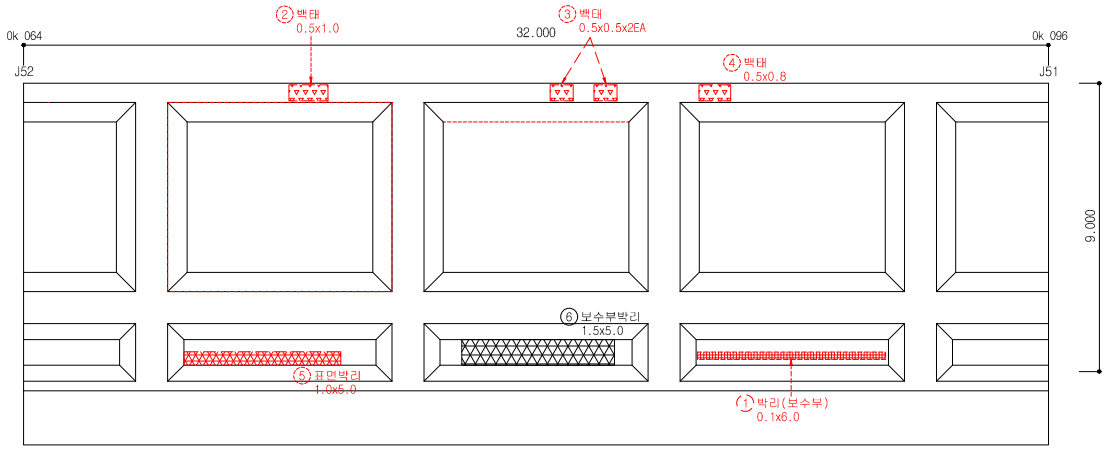


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	박리	0.10	6.00		0.60	㎡	1.00					2
2	2016	백태	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					2
3	2016	백태	0.50	0.50		0.50	㎡	2.00					2
4	2016	백태	0.50	0.80		0.40	㎡	1.00					2
5	2016	표면박리	1.00	5.00		5.00	㎡	1.00					2
6	2019	보수부박리	1.50	5.00		7.50	㎡	1.00				신규	2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	017

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

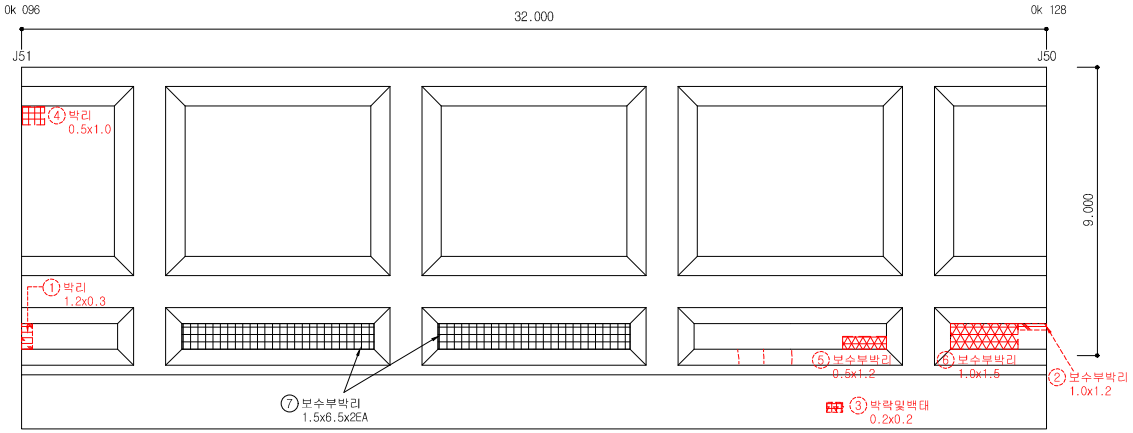


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	박리	1.20	0.30		0.36	㎡	1.00					2
2	2011	보수부 박리	1.00	1.20		1.20	㎡	1.00					2
3	2011	박락및백태	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					2
4	2016	박리	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					2
5	2016	보수부박리	0.50	1.20		0.60	㎡	1.00					2
6	2016	보수부박리	1.00	1.50		1.50	㎡	1.00					2
7	2019	보수부박리	1.50	6.50		19.50	㎡	2.00				신규	2
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	018

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

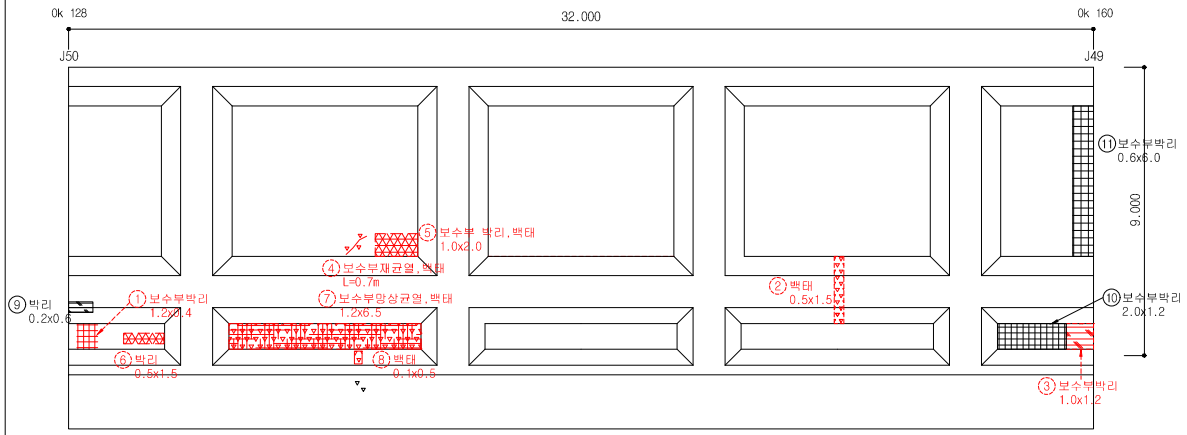


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭(㎜)	길이(m)	깊이(㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	보수부 박리	1.20	0.40		0.48	㎡	1.00					2
2	2011	백태	0.50	1.50		0.75	㎡	1.00					2
3	2011	보수부 박리	1.00	1.20		1.20	㎡	1.00					2
4	2016	보수부 재균열, 백태		0.70		0.70	m	1.00					2
5	2016	보수부 박리, 백태	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					2
6	2016	박리	0.50	1.50		0.75	㎡	1.00					2
7	2016	보수부 망상균열, 백태	1.20	6.50		7.80	㎡	1.00					2
8	2016	백태	0.10	0.50		0.05	㎡	1.00					2
9	2019	박리	0.20	0.60		0.12	㎡	1.00				신규	2
10	2019	보수부박리	2.00	1.20		2.40	㎡	1.00				신규	2
11	2019	보수부박리	0.60	6.00		3.60	㎡	1.00				신규	2
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	019

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

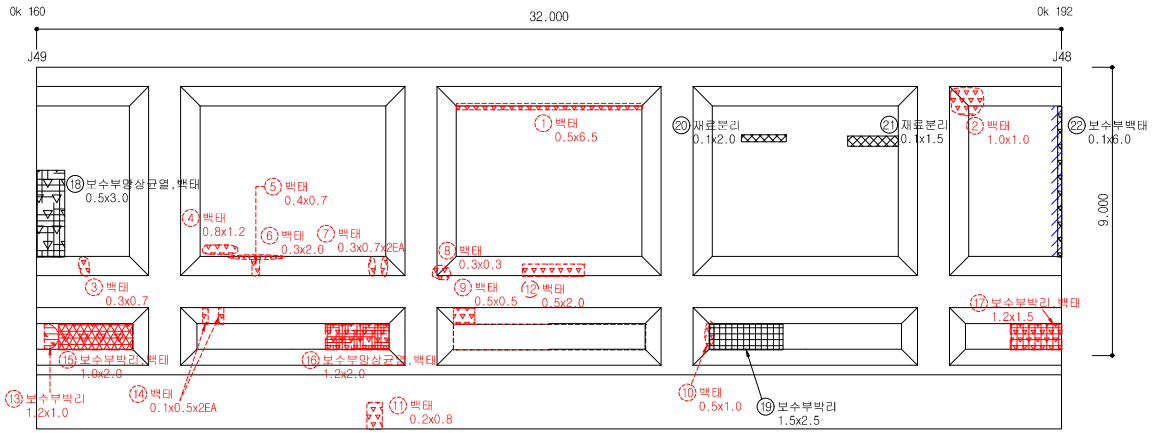


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.50	6.50		0.75	㎡	1.00					2
2	2011	백태	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00					2
3	2011	백태	0.30	0.70		0.21	㎡	1.00					2
4	2011	백태	0.80	1.20		0.96	㎡	1.00					2
5	2011	백태	0.40	0.70		0.28	㎡	1.00					2
6	2011	백태	0.30	2.00		0.60	㎡	1.00					2
7	2011	백태	0.30	0.70		0.42	㎡	2.00					2
8	2011	백태	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					2
9	2011	백태	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
10	2011	백태	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					2
11	2016	백태	0.20	0.80		0.16	㎡	1.00					2
12	2014	백태	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
13	2011	보수부 박리	1.20	1.00		1.20	㎡	1.00					2
14	2011	백태	0.10	0.50		0.10	㎡	2.00					2
15	2016	보수부박리, 백태	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					2
16	2016	보수부 망상균열, 백태	1.20	2.00		2.40	㎡	1.00					2
17	2016	보수부박리, 백태	1.20	1.50		1.80	㎡	1.00					2
18	2019	보수부 망상균열, 백태	0.50	3.00		1.50	㎡	1.00				신규	2
19	2019	보수부박리	1.50	2.50		3.75	㎡	1.00				신규	2
20	2019	재료분리	0.10	2.00		0.20	㎡	1.00				신규	2
21	2019	재료분리	0.10	1.50		0.15	㎡	1.00				신규	2
22	2019	보수부백태	0.10	6.00		0.60	㎡	1.00				신규	2
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	020

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

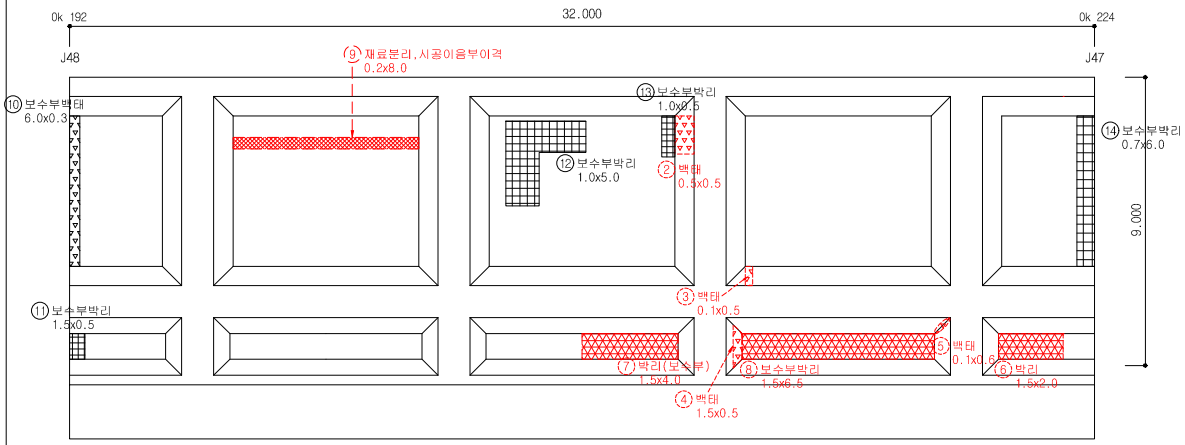


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
2	2011	백태	0.10	0.50		0.05	㎡	1.00					2
3	2011	백태	1.50	0.50		0.75	㎡	1.00					2
4	2011	백태	0.10	0.60		0.06	㎡	1.00					2
5	2011	박리	1.50	2.00		3.00	㎡	1.00					2
6	2016	박리(보수부)	1.50	4.00		6.00	㎡	1.00					2
7	2016	보수부박리	1.50	6.50		9.75	㎡	1.00					2
8	2018	재료분리,시공이음부이격	0.20	8.00		1.60	㎡	1.00					2
9	2019	보수부백태	6.00	0.30		1.80	㎡	1.00				신규	2
10	2019	보수부박리	1.50	0.50		0.75	㎡	1.00				신규	2
11	2019	보수부박리	1.00	5.00		5.00	㎡	1.00				신규	2
12	2019	보수부박리	1.00	0.50		0.50	㎡	1.00				신규	2
13	2019	보수부박리	0.70	6.00		4.20	㎡	1.00				신규	2
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	021

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

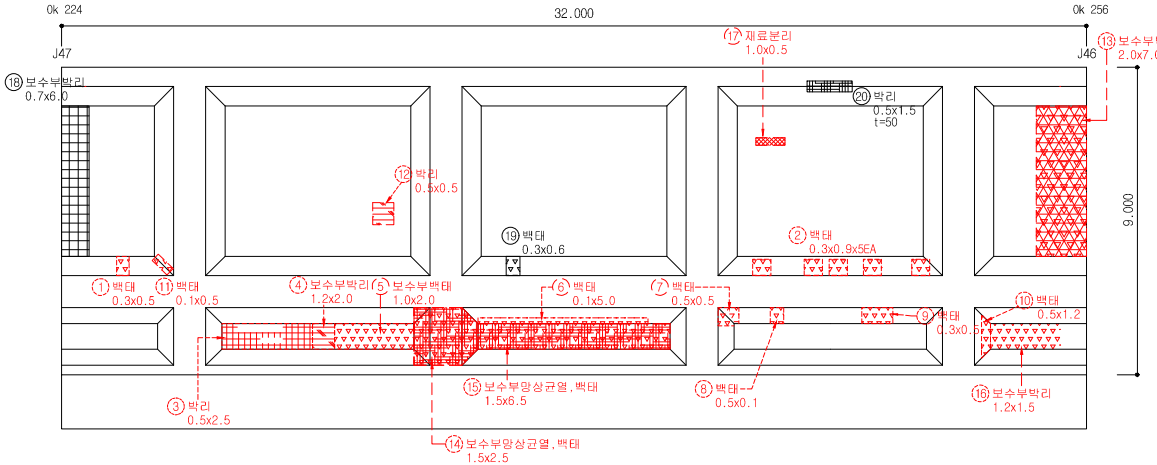


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					2
2	2011	백태	0.30	0.90		1.35	㎡	5.00					2
3	2011	박리	0.50	2.50		1.25	㎡	1.00					2
4	2011	보수부 박리	1.20	2.00		2.40	㎡	1.00					2
5	2014	보수부 백태	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					2
6	2014	백태	0.10	5.00		0.50	㎡	1.00					2
7	2014	백태	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
8	2011	백태	0.50	0.10		0.05	㎡	1.00					2
9	2011	백태	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					2
10	2011	백태	0.50	1.20		0.60	㎡	1.00					2
11	2016	백태	0.10	0.50		0.05	㎡	1.00					2
12	2016	박리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
13	2016	보수부 박리, 백태	2.00	7.00		14.00	㎡	1.00					2
14	2016	보수부 망상균열, 백태	1.50	2.50		3.75	㎡	1.00					2
15	2016	보수부 망상균열, 백태	1.50	6.50		9.75	㎡	1.00					2
16	2016	보수부 박리	1.20	1.50		1.80	㎡	1.00					2
17	2018	재료분리	1.00	0.50		0.50	㎡	1.00					2
18	2019	보수부박리	0.70	6.00		4.20	㎡	1.00				신규	2
19	2019	백태	0.30	0.60		0.18	㎡	1.00				신규	2
20	2019	박리	0.50	1.50		0.75	㎡	1.00				신규	2
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	022

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

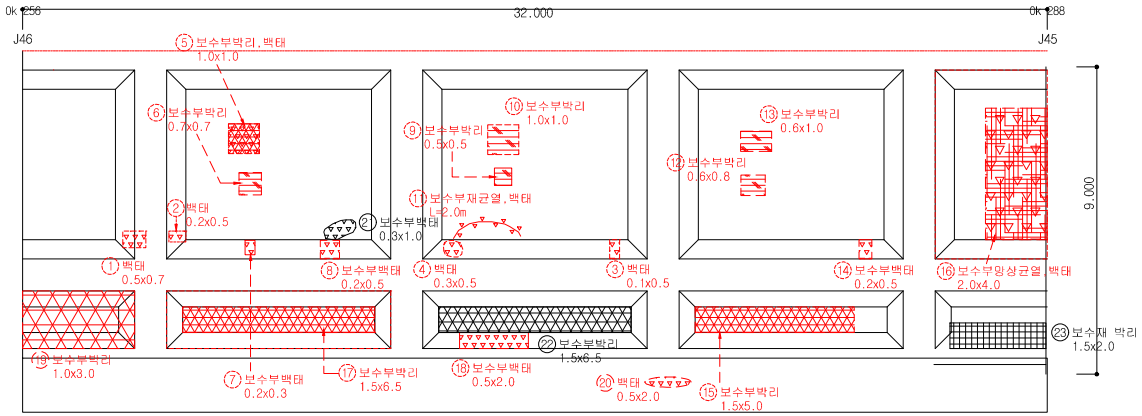


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.50	0.70		0.35	㎡	1.00					2
2	2011	백태	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
3	2011	백태	0.10	0.50		0.05	㎡	1.00					2
4	2011	백태	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					2
5	2016	보수부 박리, 백태	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00					2
6	2016	보수부 박리	0.70	0.70		0.49	㎡	1.00					2
7	2016	보수부 백태	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00					2
8	2016	보수부 백태	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
9	2016	보수부 박리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
10	2016	보수부 박리	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00					2
11	2016	보수부 재균열, 백태		2.00		2.00	m	1.00					2
12	2016	보수부 박리	0.60	0.80		0.48	㎡	1.00					2
13	2016	보수부 박리	0.60	1.00		0.60	㎡	1.00					2
14	2016	보수부 백태	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
15	2016	보수부박리	1.50	5.00		7.50	㎡	1.00					2
16	2016	보수부 망상균열, 백태	2.00	4.00		8.00	㎡	1.00					2
17	2016	보수부박리	1.50	6.50		9.75	㎡	1.00					2
18	2016	보수부 백태	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
19	2018	보수부박리	1.00	3.00		3.00	㎡	1.00					2
20	2018	백태	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
21	2019	보수부백태	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00				신규	2
22	2019	보수부박리	1.50	6.50		9.75	㎡	1.00				신규	2
23	2019	보수재 박리	1.50	2.00		3.00	㎡	1.00				신규	2
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	023

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

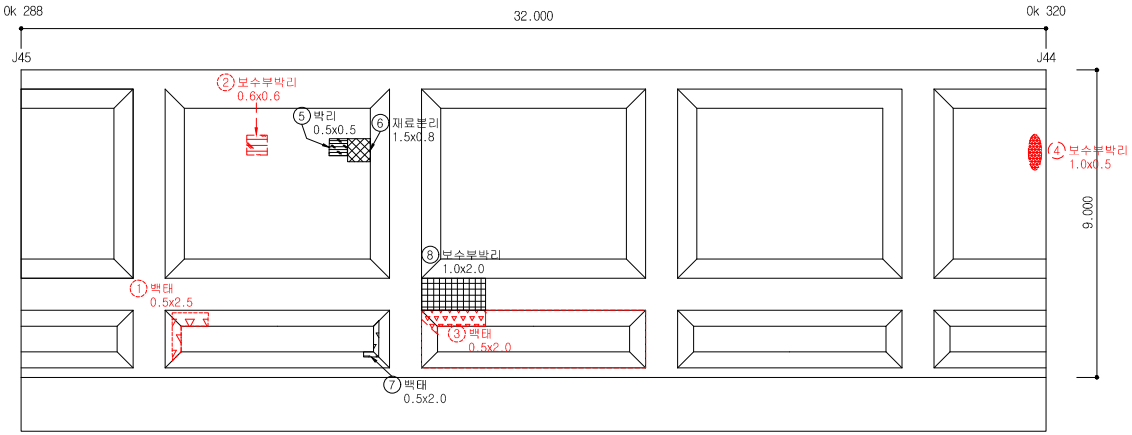


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.50	2.50		1.25	㎡	1.00					2
2	2016	보수부 박리	0.60	0.60		0.36	㎡	1.00					2
3	2016	백태	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
4	2018	보수부박리	1.00	0.50		0.50	㎡	1.00					2
5	2019	박리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00				신규	2
6	2019	재료분리	1.50	0.80		1.20	㎡	1.00				신규	2
7	2019	백태	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00				신규	2
8	2019	보수부박리	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00				신규	2
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범 례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	024

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면


손 상 물 량 표

연번	적용년도	결함종류	결함규모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭(㎜)	길이(m)	깊이(㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.10	0.50		0.10	㎡	2.00					2
2	2016	박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					2
3	2019	교대박리	0.30	1.50		0.45	㎡	1.00				신규	2
4	2019	백태	1.50	0.70		1.05	㎡	1.00				신규	2
5	2019	재료분리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00				신규	2
6	2019	박리	0.40	0.40		0.16	㎡	1.00				신규	2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

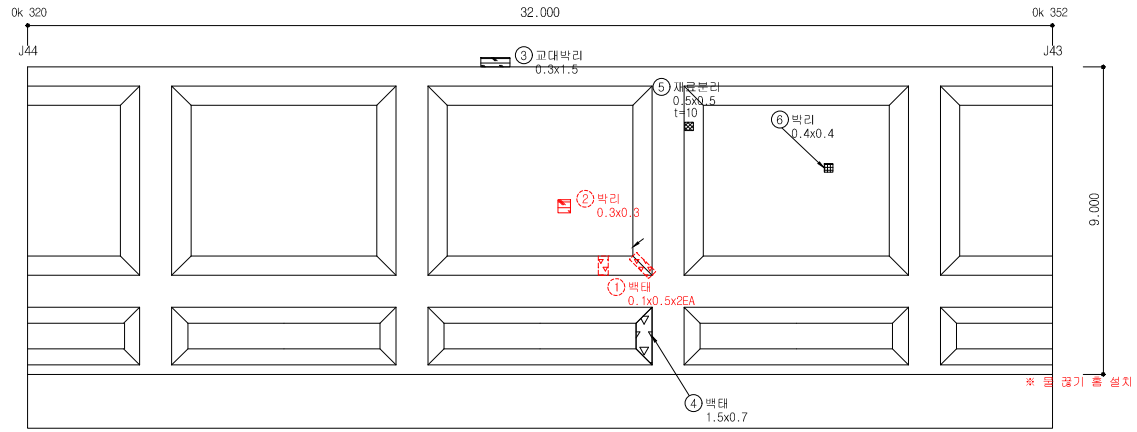


점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용역명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	025

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

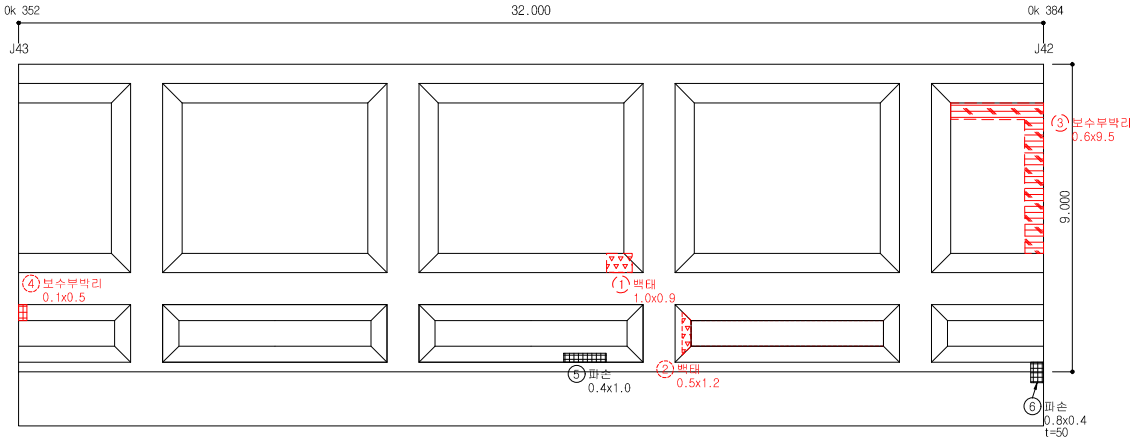


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	백태	1.00	9.00		9.00	㎡	1.00					2
2	2011	백태	0.50	1.20		0.60	㎡	1.00					2
3	2014	보수부박리	0.60	9.50		5.70	㎡	1.00					2
4	2016	보수부 박리	0.10	0.50		0.05	㎡	1.00					2
5	2019	파손	0.40	1.00		0.40	㎡	1.00				신규	2
6	2019	파손	0.80	0.40		0.32	㎡	1.00				신규	2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	026

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

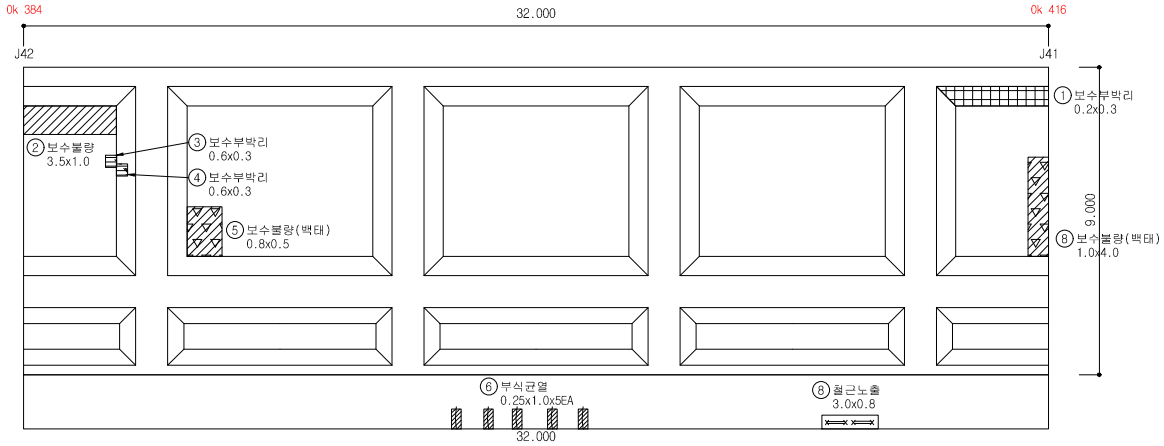


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	보수부박리	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00				신규	2
2	2019	보수불량	3.50	1.00		3.50	㎡	1.00				신규	2
3	2019	보수부박리	0.60	0.30		0.18	㎡	1.00				신규	2
4	2019	보수부박리	0.60	0.30		0.18	㎡	1.00				신규	2
5	2019	보수불량	0.80	0.50		0.40	㎡	1.00				신규	2
6	2019	부식균열	0.25	1.00		1.25	㎡	5.00				신규	2
7	2019	철근노출	3.00	0.80		2.40	㎡	1.00				신규	2
8	2019	보수불량	1.00	4.00		4.00	㎡	1.00				신규	2
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	027

ID : 도림천4복개 1련 / 바닥판하면

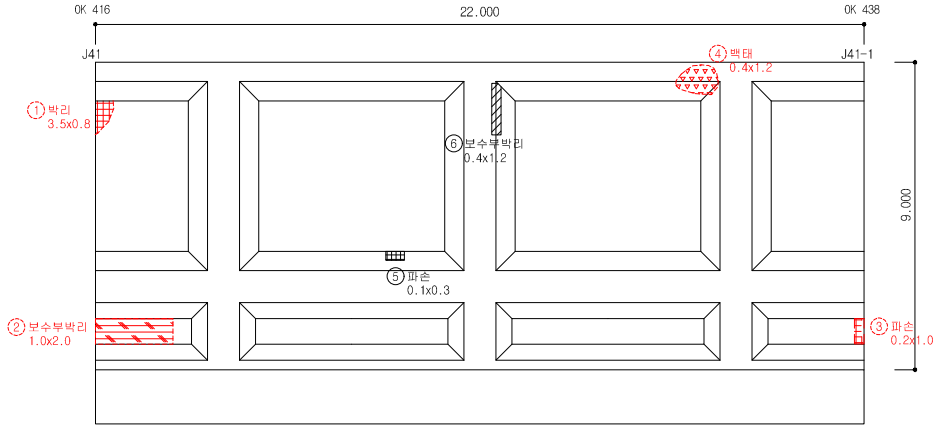


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	박리	3.50	0.80		2.80	㎡	1.00					2
2	2011	보수부 박리	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					2
3	2013	파손	0.20	1.00		0.20	㎡	1.00					2
4	2011	백태	0.40	1.20		0.48	㎡	1.00					2
5	2019	파손	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00				신규	2
6	2019	보수부박리	0.40	1.20		0.48	㎡	1.00				신규	2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	028

ID : 도림천4복개 1련 / 교대


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2	2016	박리	20.00	0.30		6.00	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

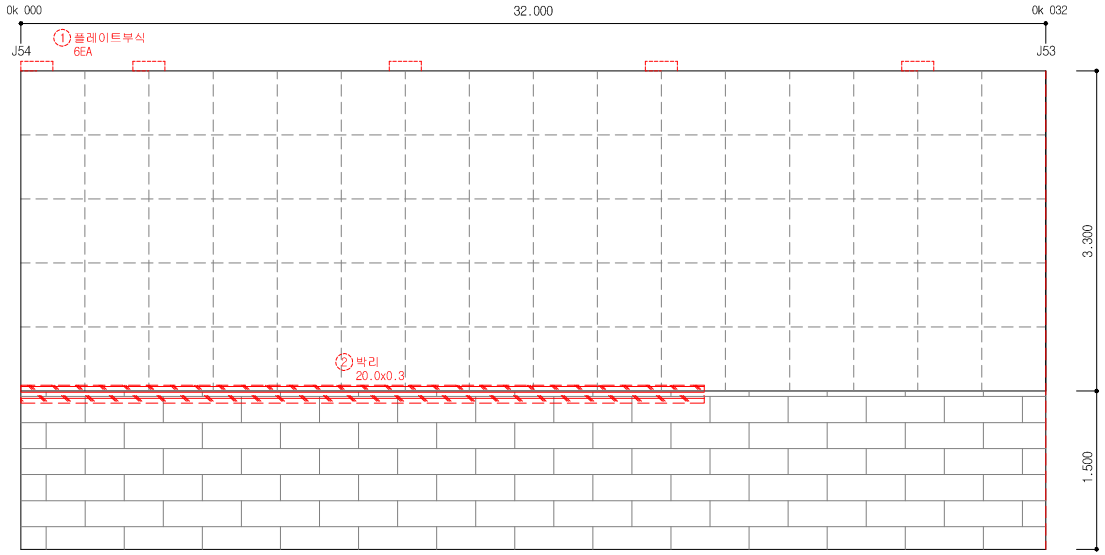


점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	029

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

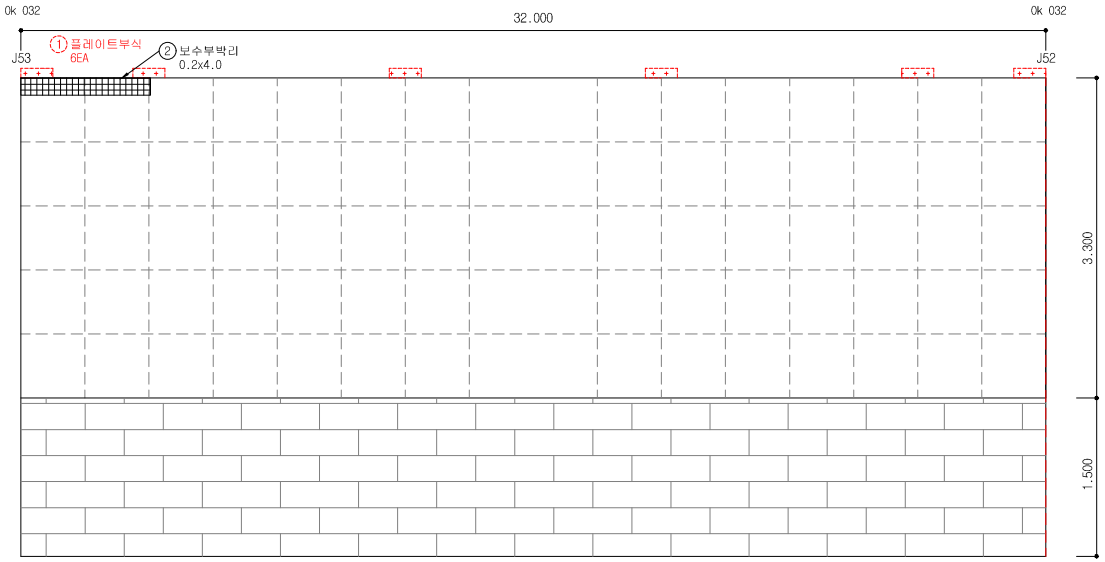


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2	2019	보수부박리	0.20	4.00		0.80	㎡	1.00				신규	2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	030

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

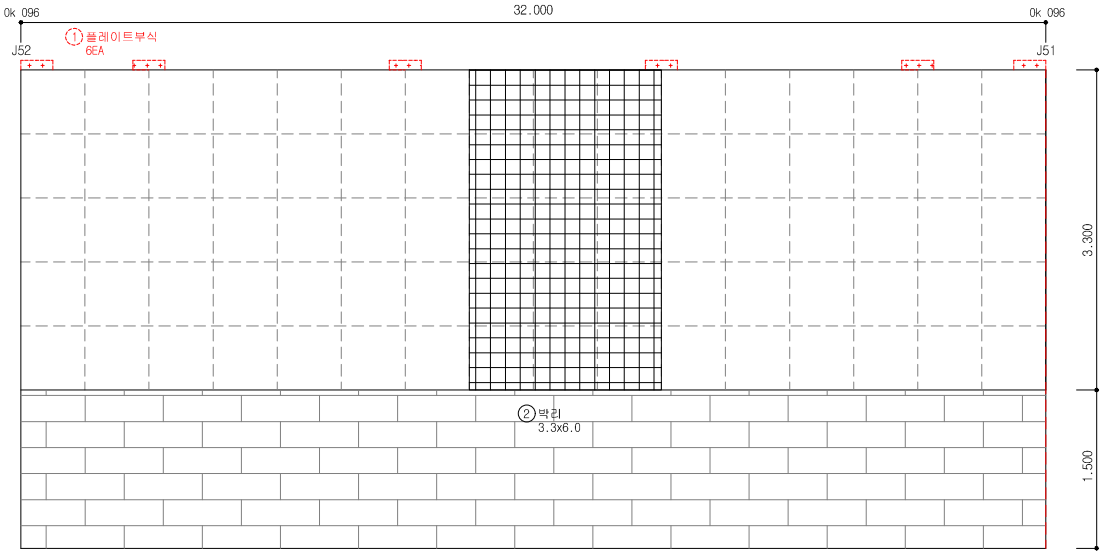


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2	2019	박리	3.30	6.00		19.80	㎡	1.00				신규	2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	031

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

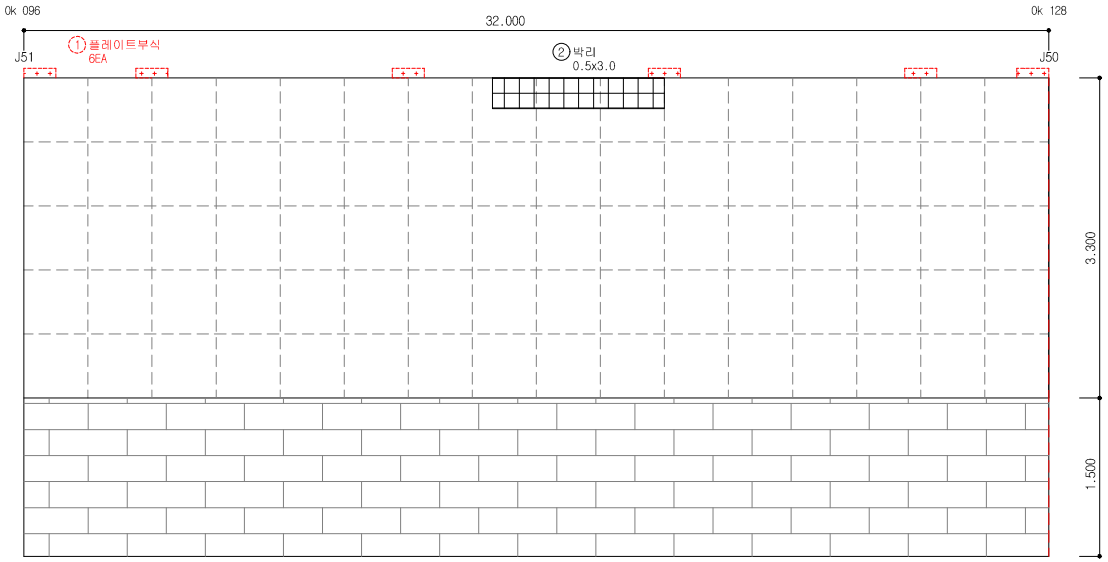


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2	2019	박리	0.50	3.00		1.50	㎡	1.00				신규	2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	032

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

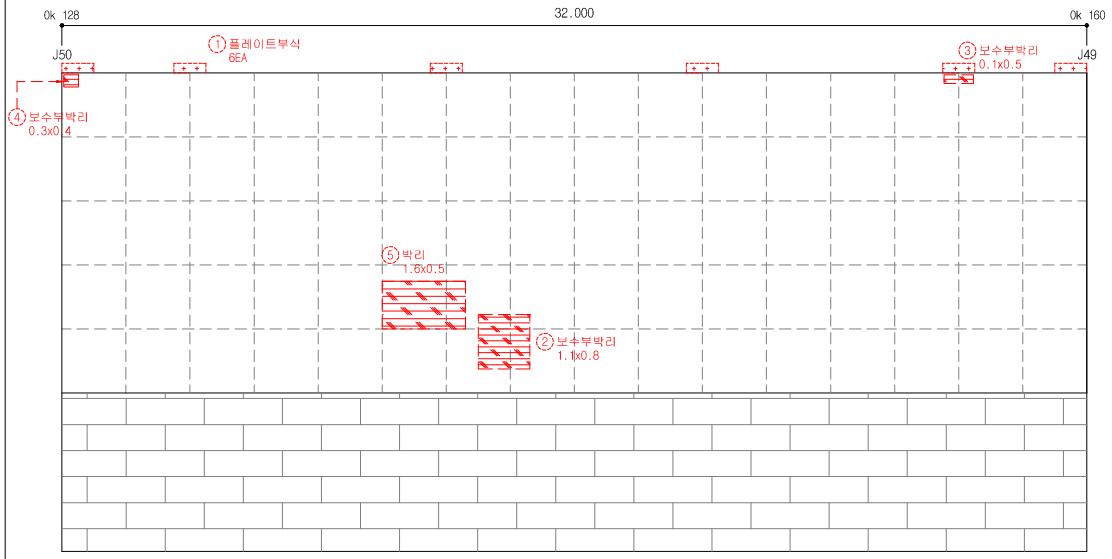


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2	2016	보수부 박리	1.10	0.80		0.88	㎡	1.00					2
3	2016	보수부 박리	0.10	0.50		0.05	㎡	1.00					2
4	2016	보수부 박리	0.30	0.40		0.12	㎡	1.00					2
5	2016	박리	1.60	0.50		0.80	㎡	1.00					2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	033

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

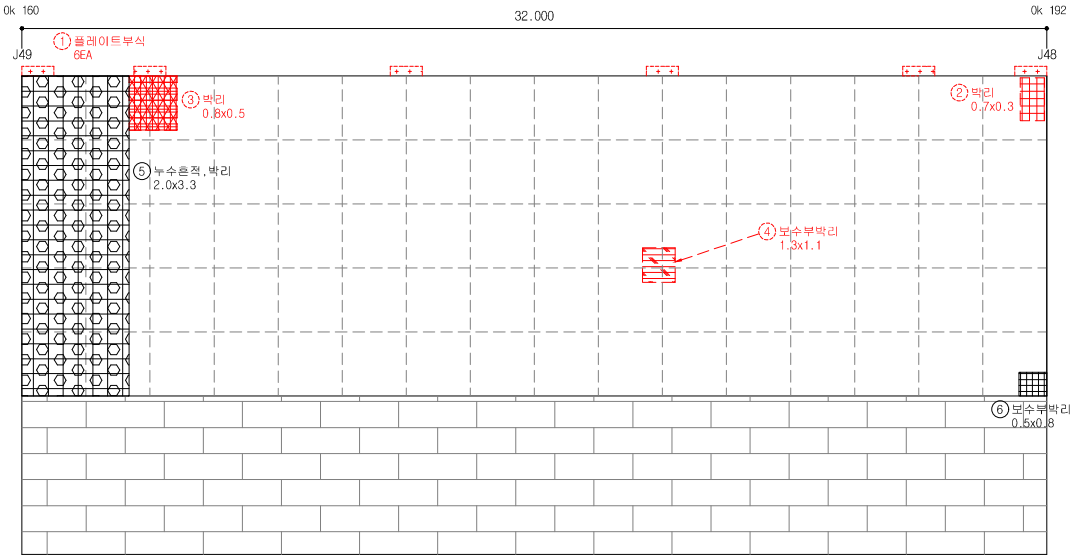


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2	2016	박리	0.70	0.30		0.21	㎡	1.00					2
3	2016	박리	0.80	0.50		0.40	㎡	1.00					2
4	2016	보수부 박리	1.30	1.10		1.43	㎡	1.00					2
5	2019	누수흔적,박리	2.00	3.30		6.60	㎡	1.00				신규	2
6	2019	보수부박리	0.50	0.80		0.40	㎡	1.00				신규	2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	034

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

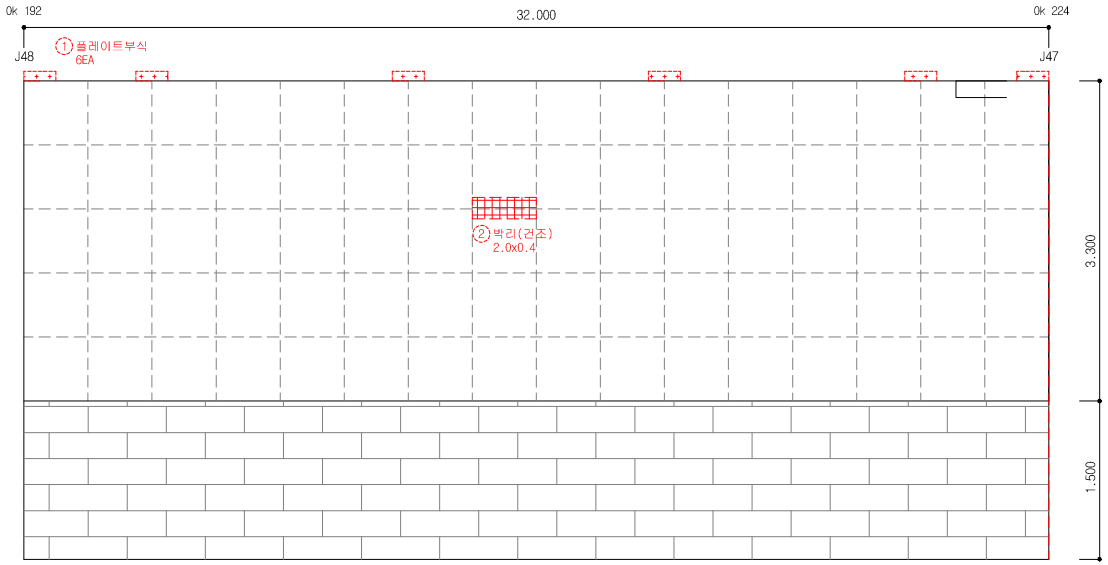


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2	2016	박리	2.00	0.40		0.80	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	035

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

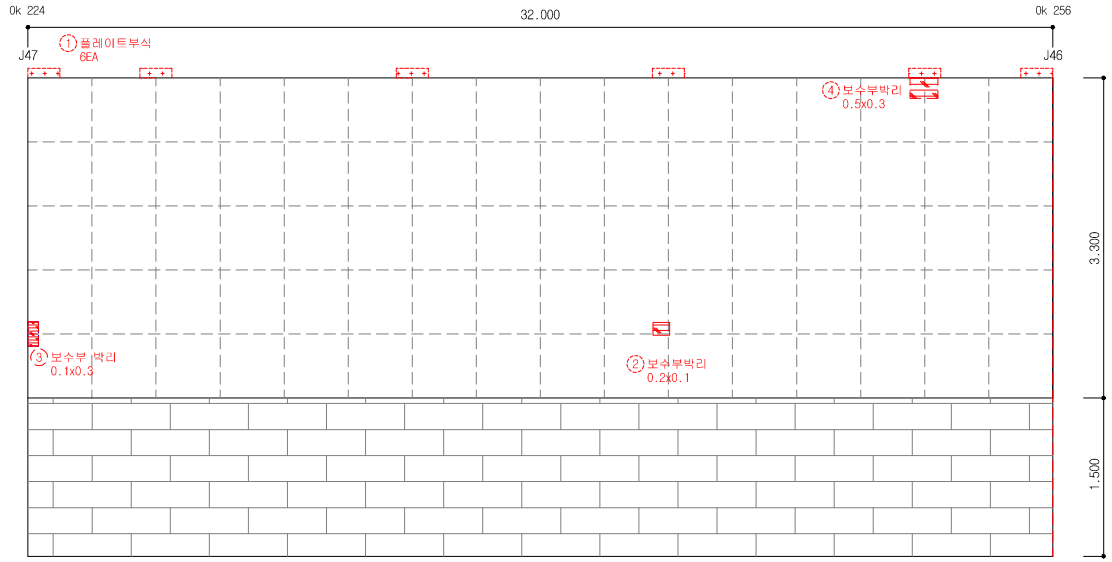


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2	2016	보수부 박리	0.20	0.10		0.02	㎡	1.00					2
3	2018	보수부 박리	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00					2
4	2016	보수부 박리	0.50	0.30		0.15	㎡	1.00					2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	036

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

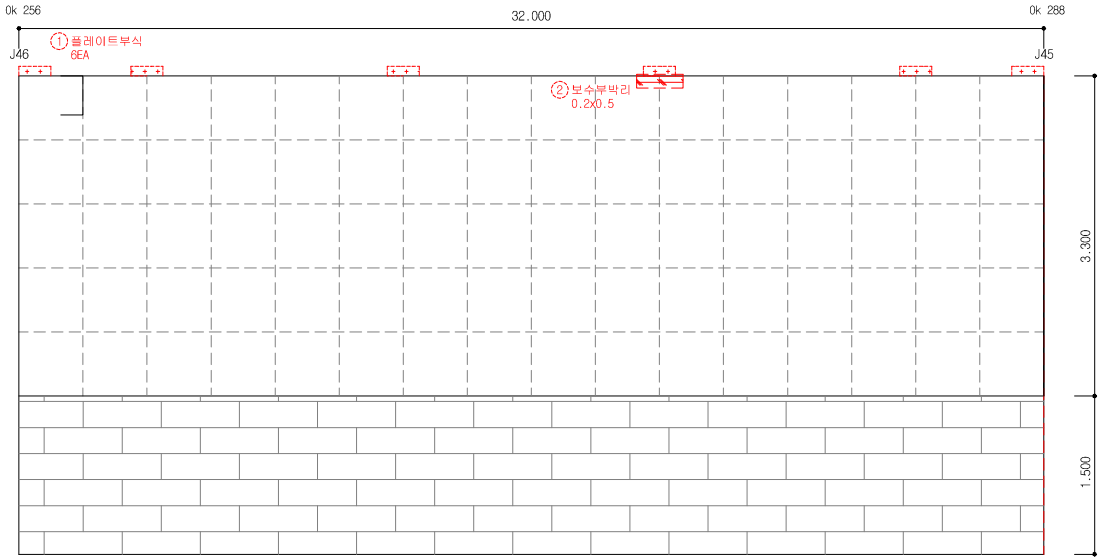


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2	2016	보수부 박리	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	037

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

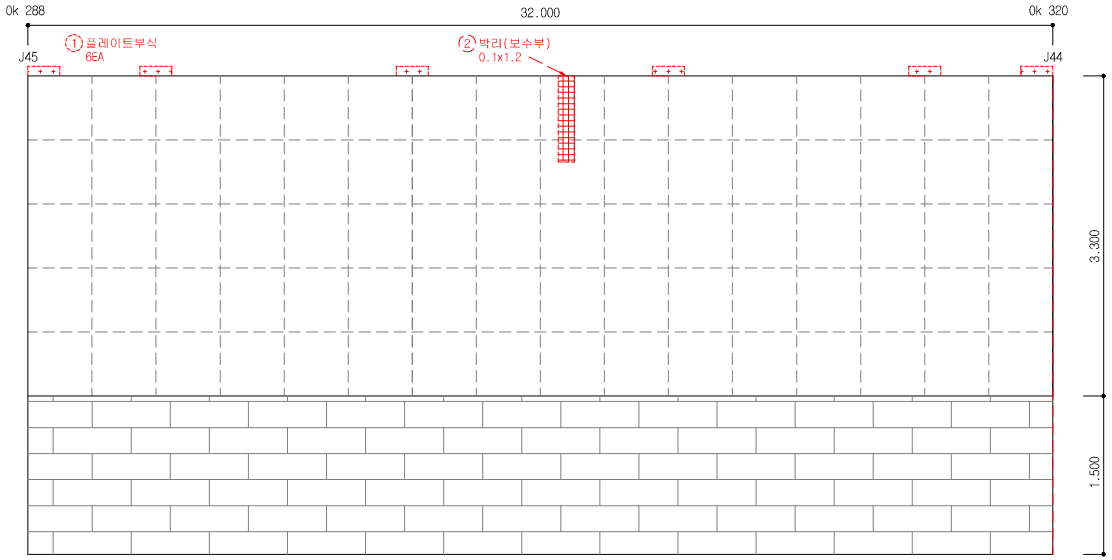


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2	2014	박리	0.10	1.20		1.20	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	038

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

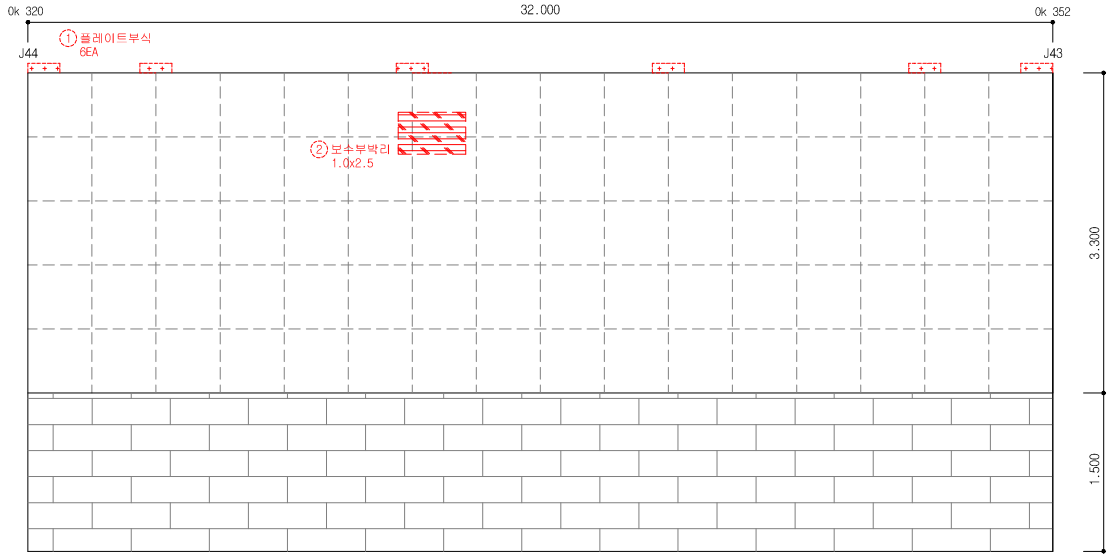


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2	2016	보수부박리	1.00	2.50		2.50	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	039

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

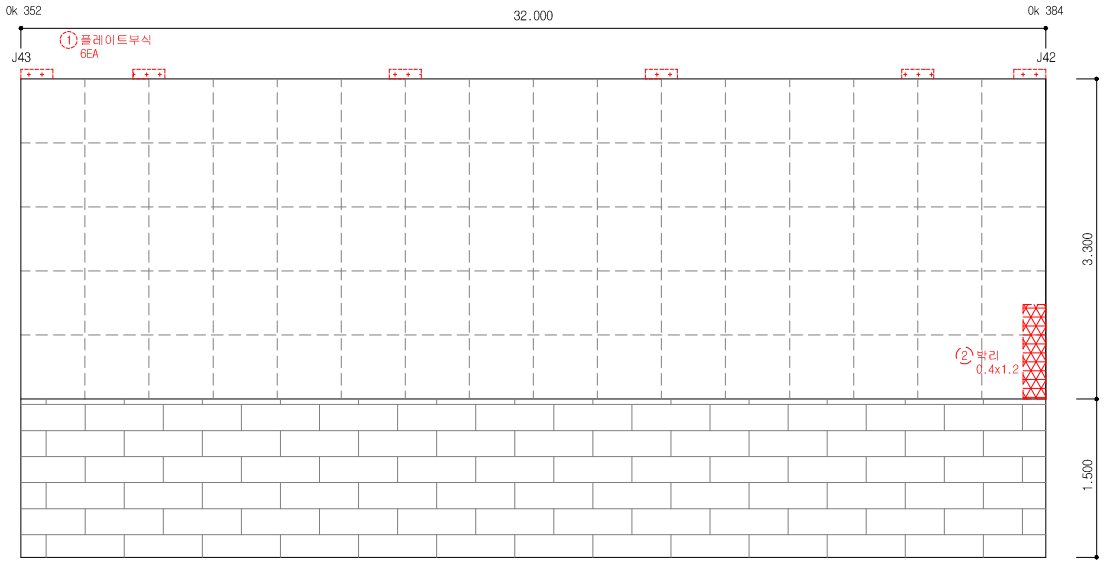


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2	2018	박리	0.40	1.20		0.48	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	040

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

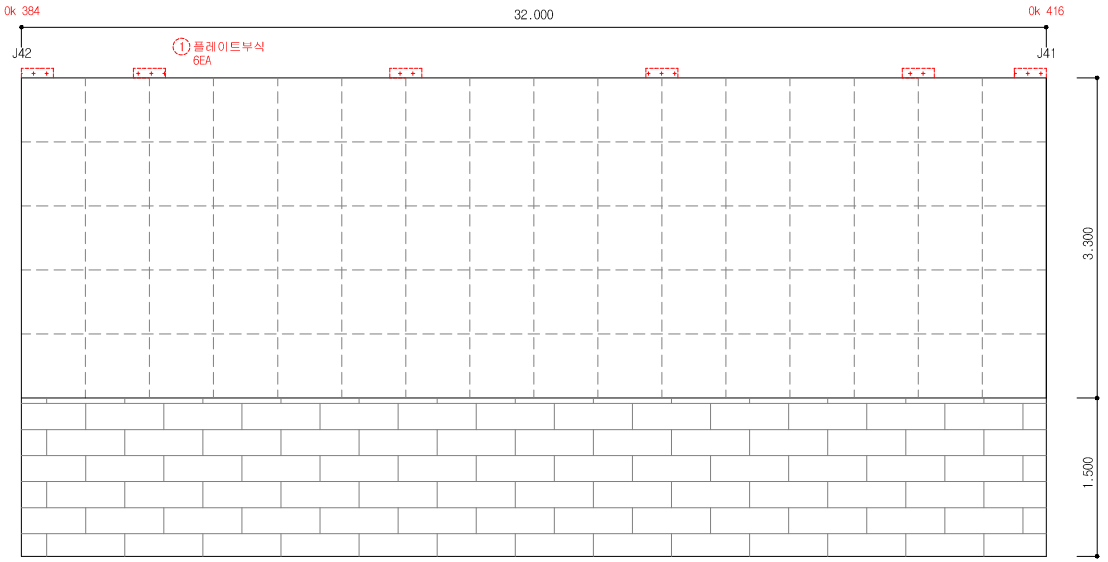


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (mm)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	6.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	041

ID : 도림천4복개 1련 / 교대

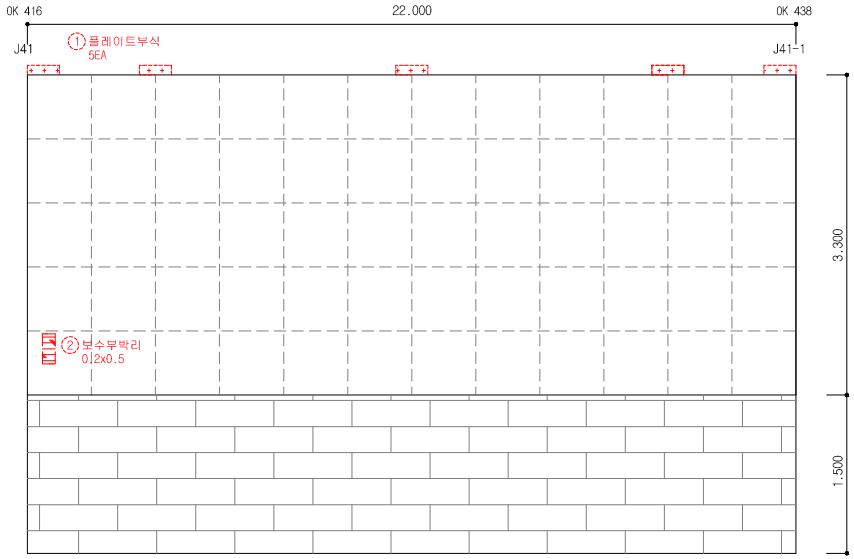


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식					EA	5.00					2
2	2016	보수부박리	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	042

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

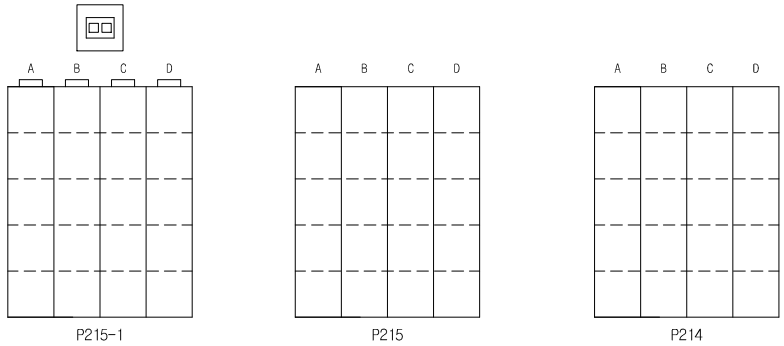


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	043

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

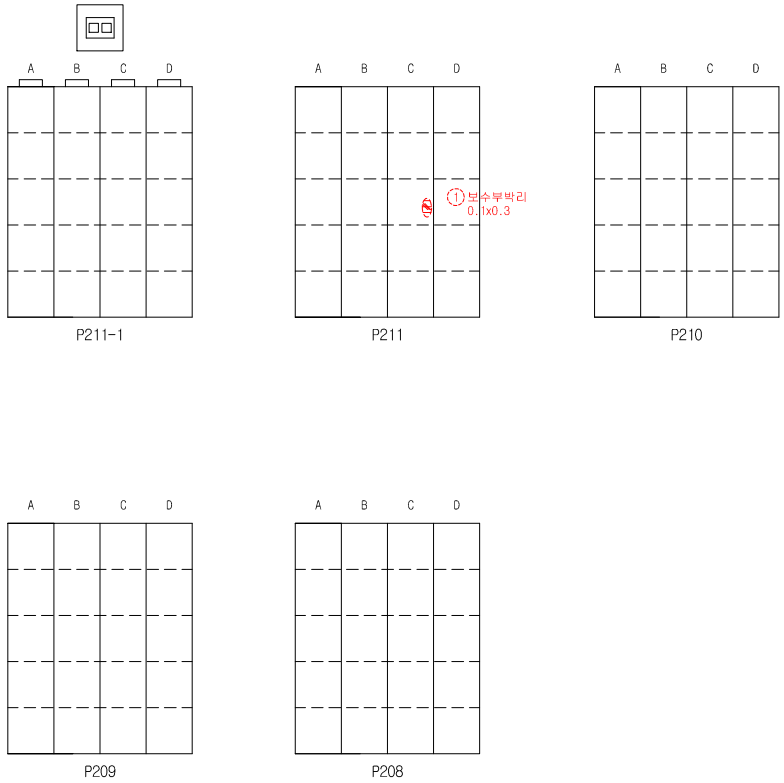


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	보수부 박리	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	044

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

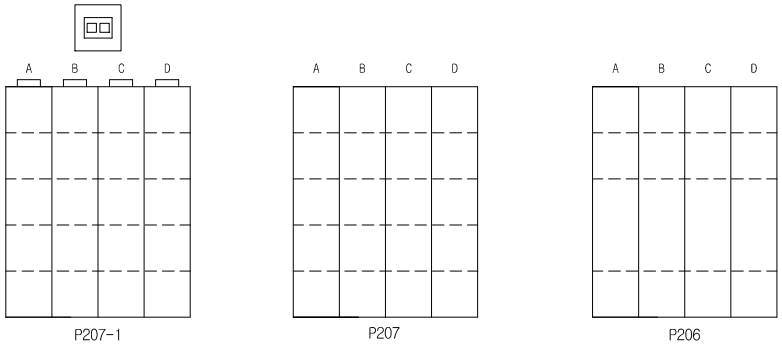


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	045

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

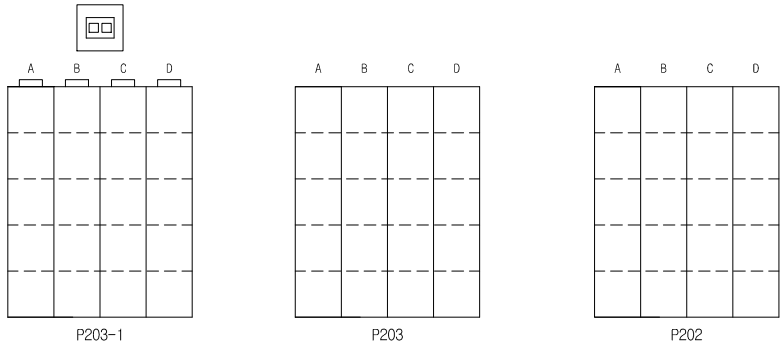


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	046

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

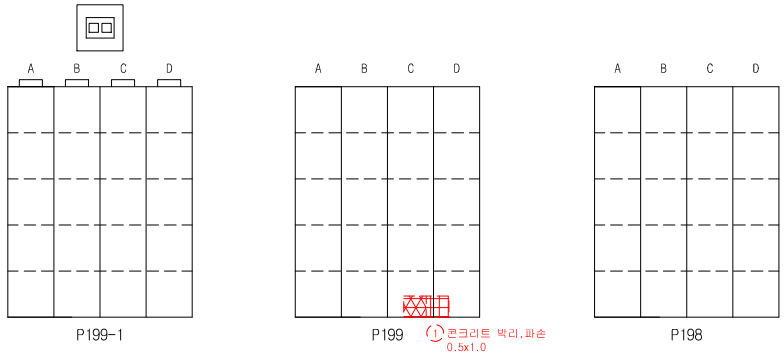


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	콘크리트 박리,파손	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	047

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

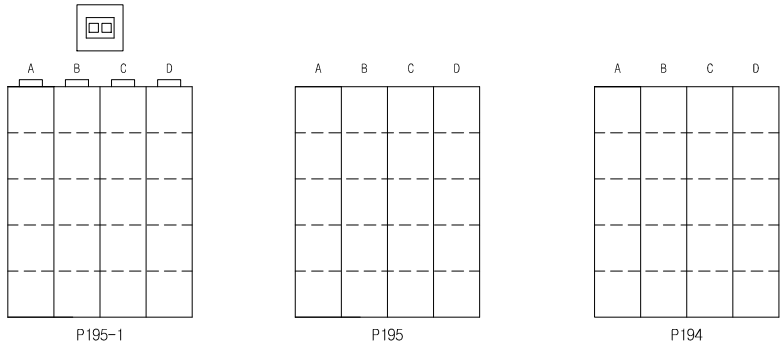


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	048

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

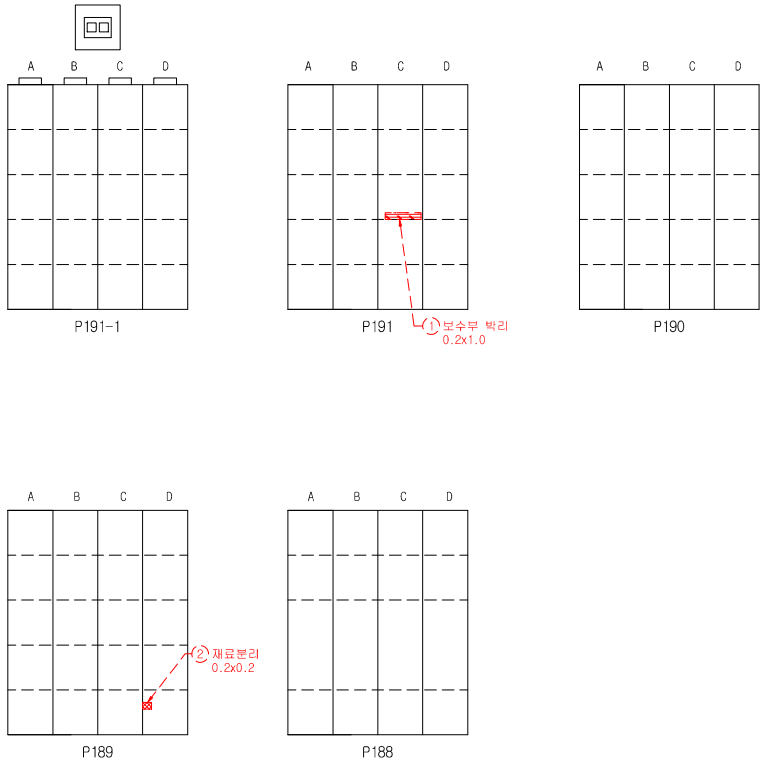


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	보수부 박리	0.20	1.00		0.20	㎡	1.00					2
2	2018	재료분리	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	049

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

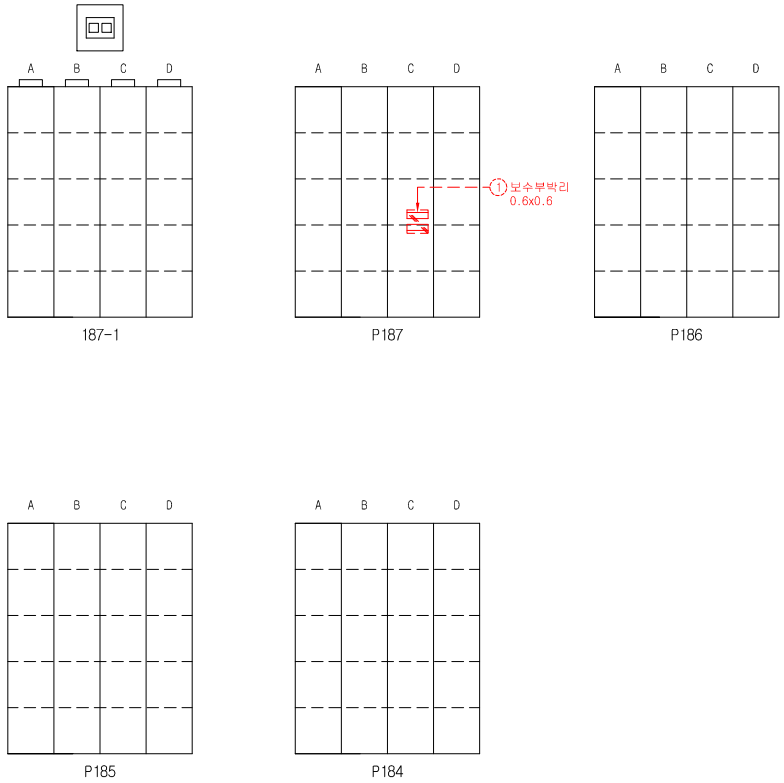


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	보수부 박리	0.60	0.60		0.36	㎡	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	050

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

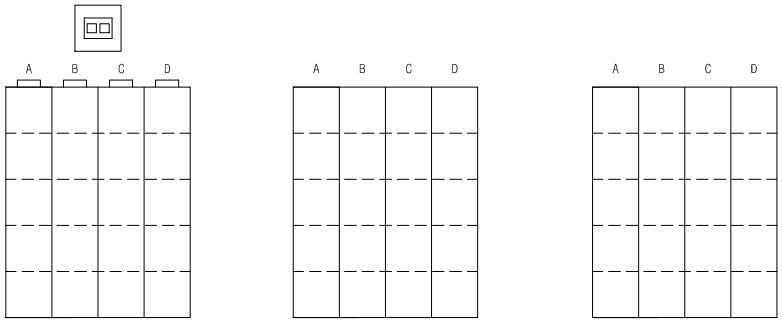


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	051

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

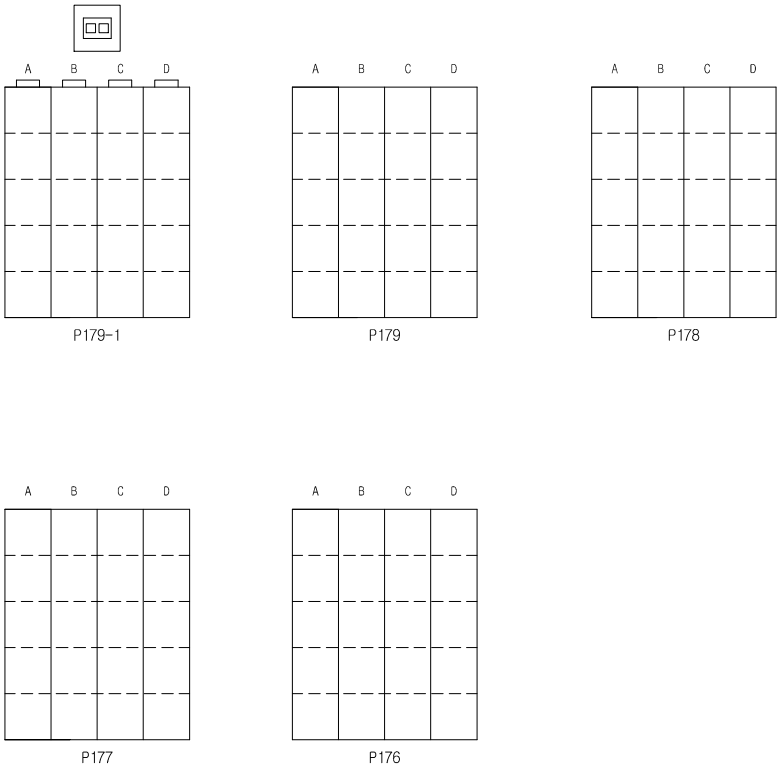


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	052

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

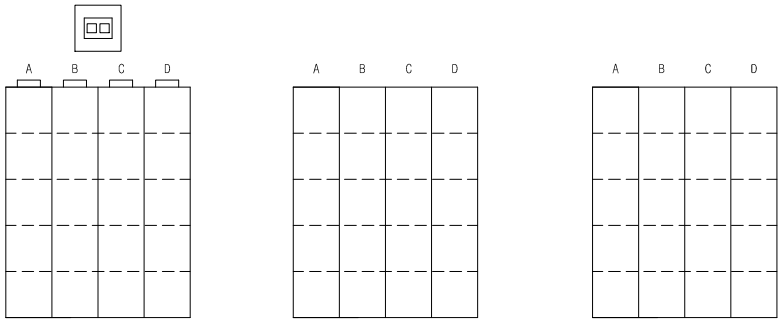


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	053

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

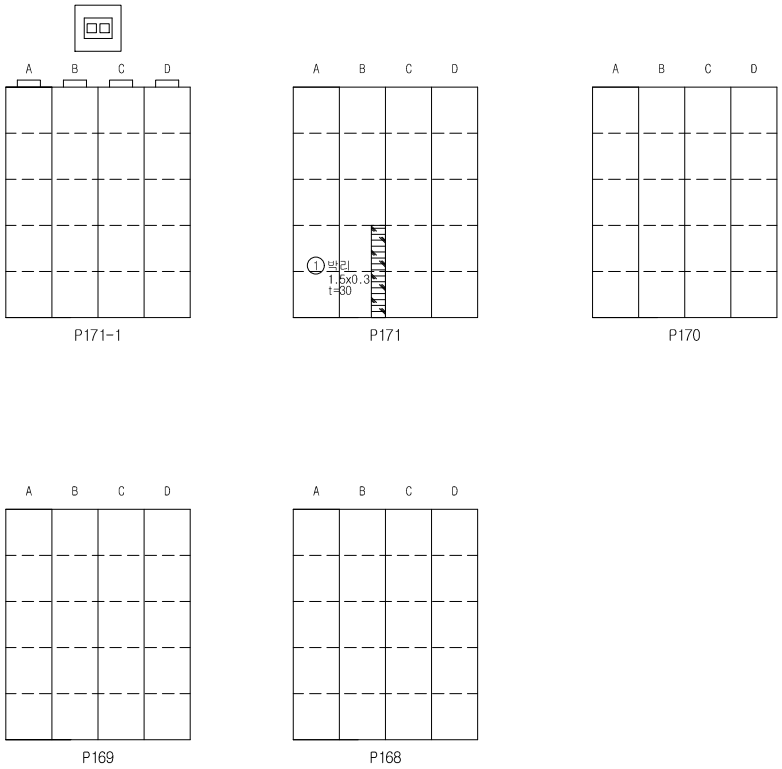


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	박리	1.50	0.30		0.45	㎡	1.00				신규	2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	054

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

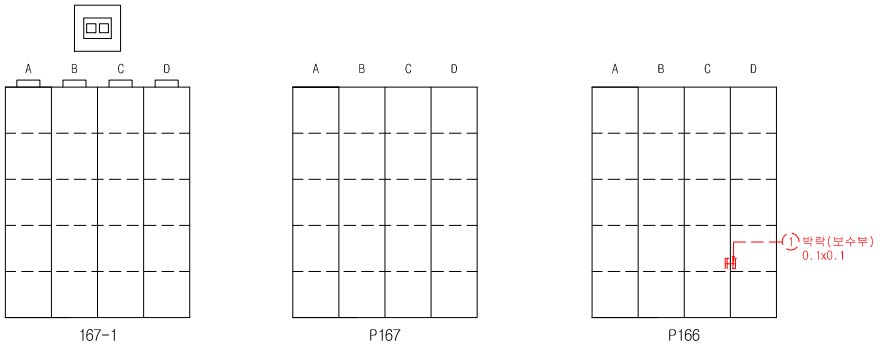


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (mm)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	박락	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기을
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승훈
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	055

ID : 도림천4복개 1련 / 교각

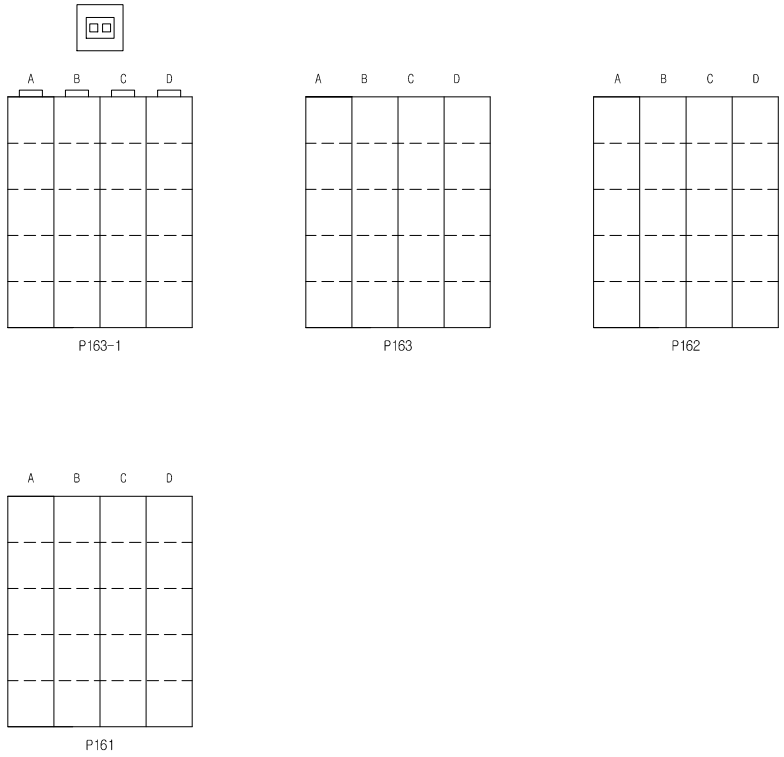


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	056

1.4 2련 (1순위,2순위)

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

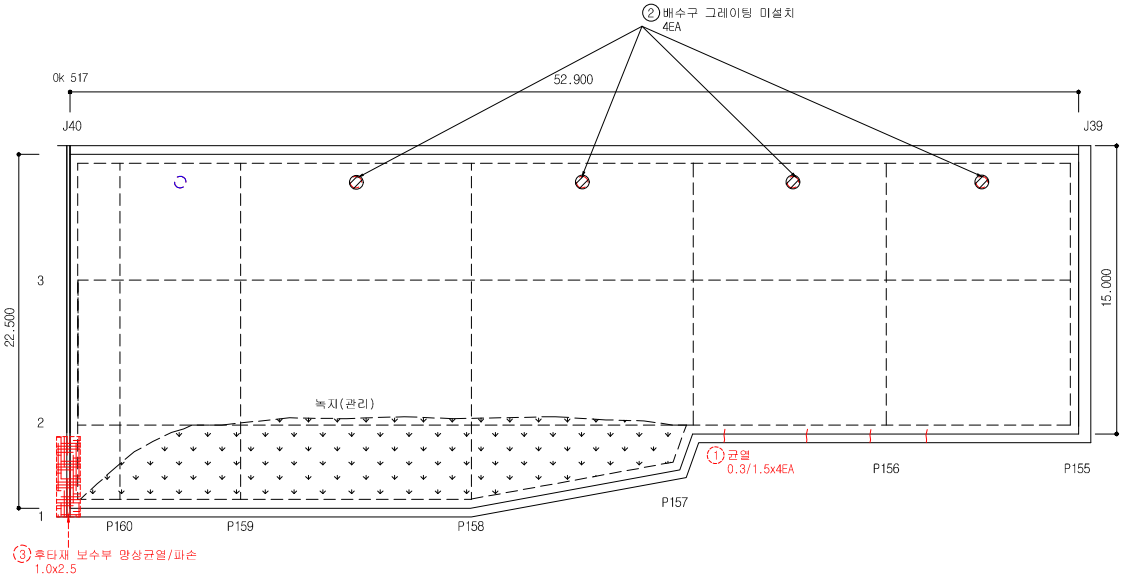


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		6.00	m	4.00					1
2	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
3	2013	후타재보수부망상균열/파손	1.00	2.50		2.50	㎡	1.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	001

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

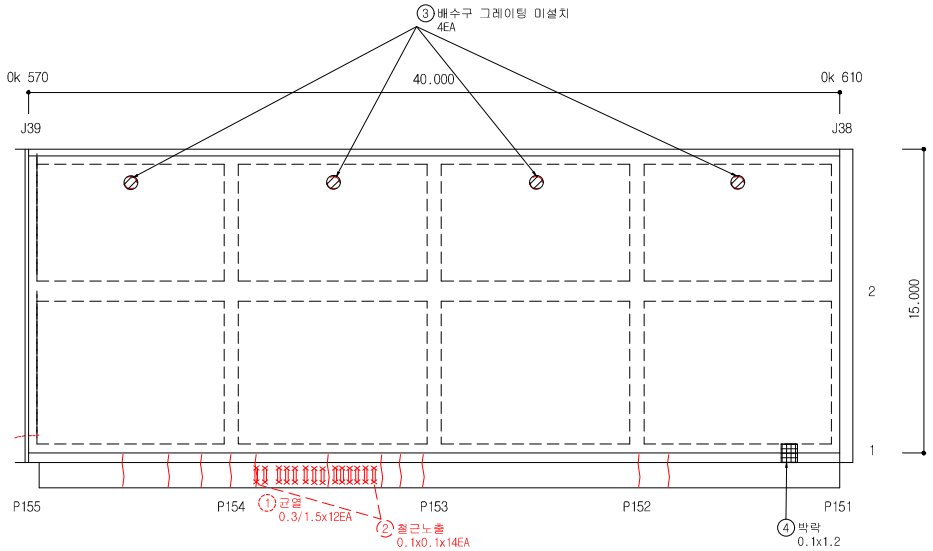


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		18.00	m	12.00					1
2	2018	철근노출	0.10	0.10		0.14	㎡	14.00					1
3	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
4	2019	박락	0.10	1.20		0.12	㎡	1.00				신규	2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	002

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

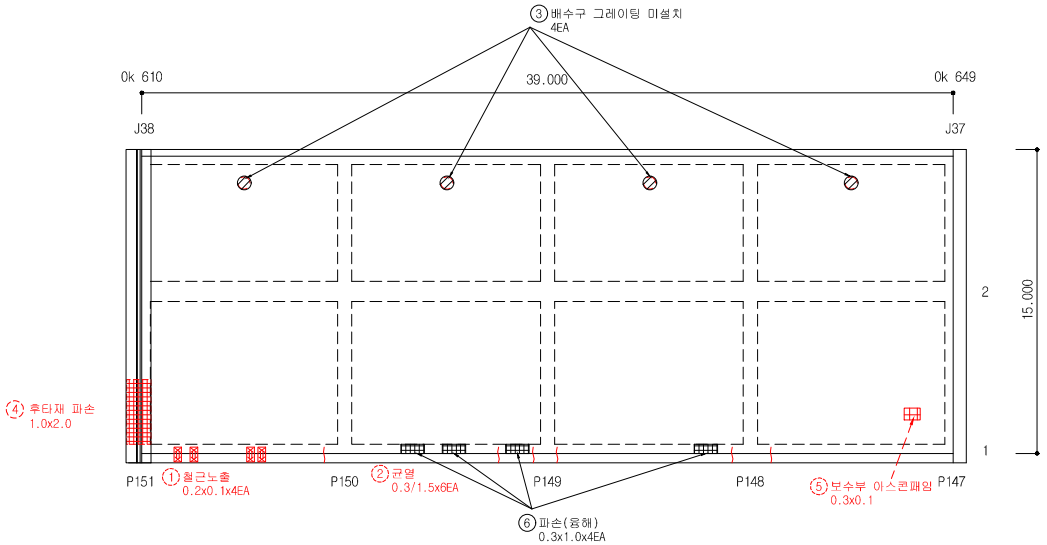


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	철근노출	0.20	0.10		0.08	㎡	4.00					1
2	2016	균열	0.30	1.50		9.00	m	6.00					1
3	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
4	2013	후타재파손	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					2
5	2016	보수부아스콘패임	0.30	0.10		0.03	㎡	1.00					2
6	2019	파손	0.30	1.00		1.20	㎡	4.00				신규	2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	얼룩	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	003

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

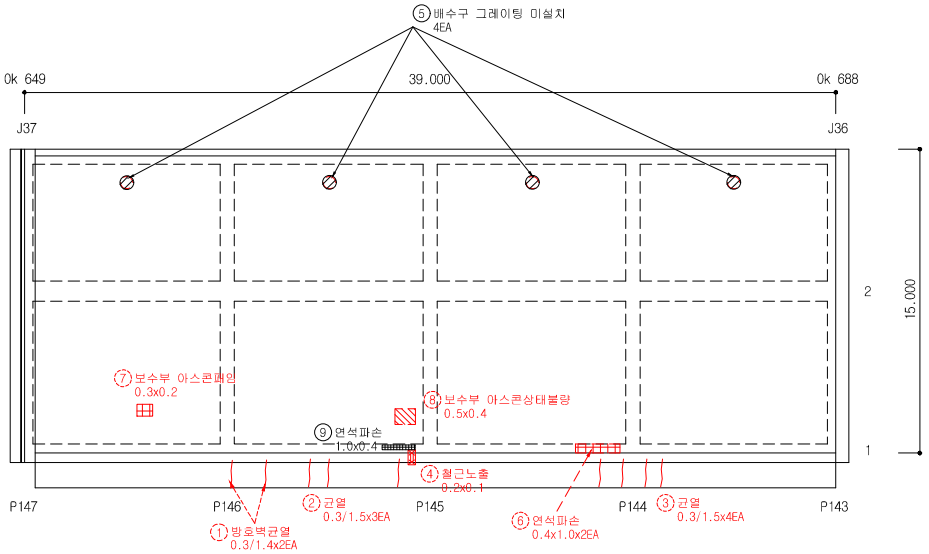


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	방호벽균열	0.30	1.40		2.80	m	2.00					1
2	2016	균열	0.30	1.50		4.50	m	3.00					1
3	2016	균열	0.30	1.50		6.00	m	4.00					1
4	2016	철근노출	0.20	0.10		0.02	㎡	1.00					1
5	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
6	2016	연석파손	0.40	1.00		0.80	㎡	2.00					2
7	2016	보수부아스콘패임	0.30	0.20		0.06	㎡	1.00					2
8	2016	보수부아스콘상태불량	0.50	0.40		0.20	㎡	1.00					2
9	2019	연석파손	1.00	0.40		0.40	㎡	1.00				신규	2
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	004

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

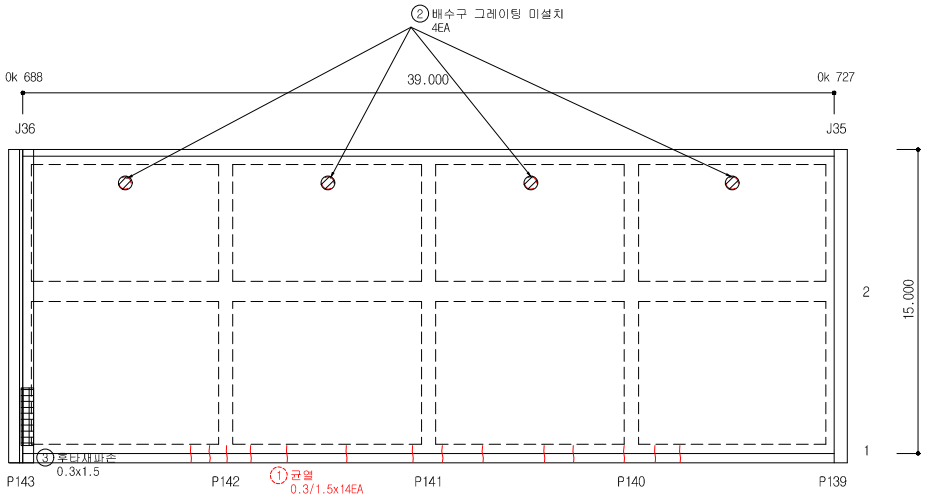


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		21.00	m	14.00					1
2	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
3	2019	후타재파손	0.30	1.50		0.45	㎡	1.00				신규	2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	005

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

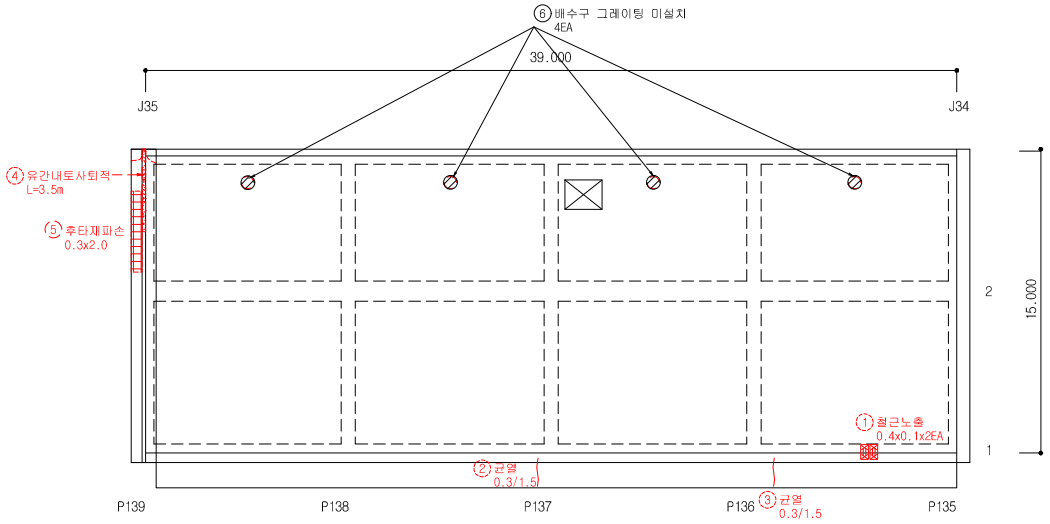


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	철근노출	0.40	0.10		0.08	㎡	2.00					1
2	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
3	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
4	2016	유간내토사퇴적	-	3.50		3.50	m	1.00					2
5	2014	후타재파손	0.30	2.00		0.60	㎡	1.00					2
6	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	006

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

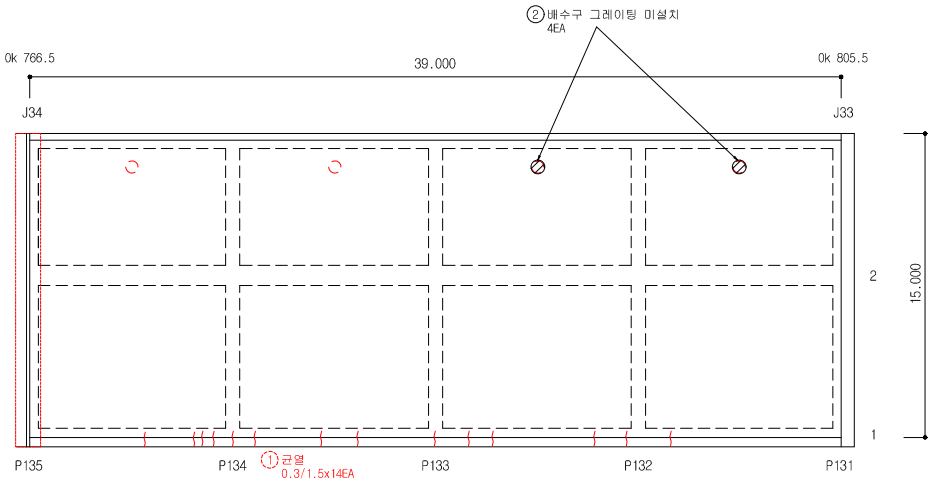


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		21.00	m	14.00					1
2	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		2.00	EA	2.00				신규	1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	007

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

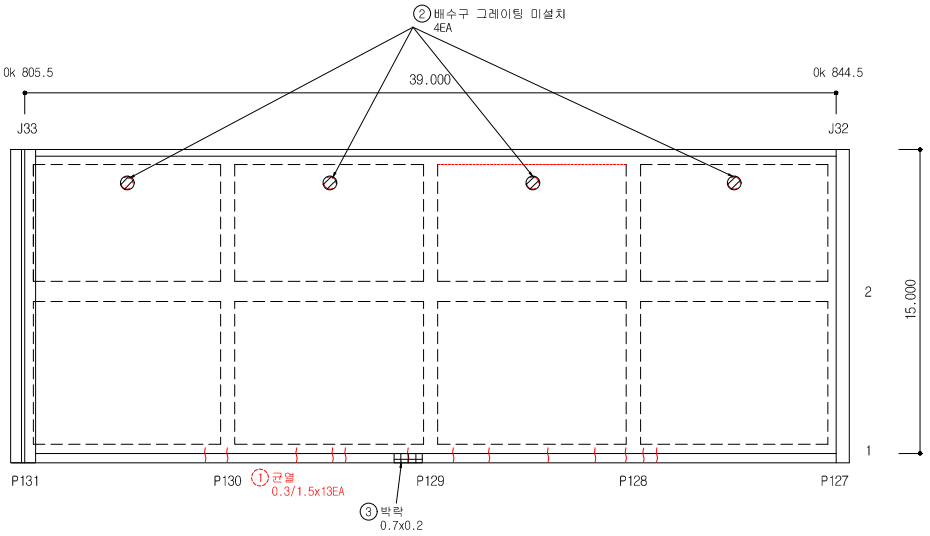


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		19.50	m	13.00					1
2	2019	배수구그레이딩 미설치	-	-		2.00	EA	2.00				신규	1
3	2019	박락	0.70	0.20		0.14	㎡	1.00				신규	2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	008

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

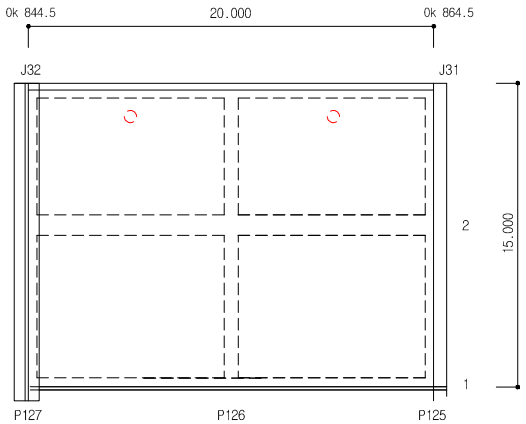


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	009

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

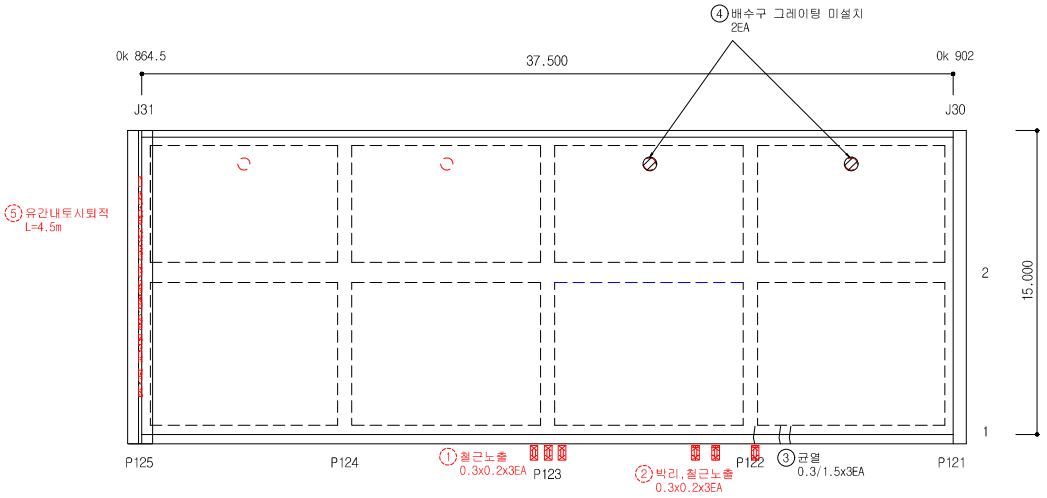


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	철근노출	0.30	0.20		0.18	㎡	3.00					1
2	2016	박리,철근노출	0.30	0.20		0.18	㎡	3.00					1
3	2019	균열	0.30	1.50		4.50	m	3.00				신규	1
4	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		2.00	EA	2.00				신규	1
5	2016	유간내도사틔적	-	4.50		4.50	m	1.00					2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	010

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

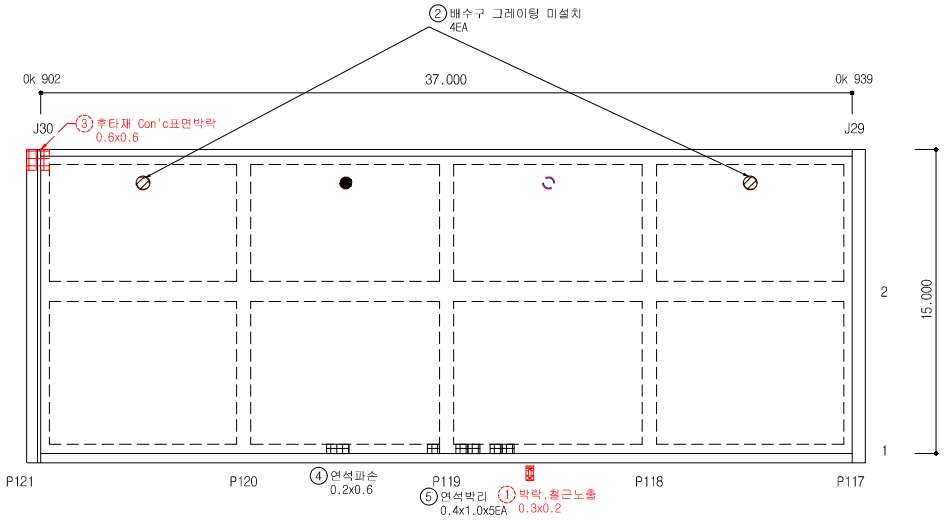


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	박락,철근노출	0.30	0.20		0.06	㎡	1.00					1
2	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		2.00	EA	2.00				신규	1
3	2016	후타재 Con`c표면박락	0.60	0.60		0.36	㎡	1.00					2
4	2019	연석파손	0.20	0.60		0.12	㎡	1.00				신규	2
5	2019	연석박리	0.40	1.00		2.00	㎡	5.00				신규	2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	011

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

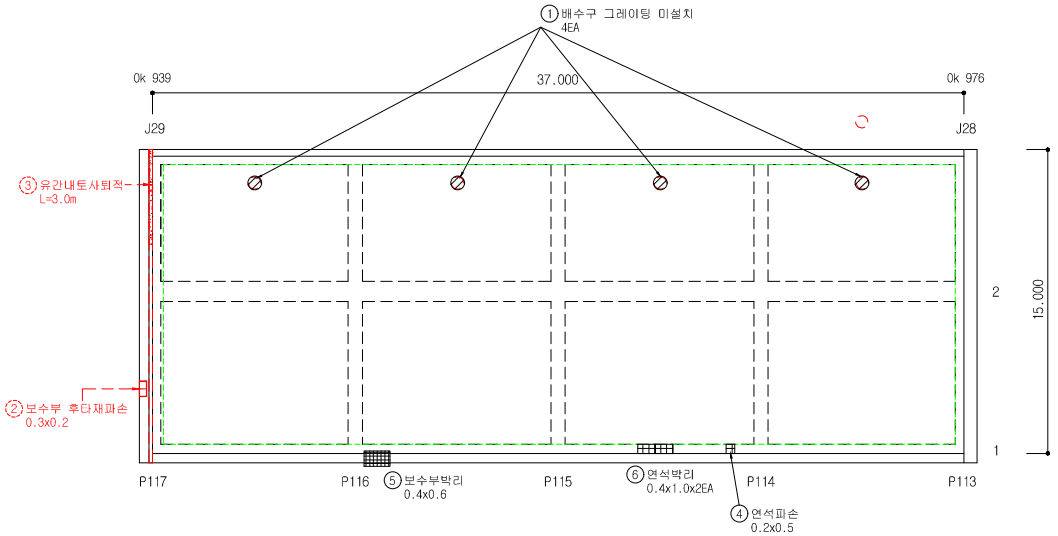


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
2	2016	보수부 후단재파손	0.30	0.20		0.06	㎡	1.00					2
3	2016	유간내토사퇴적	-	3.00		1.00	m	1.00					2
4	2019	연석파손	0.40	1.00		0.40	㎡	2.00				신규	2
5	2019	보수부박리	0.40	0.60		0.24	㎡	1.00				신규	2
6	2019	연석박리	0.40	0.60		0.24	㎡	1.00				신규	2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	012

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

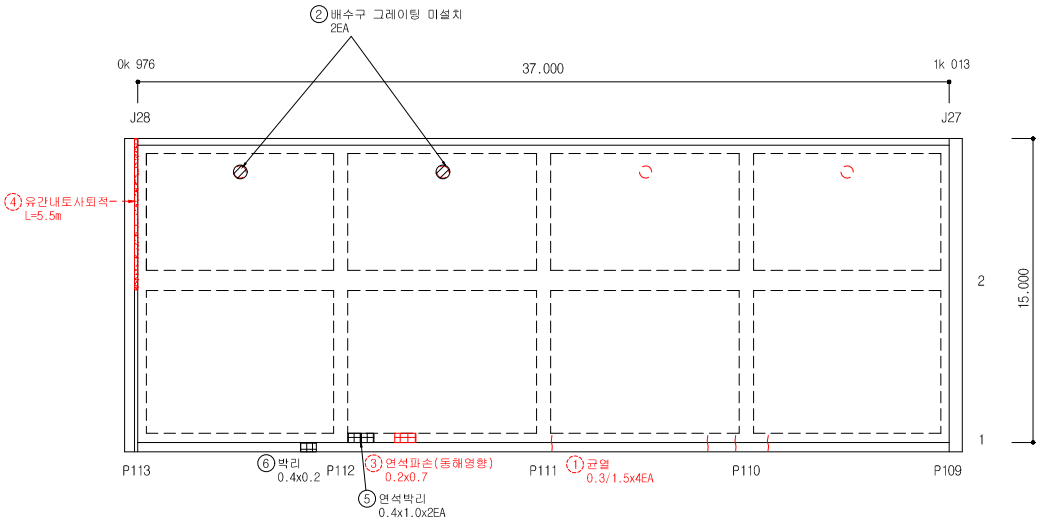


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		6.00	m	4.00					1
2	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		2.00	EA	2.00				신규	1
3	2016	연석파손(동해영향)	0.20	0.70		1.00	EA	1.00					2
4	2016	유간내토사퇴적	-	5.50		1.00	m	1.00					2
5	2019	연석박리	0.40	1.00		0.80	㎡	2.00				신규	2
6	2019	박리	0.40	0.20		0.08	㎡	1.00				신규	2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	얼회	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	013

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

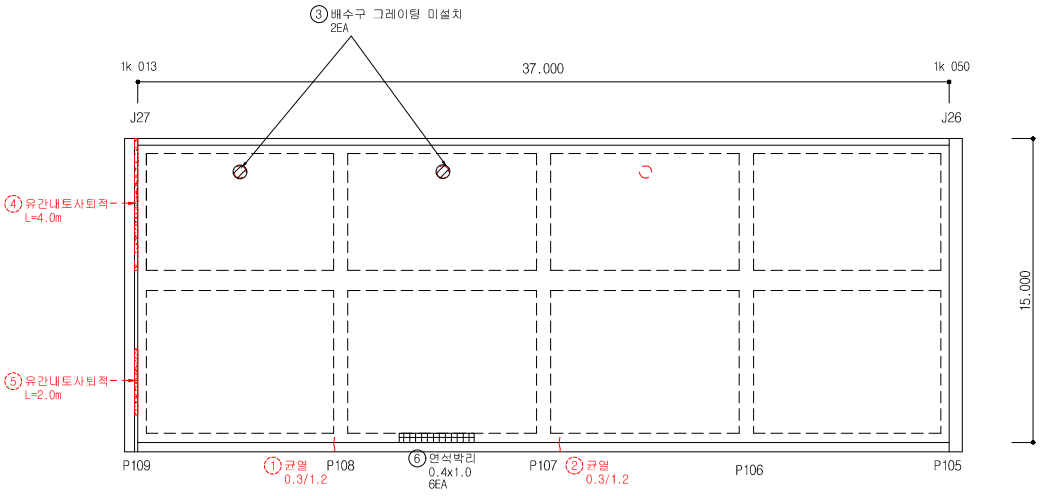


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.20		1.20	m	1.00					1
2	2016	균열	0.30	1.20		1.20	m	1.00					1
3	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		2.00	EA	2.00				신규	1
4	2016	유간내토사퇴적	-	4.00		1.00	m	1.00					2
5	2016	유간내토사퇴적	-	2.00		1.00	m	1.00					2
6	2019	연석박리	0.40	1.00		2.40	㎡	6.00				신규	2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	014

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

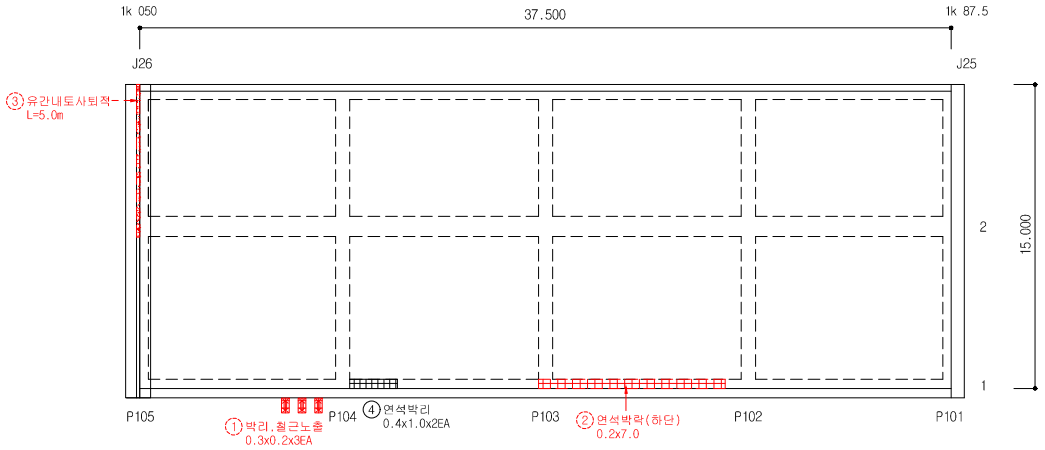


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	박리,철근노출	0.30	0.20		0.18	㎡	3.00					1
2	2016	연석박락(하단)	0.20	7.00		1.00	EA	1.00					2
3	2016	유간내토사퇴적	-	5.00		5.00	m	1.00					2
4	2019	연석박리	0.40	1.00		0.80	㎡	2.00				신규	2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	015

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

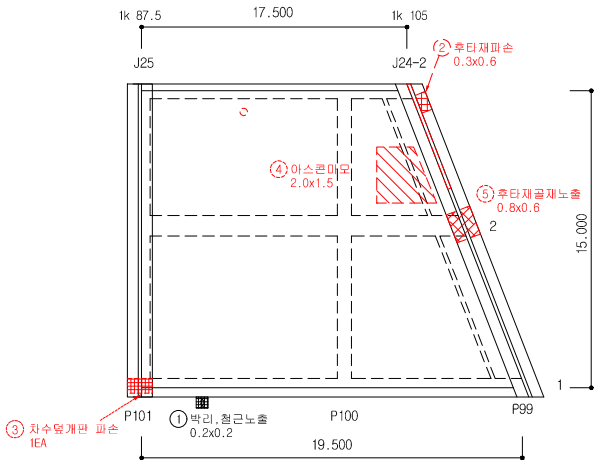


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	박리,철근노출	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00				신규	1
2	2018	후타재파손	0.30	0.60		0.18	㎡	1.00					2
3	2013	차수덮개판파손	-	-		1.00	EA	1.00					2
4	2016	아스콘마모	2.00	1.50		3.00	㎡	1.00					2
5	2016	후타재골재노출	0.80	0.60		0.48	㎡	1.00					2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	016

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

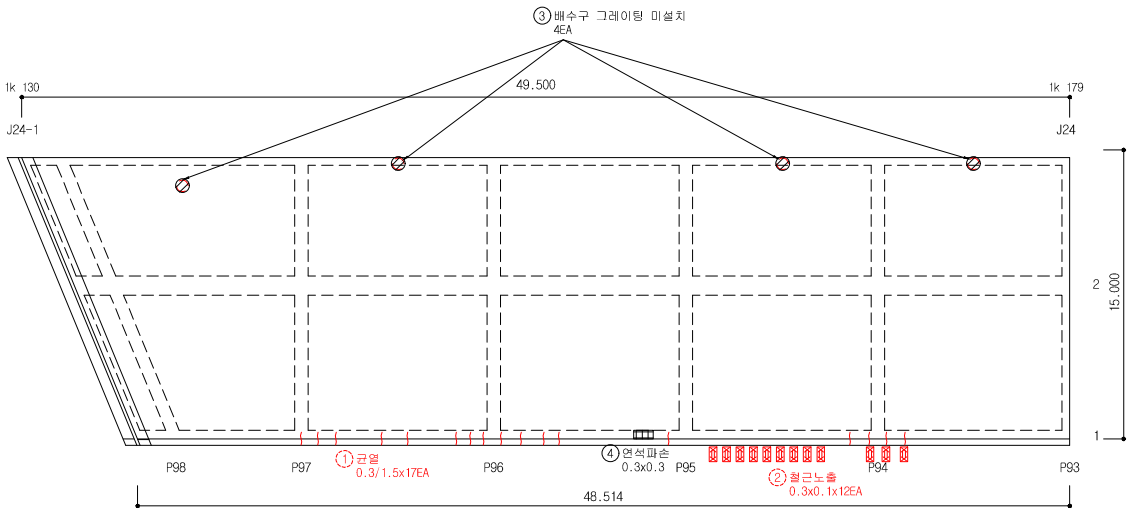


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		25.50	m	17.00					1
2	2016	철근노출	0.30	0.10		0.36	㎡	12.00					1
3	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
4	2019	연석파손	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00				신규	2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	017

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

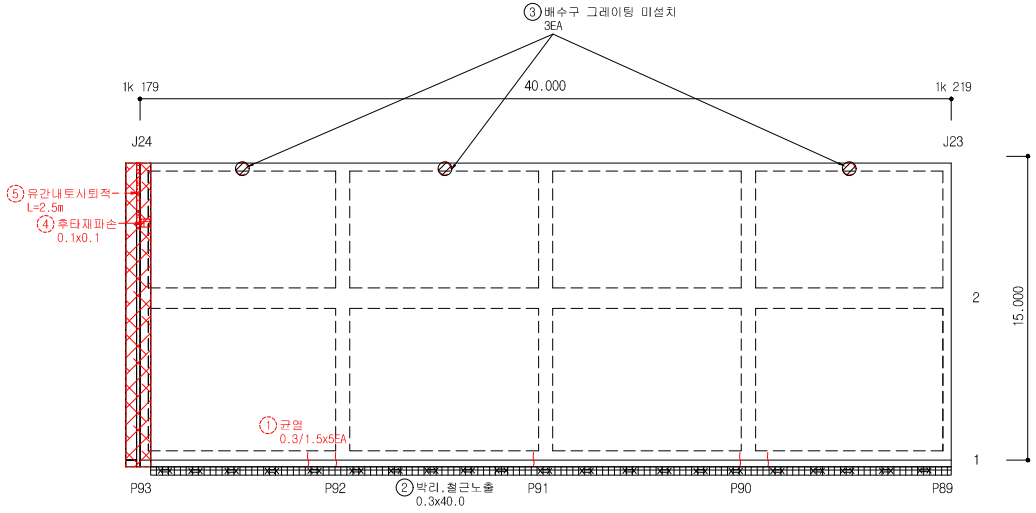


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		7.50	m	5.00					1
2	2019	박리,철근노출	0.30	40.00		12.00	㎡	1.00				신규	1
3	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		3.00	EA	3.00				신규	1
4	2016	후타재파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
5	2016	유간내토사퇴적	-	2.50		2.50	m	1.00					2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	얼회	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	018

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

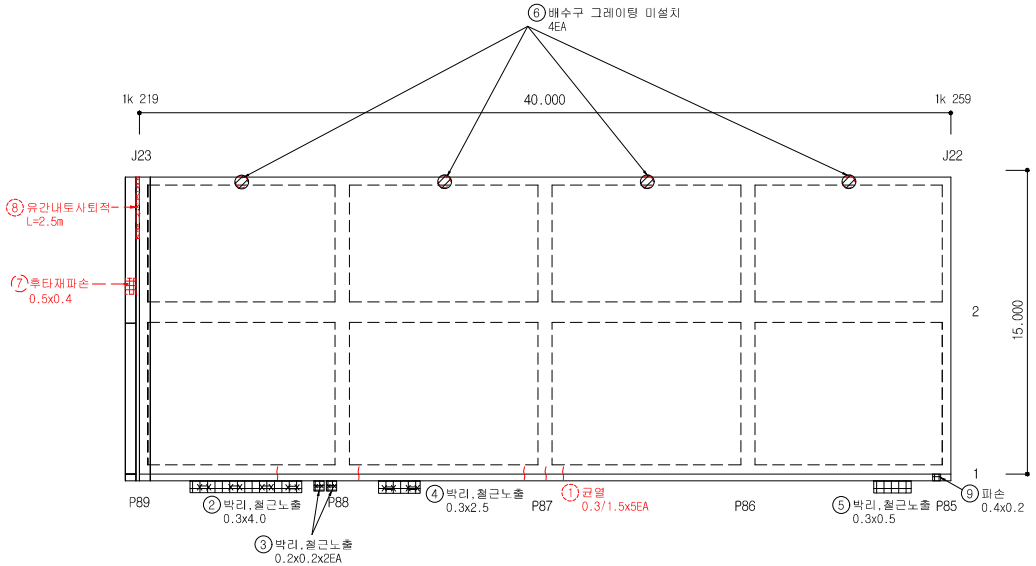


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		7.50	m	5.00					1
2	2019	박리,철근노출	0.30	4.00		1.20	㎡	1.00				신규	1
3	2019	박리,철근노출	0.20	0.20		0.08	㎡	2.00				신규	1
4	2019	박리,철근노출	0.30	2.50		0.75	㎡	1.00				신규	1
5	2019	박리,철근노출	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00				신규	1
6	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
7	2014	후타재파손	0.50	0.40		0.20	㎡	1.00					2
8	2016	유간내토사퇴적	-	2.50		2.50	m	1.00					2
9	2019	파손	0.40	0.20		0.08	㎡	1.00				신규	2
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	019

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

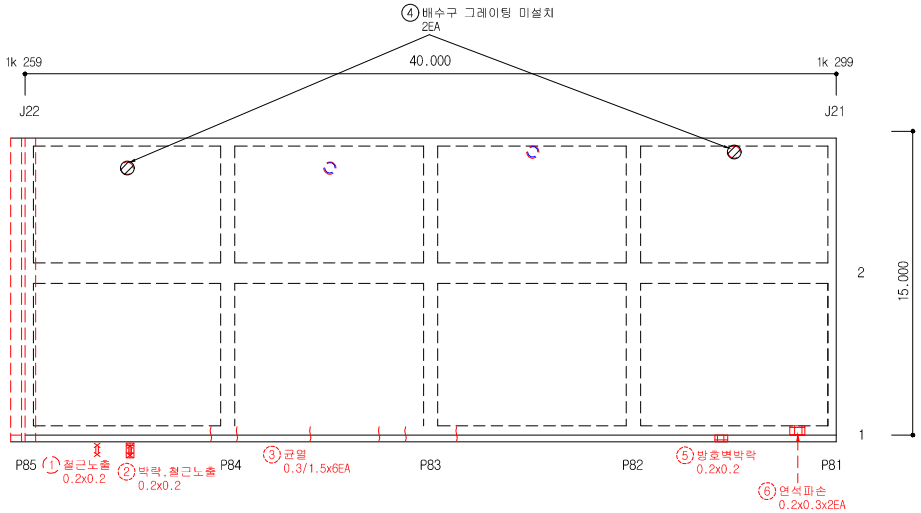


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	철근노출	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					1
2	2016	박락,철근노출	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					1
3	2016	균열	0.30	1.50		9.00	m	6.00					1
4	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		2.00	EA	2.00				신규	1
5	2016	방호벽박락	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					2
6	2016	연석파손	0.20	0.30		2.00	EA	2.00					2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	얼룩	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	020

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

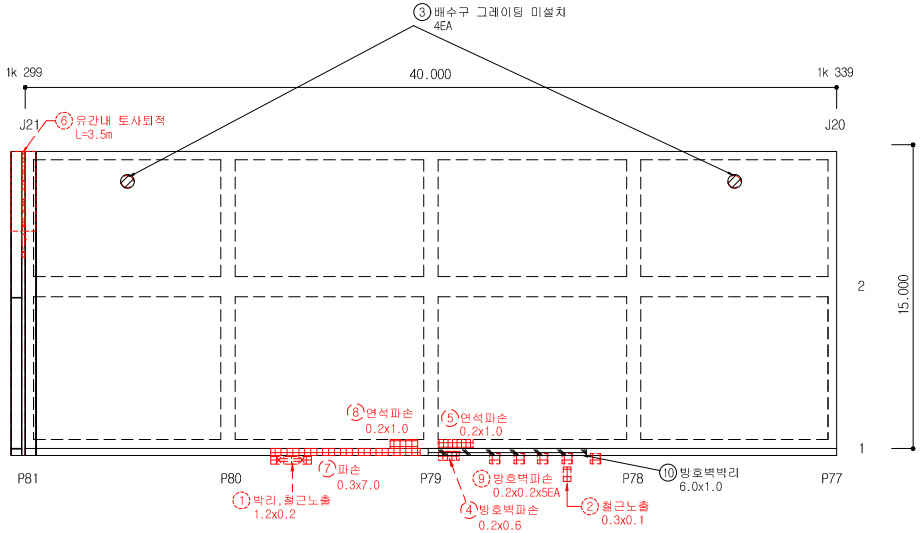


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	박리,철근노출	1.20	0.20		0.24	㎡	1.00					1
2	2016	철근노출	0.30	0.10		0.03	㎡	1.00					1
3	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		2.00	EA	2.00				신규	1
4	2014	방호벽파손	0.20	0.60		0.12	㎡	1.00					2
5	2014	연석파손	0.20	1.00		1.00	EA	1.00					2
6	2016	유간내 토사퇴적	-	3.50		3.50	m	1.00					2
7	2018	파손	0.30	7.00		2.10	㎡	1.00					2
8	2018	연석파손	0.20	1.00		0.20	㎡	1.00					2
9	2016	방호벽파손	0.20	0.20		0.20	㎡	5.00					2
10	2019	방호벽박리	6.00	1.00		6.00	㎡	1.00				신규	2
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	얼회	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	021

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

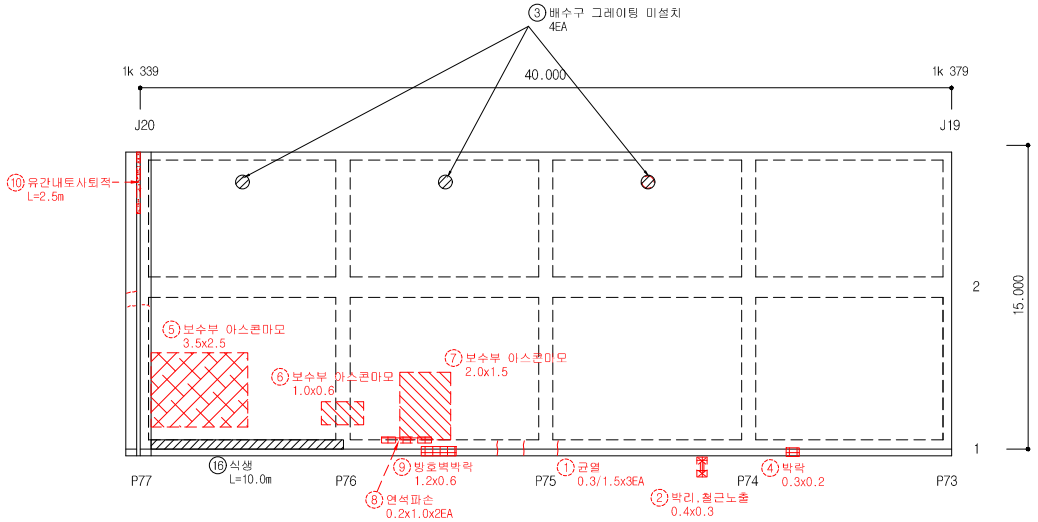


손 상 물 량 표

연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		4.50	m	3.00					1
2	2016	박리,철근노출	0.40	0.30		0.12	㎡	1.00					1
3	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
4	2016	박락	0.30	0.20		0.06	㎡	1.00					2
5	2016	보수부아스콘마모	3.50	2.50		8.75	㎡	1.00					2
6	2016	보수부아스콘마모	1.00	0.60		0.60	㎡	1.00					2
7	2016	보수부아스콘마모	2.00	1.50		3.00	㎡	1.00					2
8	2016	연석파손	0.20	1.00		2.00	EA	2.00					2
9	2016	방호벽박락	1.20	0.60		0.72	㎡	1.00					2
10	2016	유간내토사퇴적	-	2.50		2.50	m	1.00					2
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	얼회	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	022

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

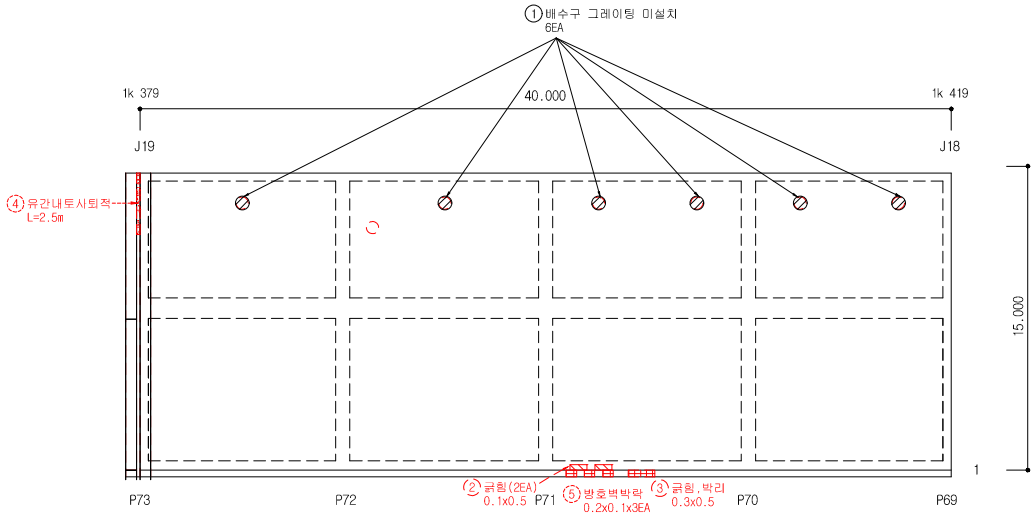


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		6.00	EA	6.00				신규	1
2	2018	긁힘	0.10	0.50		0.10	㎡	2.00					2
3	2018	긁힘,박리	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					2
4	2016	유간내토사퇴적	-	2.50		2.50	m	1.00					2
5	2016	방호벽박락	0.20	0.10		0.06	㎡	3.00					2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	023

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

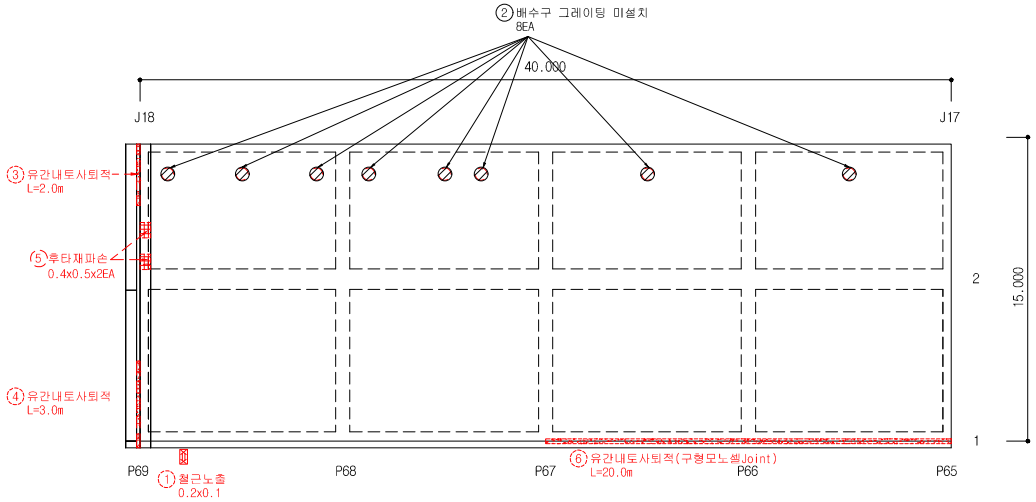


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	철근노출	0.20	0.10		0.02	㎡	1.00					1
2	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		8.00	EA	8.00				신규	1
3	2016	유간내토사퇴적	-	2.00		2.00	m	1.00					2
4	2016	유간내토사퇴적	-	3.00		3.00	m	1.00					2
5	2014	후단재파손	0.40	0.50		0.40	㎡	2.00					2
6	2016	유간내토사퇴적(구형모노셀Joint)		20.00		20.00	m	1.00					2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	024

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

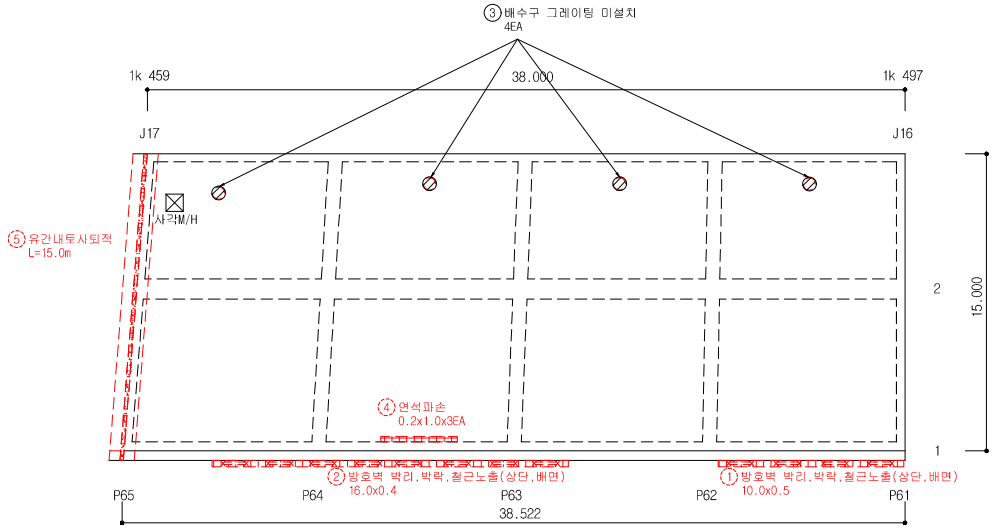


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	방호벽 박리,박락,철근노출(상단,배면)	10.00	0.50		5.00	㎡	1.00					1
2	2016	방호벽 박리,박락,철근노출(상단,배면)	16.00	0.40		6.40	㎡	1.00					1
3	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
4	2016	연석파손	0.20	1.00		3.00	EA	3.00					2
5	2016	유간내토사퇴적	-	15.00		15.00	m	1.00					2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	025

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

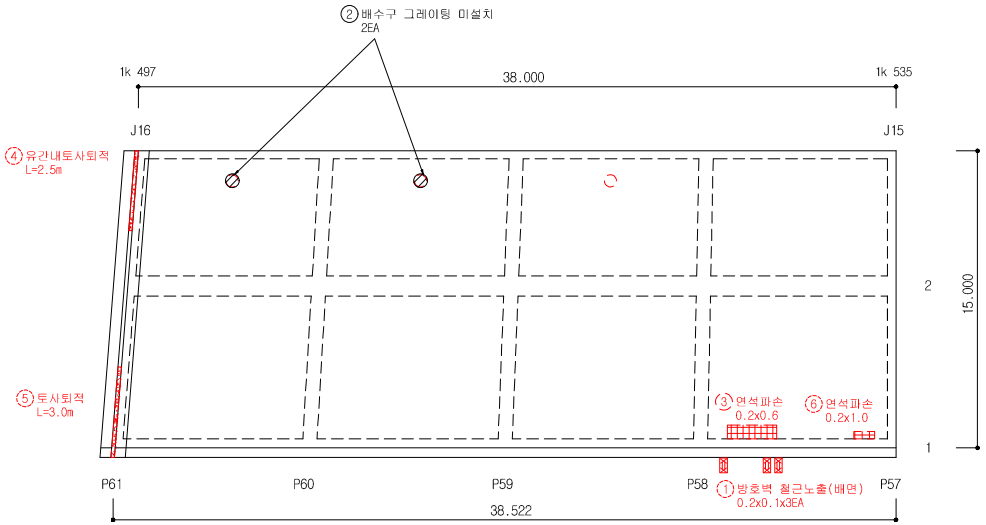


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	방호벽 철근노출	0.20	0.10		0.06	㎡	3.00					1
2	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		2.00	EA	2.00				신규	1
3	2018	연석파손	0.20	0.60		0.12	㎡	1.00					2
4	2016	유간내토사퇴적	-	2.50		2.50	m	1.00					2
5	2016	도사퇴적	-	3.00		3.00	m	1.00					2
6	2016	연석파손	0.20	1.00		1.00	EA	1.00					2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	026

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

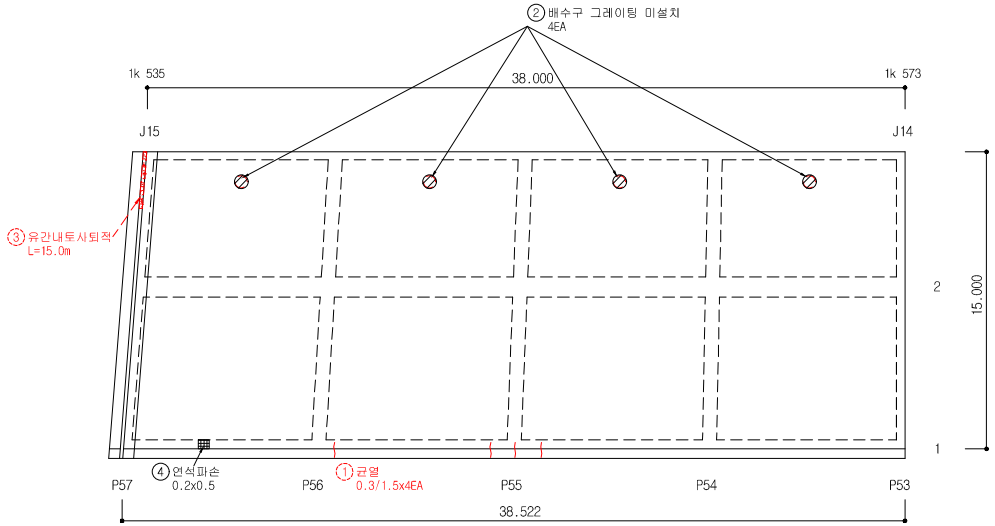


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		6.00	m	4.00					1
2	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
3	2016	유간내토사퇴적	-	15.00		15.00	m	1.00					2
4	2019	연석파손	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00				신규	2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	027

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

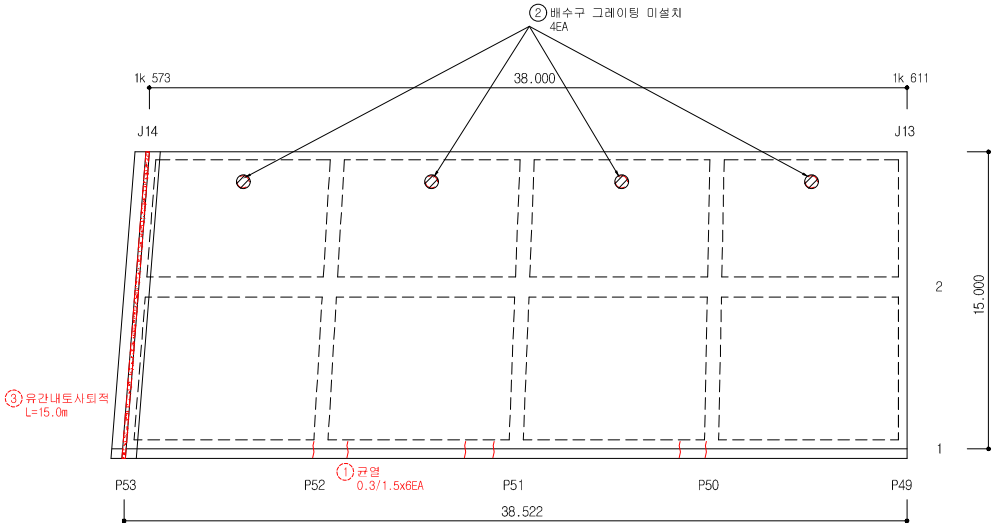


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		9.00	m	6.00					1
2	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
3	2016	유간내토사퇴적	-	15.00		15.00	m	1.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	028

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

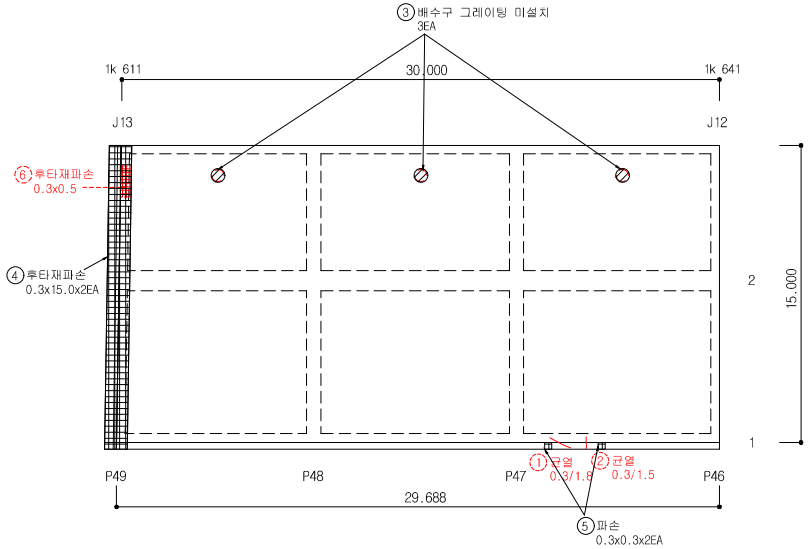


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.80		1.80	m	1.00					1
2	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
3	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		3.00	EA	3.00				신규	1
4	2019	후타재파손	0.30	15.00		9.00	㎡	2.00				신규	2
5	2019	파손	0.30	0.30		0.18	㎡	2.00				신규	2
6	2011	후타재파손	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	029

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

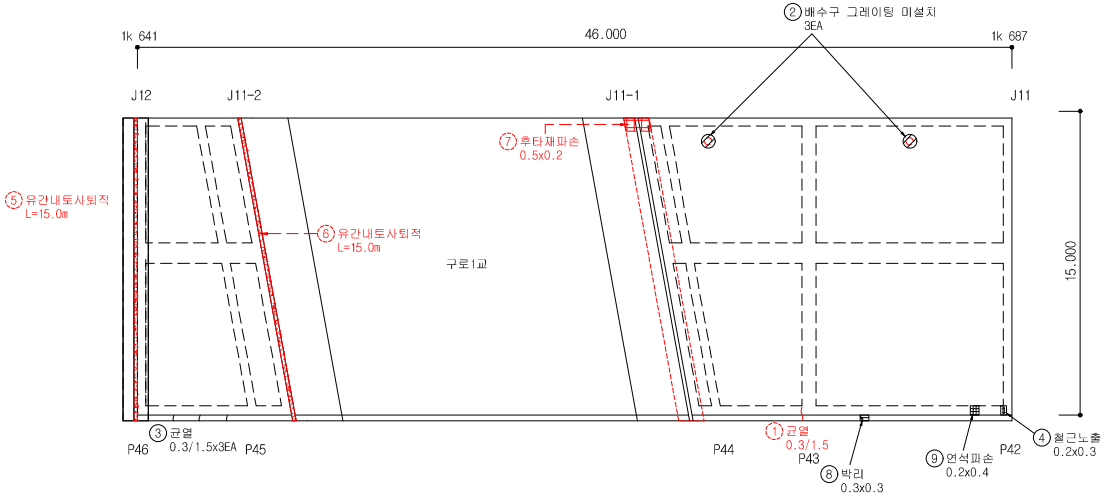


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
2	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		3.00	EA	3.00				신규	1
3	2019	균열	0.30	1.50		4.50	m	3.00				신규	1
4	2019	철근노출	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00				신규	1
5	2016	유간내토사퇴적	-	15.00		15.00	m	1.00					2
6	2016	유간내토사퇴적	-	15.00		15.00	m	1.00					2
7	2016	후타재파손	0.50	0.20		0.10	㎡	1.00					2
8	2019	박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00				신규	2
9	2019	연석파손	0.20	0.40		0.08	㎡	1.00				신규	2
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	030

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

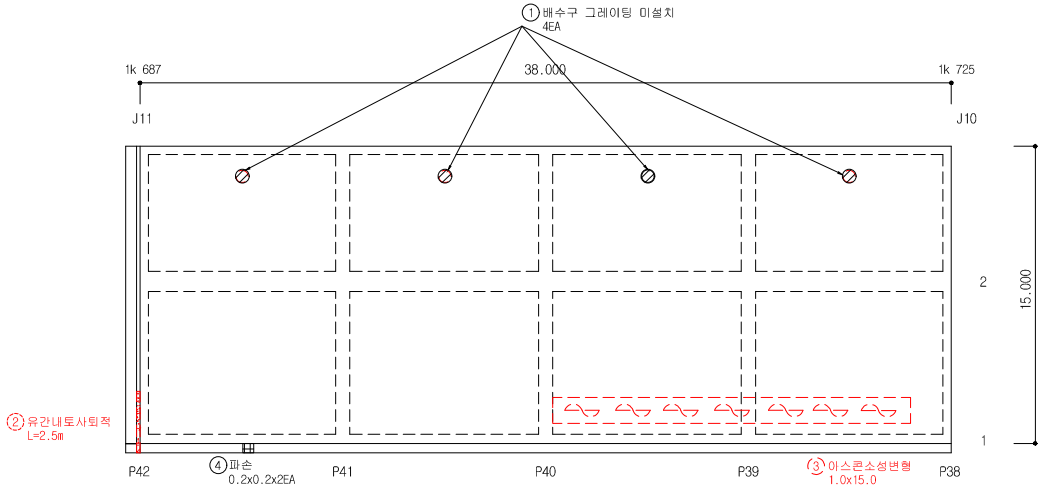


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		2.00	EA	2.00				신규	1
2	2016	유간내토사퇴적	-	2.50		2.50	m	1.00					2
3	2018	아스콘소성변형	1.00	15.00		15.00	㎡	1.00					2
4	2019	파손	0.20	0.20		0.08	㎡	2.00				신규	2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	031

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

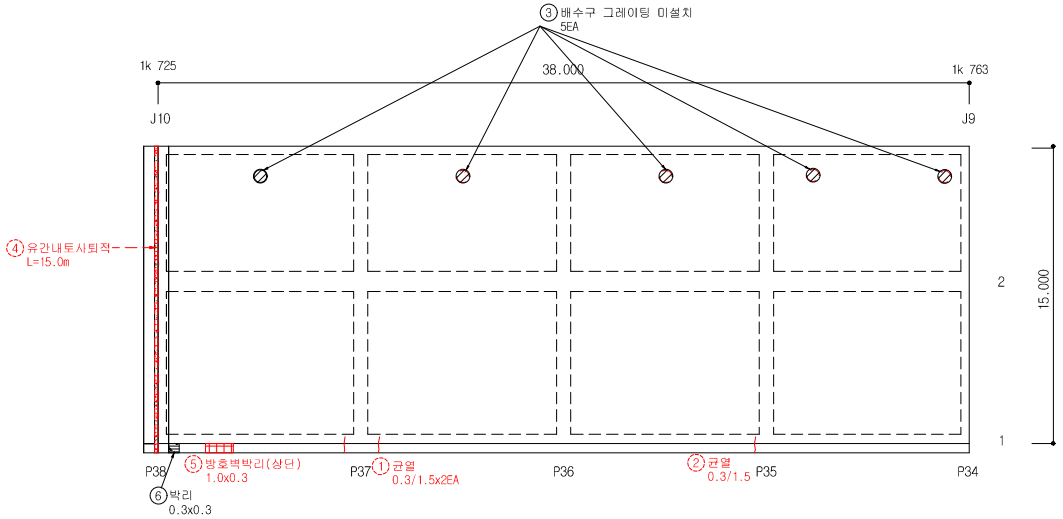


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		3.00	m	2.00					1
2	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
3	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		5.00	EA	2.00				신규	1
4	2016	유간내토사퇴적	-	0.00		15.00	m	1.00					2
5	2016	방호벽박리(상단)	1.00	0.30		0.30	㎡	1.00					2
6	2019	박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00				신규	2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	032

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

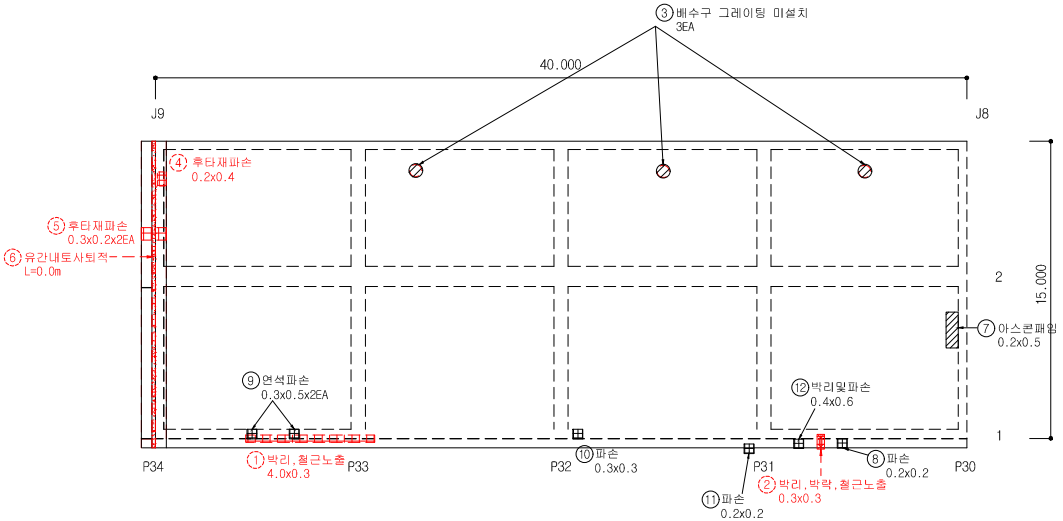


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	박리,철근노출	4.00	0.30		1.20	㎡	1.00					1
2	2016	박리,박락,철근노출	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					1
3	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		5.00	EA	2.00				신규	1
4	2011	후타재파손	0.20	0.40		0.08	㎡	1.00					2
5	2016	후타재파손	0.30	0.20		0.12	㎡	2.00					2
6	2016	유간내토사퇴적	-	15.00		15.00	m	1.00					2
7	2019	아스콘패임	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00				신규	2
8	2019	파손	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00				신규	2
9	2019	연석파손	0.30	0.50		0.30	㎡	2.00				신규	2
10	2019	파손	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00				신규	2
11	2019	파손	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00				신규	2
12	2019	박리및파손	0.40	0.60		0.24	㎡	1.00				신규	2
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	033

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

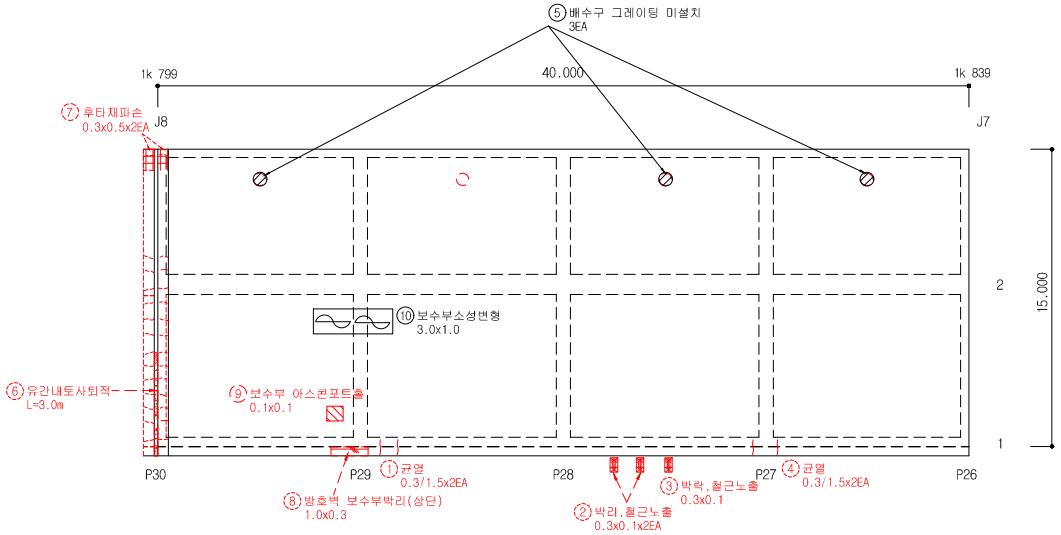


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		3.00	m	2.00					1
2	2016	박리,철근노출	0.30	0.10		0.06	㎡	2.00					1
3	2016	박락,철근노출	0.30	0.10		0.03	㎡	1.00					1
4	2016	균열	0.30	1.50		3.00	m	2.00					1
5	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		3.00	EA	3.00				신규	1
6	2016	유간내토사퇴적	-	3.00		3.00	m	1.00					2
7	2011	후타재파손	0.30	0.50		0.30	㎡	2.00					2
8	2016	방호벽 보수부박리(상단)	1.00	0.30		0.30	㎡	1.00					2
9	2018	보수부아스콘포트홀	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
10	2019	보수부소성변형	3.00	1.00		3.00	㎡	1.00				신규	2
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	034

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

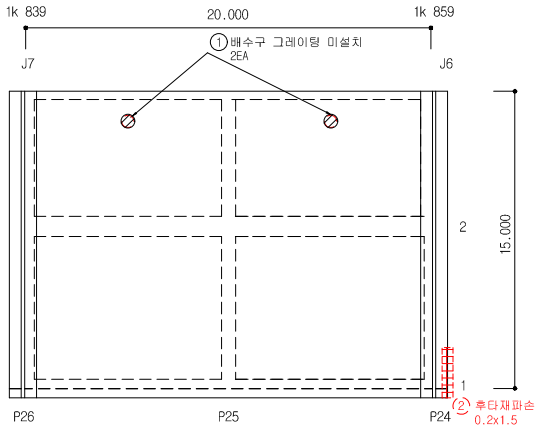


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		2.00	EA	2.00				신규	1
2	2018	후타재파손	0.20	1.50		0.30	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	035

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

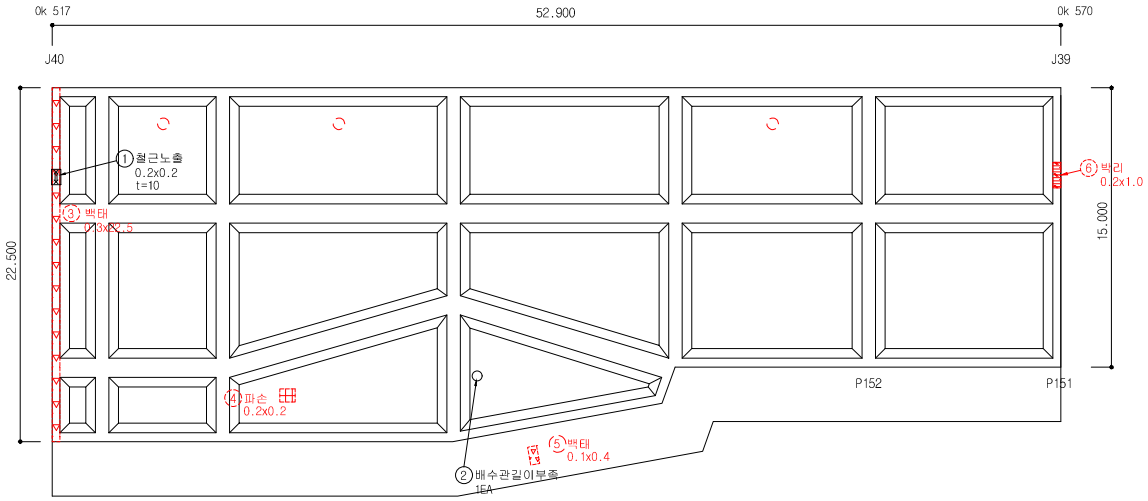


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	철근노출	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00				신규	1
2	2019	배수관길이부족	-	-		1.00	EA	1.00				신규	1
3	2011	백태	0.30	22.50		6.75	㎡	1.00					2
4	2011	파손	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					2
5	2014	백태	0.10	0.40		0.04	㎡	1.00					2
6	2016	박리	0.20	1.00		0.20	㎡	1.00					2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	036

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

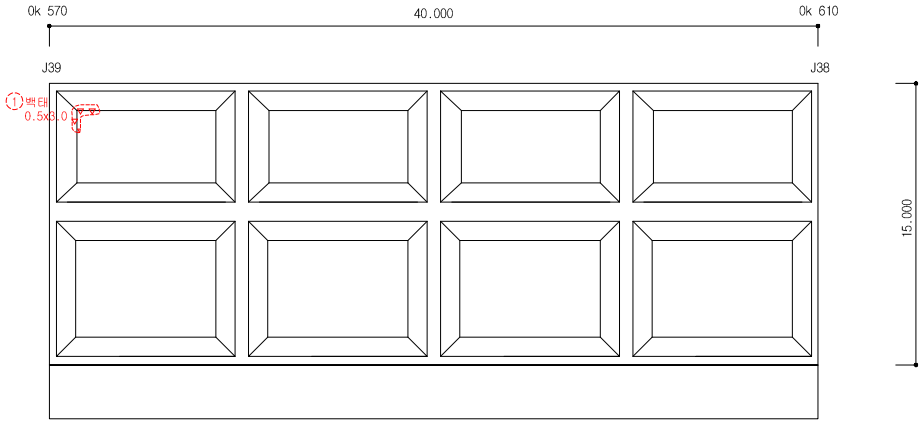


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.50	3.00		1.50	㎡	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	037

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

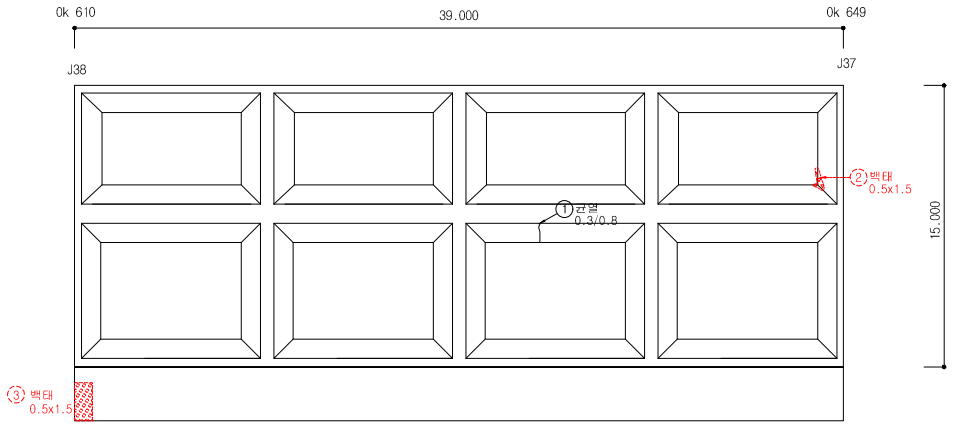


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00				신규	1
2	2011	백태	0.50	1.50		0.75	㎡	1.00					2
3	2011	백태	0.50	1.50		0.75	㎡	1.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	038

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

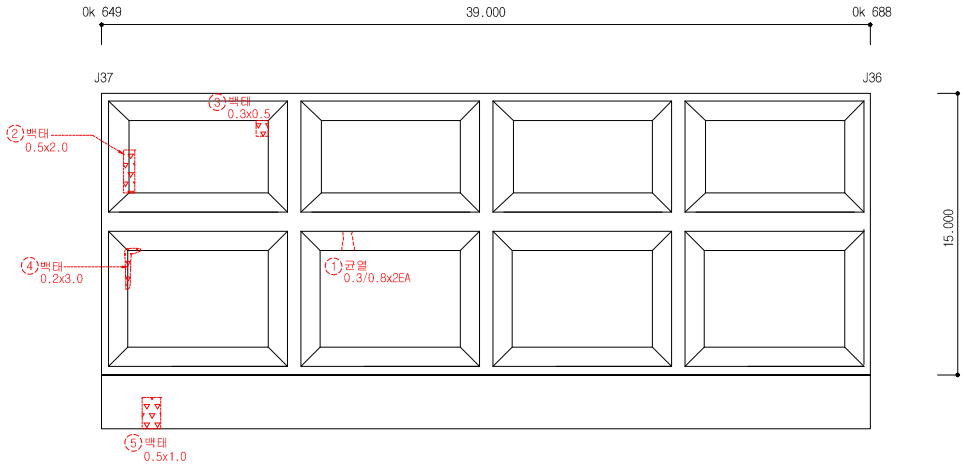


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	균열	0.30	0.80		1.60	m	2.00					1
2	2011	백태	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
3	2013	백태	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					2
4	2011	백태	0.20	3.00		0.60	㎡	1.00					2
5	2011	백태	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	039

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

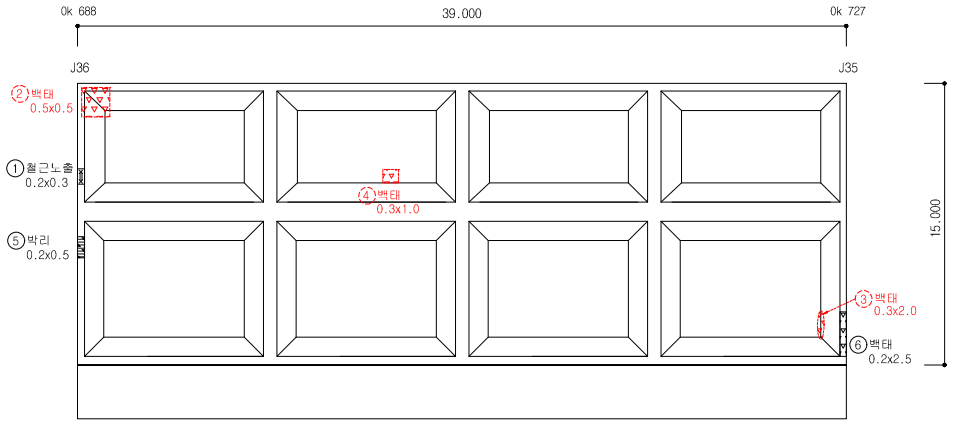


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	철근노출	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00				신규	1
2	2011	백태	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
3	2011	백태	0.30	2.00		0.60	㎡	1.00					2
4	2011	백태	0.30	1.00		0.30	㎡	1.00					2
5	2019	박리	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00				신규	2
6	2019	백태	0.20	2.50		0.50	㎡	1.00				신규	2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	040

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

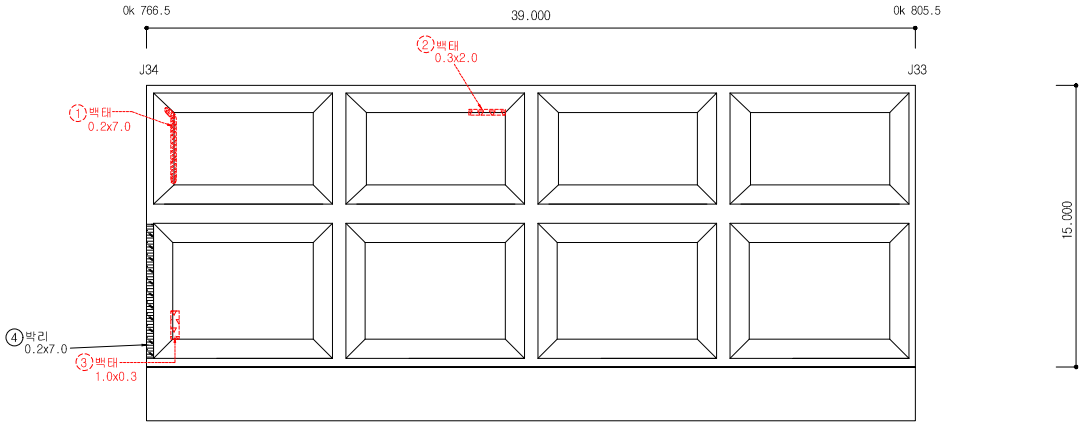


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.20	7.00		1.40	㎡	1.00					2
2	2011	백태	0.30	2.00		0.60	㎡	1.00					2
3	2011	백태	1.00	0.30		0.30	㎡	1.00					2
4	2019	박리	0.20	7.00		1.40	㎡	1.00				신규	2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	041

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

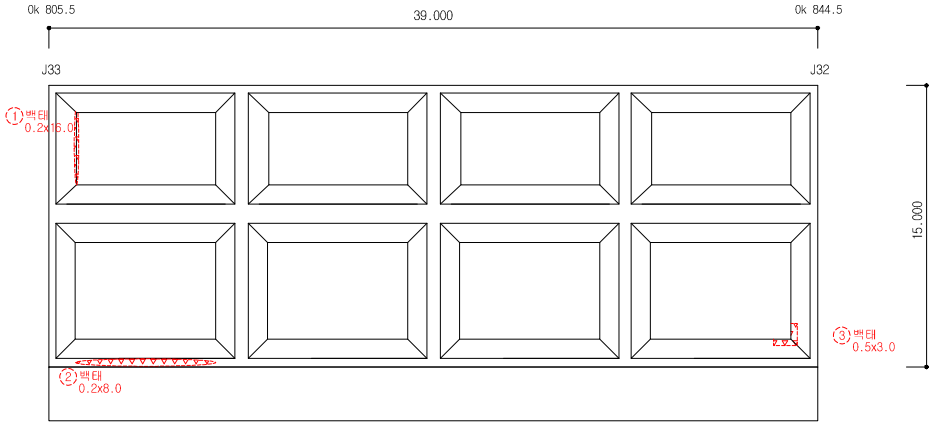


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.20	16.00		3.20	㎡	1.00					2
2	2011	백태	0.20	8.00		1.60	㎡	1.00					2
3	2011	백태	0.50	3.00		1.50	㎡	1.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	얼회	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	042

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

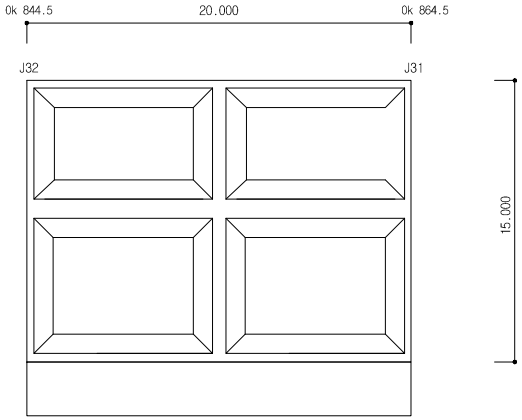


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	043

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

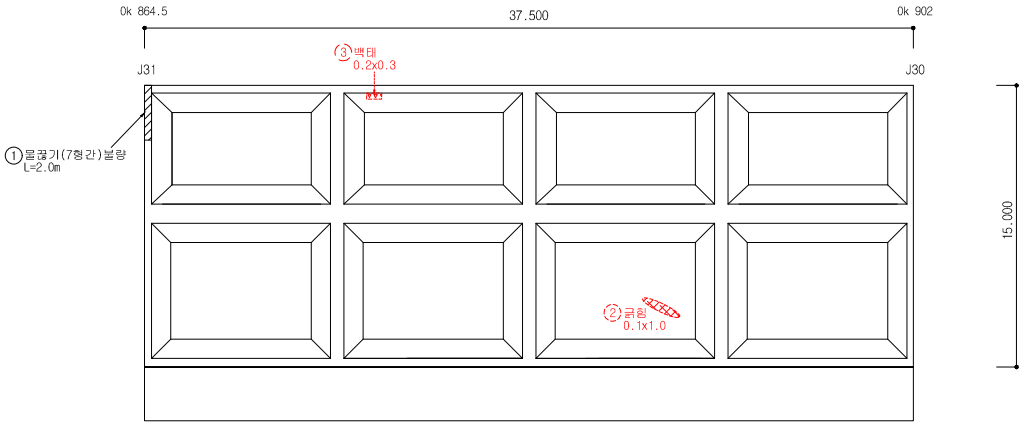


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (mm)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	물끊기보량		2.00		2.00	m	1.00				신규	1
2	2011	균열	0.10	1.00		0.10	㎡	1.00					2
3	2014	백태	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	얼회	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	044

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

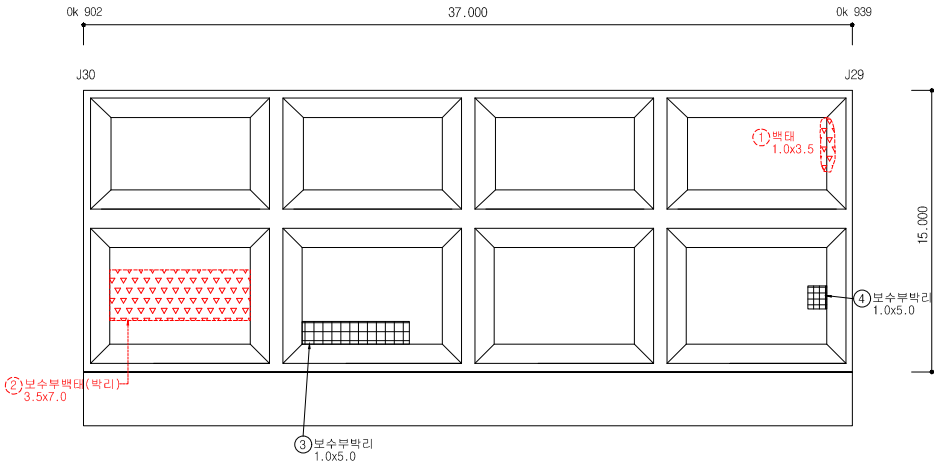


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	1.00	3.50		3.50	㎡	1.00					2
2	2011	보수부 백태	3.50	7.00		24.50	㎡	1.00					2
3	2019	보수부박리	1.00	5.00		5.00	㎡	1.00				신규	2
4	2019	보수부박리	1.00	5.00		5.00	㎡	1.00				신규	2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	045

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

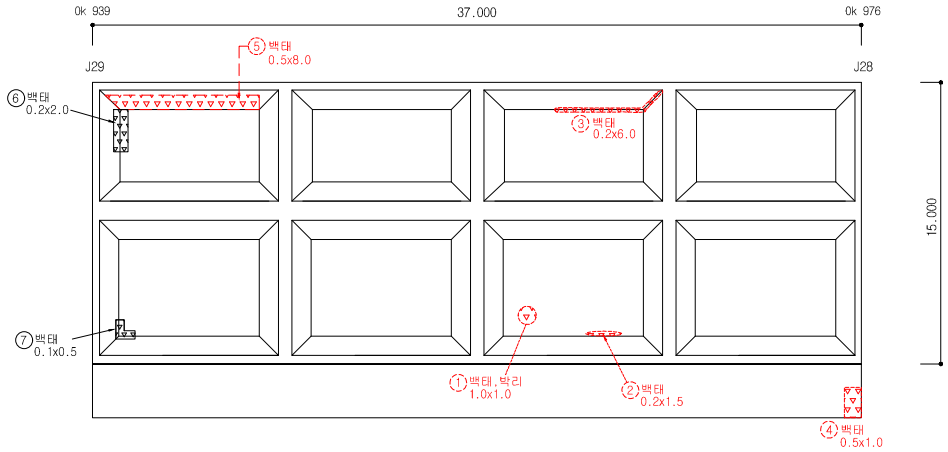


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태 및 박리	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00					2
2	2011	백태	0.20	1.50		0.30	㎡	1.00					2
3	2011	백태	0.20	6.00		1.20	㎡	1.00					2
4	2011	백태	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					2
5	2016	백태	0.50	8.00		4.00	㎡	1.00					2
6	2019	백태	0.20	2.00		0.40	㎡	1.00				신규	2
7	2019	백태	0.10	0.50		0.05	㎡	1.00				신규	2
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	046

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

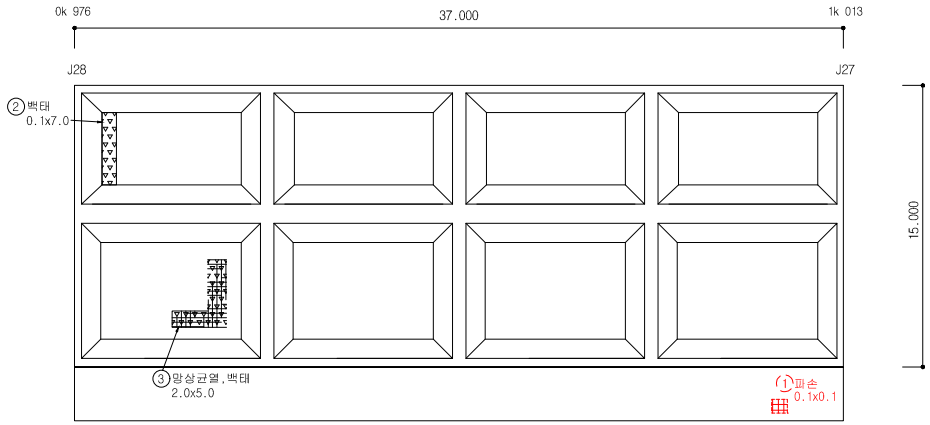


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
2	2019	백태	0.10	7.00		0.70	㎡	1.00				신규	2
3	2019	망상균열 및 백태	2.00	5.00		10.00	㎡	1.00				신규	2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손, 탈락 박리, 박락	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태, 결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수, 습윤	배수구막힘	보수	도면번호	047

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

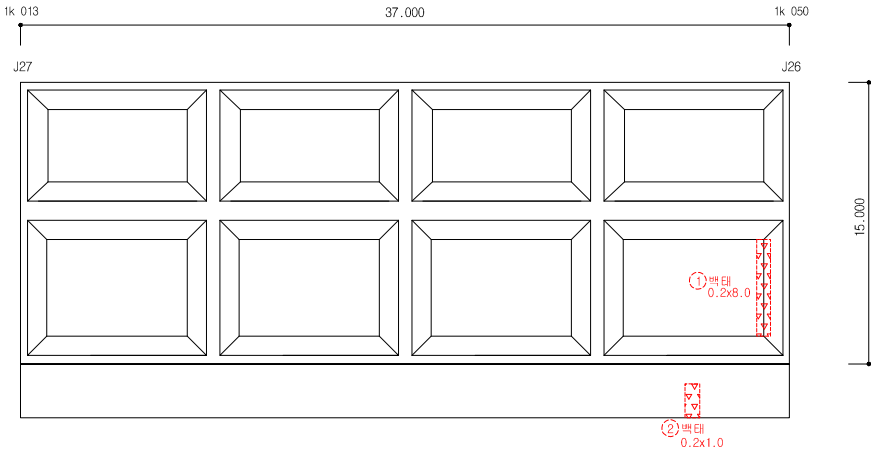


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.20	8.00		1.60	㎡	1.00					2
2	2011	백태	0.20	1.00		1.00	m	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	048

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

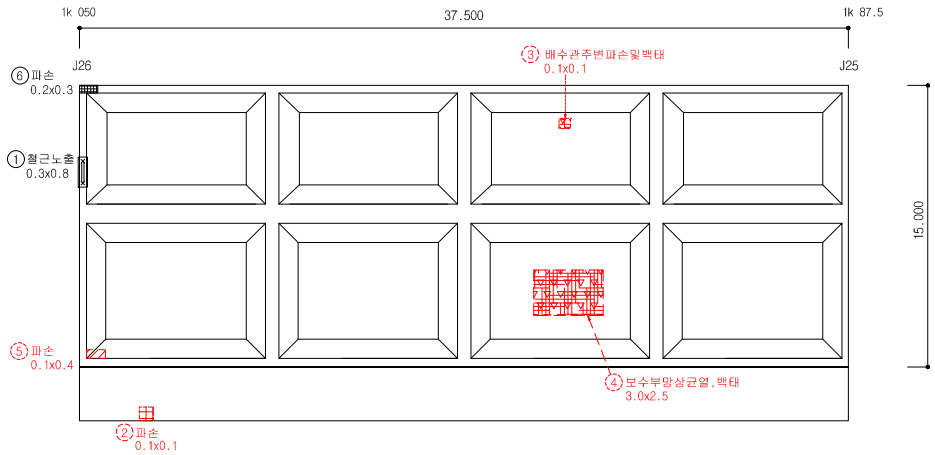


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	철근노출	0.30	0.80		0.24	㎡	1.00				신규	1
2	2011	파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
3	2011	배수관주변 파손 및 백태	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
4	2016	보수부 망상균열 및 백태	3.00	2.50		7.50	㎡	1.00					2
5	2016	파손	0.10	0.40		0.04	㎡	1.00					2
6	2019	파손	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00				신규	2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	049

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

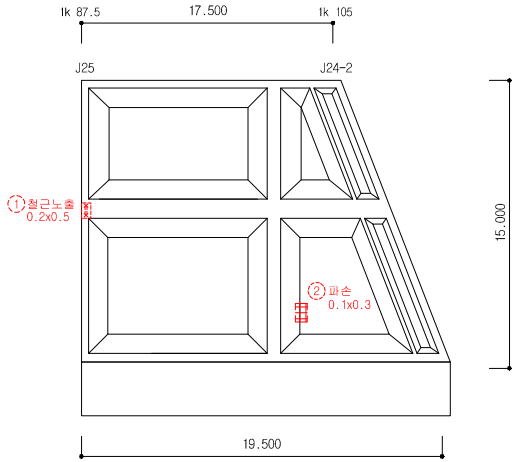


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	철근노출	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					1
2	2016	파손	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	050

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

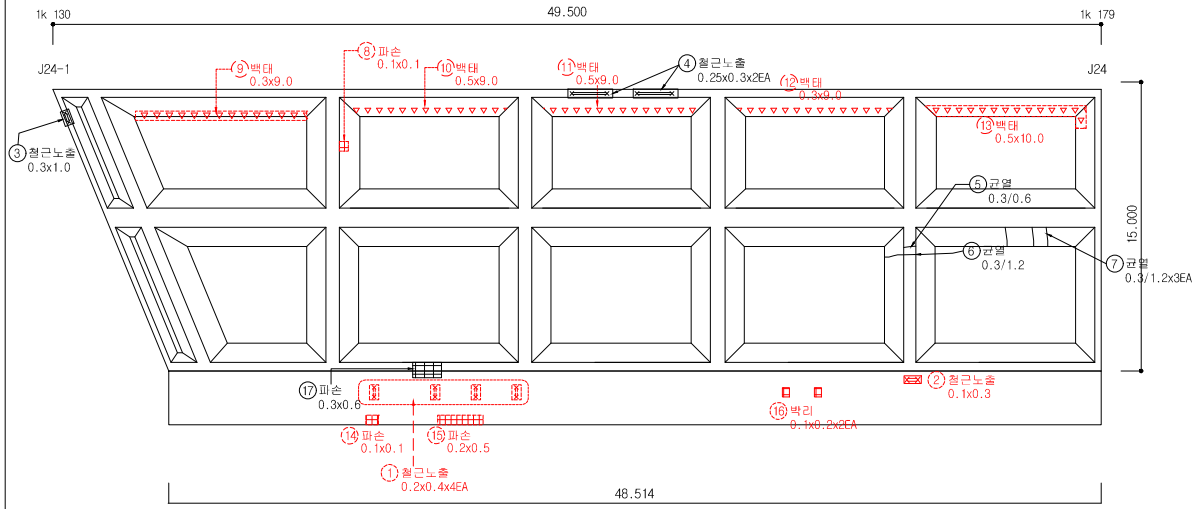


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	철근노출	0.20	0.40		0.32	㎡	4.00					1
2	2016	철근노출	0.10	0.30		0.30	m	1.00					1
3	2019	철근노출	0.30	1.00		0.30	㎡	1.00				신규	1
4	2019	철근노출	0.25	0.30		0.15	㎡	2.00				신규	1
5	2019	균열	0.30	0.60		0.60	m	1.00				신규	1
6	2019	균열	0.30	1.20		1.20	m	1.00				신규	1
7	2019	균열	0.30	1.20		2.40	m	3.00				신규	1
8	2011	파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
9	2014	백태	0.30	9.00		2.70	㎡	1.00					2
10	2014	백태	0.50	9.00		4.50	㎡	1.00					2
11	2014	백태	0.50	9.00		4.50	㎡	1.00					2
12	2014	백태	0.30	9.00		2.70	㎡	1.00					2
13	2014	백태	0.50	10.00		5.00	㎡	1.00					2
14	2011	파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
15	2011	파손	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
16	2016	박리	0.10	0.20		0.04	㎡	2.00					2
17	2019	파손	0.30	0.60		0.18	㎡	1.00				신규	2
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	얼회	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	051

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면



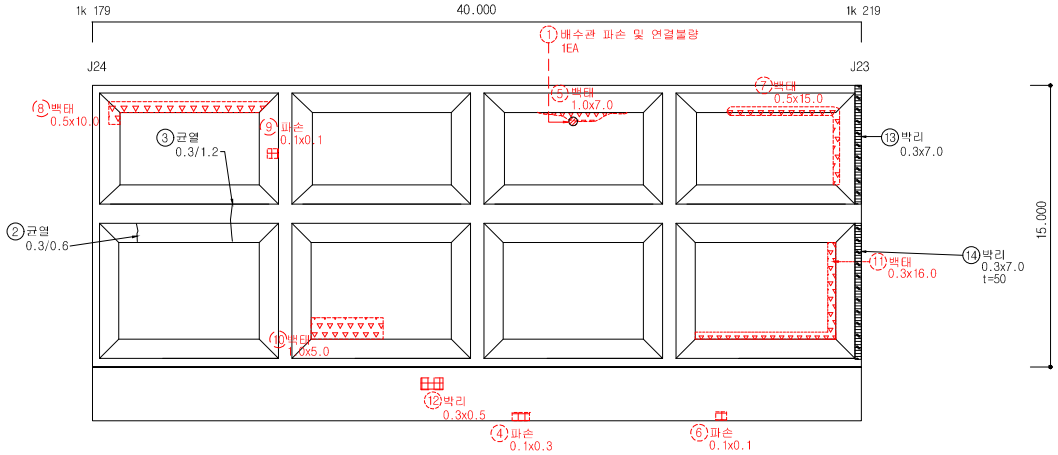손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수관 파손 및 연결불량				1.00	EA	1.00					1
2	2019	균열	0.30	0.60		0.30	m	1.00				신규	1
3	2019	균열	0.30	1.20		1.20	m	1.00				신규	1
4	2011	파손	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00					2
5	2011	백태	1.00	7.00		7.00	㎡	1.00					2
6	2011	파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
7	2011	백태	0.50	15.00		7.50	㎡	1.00					2
8	2014	백태	0.50	10.00		5.00	㎡	1.00					2
9	2011	파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
10	2014	백태	1.00	5.00		5.00	㎡	1.00					2
11	2011	백태	0.30	16.00		4.80	㎡	1.00					2
12	2016	박리	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					2
13	2019	박리	0.30	0.70		2.10	㎡	1.00				신규	2
14	2019	박리	0.30	0.70		2.10	㎡	1.00				신규	2
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	052

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

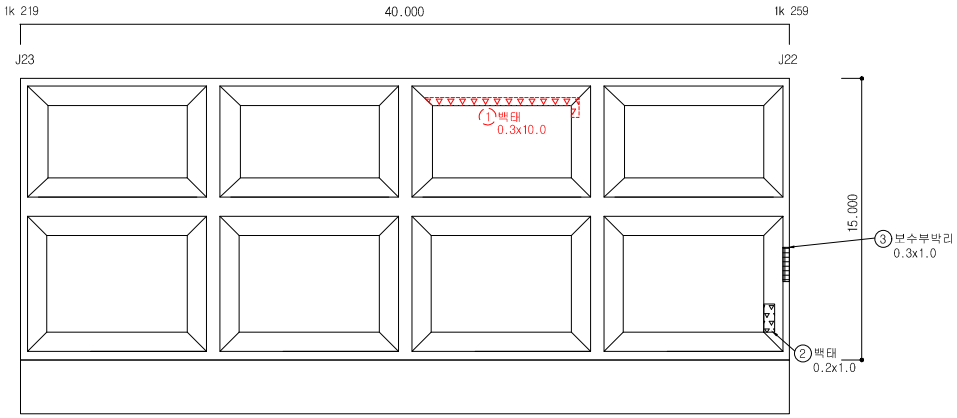


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	백태	0.30	10.00		3.00	㎡	1.00					2
2	2019	백태	0.20	1.00		0.20	㎡	1.00				신규	2
3	2019	보수부박리	0.30	1.00		0.30	㎡	1.00				신규	2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	053

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

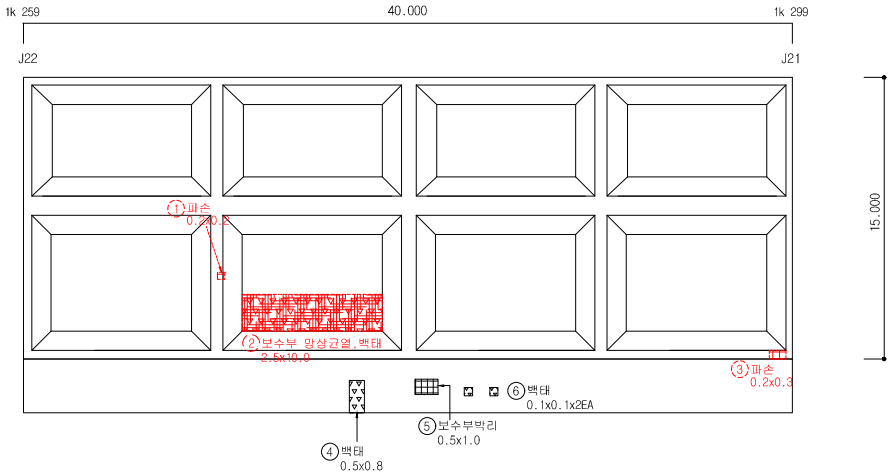


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	파손	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					2
2	2014	보수부 망상균열 및 백태	2.50	10.00		25.00	㎡	1.00					2
3	2011	파손	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00					2
4	2019	백태	0.50	0.80		0.40	㎡	1.00				신규	2
5	2019	보수부박리	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00				신규	2
6	2019	백태	0.10	0.10		0.02	㎡	2.00				신규	2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	054

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

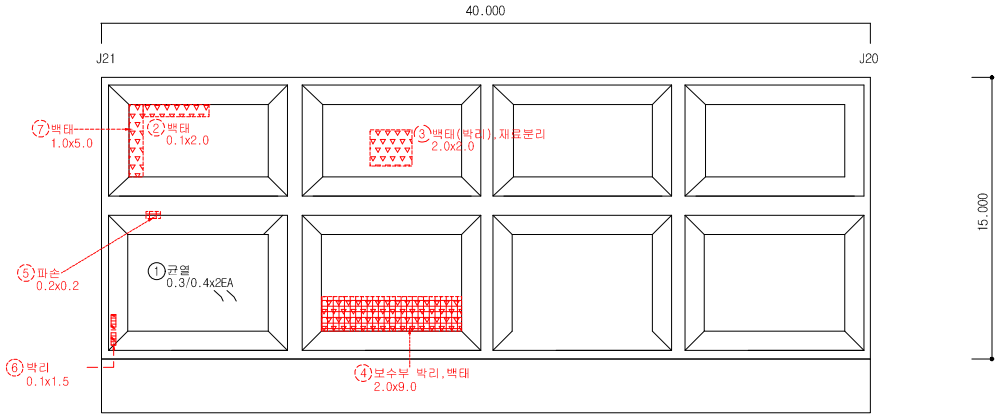


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	균열	0.30	0.40		0.80	m	2.00				신규	1
2	2011	백태	0.10	2.00		0.20	㎡	1.00					2
3	2014	백태(박리),재료분리	2.00	2.00		4.00	㎡	1.00					2
4	2011	보수부 박리 및 백태	2.00	9.00		18.00	㎡	1.00					2
5	2011	파손	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					2
6	2016	박리	0.10	1.50		0.15	㎡	1.00					2
7	2011	백태	1.00	5.00		5.00	㎡	1.00					2
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	얼회	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	055

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

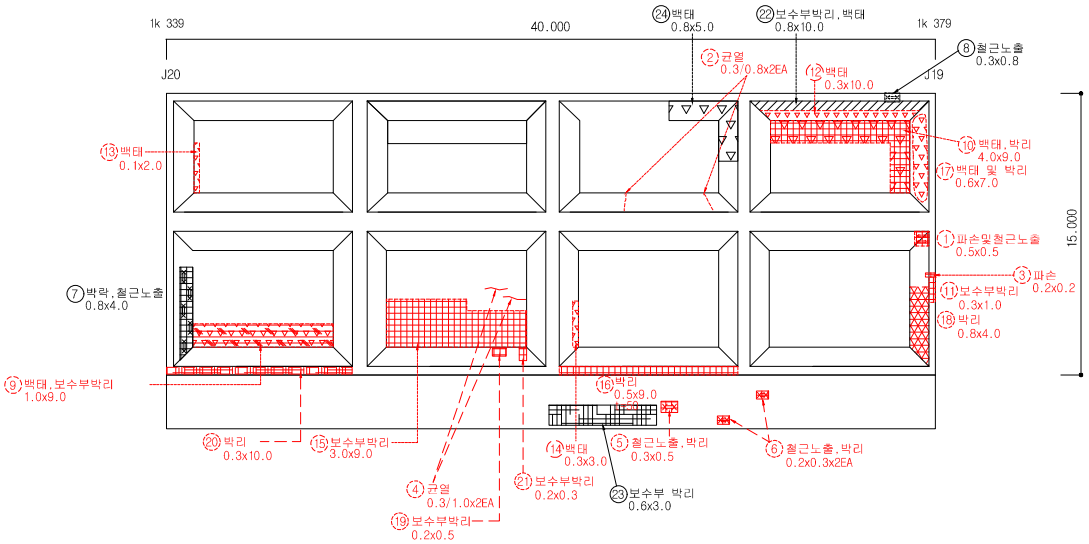


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	파손 및 철근노출	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					1
2	2011	균열	0.30	0.80		1.60	m	2.00					1
3	2011	파손	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					1
4	2016	균열	0.30	1.00		2.00	m	2.00					1
5	2016	철근노출 및 박리	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					1
6	2016	철근노출 및 박리	0.20	0.30		0.12	㎡	2.00					1
7	2019	박락,철근노출	0.80	4.00		3.20	㎡	1.00				신규	1
8	2019	철근노출	0.30	0.80		0.24	㎡	1.00				신규	1
9	2011	백태 보수부 박리	1.00	9.00		9.00	㎡	1.00					2
10	2011	백태 및 박리	4.00	9.00		36.00	㎡	1.00					2
11	2011	보수부 박리	0.30	1.00		0.30	㎡	1.00					2
12	2014	백태	0.30	10.00		3.00	㎡	1.00					2
13	2011	백태	0.10	2.00		0.20	㎡	1.00					2
14	2014	백태	0.30	3.00		0.90	㎡	1.00					2
15	2011	보수부 박리	3.00	9.00		27.00	㎡	1.00					2
16	2011	박리	0.50	9.00		4.50	㎡	1.00					2
17	2011	백태 및 박리	0.60	7.00		4.20	㎡	1.00					2
18	2016	박리	0.80	4.00		3.20	㎡	1.00					2
19	2016	보수부 박리	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
20	2016	박리	0.30	10.00		3.00	㎡	1.00					2
21	2016	보수부 박리	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00					2
22	2019	보수부 박리 및 백태	0.80	10.00		8.00	㎡	1.00				신규	2
23	2019	보수부 박리	0.60	3.00		1.80	㎡	1.00				신규	2
24	2019	백태	0.80	5.00		4.00	㎡	1.00				신규	2
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	056

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면



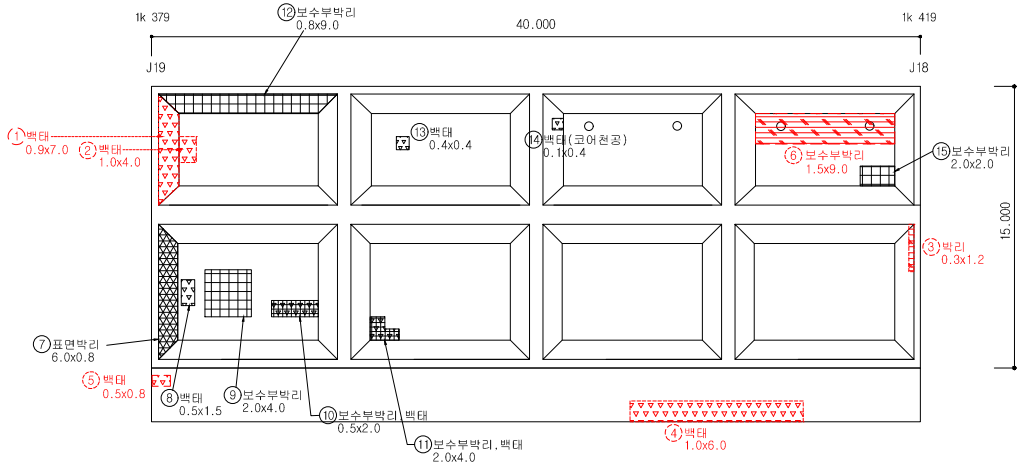손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	백태	0.90	7.00		6.30	㎡	1.00					2
2	2011	백태	1.00	4.00		4.00	㎡	1.00					2
3	2011	박리	0.30	1.20		0.36	㎡	1.00					2
4	2011	백태	1.00	6.00		6.00	㎡	1.00					2
5	2016	백태	0.50	0.80		0.40	㎡	1.00					2
6	2016	보수부 박리	1.50	9.00		13.50	㎡	1.00					2
7	2019	표면박리	6.00	0.80		4.80	㎡	1.00				신규	2
8	2019	백태	0.50	1.50		0.75	㎡	1.00				신규	2
9	2019	보수부박리	2.00	4.00		8.00	㎡	1.00				신규	2
10	2019	보수부박리 및 백태	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00				신규	2
11	2019	보수부박리 및 백태	2.00	4.00		8.00	㎡	1.00				신규	2
12	2019	보수부박리	0.80	9.00		7.20	㎡	1.00				신규	2
13	2019	백태	0.40	0.40		0.16	㎡	1.00				신규	2
14	2019	백태	0.10	0.40		0.04	㎡	1.00				신규	2
15	2019	보수부박리	2.00	2.00		4.00	㎡	1.00				신규	2
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	057

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

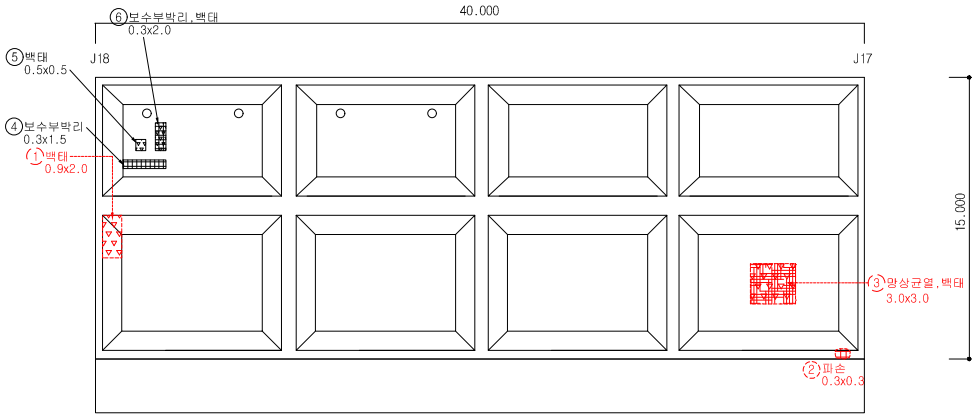


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	백태	0.90	2.00		1.80	㎡	1.00					2
2	2011	파손	0.30	0.30		0.30	m	1.00					2
3	2014	망상균열 및 백태	3.00	3.00		9.00	㎡	1.00					2
4	2019	보수부박리	0.30	1.50		0.45	㎡	1.00				신규	2
5	2019	백태	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00				신규	2
6	2019	보수부박리 및 백태	0.30	2.00		0.60	㎡	1.00				신규	2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	058

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

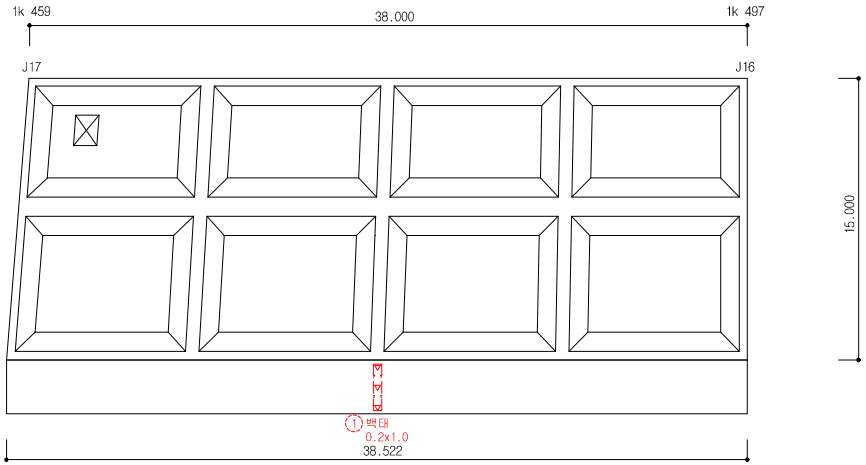


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	백태	0.20	1.00		0.20	㎡	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	059

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

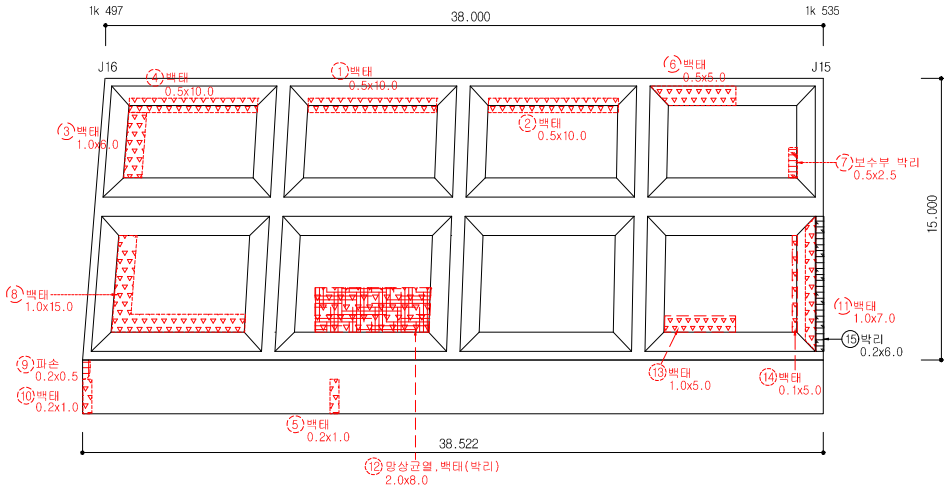


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.50	10.00		5.00	㎡	1.00					2
2	2011	백태	0.50	10.00		5.00	㎡	1.00					2
3	2014	백태	1.00	6.00		6.00	㎡	1.00					2
4	2011	백태	0.50	10.00		5.00	㎡	1.00					2
5	2011	백태	0.20	1.00		0.20	㎡	1.00					2
6	2014	백태	0.50	5.00		2.50	㎡	1.00					2
7	2013	보수부 박리	0.50	2.50		1.25	㎡	1.00					2
8	2014	백태	1.00	15.00		15.00	㎡	1.00					2
9	2011	파손	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
10	2011	백태	0.20	1.00		0.20	㎡	1.00					2
11	2014	백태	1.00	7.00		7.00	㎡	1.00					2
12	2016	랑상균열 및 백태	2.00	8.00		16.00	㎡	1.00					2
13	2016	백태	1.00	5.00		5.00	㎡	1.00					2
14	2016	백태	0.10	5.00		0.50	㎡	1.00					2
15	2019	박리	0.20	6.00		1.20	㎡	1.00				신규	2
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	060

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

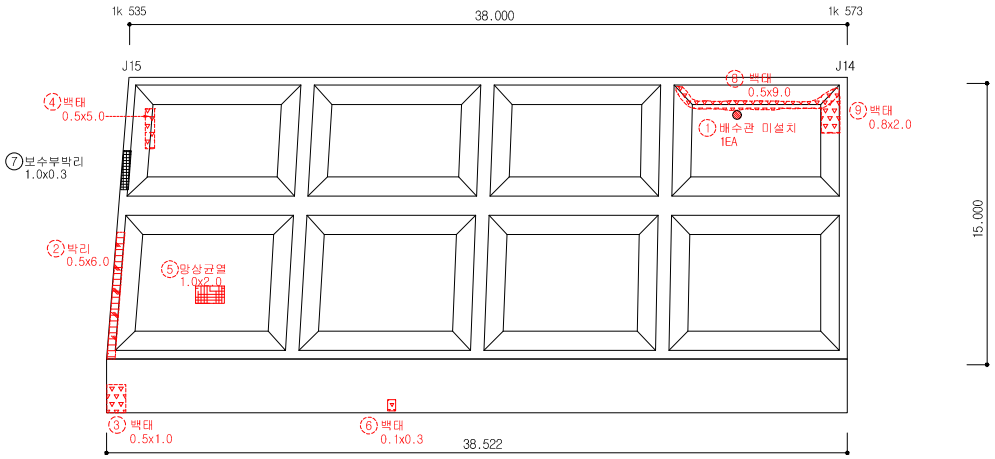


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수관 미설치				1.00	EA	1.00					1
2	2011	박리	0.50	6.00		3.00	㎡	1.00					2
3	2011	백태	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					2
4	2011	백태	0.50	5.00		2.50	㎡	1.00					2
5	2016	망상균열 및 백태	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					2
6	2016	백태	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00					2
7	2019	보수부 박리	1.00	0.30		0.30	㎡	1.00				신규	2
8	2011	백태	0.50	9.00		4.50	㎡	1.00					2
9	2011	백태	0.80	2.00		1.60	㎡	1.00					2
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	061

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

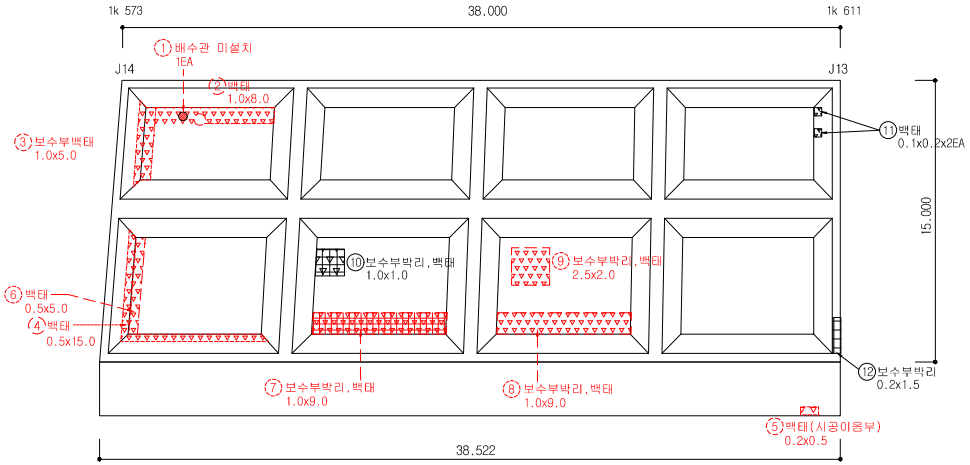


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (mm)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수관 미설치				1.00	EA	1.00					1
2	2014	백태	1.00	8.00		8.00	㎡	1.00					2
3	2011	보수부 백태	1.00	5.00		5.00	㎡	1.00					2
4	2014	백태	0.50	15.00		7.50	㎡	1.00					2
5	2011	백태	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
6	2016	백태	0.50	5.00		2.50	㎡	1.00					2
7	2016	보수부 박리 및 백태	1.00	9.00		9.00	㎡	1.00					2
8	2016	보수부 박리 및 백태	1.00	9.00		9.00	㎡	1.00					2
9	2016	보수부 박리 및 백태	2.50	2.00		5.00	㎡	1.00					2
10	2019	보수부 박리 및 백태	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00				신규	2
11	2019	백태	0.10	0.20		0.04	㎡	2.00				신규	2
12	2019	보수부박리	0.20	1.50		0.30	㎡	1.00				신규	2
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	062

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면



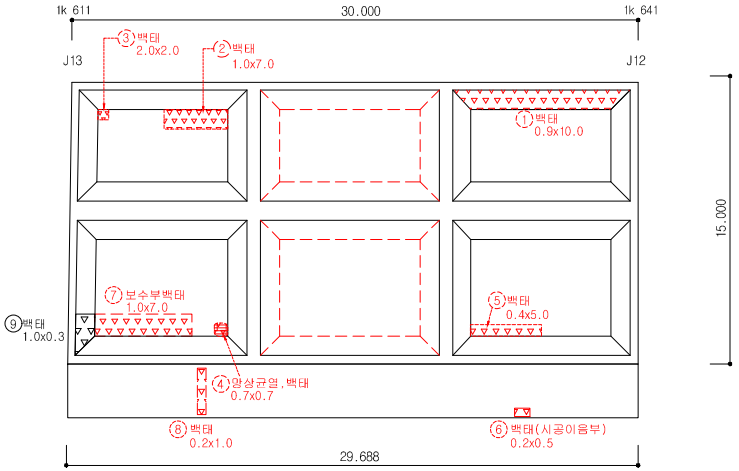손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.90	10.00		9.00	㎡	1.00					2
2	2014	백태	1.00	7.00		7.00	㎡	1.00					2
3	2013	백태	2.00	2.00		4.00	㎡	1.00					2
4	2011	망상균열, 백태	0.70	0.70		0.49	㎡	1.00					2
5	2011	백태	0.40	5.00		2.00	㎡	1.00					2
6	2016	백태	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
7	2016	보수부 백태	1.00	7.00		7.00	㎡	1.00					2
8	2016	백태	0.20	1.00		0.20	㎡	1.00					2
9	2019	백태	1.00	0.30		0.30	㎡	1.00				신규	2
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	063

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

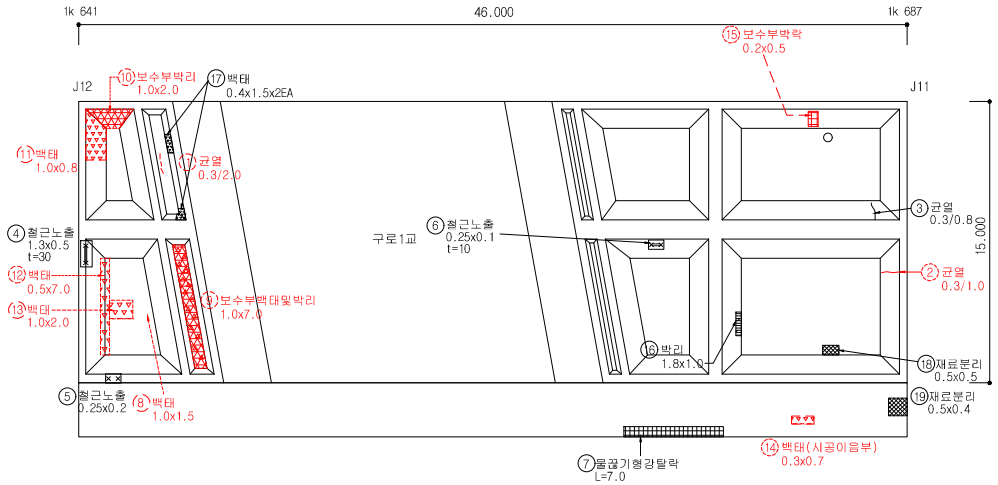


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2013	균열	0.30	2.00		2.00	m	1.00					1
2	2016	균열	0.30	1.00		1.00	m	1.00					1
3	2019	균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00				신규	1
4	2019	철근노출	1.30	0.50		0.65	㎡	1.00				신규	1
5	2019	철근노출	0.25	0.20		0.05	㎡	1.00				신규	1
6	2019	철근노출	0.25	0.10		0.03	㎡	1.00				신규	1
7	2019	물끊기형강탈락		7.00		7.00	m	1.00				신규	1
8	2014	백태	1.00	1.50		1.50	㎡	1.00					2
9	2011	보수부 백태 및 박리	1.00	7.00		7.00	㎡	1.00					2
10	2013	보수부 박리	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					2
11	2014	백태	1.00	0.80		0.80	㎡	1.00					2
12	2011	백태	0.50	7.00		3.50	㎡	1.00					2
13	2014	백태	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					2
14	2016	백태	0.30	0.70		0.21	㎡	1.00					2
15	2016	보수부 박락	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
16	2019	박리	1.80	1.00		1.80	㎡	1.00				신규	2
17	2019	백태	0.40	1.50		1.20	㎡	2.00				신규	2
18	2019	재료분리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00				신규	2
19	2019	재료분리	0.50	0.40		0.20	㎡	1.00				신규	2
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	064

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

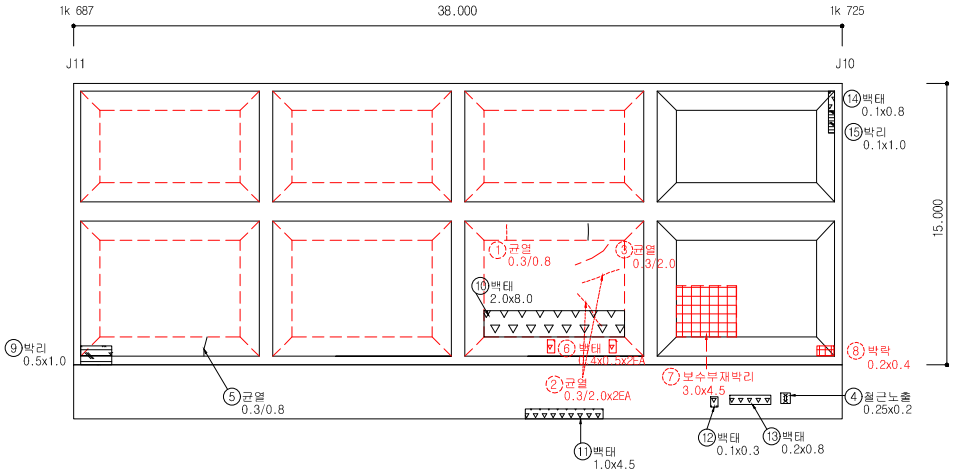


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00					1
2	2011	균열	0.30	2.00		4.00	m	2.00					1
3	2016	균열	0.30	2.00		2.00	m	1.00					1
4	2019	철근노출	0.25	0.20		0.05	㎡	1.00				신규	1
5	2019	균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00				신규	1
6	2016	백태	0.40	0.50		0.40	㎡	2.00					2
7	2016	보수부 재박리	3.00	4.50		13.50	㎡	1.00					2
8	2016	박락	0.20	0.40		0.08	㎡	1.00					2
9	2019	박리	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00				신규	2
10	2019	백태	2.00	8.00		16.00	㎡	1.00				신규	2
11	2019	백태	1.00	4.50		4.50	㎡	1.00				신규	2
12	2019	백태	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00				신규	2
13	2019	백태	0.20	0.80		0.16	㎡	1.00				신규	2
14	2019	백태	0.10	0.80		0.08	㎡	1.00				신규	2
15	2019	박리	0.10	1.00		0.10	㎡	1.00				신규	2
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	065

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

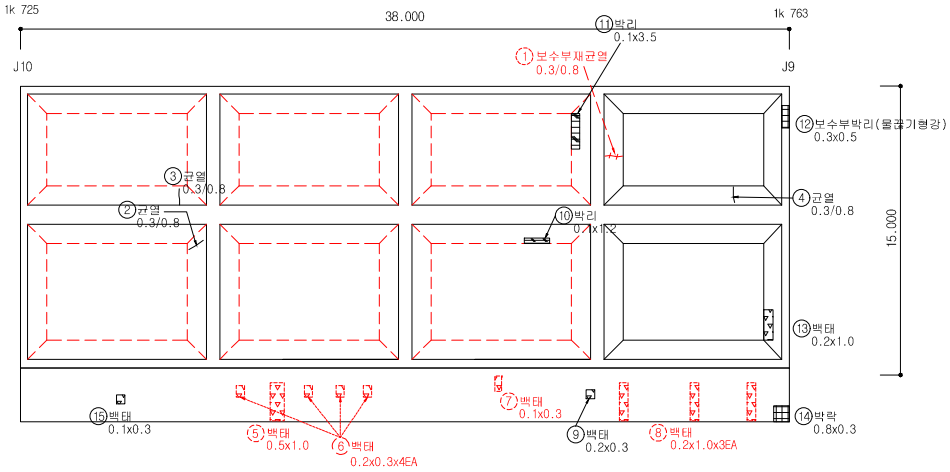


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	보수부 재균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00					1
2	2019	균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00				신규	1
3	2019	균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00				신규	1
4	2019	균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00				신규	1
5	2011	백태	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					2
6	2014	백태	0.20	0.30		0.24	㎡	4.00					2
7	2011	백태	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00					2
8	2011	백태	0.20	1.00		0.60	㎡	3.00					2
9	2019	백태	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00				신규	2
10	2019	박리	0.10	1.20		0.12	㎡	1.00				신규	2
11	2019	박리	0.10	3.50		0.35	㎡	1.00				신규	2
12	2019	보수부박리	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00				신규	2
13	2019	백태	0.20	1.00		0.20	㎡	1.00				신규	2
14	2019	박락	0.80	0.30		0.24	㎡	1.00				신규	2
15	2019	백태	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00				신규	2
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	066

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

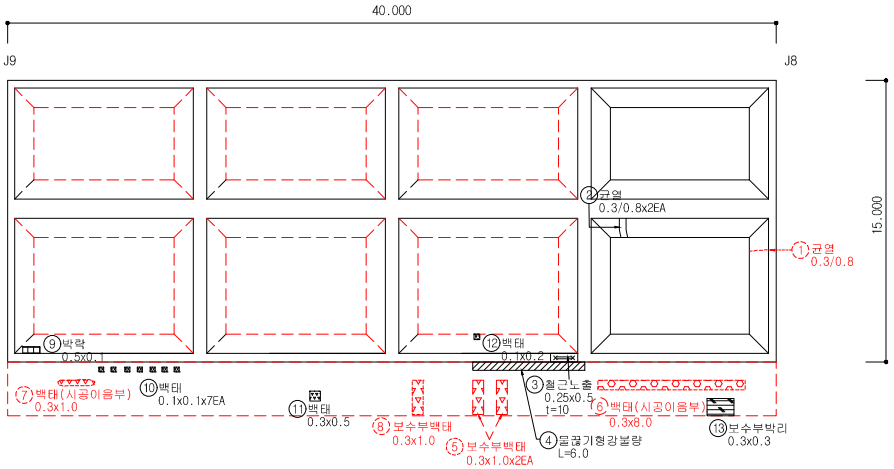


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00					1
2	2019	균열	0.30	0.80		1.60	m	2.00				신규	1
3	2019	철근노출	0.25	0.50		0.13	㎡	1.00				신규	1
4	2019	물끊기형강볼량		6.00		6.00	m	1.00				신규	1
5	2016	보수부 백태	0.30	1.00		0.60	㎡	2.00					2
6	2014	백태	0.30	8.00		2.40	㎡	1.00					2
7	2011	백태	0.30	1.00		1.00	m	1.00					2
8	2011	보수부 백태	0.30	1.00		0.30	㎡	1.00					2
9	2019	박락	0.50	0.10		0.05	㎡	1.00				신규	2
10	2019	백태	0.10	0.10		0.07	㎡	7.00				신규	2
11	2019	백태	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00				신규	2
12	2019	백태	0.10	0.20		0.02	㎡	1.00				신규	2
13	2019	보수부박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00				신규	2
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	얼회	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	067

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면



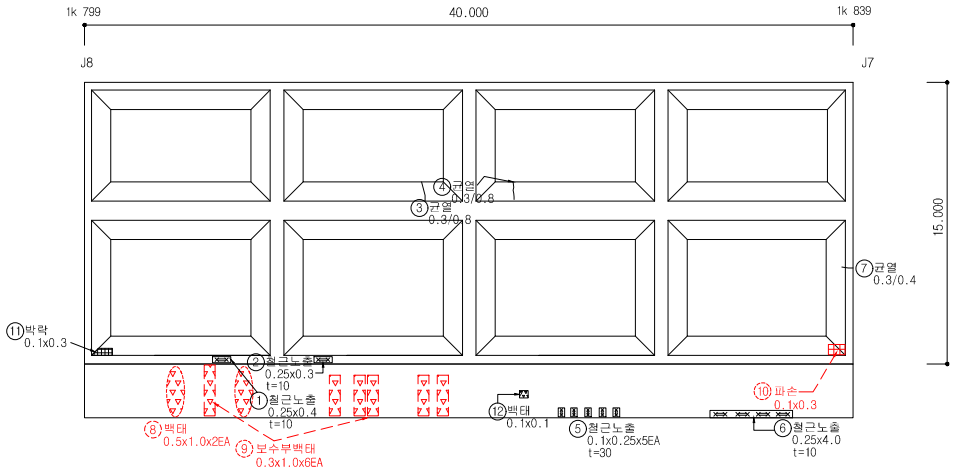손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	철근노출	0.25	0.40		0.10	㎡	1.00				신규	1
2	2019	철근노출	0.25	0.30		0.08	㎡	1.00				신규	1
3	2019	균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00				신규	1
4	2019	균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00				신규	1
5	2019	철근노출	0.10	0.25		0.13	㎡	5.00				신규	1
6	2019	철근노출	0.25	4.00		1.00	㎡	1.00				신규	1
7	2019	균열	0.30	0.40		0.40	m	1.00				신규	1
8	2011	백태	0.50	1.00		1.00	㎡	2.00					2
9	2016	보수부 백태	0.30	1.00		1.80	㎡	6.00					2
10	2016	파손	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00					2
11	2019	박락	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00				신규	2
12	2019	백태	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00				신규	2
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	068

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

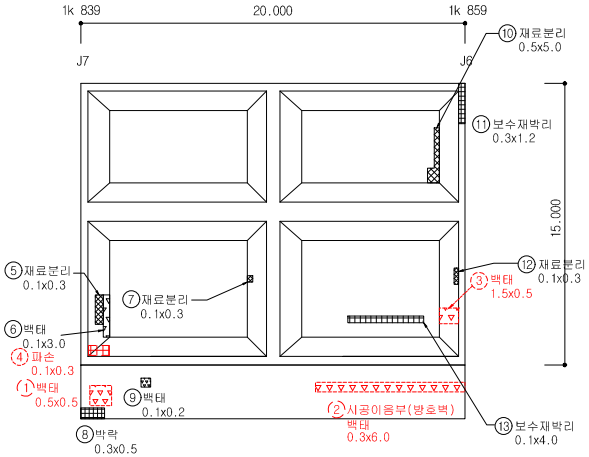


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	백태	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
2	2014	시공이음부(방호벽)백태	0.30	6.00		1.80	㎡	1.00					2
3	2011	백태	1.50	0.50		0.75	㎡	1.00					2
4	2016	파손	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00					2
5	2019	재료분리	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00				신규	2
6	2019	백태	0.10	3.00		0.30	㎡	1.00				신규	2
7	2019	재료분리	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00				신규	2
8	2019	박락	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00				신규	2
9	2019	백태	0.10	0.20		0.02	㎡	1.00				신규	2
10	2019	재료분리	0.50	5.00		2.50	㎡	1.00				신규	2
11	2019	보수재박리	0.30	1.20		0.36	㎡	1.00				신규	2
12	2019	재료분리	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00				신규	2
13	2019	보수재박리	0.10	4.00		0.40	㎡	1.00				신규	2
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	069

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

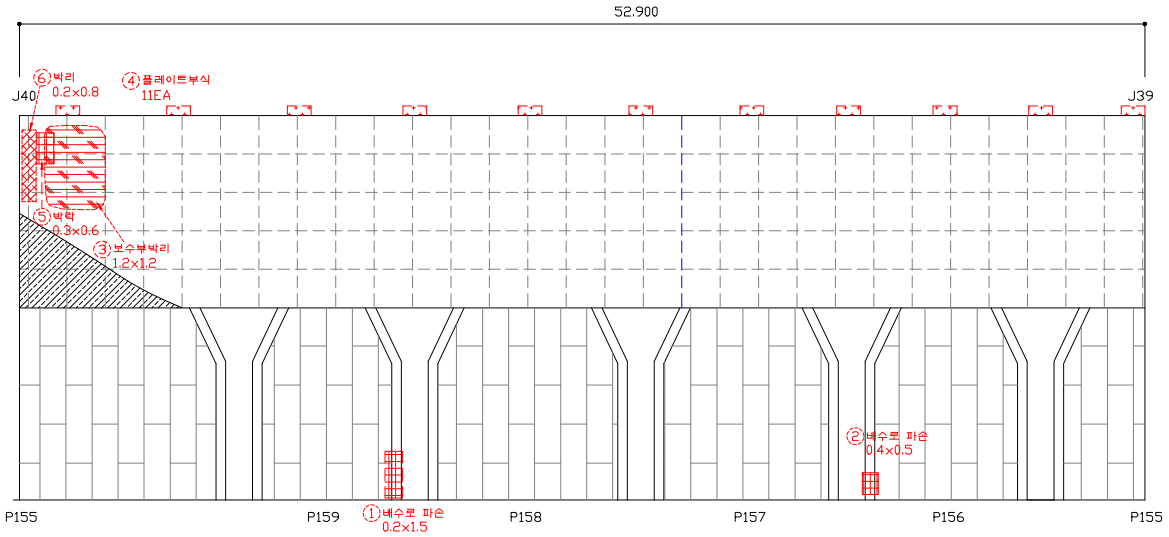


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수로파손	0.20	1.50		0.30	㎡	1.00					1
2	2016	배수로파손	0.40	0.50		0.20	㎡	1.00					1
3	2011	보수부박리	1.20	1.20		1.44	㎡	1.00					2
4	2011	플레이트부식	-	-		11.00	EA	11.00					2
5	2016	박락	0.30	0.60		0.18	㎡	1.00					2
6	2011	박리	0.20	0.80		0.16	㎡	1.00					2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	070

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

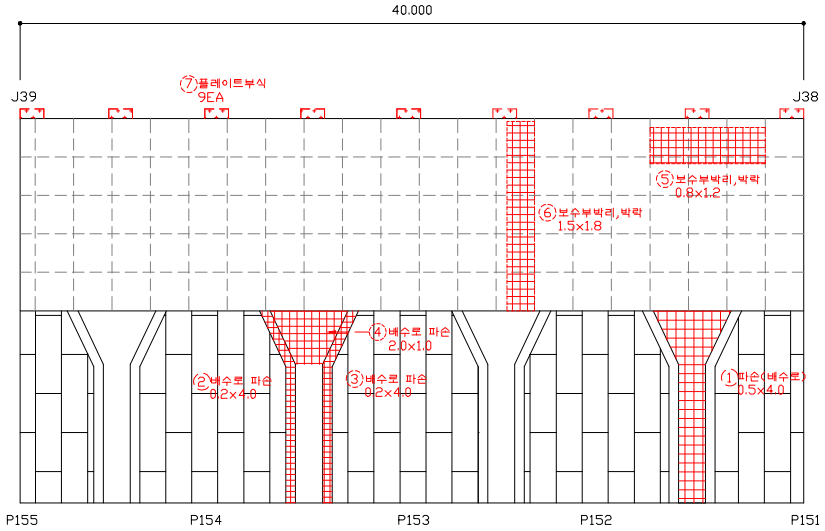


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	파손(배수로)	0.50	4.00		2.00	㎡	1.00					1
2	2014	배수로파손	0.20	4.00		0.80	㎡	1.00					1
3	2011	배수로파손	0.20	4.00		0.80	㎡	1.00					1
4	2016	배수로파손	2.00	1.00		2.00	㎡	1.00					1
5	2011	보수부박리,박락	0.80	1.20		0.96	㎡	1.00					2
6	2011	보수부박리,박락	1.50	1.80		2.70	㎡	1.00					2
7	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	071

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

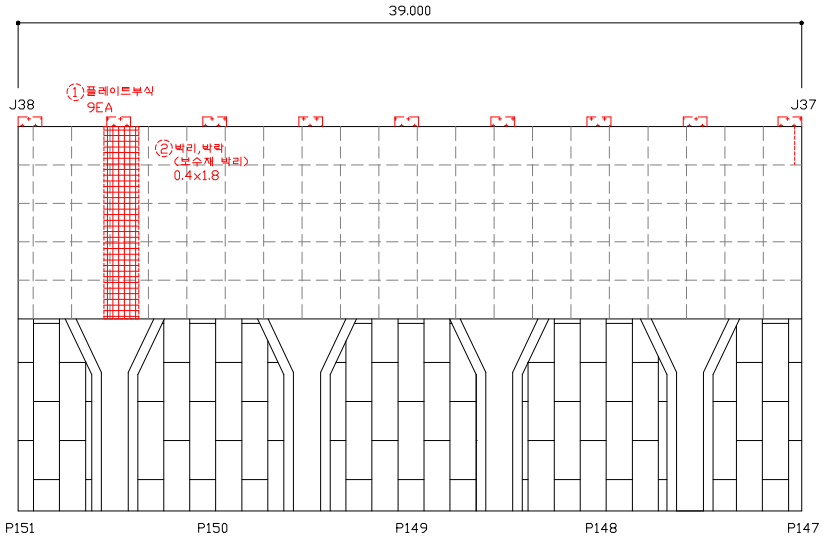


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
2	2011	박리,박락(보수재박리)	0.40	1.80		0.72	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	072

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

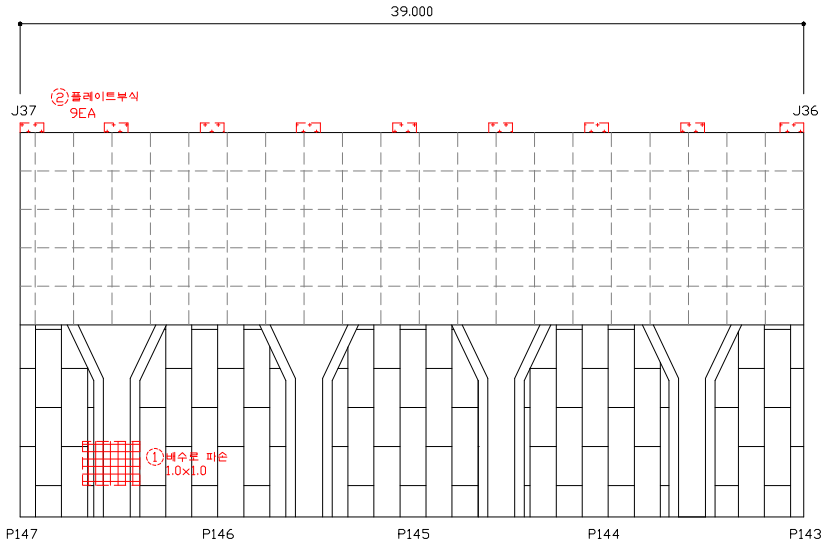


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수로파손	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00					1
2	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	073

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

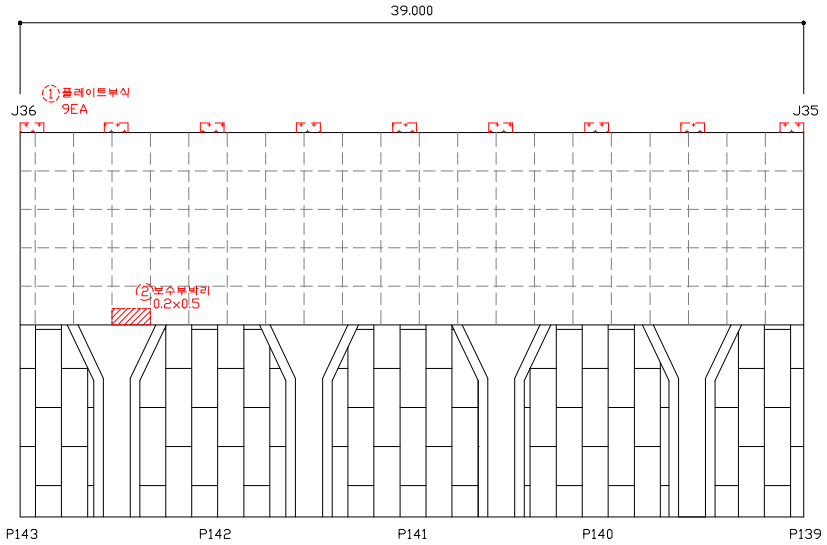


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
2	2014	보수부박리	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	074

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

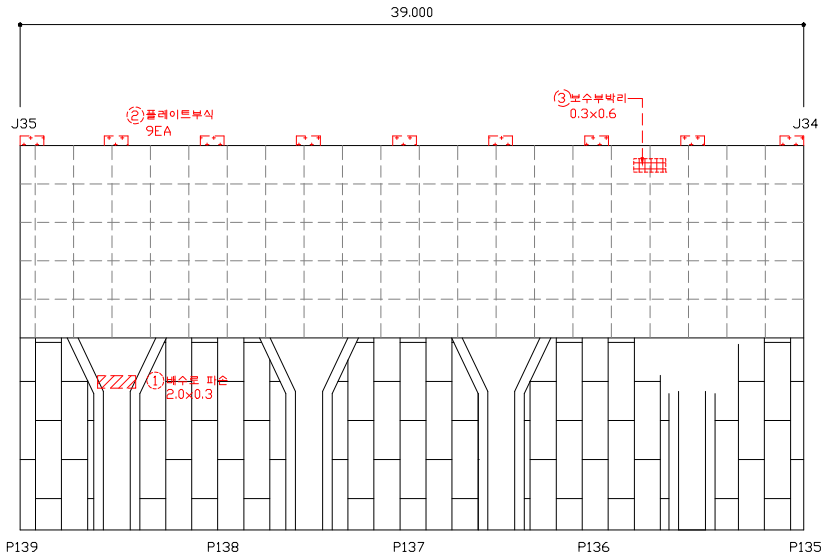


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수로파손	2.00	0.30		0.60	㎡	1.00					1
2	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
3	2014	보수부박리	0.30	0.60		0.18	㎡	1.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	075

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

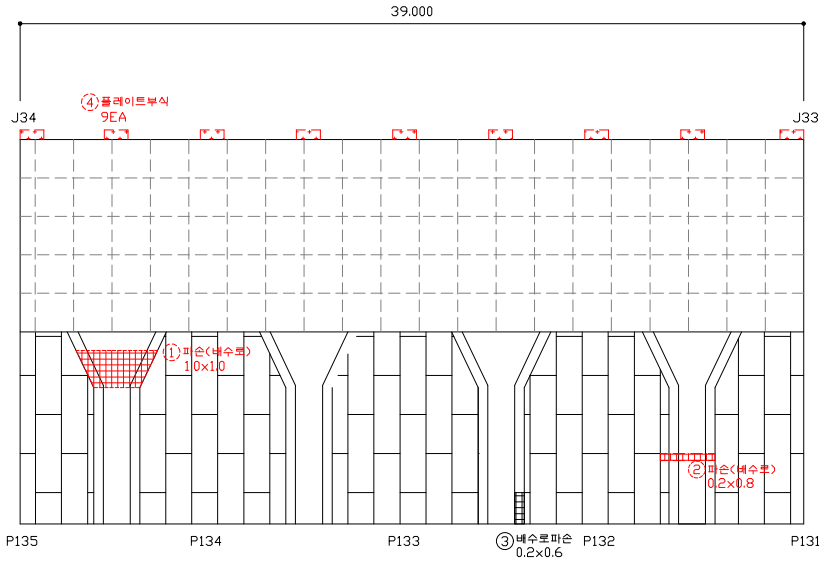


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	파손	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00					1
2	2016	파손	0.20	0.80		0.16	㎡	1.00					1
3	2019	배수로파손	0.20	0.60		0.12	㎡	1.00				신규	1
4	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	076

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

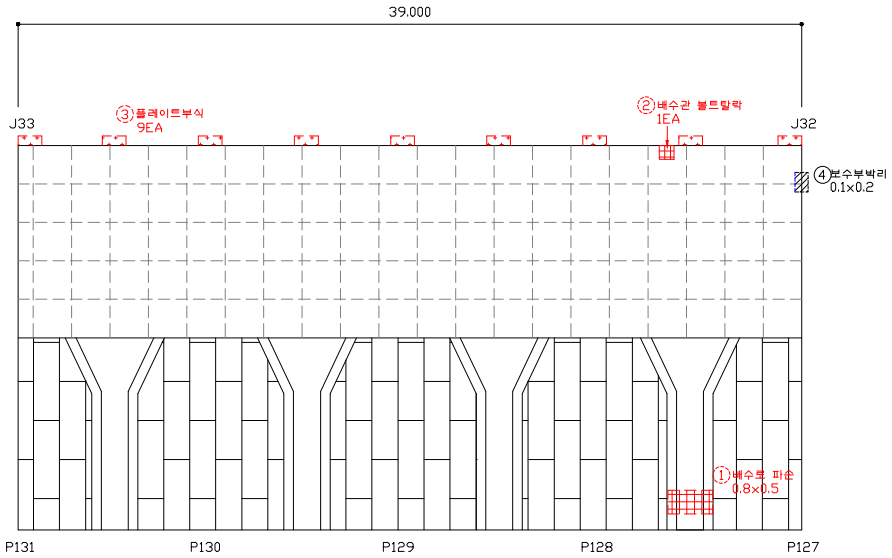


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수로파손	0.80	0.50		0.40	㎡	1.00					1
2	2016	배수관볼트탈락				1.00	EA	1.00					1
3	2011	플레이트부식				9.00	EA	9.00					2
4	2019	보수부박리	0.10	0.20		0.02	㎡	1.00				신규	2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	077

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

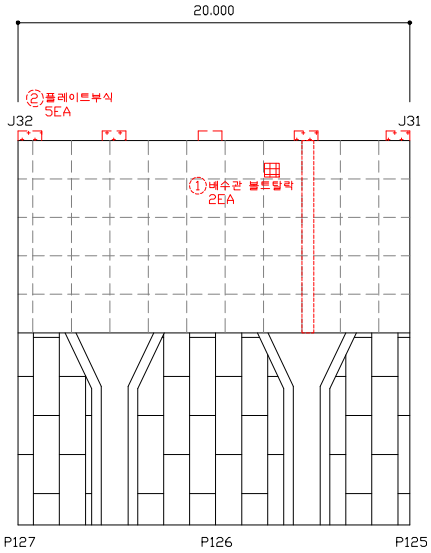


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수관볼트탈락				2.00	EA	2.00					1
2	2011	플레이트부식				5.00	EA	5.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	078

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

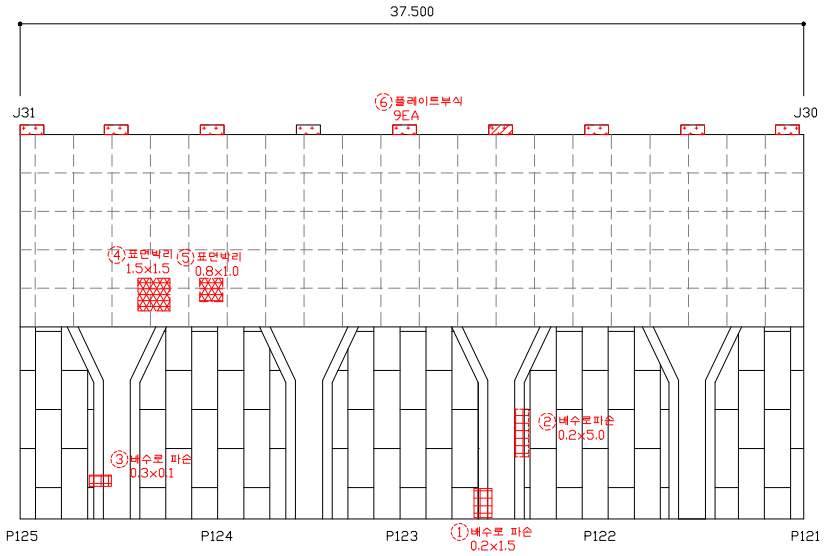


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수로파손	0.20	1.50		0.30	㎡	1.00					1
2	2016	배수로파손	0.20	5.00		1.00	㎡	1.00					1
3	2016	배수로파손	0.30	0.10		0.03	㎡	1.00					1
4	2018	표면박리	1.50	1.50		3.00	㎡	1.00					2
5	2018	표면박리	0.80	1.00		0.80	㎡	1.00					2
6	2018	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	079

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

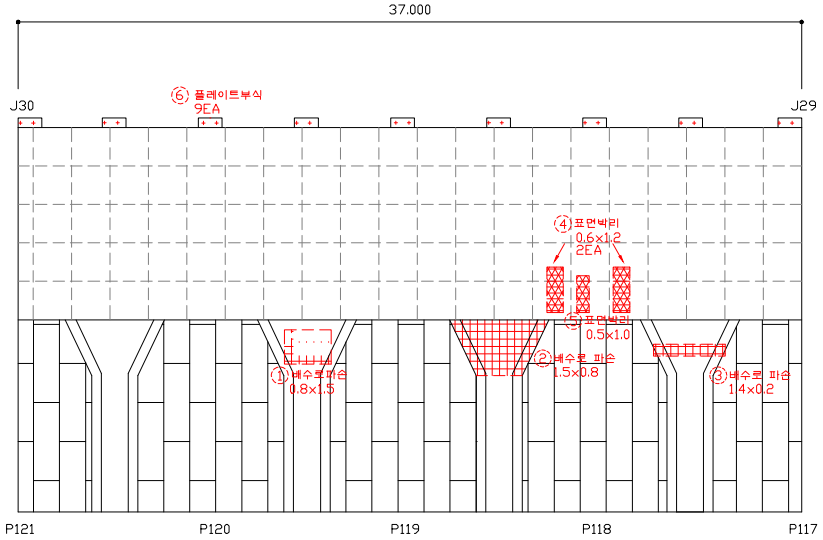


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	배수로파손	0.80	1.50		1.20	㎡	1.00					1
2	2016	배수로파손	1.50	0.80		1.20	㎡	1.00					1
3	2016	배수로파손	1.20	0.20		0.24	㎡	1.00					1
4	2018	표면박리	0.60	1.20		1.44	㎡	2.00					2
5	2018	표면박리	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					2
6	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	080

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

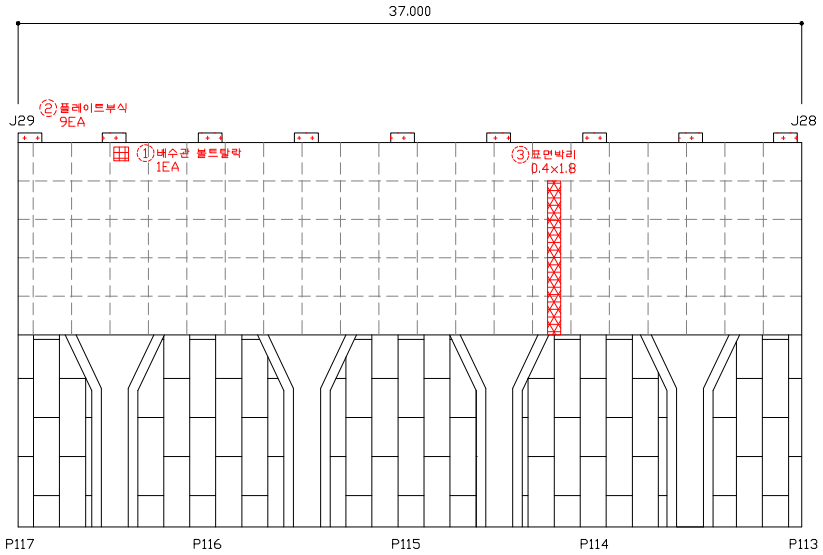


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수관볼트탈락	-	-		1.00	EA	1.00					1
2	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
3	2016	표면박리	0.40	1.80		0.72	㎡	1.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	081

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

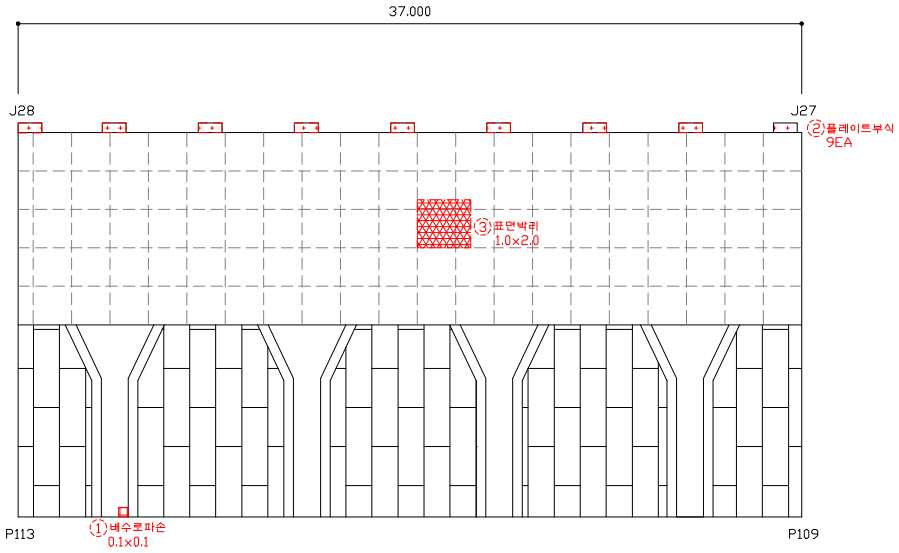


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	배수로파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					1
2	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
3	2018	표면박리	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	082

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

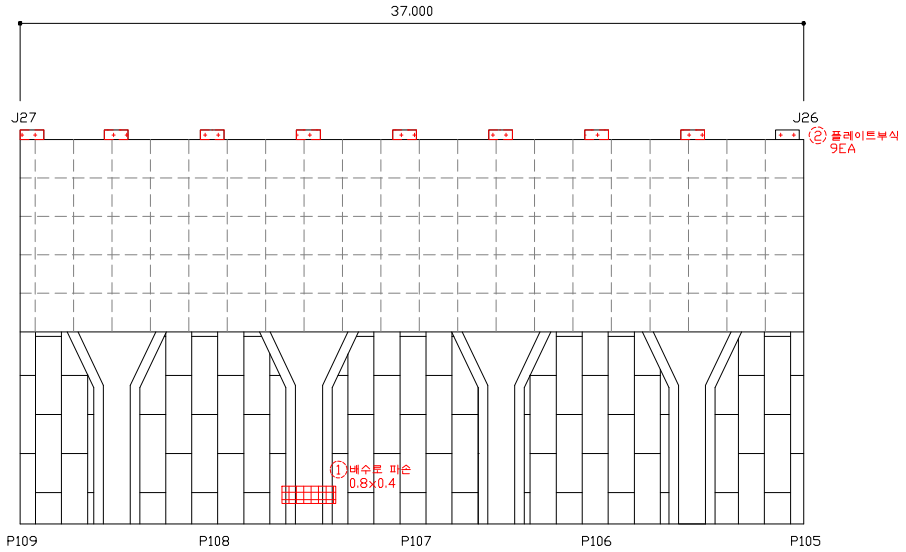


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수로파손	0.80	0.40		0.32	㎡	1.00					1
2	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	083

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

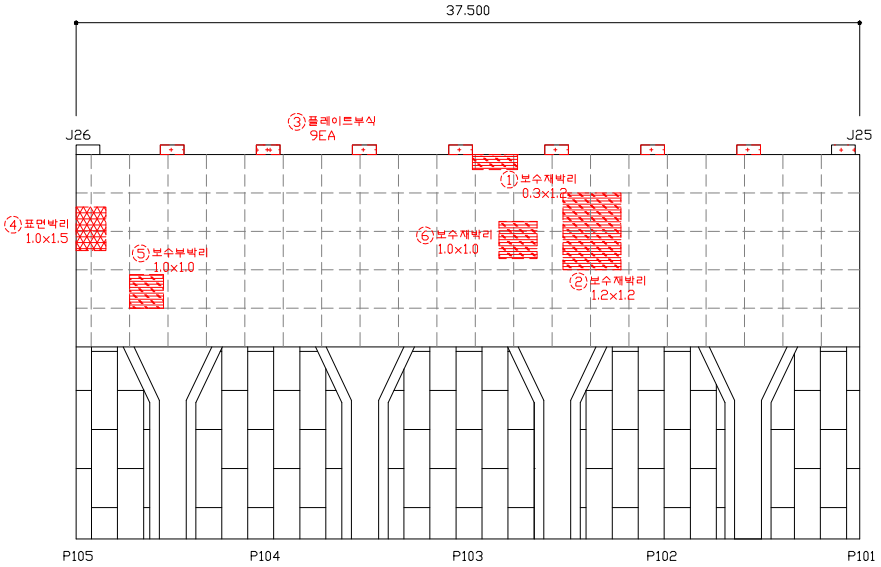


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	보수재박리	0.30	1.20		0.36	㎡	1.00					2
2	2018	보수재박리	1.20	1.20		2.40	㎡	1.00					2
3	2018	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
4	2018	표면박리	1.00	1.50		1.50	㎡	1.00					2
5	2018	보수부박리	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00					2
6	2018	보수재박리	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00					2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	084

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

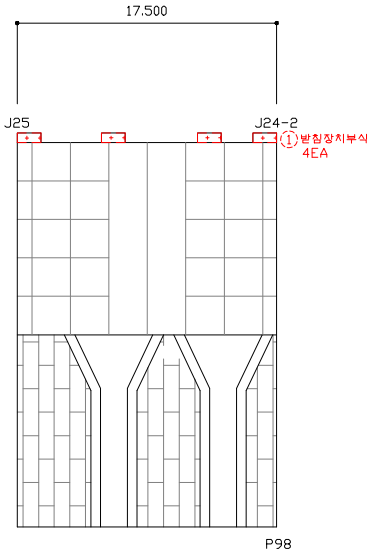


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	받침장치부식	-	-		4.00	EA	4.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락,박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	085

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

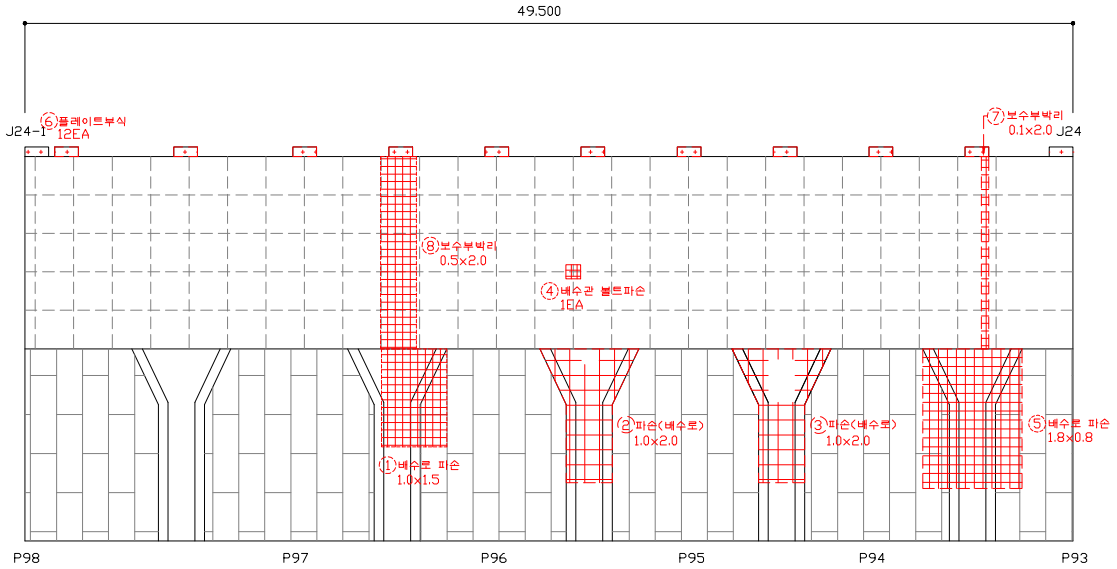


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	배수로파손	1.00	1.50		1.50	㎡	1.00					1
2	2014	파손(배수로)	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					1
3	2014	파손(배수로)	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					1
4	2016	배수관볼트파손	-	-		1.00	EA	1.00					1
5	2016	배수로파손	1.80	0.80		1.44	㎡	1.00					1
6	2011	플레이트부식	-	-		12.00	EA	12.00					2
7	2018	보수부박리	0.10	2.00		0.20	㎡	1.00					2
8	2011	보수부박리	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	086

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

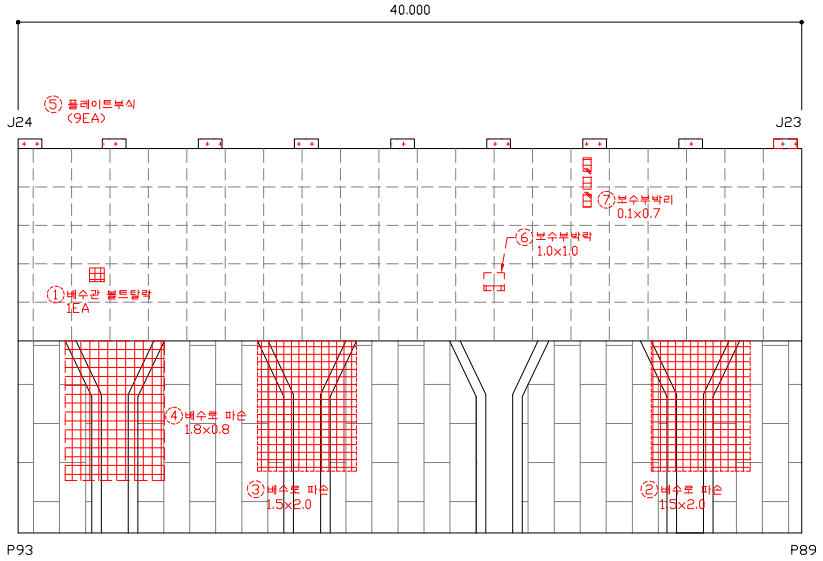


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수관볼트탈락	-	-		1.00	EA	1.00					1
2	2011	배수로파손	1.50	2.00		3.00	㎡	1.00					1
3	2011	배수로파손	1.50	2.00		3.00	㎡	1.00					1
4	2016	배수로파손	1.80	0.80		1.44	㎡	1.00					1
5	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
6	2018	보수부박락	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00					2
7	2016	보수부박리	0.10	0.70		0.07	㎡	1.00					2
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	087

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

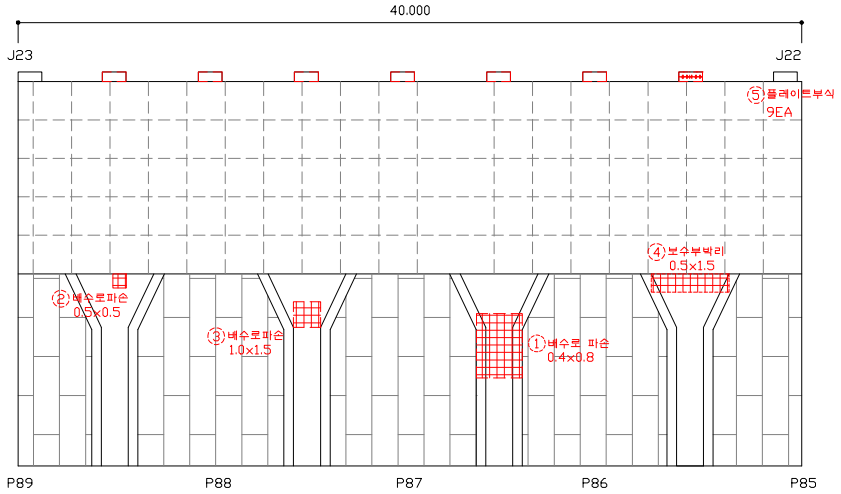


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수로파손	0.40	0.80		0.32	㎡	1.00					1
2	2018	배수로파손	0.50	0.50		1.00	㎡	1.00					1
3	2018	배수로파손	1.00	1.50		1.50	㎡	1.00					1
4	2018	보수부박리	0.50	1.50		0.75	㎡	1.00					2
5	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	088

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

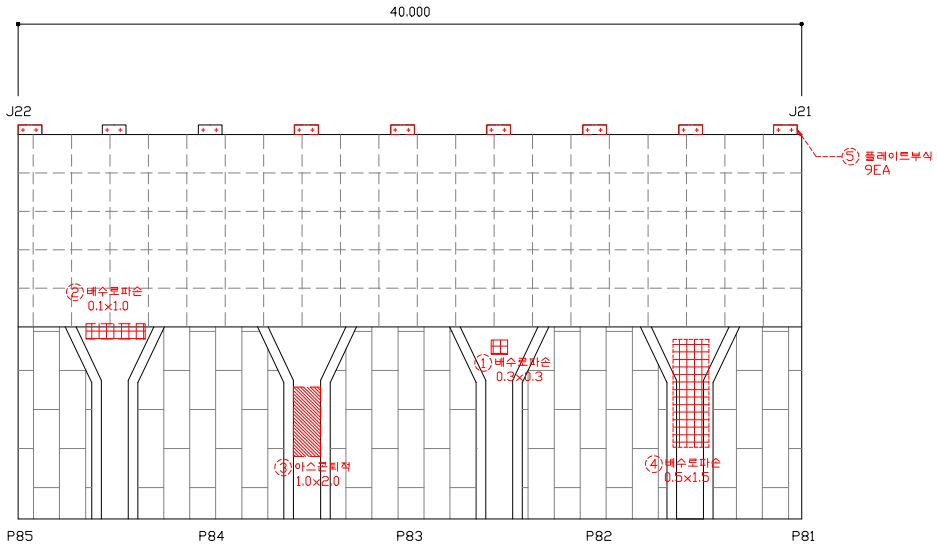


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	배수로파손	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					1
2	2018	배수로파손	0.10	1.00		0.10	㎡	1.00					1
3	2018	아스콘탈적	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					1
4	2011	배수로파손	0.50	1.50		0.75	㎡	1.00					1
5	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	089

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

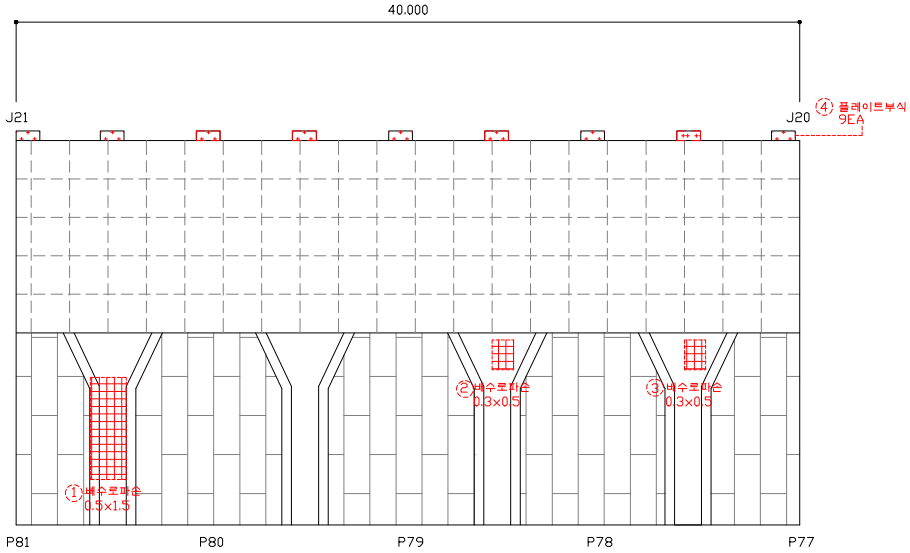


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	배수로파손	0.50	1.50		0.75	㎡	1.00					1
2	2011	배수로파손	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					1
3	2011	배수로파손	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					1
4	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	090

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

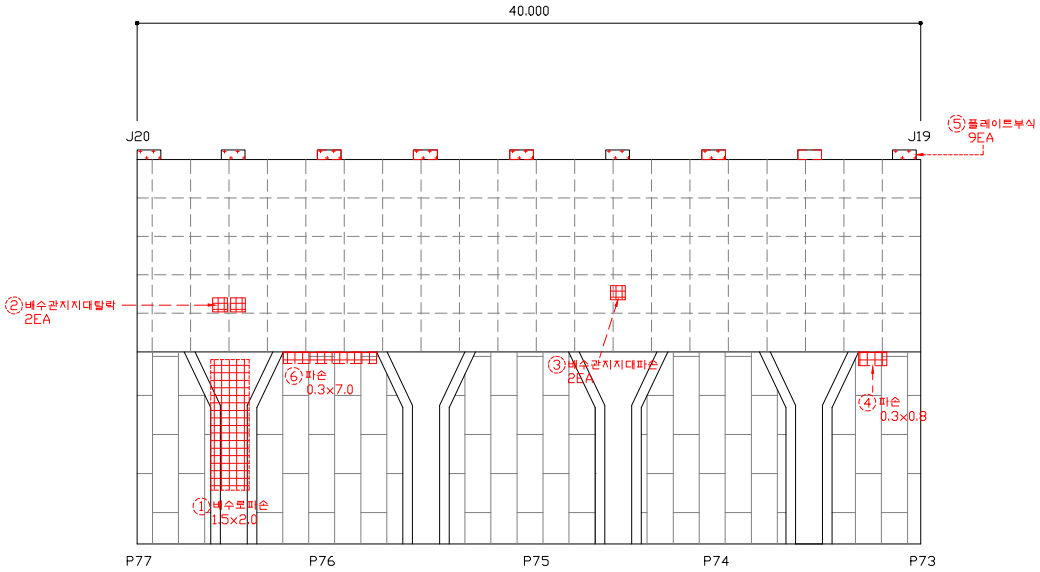


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	배수로파손	1.50	2.00		3.00	㎡	1.00					1
2	2016	배수관지지대탈락	-	-		2.00	EA	2.00					1
3	2016	배수관지지대파손	-	-		2.00	EA	2.00					1
4	2018	파손	0.30	0.80		0.24	㎡	1.00					2
5	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
6	2018	파손	0.30	7.00		2.10	㎡	1.00					2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	091

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

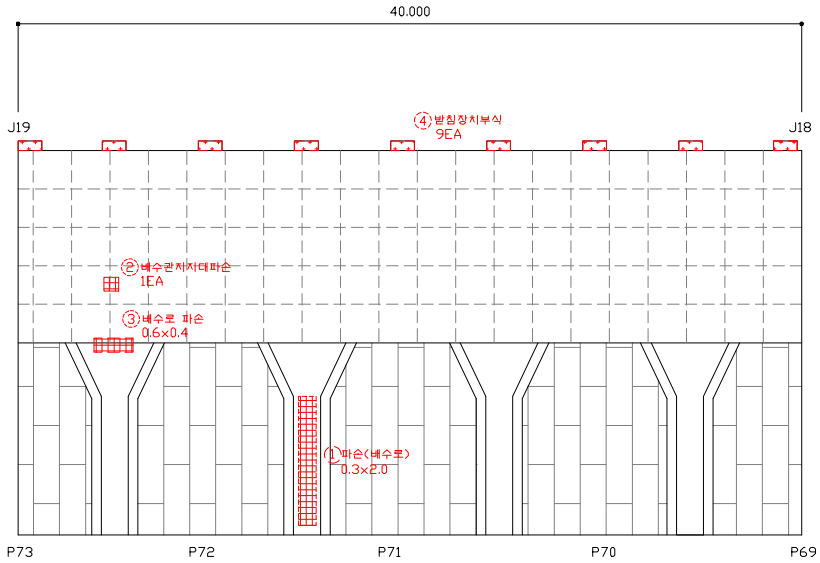


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	파손(배수로)	0.30	2.00		0.60	㎡	1.00					1
2	2016	배수관지지대파손	-	-		1.00	EA	1.00					1
3	2016	배수로파손	0.60	0.40		0.24	㎡	1.00					1
4	2018	받침장치부식	-	-		9.00	㎡	9.00					2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	092

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

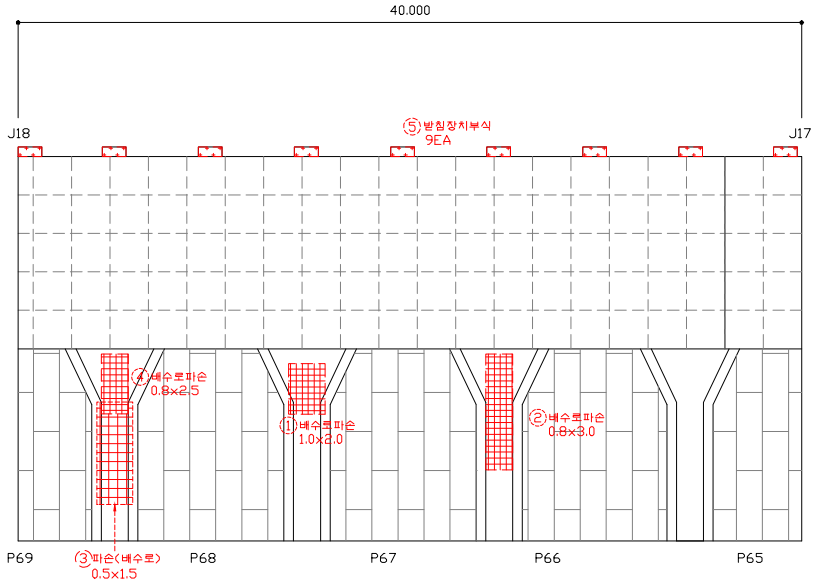


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	배수로파손	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					1
2	2018	배수로파손	0.80	3.00		2.40	㎡	1.00					1
3	2014	파손(배수로)	0.50	1.50		0.75	㎡	1.00					1
4	2018	배수로파손	0.80	2.50		2.00	㎡	1.00					1
5	2018	방침장치부식	-	-		9.00	㎡	9.00					2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	093

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

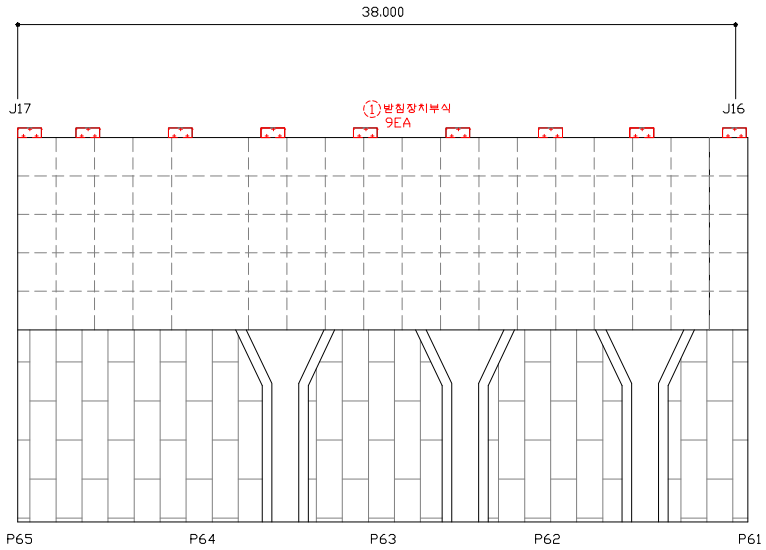


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	받침장치부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	094

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

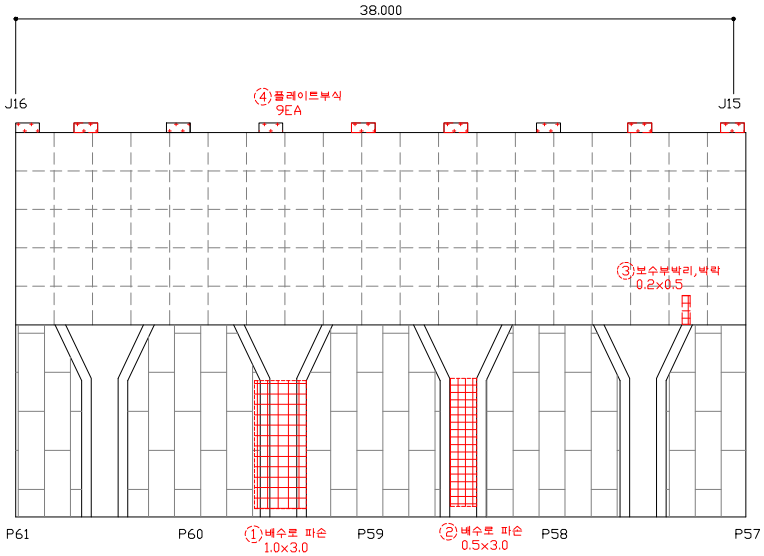


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	배수로파손	1.00	3.00		3.00	㎡	1.00					1
2	2011	배수로파손	0.50	3.00		1.50	㎡	1.00					1
3	2018	보수부박리,박락	0.20	0.50		1.00	㎡	1.00					2
4	2018	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	095

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

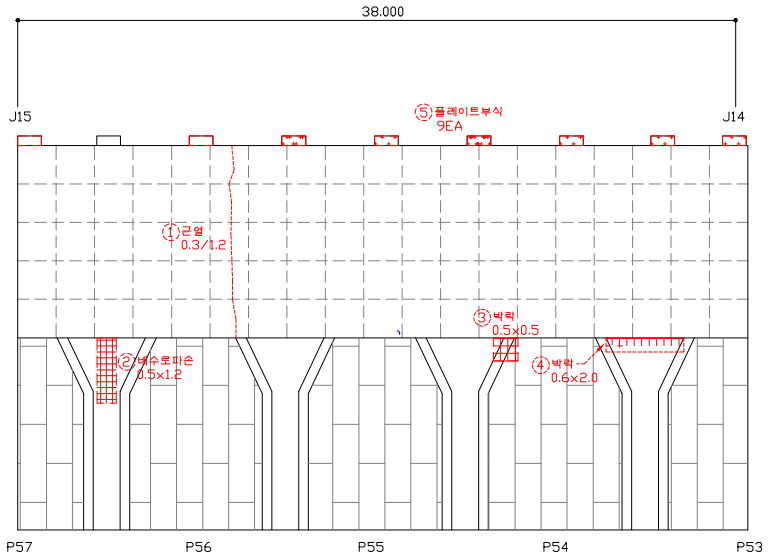


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	균열	0.30	1.20		1.20	m	1.00					1
2	2018	배수로파손	0.50	1.20		0.60	㎡	1.00					1
3	2018	박락	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
4	2018	박락	0.60	2.00		1.20	㎡	1.00					2
5	2018	플레이트부식				9.00	EA	9.00					2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	096

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

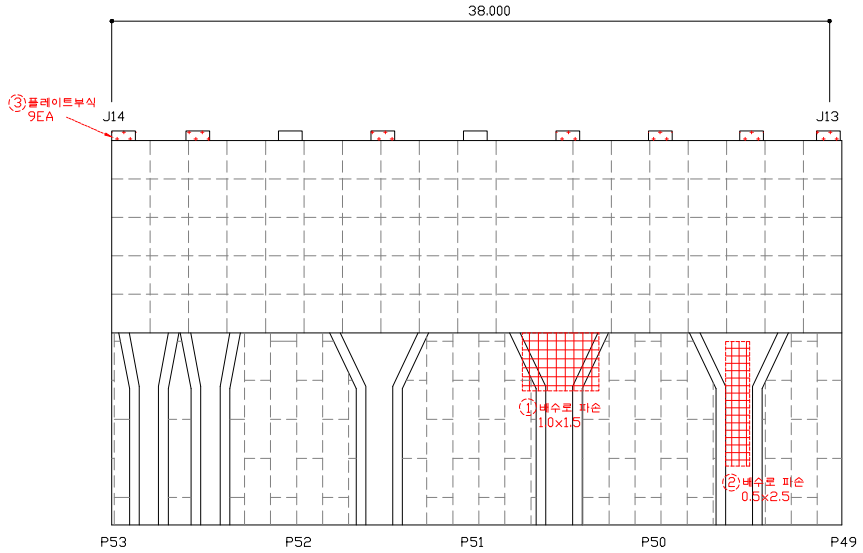


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	배수로파손	1.00	1.50		1.50	㎡	1.00					1
2	2011	배수로파손	0.50	2.50		1.25	㎡	1.00					1
3	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	097

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

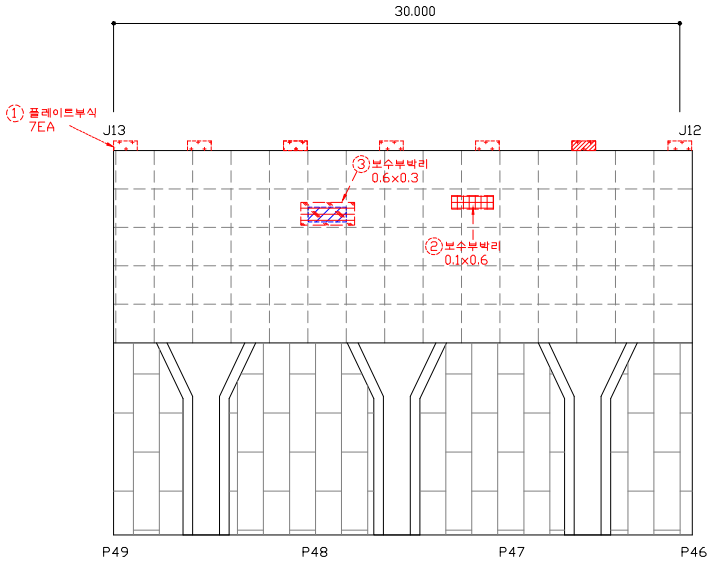


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트부식	-	-		7.00	EA	7.00					2
2	2016	보수부박리	0.10	0.60		0.06	㎡	1.00					2
3	2018	보수부박리	0.60	0.30		0.18	㎡	1.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	098

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

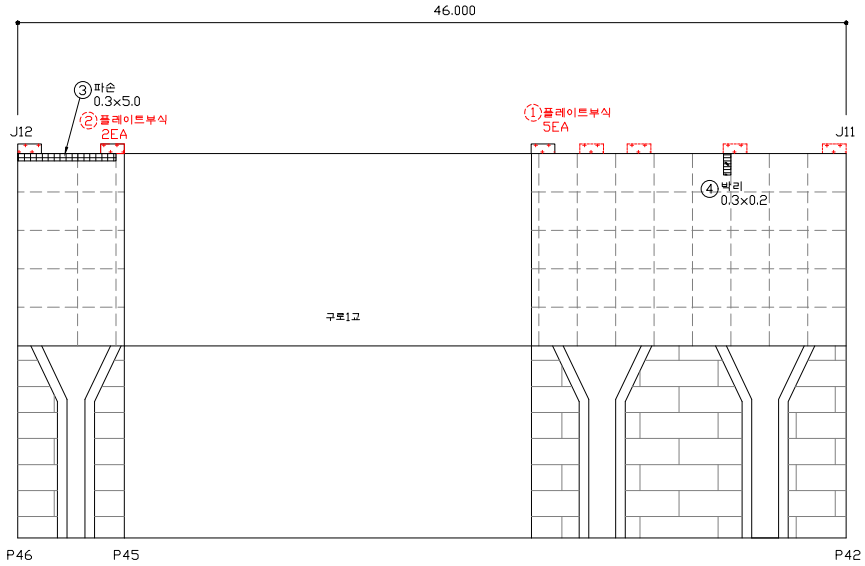


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트부식				5.00	EA	5.00					2
2	2018	플레이트부식	-	-		2.00	EA	2.00					2
3	2019	파손	0.30	5.00		1.50	㎡	1.00				신규	2
4	2019	박리	0.30	0.20		0.06	㎡	1.00				신규	2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	099

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

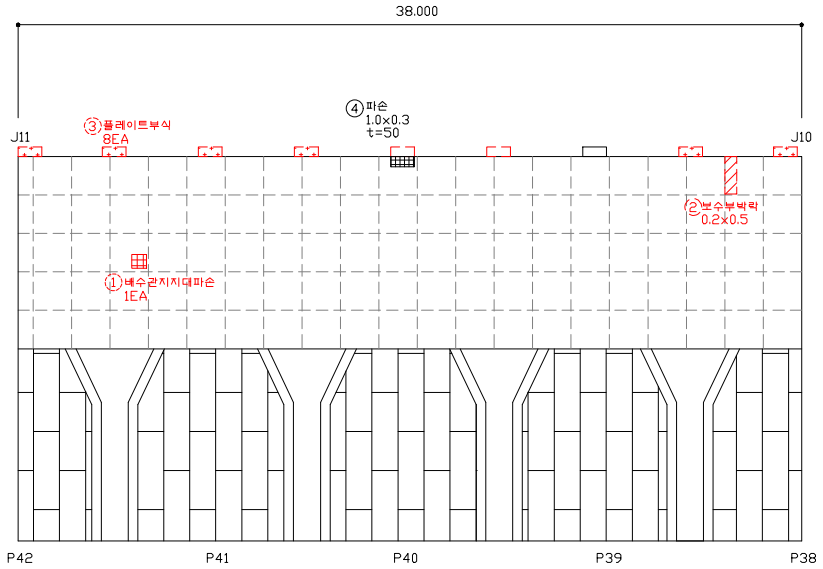


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수관지지대파손	-	-		1.00	EA	1.00					1
2	2018	보수부박락	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
3	2018	플레이트부식	-	-		8.00	EA	8.00					2
4	2019	파손	1.00	0.30		0.30	㎡	1.00				신규	2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	100

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

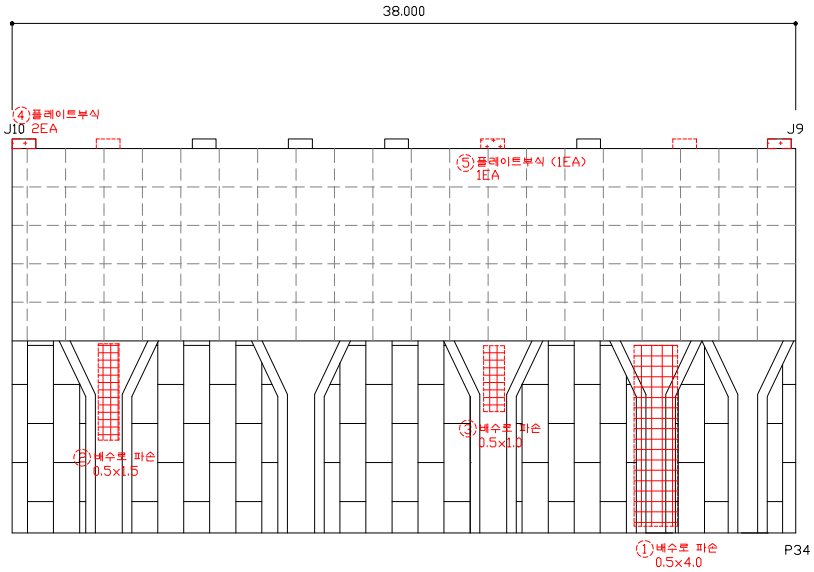


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	배수로파손	0.50	4.00		2.00	㎡	1.00					1
2	2011	배수로파손	0.50	1.50		0.75	㎡	1.00					1
3	2011	배수로파손	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					1
4	2018	플레이트부식	-	-		2.00	EA	2.00					2
5	2011	플레이트부식	-	-		1.00	EA	1.00					2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	101

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

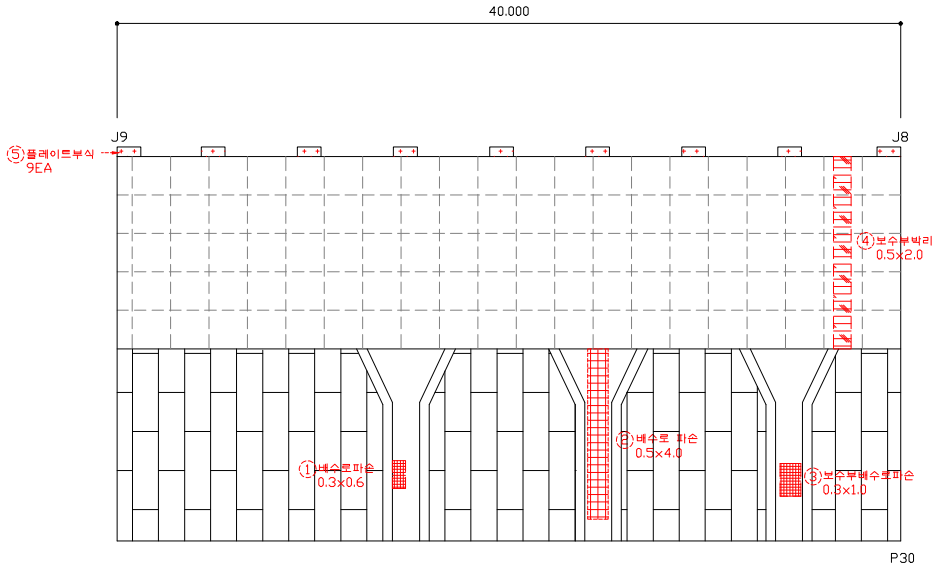


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	배수로파손	0.30	0.60		0.18	㎡	1.00					1
2	2011	배수로파손	0.50	4.00		2.00	㎡	1.00					1
3	2018	보수부배수로파손	0.30	1.00		0.30	㎡	1.00					1
4	2016	보수부박리	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
5	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	102

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

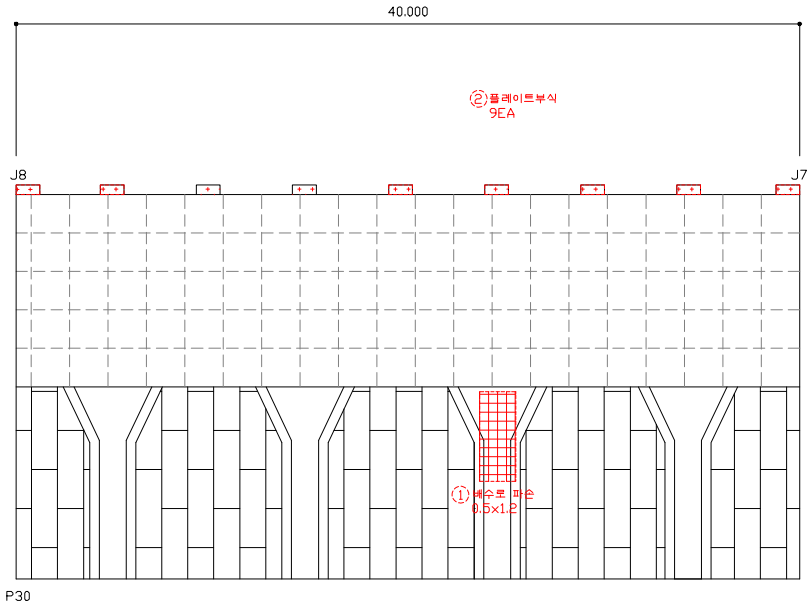


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	배수로파손	0.50	1.20		0.60	㎡	1.00					1
2	2011	플레이트부식	-	-		2.00	EA	2.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	103

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

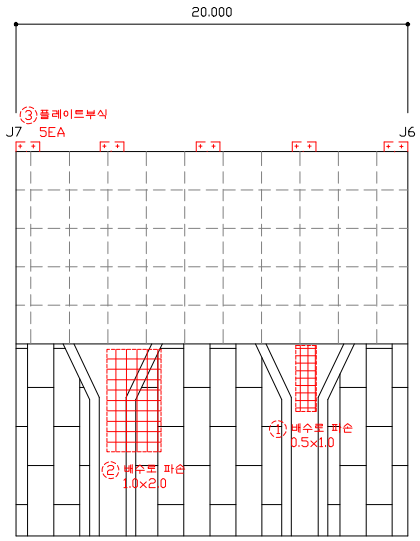


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	배수로파손	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					1
2	2011	배수로파손	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					1
3	2011	플레이트부식	-	-		5.00	EA	5.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	104

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

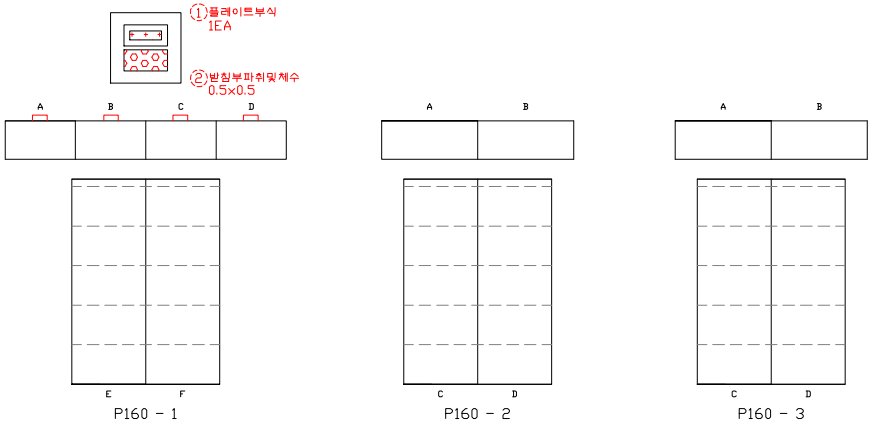


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락,박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	105

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

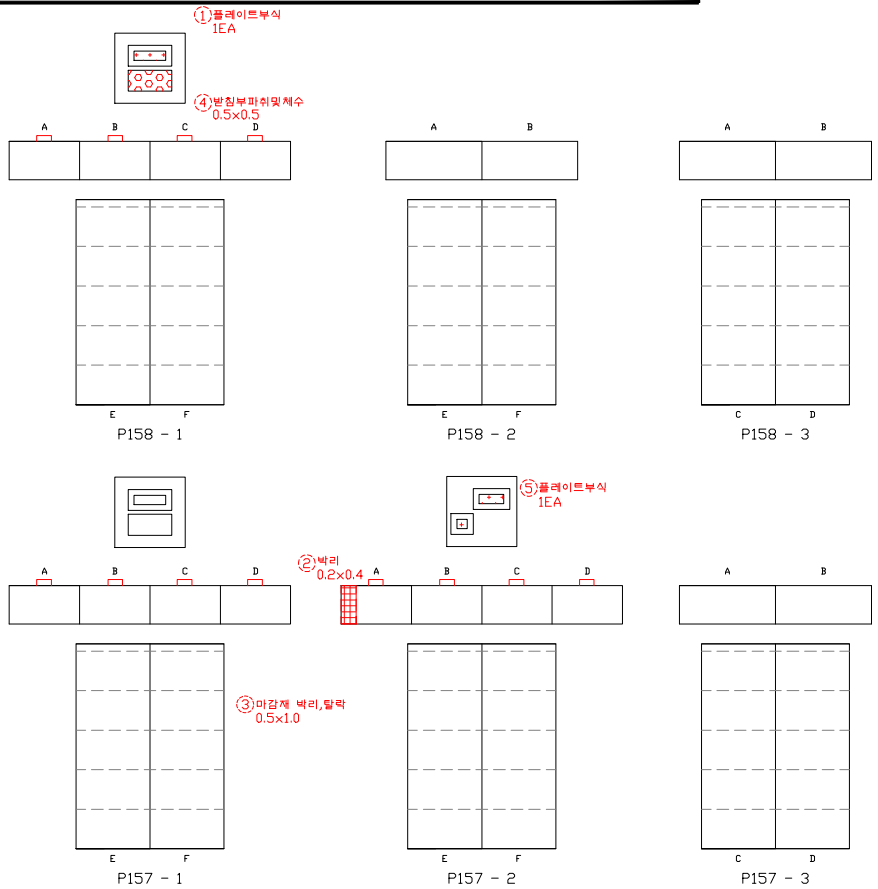


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2018	박리	0.20	0.40		0.08	㎡	1.00					2
3	2016	마감재 박리, 탈락	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					2
4	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	106


ID : 도림천4복개 2련 / 교각

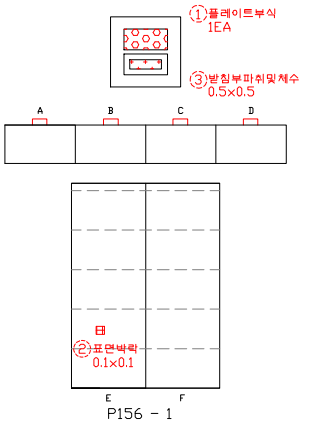


P156 - 1



P156 - 2

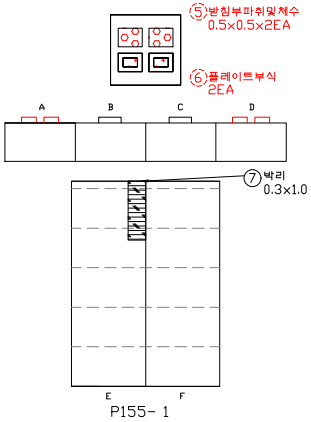

P155- 1

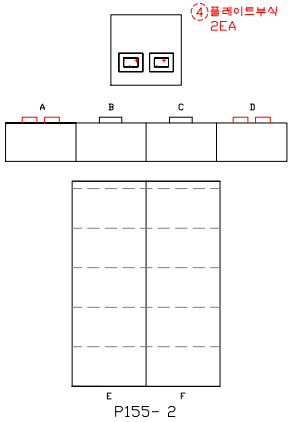


P155- 2

손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2016	표면박락	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
3	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				2.00	EA	2.00					2
5	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.50	㎡	2.00					2
6	2011	플레이트 부식				2.00	EA	2.00					2
7	2019	박리	0.30	1.00		0.30	㎡	1.00				신규	2
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	107

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

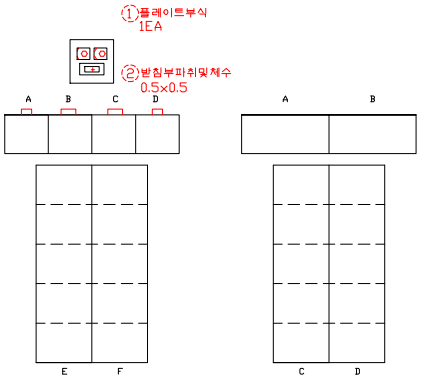


P154 - 1

P154 - 2

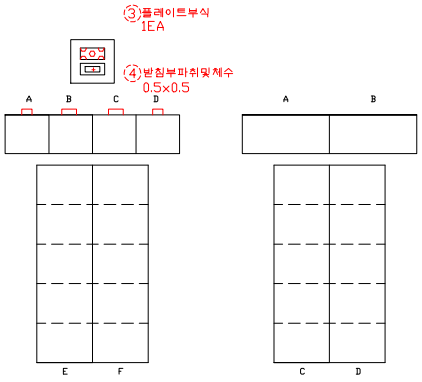


P153- 1

P153- 2

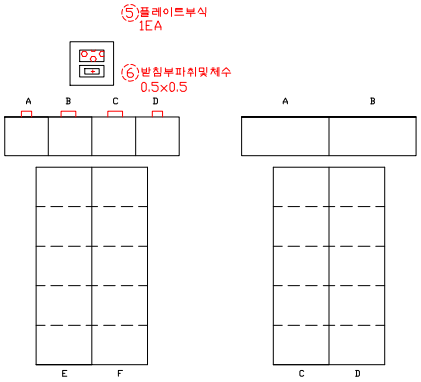


P152 - 1

P152 - 2

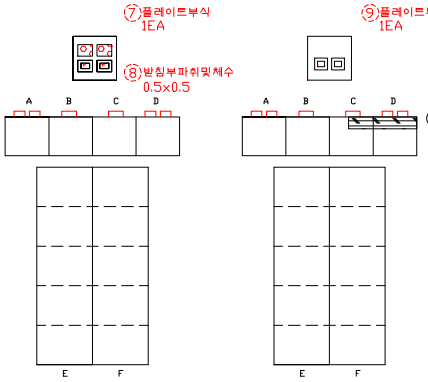

P151 - 1

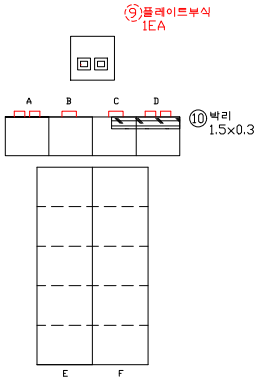


P151 - 2

손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
7	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
8	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
9	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
10	2019	박리	1.50	0.30		0.45	㎡	1.00				신규	2
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	108

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

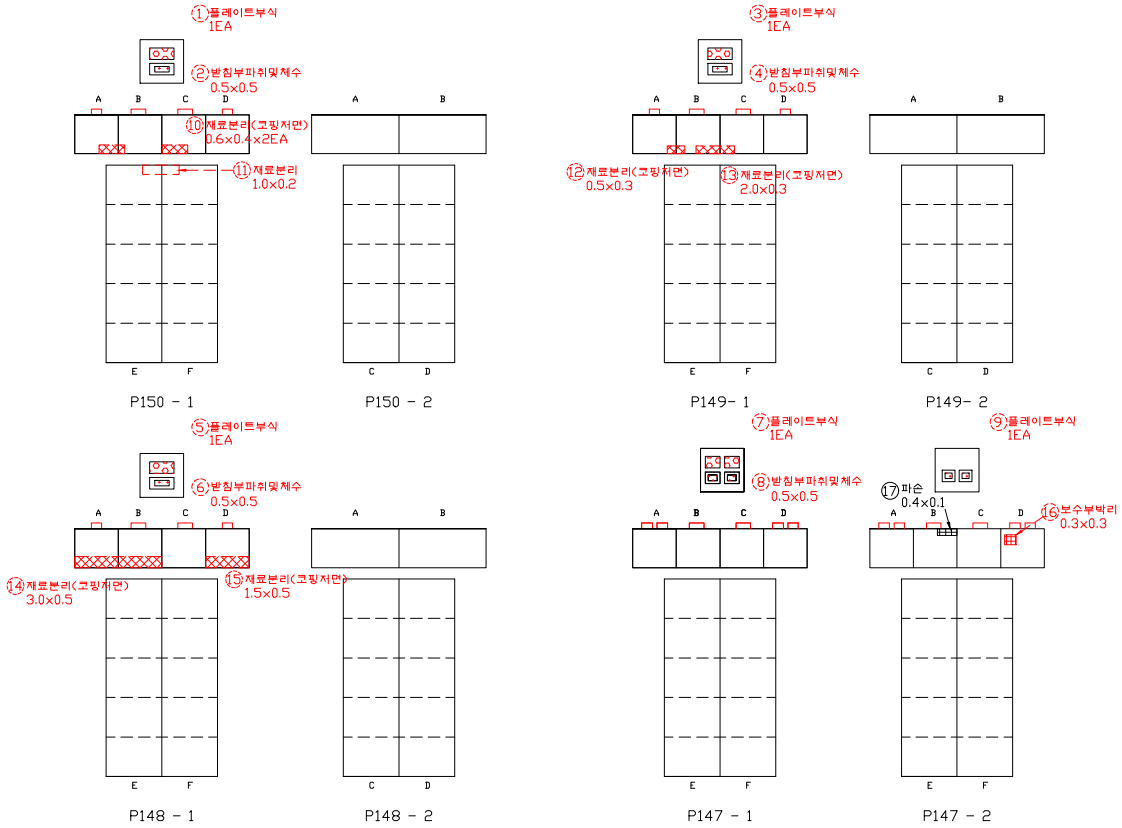


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
7	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
8	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
9	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
10	2016	재료분리	0.60	0.40		0.48	㎡	2.00					2
11	2016	재료분리	1.00	0.20		0.20	㎡	1.00					2
12	2016	재료분리	0.50	0.30		0.15	㎡	1.00					2
13	2016	재료분리	2.00	0.30		0.60	㎡	1.00					2
14	2016	재료분리	3.00	0.50		1.50	㎡	1.00					2
15	2016	재료분리	1.50	0.50		0.75	㎡	1.00					2
16	2018	보수부박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					2
17	2019	파손	0.40	0.10		0.04	㎡	1.00				신규	2
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	109

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

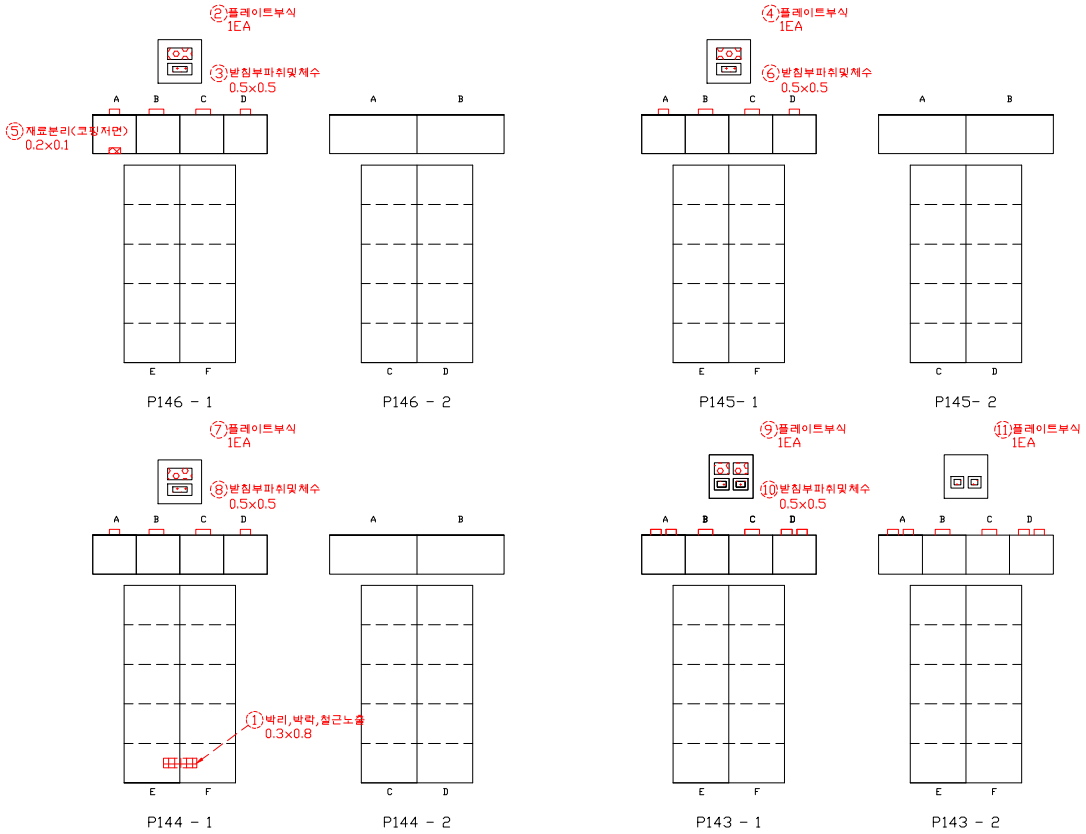


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	박리, 박락, 철근노출	0.30	0.80		0.24	㎡	1.00					1
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2016	재료분리	0.20	0.10		0.02	㎡	1.00					2
6	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
7	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
8	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
9	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
10	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
11	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	110

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

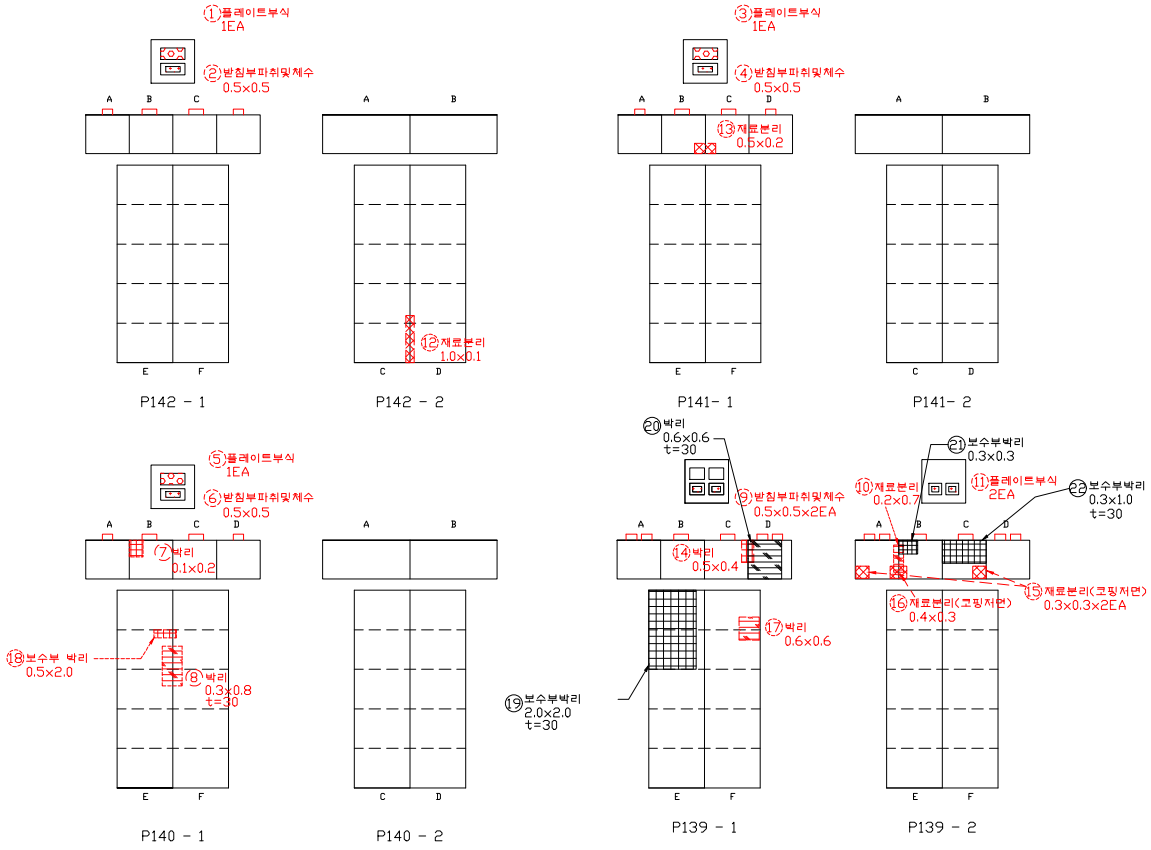


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				0.03	㎡	1.00					2
4	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
7	2014	박리	0.10	0.20		0.02	㎡	1.00					2
8	2014	박리	0.30	0.80		0.24	㎡	1.00					2
9	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.50	㎡	2.00					2
10	2011	재료분리	0.20	0.70		0.14	㎡	1.00					2
11	2011	플레이트 부식				2.00	EA	2.00					2
12	2016	재료분리	1.00	0.10		0.10	㎡	1.00					2
13	2016	재료분리	0.50	0.20		0.10	㎡	1.00					2
14	2016	박리	0.50	0.40		0.20	㎡	1.00					2
15	2016	재료분리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					2
16	2016	재료분리	0.40	0.30		0.12	㎡	1.00					2
17	2016	박리	0.60	0.60		0.36	㎡	1.00					2
18	2018	보수부 박리	0.30	0.20		0.06	㎡	1.00					2
19	2019	보수부박리	2.00	2.00		4.00	㎡	1.00				신규	2
20	2019	박리	0.60	0.60		0.36	㎡	1.00				신규	2
21	2019	보수부박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00				신규	2
22	2019	보수부박리	0.30	1.00		0.30	㎡	1.00				신규	2
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	111


ID : 도림천4복개 2련 / 교각

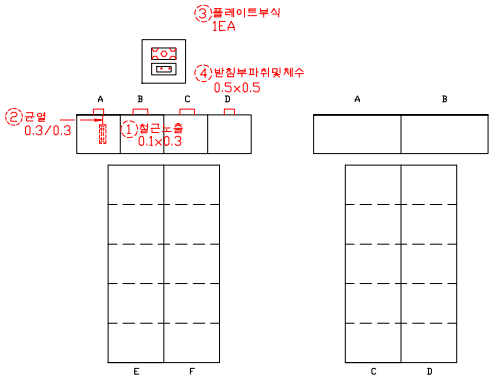


P138 - 1 P138 - 2

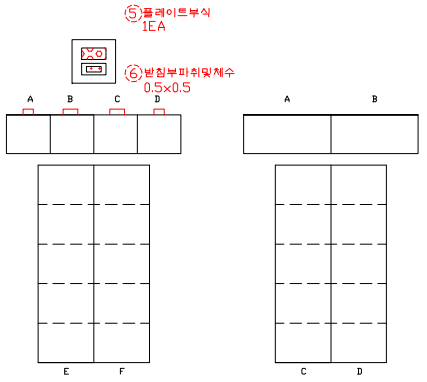

P137- 1 P137- 2

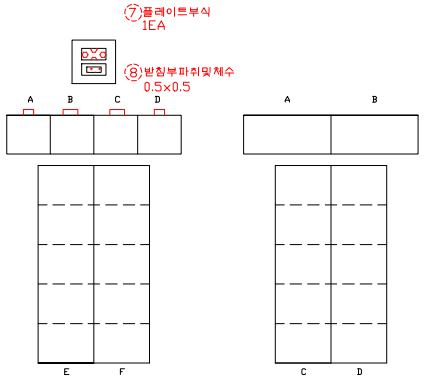

P136 - 1 P136 - 2

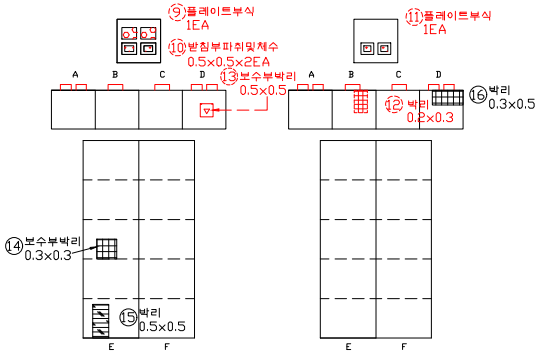


P135 - 1 P135 - 2

손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	철근노출	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00					1
2	2016	균열	0.30	0.30		0.30	m	1.00					1
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
7	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
8	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
9	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
10	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.50	㎡	2.00					2
11	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
12	2011	박리	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00					2
13	2016	보수부 박리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
14	2019	보수부박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00				신규	2
15	2019	박리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00				신규	2
16	2019	박리	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00				신규	2
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	112

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

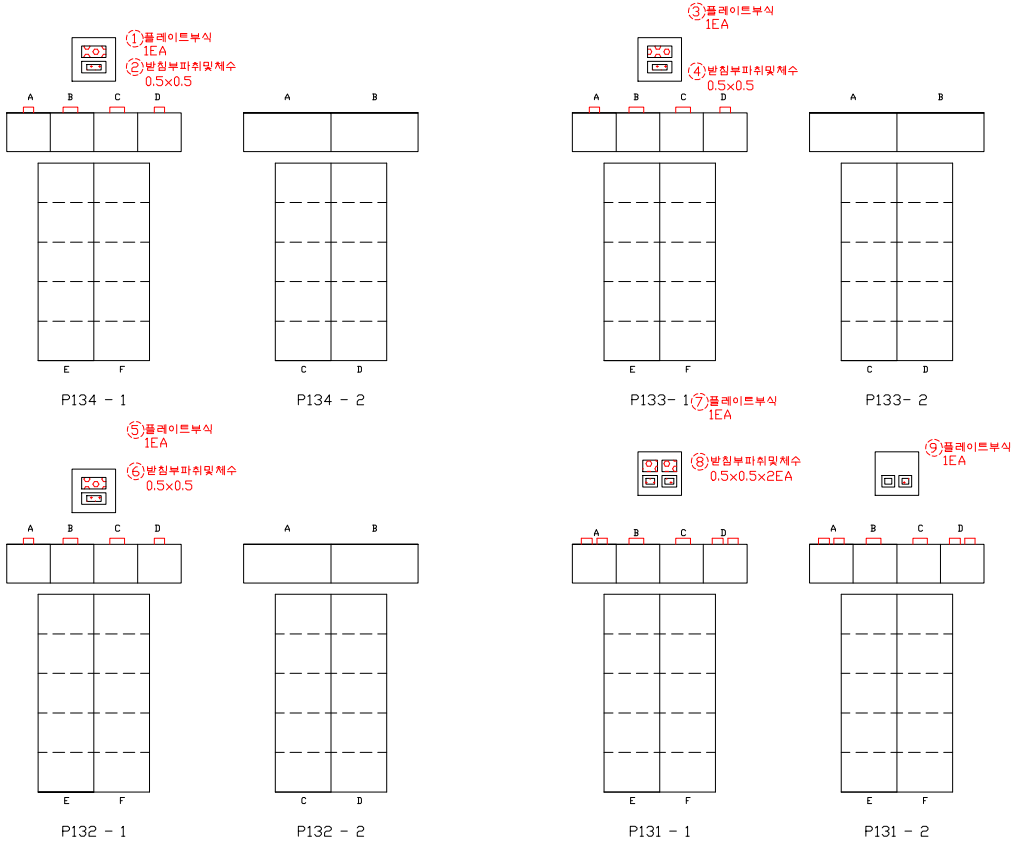


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	받침부 파취 및 채수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	받침부 파취 및 채수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	받침부 파취 및 채수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
7	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
8	2011	받침부 파취 및 채수	0.50	0.50		0.50	㎡	2.00					2
9	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	113

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

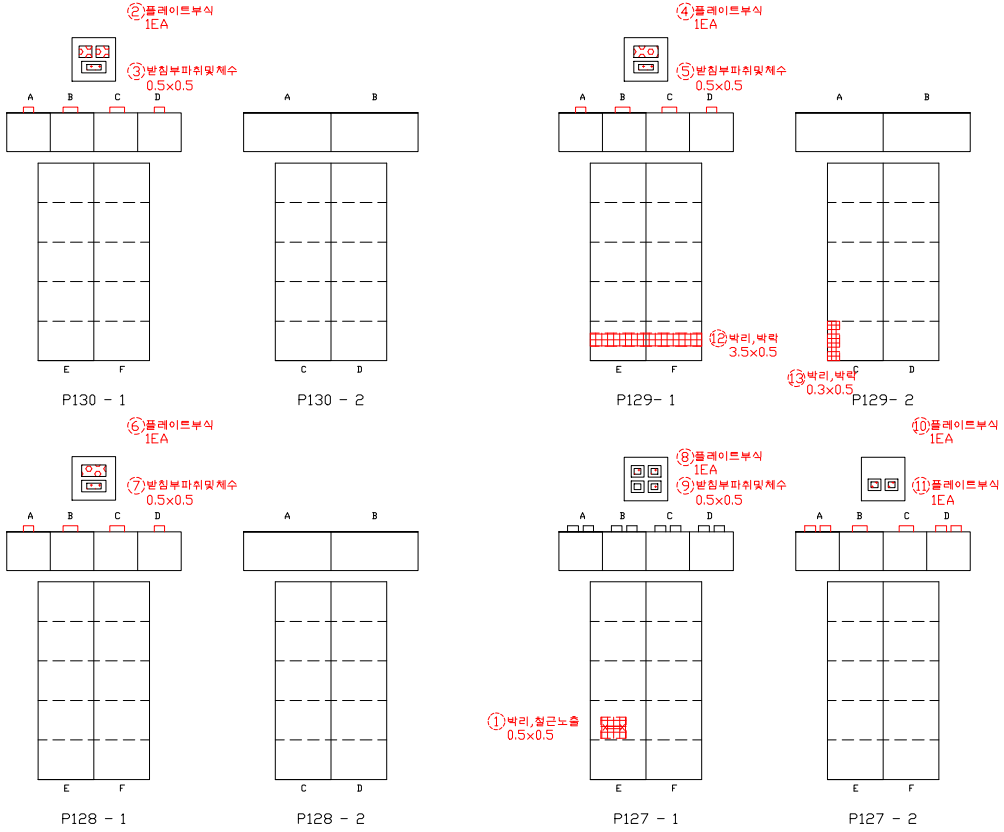


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	박리, 철근노출	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					1
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
6	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
7	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
8	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
9	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
10	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
11	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
12	2016	박리, 박락	3.50	0.50		1.75	㎡	1.00					2
13	2018	박리,박락	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					2
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	114

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

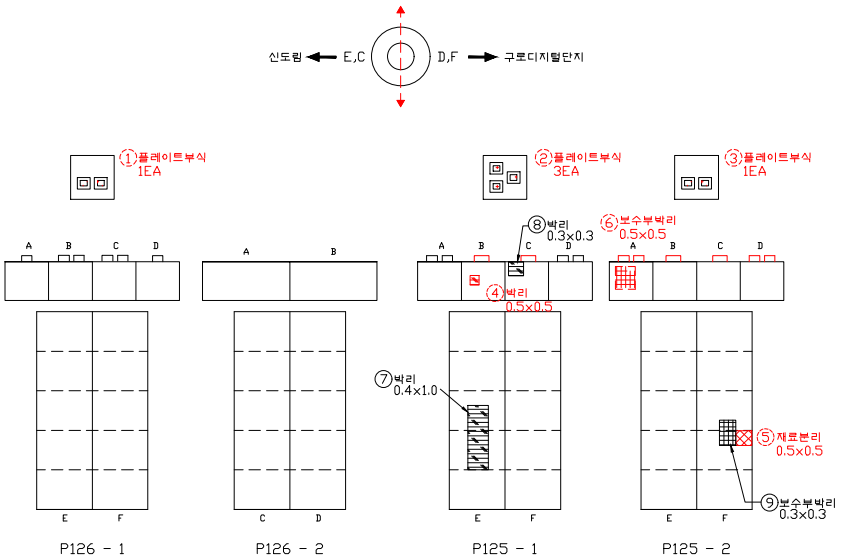


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				3.00	EA	3.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2016	박리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
5	2016	재료분리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
6	2018	보수부박리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
7	2019	박리	0.40	1.00		0.40	㎡	1.00				신규	2
8	2019	박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00				신규	2
9	2019	보수부박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00				신규	2
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	115

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

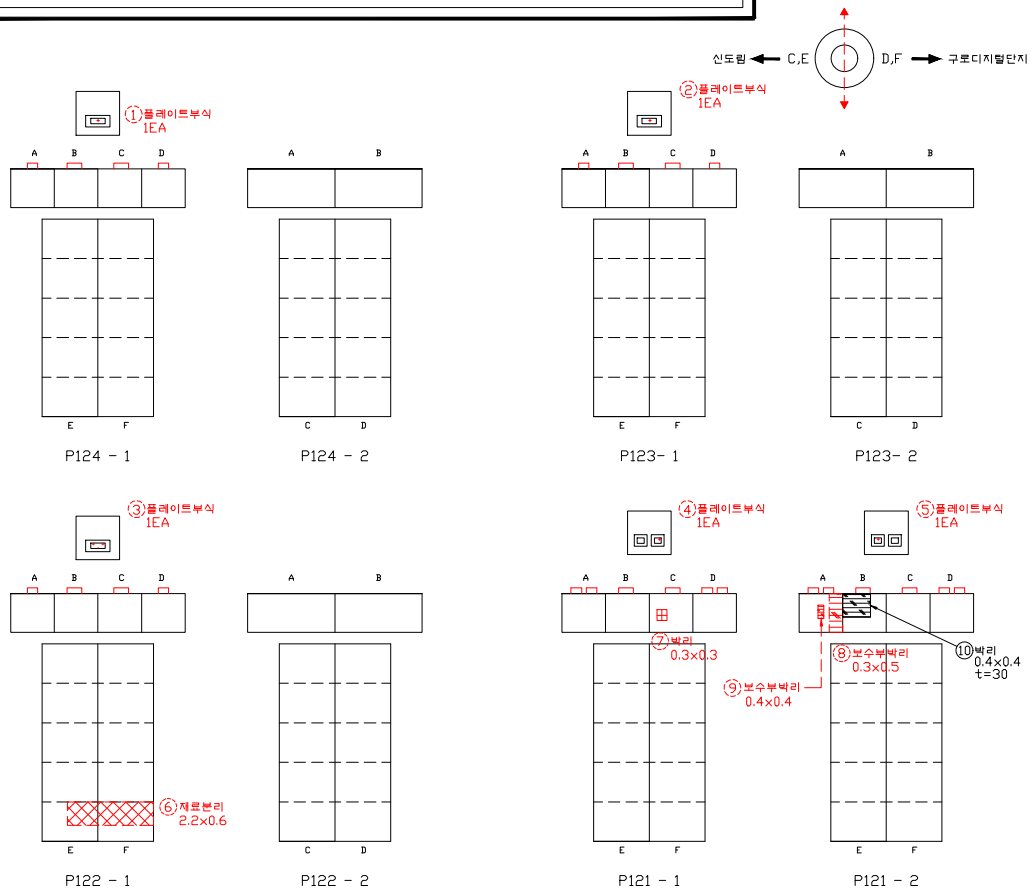


손 상 물 량 표

연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2016	재료분리	2.20	0.60		1.32	㎡	1.00					2
7	2016	박리 및 박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					2
8	2016	보수부 박리	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					2
9	2018	보수부박리	0.40	0.40		0.16	㎡	1.00					2
10	2019	박리	0.40	0.40		0.16	㎡	1.00				신규	2
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	116

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

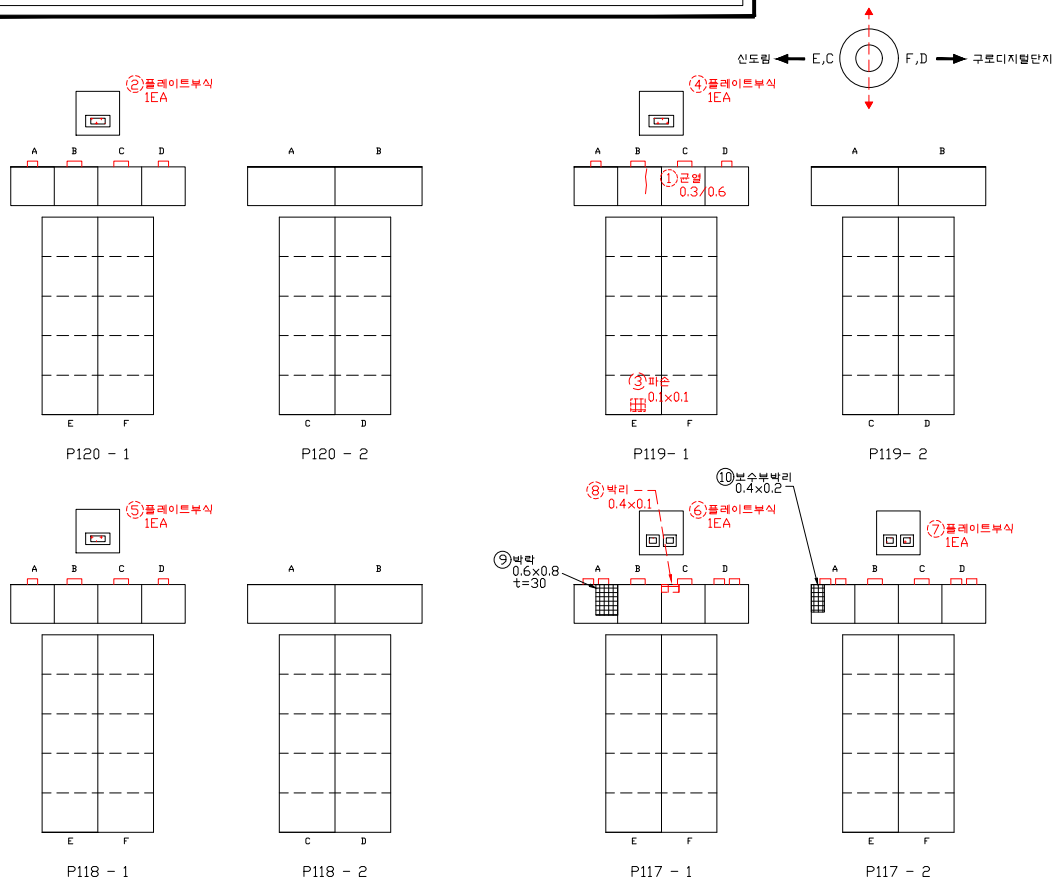


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	0.60		0.60	m	1.00					1
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2014	파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
7	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
8	2018	박리	0.40	0.10		0.04	㎡	1.00					2
9	2019	박락	0.60	0.80		0.48	㎡	1.00				신규	2
10	2019	보수부박리	0.40	0.20		0.08	㎡	1.00				신규	2
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	117

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

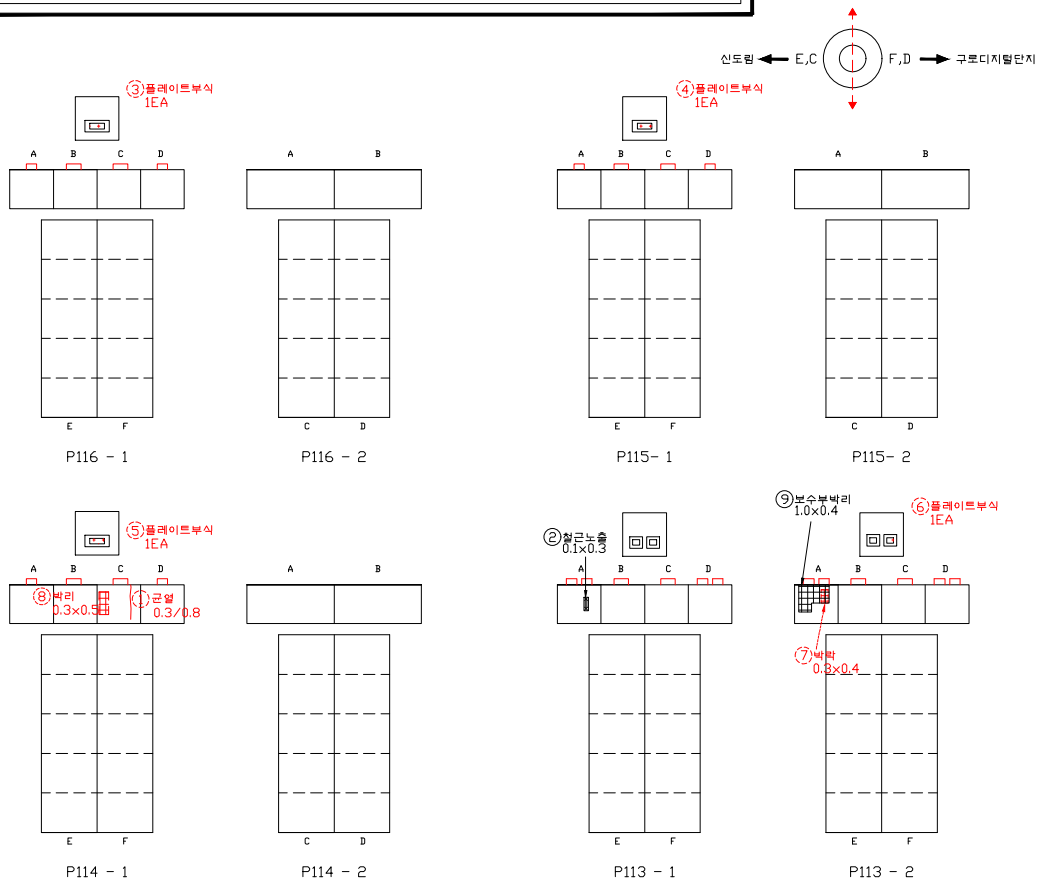


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00					1
2	2019	철근노출	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00				신규	1
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
7	2011	박락	0.30	0.40		0.12	㎡	1.00					2
8	2016	박리	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					2
9	2019	보수부박리	1.00	0.40		0.40	㎡	1.00				신규	2
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	118

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

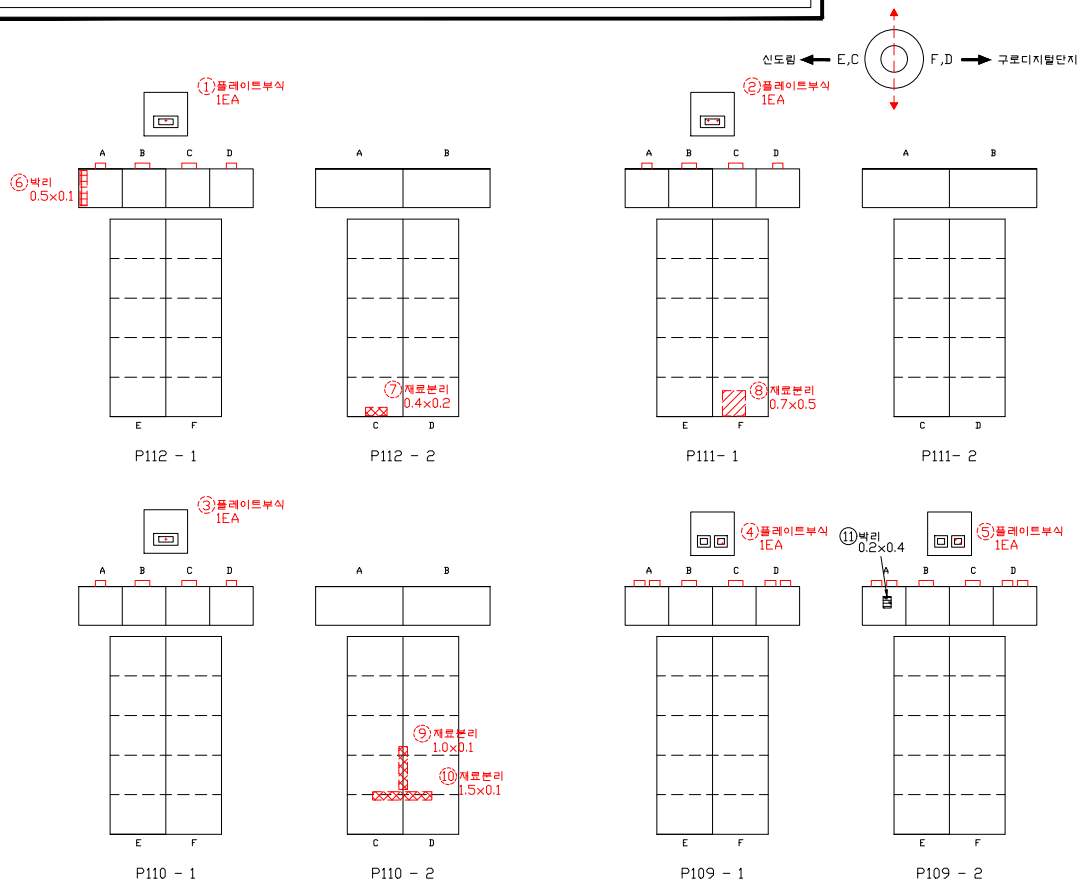


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2016	박리	0.50	0.10		0.05	㎡	1.00					2
7	2016	재료분리	0.40	0.20		0.08	㎡	1.00					2
8	2016	재료분리	0.70	0.50		0.35	㎡	1.00					2
9	2016	재료분리	1.00	0.10		0.10	㎡	1.00					2
10	2016	재료분리	1.50	0.10		0.15	㎡	1.00					2
11	2019	박리	0.20	0.40		0.08	㎡	1.00				신규	2
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	119

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

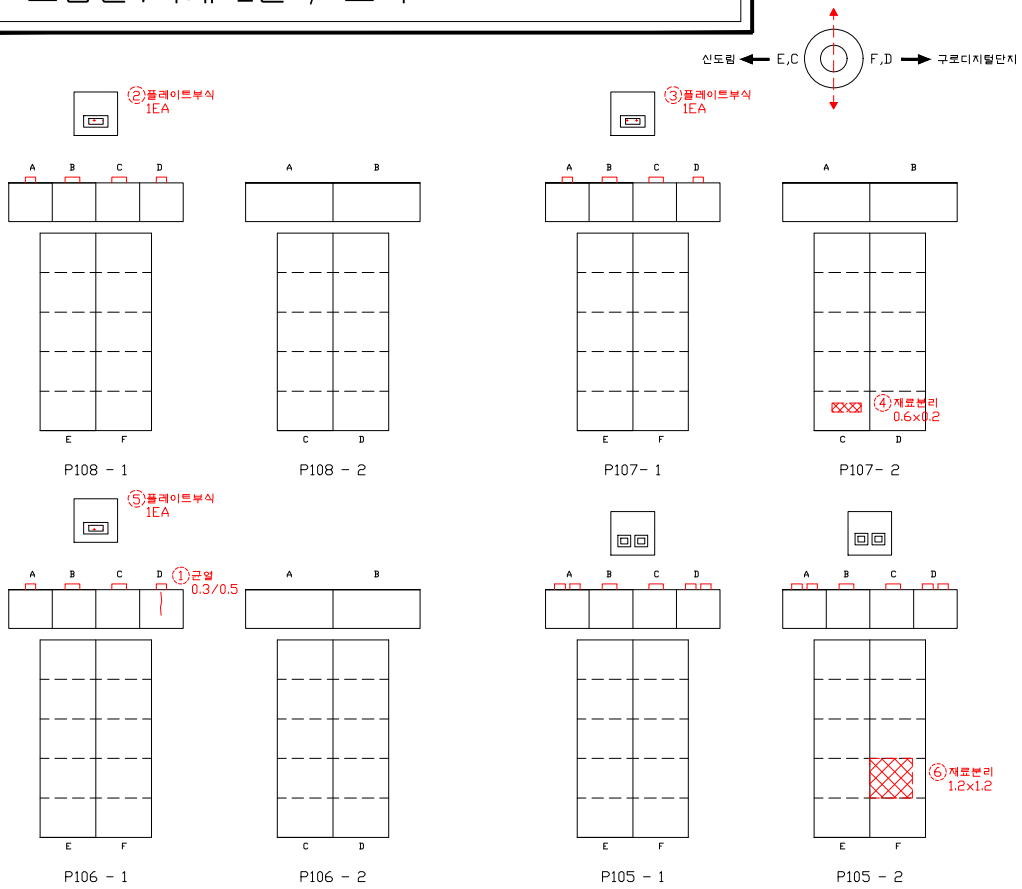


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	0.50		0.50	m	1.00					1
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2016	재료분리	0.60	0.20		0.12	㎡	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2016	재료분리	1.20	1.20		1.44	㎡	1.00					2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	120

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

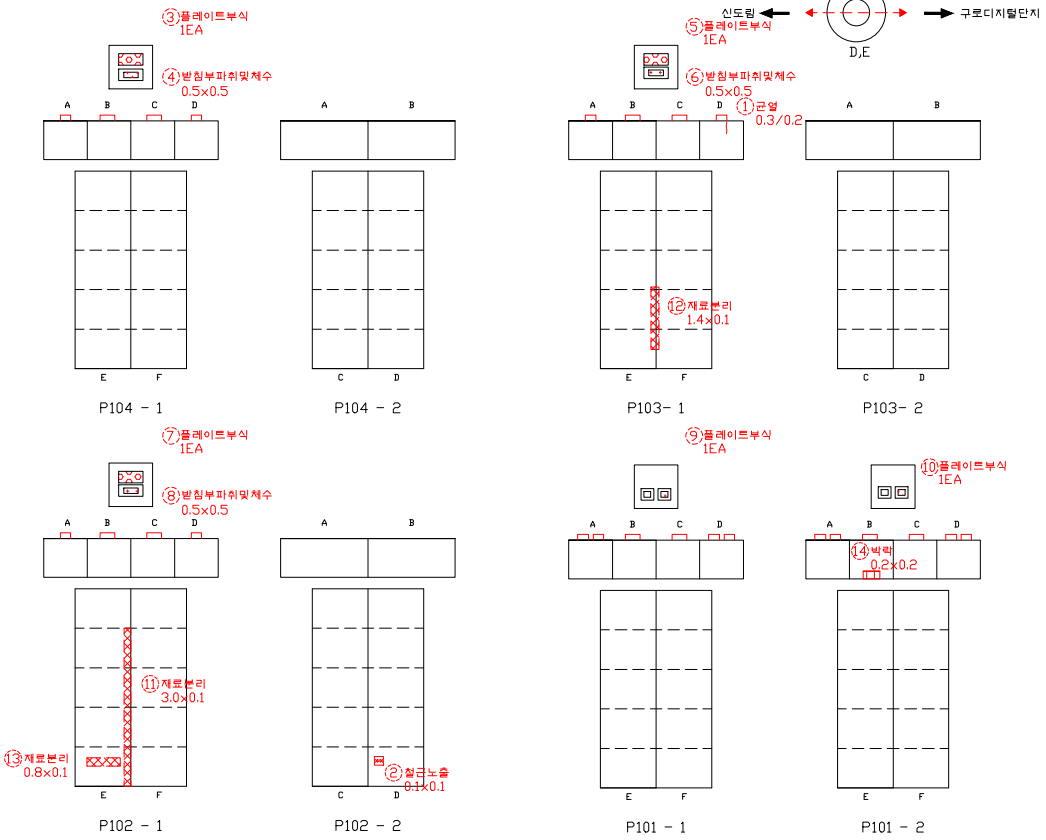


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역				비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량			
1	2016	균열	0.30	0.20		0.20	m	1.00						1
2	2018	철근노출	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00						1
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00						2
4	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00						2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00						2
6	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00						2
7	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00						2
8	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00						2
9	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00						2
10	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00						2
11	2016	재료분리	3.00	0.10		0.30	㎡	1.00						2
12	2016	재료분리	1.40	0.10		0.14	㎡	1.00						2
13	2016	재료분리	0.80	0.10		0.08	㎡	1.00						2
14	2018	박락	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00						2
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	121

ID : 도림천4복개 2련 / 교각



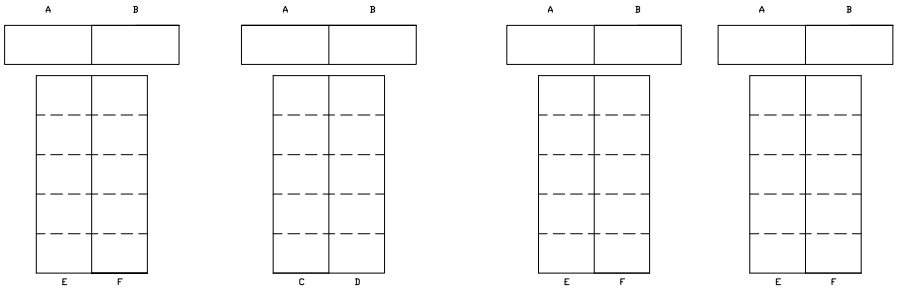


P100 - 1 P100 - 2 P99 - 1 P99 - 2

손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	122

ID : 도림천4복개 2련 / 교각



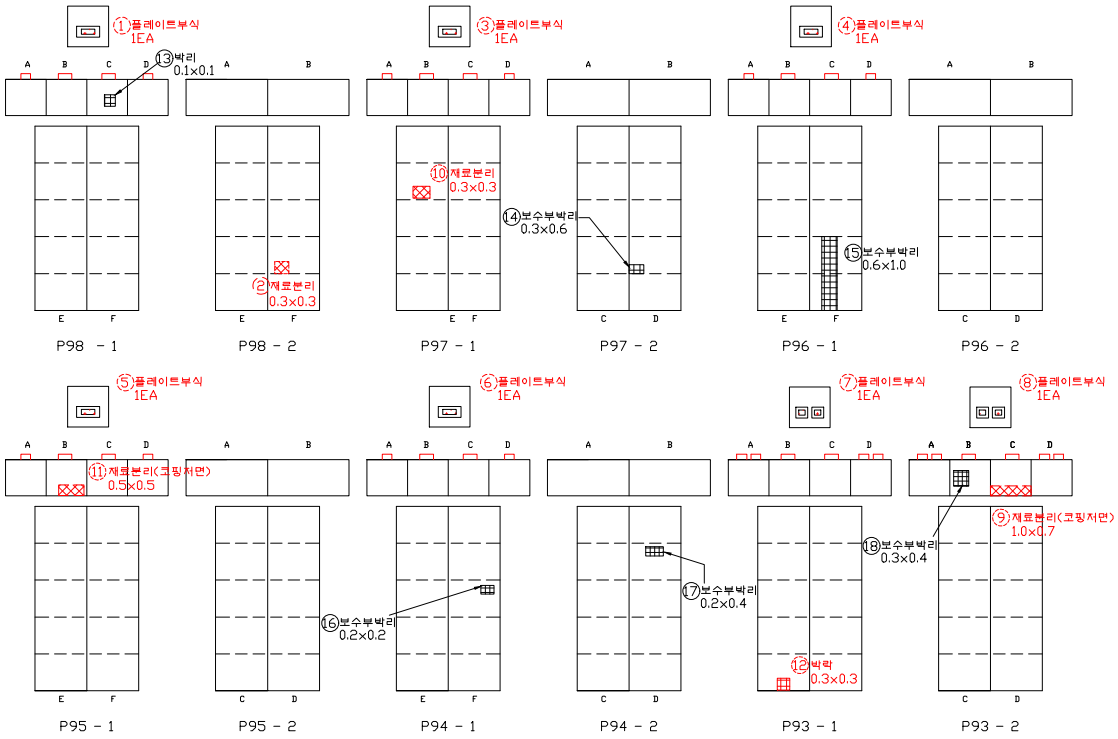


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2014	재료분리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
7	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
8	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
9	2016	재료분리	1.00	0.70		0.70	㎡	1.00					2
10	2016	재료분리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					2
11	2016	재료분리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
12	2016	박락	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					2
13	2019	박리	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00				신규	2
14	2019	보수부박리	0.30	0.60		0.18	㎡	1.00				신규	2
15	2019	보수부박리	0.60	1.00		0.60	㎡	1.00				신규	2
16	2019	보수부박리	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00				신규	2
17	2019	보수부박리	0.20	0.40		0.08	㎡	1.00				신규	2
18	2019	보수부박리	0.30	0.40		0.12	㎡	1.00				신규	2
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	123

ID : 도림천4복개 2련 / 교각



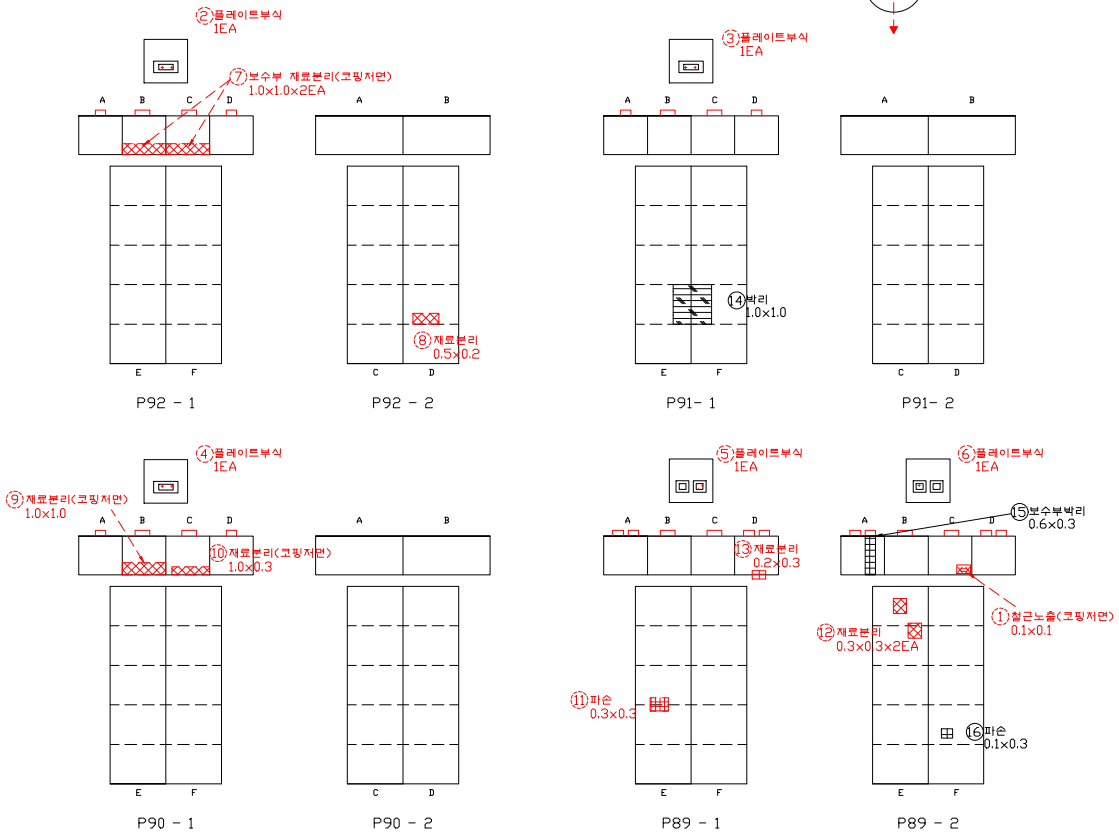


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	철근노출	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					1
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
7	2016	보수부 재료분리	1.00	1.00		2.00	㎡	2.00					2
8	2016	재료분리	0.50	0.20		0.10	㎡	1.00					2
9	2016	재료분리	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00					2
10	2016	재료분리	1.00	0.30		0.30	㎡	1.00					2
11	2016	파손	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					2
12	2016	재료분리	0.30	0.30		0.18	㎡	2.00					2
13	2018	재료분리	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00					2
14	2019	박리	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00				신규	2
15	2019	보수부박리	0.60	0.30		0.18	㎡	1.00				신규	2
16	2019	파손	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00				신규	2
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	124

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

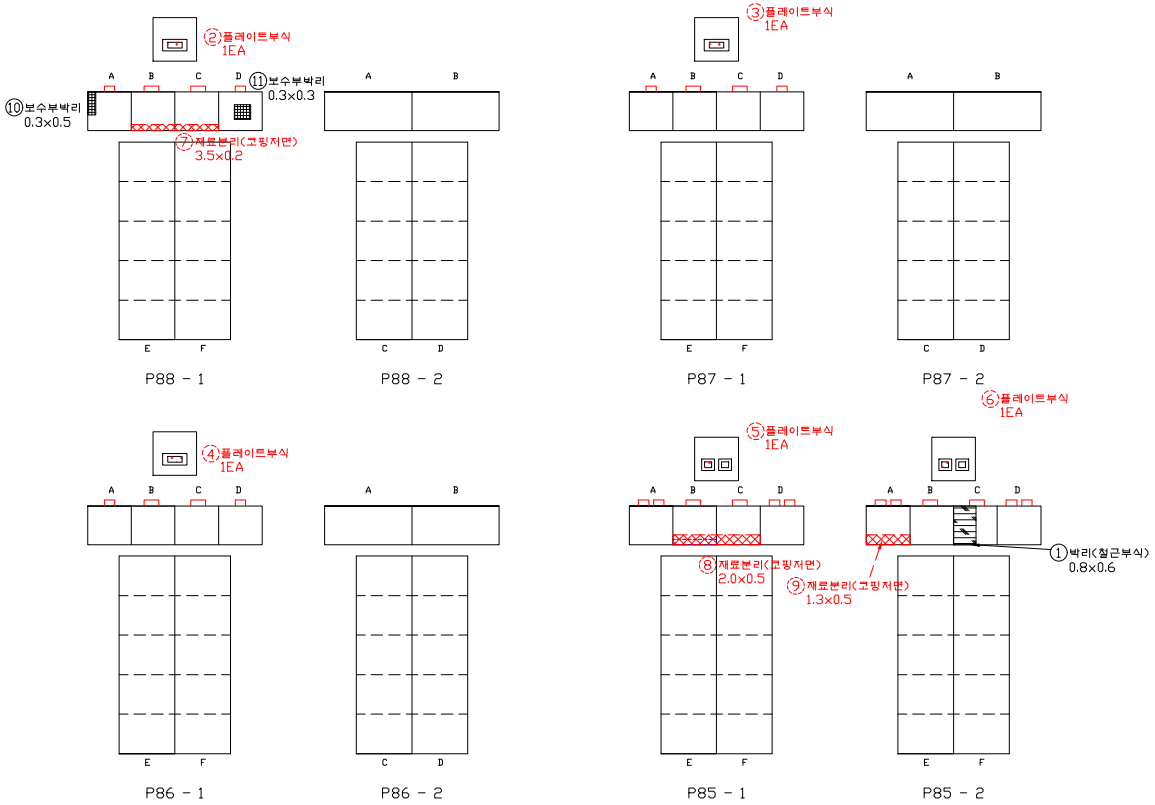


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	박리(철근부식)	0.80	0.60		0.48	㎡	1.00				신규	1
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
7	2016	재료분리	3.50	0.20		0.70	㎡	1.00					2
8	2016	재료분리	2.00	0.50		1.00	㎡	1.00					2
9	2016	재료분리	1.30	0.50		0.65	㎡	1.00					2
10	2019	보수부박리	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00				신규	2
11	2019	보수부박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00				신규	2
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	125

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

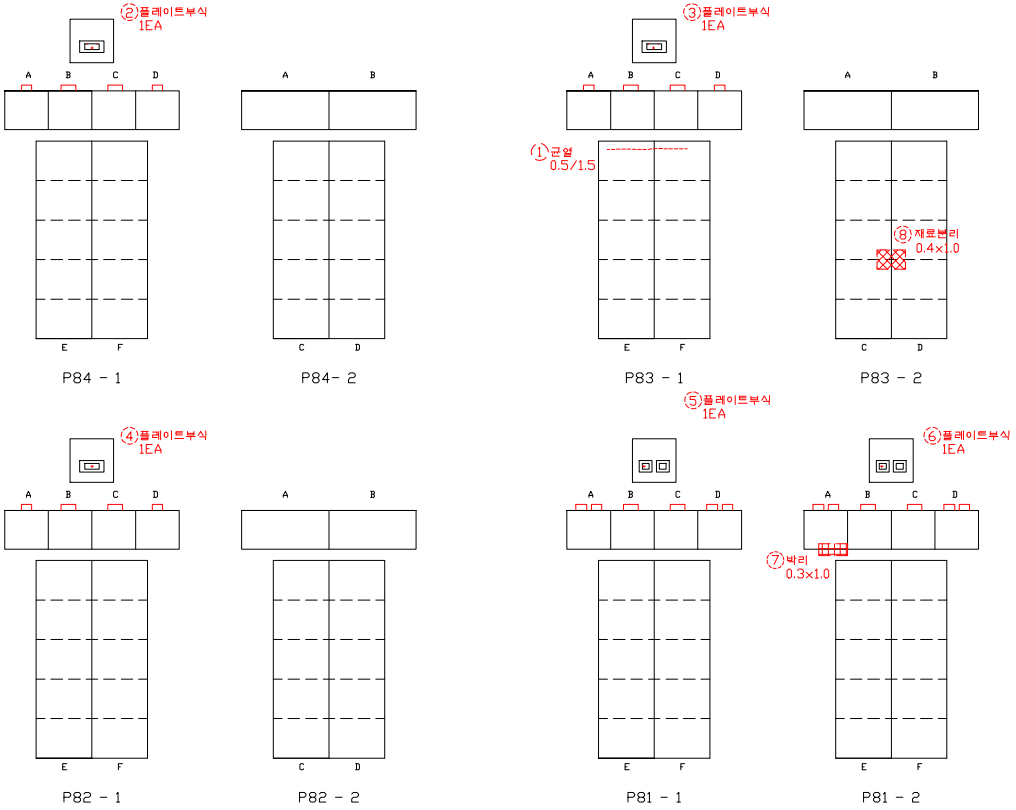


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	균열	0.50	1.50		1.50	m	1.00					1
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
7	2016	박리	0.30	1.00		0.30	㎡	1.00					2
8	2018	재료분리	0.40	1.00		0.40	㎡	1.00					2
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	126

ID : 도림천4복개 2련 / 교각



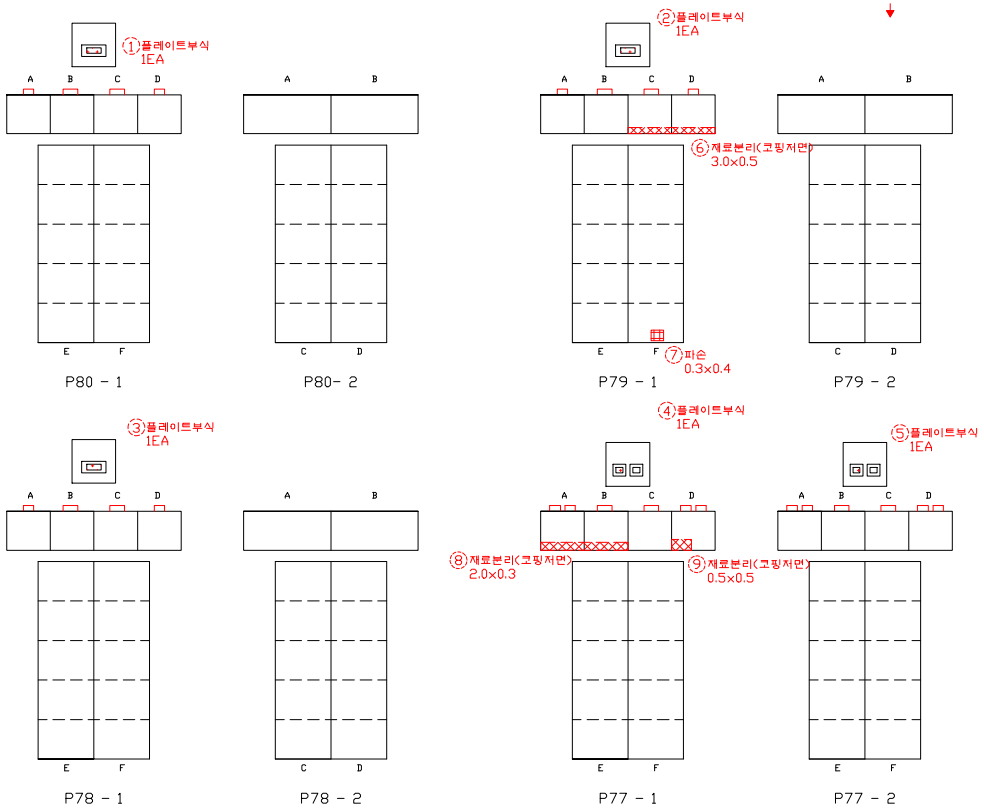


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2016	재료분리	3.00	0.50		1.50	㎡	1.00					2
7	2016	파손	0.30	0.40		0.12	㎡	1.00					2
8	2016	재료분리	2.00	0.30		0.60	㎡	1.00					2
9	2016	재료분리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	127

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

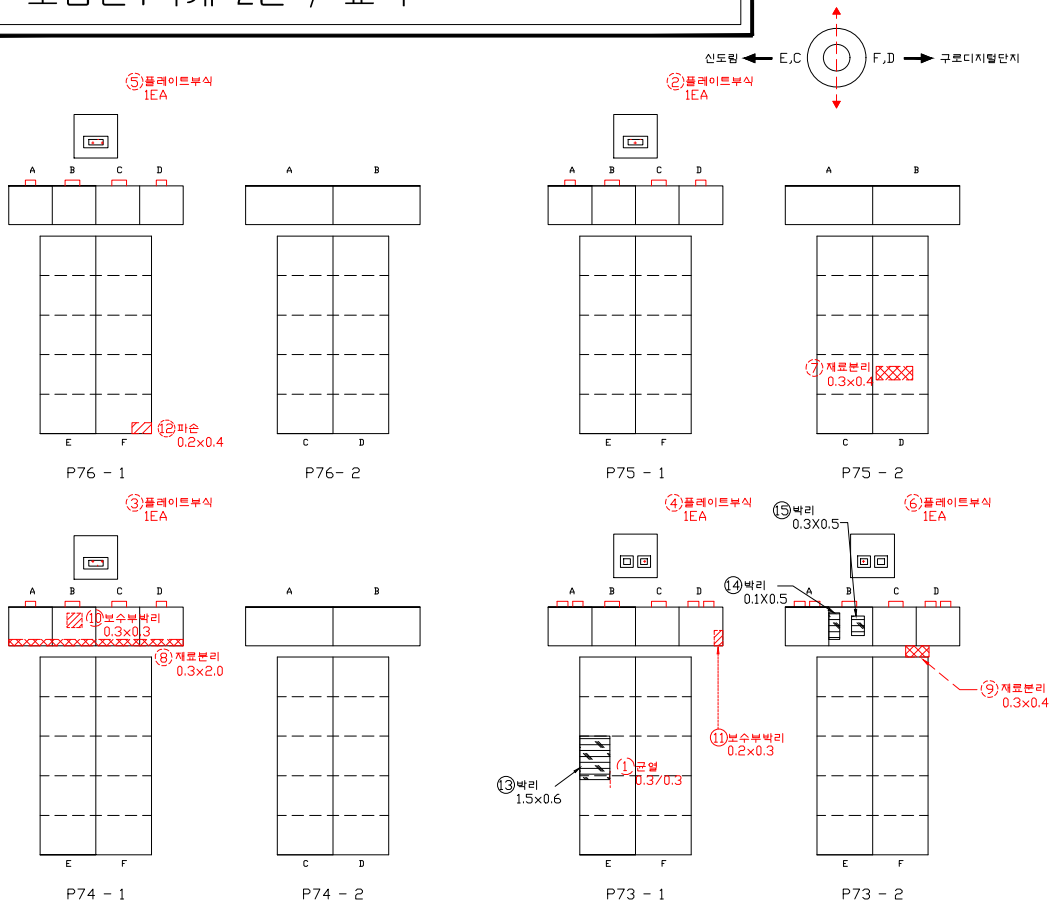


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	균열	0.30	0.30		0.30	m	1.00					1
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
7	2018	재료분리	0.30	0.40		0.12	㎡	1.00					2
8	2018	재료분리	0.30	2.00		0.60	㎡	1.00					2
9	2018	재료분리	0.30	0.40		0.12	㎡	1.00					2
10	2014	보수부박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					2
11	2011	보수부박리	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00					2
12	2016	재료분리	0.20	0.40		0.08	㎡	1.00					2
13	2019	박리	1.50	0.60		0.90	㎡	1.00				신규	2
14	2019	박리	0.10	0.50		0.05	㎡	1.00				신규	2
15	2019	박리	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00				신규	2
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	128

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

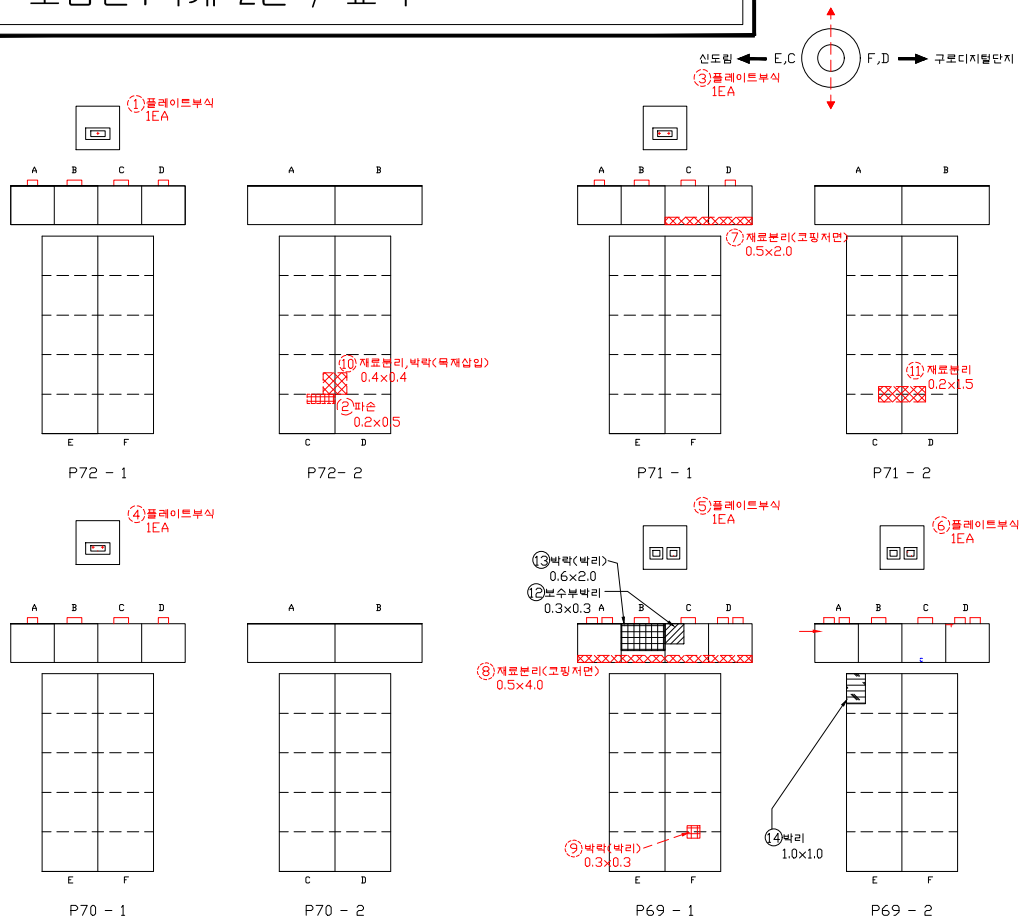


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2014	파손	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
7	2016	재료분리	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
8	2016	재료분리	0.50	4.00		2.00	㎡	1.00					2
9	2016	박락(박리)	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					2
10	2018	재료분리,박락(목재삽입)	0.40	0.40		0.16	㎡	1.00					2
11	2018	재료분리	0.20	1.50		0.30	㎡	1.00					2
12	2019	보수부 박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00				신규	2
13	2019	박락(박리)	0.60	2.00		1.20	㎡	1.00				신규	2
14	2019	박리	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00				신규	2
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	129

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

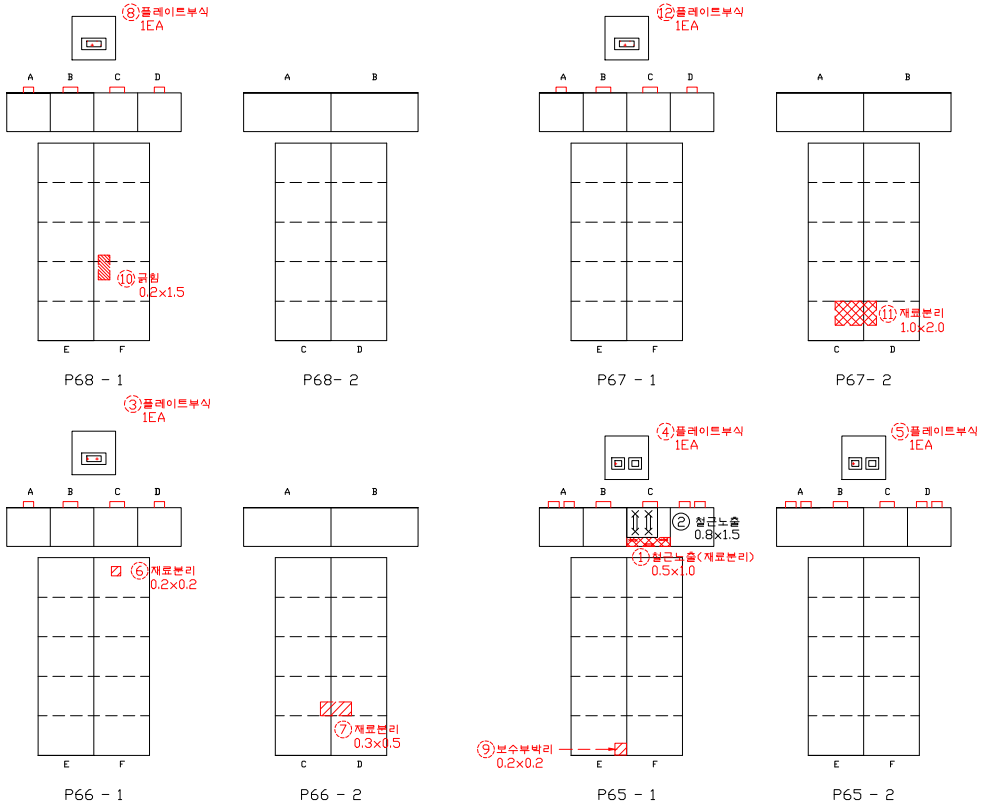


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	철근노출(재료분리)	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					1
2	2019	철근노출	0.80	1.50		1.20	㎡	1.00				신규	1
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2016	재료분리	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					2
7	2016	재료분리	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					2
8	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
9	2016	보수부 박리	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					2
10	2018	균열	0.20	1.50		0.30	㎡	1.00					2
11	2018	재료분리	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					2
12	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	130

ID : 도림천4복개 2련 / 교각



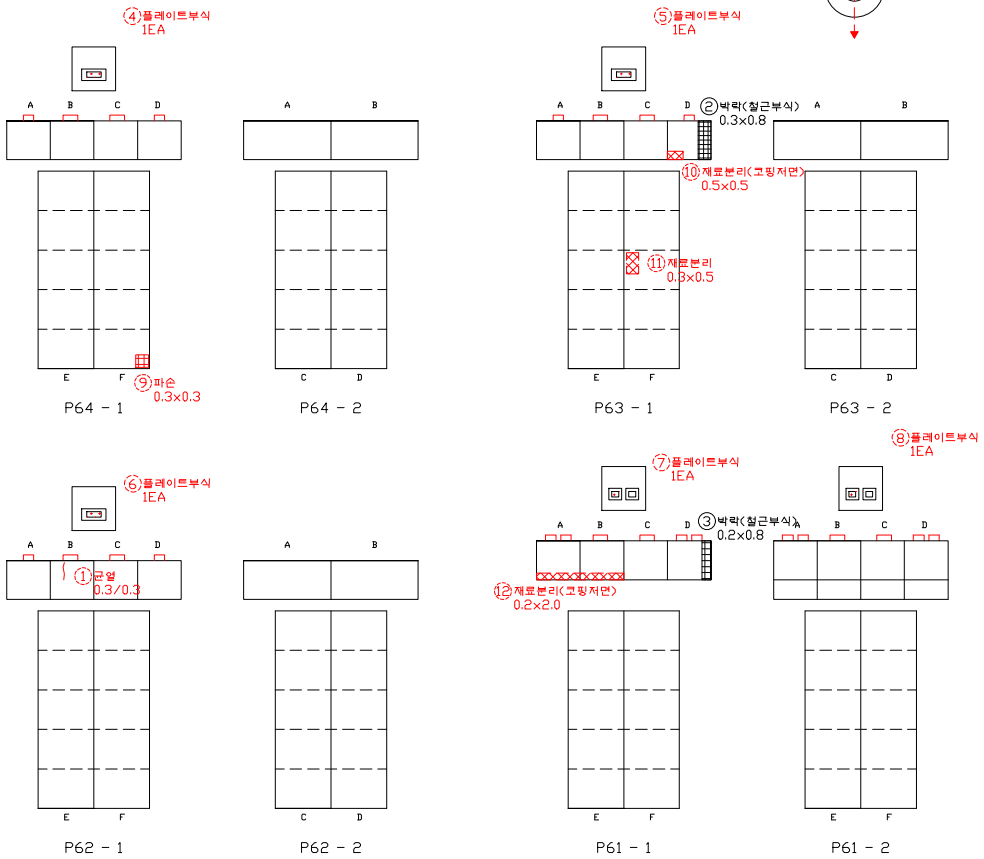


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	0.30		0.30	m	1.00					1
2	2019	박락(철근부식)	0.30	0.80		0.24	㎡	1.00				신규	1
3	2019	박락(철근부식)	0.20	0.80		0.16	㎡	1.00				신규	1
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
7	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
8	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
9	2016	파손	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					2
10	2016	재료분리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
11	2016	재료분리	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					2
12	2016	재료분리	0.20	2.00		0.40	㎡	1.00					2
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	131

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

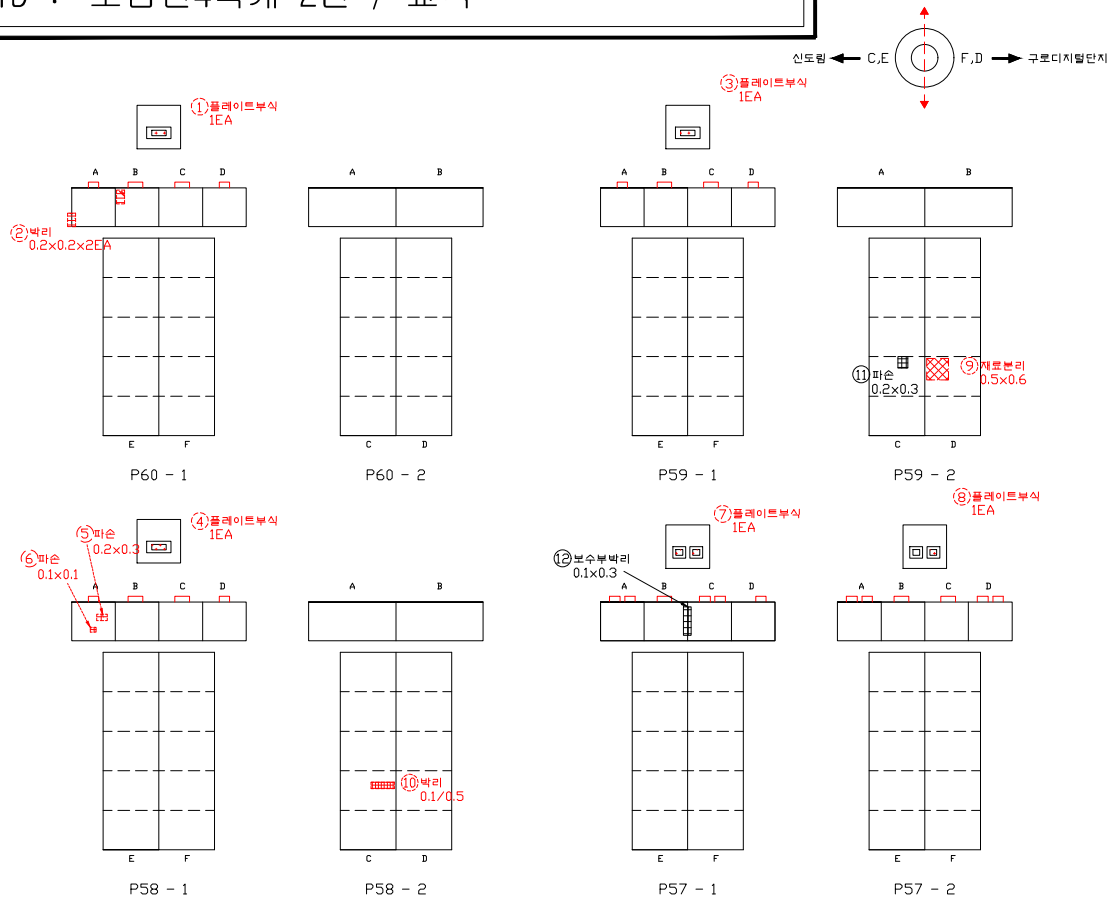


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	박리	0.20	0.20		0.08	㎡	2.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2014	파손	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00					2
6	2014	파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
7	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
8	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
9	2016	재료분리	0.50	0.60		0.30	㎡	1.00					2
10	2016	박리	0.10	0.50		0.05	㎡	1.00					2
11	2019	파손	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00				신규	2
12	2019	보수부박리	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00				신규	2
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	132

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

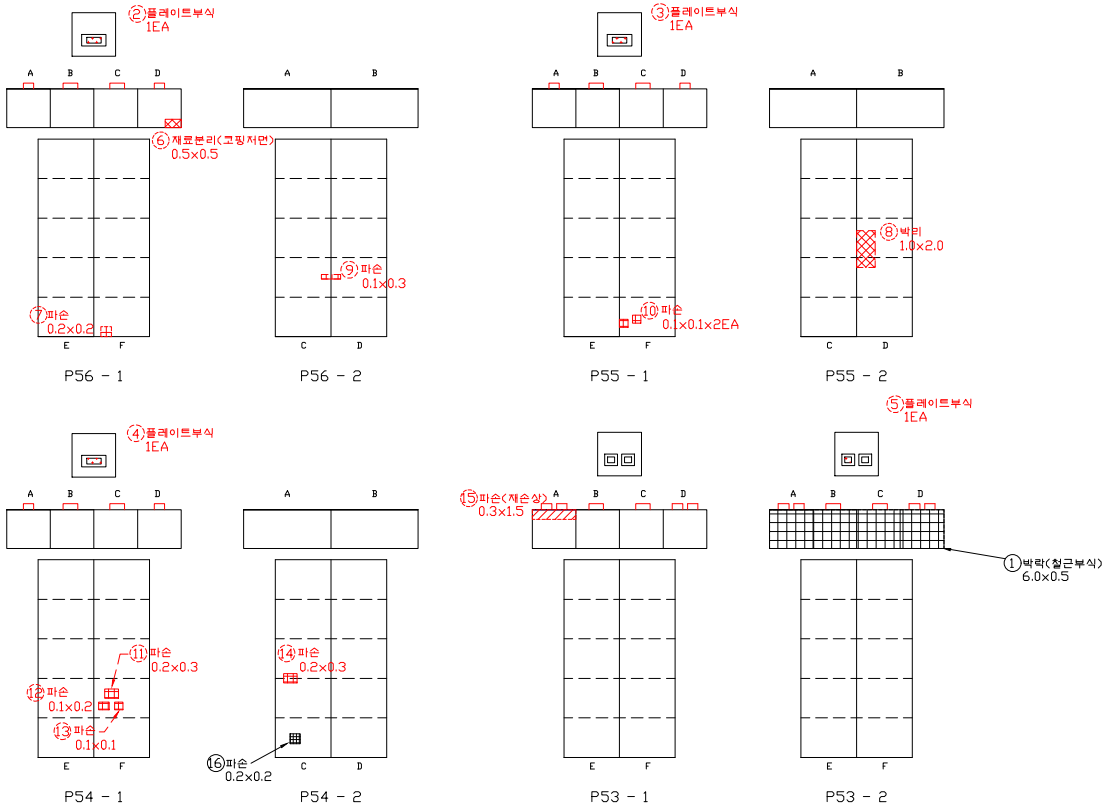


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	박락(철근부식)	6.00	0.50		3.00	㎡	1.00				신규	1
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2016	재료분리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
7	2016	파손	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					2
8	2016	박리	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					2
9	2018	파손	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00					2
10	2018	파손	0.10	0.10		0.02	㎡	2.00					2
11	2018	파손	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00					2
12	2018	파손	0.10	0.20		0.02	㎡	1.00					2
13	2018	파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
14	2018	파손	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00					2
15	2011	파손	0.30	1.50		0.45	㎡	1.00					2
16	2019	파손	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00				신규	2
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	133

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

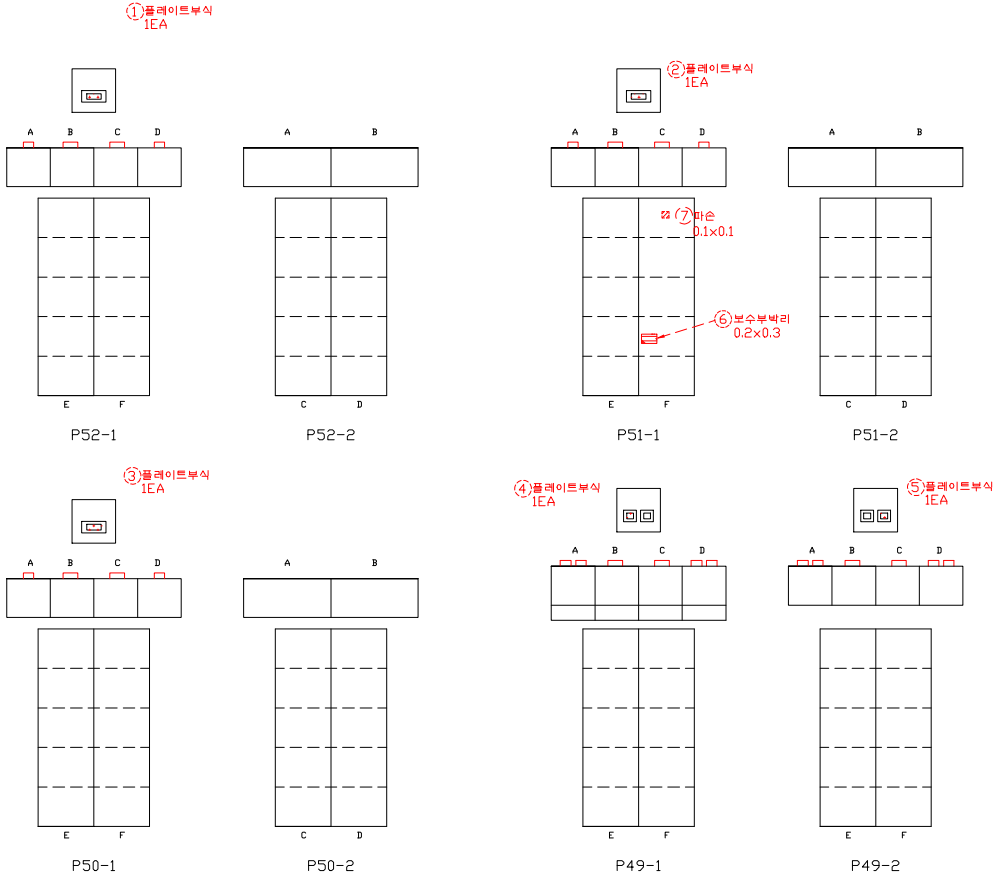


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2016	보수부 박리	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00					2
7	2018	파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기을
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승훈
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	134

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

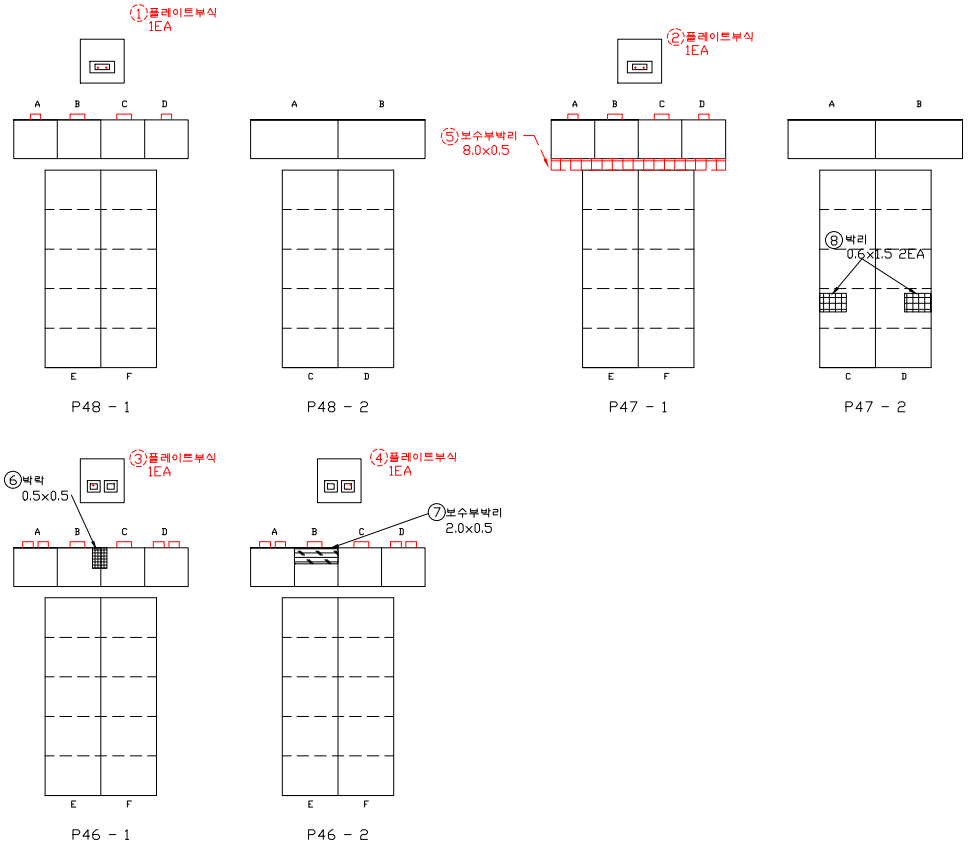


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2018	보수부박리	8.00	0.50		4.00	㎡	1.00					2
6	2019	박락	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00				신규	2
7	2019	보수부박리	2.00	0.50		1.00	㎡	1.00				신규	2
8	2019	박리	0.60	1.50		1.80	㎡	2.00				신규	2
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	135

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

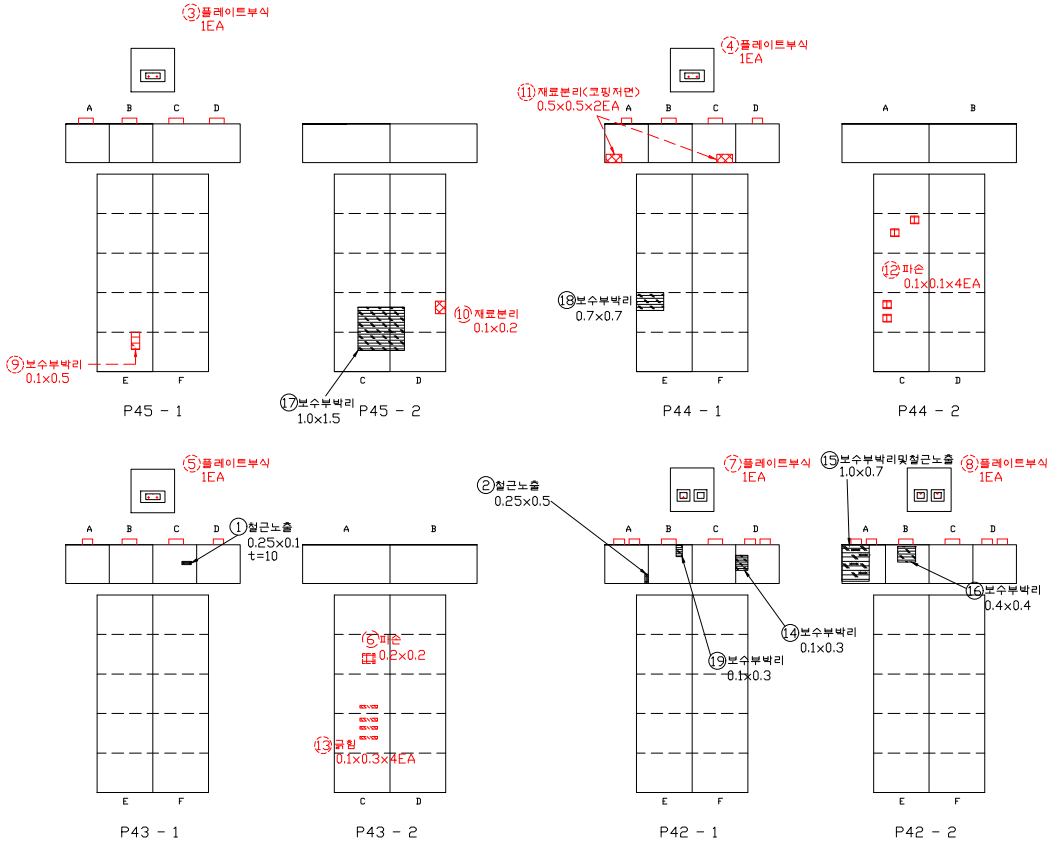


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	철근노출	0.25	0.10		0.03	㎡	1.00				신규	1
2	2019	철근노출	0.25	0.50		0.13	㎡	1.00				신규	1
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2014	파손	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					2
7	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
8	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
9	2016	보수부 박리	0.10	0.50		0.05	㎡	1.00					2
10	2016	재료분리	0.10	0.20		0.02	㎡	1.00					2
11	2016	재료분리	0.50	0.50		0.50	㎡	2.00					2
12	2018	파손	0.10	0.10	10	0.04	㎡	4.00					2
13	2018	균열	0.10	0.03		0.12	㎡	4.00					2
14	2019	보수부박리	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00				신규	2
15	2019	보수부박리 및 철근노출	1.00	0.70		0.70	㎡	1.00				신규	2
16	2019	보수부박리	0.40	0.40		0.16	㎡	1.00				신규	2
17	2019	보수부박리	1.00	1.50		1.50	㎡	1.00				신규	2
18	2019	보수부박리	0.70	0.70		0.49	㎡	1.00				신규	2
19	2019	보수부박리	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00				신규	2
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	136

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

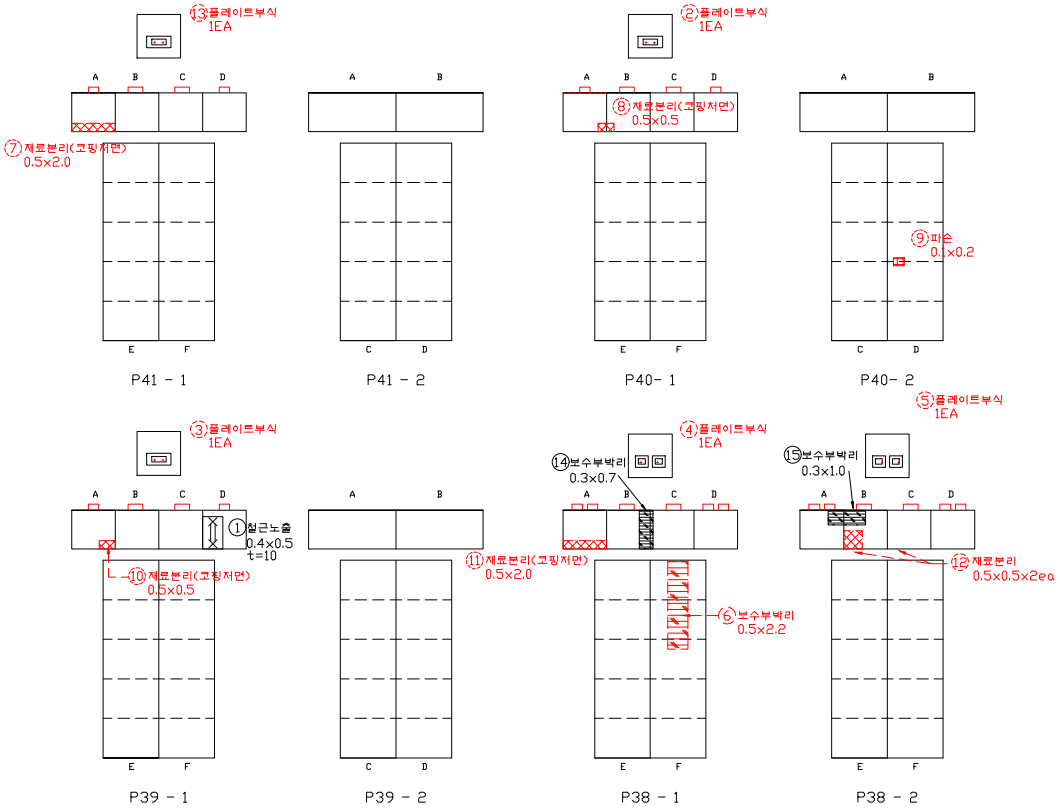


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	철근노출	0.40	0.50		0.20	㎡	1.00				신규	1
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2016	보수부박리	0.50	2.20		1.10	㎡	1.00					2
7	2016	재료분리	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
8	2016	재료분리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
9	2016	파손	0.10	0.20		0.02	㎡	1.00					2
10	2016	재료분리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
11	2016	재료분리	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
12	2018	재료분리	0.50	0.50		0.50	㎡	2.00					2
13	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
14	2019	보수부박리	0.30	0.70		0.21	㎡	1.00				신규	2
15	2019	보수부박리	0.30	1.00		0.30	㎡	1.00				신규	2
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	137

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

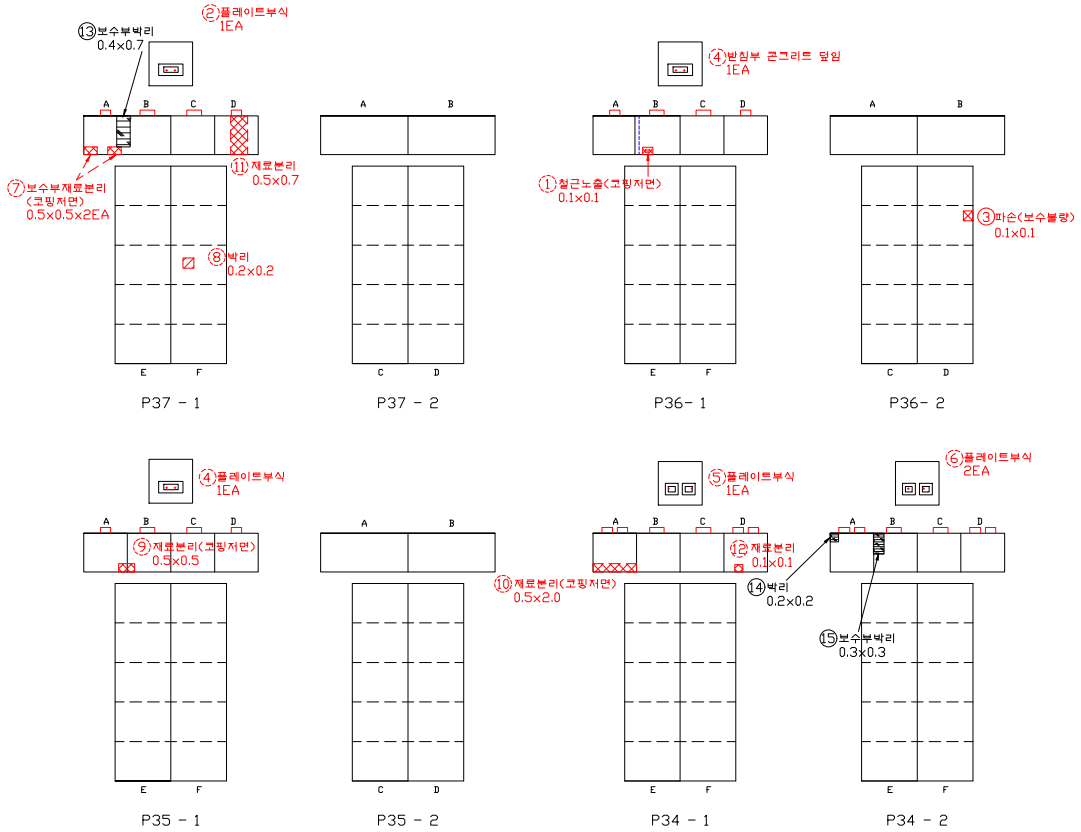


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	철근노출	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					1
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2014	파손(보수불량)	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				2.00	EA	2.00					2
6	2011	플레이트 부식				2.00	EA	2.00					2
7	2016	보수부 재료분리	0.50	0.50		0.50	㎡	2.00					2
8	2016	박리	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					2
9	2016	재료분리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
10	2016	재료분리	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
11	2018	재료분리	0.50	0.70		0.35	㎡	1.00					2
12	2018	재료분리	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
13	2019	보수부박리	0.40	0.70		0.28	㎡	1.00				신규	2
14	2019	박리	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00				신규	2
15	2019	보수부박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00				신규	2
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	138

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

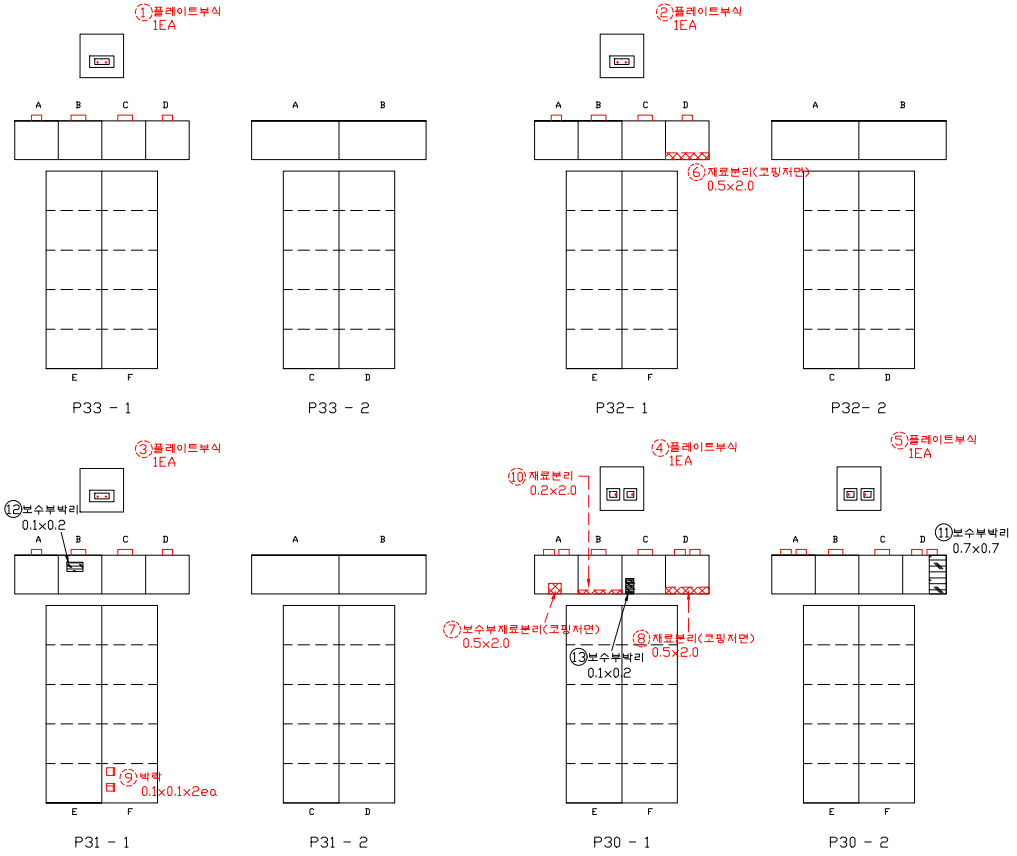


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2016	재료분리	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
7	2016	보수부 재료분리	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
8	2016	재료분리	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
9	2018	박락	0.10	0.10		0.02	㎡	2.00					2
10	2018	재료분리	0.20	2.00		0.40	㎡	1.00					2
11	2019	보수부박리	0.70	0.70		0.49	㎡	1.00				신규	2
12	2019	보수부박리	0.10	0.20		0.02	㎡	1.00				신규	2
13	2019	보수부박리	0.10	0.20		0.02	㎡	1.00				신규	2
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역						
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08	
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열	
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환	
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	139	

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

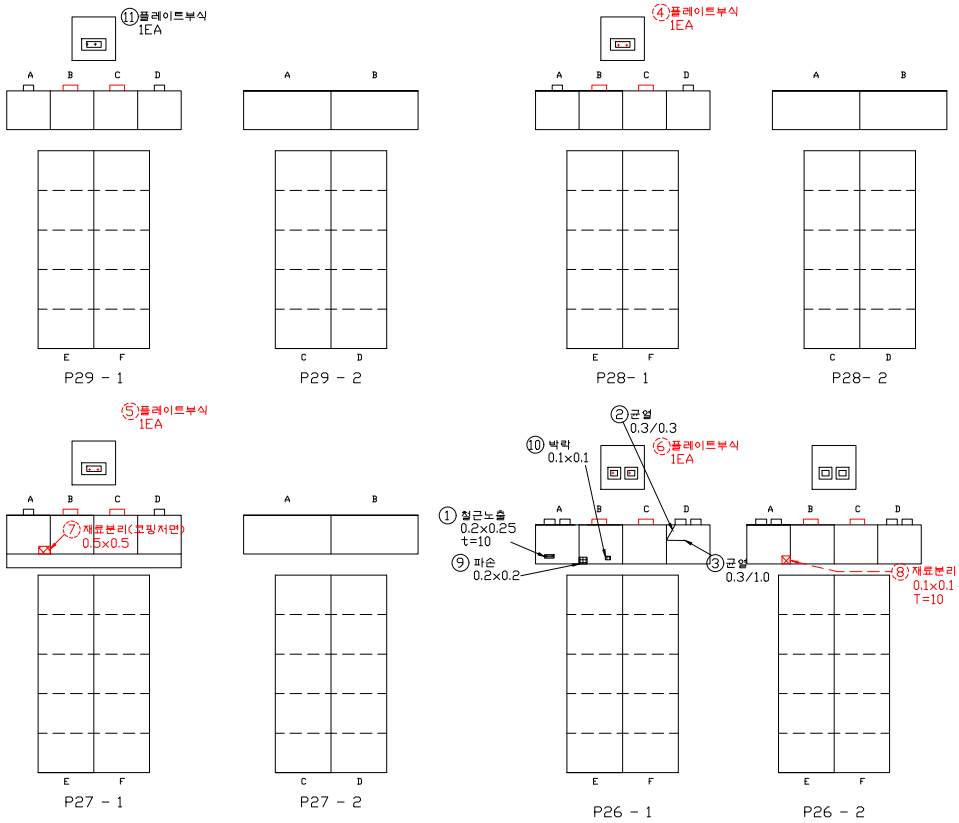


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	철근노출	0.20	0.25		0.05	㎡	1.00				신규	1
2	2019	균열	0.30	0.30		0.30	m	1.00				신규	1
3	2019	균열	0.30	1.00		1.00	m	1.00				신규	1
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
7	2016	재료분리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
8	2018	재료분리	0.10	0.10	10	0.01	㎡	1.00					2
9	2019	파손	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00				신규	2
10	2019	박락	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00				신규	2
11	2019	플레이트 부식				1.00	EA	1.00				신규	2
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	140

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

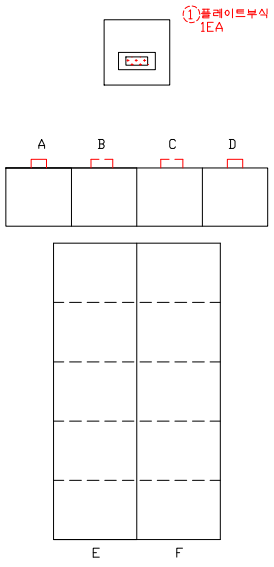

P25 - 1

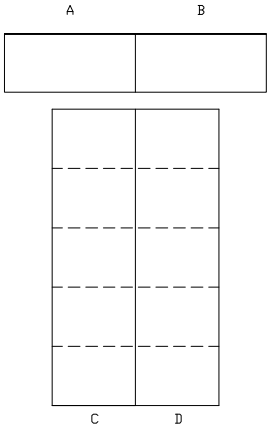


P25 - 2

손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	141

1.5 2련 (1순위)

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

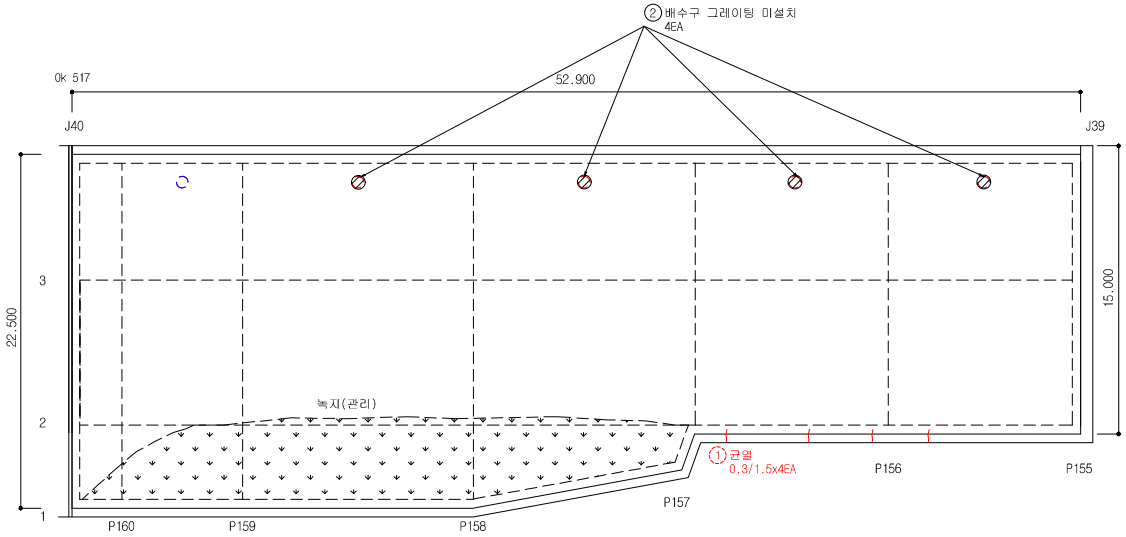


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		6.00	m	4.00					1
2	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	001

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

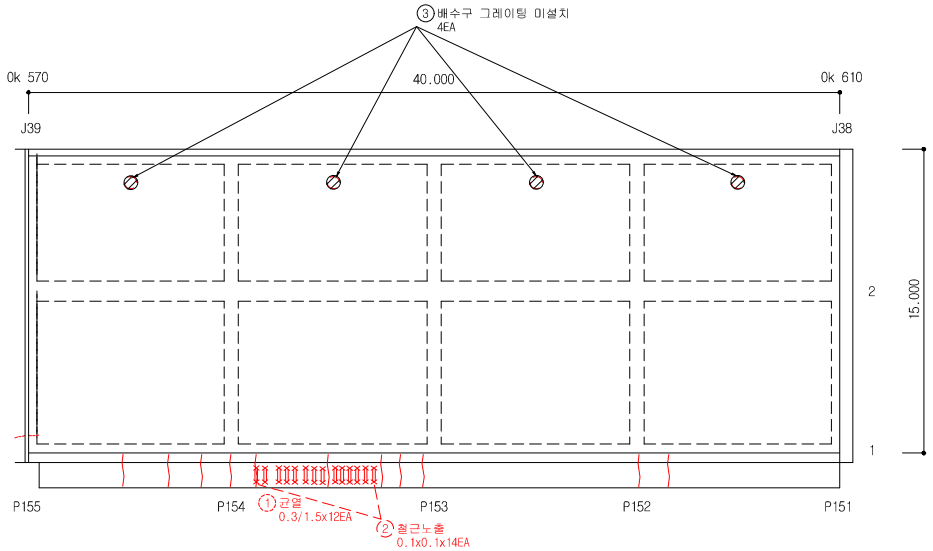


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		18.00	m	12.00					1
2	2018	철근노출	0.10	0.10		0.14	㎡	14.00					1
3	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	002

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

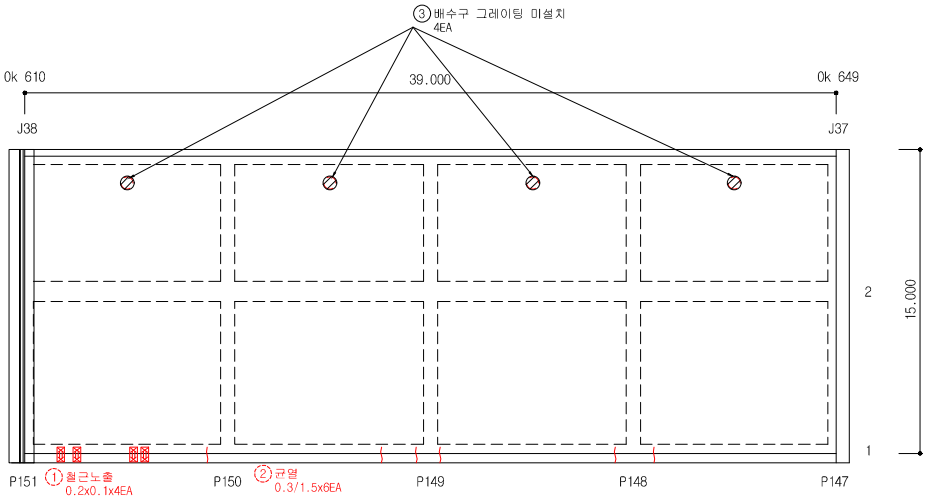


손 상 물 량 표

연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	철근노출	0.20	0.10		0.08	㎡	4.00					1
2	2016	균열	0.30	1.50		9.00	m	6.00					1
3	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	003

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

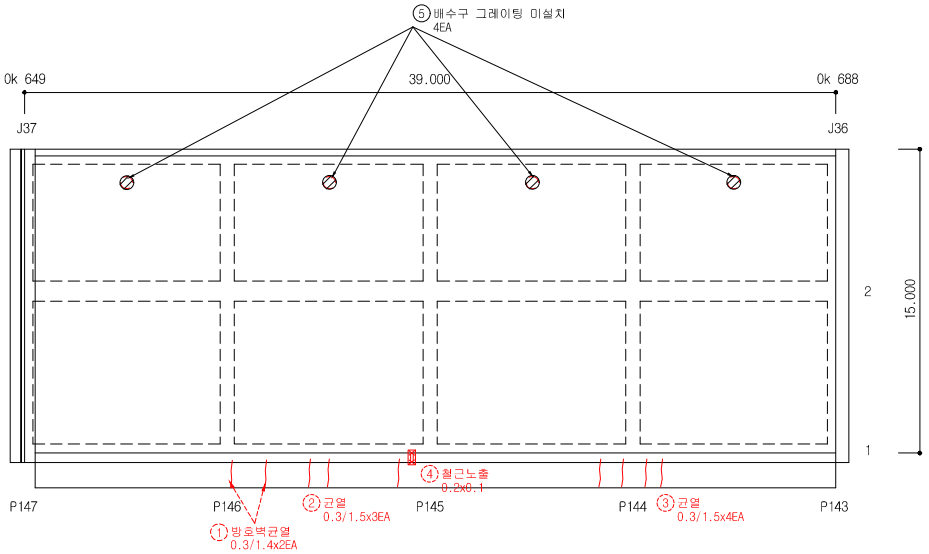


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	방호벽균열	0.30	1.40		2.80	m	2.00					1
2	2016	균열	0.30	1.50		4.50	m	3.00					1
3	2016	균열	0.30	1.50		6.00	m	4.00					1
4	2016	철근노출	0.20	0.10		0.02	㎡	1.00					1
5	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	얼회	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	004

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

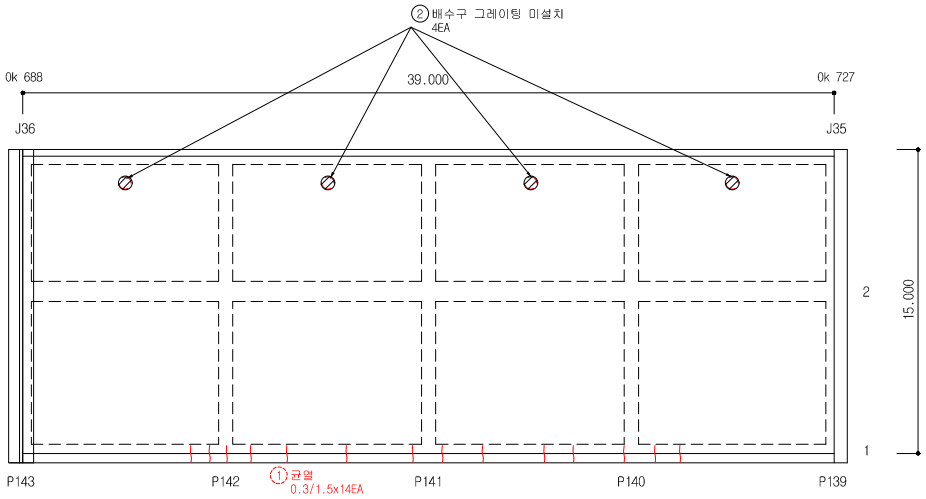


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		21.00	m	14.00					1
2	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	005

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

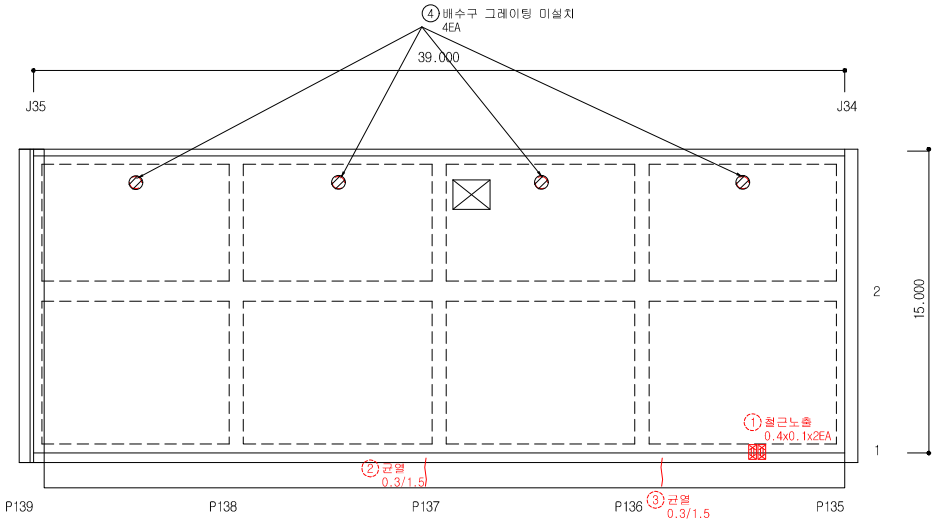


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	철근노출	0.40	0.10		0.08	㎡	2.00					1
2	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
3	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
4	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	006

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

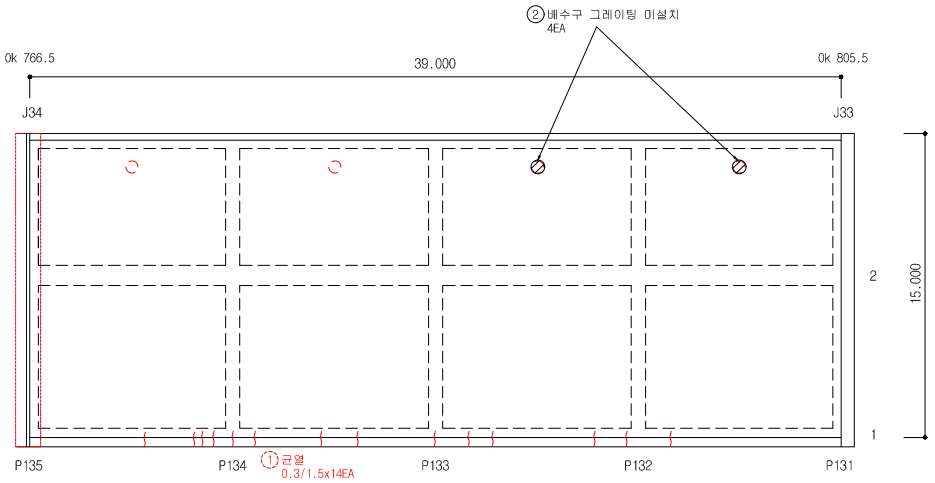


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		21.00	m	14.00					1
2	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		2.00	EA	2.00				신규	1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	007

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

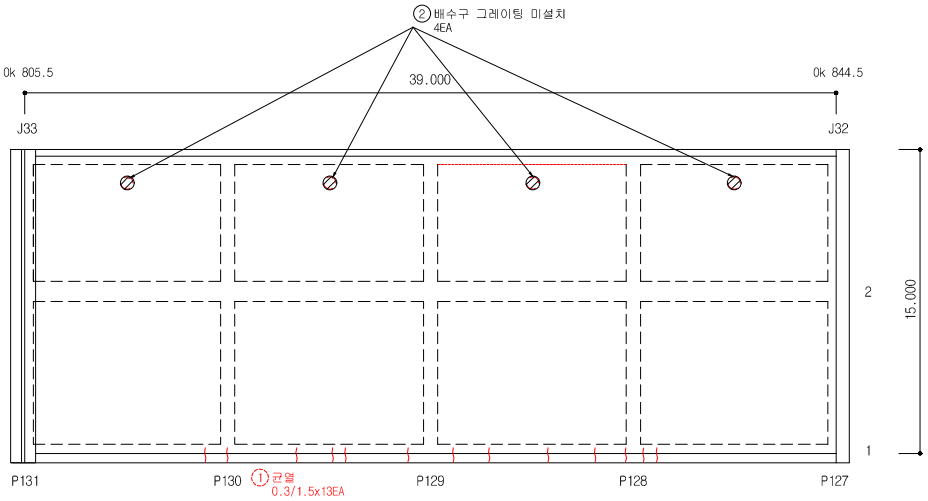


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		19.50	m	13.00					1
2	2019	배수구그레이딩 미설치	-	-		2.00	EA	2.00				신규	1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	008

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

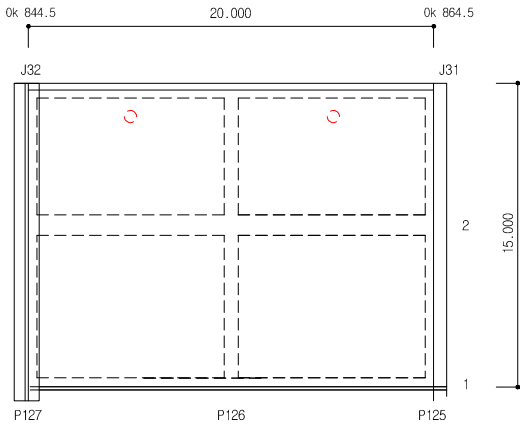


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	009

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

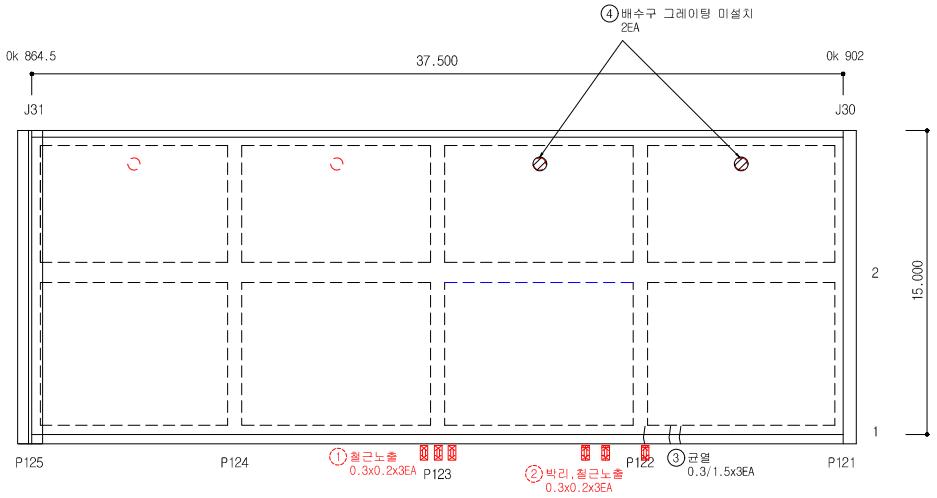


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	철근노출	0.30	0.20		0.18	㎡	3.00					1
2	2016	박리,철근노출	0.30	0.20		0.18	㎡	3.00					1
3	2019	균열	0.30	1.50		4.50	m	3.00				신규	1
4	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		2.00	EA	2.00				신규	1
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	얼룩	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	010

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

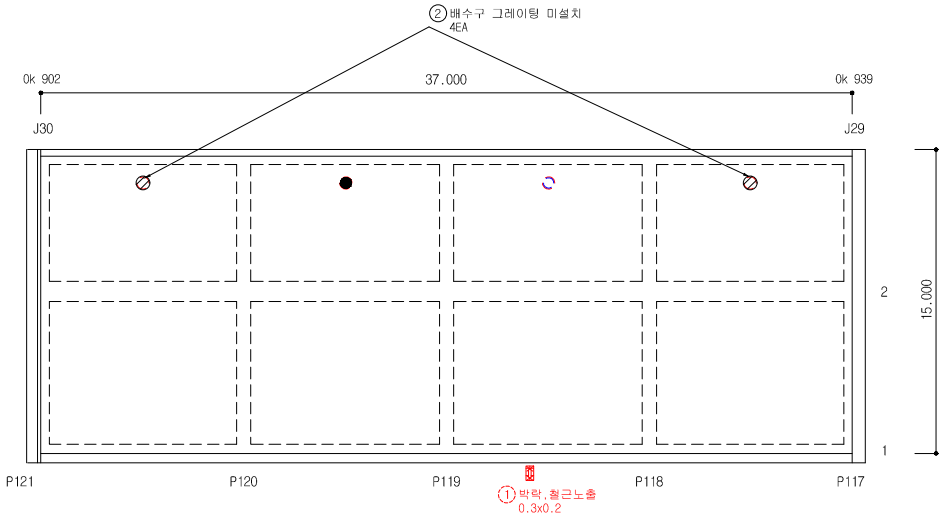


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	박락,철근노출	0.30	0.20		0.06	㎡	1.00					1
2	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		2.00	EA	2.00				신규	1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	011

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

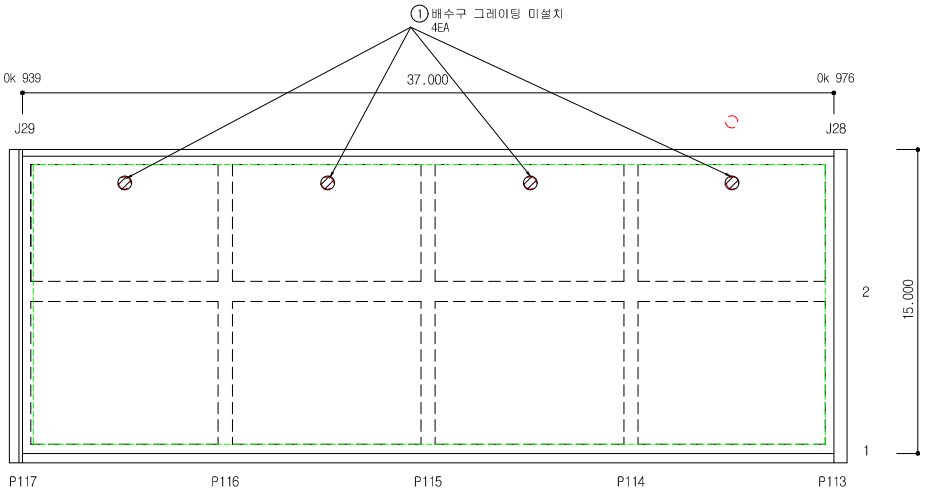


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	012

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

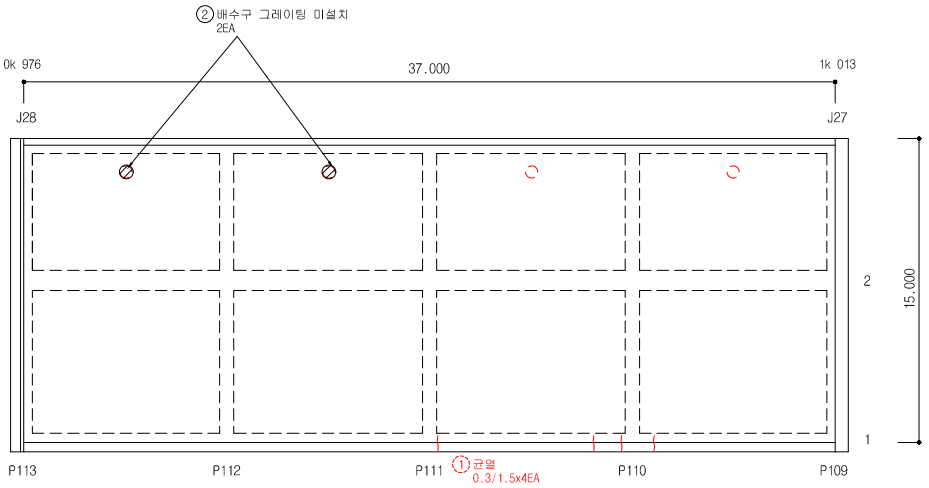


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		6.00	m	4.00					1
2	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		2.00	EA	2.00				신규	1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	013

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

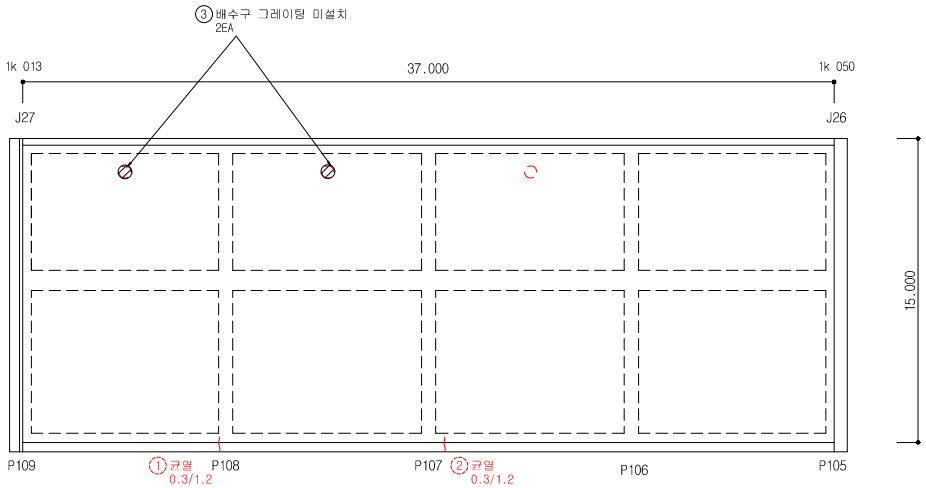


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.20		1.20	m	1.00					1
2	2016	균열	0.30	1.20		1.20	m	1.00					1
3	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		2.00	EA	2.00				신규	1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	014

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

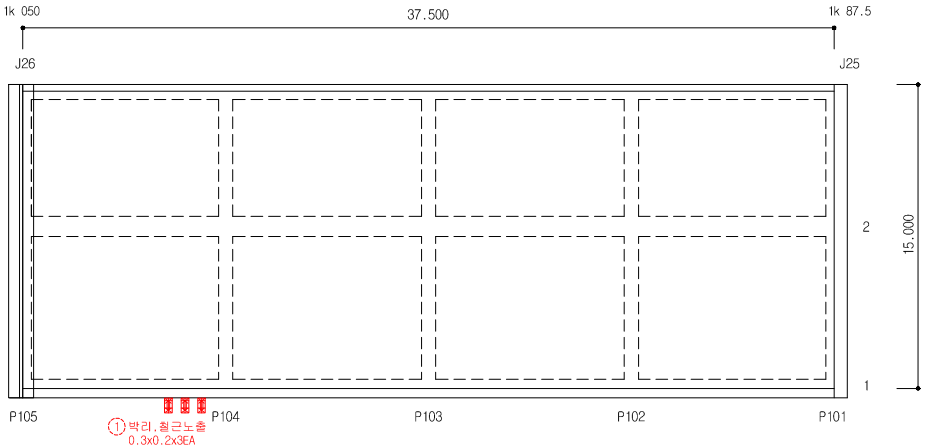


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	박리,철근노출	0.30	0.20		0.18	㎡	3.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	015

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

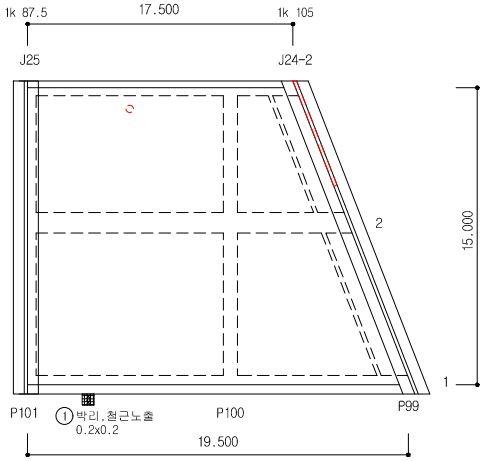


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	박리,철근노출	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00				신규	1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	016

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

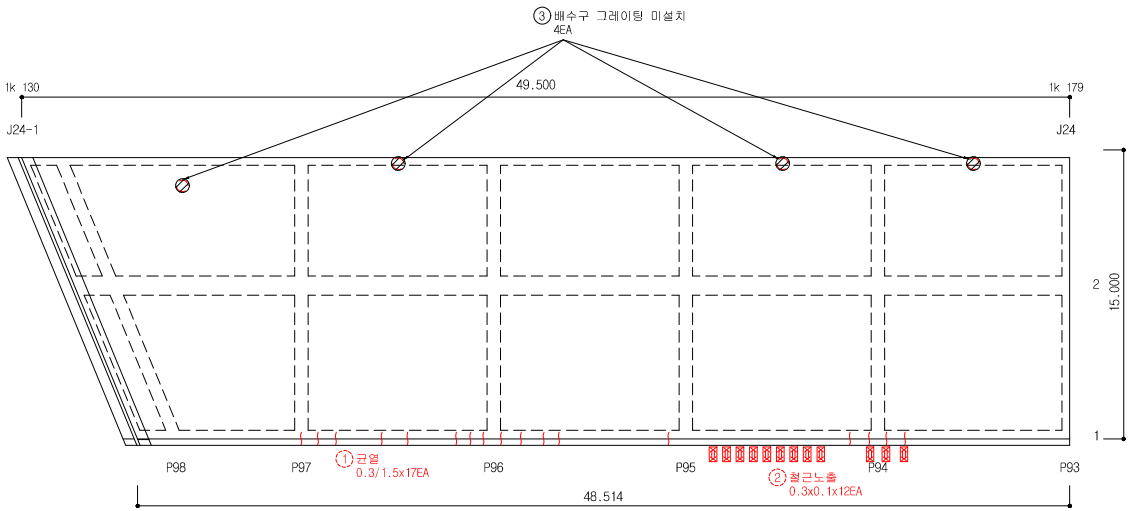


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		25.50	m	17.00					1
2	2016	철근노출	0.30	0.10		0.36	㎡	12.00					1
3	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	017

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

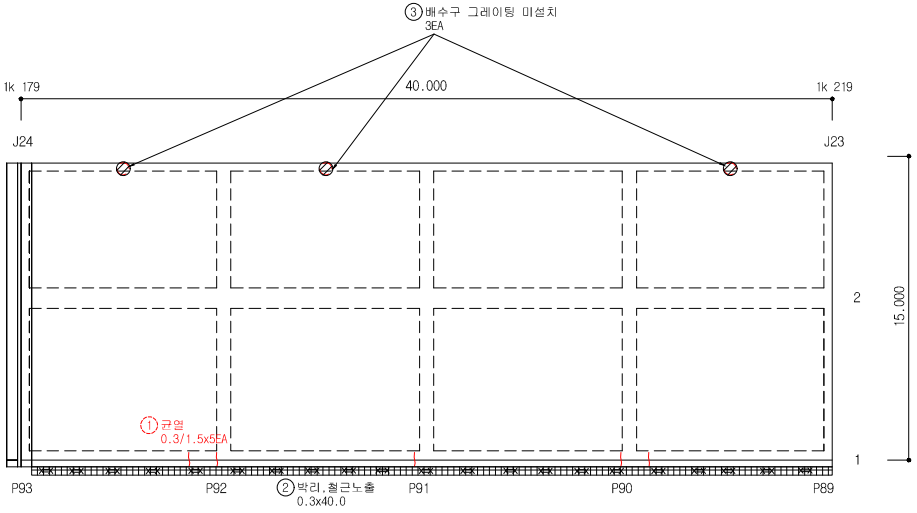


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		7.50	m	5.00					1
2	2019	박리,철근노출	0.30	40.00		12.00	㎡	1.00				신규	1
3	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		3.00	EA	3.00				신규	1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	018

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

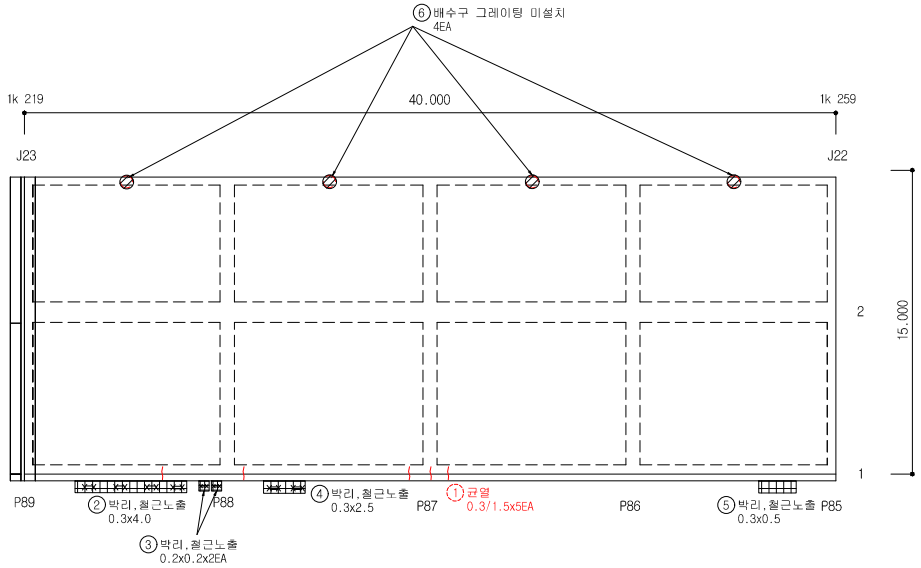


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		7.50	m	5.00					1
2	2019	박리,철근노출	0.30	4.00		1.20	㎡	1.00				신규	1
3	2019	박리,철근노출	0.20	0.20		0.08	㎡	2.00				신규	1
4	2019	박리,철근노출	0.30	2.50		0.75	㎡	1.00				신규	1
5	2019	박리,철근노출	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00				신규	1
6	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	019

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

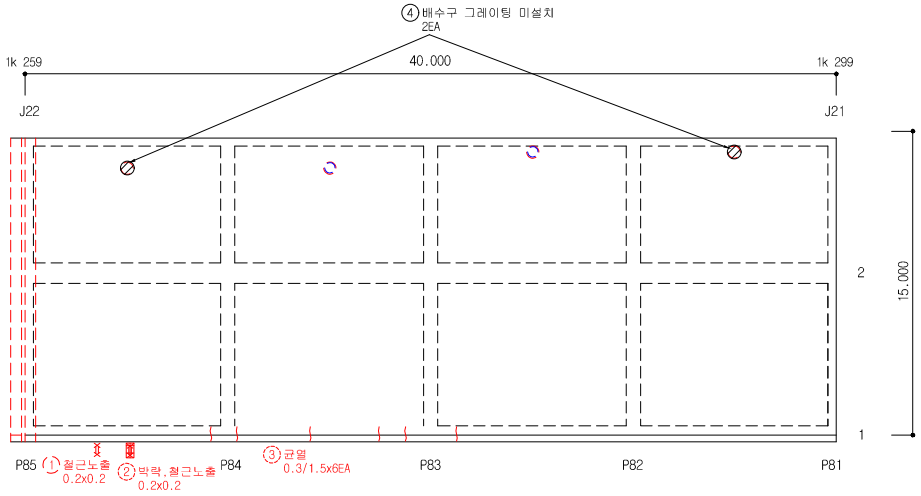


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	철근노출	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					1
2	2016	박락,철근노출	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					1
3	2016	균열	0.30	1.50		9.00	m	6.00					1
4	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		2.00	EA	2.00				신규	1
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	020

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

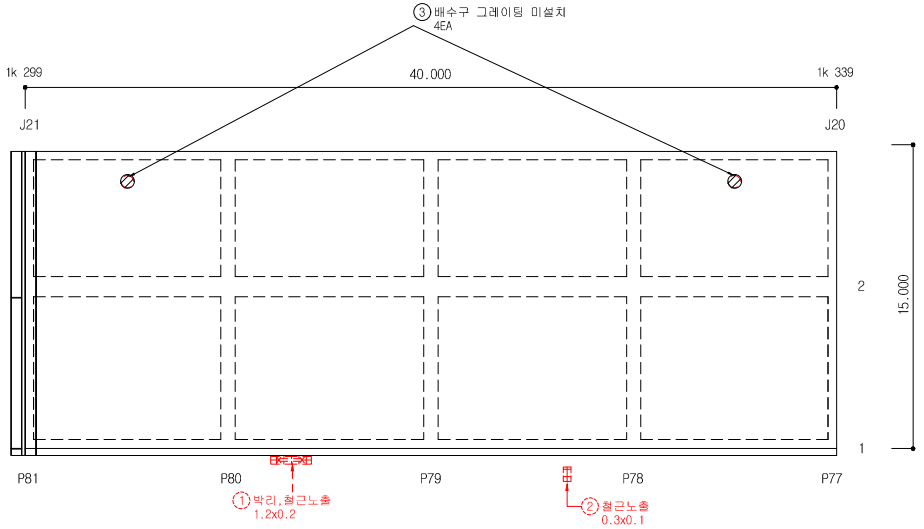


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	박리,철근노출	1.20	0.20		0.24	㎡	1.00					1
2	2016	철근노출	0.30	0.10		0.03	㎡	1.00					1
3	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		2.00	EA	2.00				신규	1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	021

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

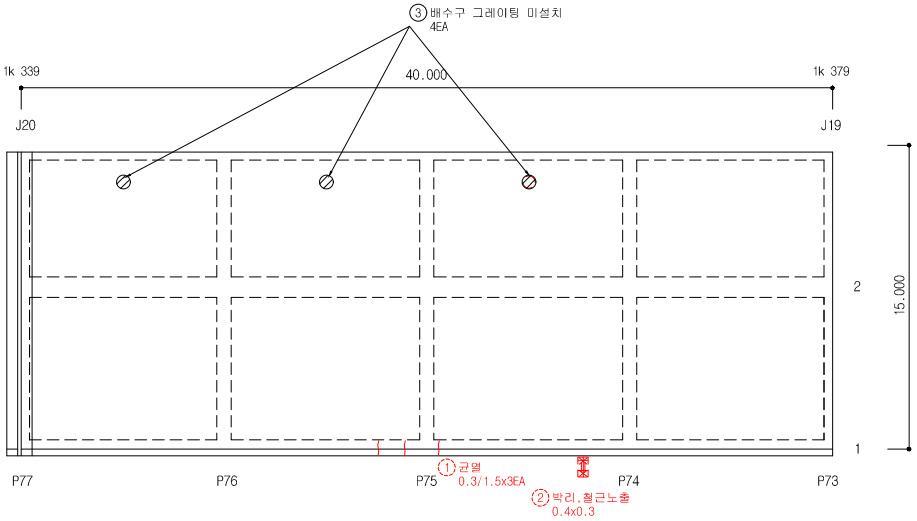


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		4.50	m	3.00					1
2	2016	박리,철근노출	0.40	0.30		0.12	㎡	1.00					1
3	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	얼회	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	022

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

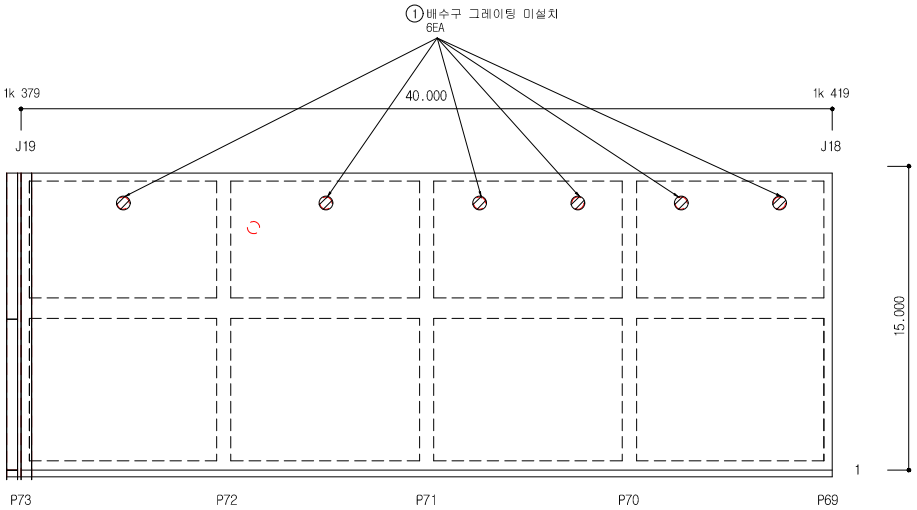


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		6.00	EA	6.00				신규	1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	023

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

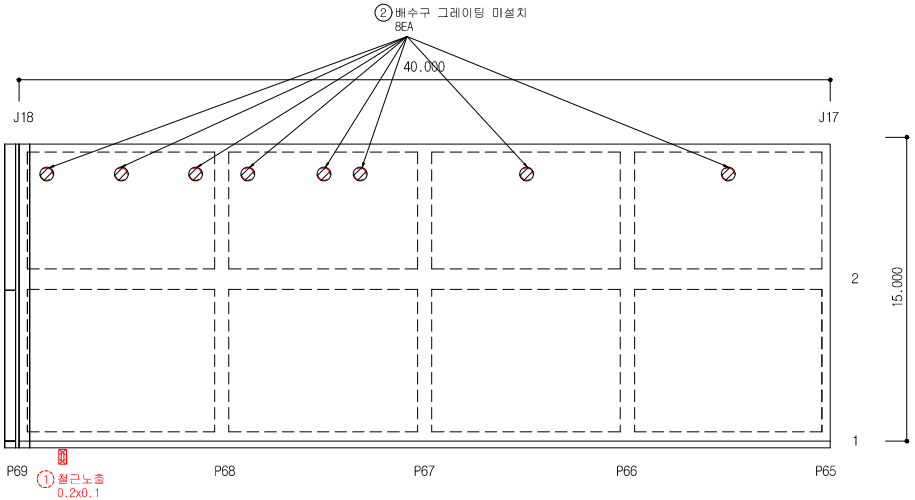


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	철근노출	0.20	0.10		0.02	㎡	1.00					1
2	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		8.00	EA	8.00				신규	1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	024

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

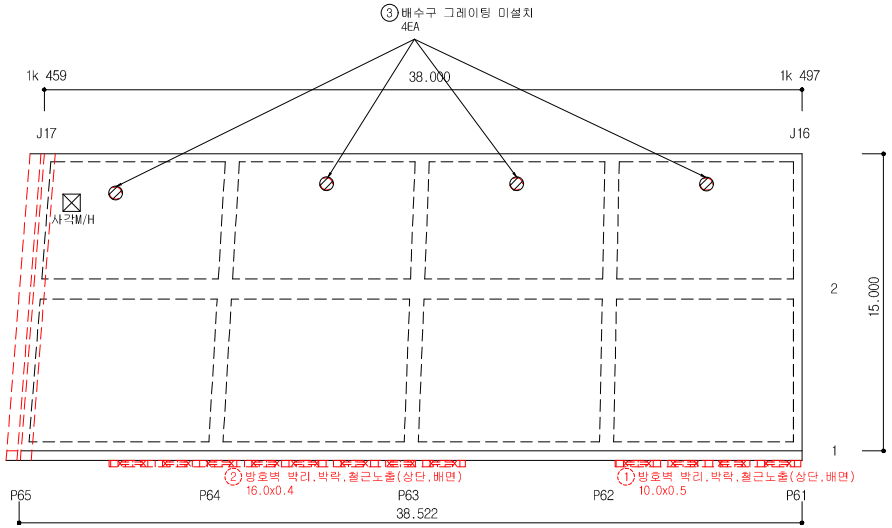


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	방호벽 박리,박락,철근노출(상단,배면)	10.00	0.50		5.00	㎡	1.00					1
2	2016	방호벽 박리,박락,철근노출(상단,배면)	16.00	0.40		6.40	㎡	1.00					1
3	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	025

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

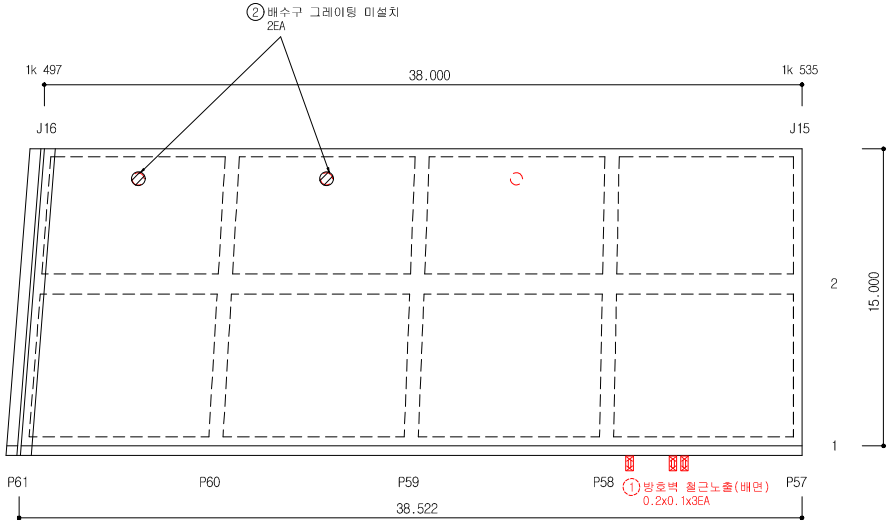


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	방호벽 철근노출	0.20	0.10		0.06	㎡	3.00					1
2	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		2.00	EA	2.00				신규	1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	026

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

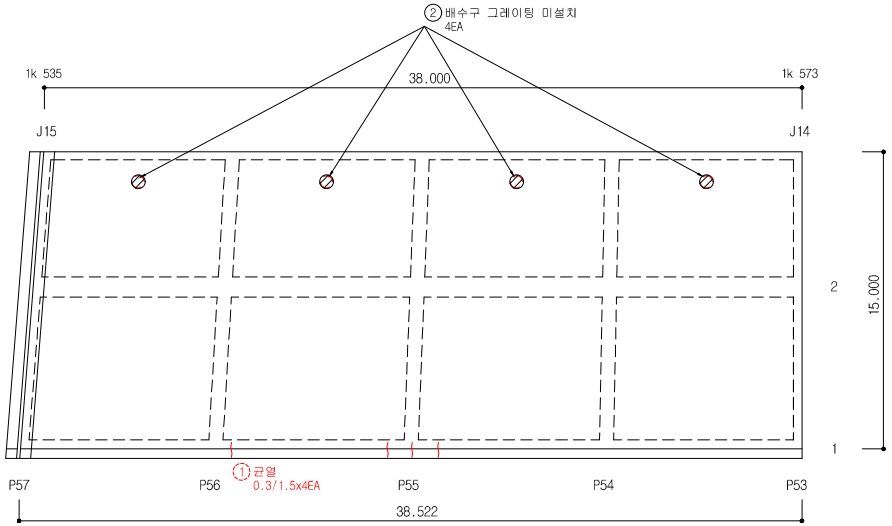


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		6.00	m	4.00					1
2	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	027

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

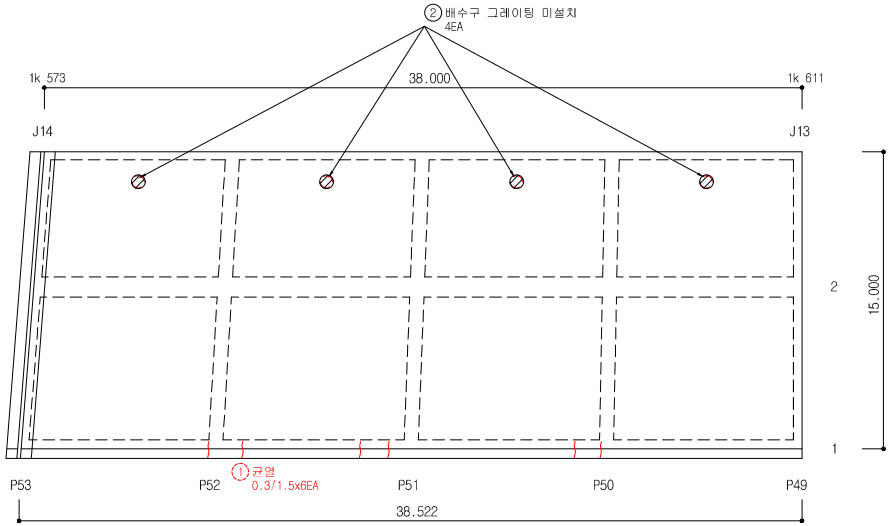


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		9.00	m	6.00					1
2	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		4.00	EA	4.00				신규	1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	028

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

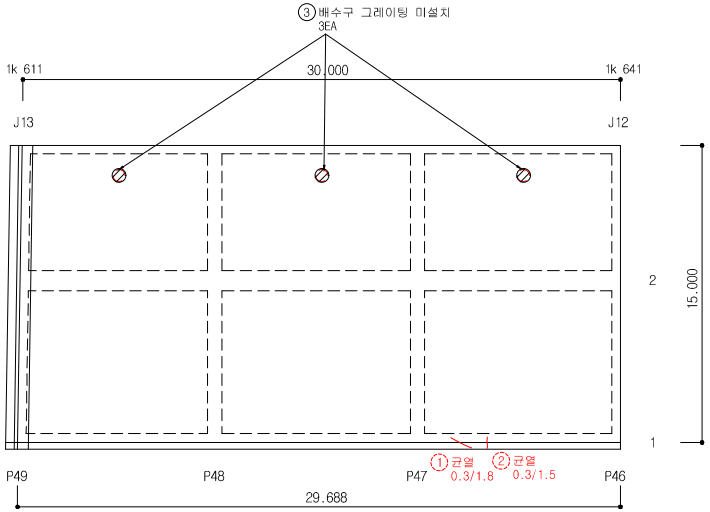


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.80		1.80	m	1.00					1
2	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
3	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		3.00	EA	3.00				신규	1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	029

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

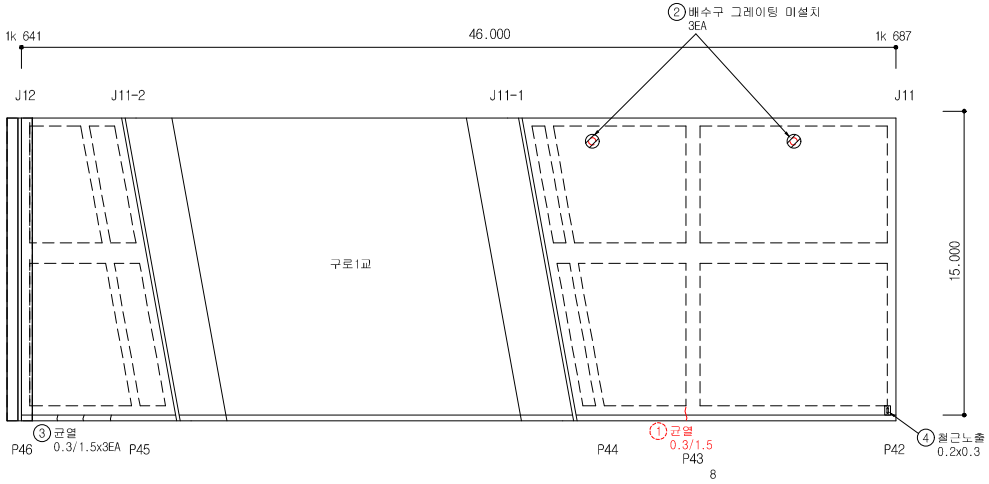


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
2	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		3.00	EA	3.00				신규	1
3	2019	균열	0.30	1.50		4.50	m	3.00				신규	1
4	2019	철근노출	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00				신규	1
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	030

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

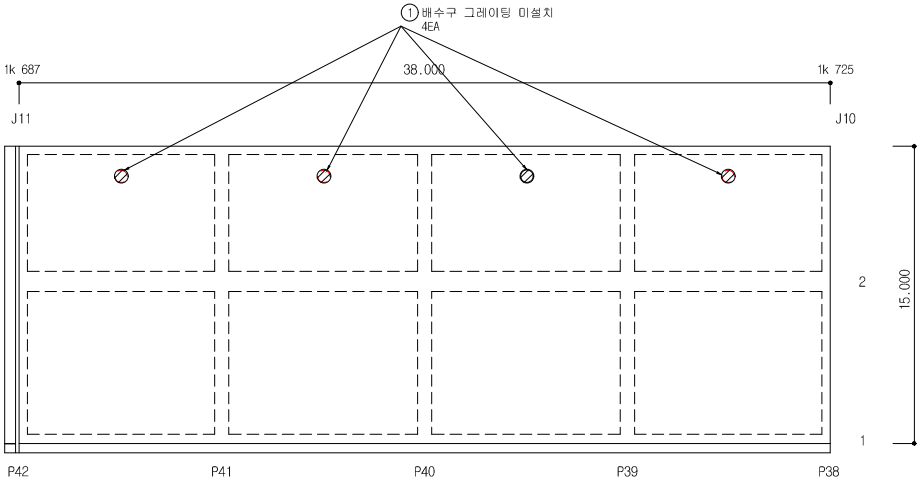


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		2.00	EA	2.00				신규	1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	031

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

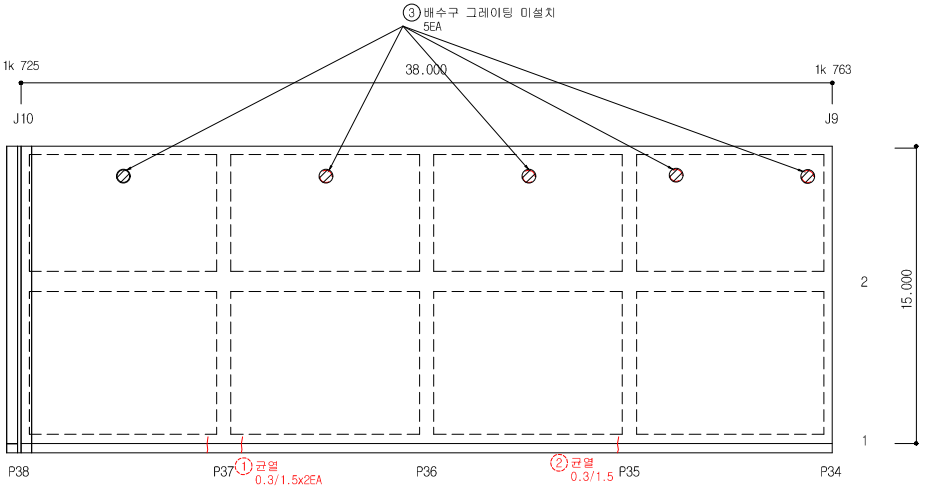


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		3.00	m	2.00					1
2	2016	균열	0.30	1.50		1.50	m	1.00					1
3	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		5.00	EA	2.00				신규	1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	032

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

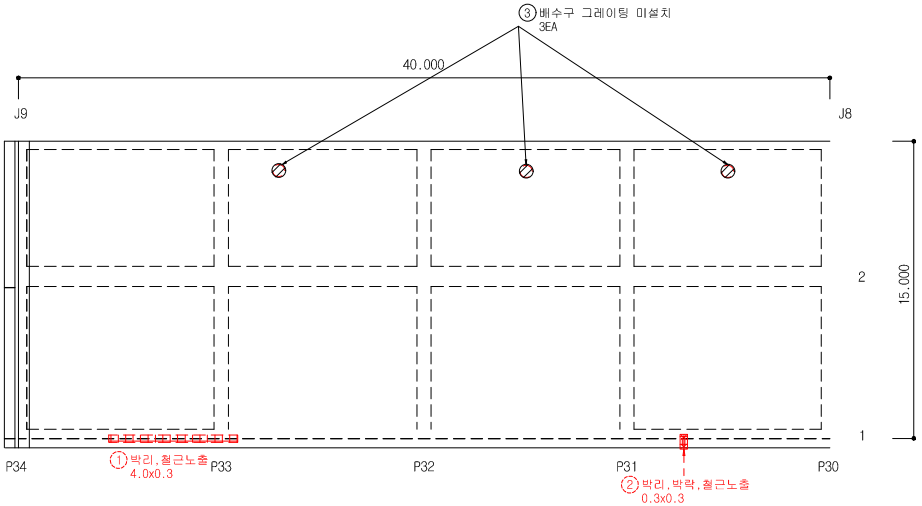


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	박리,철근노출	4.00	0.30		1.20	㎡	1.00					1
2	2016	박리,박락,철근노출	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					1
3	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		5.00	EA	2.00				신규	1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	033

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

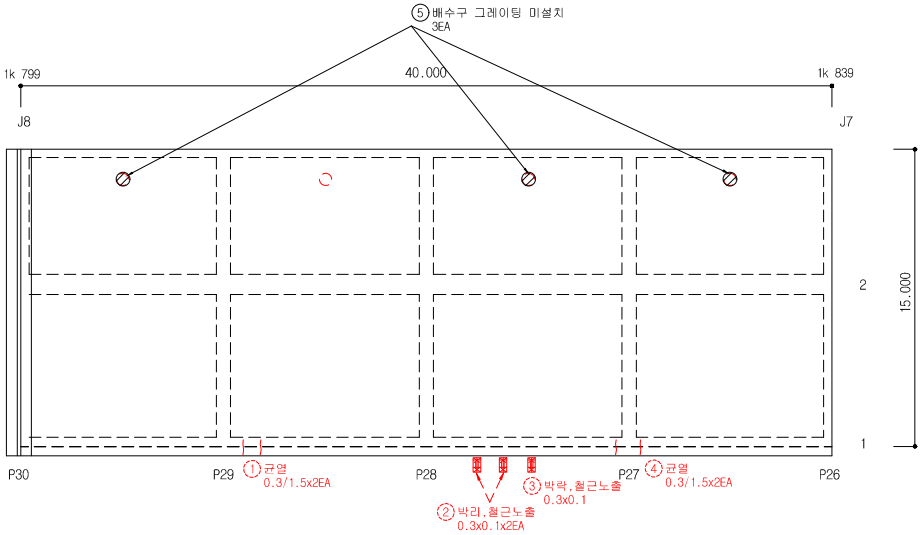


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	1.50		3.00	m	2.00					1
2	2016	박리,철근노출	0.30	0.10		0.06	㎡	2.00					1
3	2016	박락,철근노출	0.30	0.10		0.03	㎡	1.00					1
4	2016	균열	0.30	1.50		3.00	m	2.00					1
5	2019	배수구그레이팅 미설치	-	-		3.00	EA	3.00				신규	1
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	034

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

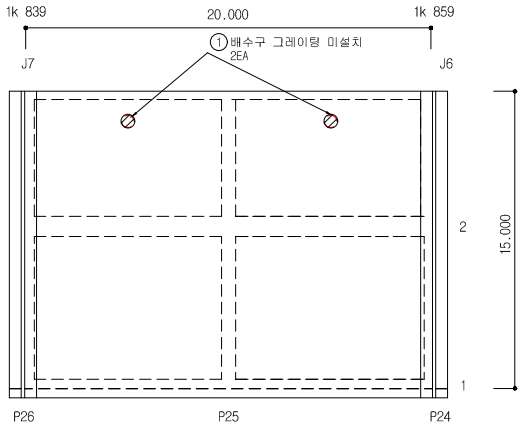


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	배수구그레이딩 미설치	-	-		2.00	EA	2.00				신규	1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	035

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

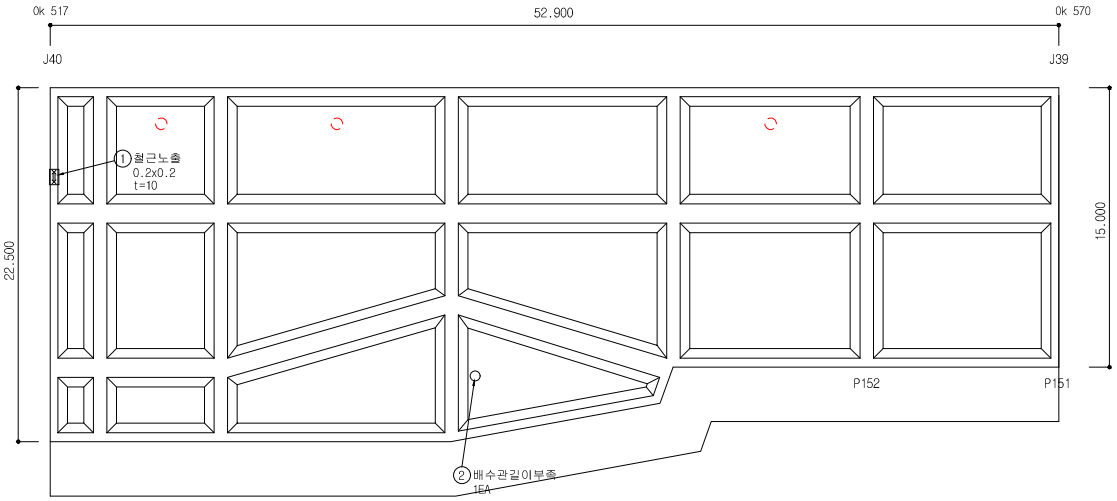


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	철근노출	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00				신규	1
2	2019	배수관길이부족	-	-		1.00	EA	1.00				신규	1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	036

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

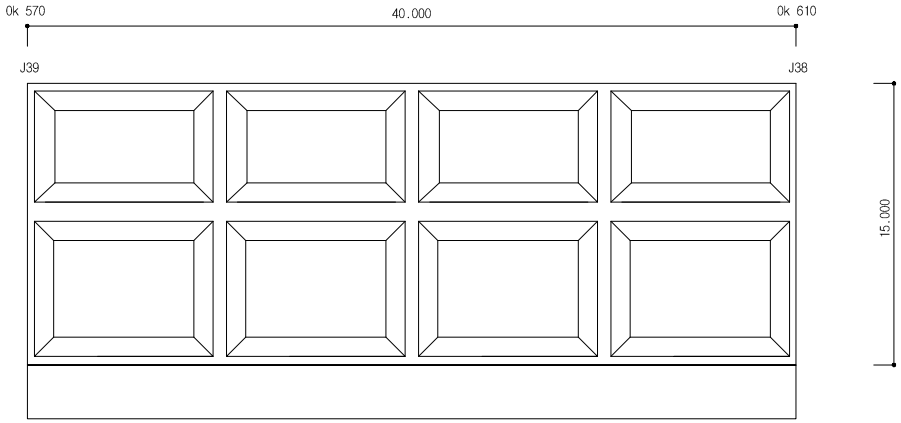


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	037

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

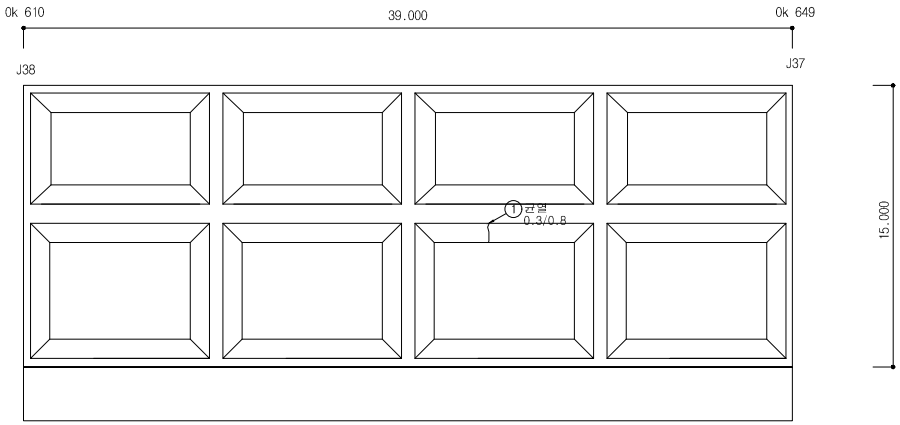


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00				신규	1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	038

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

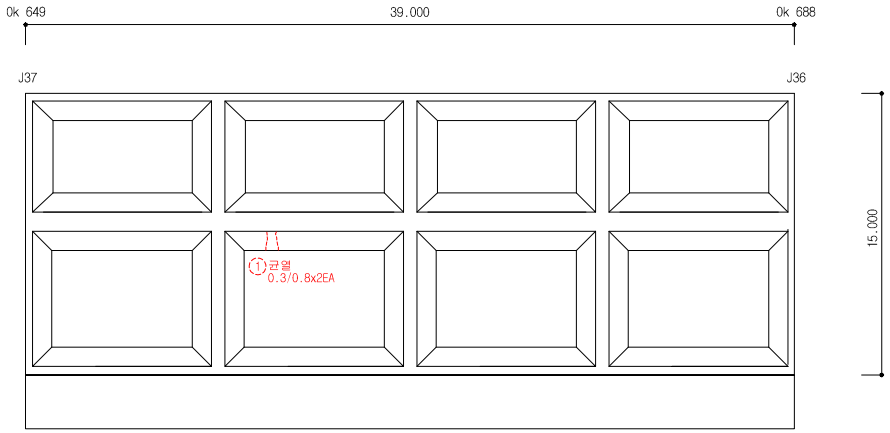


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	균열	0.30	0.80		1.60	m	2.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	039

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

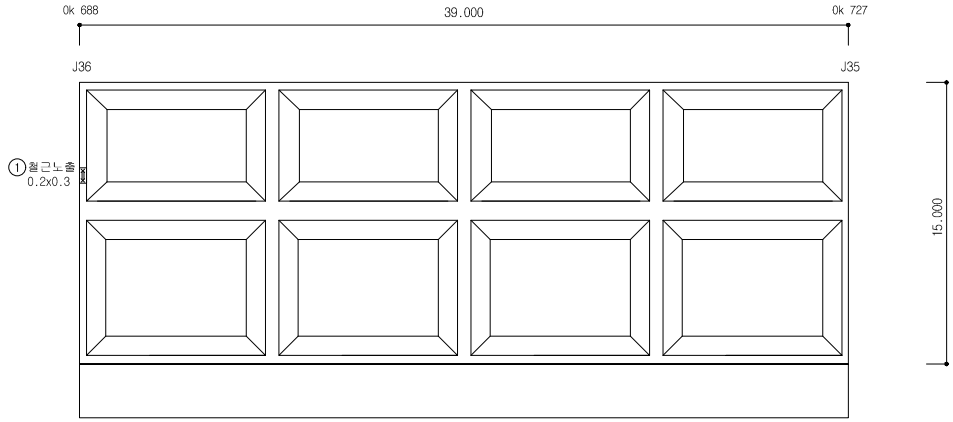


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	철근노출	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00				신규	1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	040

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

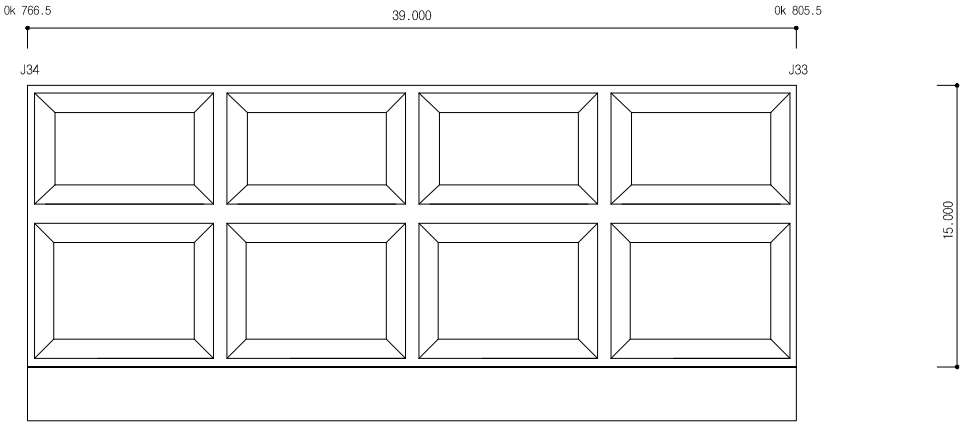


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	041

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

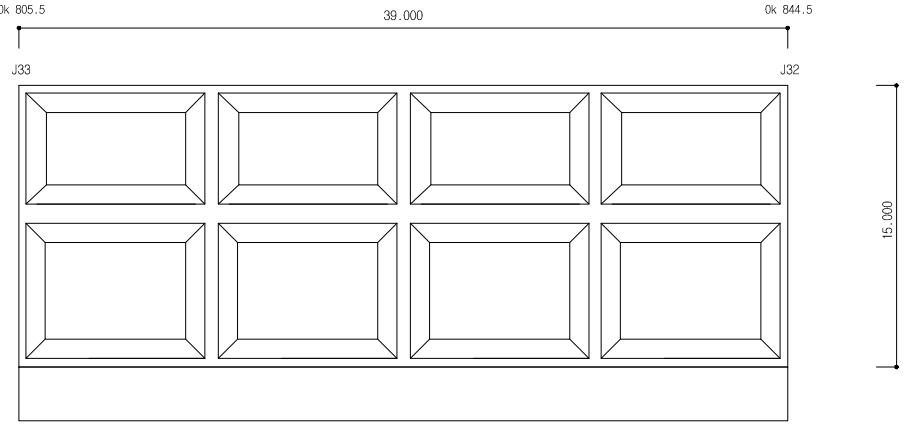


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	042

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

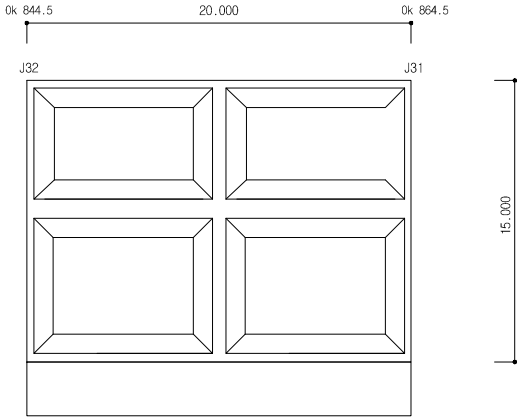


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	043

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

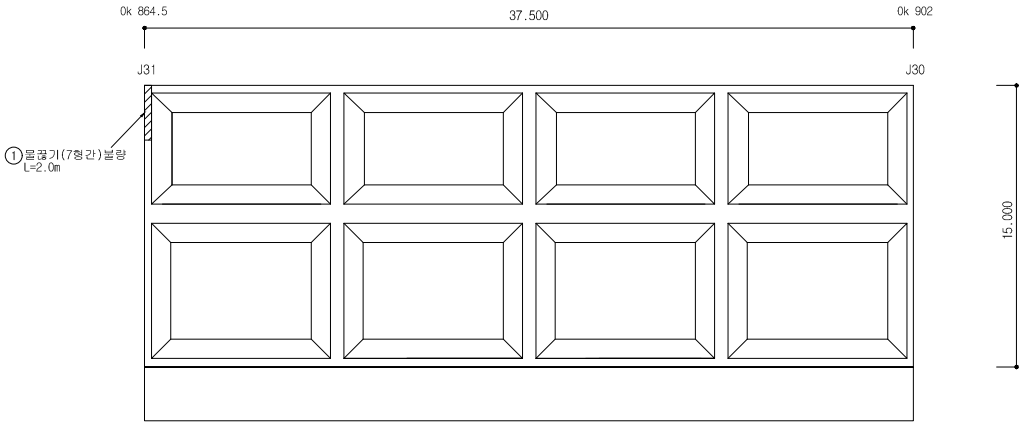


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (mm)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	물끊기불량		2.00		2.00	m	1.00				신규	1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	044

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

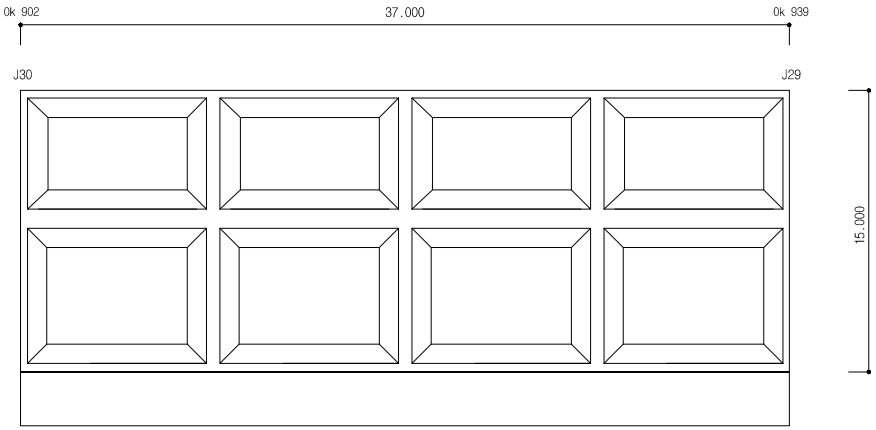


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	045

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

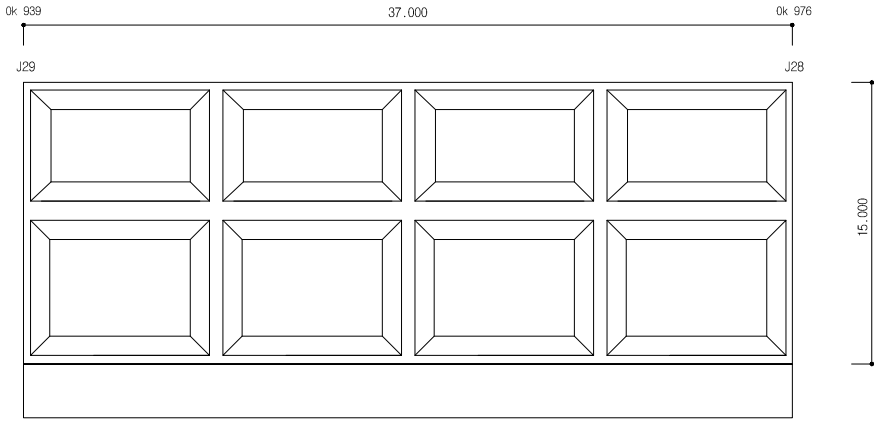


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	046

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

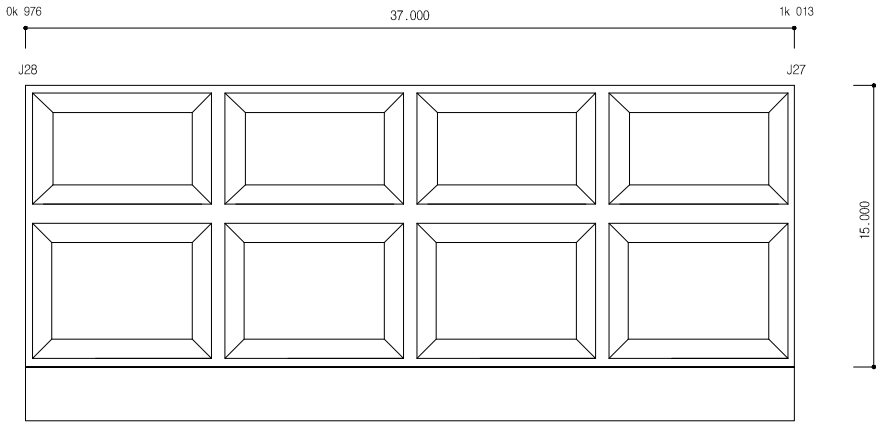


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	047

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

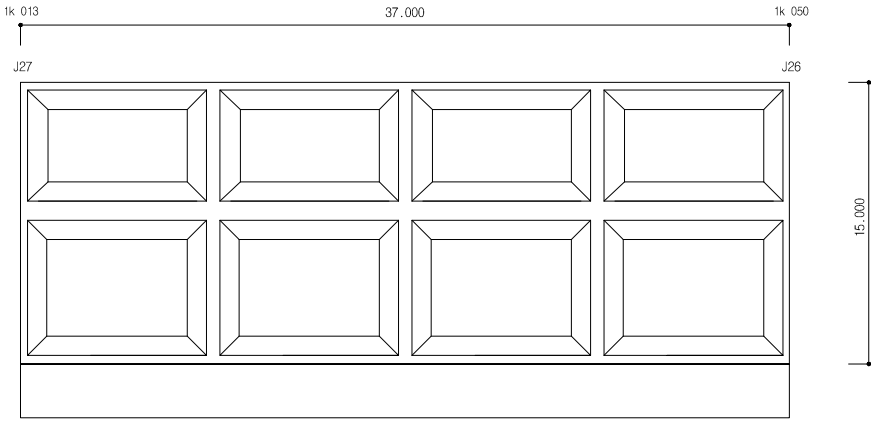


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	048

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

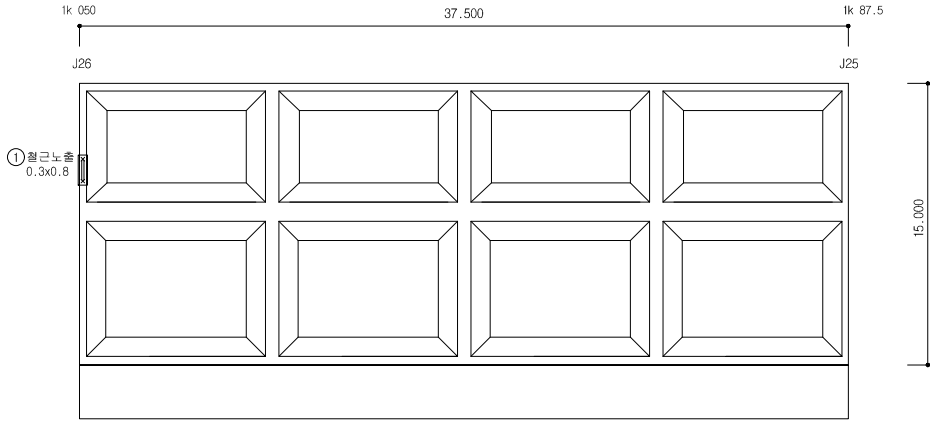


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	철근노출	0.30	0.80		0.24	㎡	1.00				신규	1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	049

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

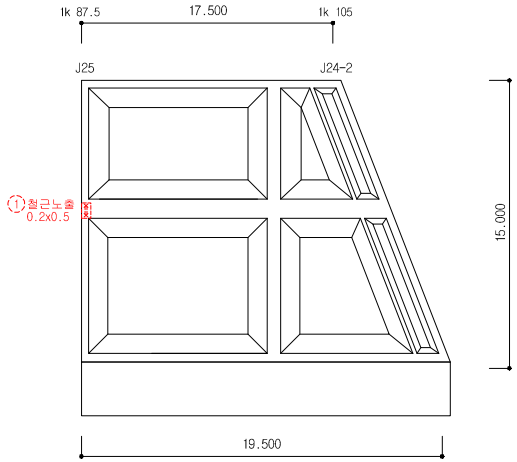


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	철근노출	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	050

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

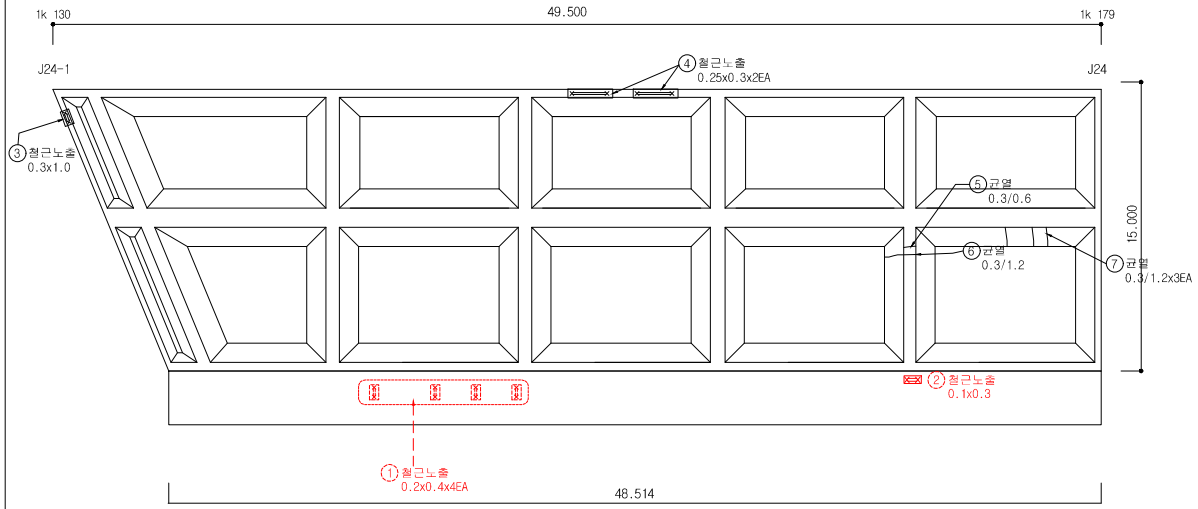


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	철근노출	0.20	0.40		0.32	㎡	4.00					1
2	2016	철근노출	0.10	0.30		0.30	m	1.00					1
3	2019	철근노출	0.30	1.00		0.30	㎡	1.00				신규	1
4	2019	철근노출	0.25	0.30		0.15	㎡	2.00				신규	1
5	2019	균열	0.30	0.60		0.60	m	1.00				신규	1
6	2019	균열	0.30	1.20		1.20	m	1.00				신규	1
7	2019	균열	0.30	1.20		2.40	m	3.00				신규	1
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	051

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

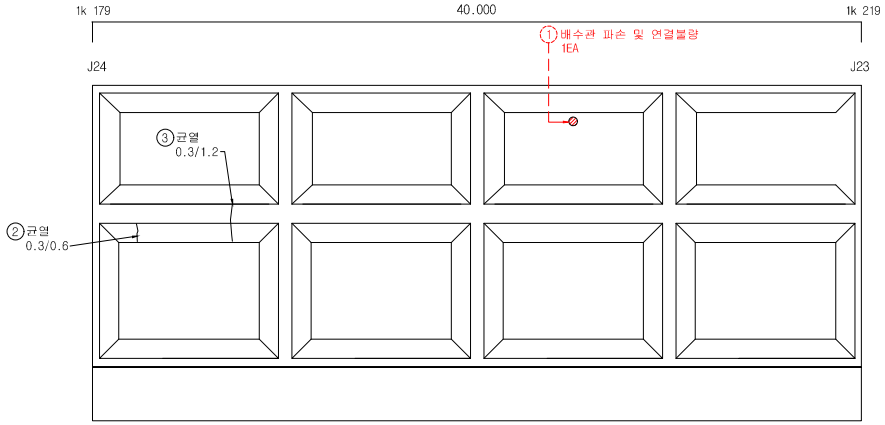


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수관 파손 및 연결불량				1.00	EA	1.00					1
2	2019	균열	0.30	0.60		0.30	m	1.00				신규	1
3	2019	균열	0.30	1.20		1.20	m	1.00				신규	1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	052

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

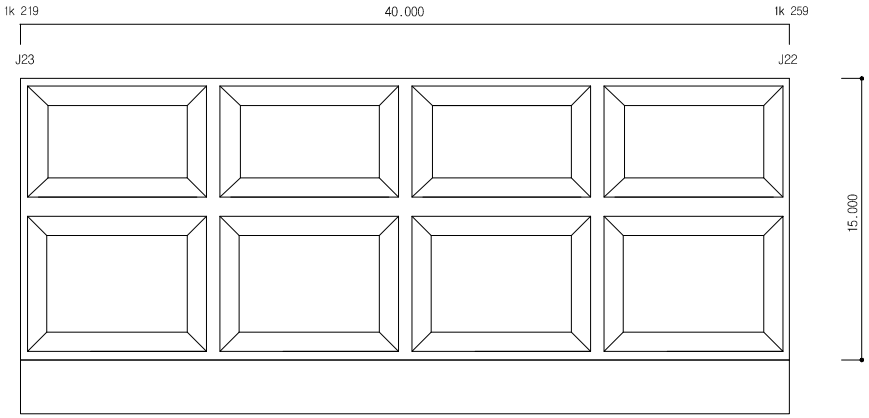


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	053

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

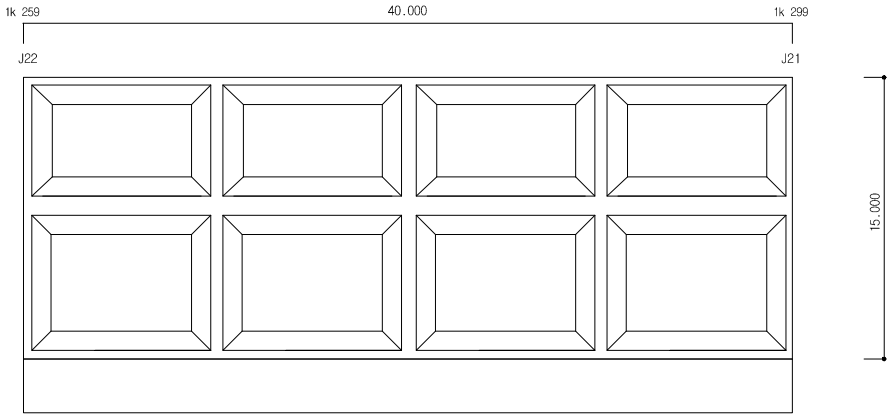


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	054

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

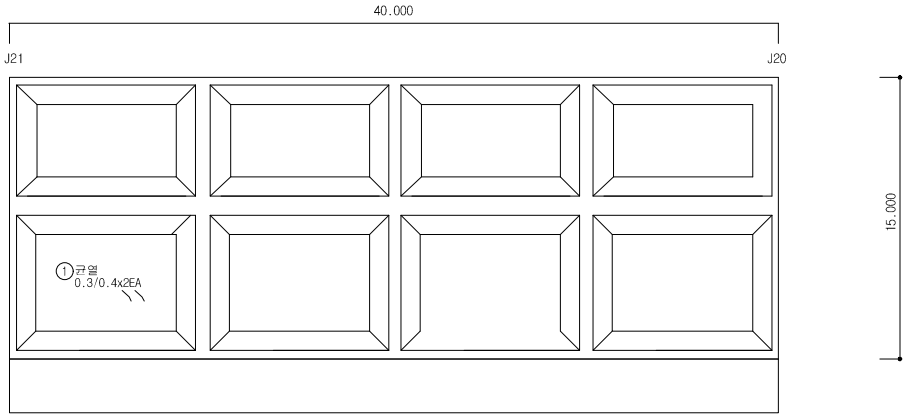


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	균열	0.30	0.40		0.80	m	2.00				신규	1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	얼룩	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	055

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

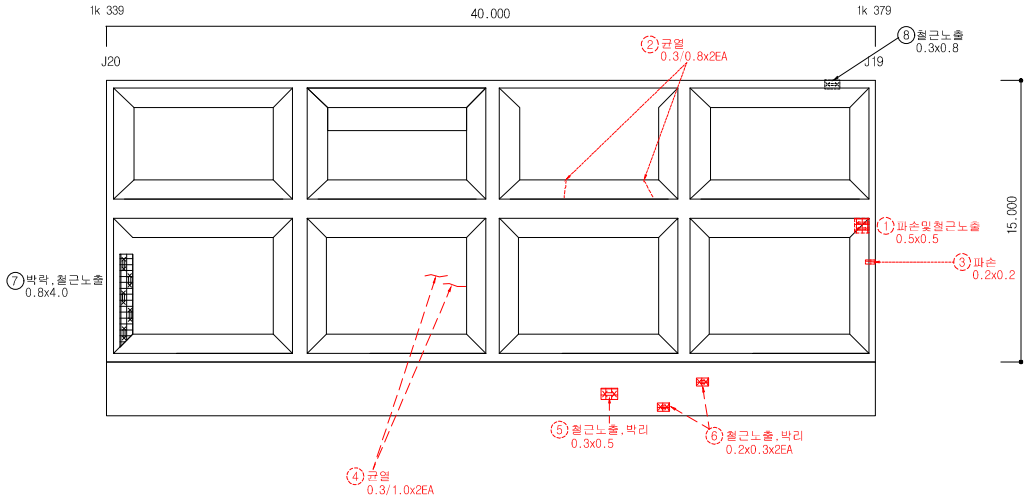


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	파손 및 철근노출	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					1
2	2011	균열	0.30	0.80		1.60	m	2.00					1
3	2011	파손	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					1
4	2016	균열	0.30	1.00		2.00	m	2.00					1
5	2016	철근노출 및 박리	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					1
6	2016	철근노출 및 박리	0.20	0.30		0.12	㎡	2.00					1
7	2019	박락,철근노출	0.80	4.00		3.20	㎡	1.00				신규	1
8	2019	철근노출	0.30	0.80		0.24	㎡	1.00				신규	1
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	056

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

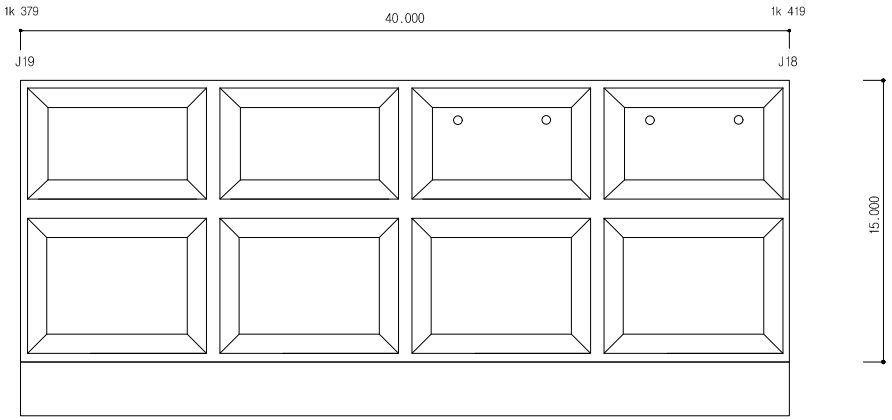


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	057

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

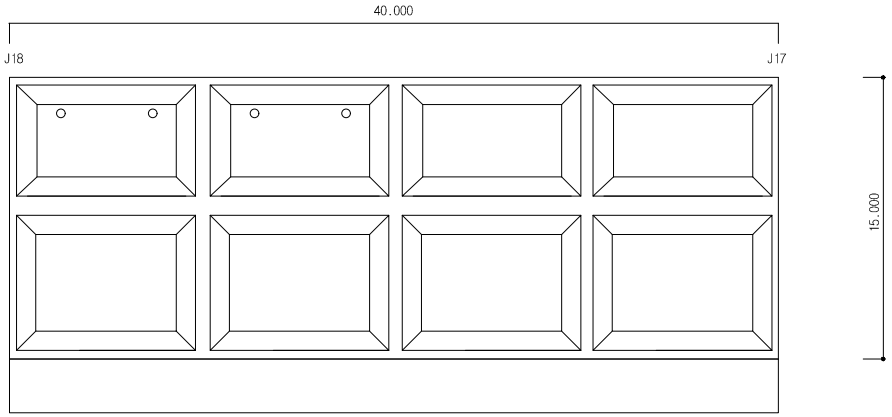


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	백태	0.90	2.00		1.80	㎡	1.00					2
2	2011	파손	0.30	0.30		0.30	m	1.00					2
3	2014	망상균열 및 백태	3.00	3.00		9.00	㎡	1.00					2
4	2019	보수부박리	0.30	1.50		0.45	㎡	1.00				신규	2
5	2019	백태	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00				신규	2
6	2019	보수부박리 및 백태	0.30	2.00		0.60	㎡	1.00				신규	2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	058

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

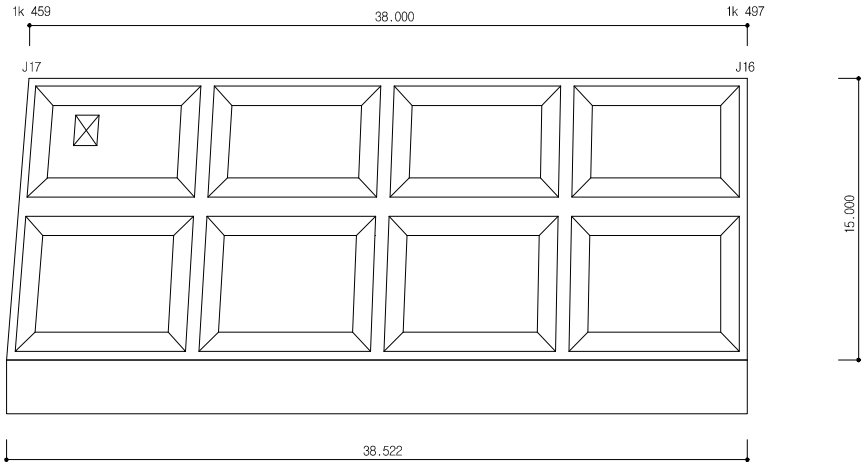


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	059

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

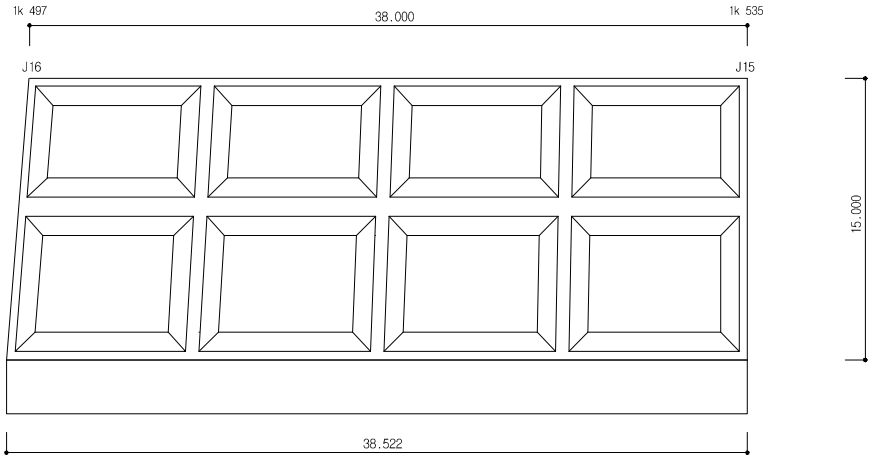


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	060

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

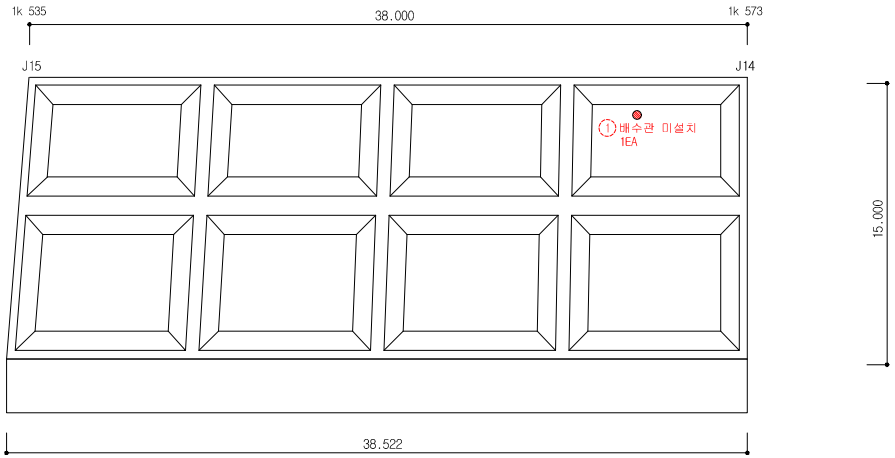


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수관 미설치				1.00	EA	1.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	061

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

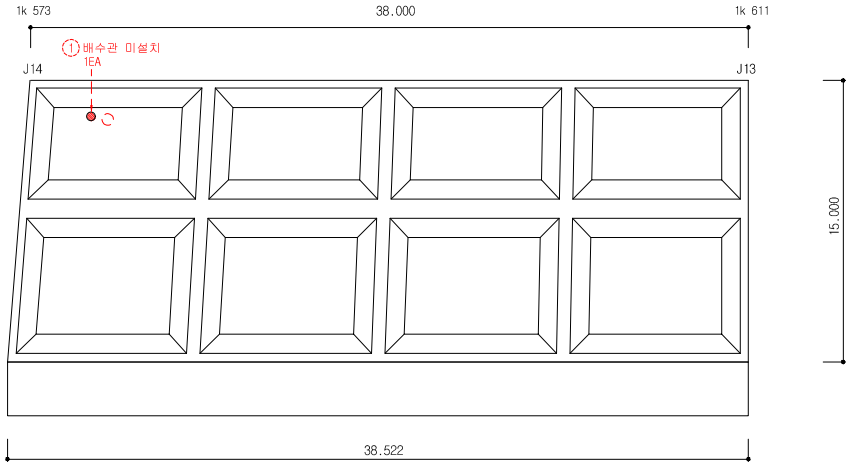


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수관 미설치				1.00	EA	1.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	062

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

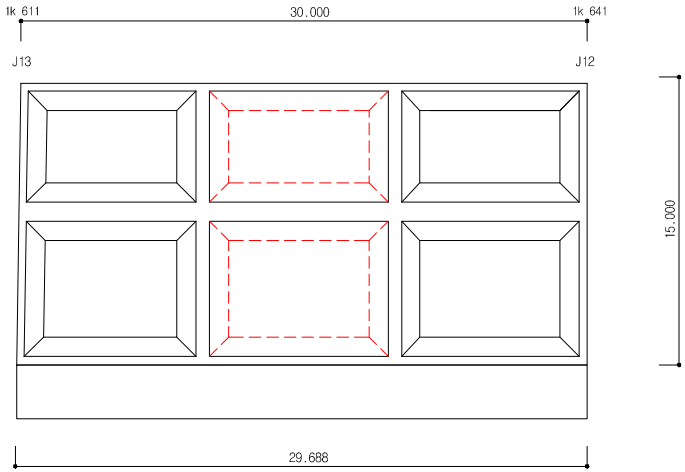


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	063

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

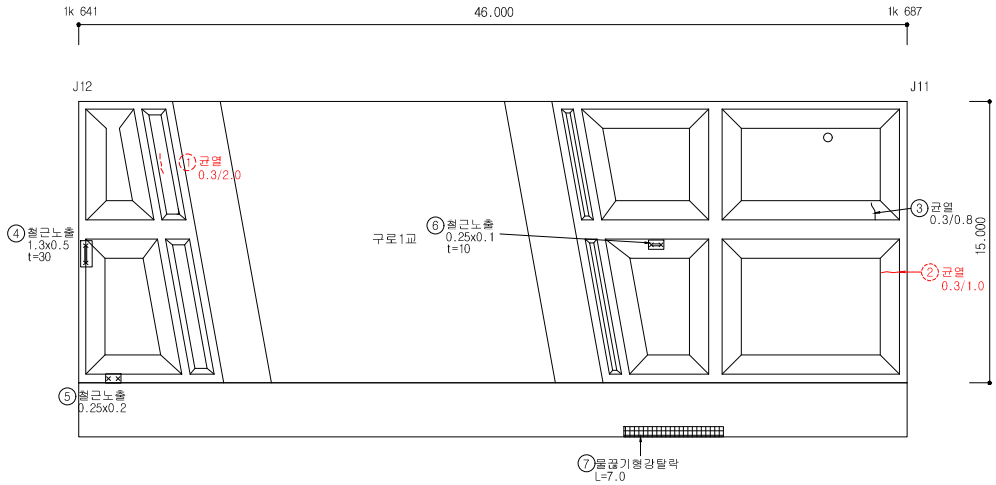


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2013	균열	0.30	2.00		2.00	m	1.00					1
2	2016	균열	0.30	1.00		1.00	m	1.00					1
3	2019	균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00				신규	1
4	2019	철근노출	1.30	0.50		0.65	㎡	1.00				신규	1
5	2019	철근노출	0.25	0.20		0.05	㎡	1.00				신규	1
6	2019	철근노출	0.25	0.10		0.03	㎡	1.00				신규	1
7	2019	물끊기형강탈락		7.00		7.00	m	1.00				신규	1
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	064

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

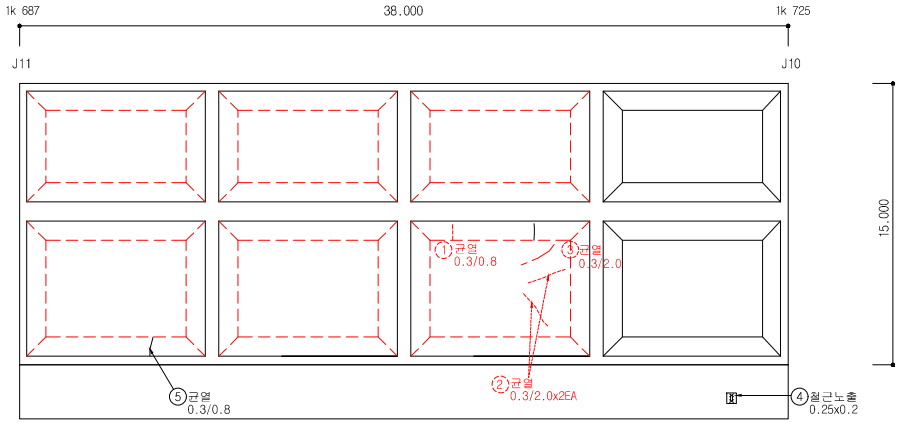


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00					1
2	2011	균열	0.30	2.00		4.00	m	2.00					1
3	2016	균열	0.30	2.00		2.00	m	1.00					1
4	2019	철근노출	0.25	0.20		0.05	㎡	1.00				신규	1
5	2019	균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00				신규	1
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	065

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

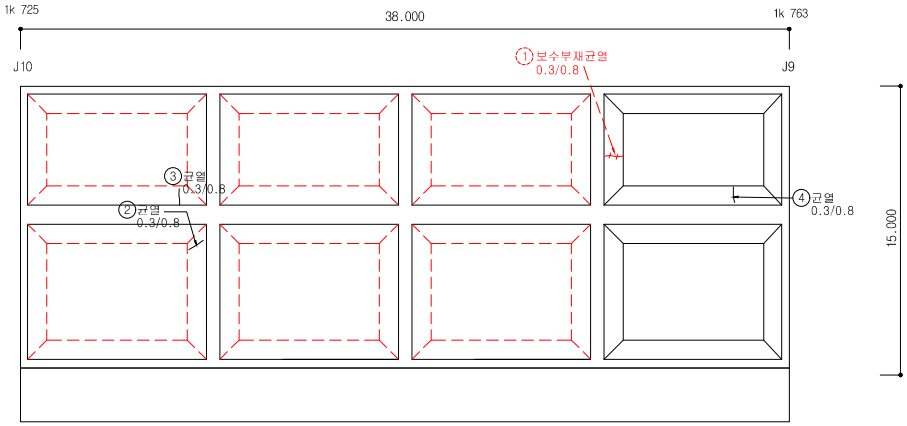


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	보수부 재균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00					1
2	2019	균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00				신규	1
3	2019	균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00				신규	1
4	2019	균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00				신규	1
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	066

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

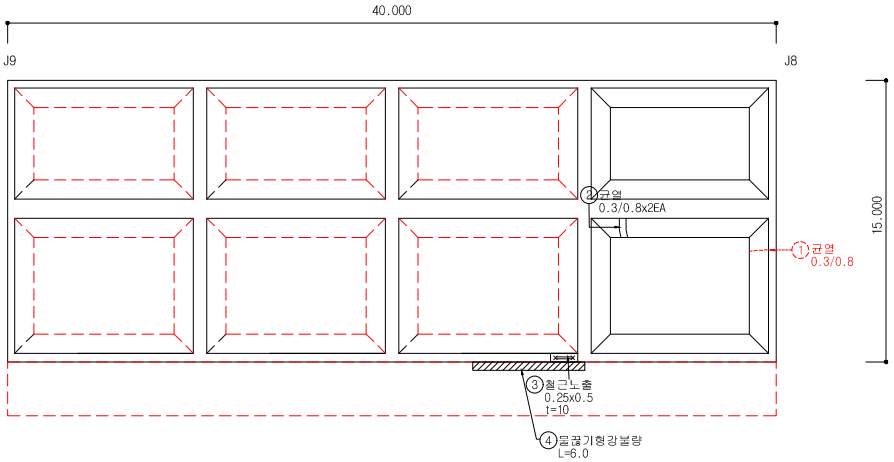


손 상 물 량 표

연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00					1
2	2019	균열	0.30	0.80		1.60	m	2.00				신규	1
3	2019	철근노출	0.25	0.50		0.13	㎡	1.00				신규	1
4	2019	물끊기형강볼량		6.00		6.00	m	1.00				신규	1
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	067

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

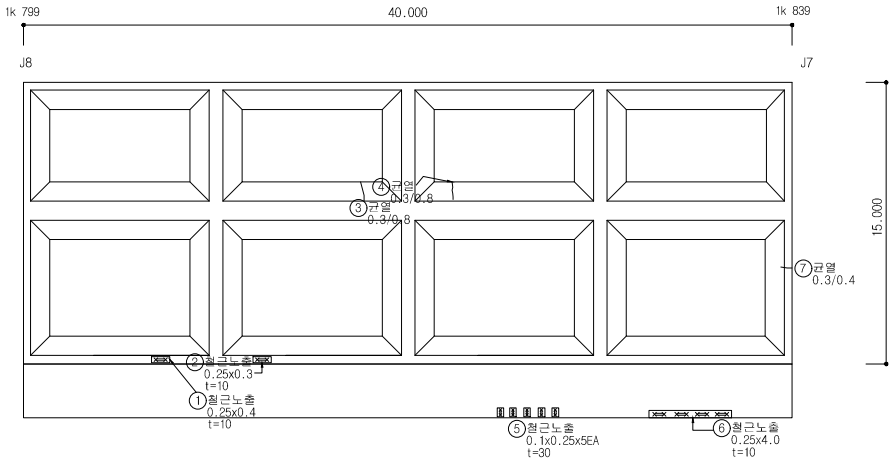


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	철근노출	0.25	0.40		0.10	㎡	1.00				신규	1
2	2019	철근노출	0.25	0.30		0.08	㎡	1.00				신규	1
3	2019	균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00				신규	1
4	2019	균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00				신규	1
5	2019	철근노출	0.10	0.25		0.13	㎡	5.00				신규	1
6	2019	철근노출	0.25	4.00		1.00	㎡	1.00				신규	1
7	2019	균열	0.30	0.40		0.40	m	1.00				신규	1
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	068

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

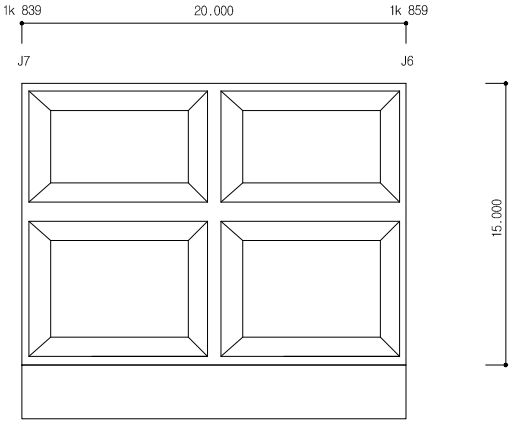


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	069

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

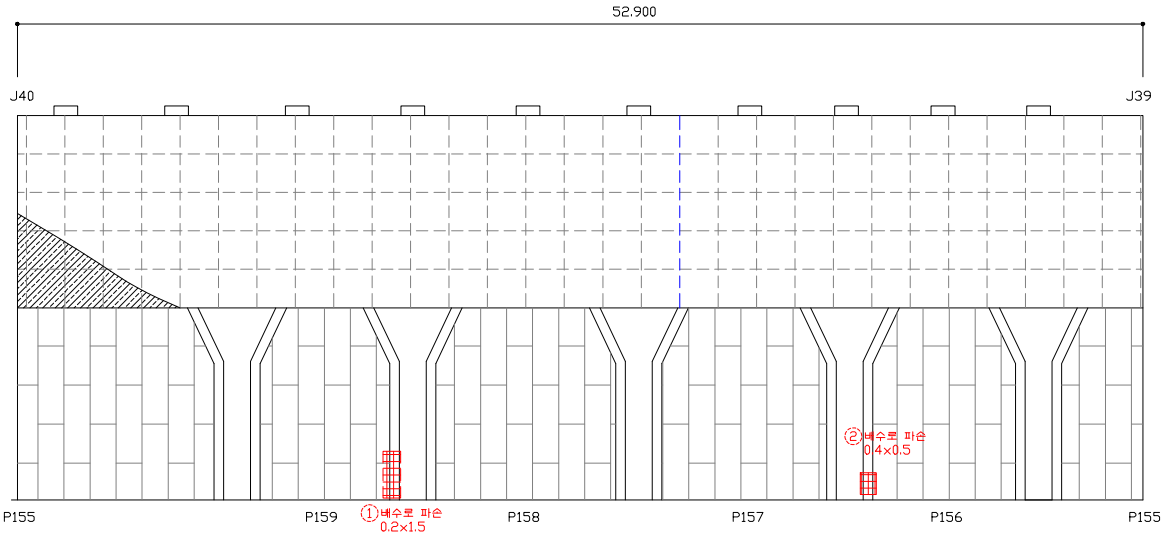


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수로파손	0.20	1.50		0.30	㎡	1.00					1
2	2016	배수로파손	0.40	0.50		0.20	㎡	1.00					1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	070

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

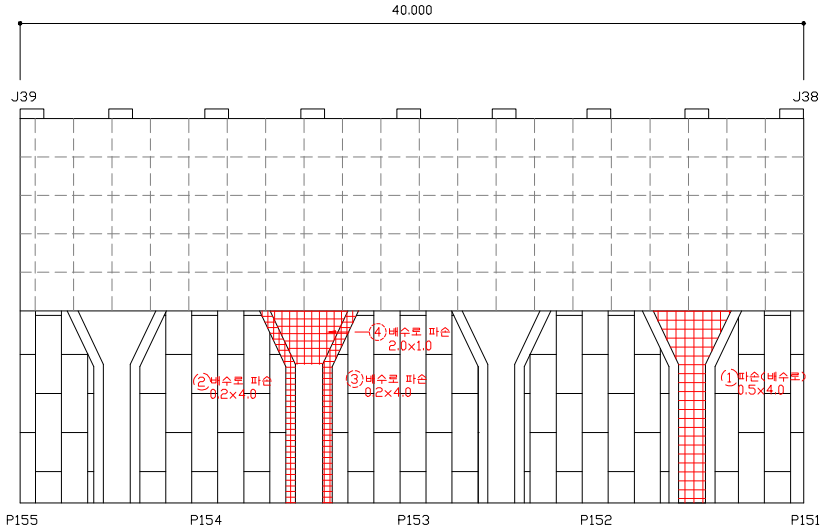


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	파손(배수로)	0.50	4.00		2.00	㎡	1.00					1
2	2014	배수로파손	0.20	4.00		0.80	㎡	1.00					1
3	2011	배수로파손	0.20	4.00		0.80	㎡	1.00					1
4	2016	배수로파손	2.00	1.00		2.00	㎡	1.00					1
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	071

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

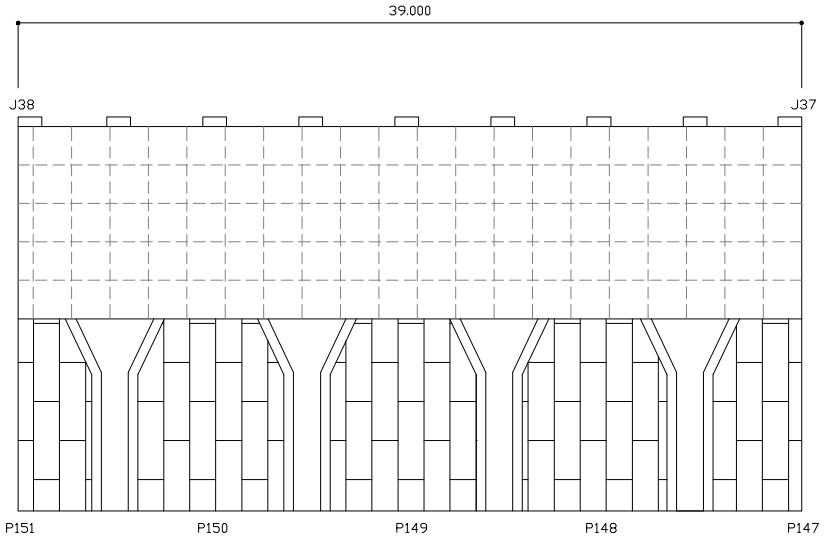


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	072

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

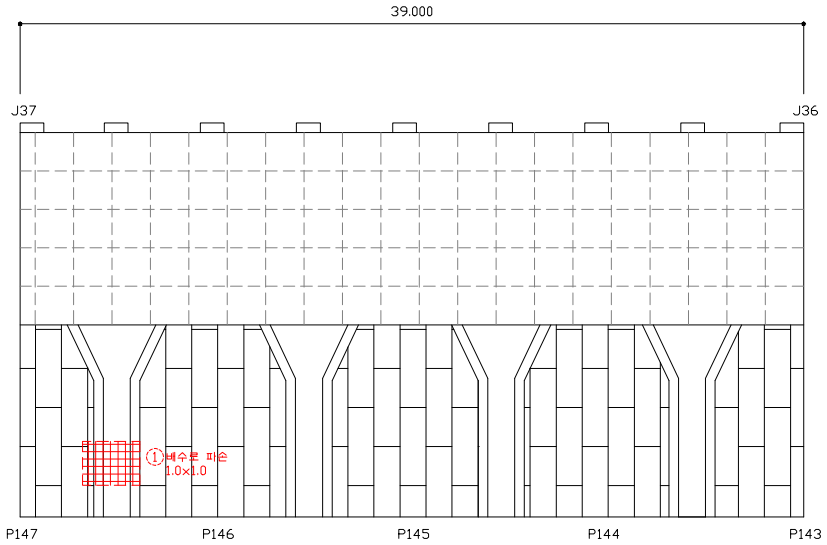


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수로파손	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	073

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

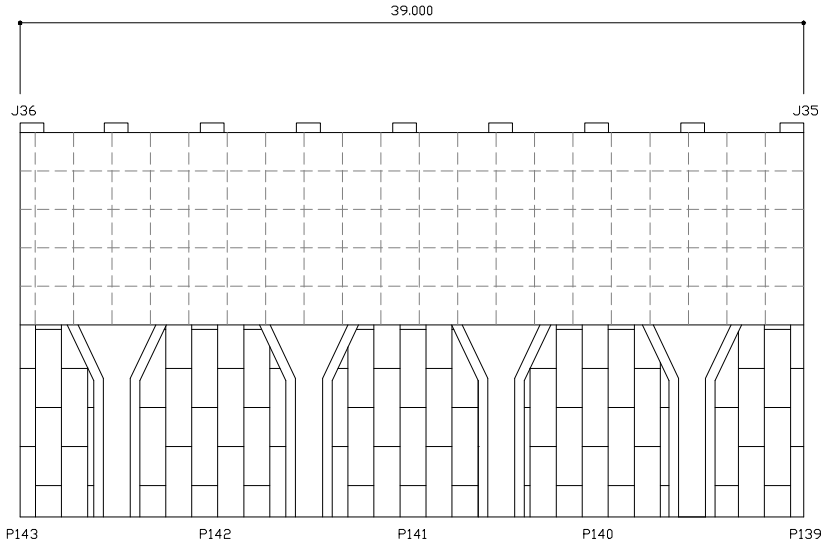


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	074

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

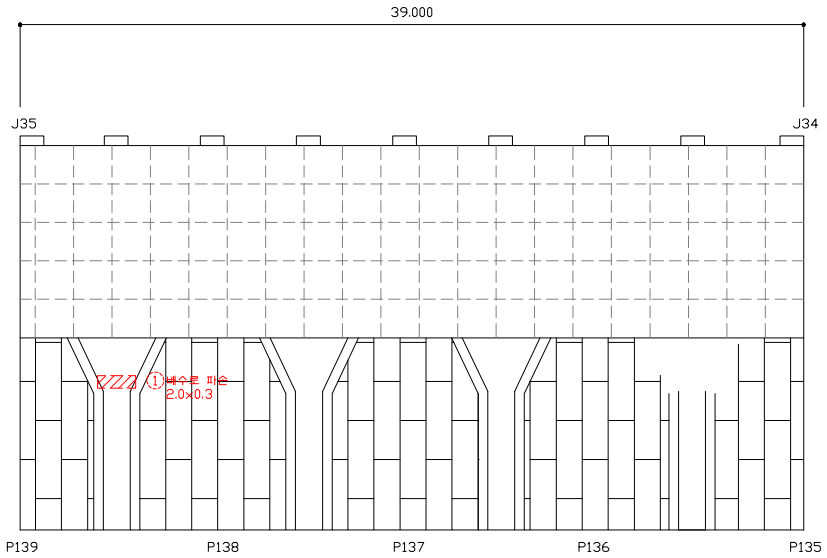


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수로파손	2.00	0.30		0.60	㎡	1.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	075

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

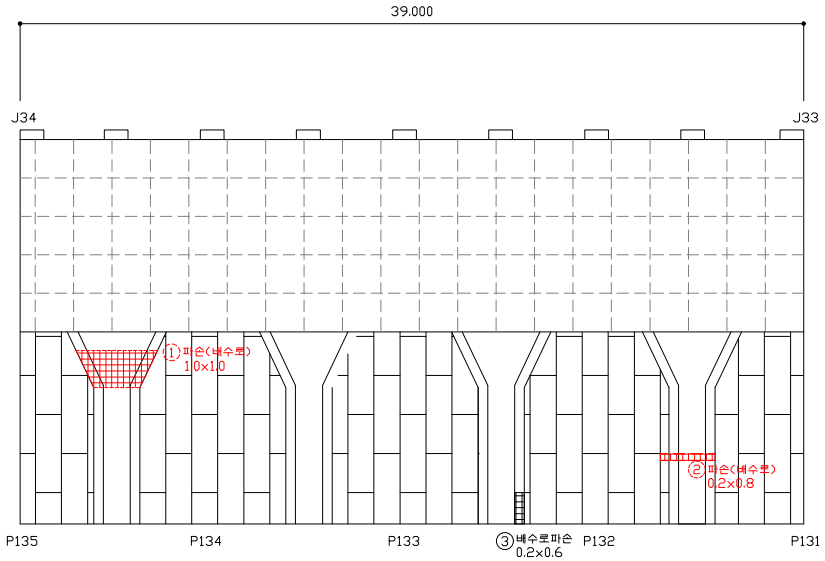


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	파손	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00					1
2	2016	파손	0.20	0.80		0.16	㎡	1.00					1
3	2019	배수로파손	0.20	0.60		0.12	㎡	1.00				신규	1
4	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	076

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

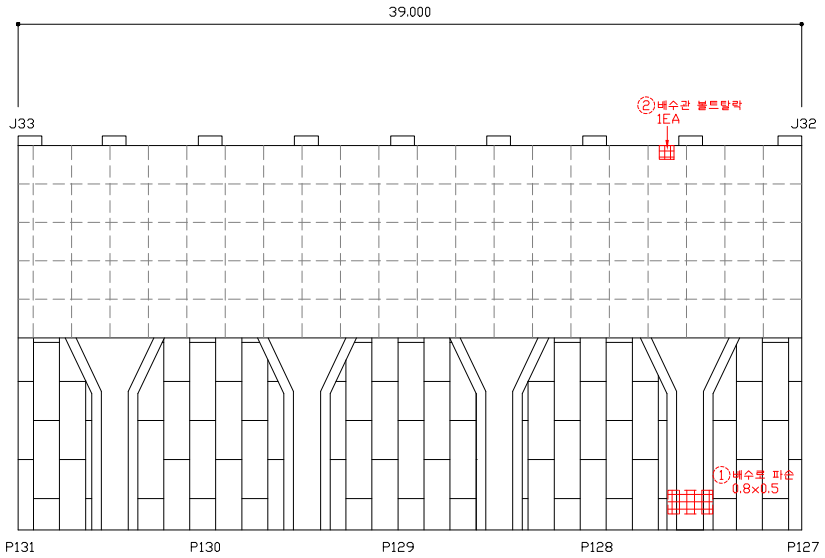


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수로파손	0.80	0.50		0.40	㎡	1.00					1
2	2016	배수관볼트탈락				1.00	EA	1.00					1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	077

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

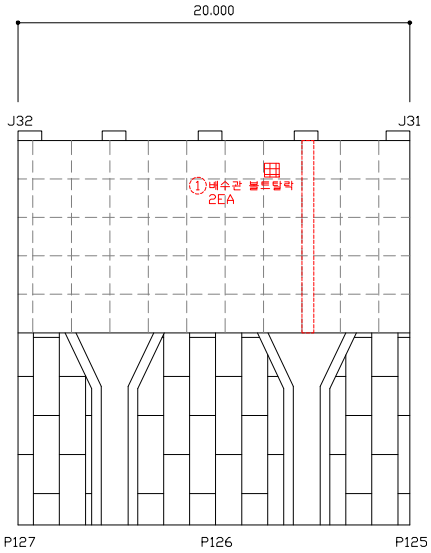


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수관볼트탈락				2.00	EA	2.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	078

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

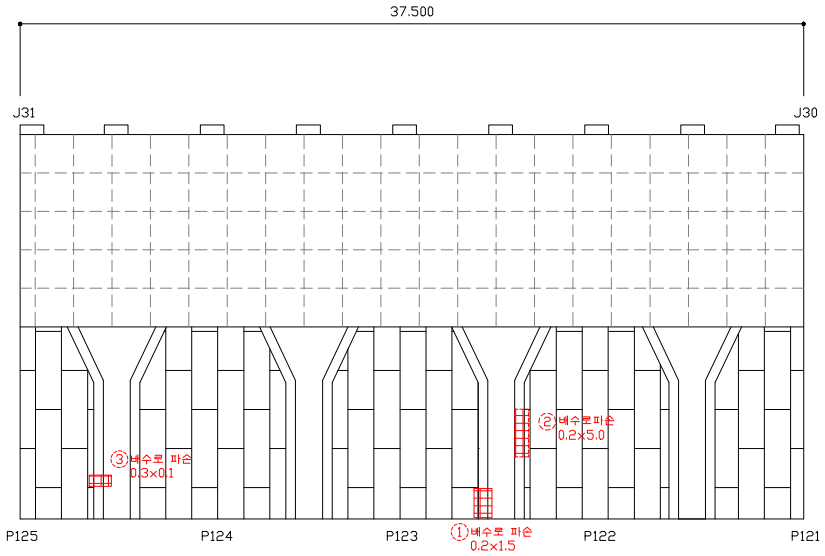


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역				비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량			
1	2016	배수로파손	0.20	1.50		0.30	㎡	1.00						1
2	2016	배수로파손	0.20	5.00		1.00	㎡	1.00						1
3	2016	배수로파손	0.30	0.10		0.03	㎡	1.00						1
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	079

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

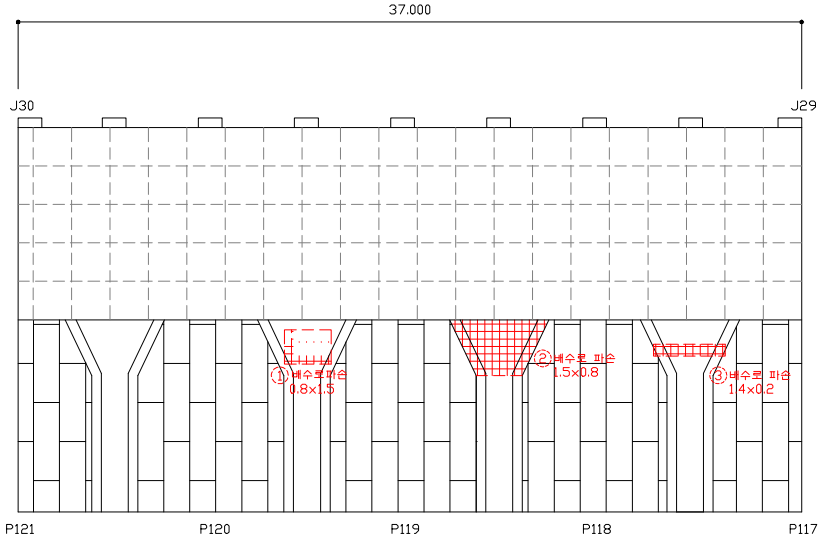


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	배수로파손	0.80	1.50		1.20	㎡	1.00					1
2	2016	배수로파손	1.50	0.80		1.20	㎡	1.00					1
3	2016	배수로파손	1.20	0.20		0.24	㎡	1.00					1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	080

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

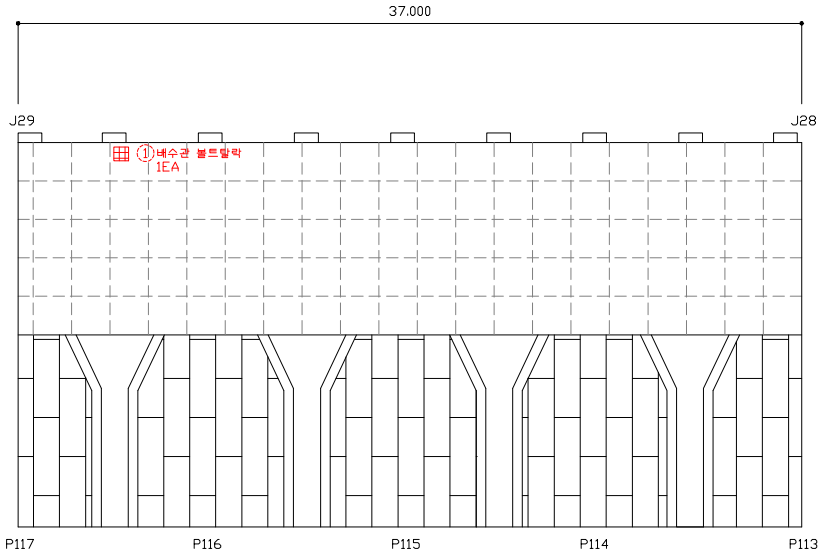


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수관볼트탈락	-	-		1.00	EA	1.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	081

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

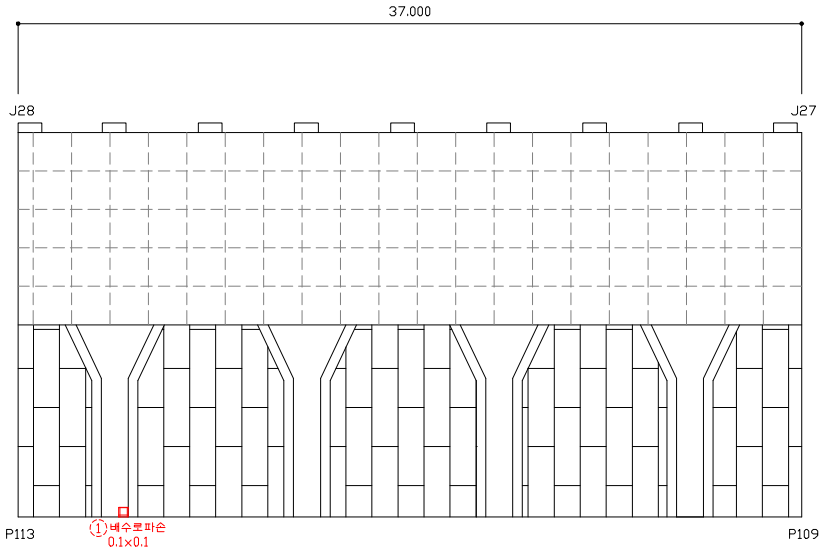


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	배수로파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	082

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

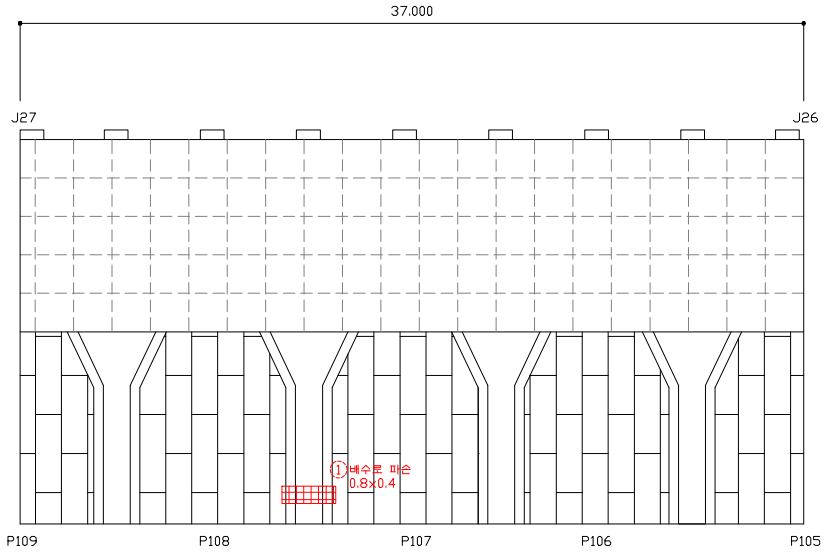


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수로파손	0.80	0.40		0.32	㎡	1.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	083

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

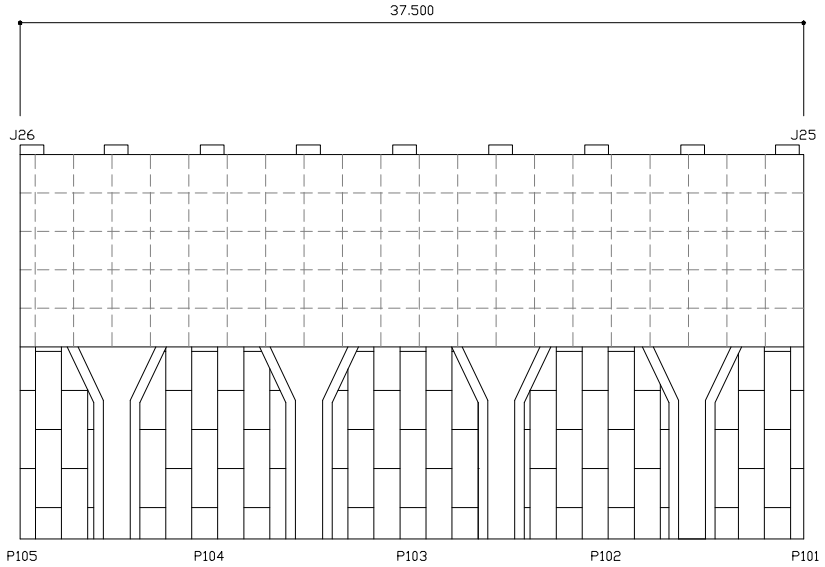


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락,박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	084

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

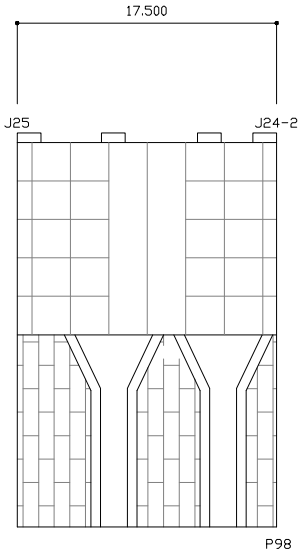


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락,박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	085

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

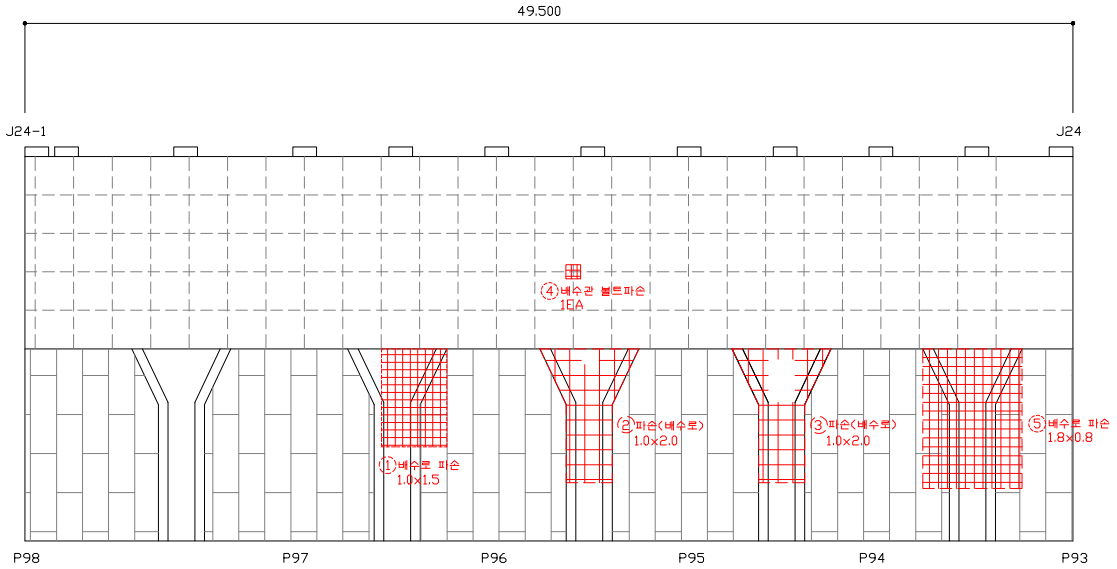


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	배수로파손	1.00	1.50		1.50	㎡	1.00					1
2	2014	파손(배수로)	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					1
3	2014	파손(배수로)	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					1
4	2016	배수관볼트파손	-	-		1.00	EA	1.00					1
5	2016	배수로파손	1.80	0.80		1.44	㎡	1.00					1
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	086

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

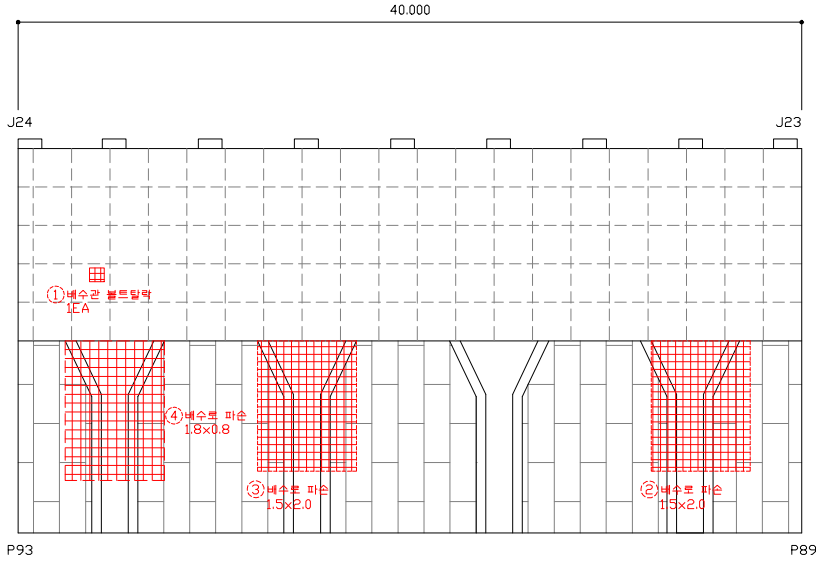


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수관볼트탈락	-	-		1.00	EA	1.00					1
2	2011	배수로파손	1.50	2.00		3.00	㎡	1.00					1
3	2011	배수로파손	1.50	2.00		3.00	㎡	1.00					1
4	2016	배수로파손	1.80	0.80		1.44	㎡	1.00					1
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	087

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

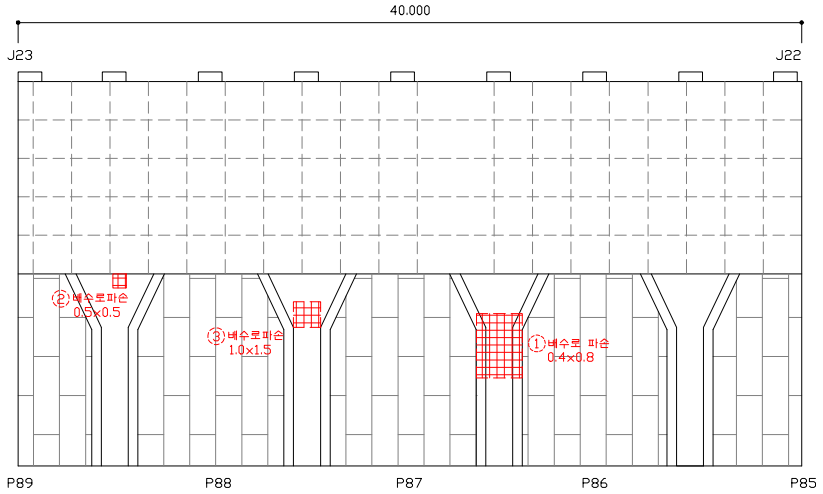


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수로파손	0.40	0.80		0.32	㎡	1.00					1
2	2018	배수로파손	0.50	0.50		1.00	㎡	1.00					1
3	2018	배수로파손	1.00	1.50		1.50	㎡	1.00					1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	088

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

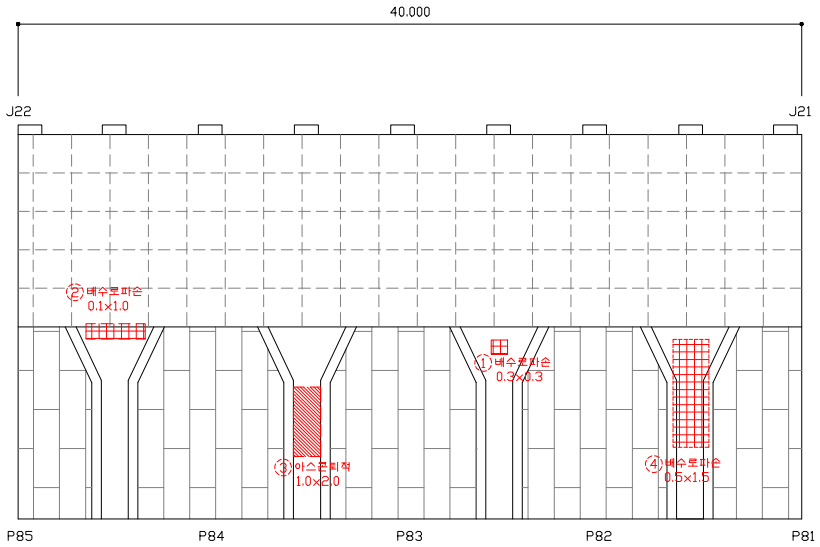


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	배수로파손	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					1
2	2018	배수로파손	0.10	1.00		0.10	㎡	1.00					1
3	2018	아스콘탈적	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					1
4	2011	배수로파손	0.50	1.50		0.75	㎡	1.00					1
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	089

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

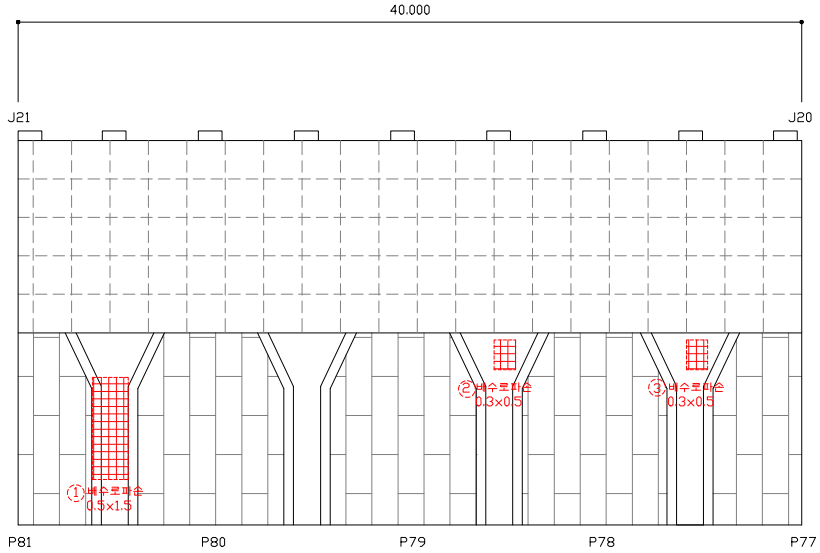


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	배수로파손	0.50	1.50		0.75	㎡	1.00					1
2	2011	배수로파손	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					1
3	2011	배수로파손	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	090

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

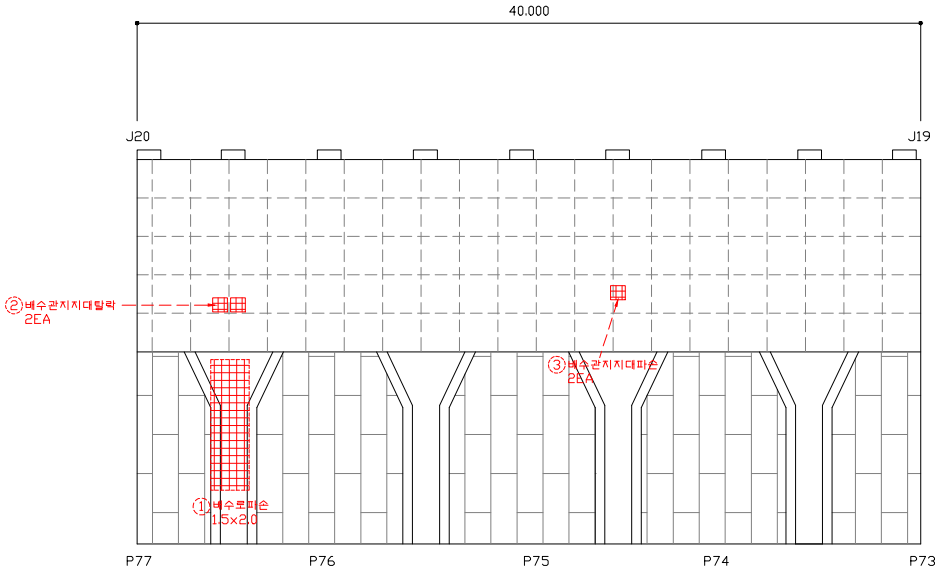


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	배수로파손	1.50	2.00		3.00	㎡	1.00					1
2	2016	배수관지지대탈락	-	-		2.00	EA	2.00					1
3	2016	배수관지지대파손	-	-		2.00	EA	2.00					1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	091

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

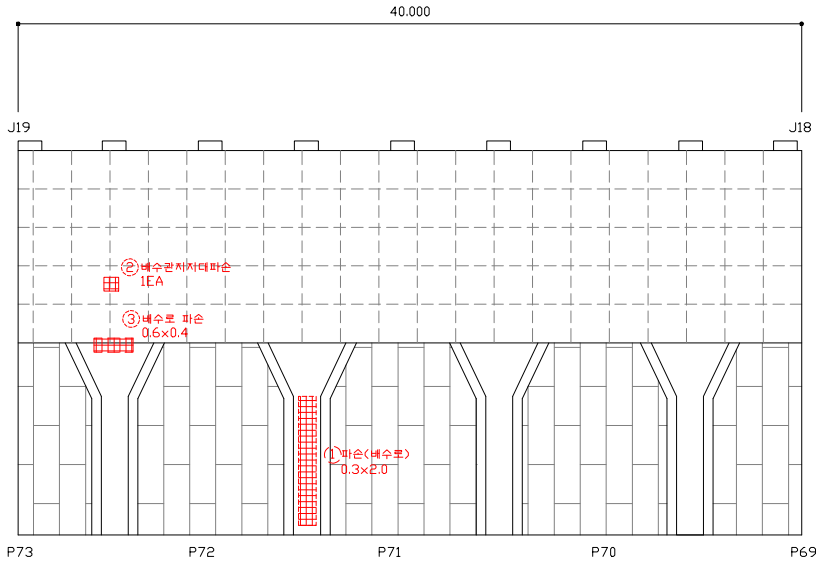


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	파손(배수로)	0.30	2.00		0.60	㎡	1.00					1
2	2016	배수관지지대파손	-	-		1.00	EA	1.00					1
3	2016	배수로파손	0.60	0.40		0.24	㎡	1.00					1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	092

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

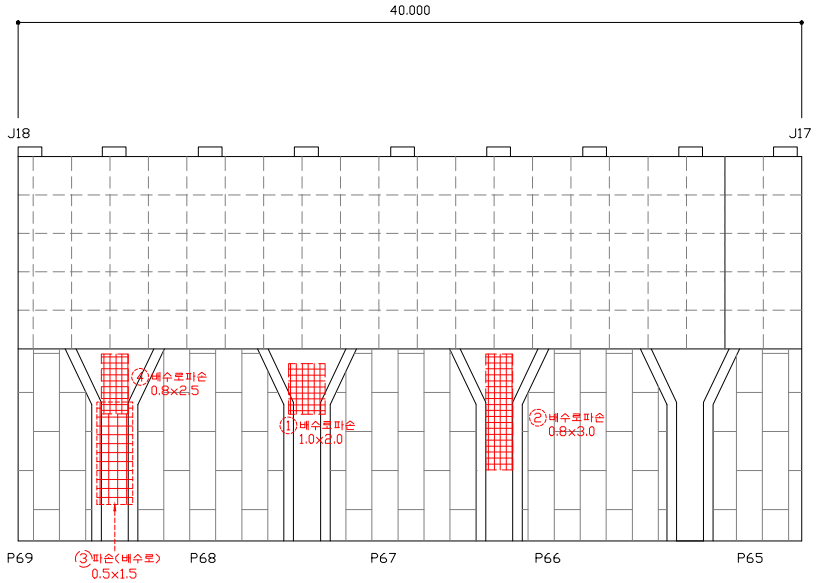


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	배수로파손	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					1
2	2018	배수로파손	0.80	3.00		2.40	㎡	1.00					1
3	2014	파손(배수로)	0.50	1.50		0.75	㎡	1.00					1
4	2018	배수로파손	0.80	2.50		2.00	㎡	1.00					1
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	093

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

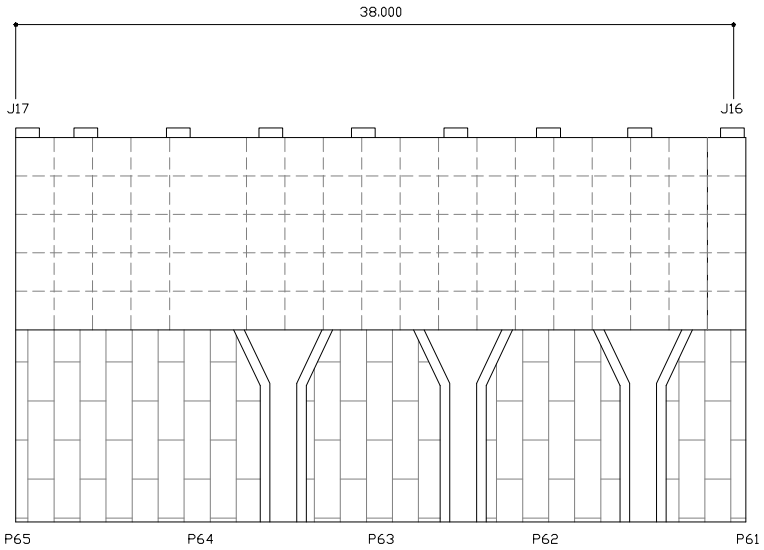


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	094

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

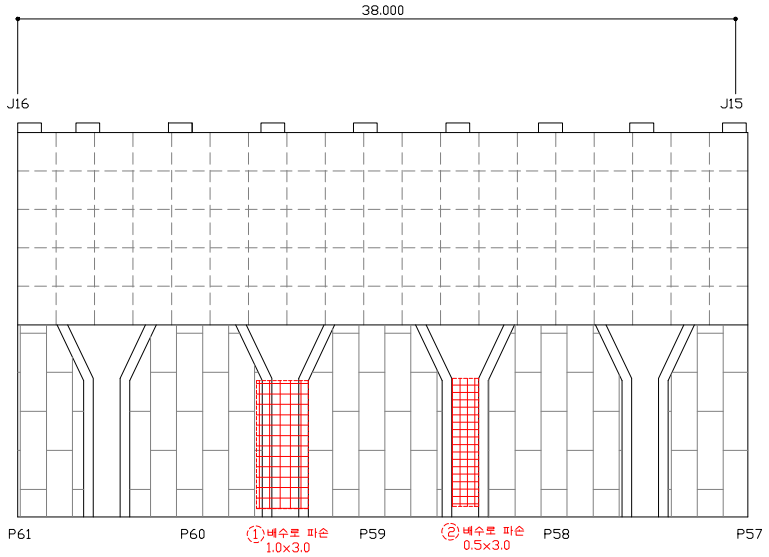


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	배수로파손	1.00	3.00		3.00	㎡	1.00					1
2	2011	배수로파손	0.50	3.00		1.50	㎡	1.00					1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	095

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

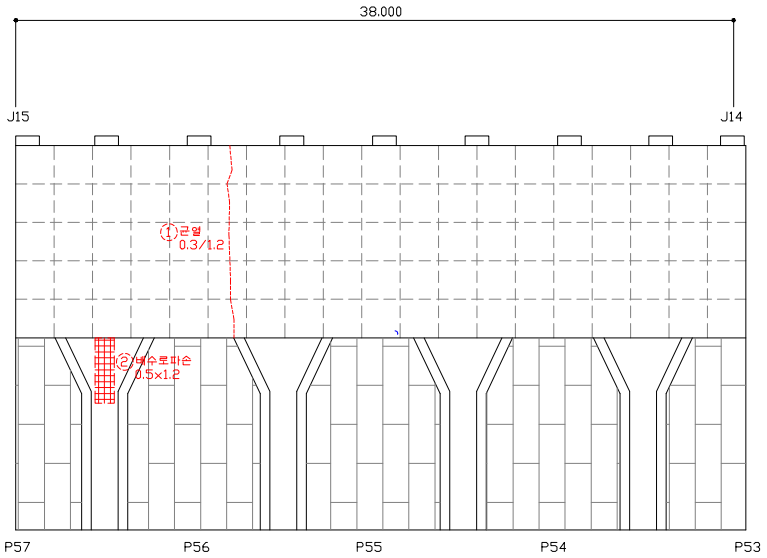


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	균열	0.30	1.20		1.20	m	1.00					1
2	2018	배수로파손	0.50	1.20		0.60	㎡	1.00					1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	096

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

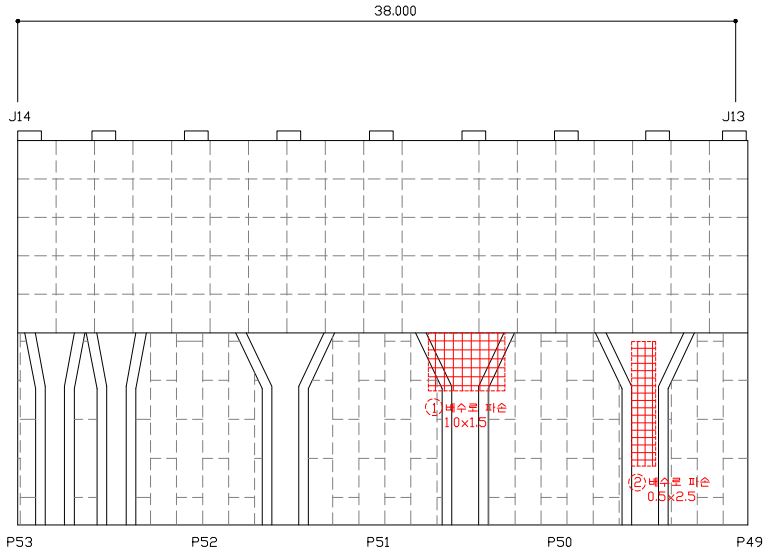


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	배수로파손	1.00	1.50		1.50	㎡	1.00					1
2	2011	배수로파손	0.50	2.50		1.25	㎡	1.00					1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	097

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

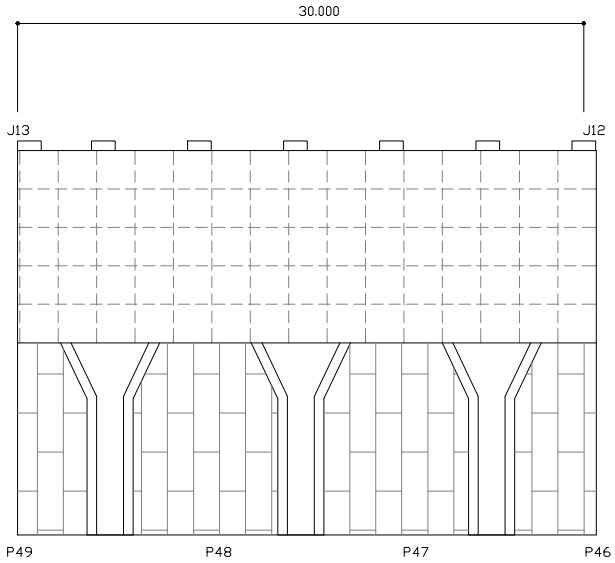


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	098

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

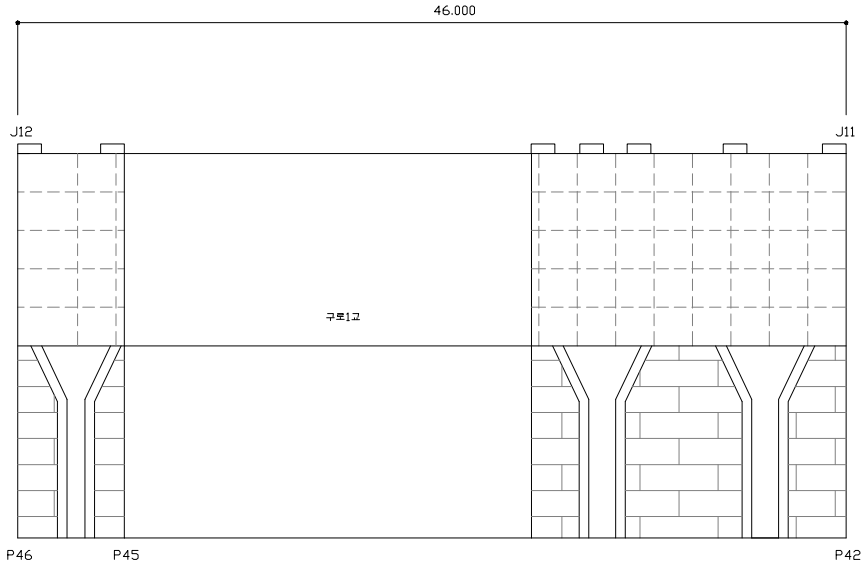


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락,박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	099

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

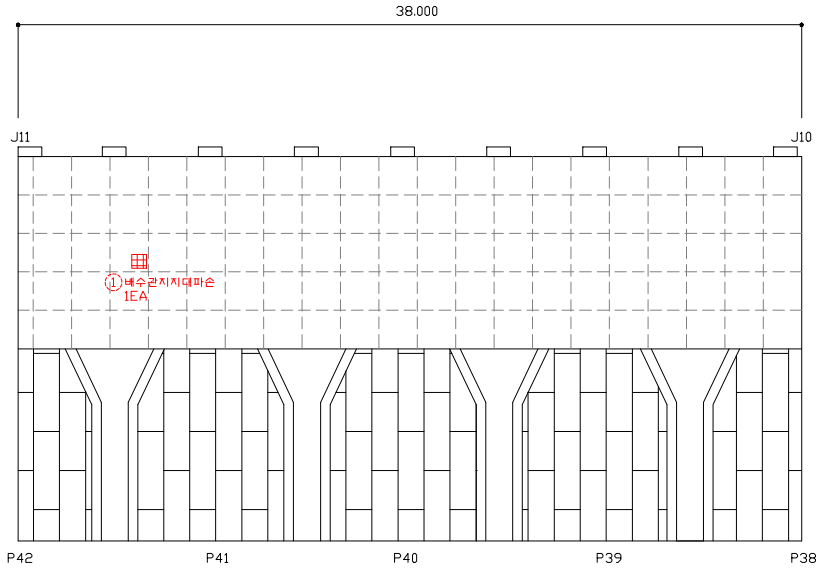


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	배수관지지대파손	-	-		1.00	EA	1.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	100

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

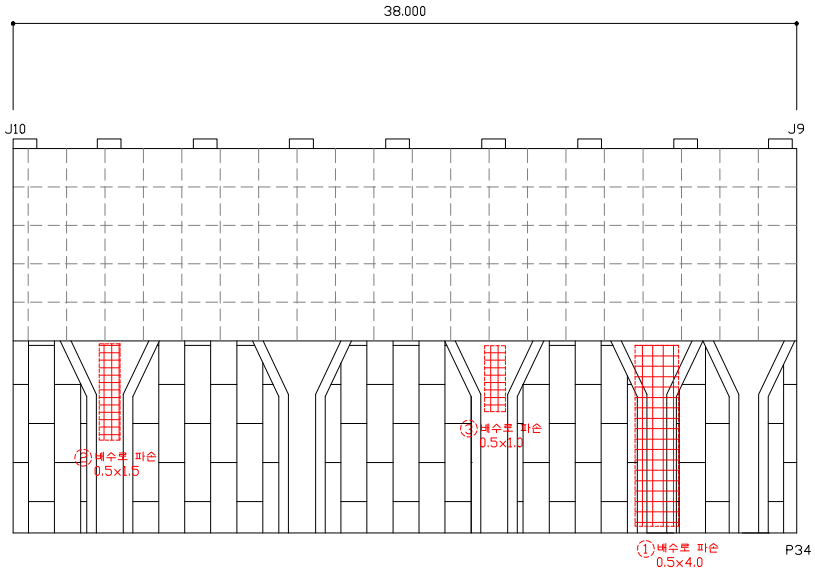


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	배수로파손	0.50	4.00		2.00	㎡	1.00					1
2	2011	배수로파손	0.50	1.50		0.75	㎡	1.00					1
3	2011	배수로파손	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	101

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

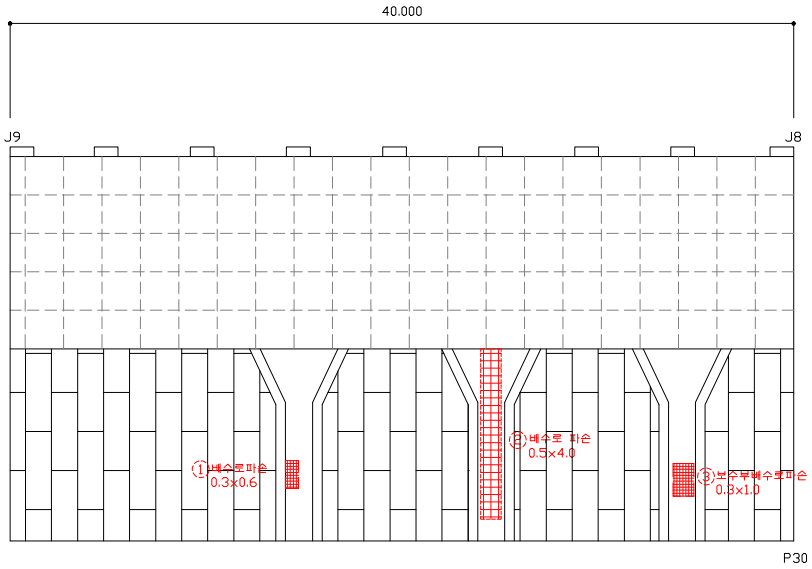


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	배수로파손	0.30	0.60		0.18	㎡	1.00					1
2	2011	배수로파손	0.50	4.00		2.00	㎡	1.00					1
3	2018	보수부배수로파손	0.30	1.00		0.30	㎡	1.00					1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	102

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

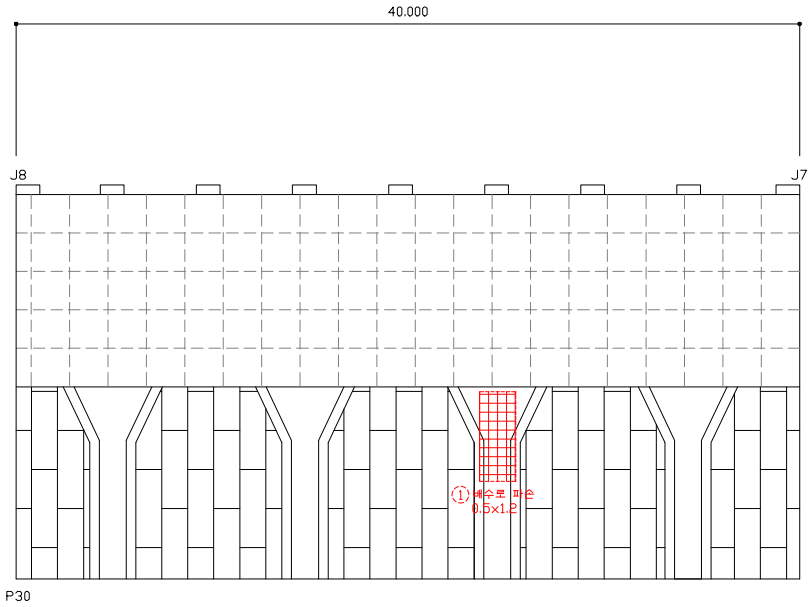


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	배수로파손	0.50	1.20		0.60	㎡	1.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	103

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

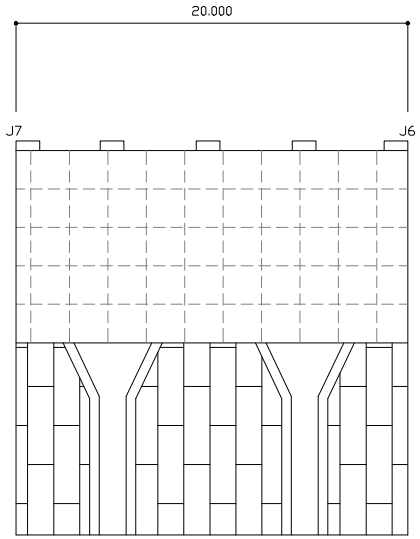


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	배수로파손	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					1
2	2011	배수로파손	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	104


ID : 도림천4복개 2련 / 교각

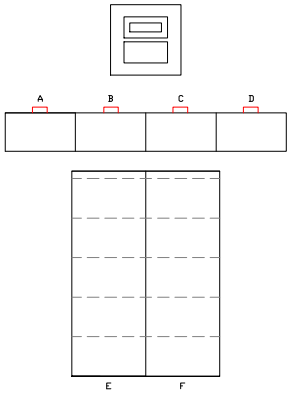


P160 - 1




P160 - 2




P160 - 3

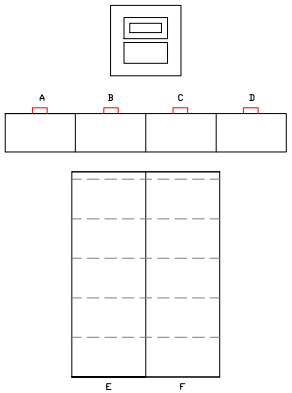

P159 - 1



P159 - 2




P159 - 3

손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락,박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	105

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

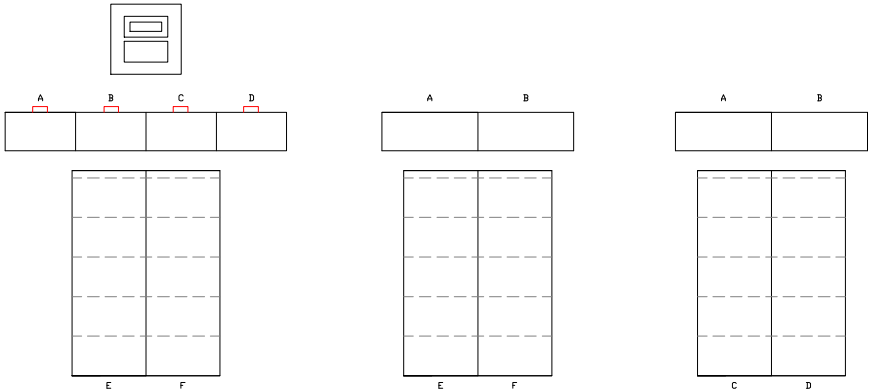


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	106


ID : 도림천4복개 2련 / 교각

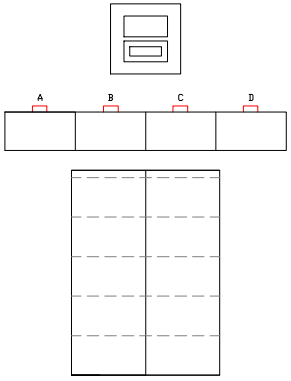


P156 - 1



P156 - 2

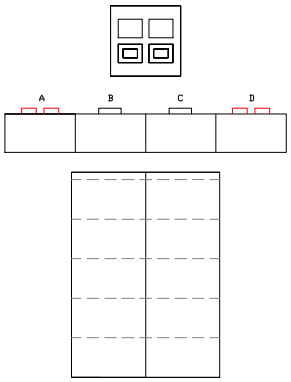

P155- 1

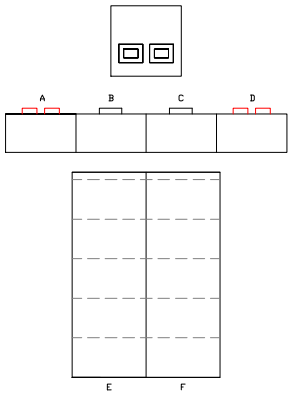


P155- 2

손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	107

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

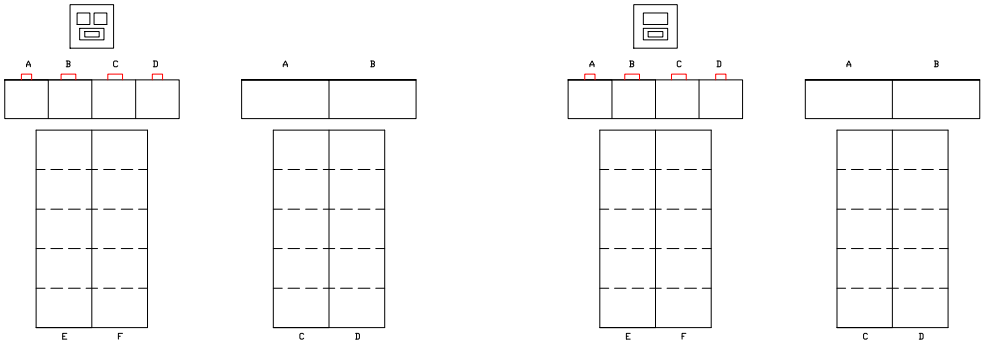


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락,박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	108


ID : 도림천4복개 2련 / 교각




P150 - 1




P150 - 2




P149- 1




P149- 2




P148 - 1



P148 - 2



P147 - 1




P147 - 2

손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	109

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

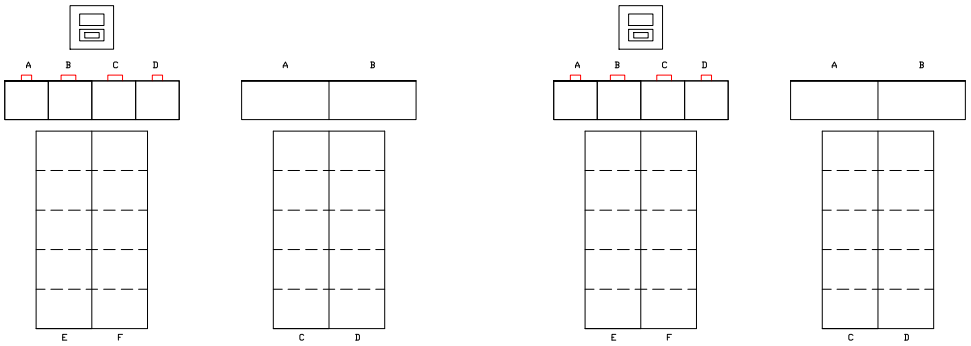

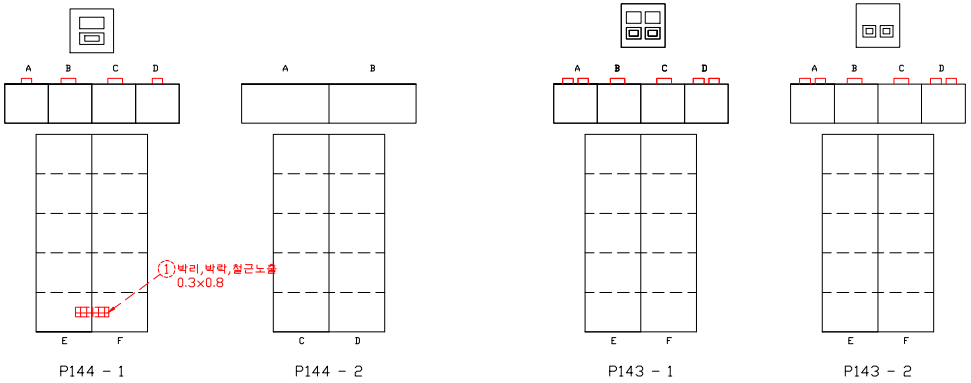


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	박리, 박락, 철근노출	0.30	0.80		0.24	㎡	1.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	110


ID : 도림천4복개 2련 / 교각




P142 - 1




P142 - 2




P141- 1




P141- 2




P140 - 1



P140 - 2



P139 - 1




P139 - 2

손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	111


ID : 도림천4복개 2련 / 교각

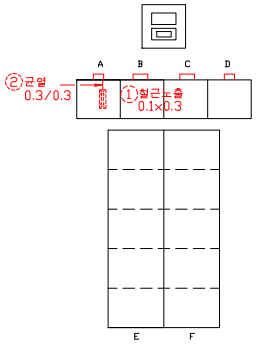


P138 - 1




P138 - 2




P137- 1




P137- 2




P136 - 1



P136 - 2



P135 - 1




P135 - 2

손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	철근노출	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00					1
2	2016	균열	0.30	0.30		0.30	m	1.00					1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	112


ID : 도림천4복개 2련 / 교각




P134 - 1




P134 - 2




P133- 1




P133- 2




P132 - 1



P132 - 2



P131 - 1




P131 - 2

손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭(㎜)	길이(m)	깊이(㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점검 · 보수 범례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION




용역명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락,박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	113


ID : 도림천4복개 2련 / 교각




P130 - 1




P130 - 2




P129- 1




P129- 2




P128 - 1



P128 - 2

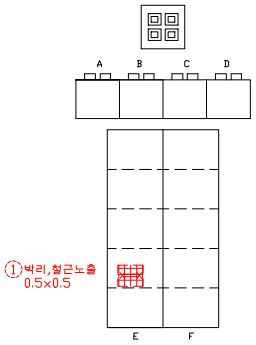

P127 - 1




P127 - 2

손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	박리, 철근노출	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	114

ID : 도림천4복개 2련 / 교각



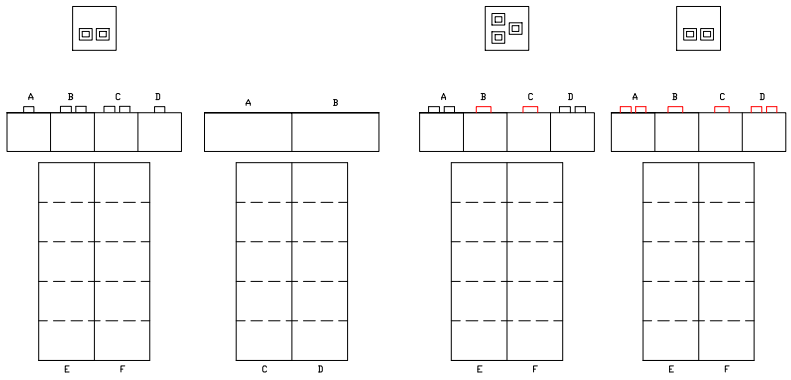


P126 - 1　P126 - 2　P125 - 1　P125 - 2

손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	115

ID : 도림천4복개 2련 / 교각







P124 - 1




P124 - 2




P123- 1




P123- 2




P122 - 1



P122 - 2



P121 - 1




P121 - 2

손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	116

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

신도림 ← E,C F,D → 구로디지털단지

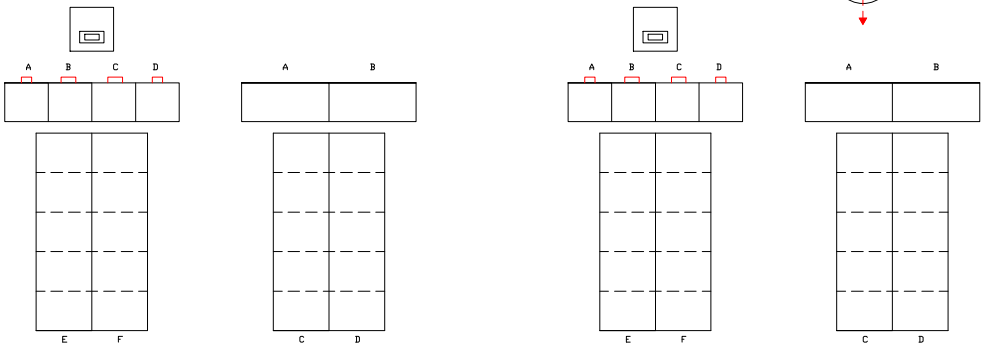

P120 - 1 P120 - 2 P119- 1 P119- 2

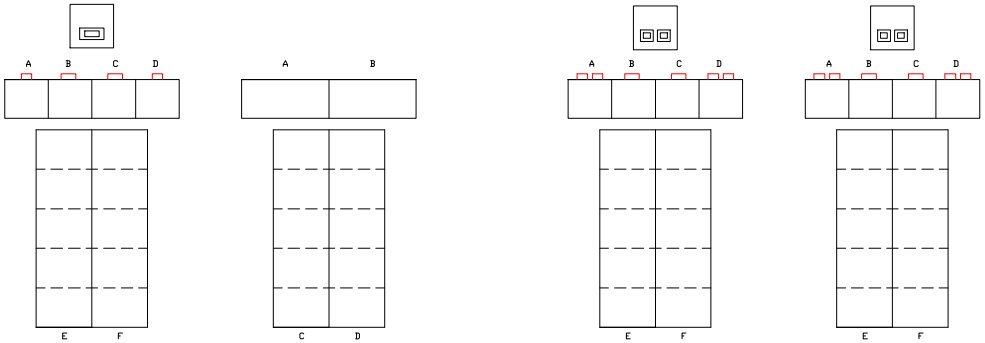


P118 - 1 P118 - 2 P117 - 1 P117 - 2

손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	0.60		0.60	m	1.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	117

ID : 도림천4복개 2련 / 교각



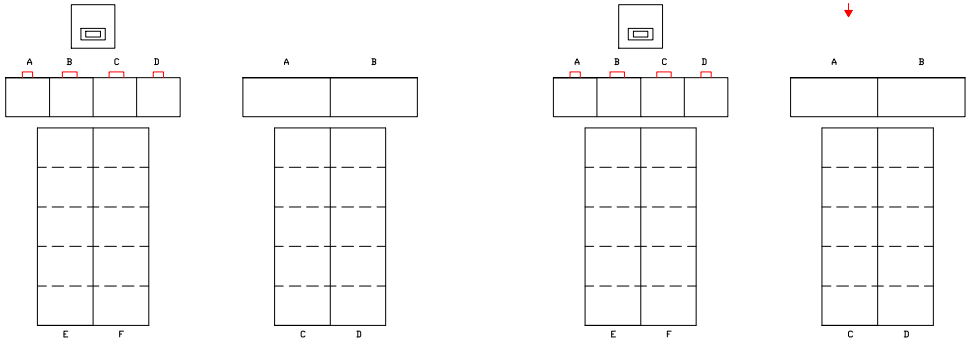

P116 - 1 P116 - 2 P115- 1 P115- 2

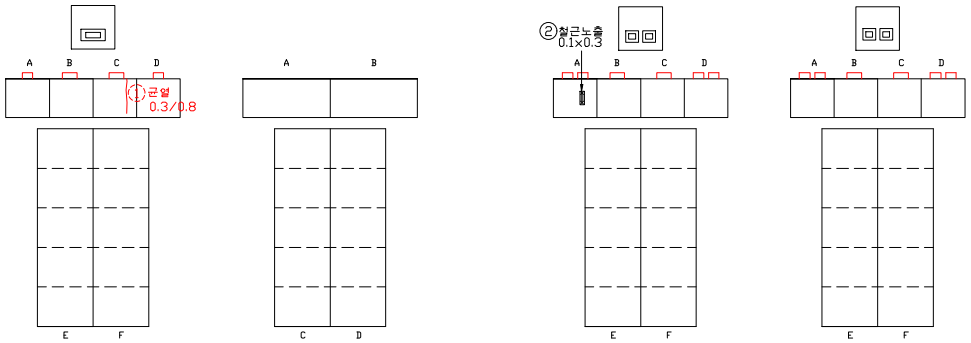


P114 - 1 P114 - 2 P113 - 1 P113 - 2

손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	균열	0.30	0.80		0.80	m	1.00					1
2	2019	철근노출	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00				신규	1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	118

ID : 도림천4복개 2련 / 교각



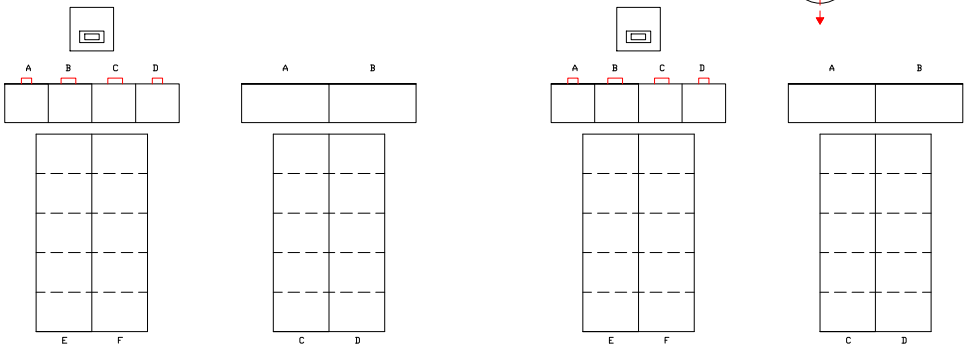

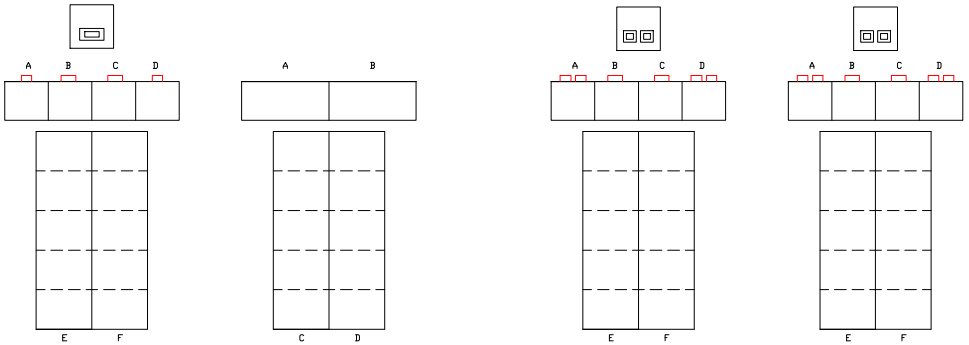


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	119

ID : 도림천4복개 2련 / 교각



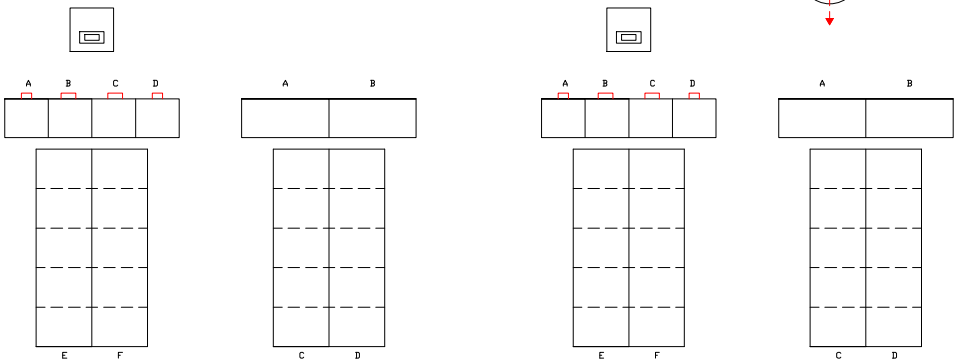


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	0.50		0.50	㎡	1.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	120

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

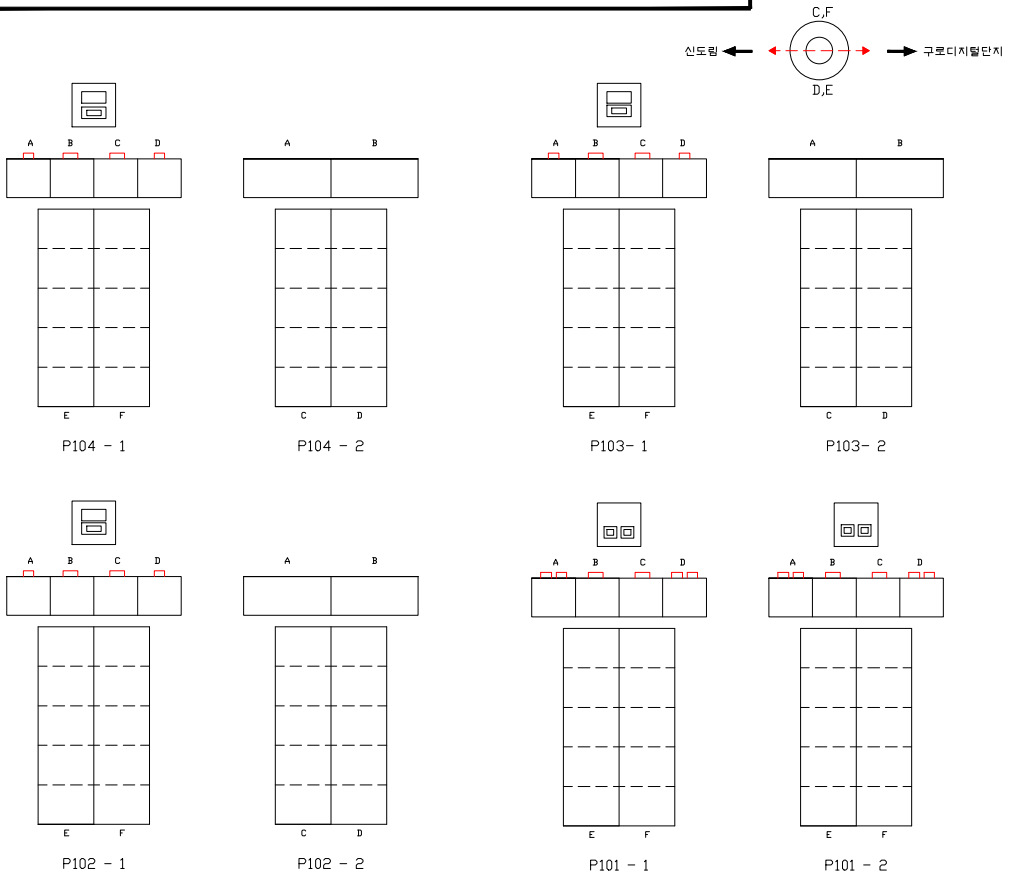


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	0.20		0.20	m	1.00					1
2	2018	철근노출	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	121

ID : 도림천4복개 2련 / 교각



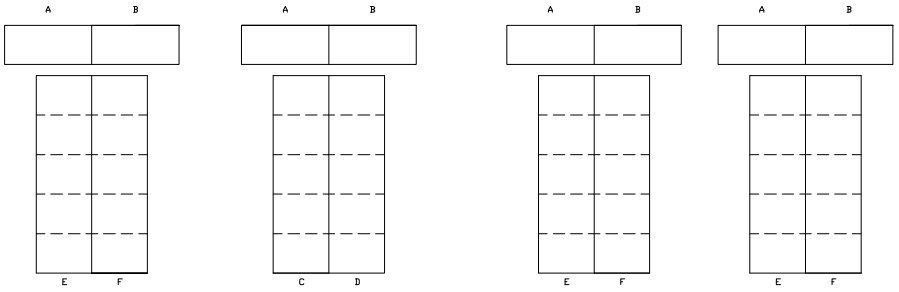


P100 - 1 P100 - 2 P99 - 1 P99 - 2

손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	122

ID : 도림천4복개 2련 / 교각



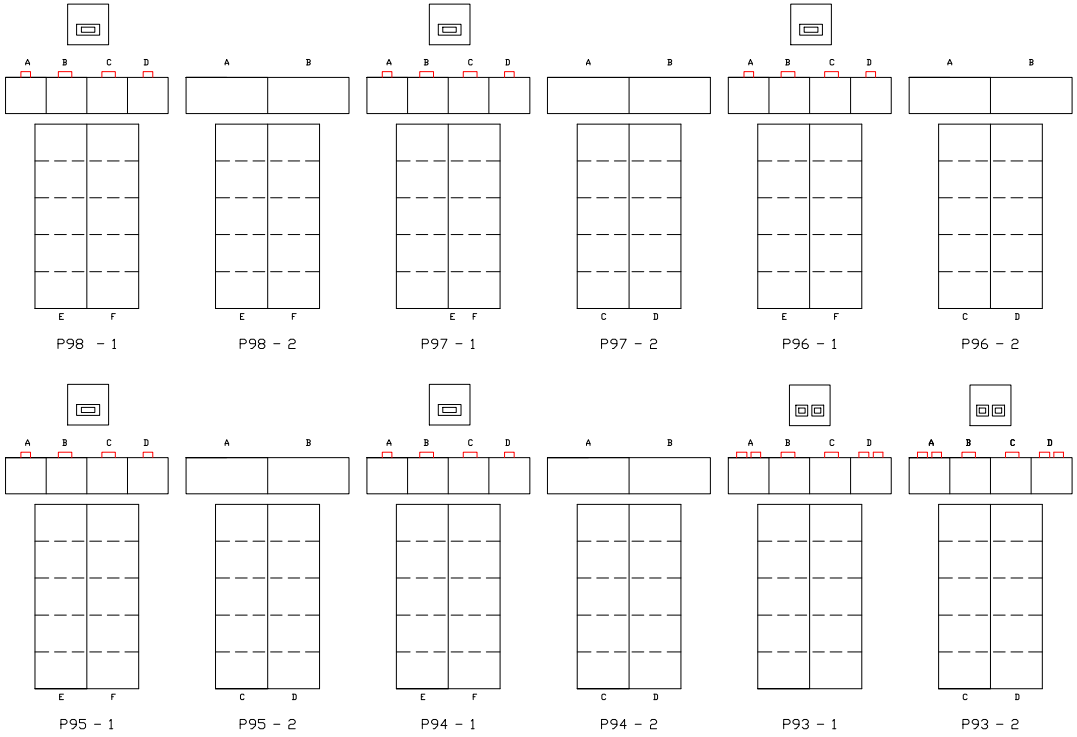


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	123

ID : 도림천4복개 2련 / 교각



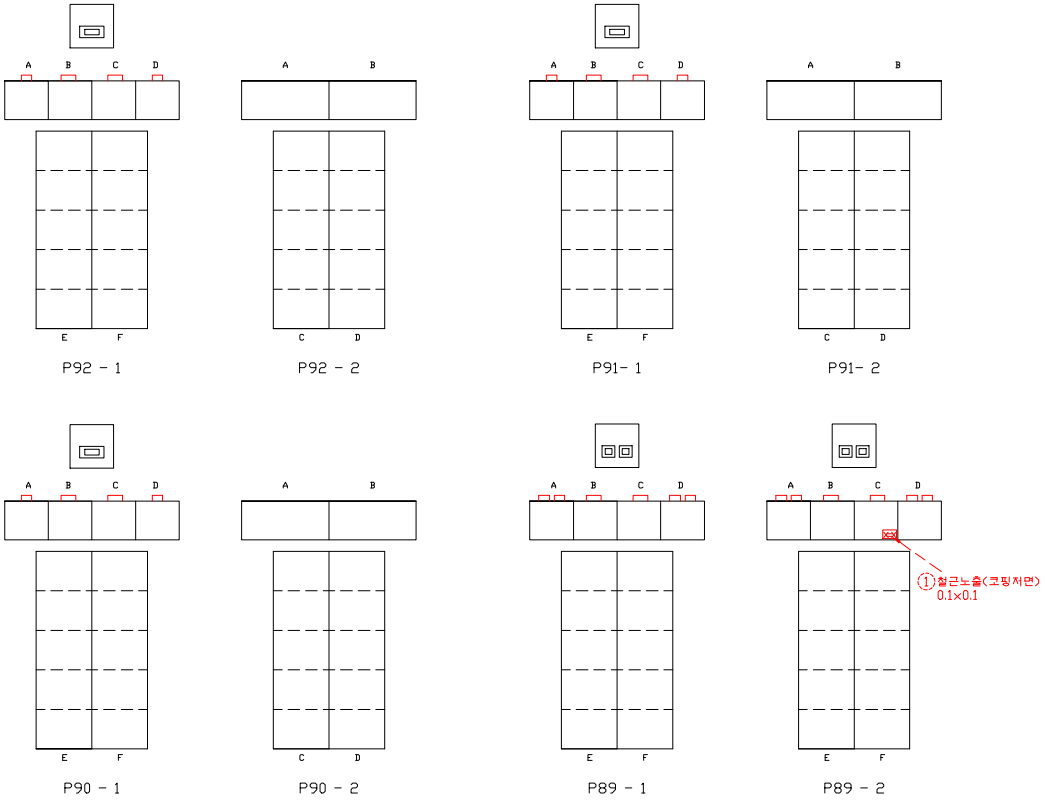


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	철근노출	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	124


ID : 도림천4복개 2련 / 교각




P88 - 1




P88 - 2




P87 - 1




P87 - 2




P86 - 1



P86 - 2



P85 - 1

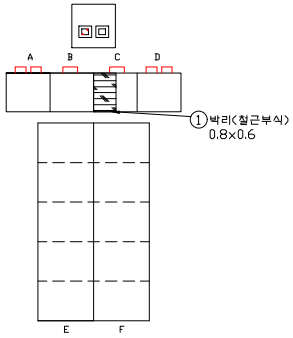


P85 - 2

손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모 폭(㎜)	깊이(m)	깊이(㎜)	물량	단위	개소	최종보수내역 년월	공법명/자재명	물량	비고	보수순위
1	2019	박리(철근부식)	0.80	0.60		0.48	㎡	1.00				신규	1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점검·보수 범례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION




용역명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	125

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

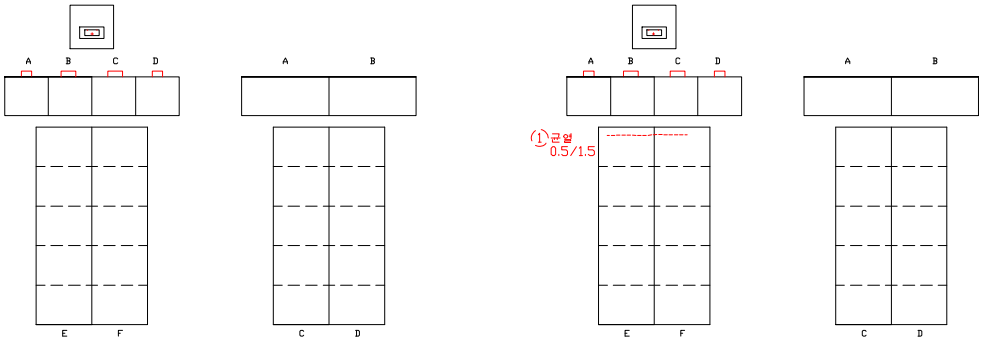

P84 - 1　P84- 2　P83 - 1　P83 - 2

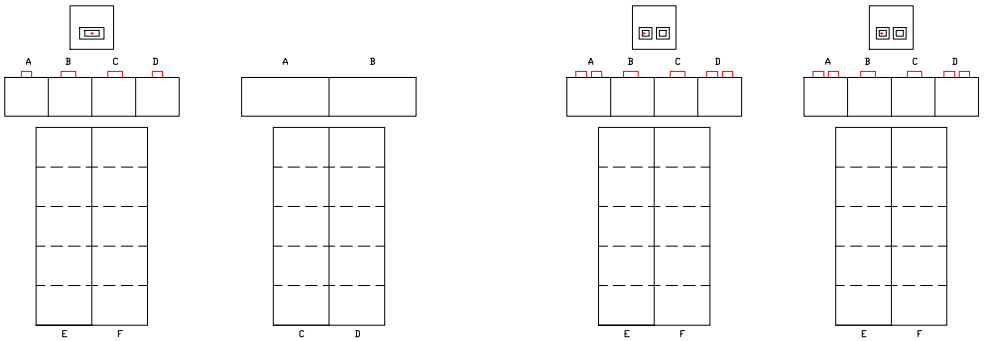


P82 - 1　P82 - 2　P81 - 1　P81 - 2

손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	균열	0.50	1.50		1.50	m	1.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	126

ID : 도림천4복개 2련 / 교각



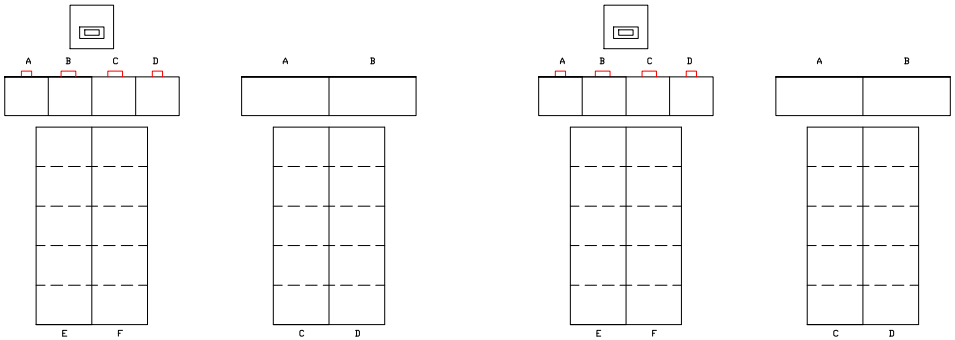


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	127

ID : 도림천4복개 2련 / 교각



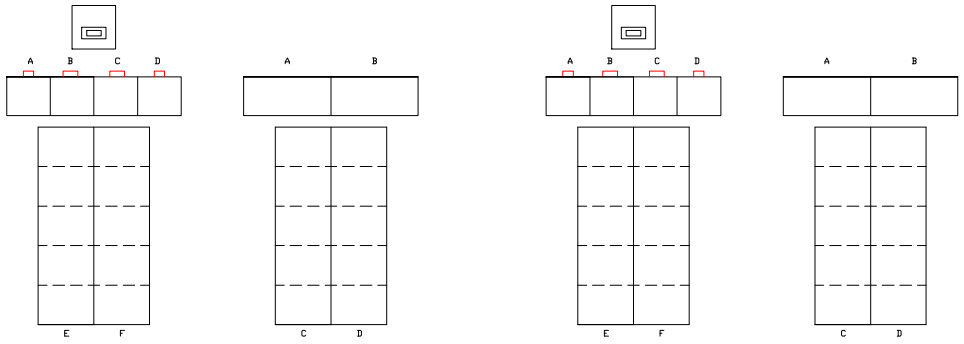


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	균열	0.30	0.30		0.30	m	1.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	128

ID : 도림천4복개 2련 / 교각







P72 - 1




P72- 2




P71 - 1




P71 - 2




P70 - 1



P70 - 2



P69 - 1




P69 - 2

손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	129

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

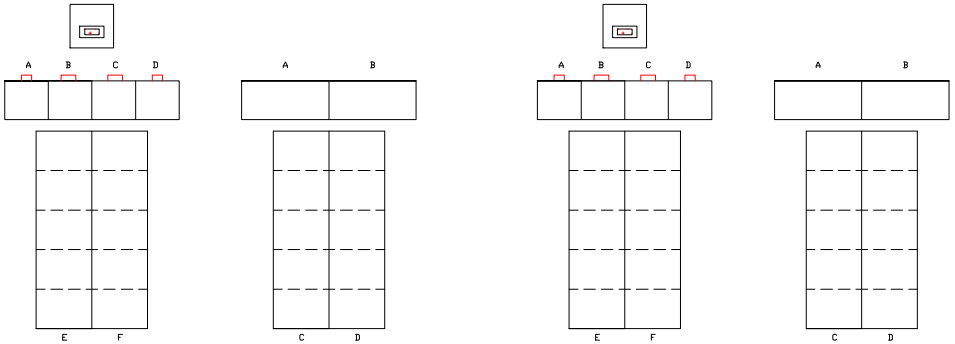

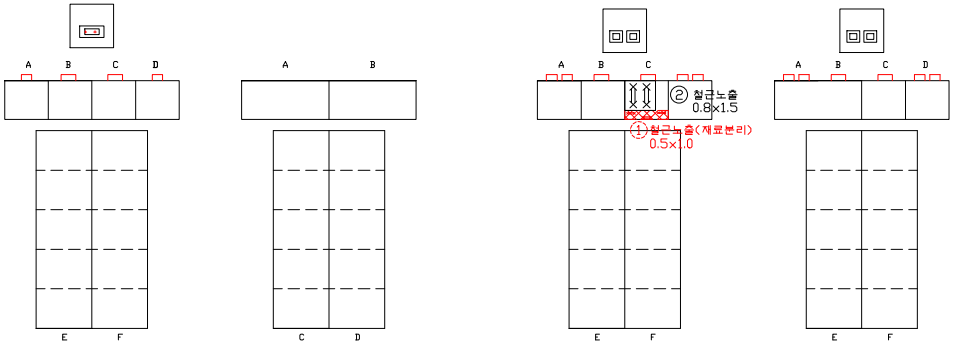


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	철근노출(재료분리)	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					1
2	2019	철근노출	0.80	1.50		1.20	㎡	1.00				신규	1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	130

ID : 도림천4복개 2련 / 교각



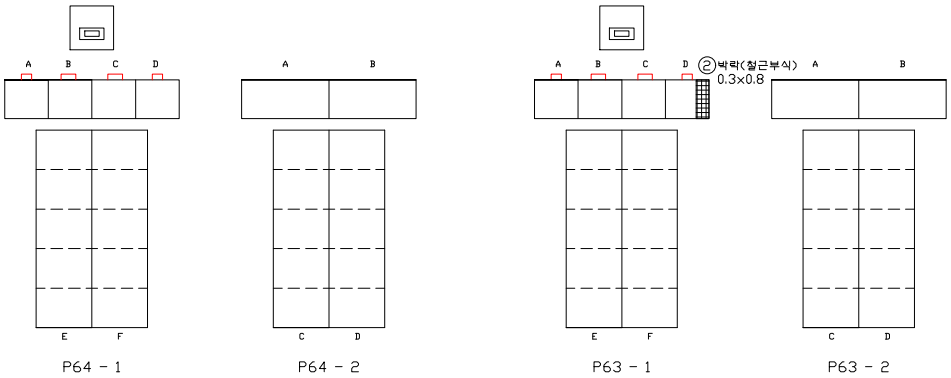


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	균열	0.30	0.30		0.30	m	1.00					1
2	2019	박락(철근부식)	0.30	0.80		0.24	㎡	1.00				신규	1
3	2019	박락(철근부식)	0.20	0.80		0.16	㎡	1.00				신규	1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	131

ID : 도림천4복개 2련 / 교각



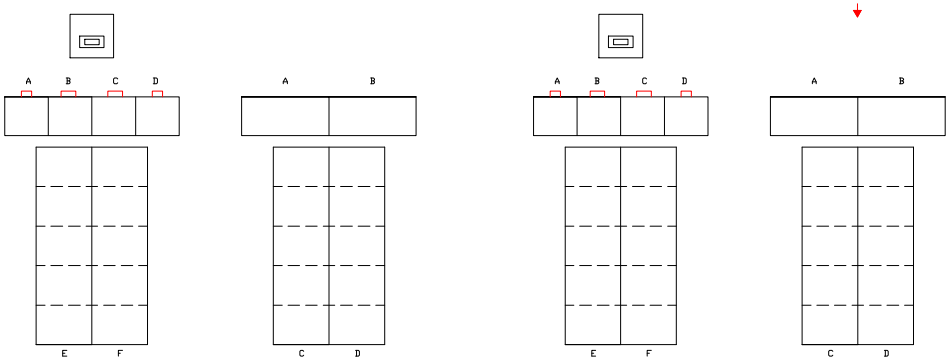


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	132

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

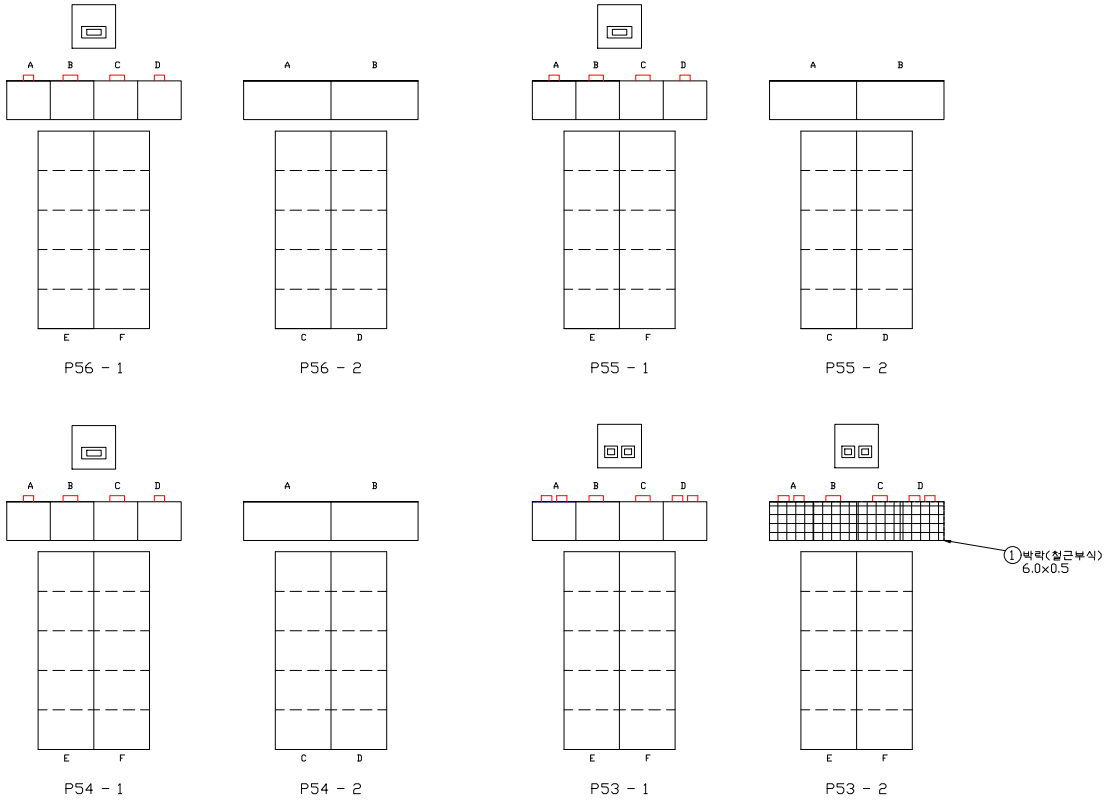


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	박락(철근부식)	6.00	0.50		3.00	㎡	1.00				신규	1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	133

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

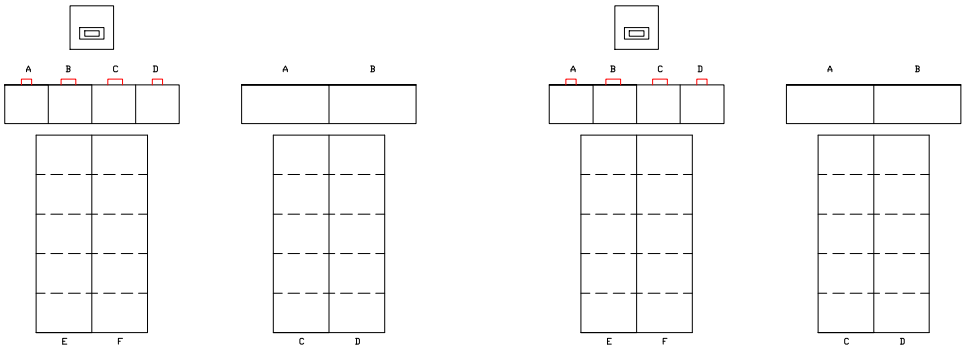


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	134


ID : 도림천4복개 2련 / 교각




P48 - 1




P48 - 2




P47 - 1



P47 - 2



P46 - 1




P46 - 2

손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	135

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

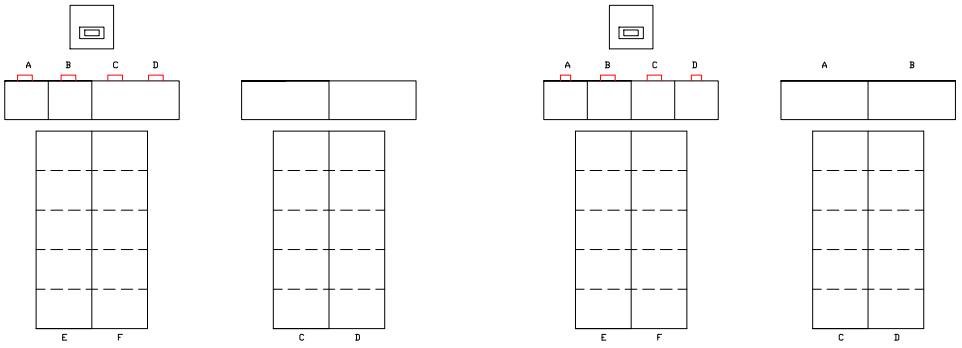

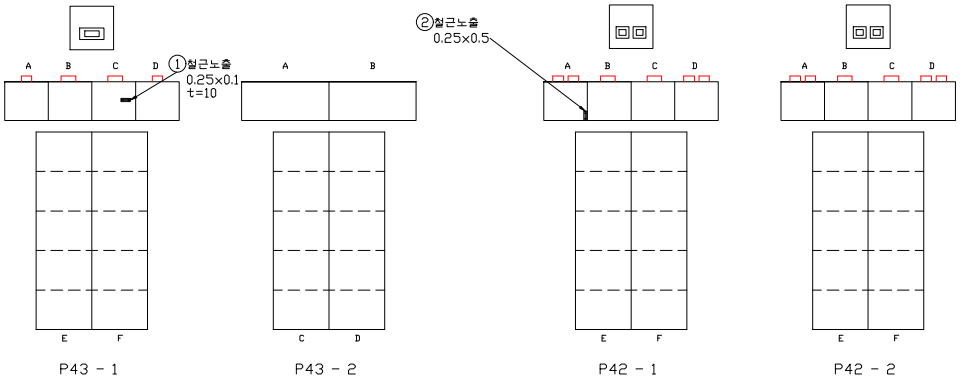


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	철근노출	0.25	0.10		0.03	㎡	1.00				신규	1
2	2019	철근노출	0.25	0.50		0.13	㎡	1.00				신규	1
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	136

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

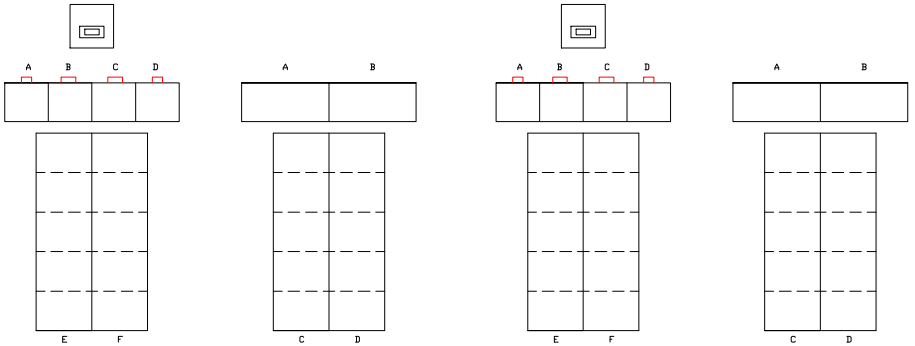


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	철근노출	0.40	0.50		0.20	㎡	1.00				신규	1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	137

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

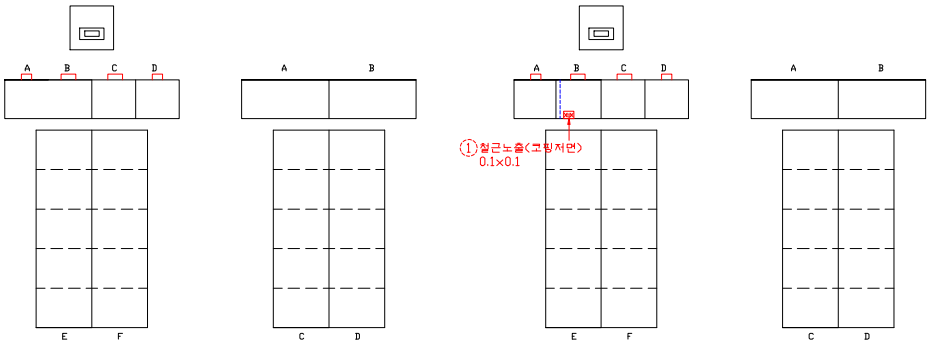

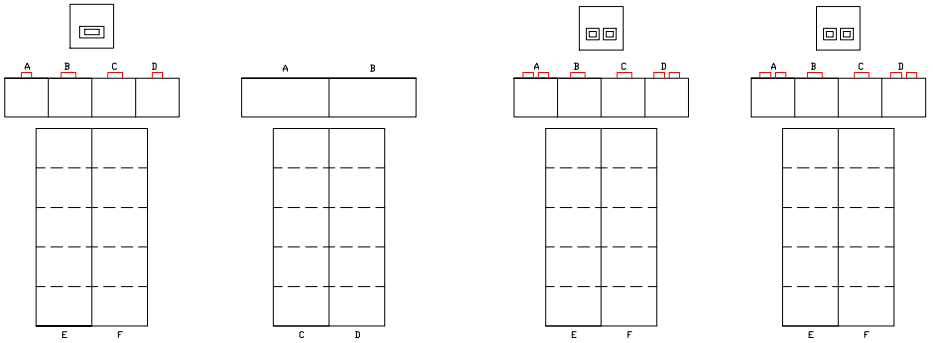


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모 폭(㎜)	결함규모 길이(m)	결함규모 깊이(㎜)	결함규모 물량	결함규모 단위	결함규모 개소	최종보수내역 년월	최종보수내역 공법명/자재명	최종보수내역 물량	비고	보수순위
1	2016	철근노출	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					1
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점검·보수 범례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION




용역명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락,박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	138


ID : 도림천4복개 2련 / 교각




P33 - 1




P33 - 2




P32- 1




P32- 2




P31 - 1



P31 - 2



P30 - 1




P30 - 2

손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	139

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

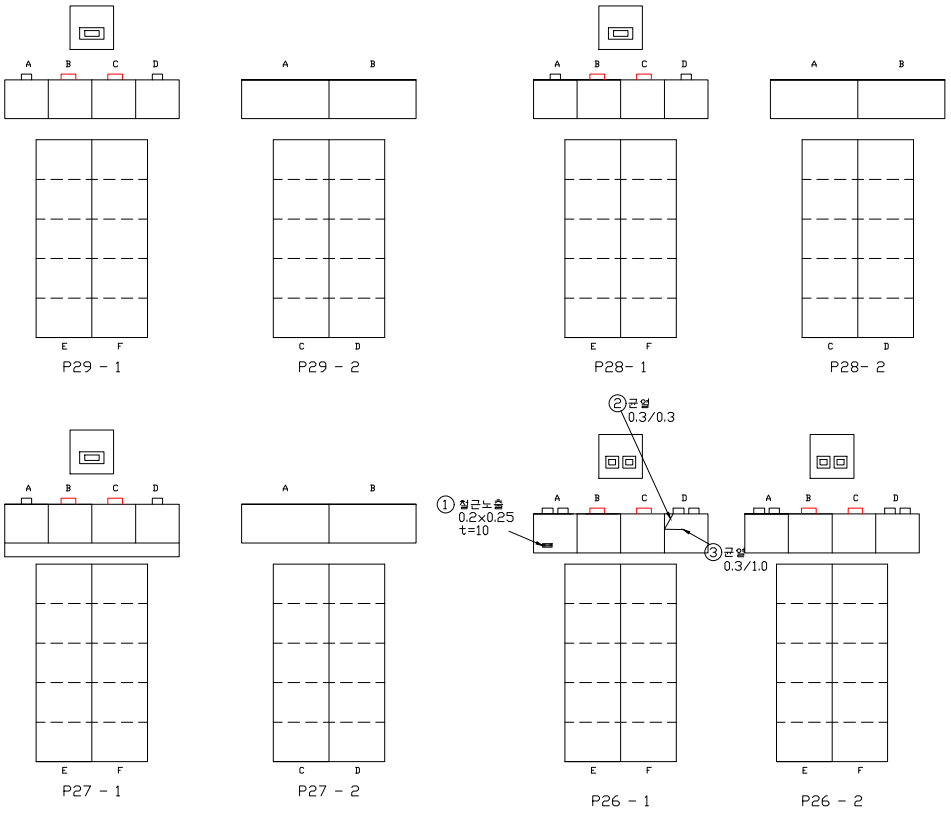


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	철근노출	0.20	0.25		0.05	㎡	1.00				신규	1
2	2019	균열	0.30	0.30		0.30	m	1.00				신규	1
3	2019	균열	0.30	1.00		1.00	m	1.00				신규	1
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	140

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

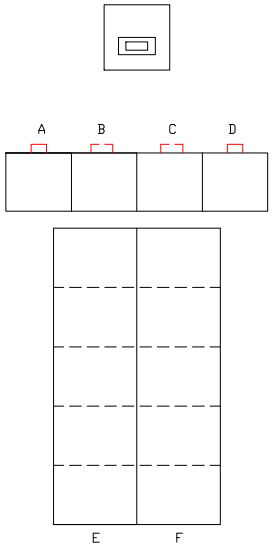

P25 - 1

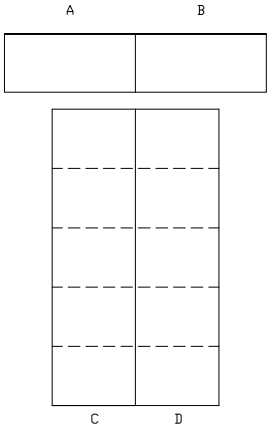


P25 - 2

손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	141

1.6 2련 (2순위)

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

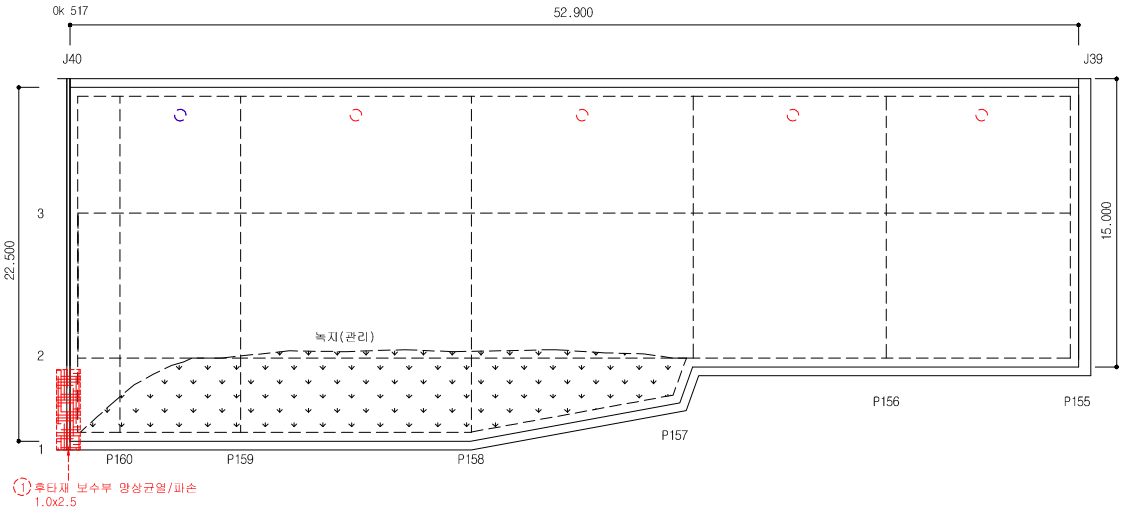


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2013	후타재보수부망상균열/파손	1.00	2.50		2.50	㎡	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	001

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

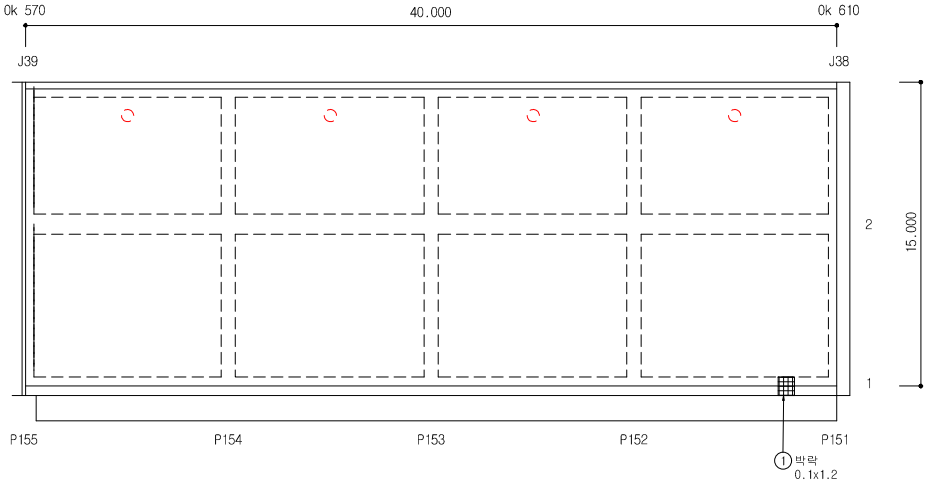


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	박락	0.10	1.20		0.12	㎡	1.00				신규	2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	002

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

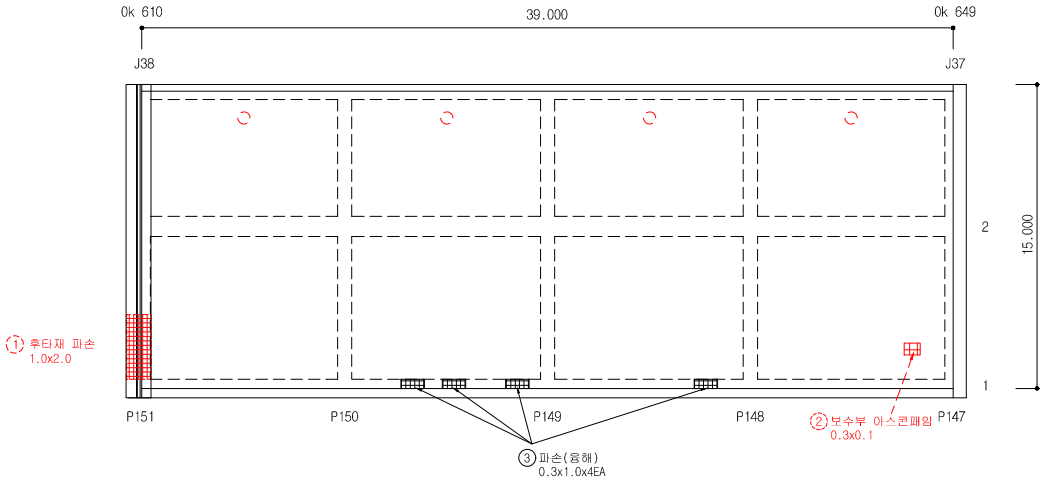


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2013	후타재파손	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					2
2	2016	보수부아스콘패잉	0.30	0.10		0.03	㎡	1.00					2
3	2019	파손	0.30	1.00		1.20	㎡	4.00				신규	2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	003

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

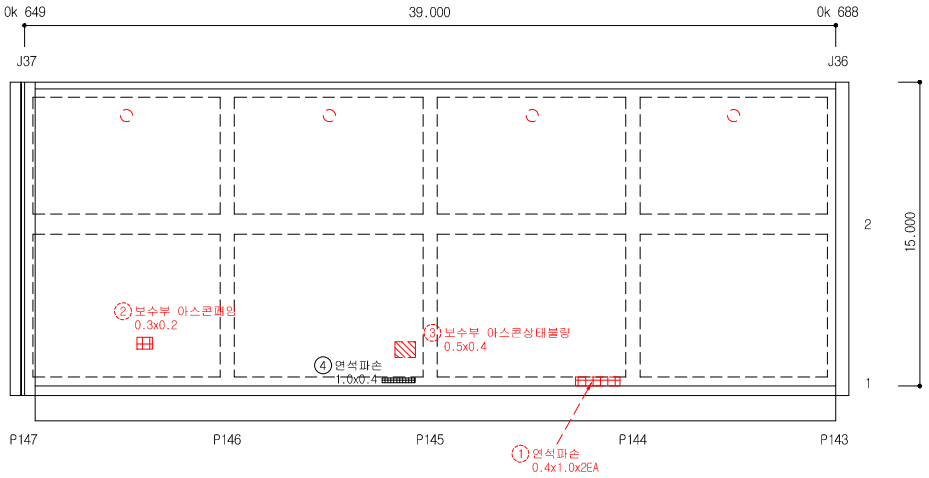


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	연석파손	0.40	1.00		0.80	㎡	2.00					2
2	2016	보수부아스콘패임	0.30	0.20		0.06	㎡	1.00					2
3	2016	보수부아스콘상태불량	0.50	0.40		0.20	㎡	1.00					2
4	2019	연석파손	1.00	0.40		0.40	㎡	1.00				신규	2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	004

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

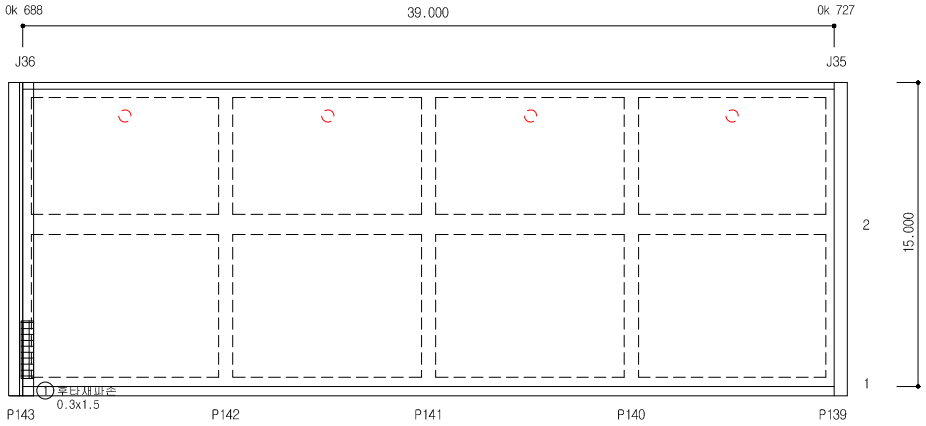


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	후타재파손	0.30	1.50		0.45	㎡	1.00				신규	2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	005

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

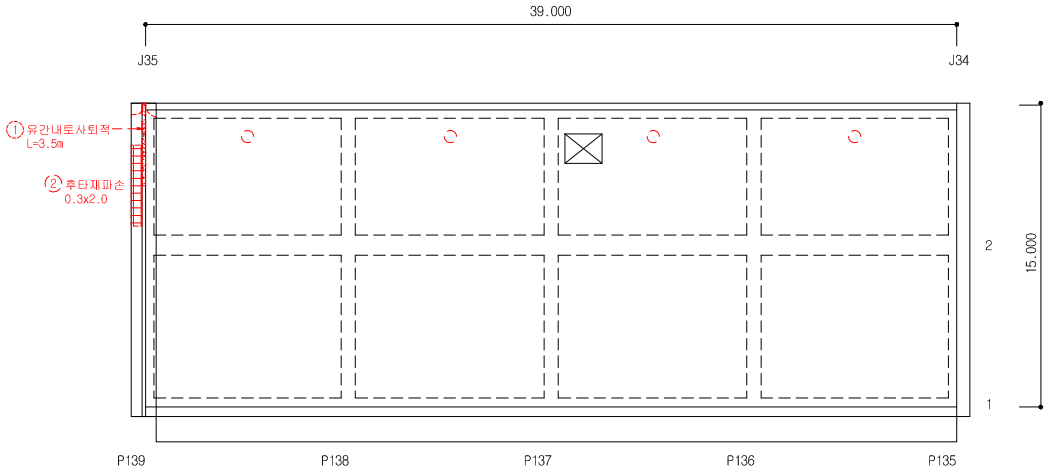


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	유간내토사퇴적	-	3.50		3.50	m	1.00					2
2	2014	후타재파손	0.30	2.00		0.60	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	얼회	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	006

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

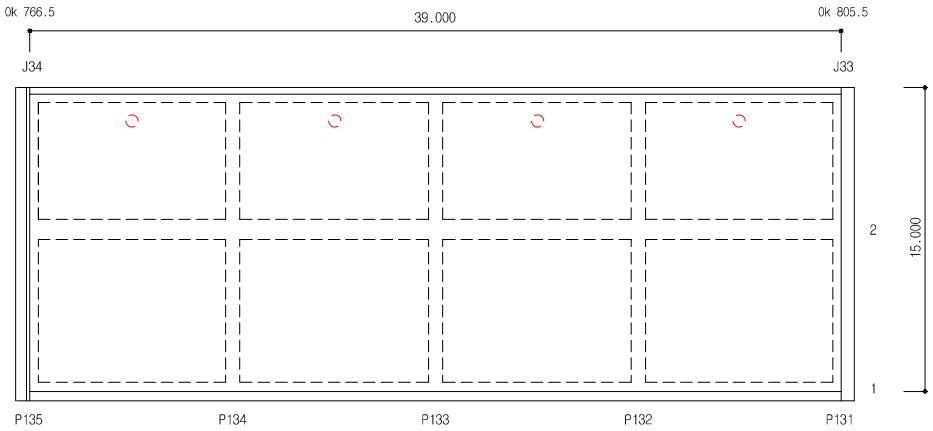


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	007

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

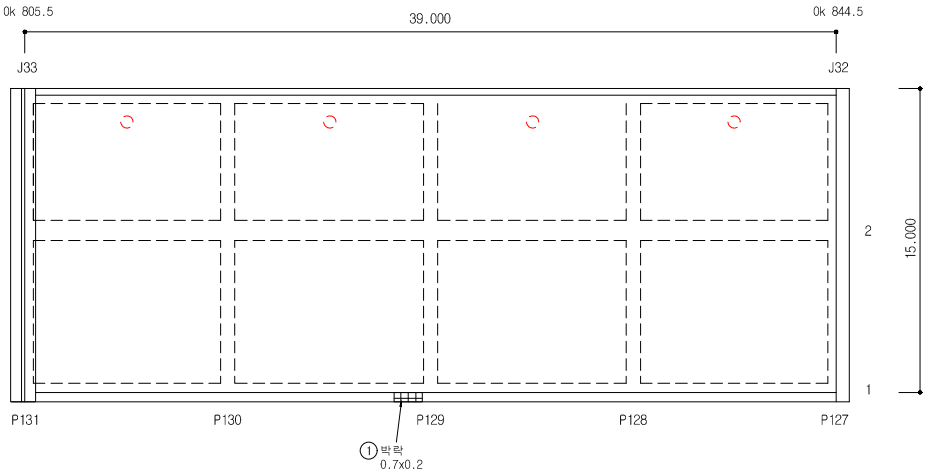


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	박락	0.70	0.20		0.14	㎡	1.00				신규	2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	008

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

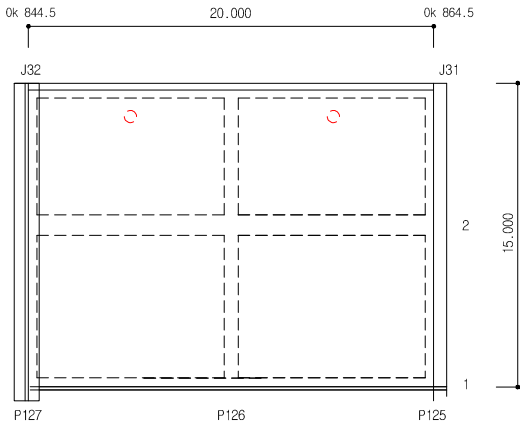


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	009

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

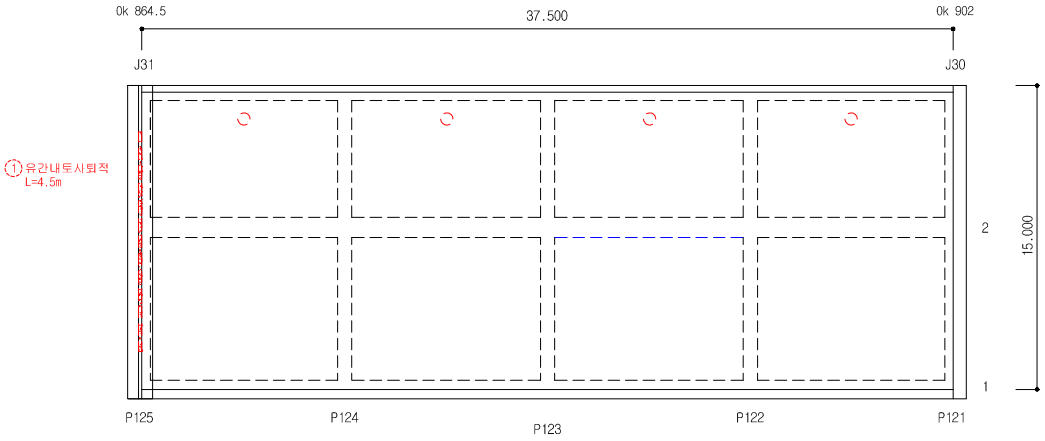


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (mm)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	유간내토사퇴적	-	4.50		4.50	m	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	010

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

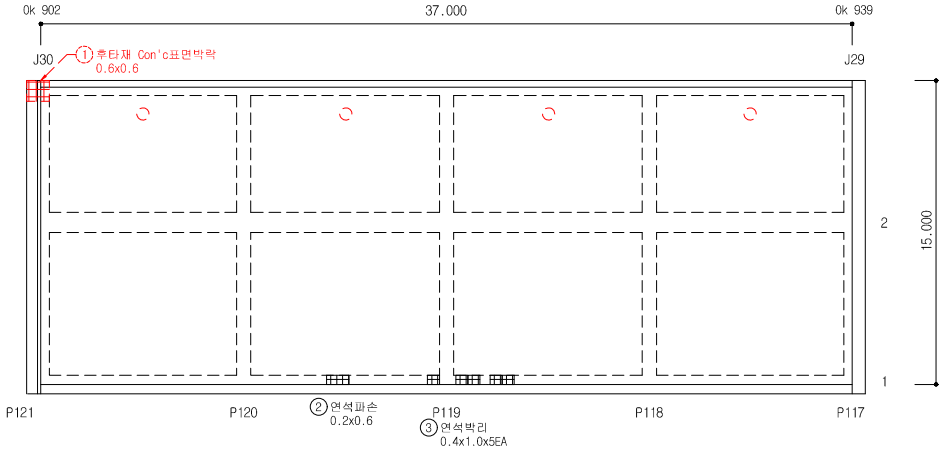


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	후타재 Con'c표면박락	0.60	0.60		0.36	㎡	1.00					2
2	2019	연석파손	0.20	0.60		0.12	㎡	1.00				신규	2
3	2019	연석박리	0.40	1.00		2.00	㎡	5.00				신규	2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	011

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

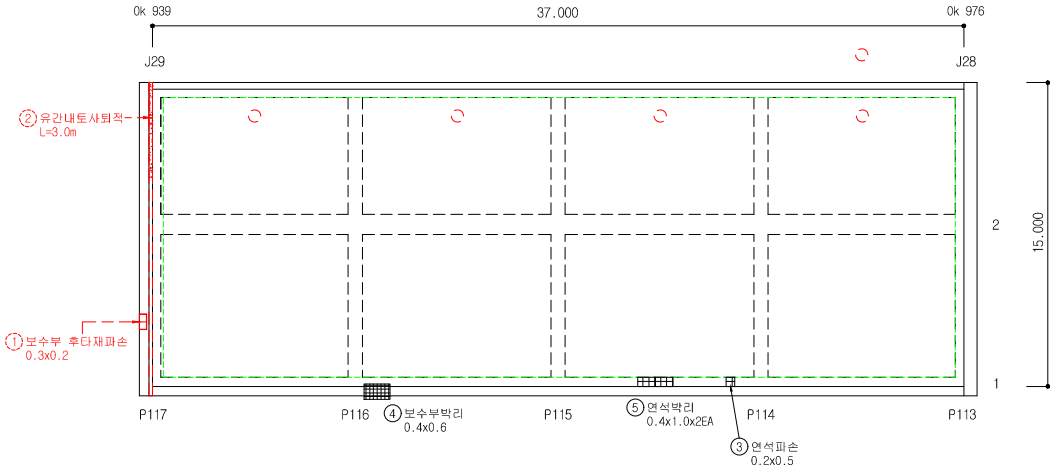


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	보수부 후타재파손	0.30	0.20		0.06	㎡	1.00					2
2	2016	유간내토사퇴적	-	3.00		1.00	m	1.00					2
3	2019	연석파손	0.40	1.00		0.40	㎡	2.00				신규	2
4	2019	보수부박리	0.40	0.60		0.24	㎡	1.00				신규	2
5	2019	연석박리	0.40	0.60		0.24	㎡	1.00				신규	2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	012

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

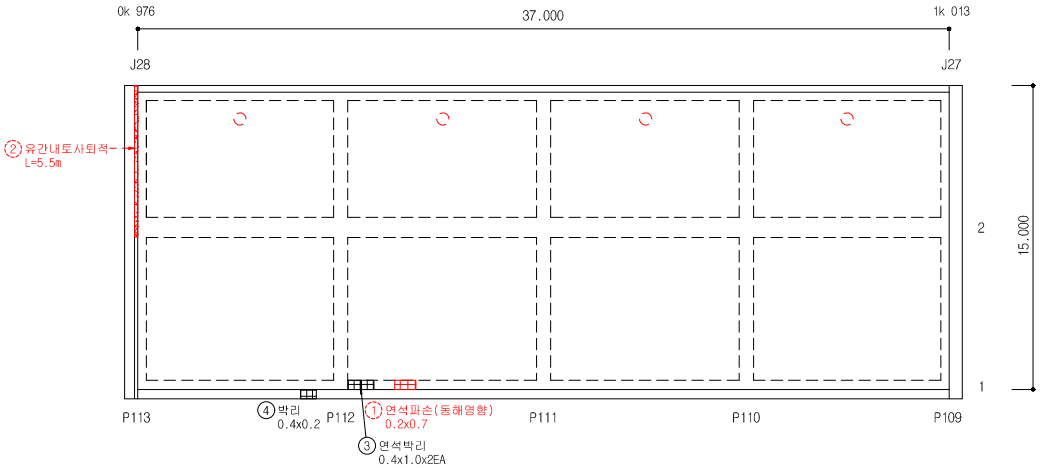


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	연석파손(동해열향)	0.20	0.70		1.00	EA	1.00					2
2	2016	유간내토사퇴적	-	5.50		1.00	m	1.00					2
3	2019	연석박리	0.40	1.00		0.80	㎡	2.00				신규	2
4	2019	박리	0.40	0.20		0.08	㎡	1.00				신규	2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	013

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

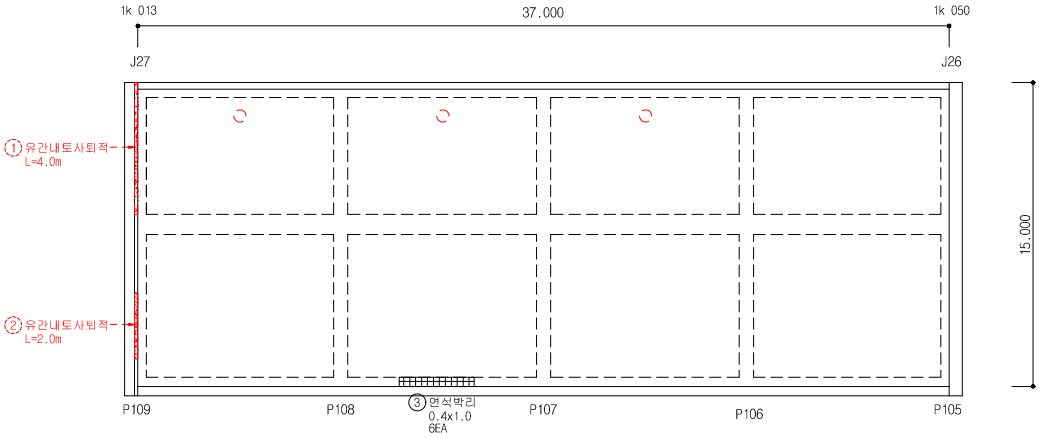


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	유간내토사퇴적	-	4.00		1.00	m	1.00					2
2	2016	유간내토사퇴적	-	2.00		1.00	m	1.00					2
3	2019	연석박리	0.40	1.00		2.40	㎡	6.00				신규	2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	014

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

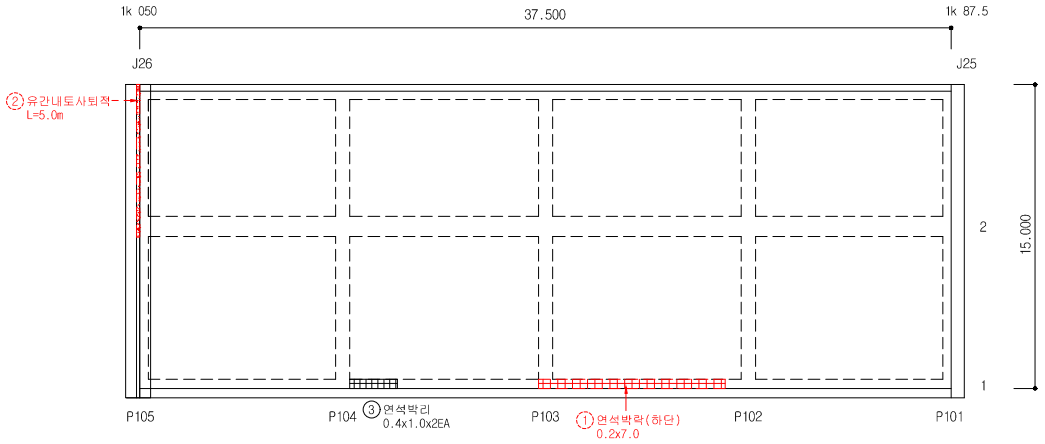


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	연석박락(하단)	0.20	7.00		1.00	EA	1.00					2
2	2016	유간내토사퇴적	-	5.00		5.00	m	1.00					2
3	2019	연석박리	0.40	1.00		0.80	㎡	2.00				신규	2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	015

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

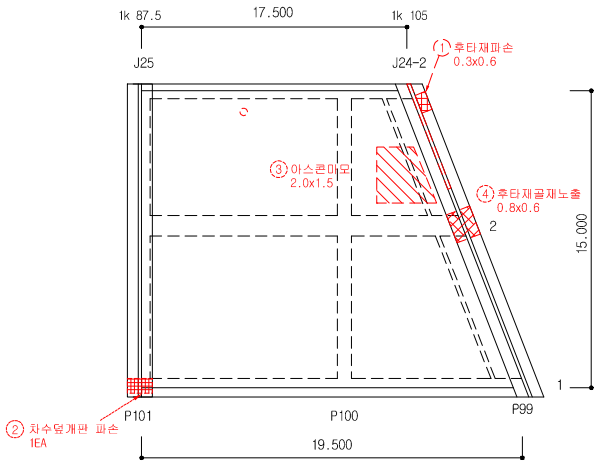


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	후타재파손	0.30	0.60		0.18	㎡	1.00					2
2	2013	차수덮개판파손	-	-		1.00	EA	1.00					2
3	2016	아스콘마모	2.00	1.50		3.00	㎡	1.00					2
4	2016	후타재골재노출	0.80	0.60		0.48	㎡	1.00					2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	016

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

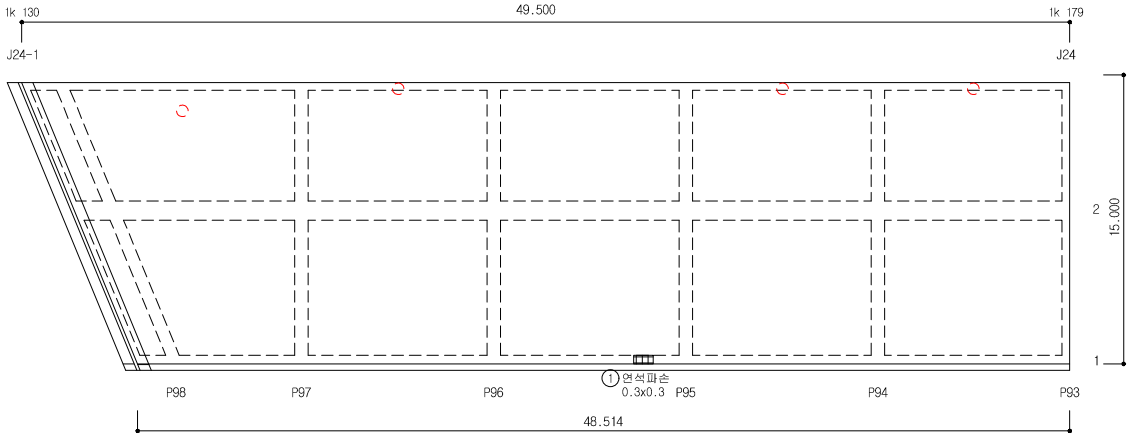


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모 폭(㎜)	결함규모 깊이(m)	결함규모 깊이(㎜)	결함규모 물량	결함규모 단위	결함규모 개소	최종보수내역 년월	최종보수내역 공법명/자재명	최종보수내역 물량	비고	보수순위
1	2019	연석파손	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00				신규	2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점검·보수 범례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용역명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	017

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

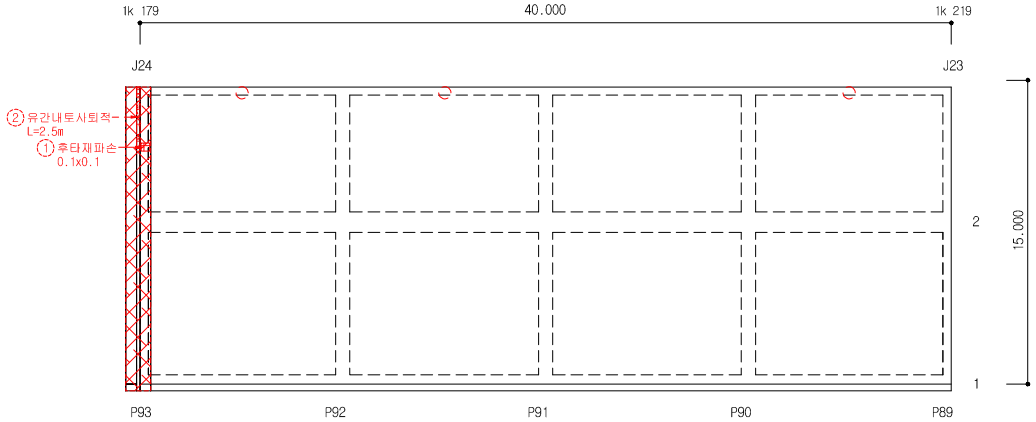


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	후타재파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
2	2016	유간내토사퇴적	-	2.50		2.50	m	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	얼회	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	018

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

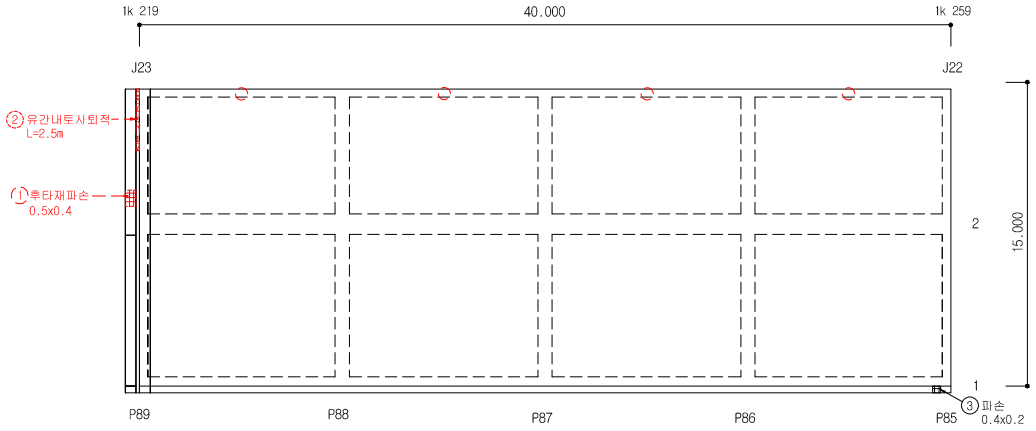


손 상 물 량 표

연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	후타재파손	0.50	0.40		0.20	㎡	1.00					2
2	2016	유간내토사퇴적	-	2.50		2.50	m	1.00					2
3	2019	파손	0.40	0.20		0.08	㎡	1.00				신규	2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	019

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

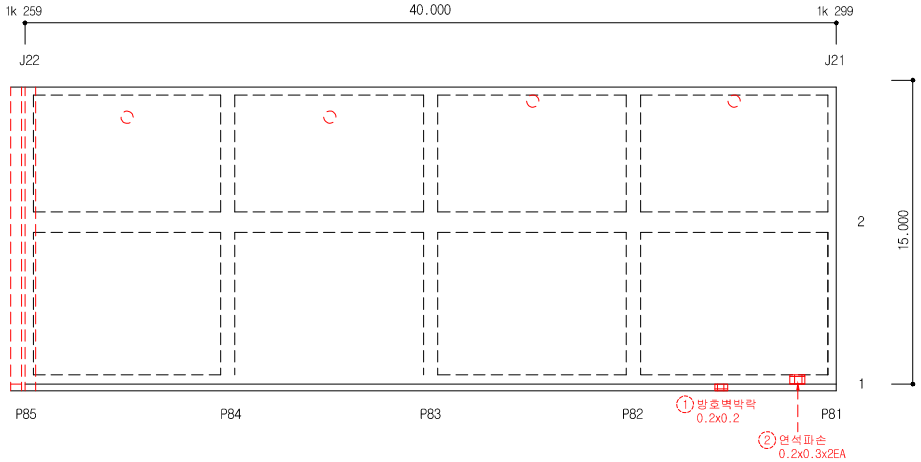


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	방호벽박락	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					2
2	2016	연석파손	0.20	0.30		2.00	EA	2.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	020

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

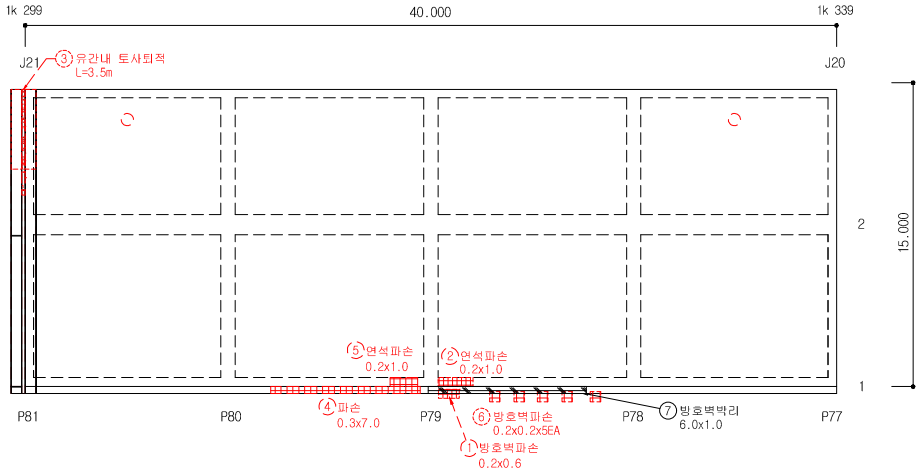


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	방호벽파손	0.20	0.60		0.12	㎡	1.00					2
2	2014	연석파손	0.20	1.00		1.00	EA	1.00					2
3	2016	유간내 토사퇴적	-	3.50		3.50	m	1.00					2
4	2018	파손	0.30	7.00		2.10	㎡	1.00					2
5	2018	연석파손	0.20	1.00		0.20	㎡	1.00					2
6	2016	방호벽파손	0.20	0.20		0.20	㎡	5.00					2
7	2019	방호벽박리	6.00	1.00		6.00	㎡	1.00				신규	2
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	얼회	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	021

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

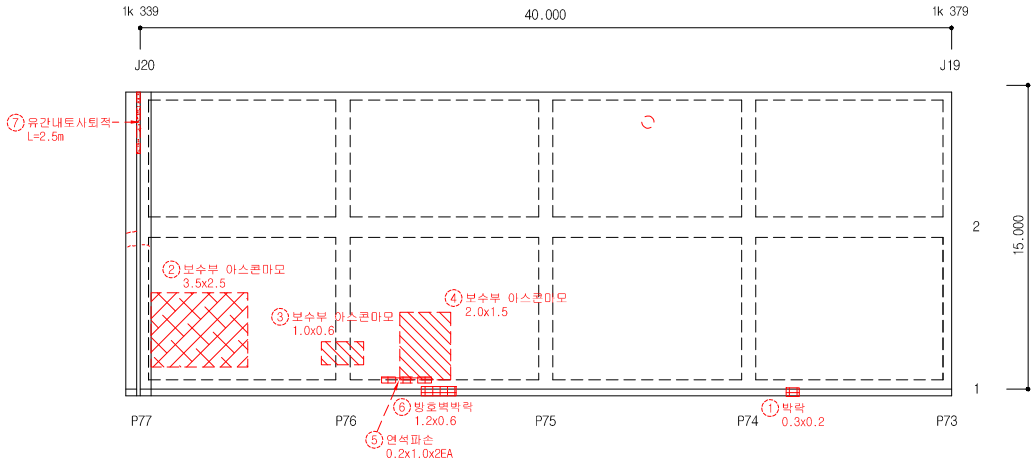


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	박락	0.30	0.20		0.06	㎡	1.00					2
2	2016	보수부아스콘마모	3.50	2.50		8.75	㎡	1.00					2
3	2016	보수부아스콘마모	1.00	0.60		0.60	㎡	1.00					2
4	2016	보수부아스콘마모	2.00	1.50		3.00	㎡	1.00					2
5	2016	연석파손	0.20	1.00		2.00	EA	2.00					2
6	2016	방호벽박락	1.20	0.60		0.72	㎡	1.00					2
7	2016	유간내토사퇴적	-	2.50		2.50	m	1.00					2
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	022

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

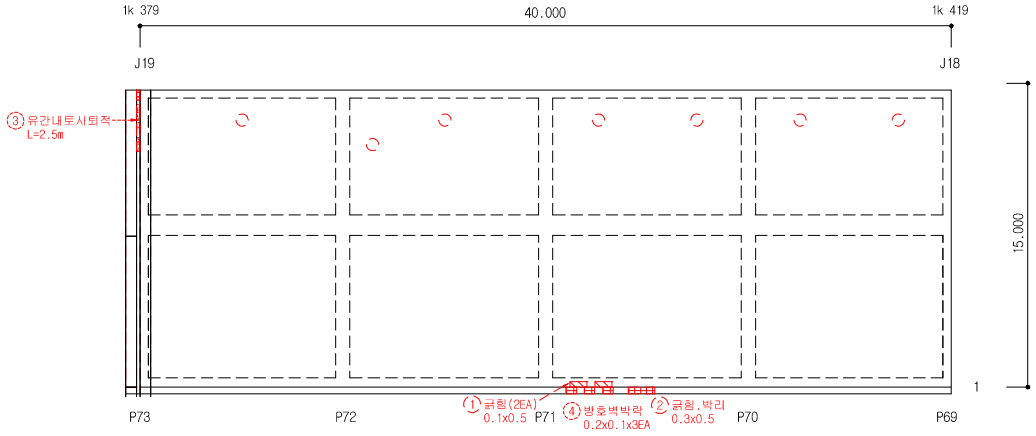


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	긁힘	0.10	0.50		0.10	㎡	2.00					2
2	2018	긁힘,박리	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					2
3	2016	유간내토사퇴적	-	2.50		2.50	m	1.00					2
4	2016	방호벽박락	0.20	0.10		0.06	㎡	3.00					2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	023

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

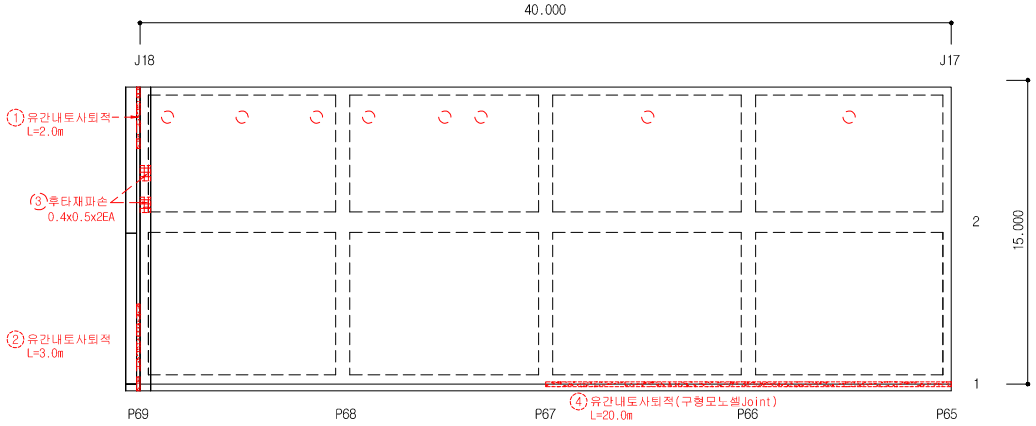


손 상 물 량 표

연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	유간내토사퇴적	-	2.00		2.00	m	1.00					2
2	2016	유간내토사퇴적	-	3.00		3.00	m	1.00					2
3	2014	후타재파손	0.40	0.50		0.40	㎡	2.00					2
4	2016	유간내토사퇴적(구형모노쎌Joint)		20.00		20.00	m	1.00					2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	024

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

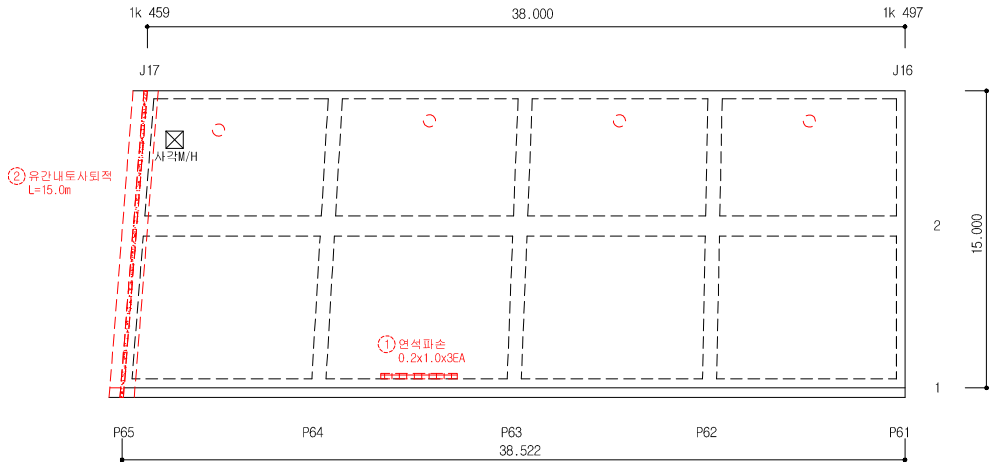


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	연석파손	0.20	1.00		3.00	EA	3.00					2
2	2016	유간내토사퇴적	-	15.00		15.00	m	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	025

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

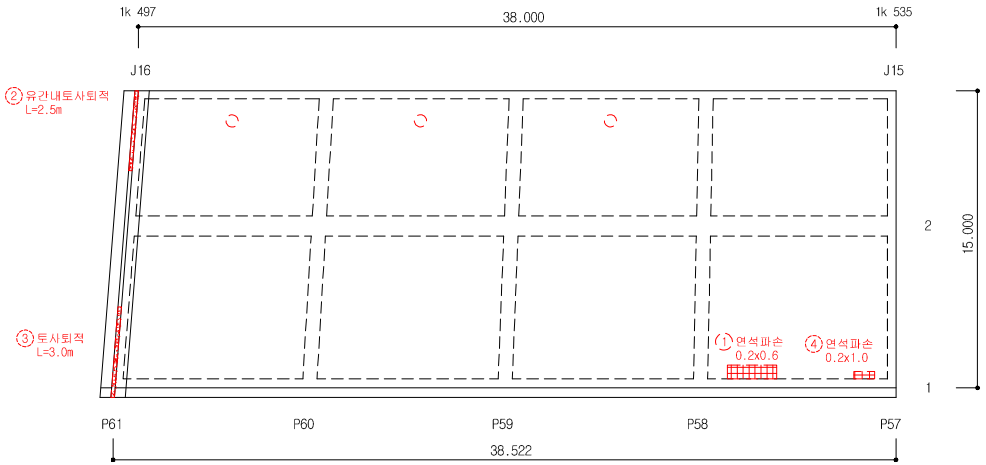


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	연석파손	0.20	0.60		0.12	㎡	1.00					2
2	2016	유간내토사퇴적	-	2.50		2.50	m	1.00					2
3	2016	토사퇴적	-	3.00		3.00	m	1.00					2
4	2016	연석파손	0.20	1.00		1.00	EA	1.00					2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	026

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

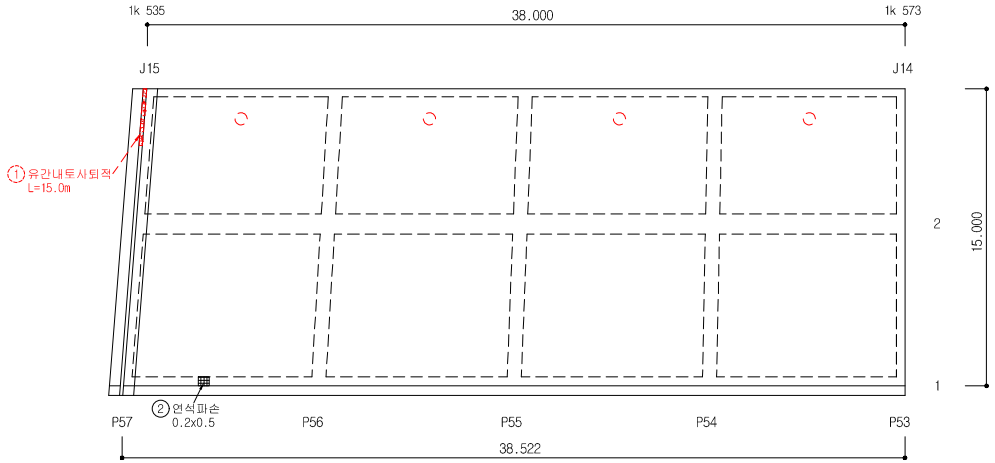


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	유간내토사퇴적		15.00		15.00	m	1.00					2
2	2019	연석파손	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00				신규	2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	027

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

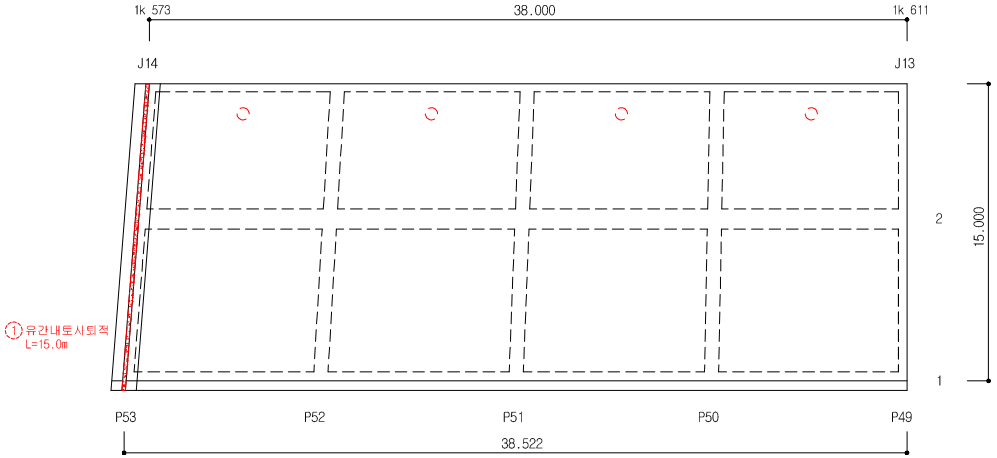


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결함종류	결함규모 폭(mm)	결함규모 길이(m)	결함규모 깊이(mm)	결함규모 물량	결함규모 단위	결함규모 개소	최종보수내역 년월	최종보수내역 공법명/자재명	최종보수내역 물량	비고	보수순위
1	2016	유간내토사퇴적	-	15.00		15.00	m	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용역명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	028

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

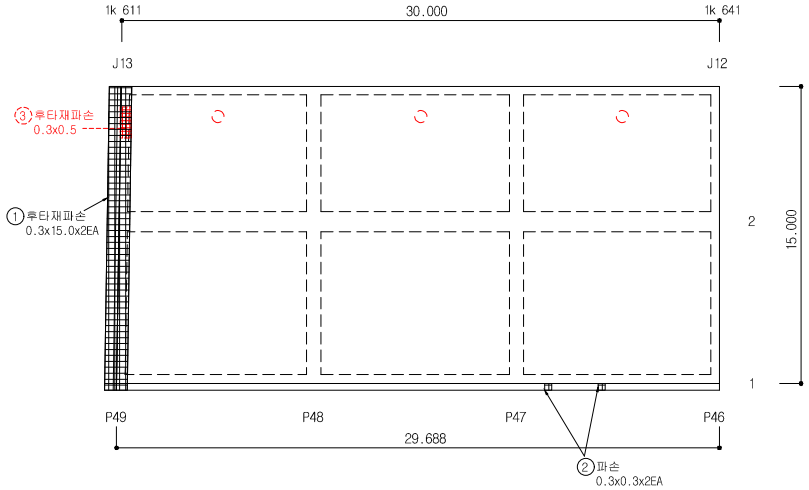


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2019	후타재파손	0.30	15.00		9.00	㎡	2.00				신규	2
2	2019	파손	0.30	0.30		0.18	㎡	2.00				신규	2
3	2011	후타재파손	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	029

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면


손 상 물 량 표

연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	유간내토사퇴적	-	15.00		15.00	m	1.00					2
2	2016	유간내토사퇴적	-	15.00		15.00	m	1.00					2
3	2016	후타재파손	0.50	0.20		0.10	㎡	1.00					2
4	2019	박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00				신규	2
5	2019	연석파손	0.20	0.40		0.08	㎡	1.00				신규	2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

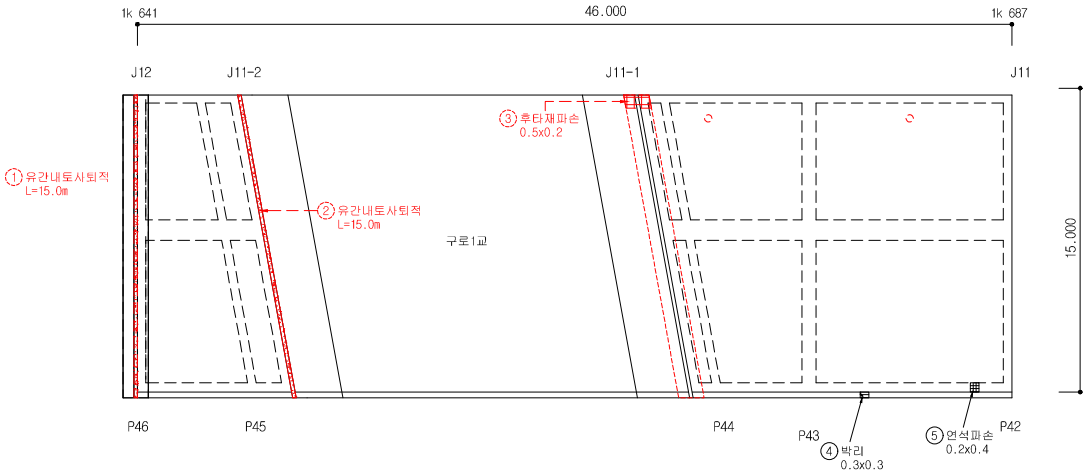


점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	030

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

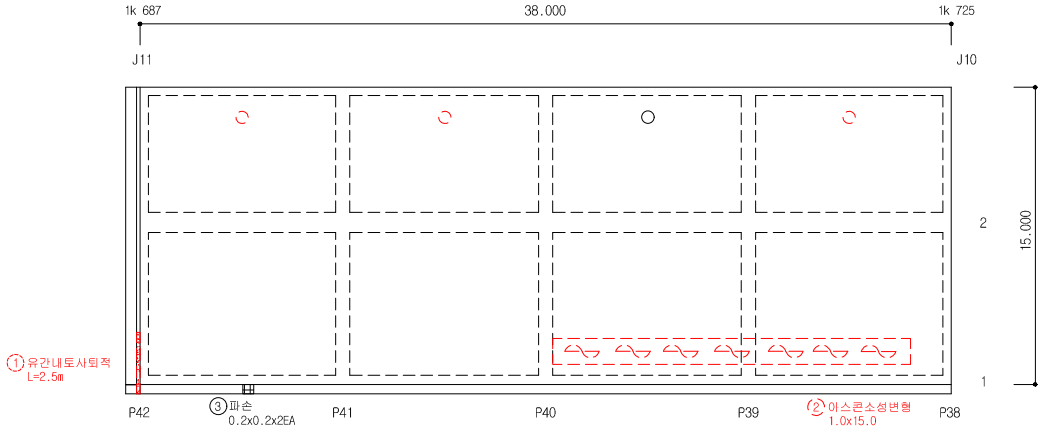


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	유간내토사퇴적	-	2.50		2.50	m	1.00					2
2	2018	아스콘소성변형	1.00	15.00		15.00	㎡	1.00					2
3	2019	파손	0.20	0.20		0.08	㎡	2.00				신규	2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	031

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

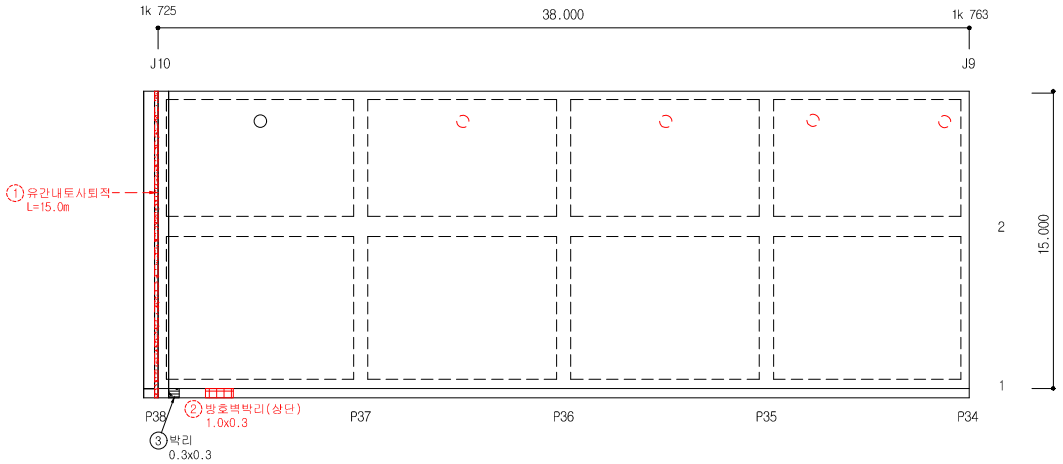


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	유간내토사퇴적	-	0.00		15.00	m	1.00					2
2	2016	방호벽박리(상단)	1.00	0.30		0.30	㎡	1.00					2
3	2019	박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00				신규	2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	얼회	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	032

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

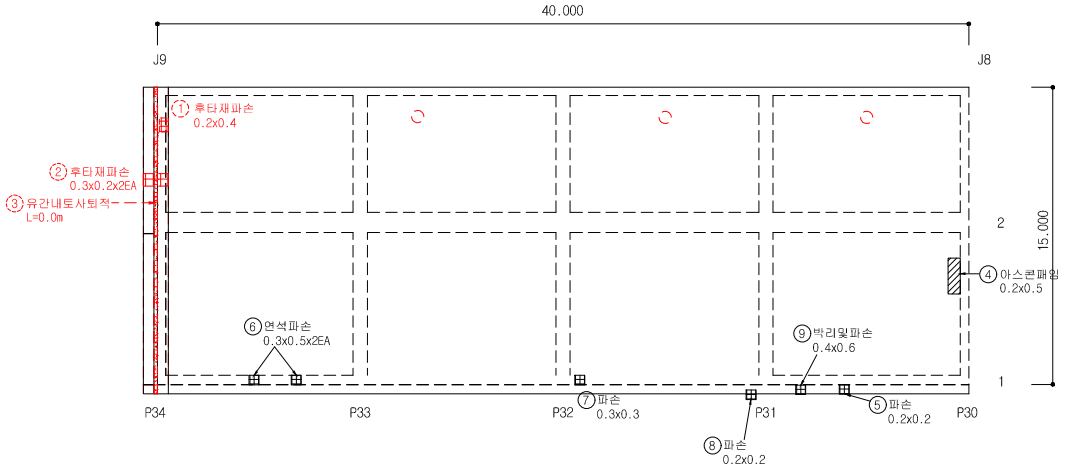


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	후타재파손	0.20	0.40		0.08	㎡	1.00					2
2	2016	후타재파손	0.30	0.20		0.12	㎡	2.00					2
3	2016	유간내토사퇴적	-	15.00		15.00	m	1.00					2
4	2019	아스콘패임	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00				신규	2
5	2019	파손	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00				신규	2
6	2019	연석파손	0.30	0.50		0.30	㎡	2.00				신규	2
7	2019	파손	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00				신규	2
8	2019	파손	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00				신규	2
9	2019	박리및파손	0.40	0.60		0.24	㎡	1.00				신규	2
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	033

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

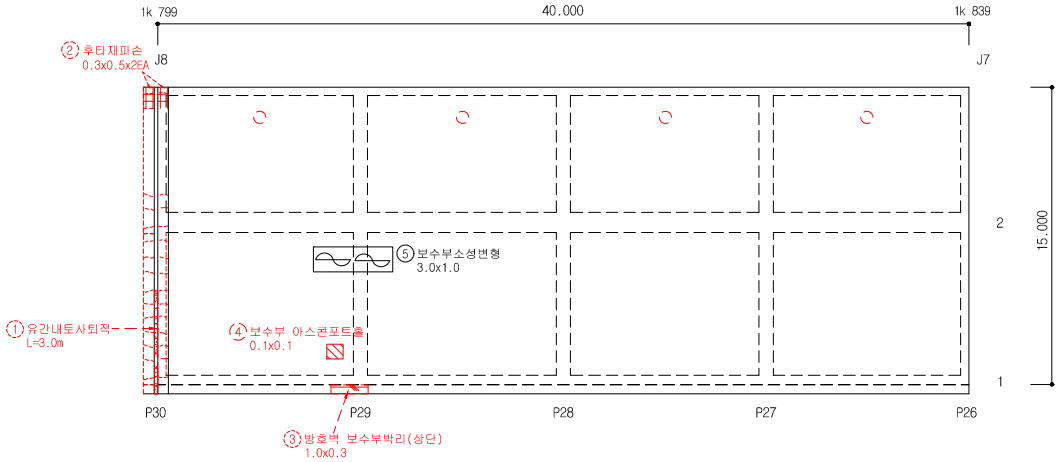


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	유간내토사퇴적	-	3.00		3.00	m	1.00					2
2	2011	후타재파손	0.30	0.50		0.30	㎡	2.00					2
3	2016	방호벽 보수부박리(상단)	1.00	0.30		0.30	㎡	1.00					2
4	2018	보수부아스콘포트홀	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
5	2019	보수부소성변형	3.00	1.00		3.00	㎡	1.00				신규	2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	034

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판상면

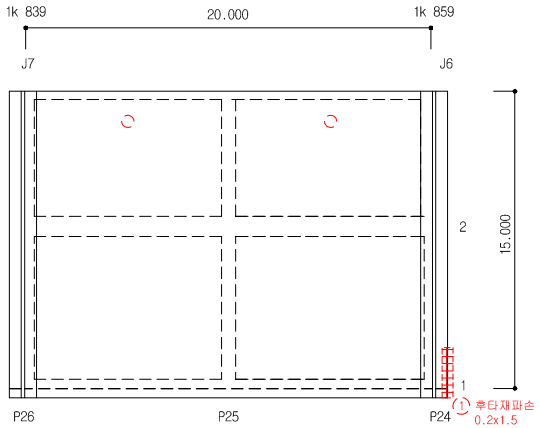


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	후타재파손	0.20	1.50		0.30	㎡	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	035

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

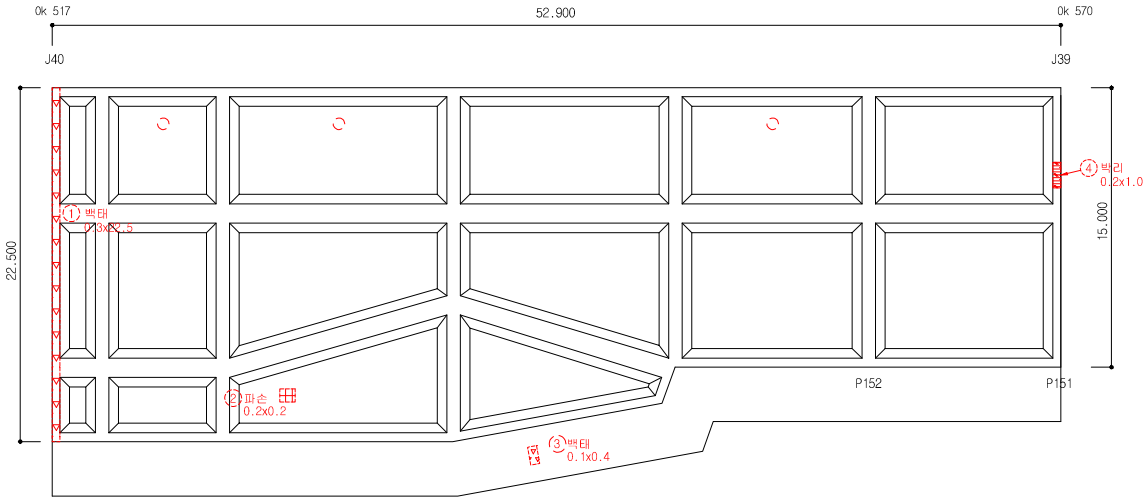


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.30	22.50		6.75	㎡	1.00					2
2	2011	파손	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					2
3	2014	백태	0.10	0.40		0.04	㎡	1.00					2
4	2016	박리	0.20	1.00		0.20	㎡	1.00					2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	036

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

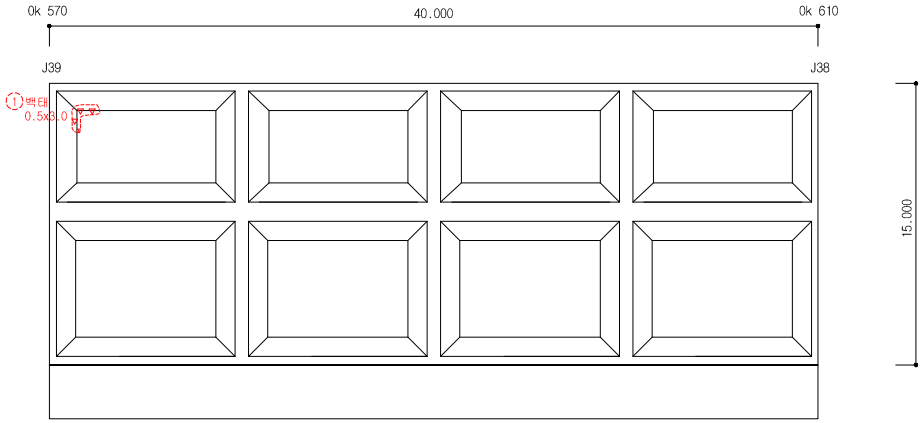


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.50	3.00		1.50	㎡	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	037

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

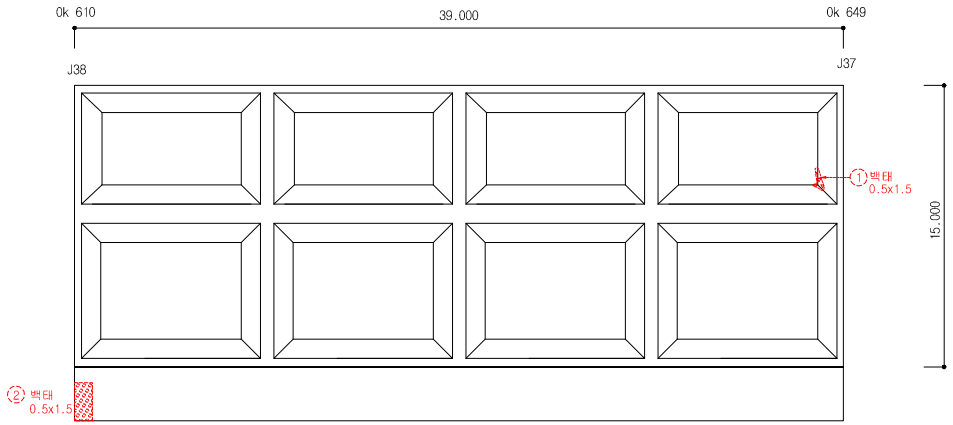


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.50	1.50		0.75	㎡	1.00					2
2	2011	백태	0.50	1.50		0.75	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	038

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

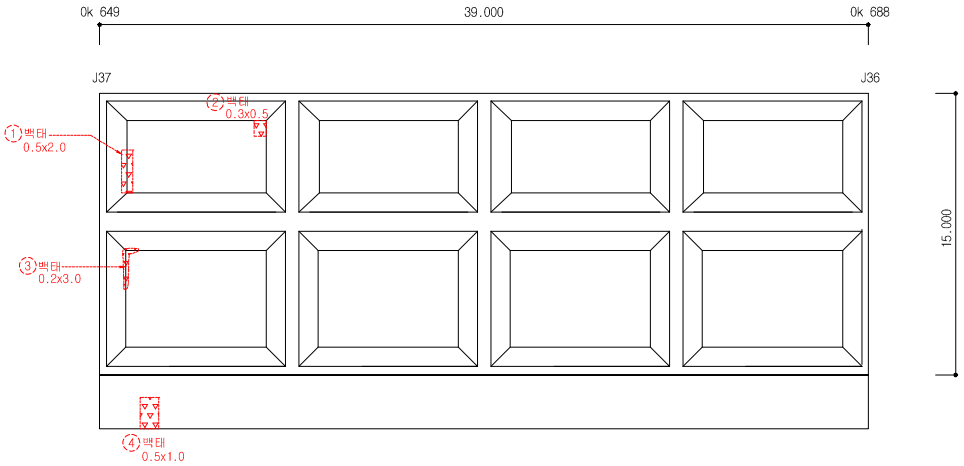


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
2	2013	백태	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					2
3	2011	백태	0.20	3.00		0.60	㎡	1.00					2
4	2011	백태	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	039

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

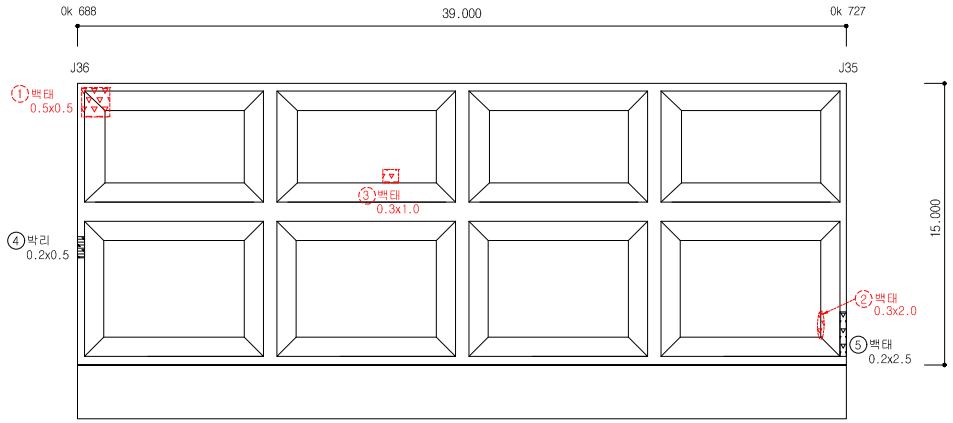


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
2	2011	백태	0.30	2.00		0.60	㎡	1.00					2
3	2011	백태	0.30	1.00		0.30	㎡	1.00					2
4	2019	박리	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00				신규	2
5	2019	백태	0.20	2.50		0.50	㎡	1.00				신규	2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	040

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

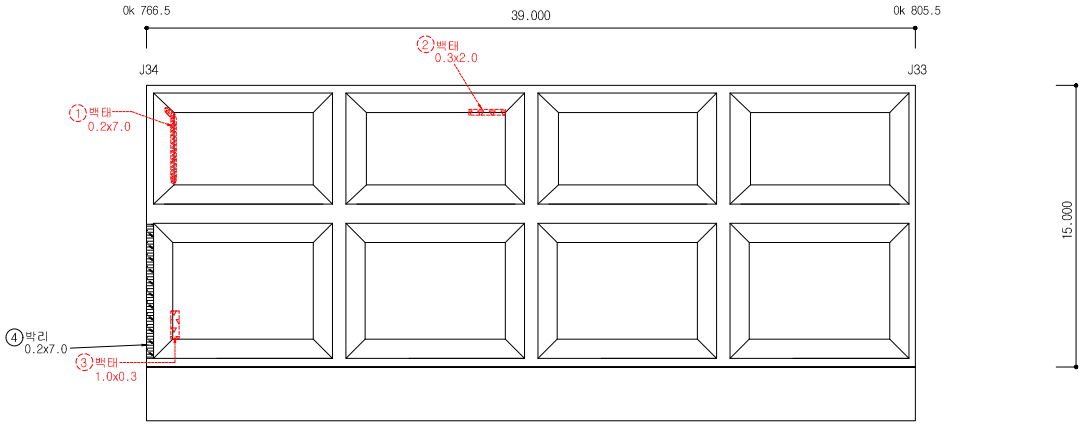


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.20	7.00		1.40	㎡	1.00					2
2	2011	백태	0.30	2.00		0.60	㎡	1.00					2
3	2011	백태	1.00	0.30		0.30	㎡	1.00					2
4	2019	박리	0.20	7.00		1.40	㎡	1.00				신규	2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	041

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

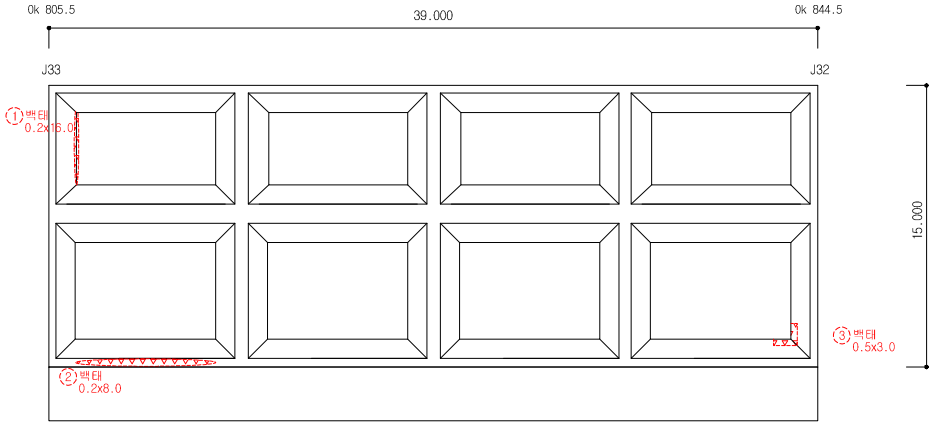


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.20	16.00		3.20	㎡	1.00					2
2	2011	백태	0.20	8.00		1.60	㎡	1.00					2
3	2011	백태	0.50	3.00		1.50	㎡	1.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	042

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

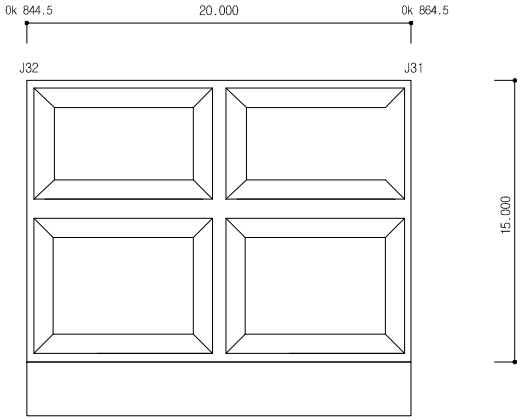


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	043

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

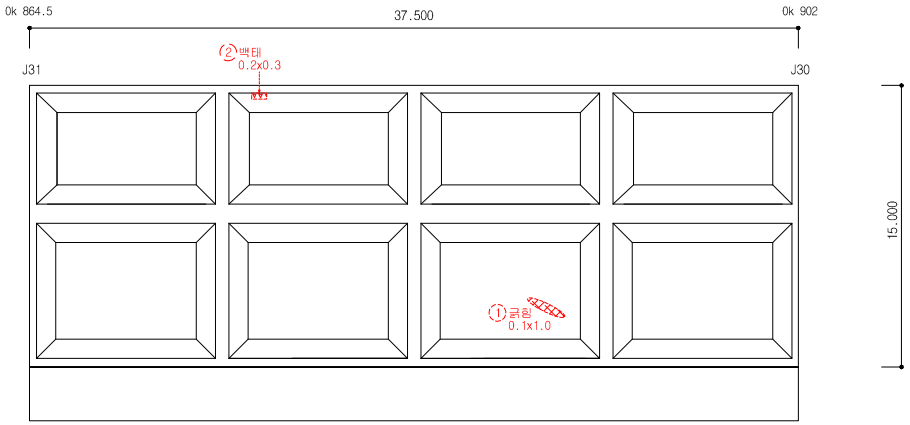


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	금회	0.10	1.00		0.10	㎡	1.00					2
2	2014	백태	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	044

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

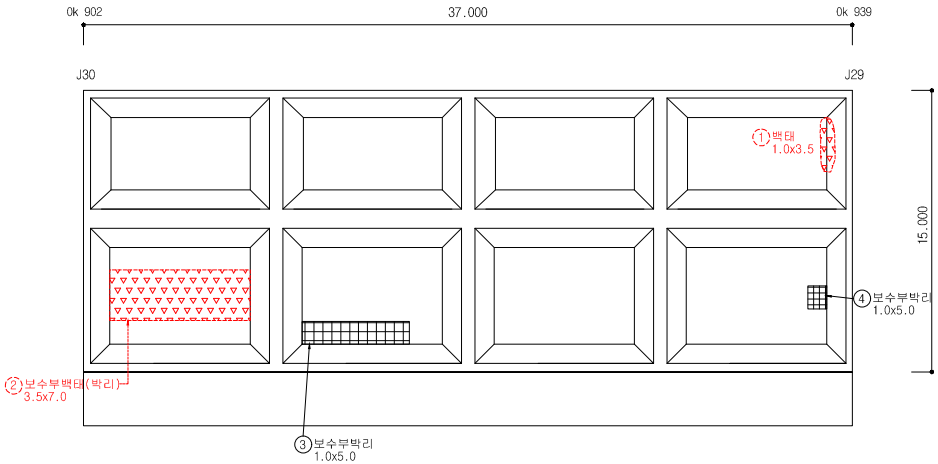


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	1.00	3.50		3.50	㎡	1.00					2
2	2011	보수부 백태	3.50	7.00		24.50	㎡	1.00					2
3	2019	보수부박리	1.00	5.00		5.00	㎡	1.00				신규	2
4	2019	보수부박리	1.00	5.00		5.00	㎡	1.00				신규	2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	045

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

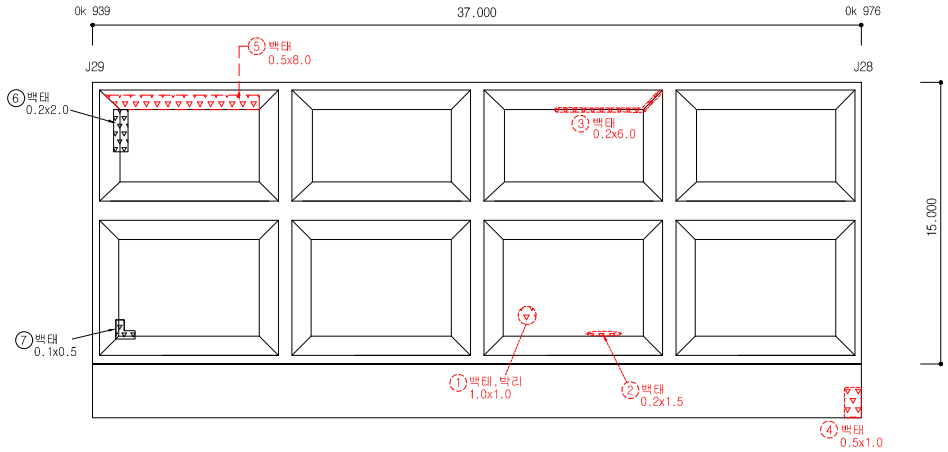


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태 및 박리	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00					2
2	2011	백태	0.20	1.50		0.30	㎡	1.00					2
3	2011	백태	0.20	6.00		1.20	㎡	1.00					2
4	2011	백태	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					2
5	2016	백태	0.50	8.00		4.00	㎡	1.00					2
6	2019	백태	0.20	2.00		0.40	㎡	1.00				신규	2
7	2019	백태	0.10	0.50		0.05	㎡	1.00				신규	2
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	046

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

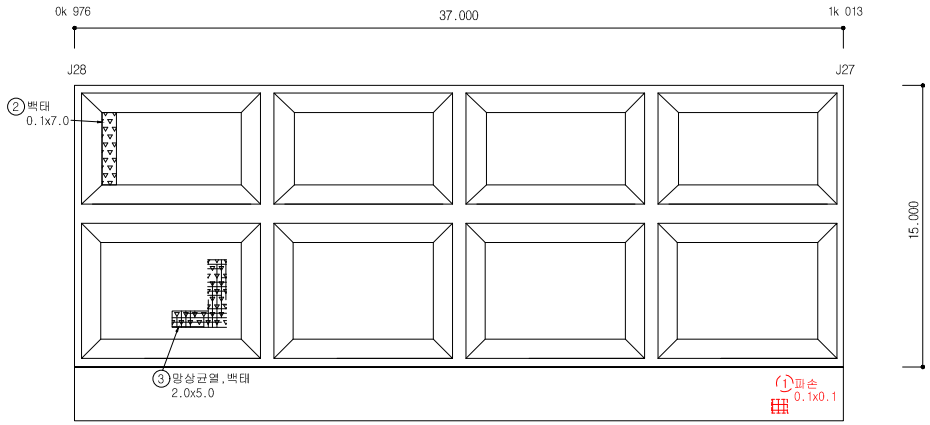


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
2	2019	백태	0.10	7.00		0.70	㎡	1.00				신규	2
3	2019	망상균열 및 백태	2.00	5.00		10.00	㎡	1.00				신규	2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손, 탈락 박리, 박락	철근노출	철근부식	좌굴, 변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태, 결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수, 습윤	배수구막힘	보수	도면번호	047

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

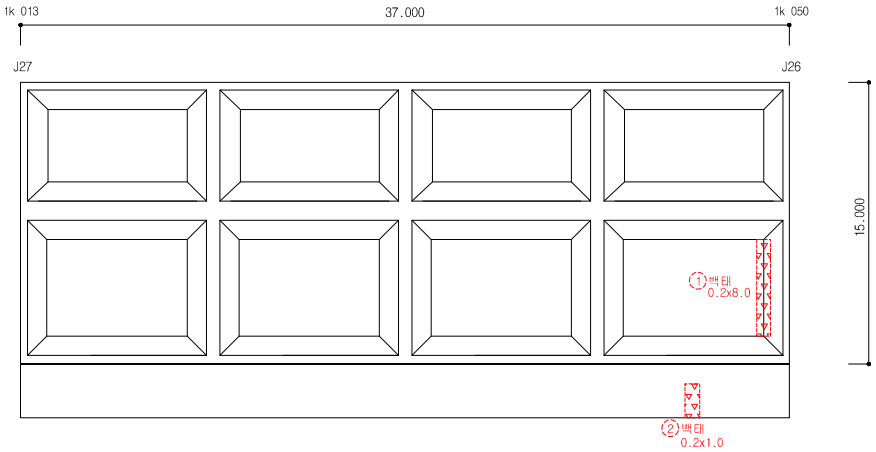


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.20	8.00		1.60	㎡	1.00					2
2	2011	백태	0.20	1.00		1.00	m	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	048

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

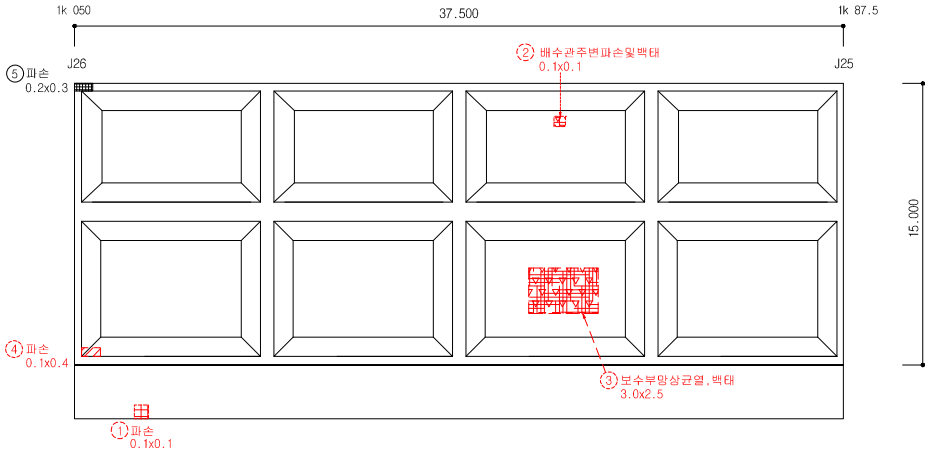


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
2	2011	배수관주변 파손 및 백태	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
3	2016	보수부 망상균열 및 백태	3.00	2.50		7.50	㎡	1.00					2
4	2016	파손	0.10	0.40		0.04	㎡	1.00					2
5	2019	파손	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00				신규	2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	049

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

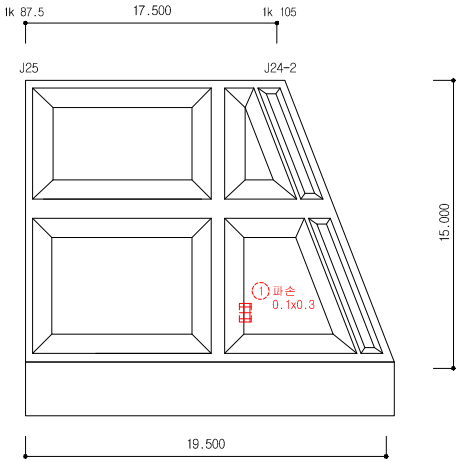


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	파손	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	050

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

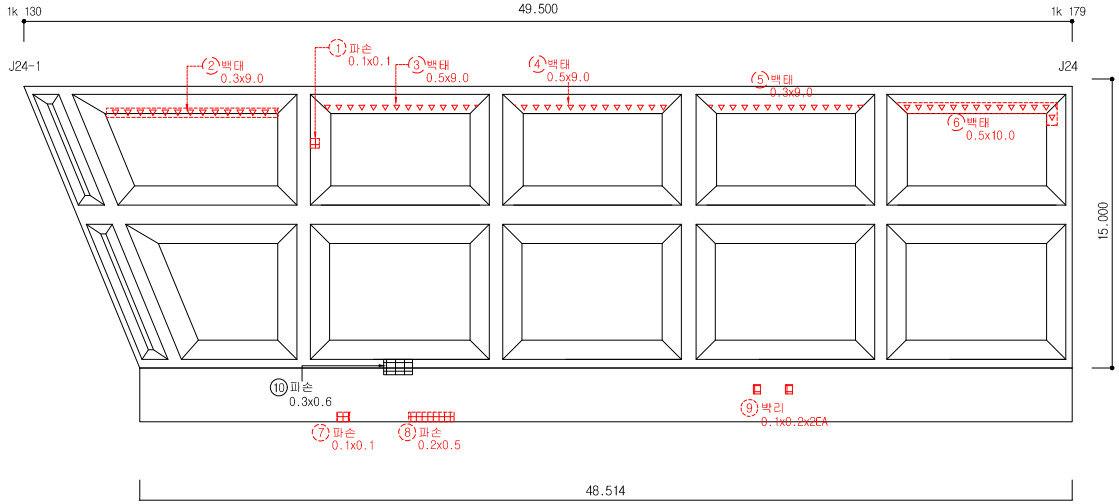


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
2	2014	백태	0.30	9.00		2.70	㎡	1.00					2
3	2014	백태	0.50	9.00		4.50	㎡	1.00					2
4	2014	백태	0.50	9.00		4.50	㎡	1.00					2
5	2014	백태	0.30	9.00		2.70	㎡	1.00					2
6	2014	백태	0.50	10.00		5.00	㎡	1.00					2
7	2011	파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
8	2011	파손	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
9	2016	박리	0.10	0.20		0.04	㎡	2.00					2
10	2019	파손	0.30	0.60		0.18	㎡	1.00				신규	2
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	051

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

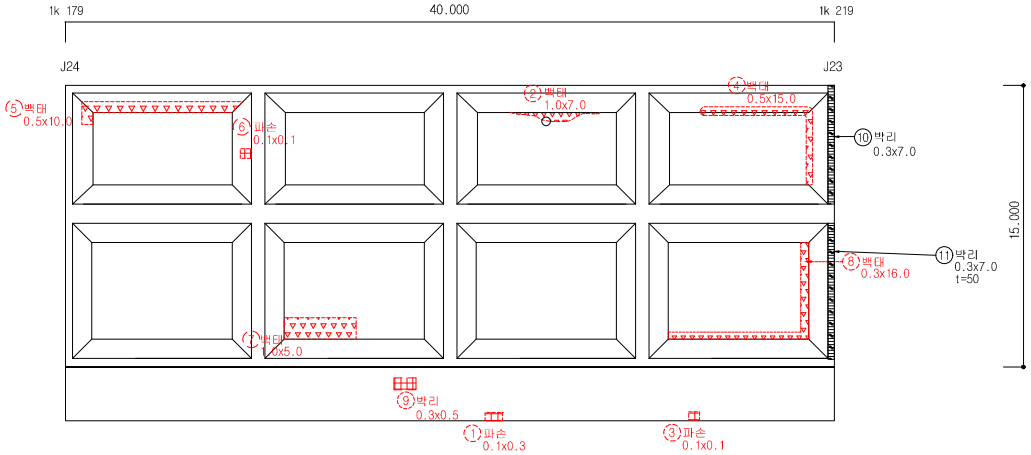


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	파손	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00					2
2	2011	백태	1.00	7.00		7.00	㎡	1.00					2
3	2011	파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
4	2011	백태	0.50	15.00		7.50	㎡	1.00					2
5	2014	백태	0.50	10.00		5.00	㎡	1.00					2
6	2011	파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
7	2014	백태	1.00	5.00		5.00	㎡	1.00					2
8	2011	백태	0.30	16.00		4.80	㎡	1.00					2
9	2016	박리	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					2
10	2019	박리	0.30	0.70		2.10	㎡	1.00				신규	2
11	2019	박리	0.30	0.70		2.10	㎡	1.00				신규	2
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	052

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

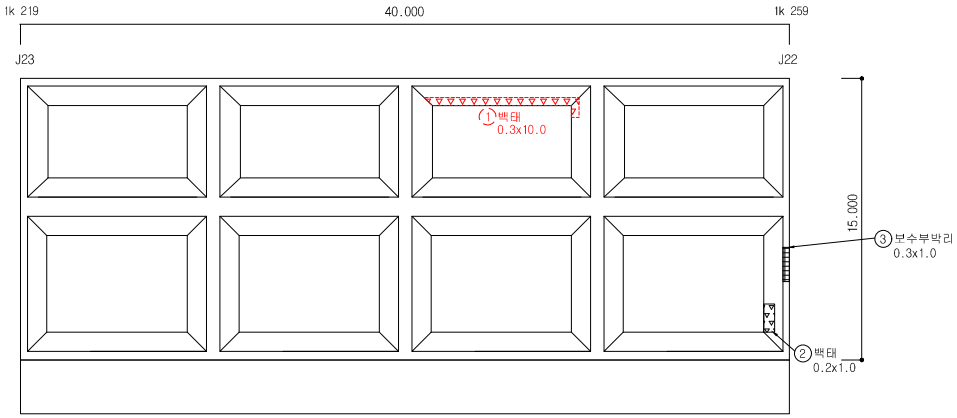


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	백태	0.30	10.00		3.00	㎡	1.00					2
2	2019	백태	0.20	1.00		0.20	㎡	1.00				신규	2
3	2019	보수부박리	0.30	1.00		0.30	㎡	1.00				신규	2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	얼회	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	053

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

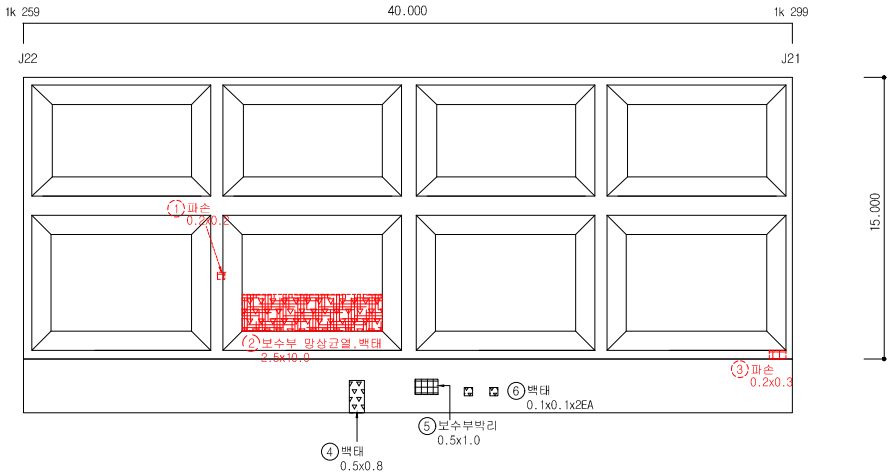


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	파손	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					2
2	2014	보수부 망상균열 및 백태	2.50	10.00		25.00	㎡	1.00					2
3	2011	파손	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00					2
4	2019	백태	0.50	0.80		0.40	㎡	1.00				신규	2
5	2019	보수부박리	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00				신규	2
6	2019	백태	0.10	0.10		0.02	㎡	2.00				신규	2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	054

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

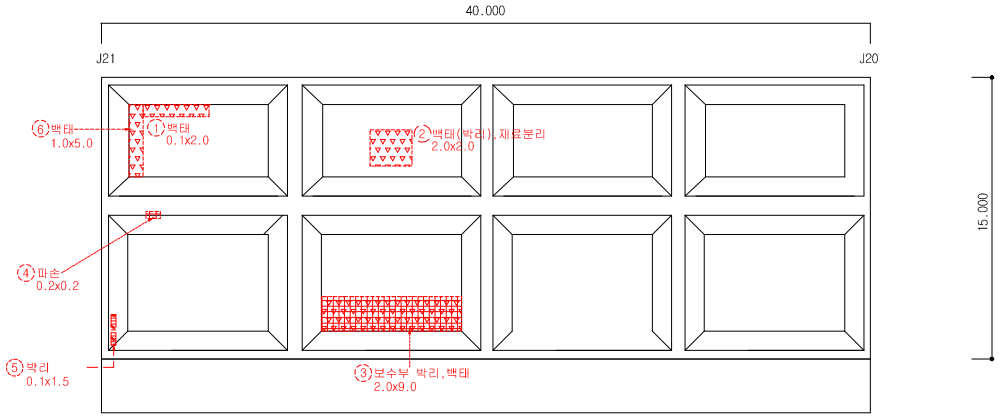


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.10	2.00		0.20	㎡	1.00					2
2	2014	백태(박리),재료분리	2.00	2.00		4.00	㎡	1.00					2
3	2011	보수부 박리 및 백태	2.00	9.00		18.00	㎡	1.00					2
4	2011	파손	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					2
5	2016	박리	0.10	1.50		0.15	㎡	1.00					2
6	2011	백태	1.00	5.00		5.00	㎡	1.00					2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	055

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

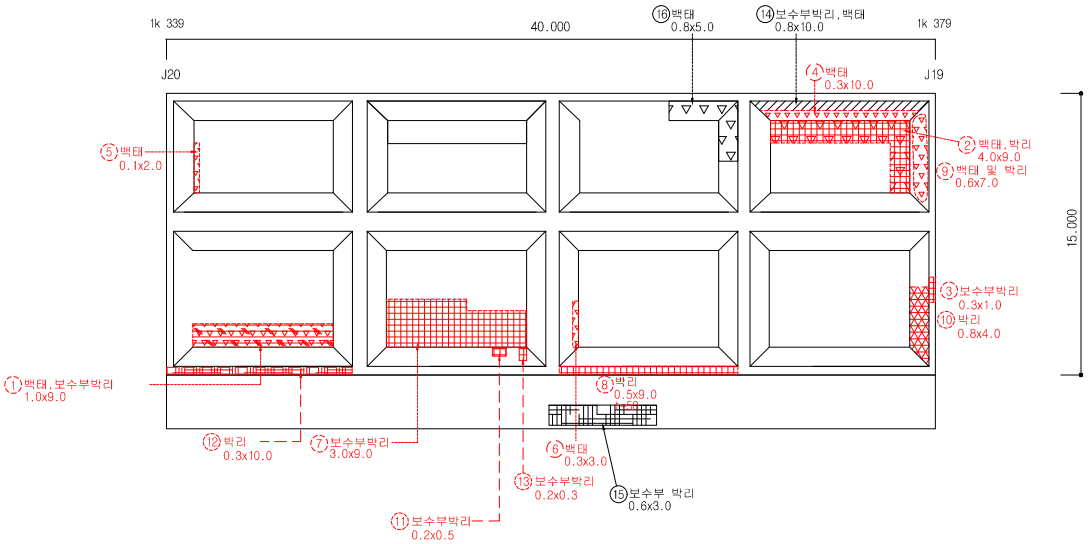


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태 보수부 박리	1.00	9.00		9.00	㎡	1.00					2
2	2011	백태 및 박리	4.00	9.00		36.00	㎡	1.00					2
3	2011	보수부 박리	0.30	1.00		0.30	㎡	1.00					2
4	2014	백태	0.30	10.00		3.00	㎡	1.00					2
5	2011	백태	0.10	2.00		0.20	㎡	1.00					2
6	2014	백태	0.30	3.00		0.90	㎡	1.00					2
7	2011	보수부 박리	3.00	9.00		27.00	㎡	1.00					2
8	2011	박리	0.50	9.00		4.50	㎡	1.00					2
9	2011	백태 및 박리	0.60	7.00		4.20	㎡	1.00					2
10	2016	박리	0.80	4.00		3.20	㎡	1.00					2
11	2016	보수부 박리	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
12	2016	박리	0.30	10.00		3.00	㎡	1.00					2
13	2016	보수부 박리	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00					2
14	2019	보수부 박리 및 백태	0.80	10.00		8.00	㎡	1.00				신규	2
15	2019	보수부 박리	0.60	3.00		1.80	㎡	1.00				신규	2
16	2019	백태	0.80	5.00		4.00	㎡	1.00				신규	2
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	056

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면



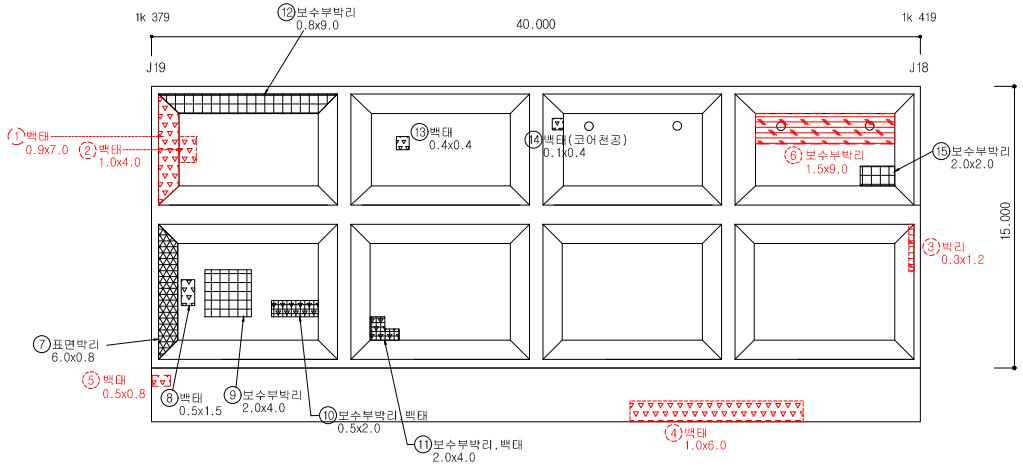손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	백태	0.90	7.00		6.30	㎡	1.00					2
2	2011	백태	1.00	4.00		4.00	㎡	1.00					2
3	2011	박리	0.30	1.20		0.36	㎡	1.00					2
4	2011	백태	1.00	6.00		6.00	㎡	1.00					2
5	2016	백태	0.50	0.80		0.40	㎡	1.00					2
6	2016	보수부 박리	1.50	9.00		13.50	㎡	1.00					2
7	2019	표면박리	6.00	0.80		4.80	㎡	1.00				신규	2
8	2019	백태	0.50	1.50		0.75	㎡	1.00				신규	2
9	2019	보수부박리	2.00	4.00		8.00	㎡	1.00				신규	2
10	2019	보수부박리 및 백태	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00				신규	2
11	2019	보수부박리 및 백태	2.00	4.00		8.00	㎡	1.00				신규	2
12	2019	보수부박리	0.80	9.00		7.20	㎡	1.00				신규	2
13	2019	백태	0.40	0.40		0.16	㎡	1.00				신규	2
14	2019	백태	0.10	0.40		0.04	㎡	1.00				신규	2
15	2019	보수부박리	2.00	2.00		4.00	㎡	1.00				신규	2
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	057

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

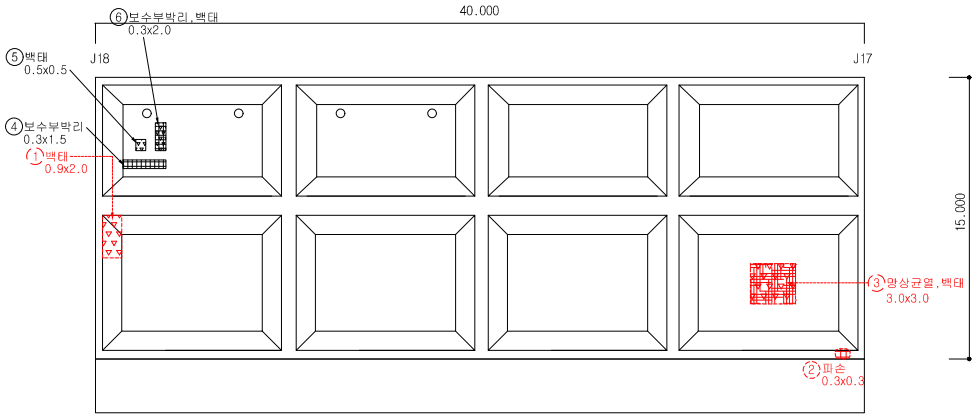


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	백태	0.90	2.00		1.80	㎡	1.00					2
2	2011	파손	0.30	0.30		0.30	m	1.00					2
3	2014	망상균열 및 백태	3.00	3.00		9.00	㎡	1.00					2
4	2019	보수부박리	0.30	1.50		0.45	㎡	1.00				신규	2
5	2019	백태	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00				신규	2
6	2019	보수부박리 및 백태	0.30	2.00		0.60	㎡	1.00				신규	2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	058

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

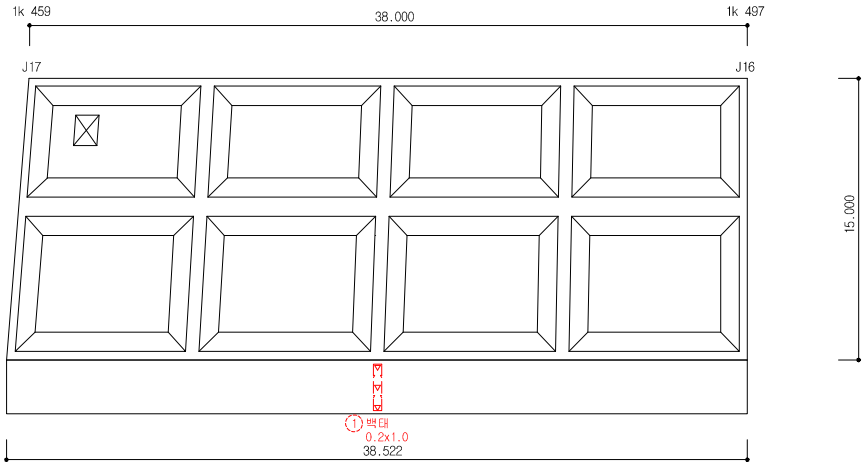


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	백태	0.20	1.00		0.20	㎡	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	059

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

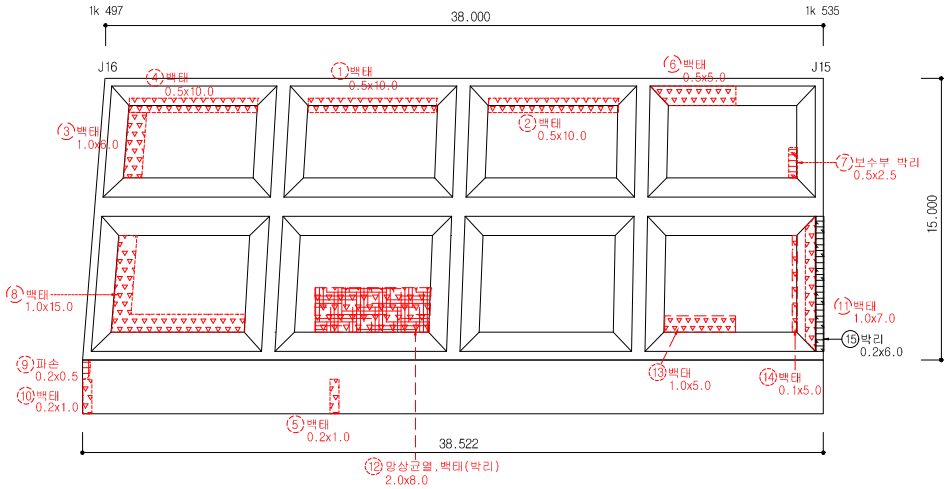


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.50	10.00		5.00	㎡	1.00					2
2	2011	백태	0.50	10.00		5.00	㎡	1.00					2
3	2014	백태	1.00	6.00		6.00	㎡	1.00					2
4	2011	백태	0.50	10.00		5.00	㎡	1.00					2
5	2011	백태	0.20	1.00		0.20	㎡	1.00					2
6	2014	백태	0.50	5.00		2.50	㎡	1.00					2
7	2013	보수부 박리	0.50	2.50		1.25	㎡	1.00					2
8	2014	백태	1.00	15.00		15.00	㎡	1.00					2
9	2011	파손	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
10	2011	백태	0.20	1.00		0.20	㎡	1.00					2
11	2014	백태	1.00	7.00		7.00	㎡	1.00					2
12	2016	망상균열 및 백태	2.00	8.00		16.00	㎡	1.00					2
13	2016	백태	1.00	5.00		5.00	㎡	1.00					2
14	2016	백태	0.10	5.00		0.50	㎡	1.00					2
15	2019	박리	0.20	6.00		1.20	㎡	1.00				신규	2
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	060

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

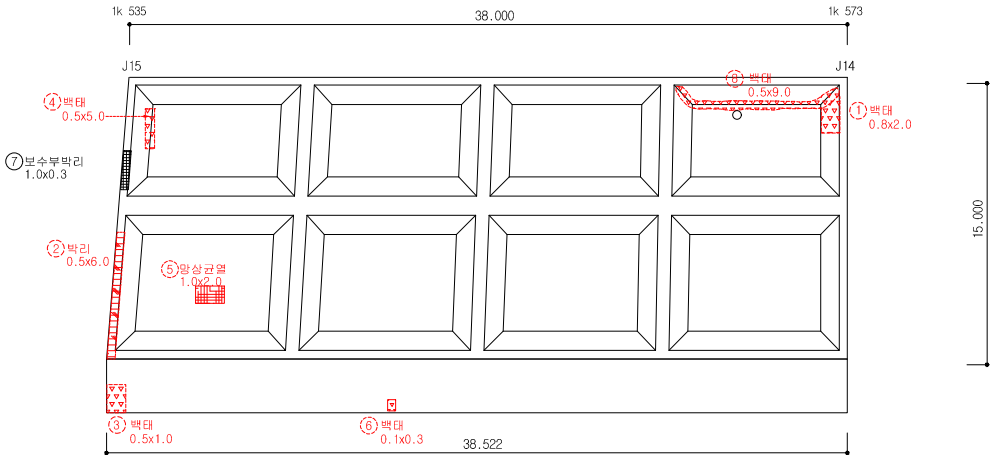


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.80	2.00		1.60	㎡	1.00					2
2	2011	박리	0.50	6.00		3.00	㎡	1.00					2
3	2011	백태	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					2
4	2011	백태	0.50	5.00		2.50	㎡	1.00					2
5	2016	망상균열 및 백태	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					2
6	2016	백태	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00					2
7	2019	보수부 박리	1.00	0.30		0.30	㎡	1.00				신규	2
8	2011	백태	0.50	9.00		4.50	㎡	1.00					2
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	061

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

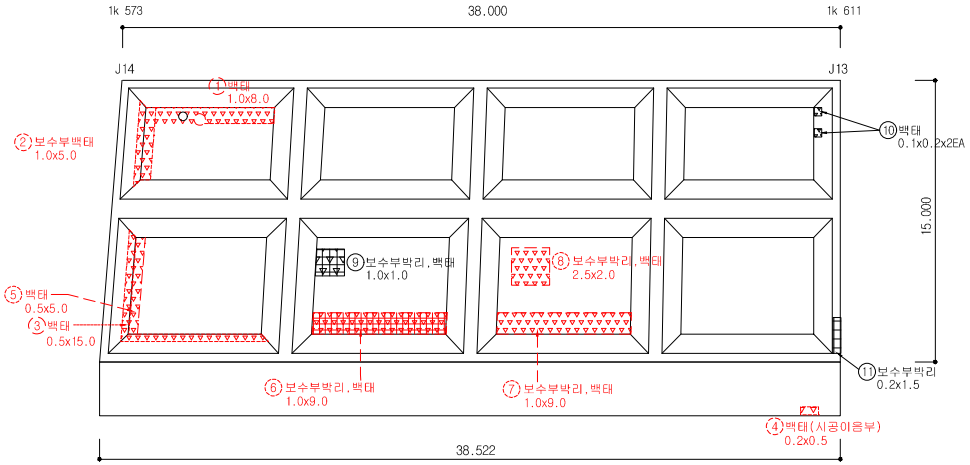


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	백태	1.00	8.00		8.00	㎡	1.00					2
2	2011	보수부 백태	1.00	5.00		5.00	㎡	1.00					2
3	2014	백태	0.50	15.00		7.50	㎡	1.00					2
4	2011	백태	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
5	2016	백태	0.50	5.00		2.50	㎡	1.00					2
6	2016	보수부 박리 및 백태	1.00	9.00		9.00	㎡	1.00					2
7	2016	보수부 박리 및 백태	1.00	9.00		9.00	㎡	1.00					2
8	2016	보수부 박리 및 백태	2.50	2.00		5.00	㎡	1.00					2
9	2019	보수부 박리 및 백태	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00				신규	2
10	2019	백태	0.10	0.20		0.04	㎡	2.00				신규	2
11	2019	보수부박리	0.20	1.50		0.30	㎡	1.00				신규	2
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	062

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

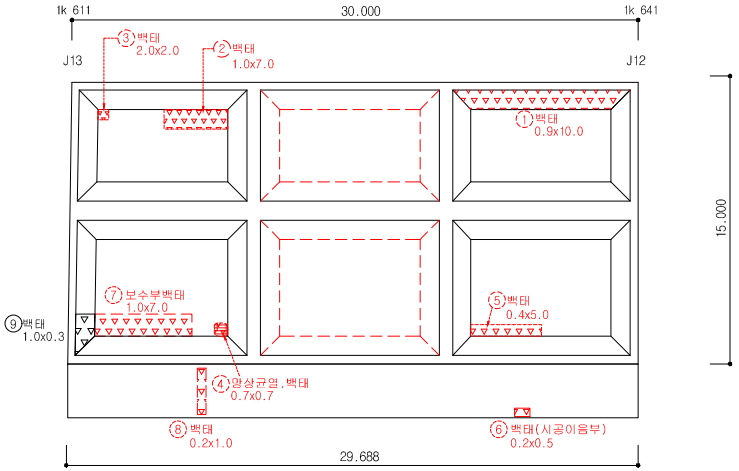


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.90	10.00		9.00	㎡	1.00					2
2	2014	백태	1.00	7.00		7.00	㎡	1.00					2
3	2013	백태	2.00	2.00		4.00	㎡	1.00					2
4	2011	망상균열, 백태	0.70	0.70		0.49	㎡	1.00					2
5	2011	백태	0.40	5.00		2.00	㎡	1.00					2
6	2016	백태	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
7	2016	보수부 백태	1.00	7.00		7.00	㎡	1.00					2
8	2016	백태	0.20	1.00		0.20	㎡	1.00					2
9	2019	백태	1.00	0.30		0.30	㎡	1.00				신규	2
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	063

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

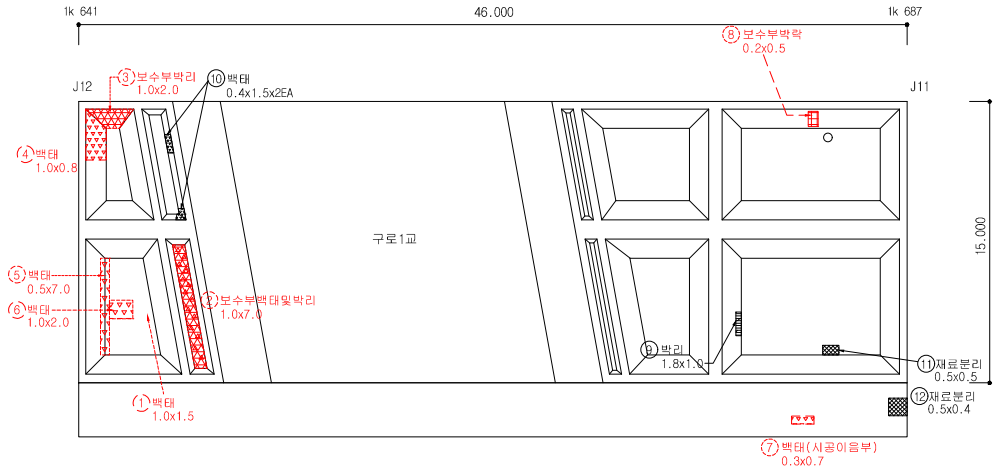


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	백태	1.00	1.50		1.50	㎡	1.00					2
2	2011	보수부 백태 및 박리	1.00	7.00		7.00	㎡	1.00					2
3	2013	보수부 박리	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					2
4	2014	백태	1.00	0.80		0.80	㎡	1.00					2
5	2011	백태	0.50	7.00		3.50	㎡	1.00					2
6	2014	백태	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					2
7	2016	백태	0.30	0.70		0.21	㎡	1.00					2
8	2016	보수부 박락	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
9	2019	박리	1.80	1.00		1.80	㎡	1.00				신규	2
10	2019	백태	0.40	1.50		1.20	㎡	2.00				신규	2
11	2019	재료분리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00				신규	2
12	2019	재료분리	0.50	0.40		0.20	㎡	1.00				신규	2
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	064

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

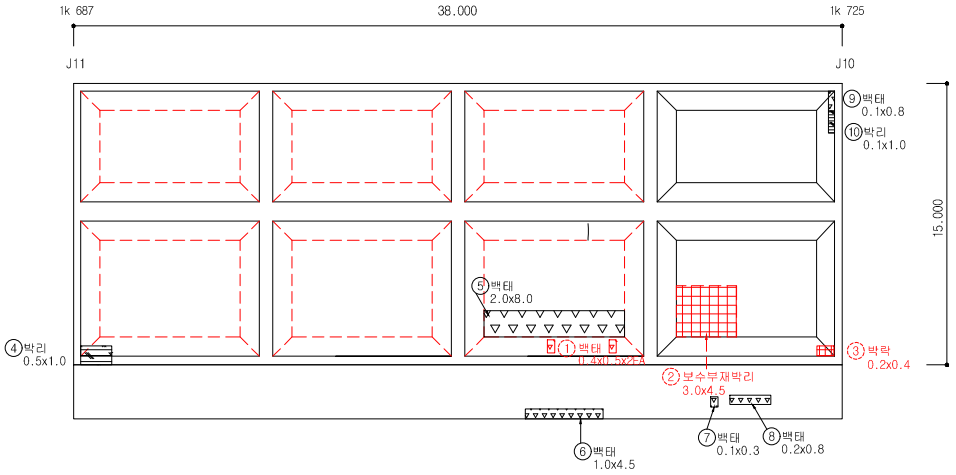


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	백태	0.40	0.50		0.40	㎡	2.00					2
2	2016	보수부 재박리	3.00	4.50		13.50	㎡	1.00					2
3	2016	박락	0.20	0.40		0.08	㎡	1.00					2
4	2019	박리	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00				신규	2
5	2019	백태	2.00	8.00		16.00	㎡	1.00				신규	2
6	2019	백태	1.00	4.50		4.50	㎡	1.00				신규	2
7	2019	백태	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00				신규	2
8	2019	백태	0.20	0.80		0.16	㎡	1.00				신규	2
9	2019	백태	0.10	0.80		0.08	㎡	1.00				신규	2
10	2019	박리	0.10	1.00		0.10	㎡	1.00				신규	2
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN



SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	065

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면


손 상 물 량 표

연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					2
2	2014	백태	0.20	0.30		0.24	㎡	4.00					2
3	2011	백태	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00					2
4	2011	백태	0.20	1.00		0.60	㎡	3.00					2
5	2019	백태	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00				신규	2
6	2019	박리	0.10	1.20		0.12	㎡	1.00				신규	2
7	2019	박리	0.10	3.50		0.35	㎡	1.00				신규	2
8	2019	보수부박리	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00				신규	2
9	2019	백태	0.20	1.00		0.20	㎡	1.00				신규	2
10	2019	박락	0.80	0.30		0.24	㎡	1.00				신규	2
11	2019	백태	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00				신규	2
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

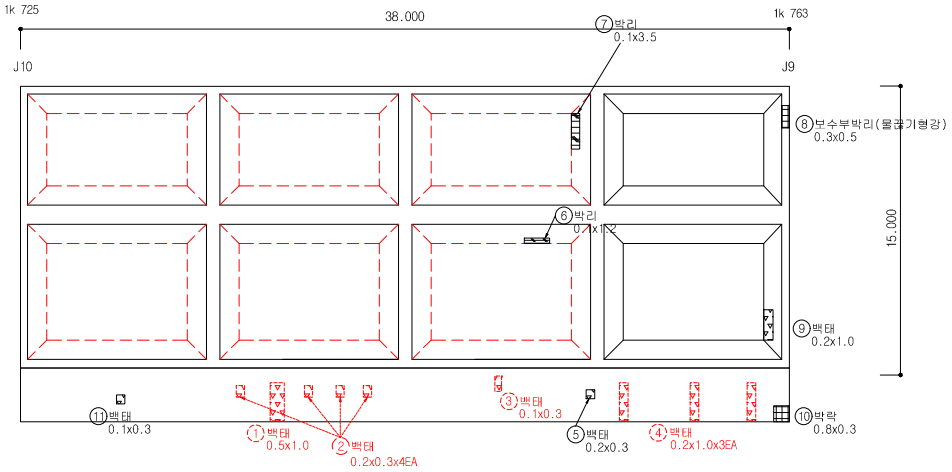


점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	066

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

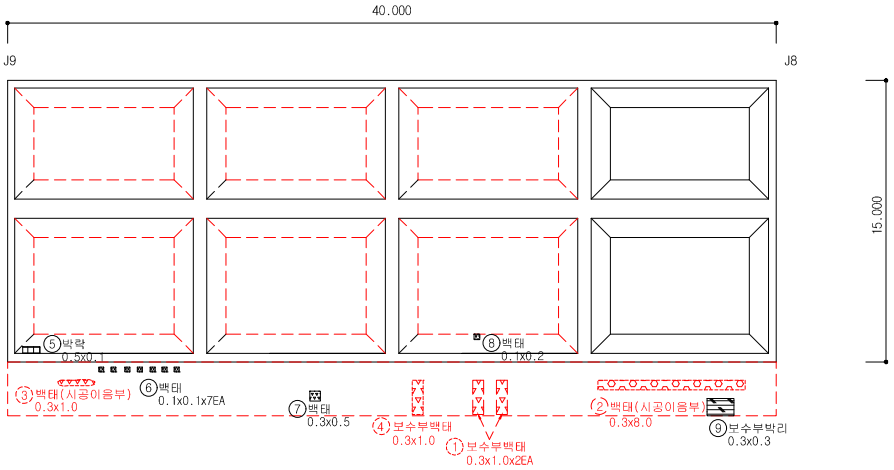


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	보수부 백태	0.30	1.00		0.60	㎡	2.00					2
2	2014	백태	0.30	8.00		2.40	㎡	1.00					2
3	2011	백태	0.30	1.00		1.00	m	1.00					2
4	2011	보수부 백태	0.30	1.00		0.30	㎡	1.00					2
5	2019	박락	0.50	0.10		0.05	㎡	1.00				신규	2
6	2019	백태	0.10	0.10		0.07	㎡	7.00				신규	2
7	2019	백태	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00				신규	2
8	2019	백태	0.10	0.20		0.02	㎡	1.00				신규	2
9	2019	보수부박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00				신규	2
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	067

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

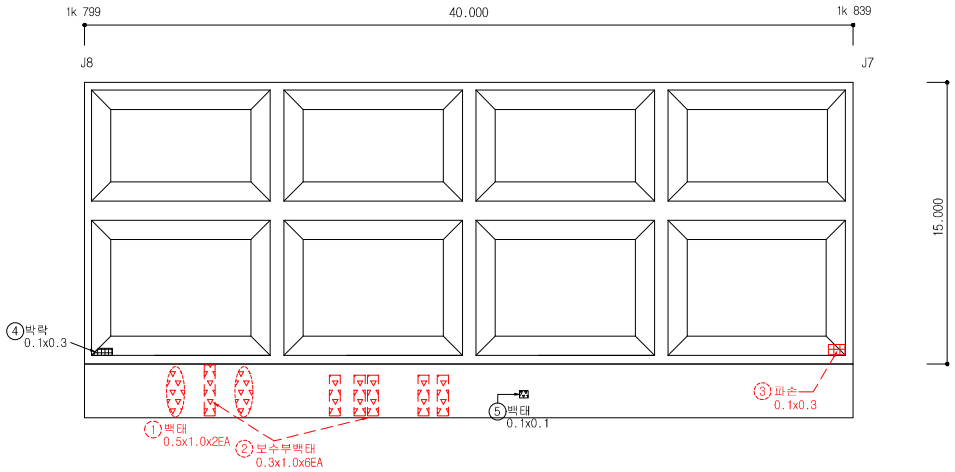


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	백태	0.50	1.00		1.00	㎡	2.00					2
2	2016	보수부 백태	0.30	1.00		1.80	㎡	6.00					2
3	2016	파손	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00					2
4	2019	박락	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00				신규	2
5	2019	백태	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00				신규	2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	068

ID : 도림천4복개 2련 / 바닥판하면

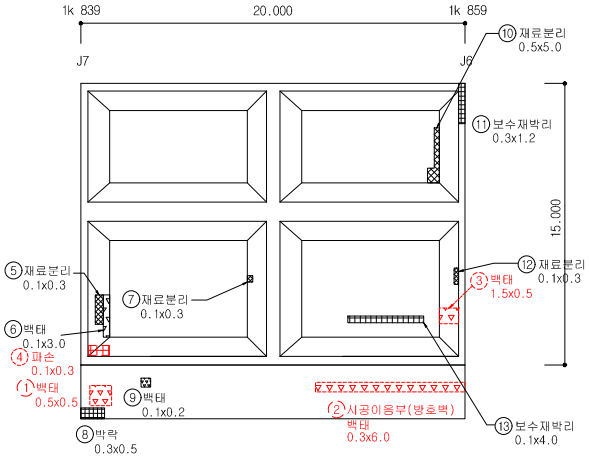


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2014	백태	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
2	2014	시공이음부(방호벽)백태	0.30	6.00		1.80	㎡	1.00					2
3	2011	백태	1.50	0.50		0.75	㎡	1.00					2
4	2016	파손	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00					2
5	2019	재료분리	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00				신규	2
6	2019	백태	0.10	3.00		0.30	㎡	1.00				신규	2
7	2019	재료분리	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00				신규	2
8	2019	박락	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00				신규	2
9	2019	백태	0.10	0.20		0.02	㎡	1.00				신규	2
10	2019	재료분리	0.50	5.00		2.50	㎡	1.00				신규	2
11	2019	보수재박리	0.30	1.20		0.36	㎡	1.00				신규	2
12	2019	재료분리	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00				신규	2
13	2019	보수재박리	0.10	4.00		0.40	㎡	1.00				신규	2
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	069

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

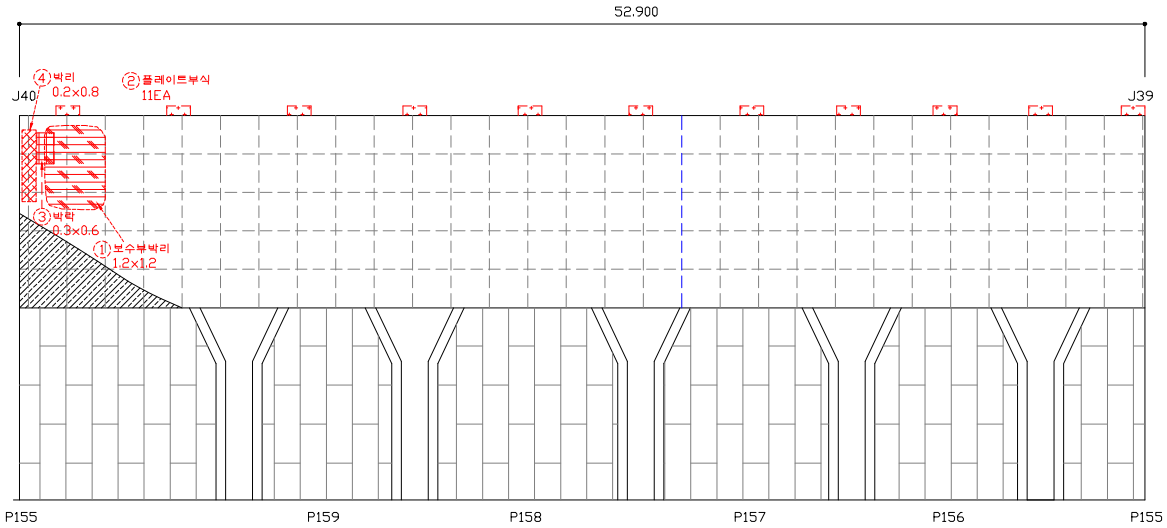


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역				비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량			
1	2011	보수부박리	1.20	1.20		1.44	㎡	1.00						2
2	2011	플레이트부식	-	-		11.00	EA	11.00						2
3	2016	박락	0.30	0.60		0.18	㎡	1.00						2
4	2011	박리	0.20	0.80		0.16	㎡	1.00						2
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	070

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

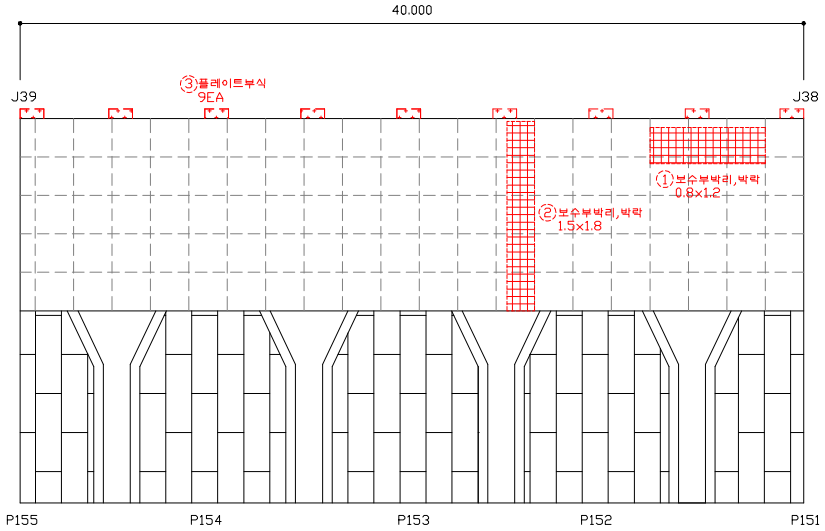


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭(㎜)	길이(m)	깊이(mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	보수부박리,박락	0.80	1.20		0.96	㎡	1.00					2
2	2011	보수부박리,박락	1.50	1.80		2.70	㎡	1.00					2
3	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	071

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

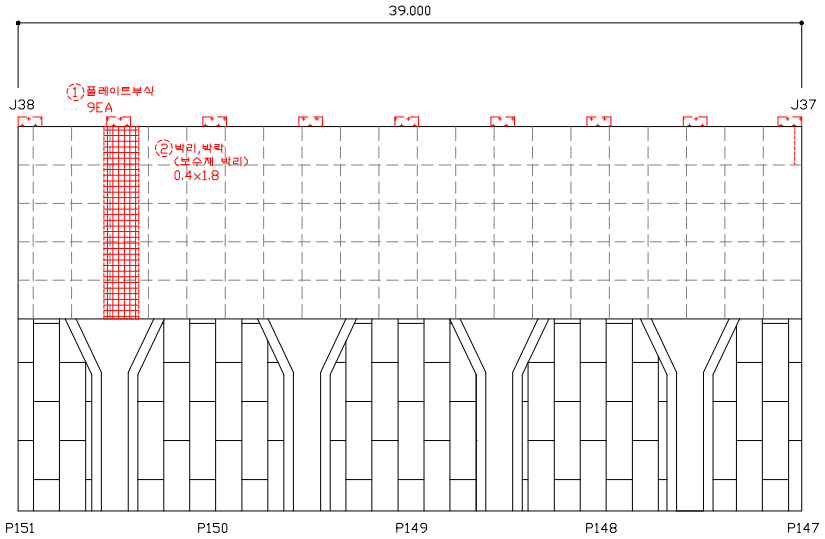


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
2	2011	박리,박락(보수재박리)	0.40	1.80		0.72	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	072

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

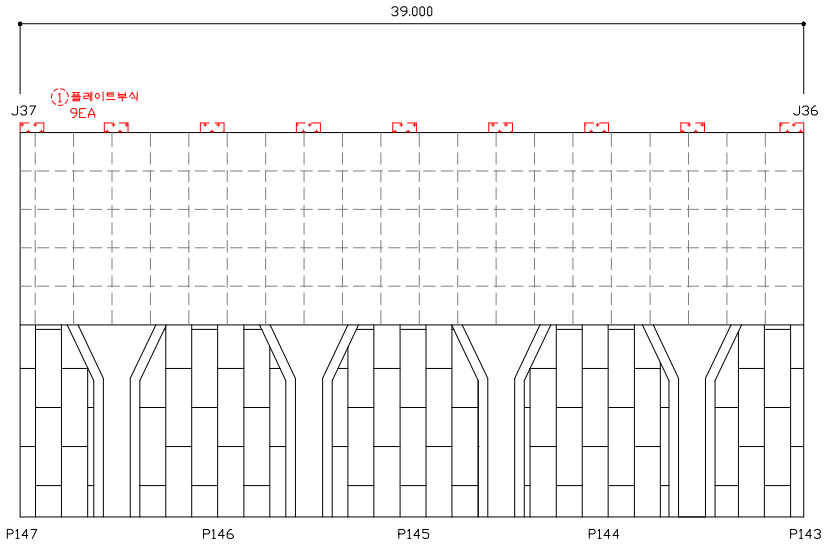


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	073

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

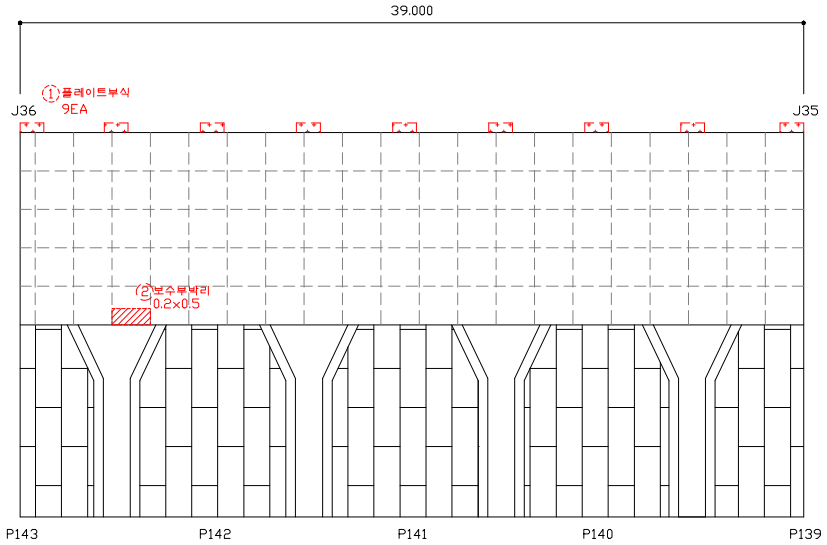


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
2	2014	보수부박리	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	074

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

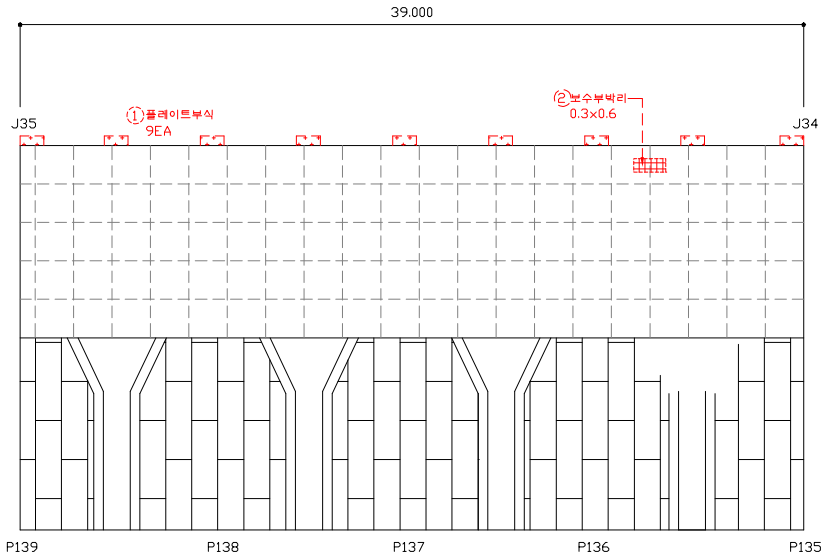


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
2	2014	보수부박리	0.30	0.60		0.18	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	075

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

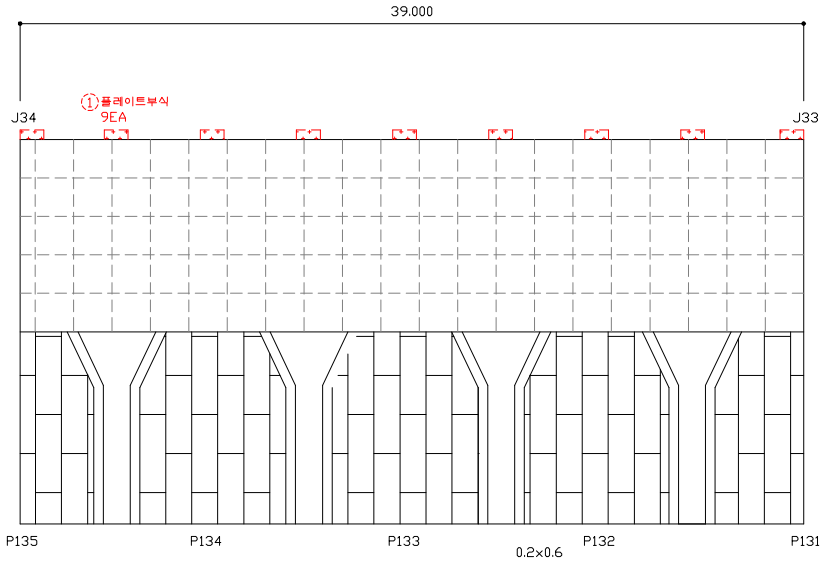


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	076

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

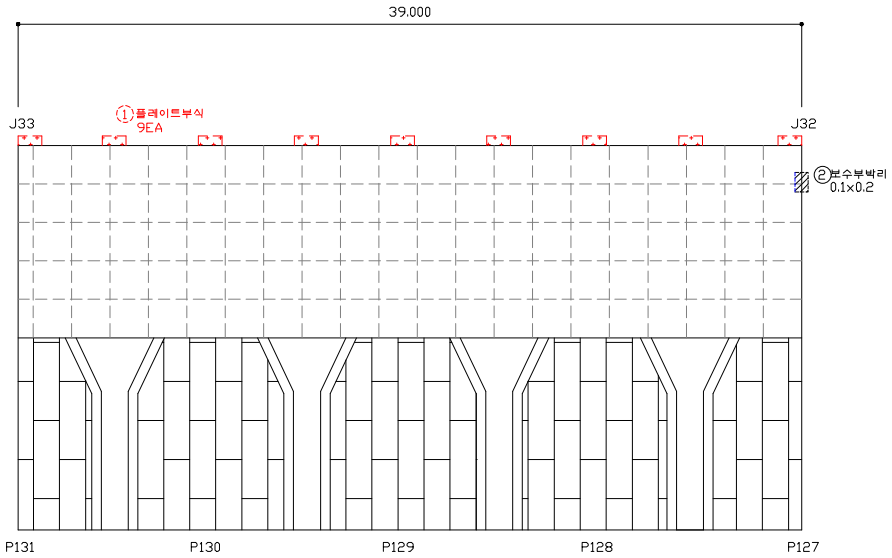


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트부식				9.00	EA	9.00					2
2	2019	보수부박리	0.10	0.20		0.02	㎡	1.00				신규	2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	077

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

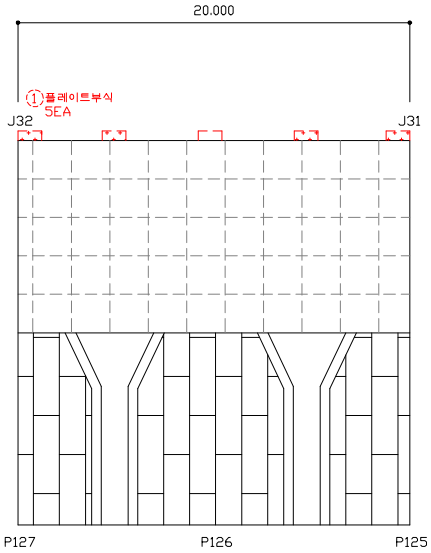


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트부식				5.00	EA	5.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	078

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

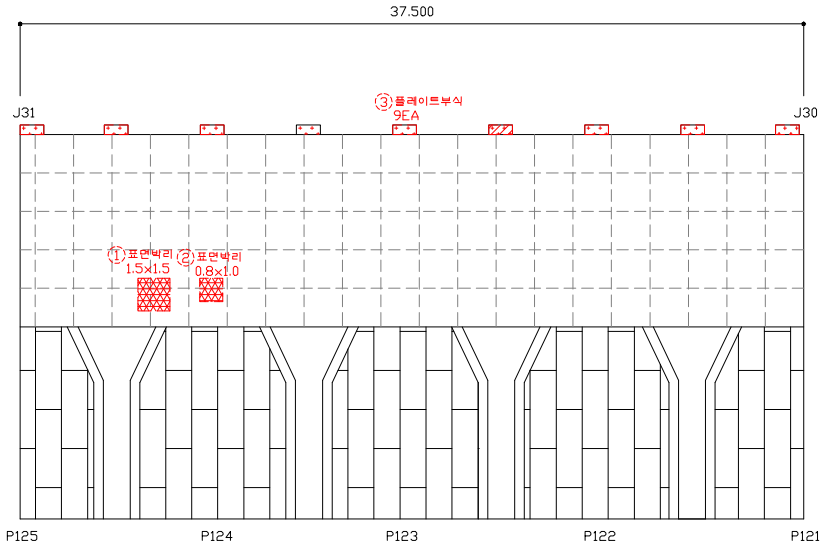


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	표면박리	1.50	1.50		3.00	㎡	1.00					2
2	2018	표면박리	0.80	1.00		0.80	㎡	1.00					2
3	2018	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	079

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

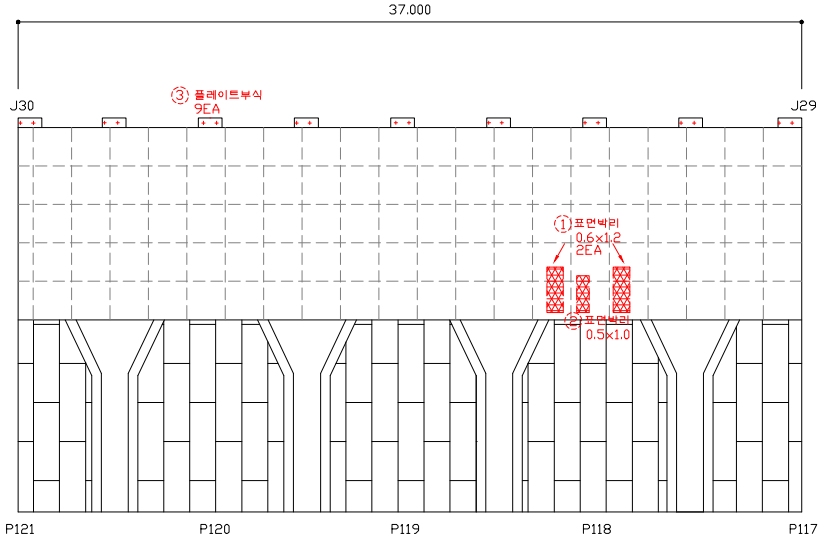


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	표면박리	0.60	1.20		1.44	㎡	2.00					2
2	2018	표면박리	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					2
3	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	080

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

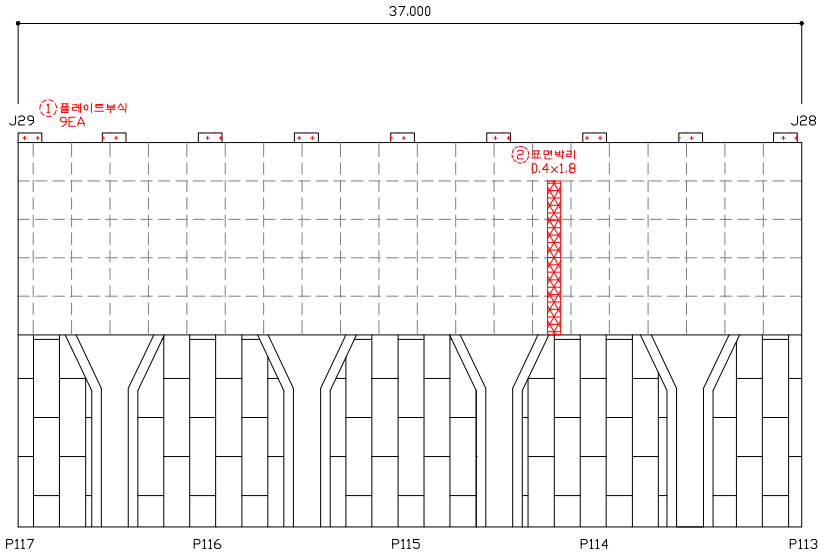


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
2	2016	표면박리	0.40	1.80		0.72	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	081

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

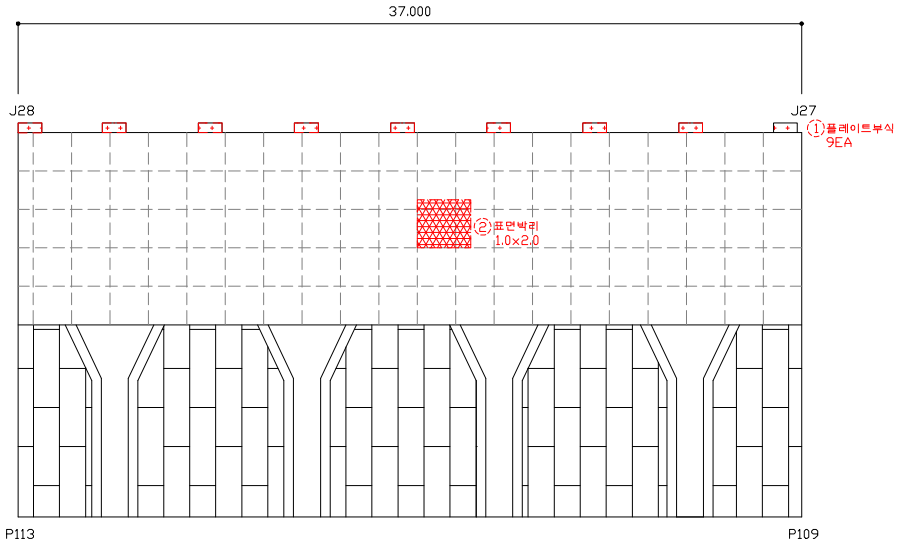


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
2	2018	표면박리	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	082

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

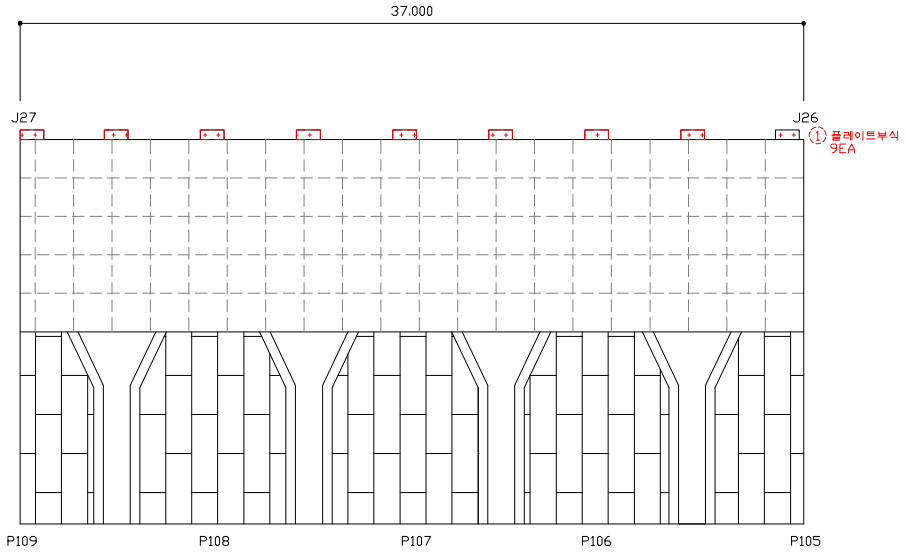


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	083

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

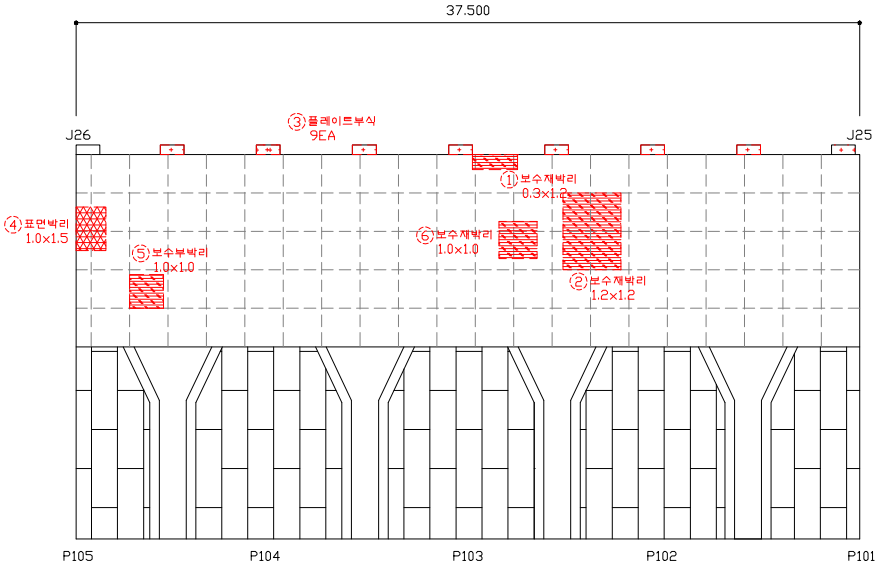


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	보수재박리	0.30	1.20		0.36	㎡	1.00					2
2	2018	보수재박리	1.20	1.20		2.40	㎡	1.00					2
3	2018	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
4	2018	표면박리	1.00	1.50		1.50	㎡	1.00					2
5	2018	보수부박리	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00					2
6	2018	보수재박리	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00					2
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	084

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

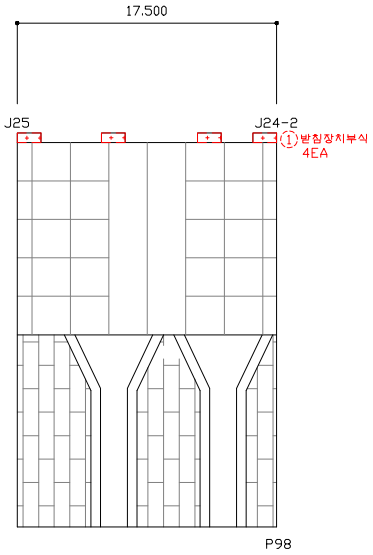


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	받침장치부식	-	-		4.00	EA	4.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락,박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	085

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

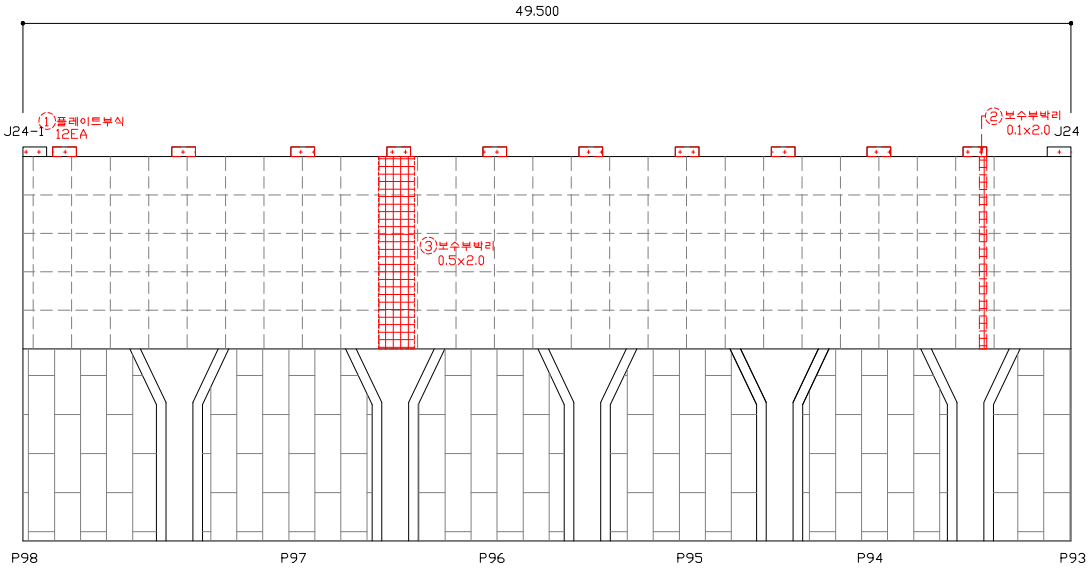


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트부식	-	-		12.00	EA	12.00					2
2	2018	보수부박리	0.10	2.00		0.20	㎡	1.00					2
3	2011	보수부박리	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	086

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

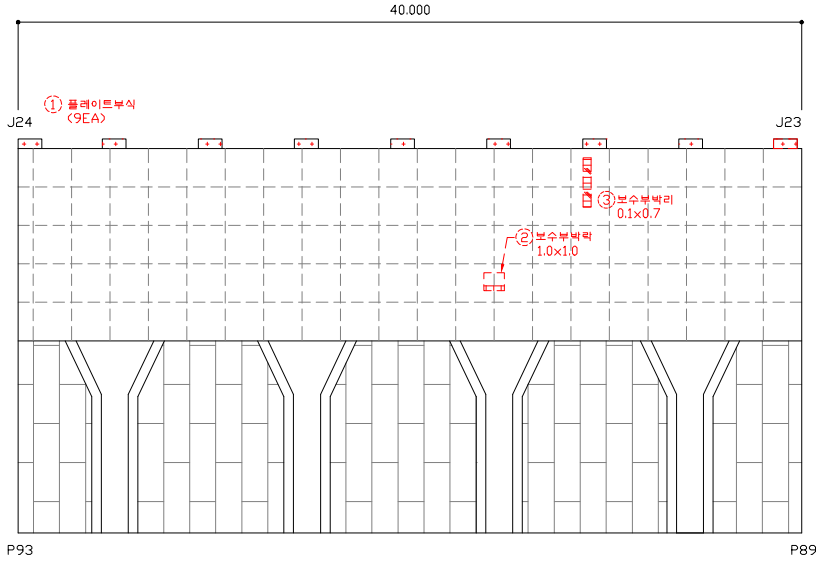


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
2	2018	보수부박락	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00					2
3	2016	보수부박리	0.10	0.70		0.07	㎡	1.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	087

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

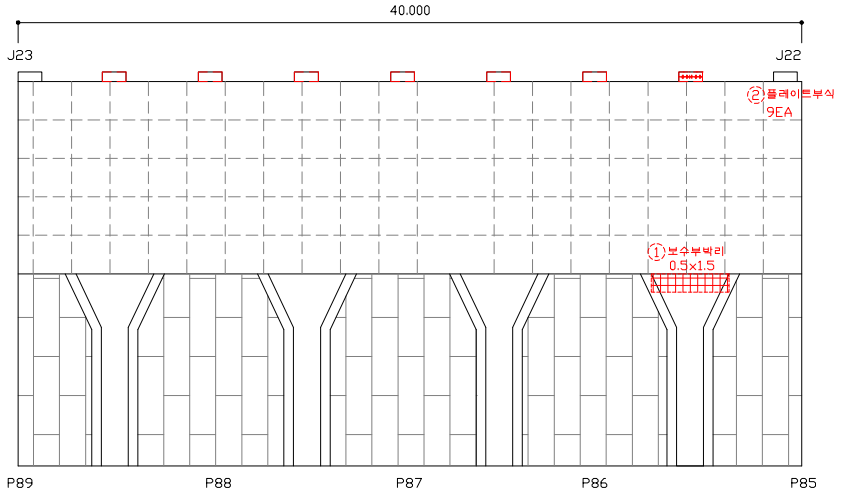


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	보수부박리	0.50	1.50		0.75	㎡	1.00					2
2	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	088

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

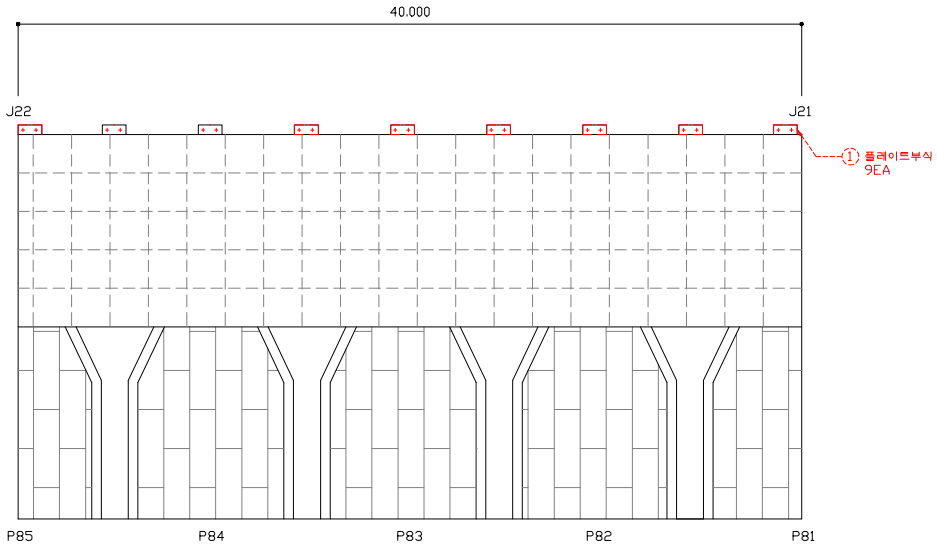


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	089

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

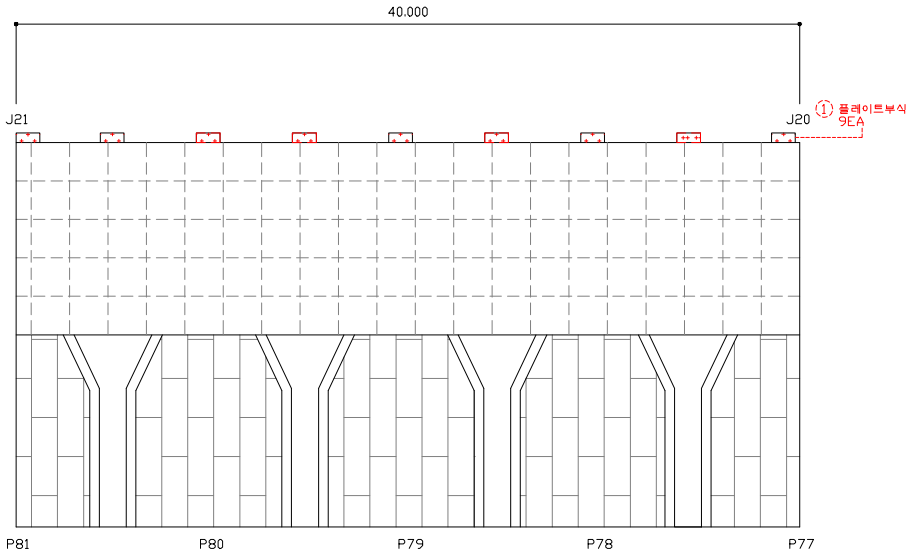


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	090

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

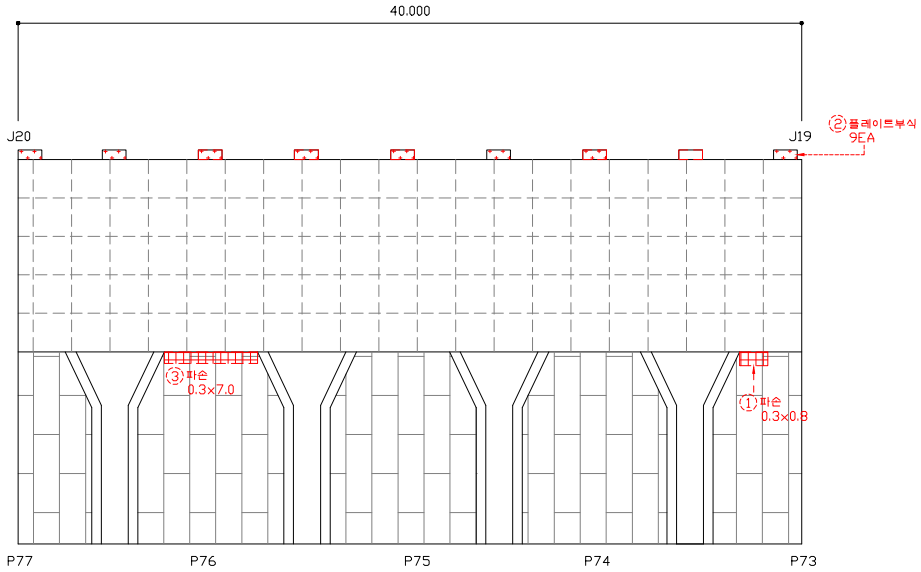


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	파손	0.30	0.80		0.24	㎡	1.00					2
2	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
3	2018	파손	0.30	7.00		2.10	㎡	1.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	091

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

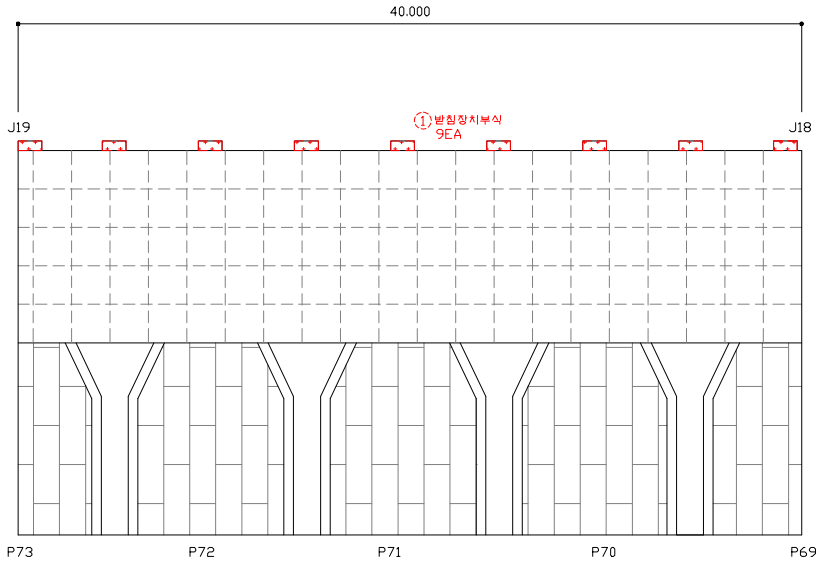


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	받침장치부식	-	-		9.00	㎡	9.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	092

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

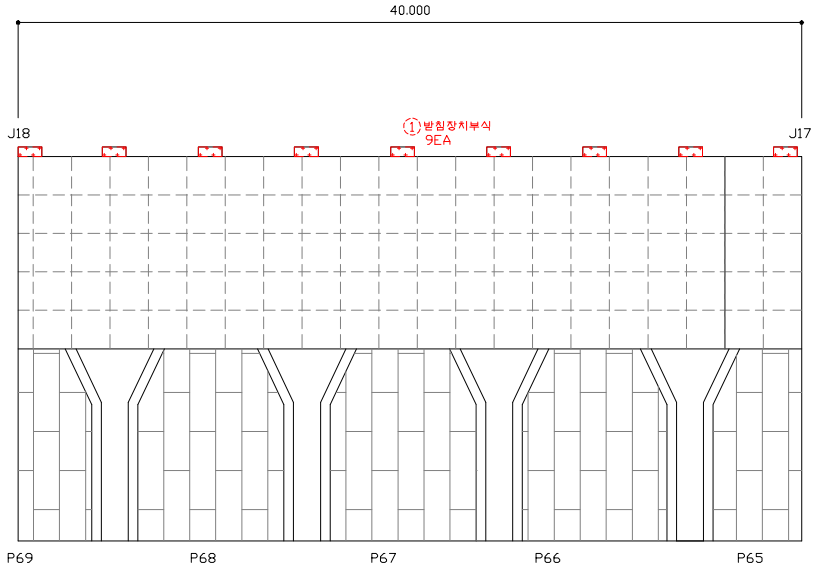


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	받침장치부식	-	-		9.00	㎡	9.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	093

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

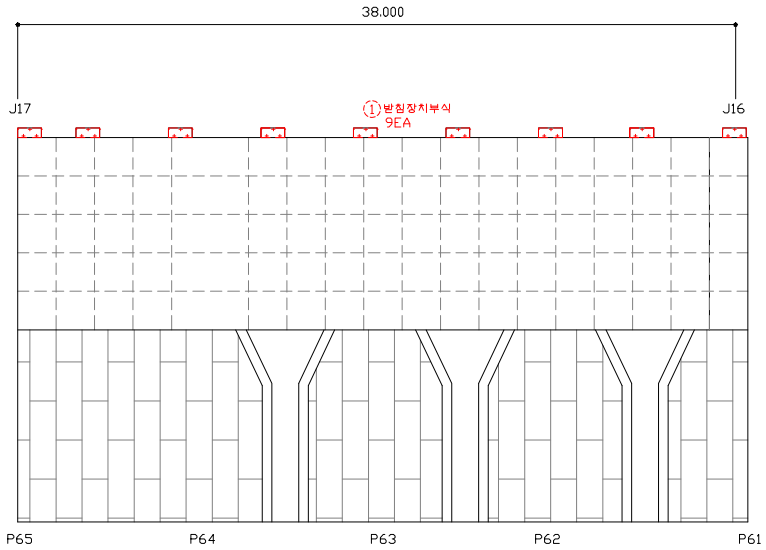


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	받침장치부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	094

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

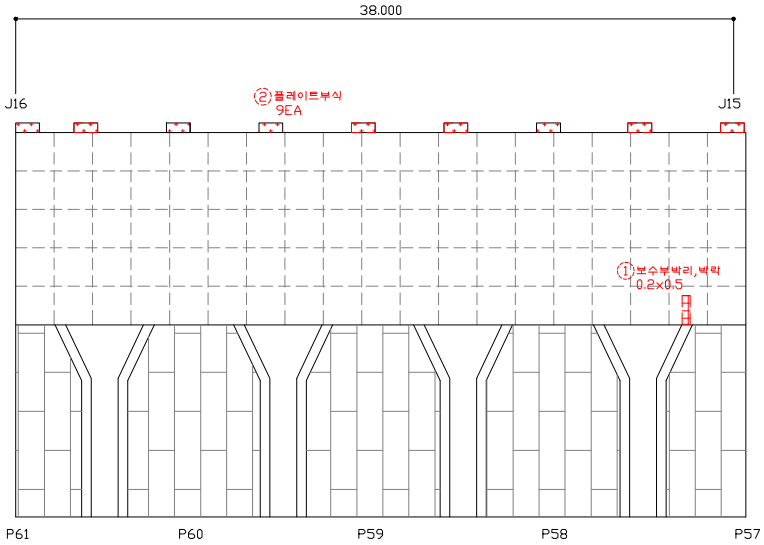


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	보수부박리,박락	0.20	0.50		1.00	㎡	1.00					2
2	2018	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	095

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

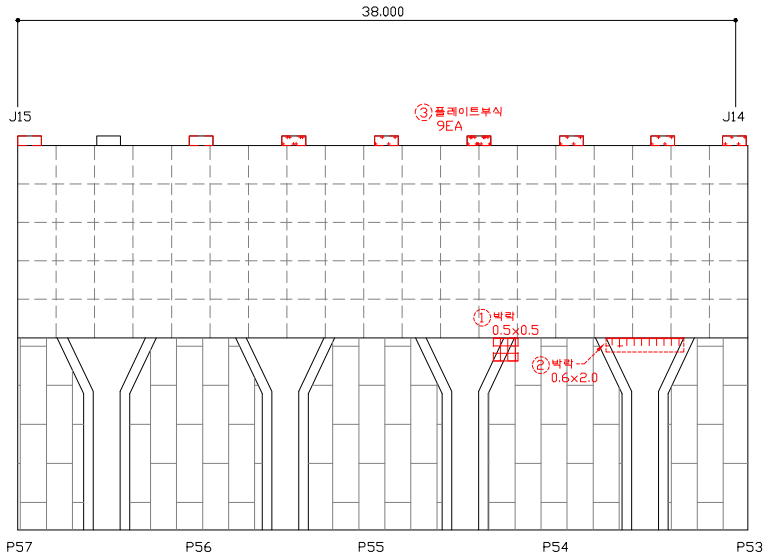


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	박락	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
2	2018	박락	0.60	2.00		1.20	㎡	1.00					2
3	2018	플레이트부식				9.00	EA	9.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	096

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

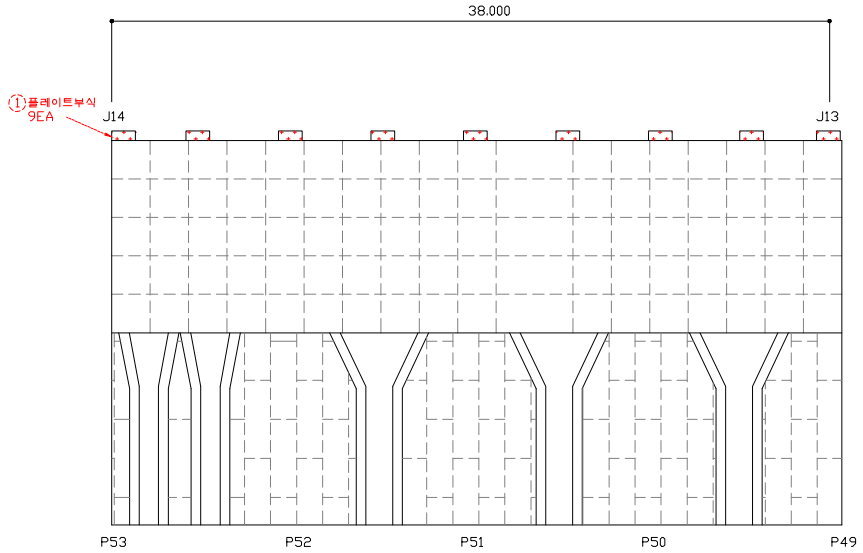


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	097

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

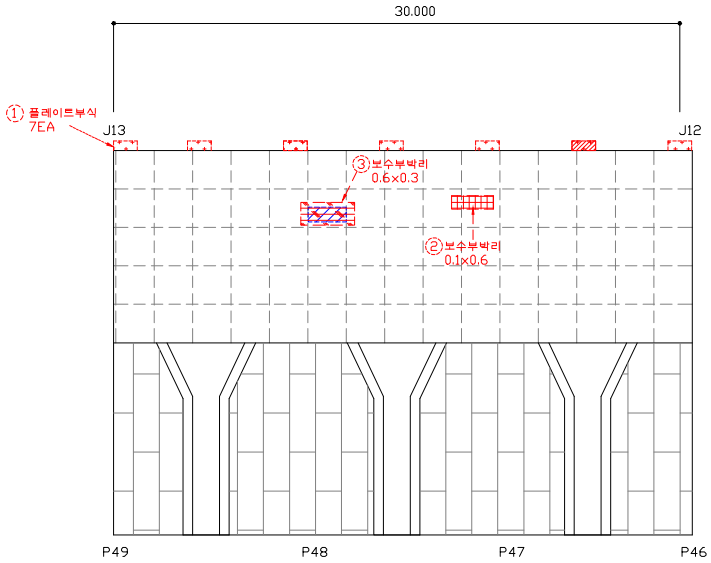


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트부식	-	-		7.00	EA	7.00					2
2	2016	보수부박리	0.10	0.60		0.06	㎡	1.00					2
3	2018	보수부박리	0.60	0.30		0.18	㎡	1.00					2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	098

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

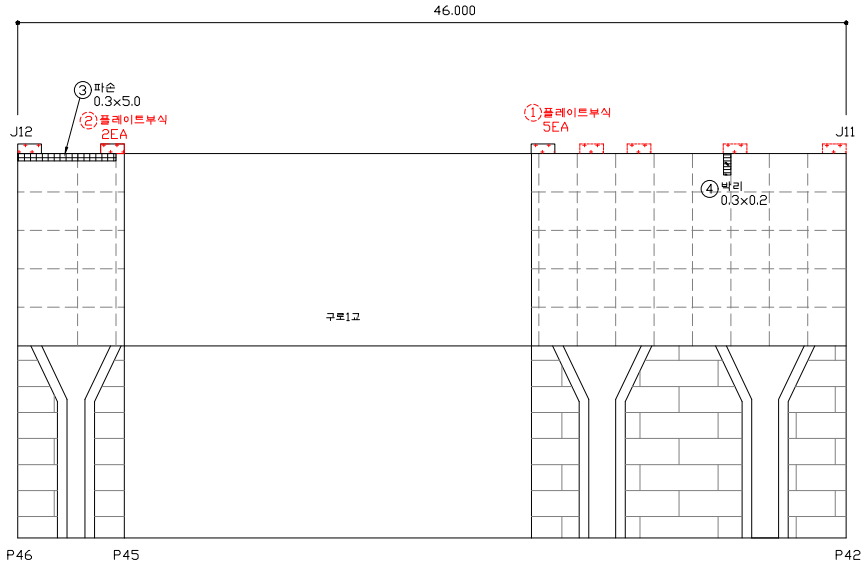


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트부식				5.00	EA	5.00					2
2	2018	플레이트부식	-	-		2.00	EA	2.00					2
3	2019	파손	0.30	5.00		1.50	㎡	1.00				신규	2
4	2019	박리	0.30	0.20		0.06	㎡	1.00				신규	2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	099

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

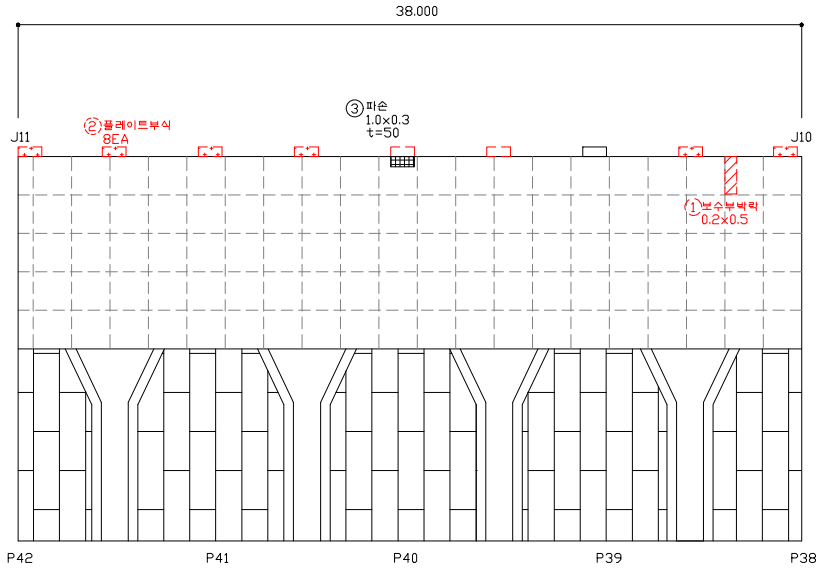


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	보수부박락	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
2	2018	플레이트부식	-	-		8.00	EA	8.00					2
3	2019	파손	1.00	0.30		0.30	㎡	1.00				신규	2
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	100

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

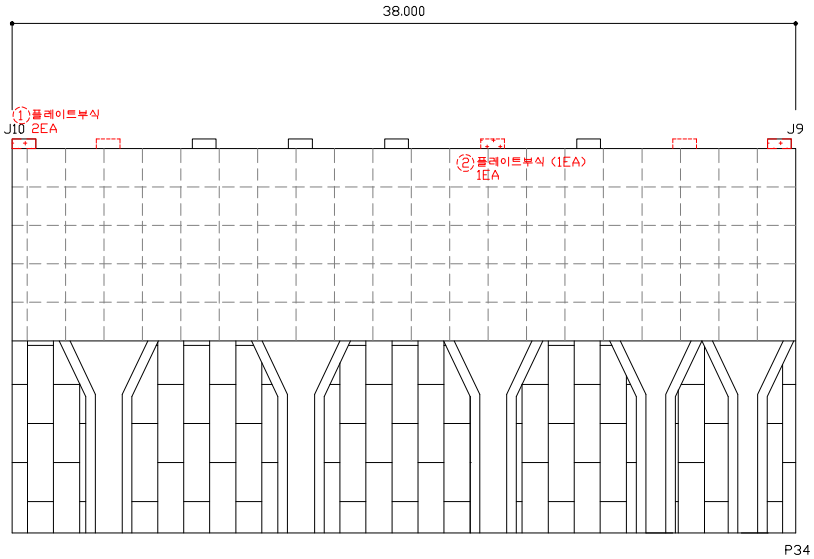


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2018	플레이트부식	-	-		2.00	EA	2.00					2
2	2011	플레이트부식	-	-		1.00	EA	1.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	101

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

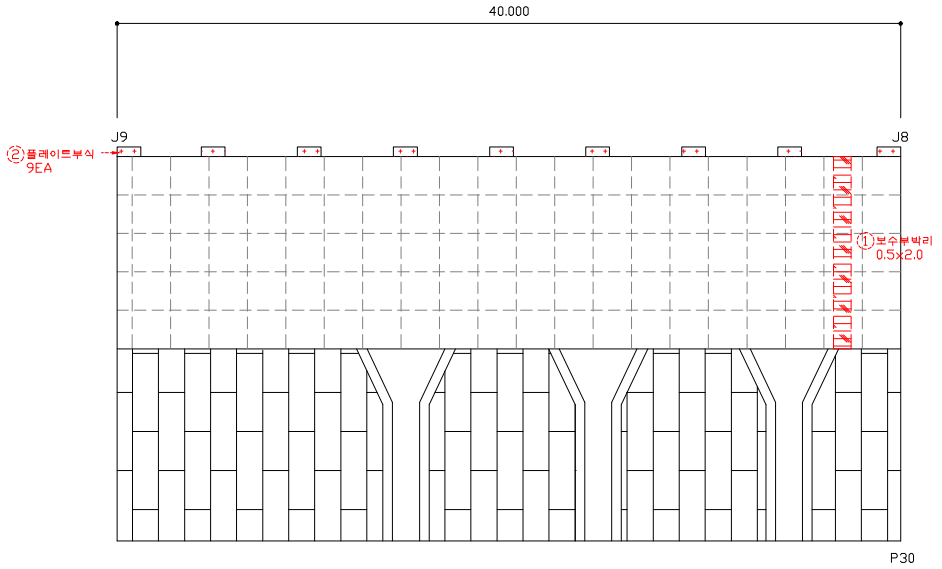


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2016	보수부박리	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
2	2011	플레이트부식	-	-		9.00	EA	9.00					2
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	102

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

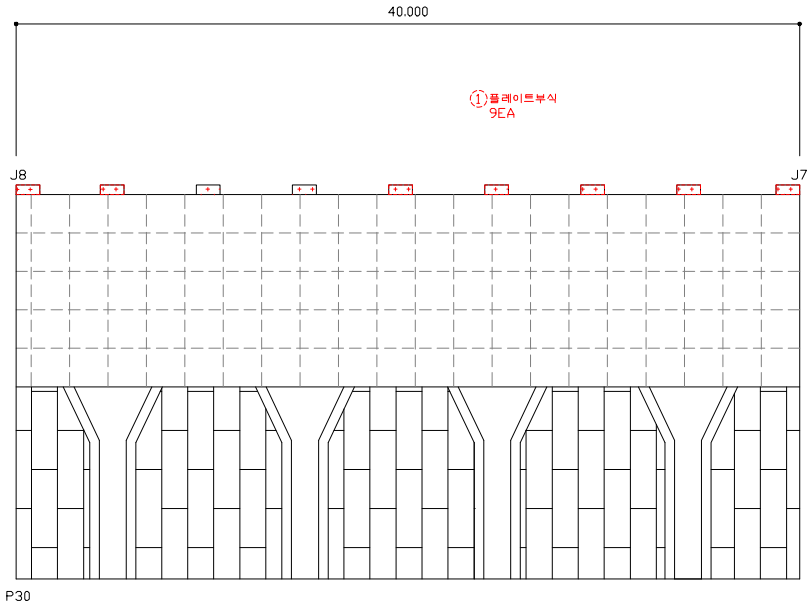


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트부식	-	-		2.00	EA	2.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	103

ID : 도림천4복개 2련 / 교대

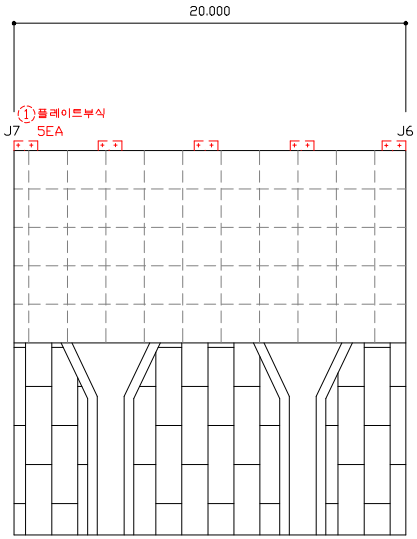


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트부식	-	-		5.00	EA	5.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	104

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

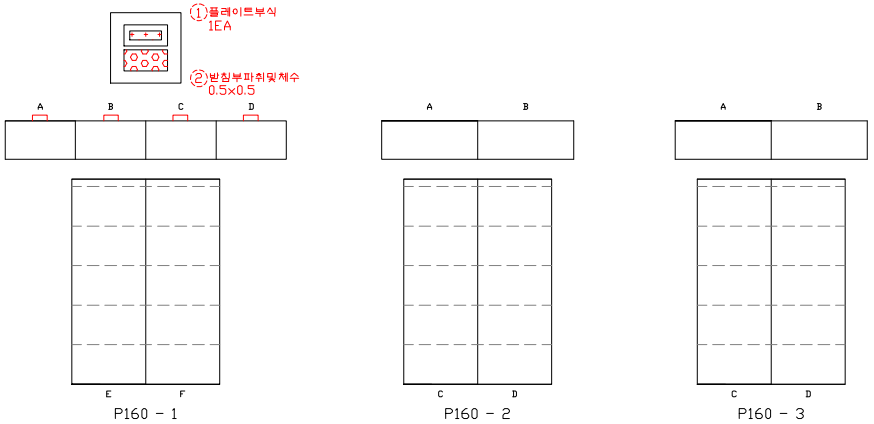


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락,박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	105

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

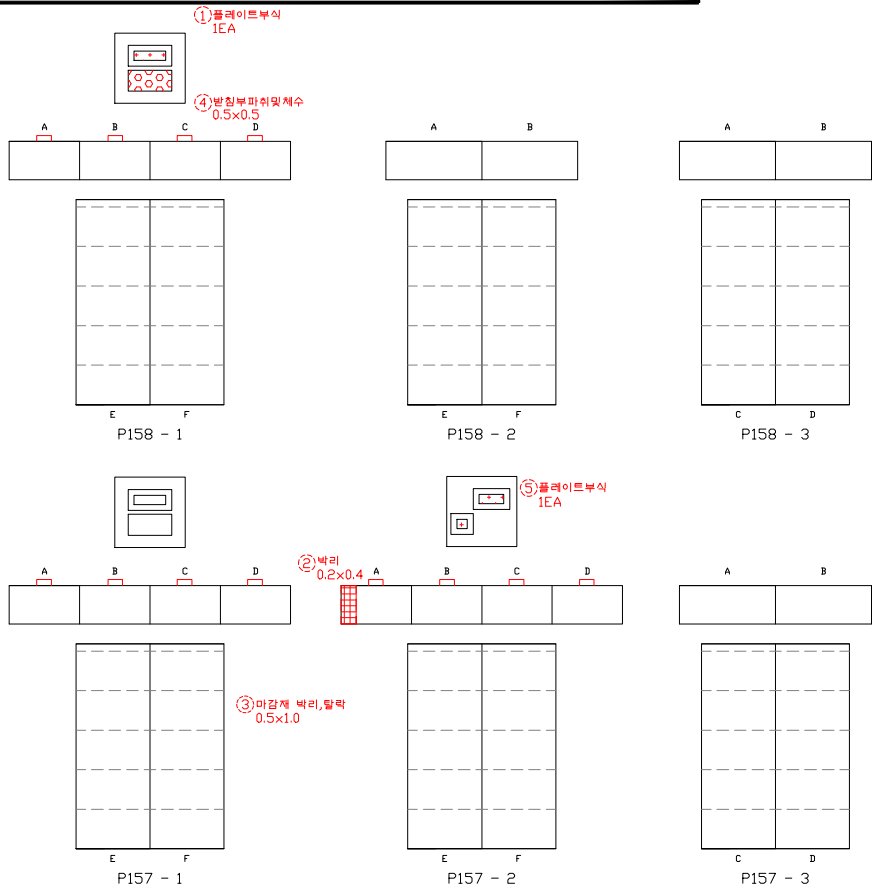


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2018	박리	0.20	0.40		0.08	㎡	1.00					2
3	2016	마감재 박리, 탈락	0.50	1.00		0.50	㎡	1.00					2
4	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	106


ID : 도림천4복개 2련 / 교각

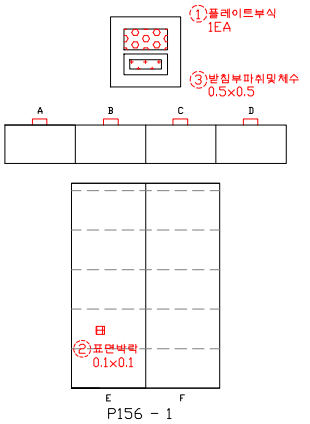


P156 - 1



P156 - 2

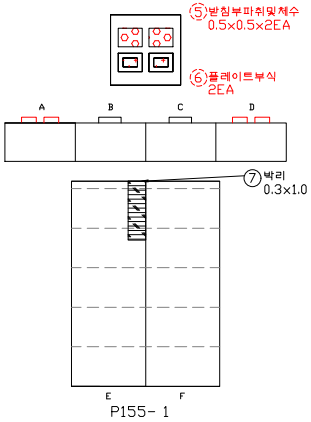

P155- 1

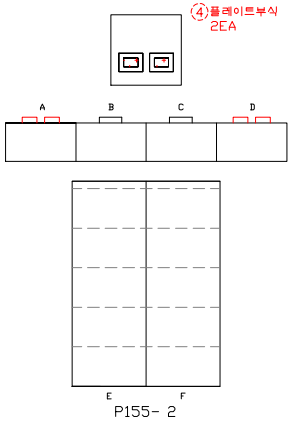


P155- 2

손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2016	표면박락	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
3	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				2.00	EA	2.00					2
5	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.50	㎡	2.00					2
6	2011	플레이트 부식				2.00	EA	2.00					2
7	2019	박리	0.30	1.00		0.30	㎡	1.00				신규	2
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	107

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

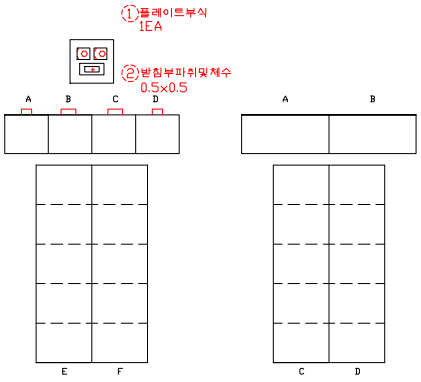


P154 - 1

P154 - 2

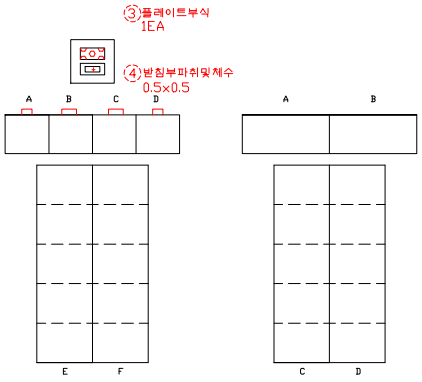


P153- 1

P153- 2

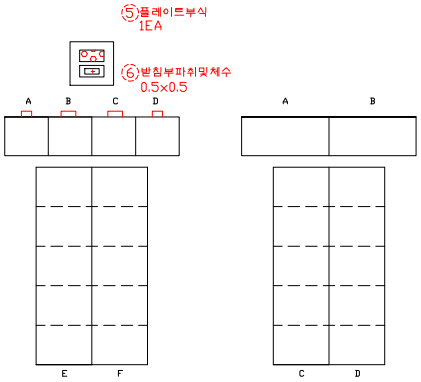


P152 - 1

P152 - 2

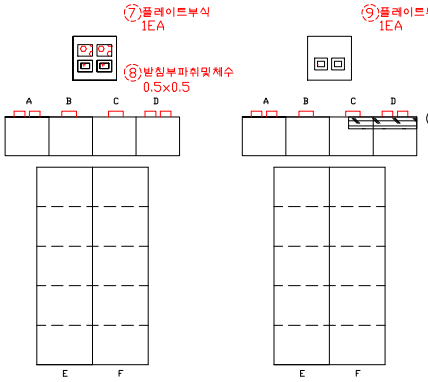

P151 - 1

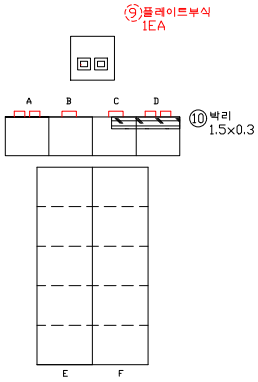


P151 - 2

손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
7	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
8	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
9	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
10	2019	박리	1.50	0.30		0.45	㎡	1.00				신규	2
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	108

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

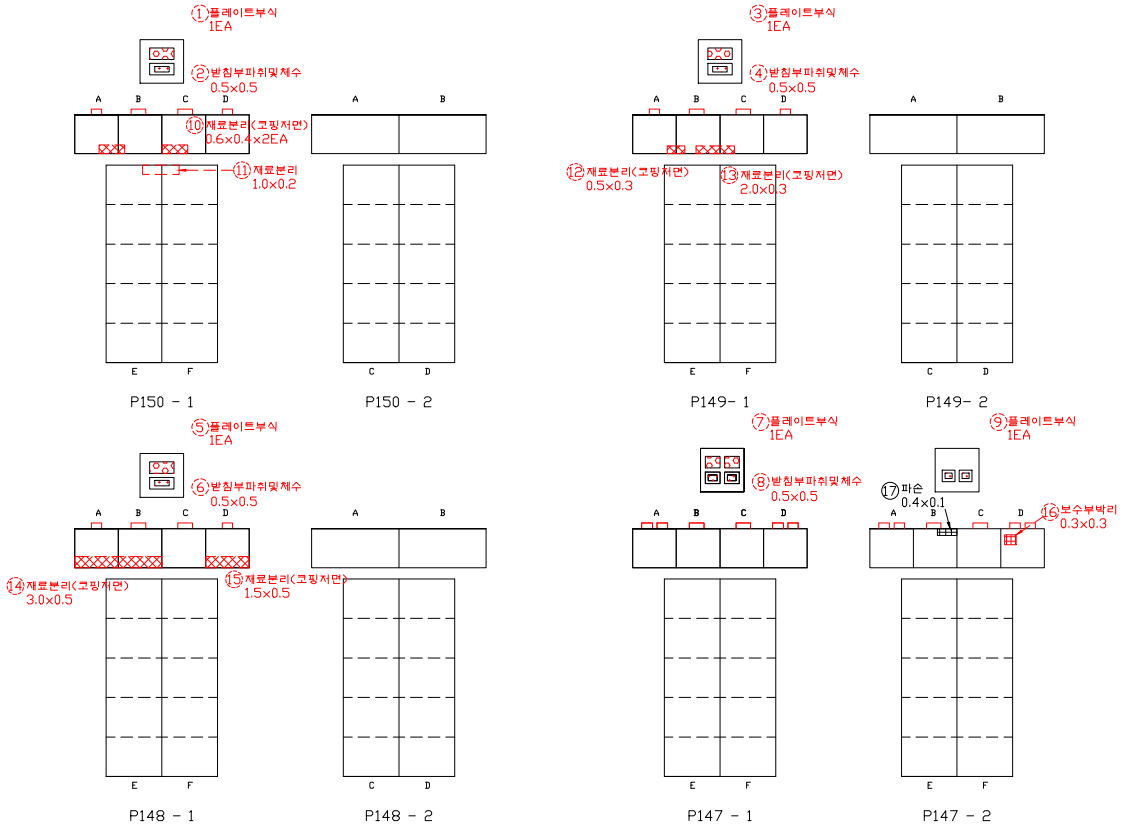


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
7	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
8	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
9	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
10	2016	재료분리	0.60	0.40		0.48	㎡	2.00					2
11	2016	재료분리	1.00	0.20		0.20	㎡	1.00					2
12	2016	재료분리	0.50	0.30		0.15	㎡	1.00					2
13	2016	재료분리	2.00	0.30		0.60	㎡	1.00					2
14	2016	재료분리	3.00	0.50		1.50	㎡	1.00					2
15	2016	재료분리	1.50	0.50		0.75	㎡	1.00					2
16	2018	보수부박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					2
17	2019	파손	0.40	0.10		0.04	㎡	1.00				신규	2
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	109

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

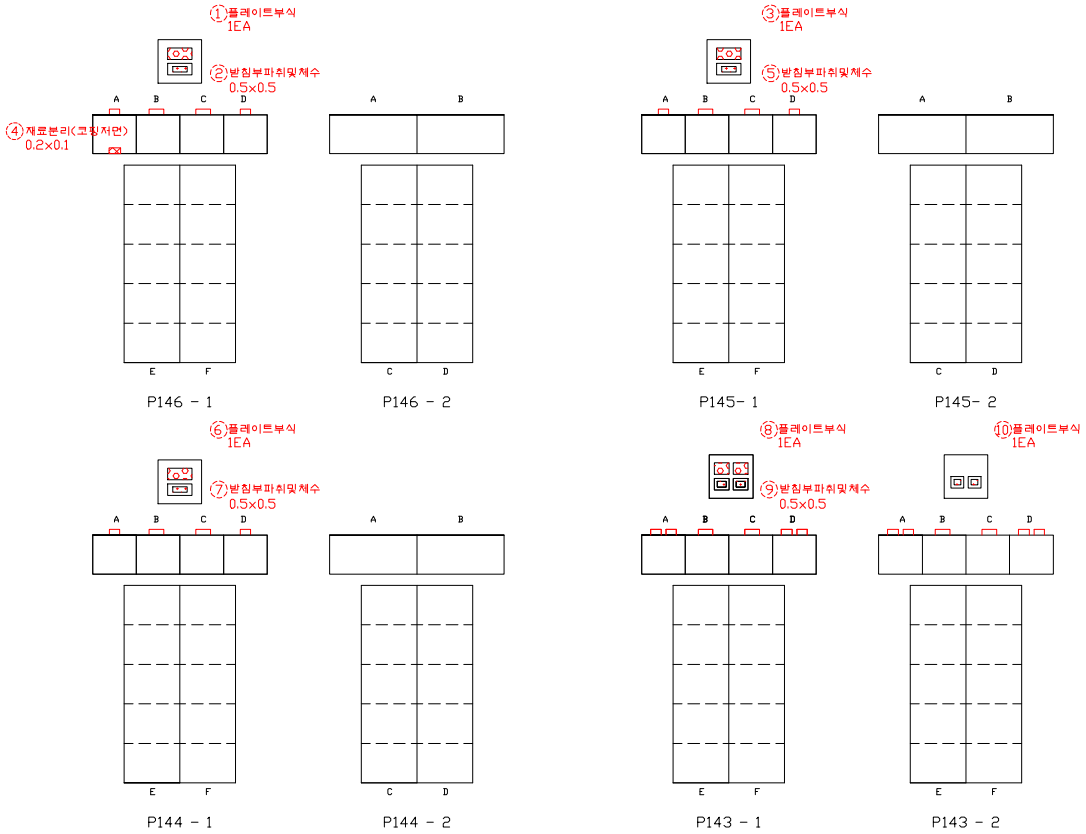


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2016	재료분리	0.20	0.10		0.02	㎡	1.00					2
5	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
6	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
7	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
8	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
9	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
10	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	110

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

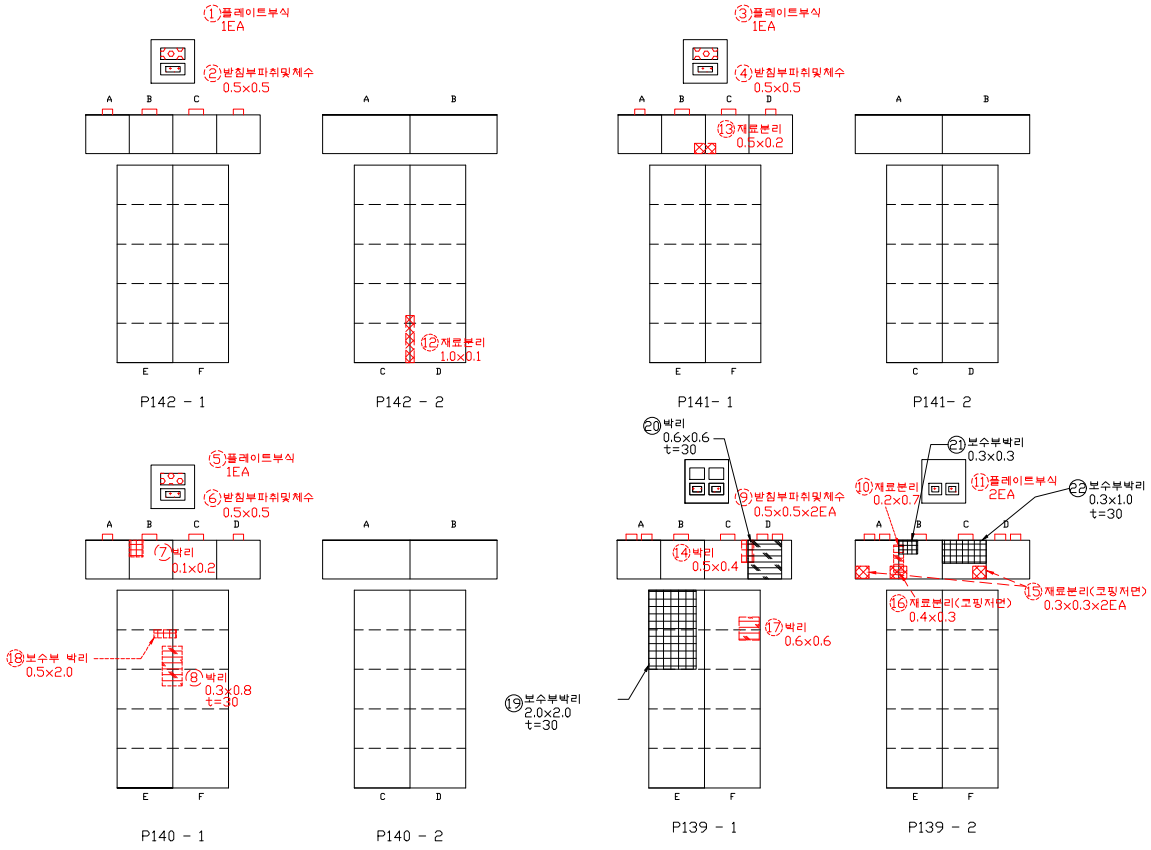


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				0.03	㎡	1.00					2
4	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
7	2014	박리	0.10	0.20		0.02	㎡	1.00					2
8	2014	박리	0.30	0.80		0.24	㎡	1.00					2
9	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.50	㎡	2.00					2
10	2011	재료분리	0.20	0.70		0.14	㎡	1.00					2
11	2011	플레이트 부식				2.00	EA	2.00					2
12	2016	재료분리	1.00	0.10		0.10	㎡	1.00					2
13	2016	재료분리	0.50	0.20		0.10	㎡	1.00					2
14	2016	박리	0.50	0.40		0.20	㎡	1.00					2
15	2016	재료분리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					2
16	2016	재료분리	0.40	0.30		0.12	㎡	1.00					2
17	2016	박리	0.60	0.60		0.36	㎡	1.00					2
18	2018	보수부 박리	0.30	0.20		0.06	㎡	1.00					2
19	2019	보수부박리	2.00	2.00		4.00	㎡	1.00				신규	2
20	2019	박리	0.60	0.60		0.36	㎡	1.00				신규	2
21	2019	보수부박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00				신규	2
22	2019	보수부박리	0.30	1.00		0.30	㎡	1.00				신규	2
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	111

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

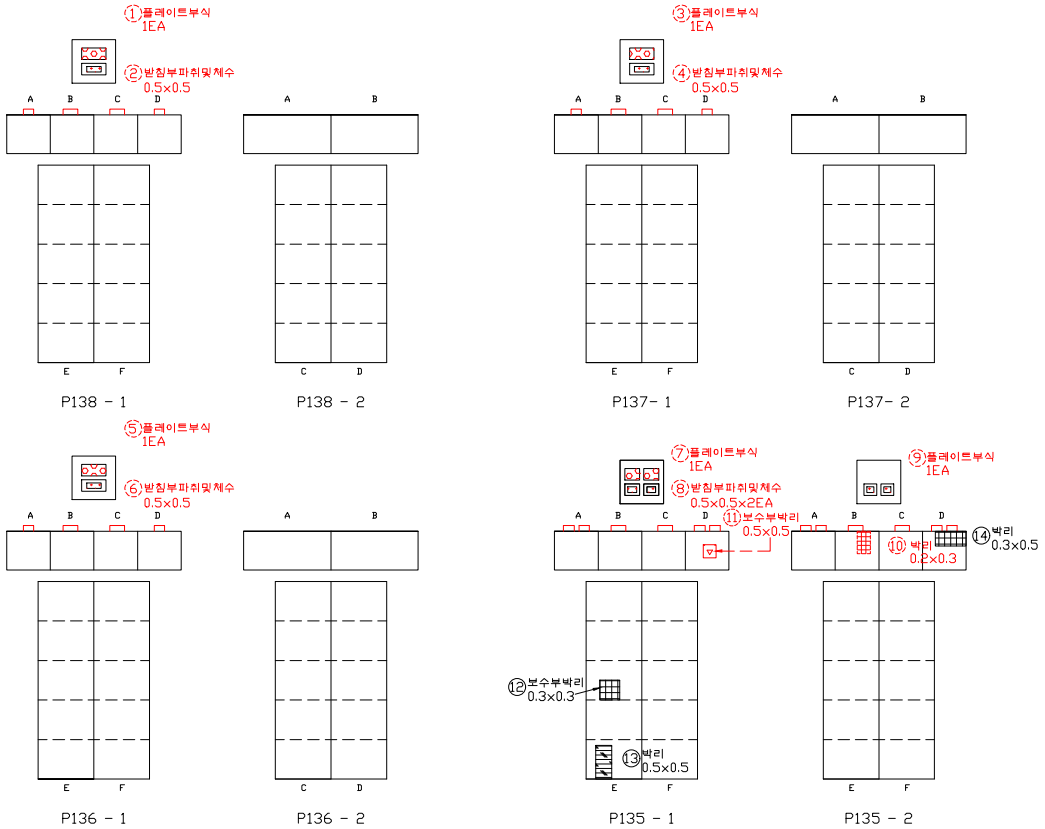


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
7	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
8	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.50	㎡	2.00					2
9	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
10	2011	박리	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00					2
11	2016	보수부 박리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
12	2019	보수부박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00				신규	2
13	2019	박리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00				신규	2
14	2019	박리	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00				신규	2
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	112

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

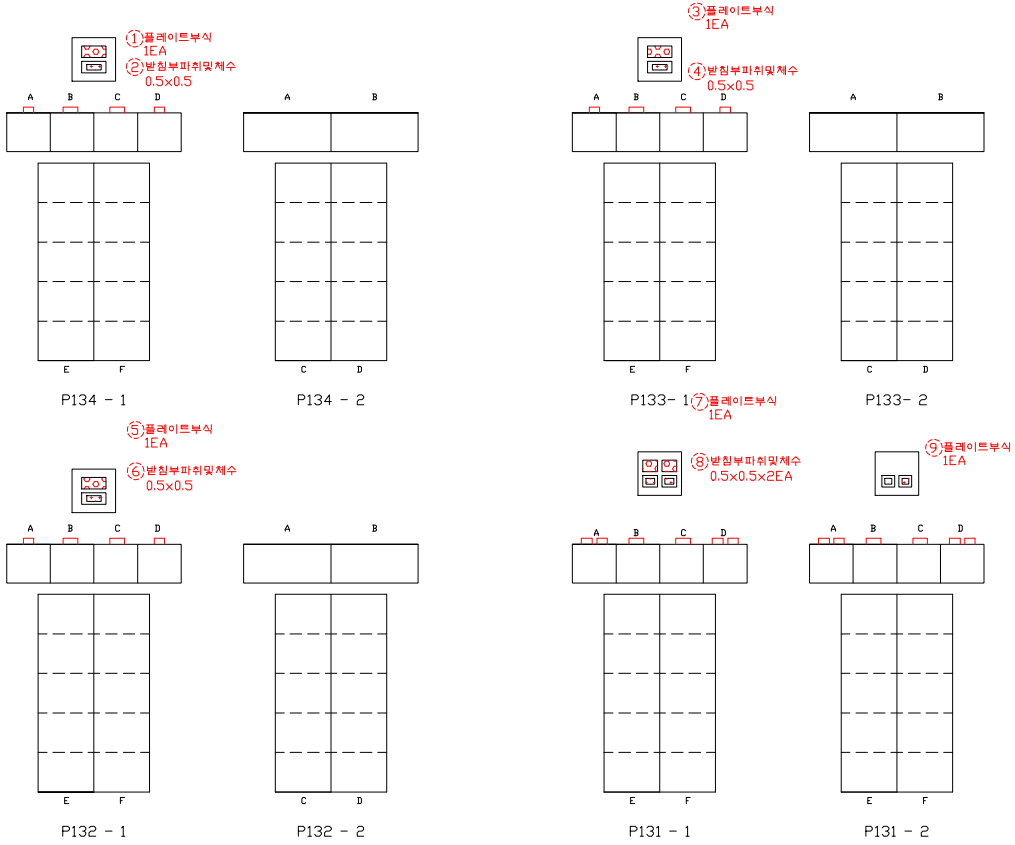


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	받침부 파취 및 채수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	받침부 파취 및 채수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	받침부 파취 및 채수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
7	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
8	2011	받침부 파취 및 채수	0.50	0.50		0.50	㎡	2.00					2
9	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	113


ID : 도림천4복개 2련 / 교각

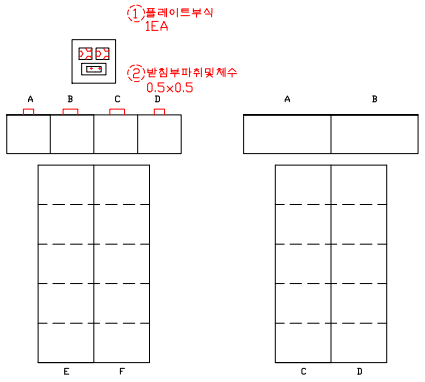


P130 - 1 P130 - 2

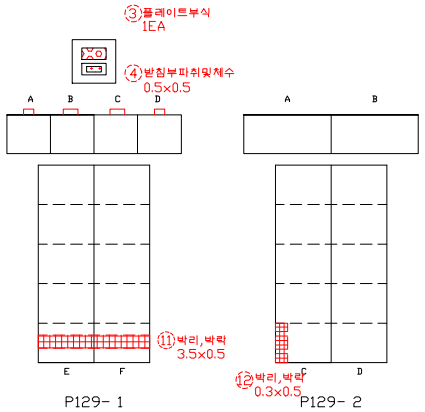

P129- 1 P129- 2

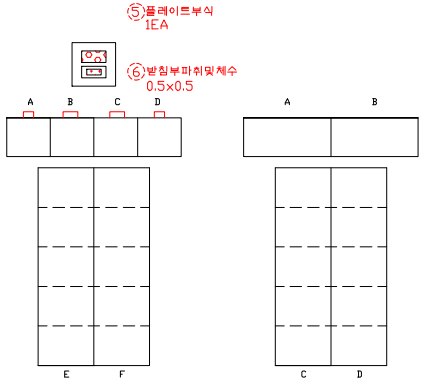

P128 - 1 P128 - 2

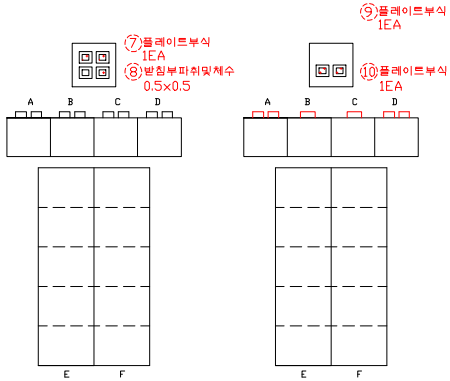


P127 - 1 P127 - 2

손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
7	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
8	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
9	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
10	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
11	2016	박리, 박락	3.50	0.50		1.75	㎡	1.00					2
12	2018	박리,박락	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					2
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	114

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

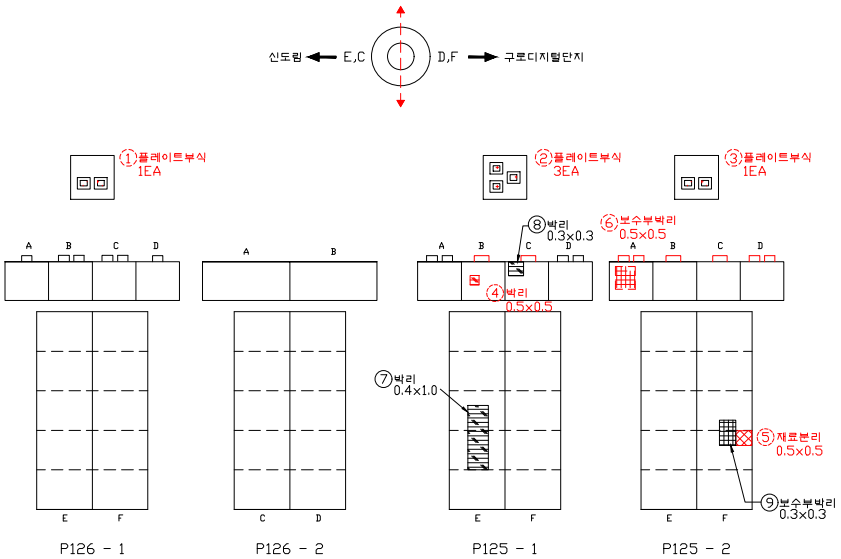


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				3.00	EA	3.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2016	박리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
5	2016	재료분리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
6	2018	보수부박리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
7	2019	박리	0.40	1.00		0.40	㎡	1.00				신규	2
8	2019	박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00				신규	2
9	2019	보수부박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00				신규	2
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	115

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

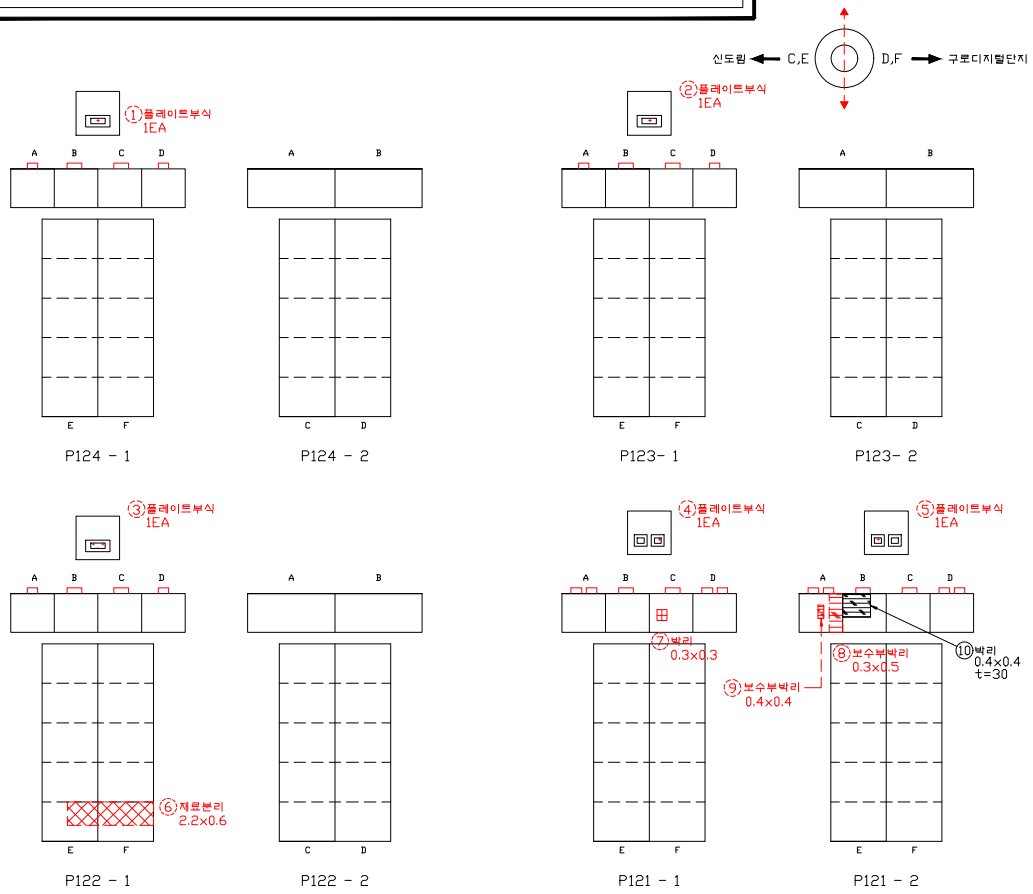


손 상 물 량 표

연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (mm)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2016	재료분리	2.20	0.60		1.32	㎡	1.00					2
7	2016	박리 및 박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					2
8	2016	보수부 박리	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					2
9	2018	보수부박리	0.40	0.40		0.16	㎡	1.00					2
10	2019	박리	0.40	0.40		0.16	㎡	1.00				신규	2
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	116

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

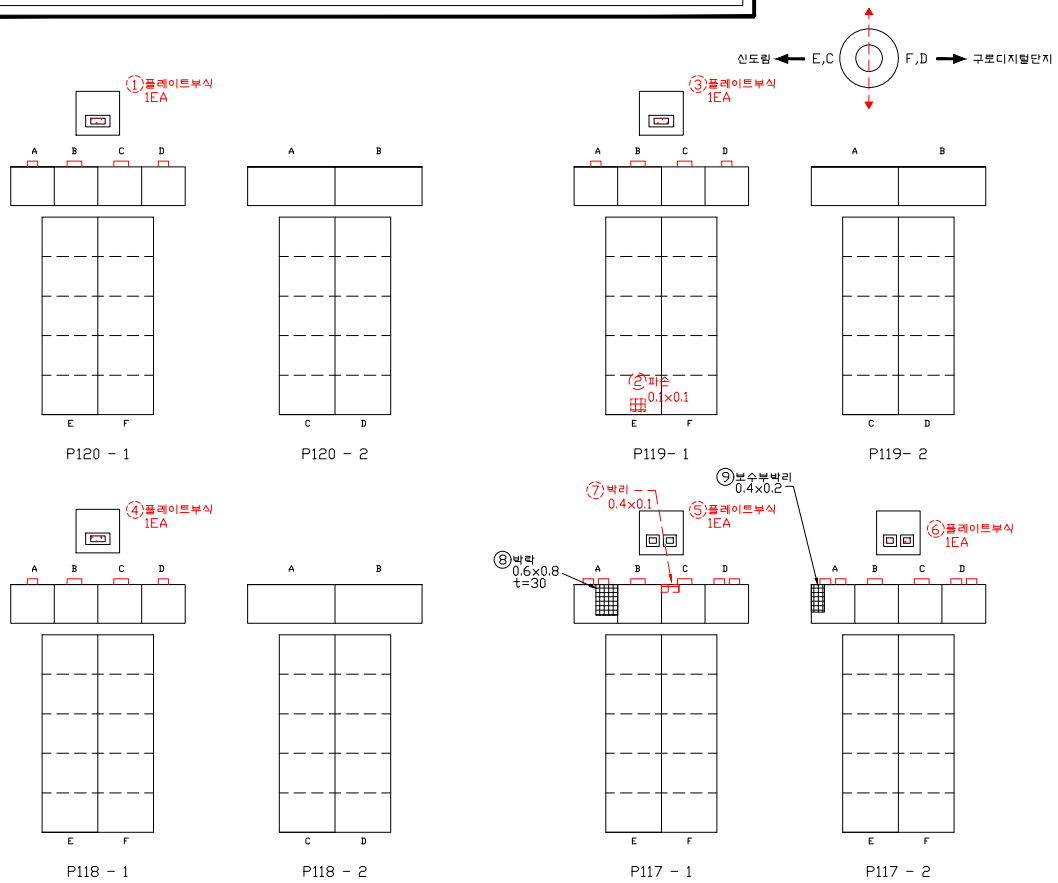


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2014	파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
7	2018	박리	0.40	0.10		0.04	㎡	1.00					2
8	2019	박락	0.60	0.80		0.48	㎡	1.00				신규	2
9	2019	보수부박리	0.40	0.20		0.08	㎡	1.00				신규	2
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	117

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

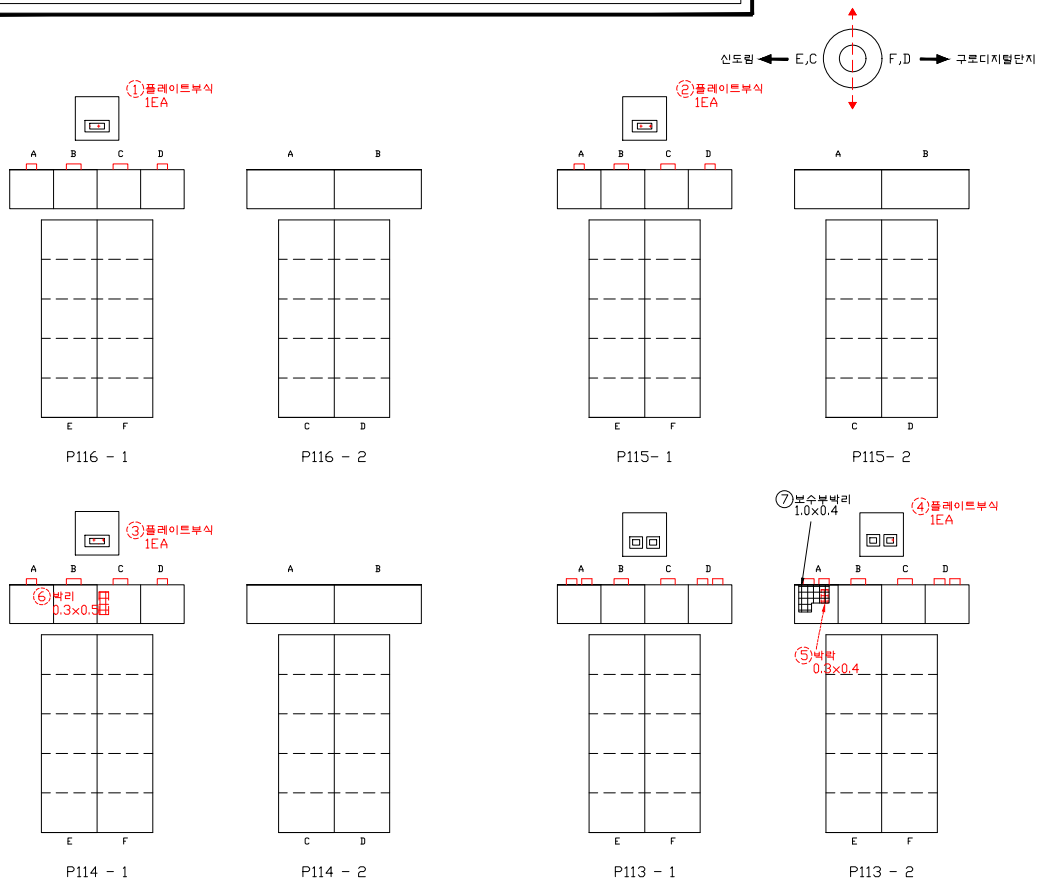


손 상 물 량 표

연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	박락	0.30	0.40		0.12	㎡	1.00					2
6	2016	박리	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					2
7	2019	보수부박리	1.00	0.40		0.40	㎡	1.00				신규	2
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	118

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

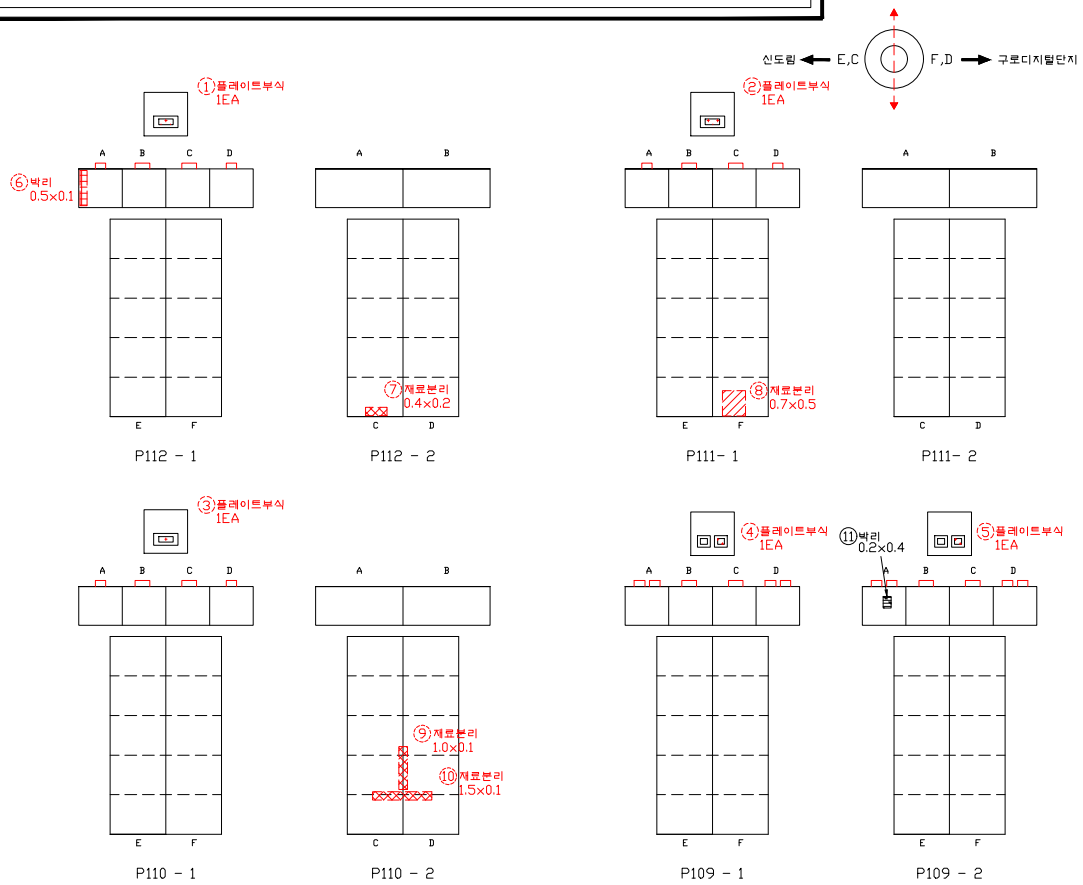


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2016	박리	0.50	0.10		0.05	㎡	1.00					2
7	2016	재료분리	0.40	0.20		0.08	㎡	1.00					2
8	2016	재료분리	0.70	0.50		0.35	㎡	1.00					2
9	2016	재료분리	1.00	0.10		0.10	㎡	1.00					2
10	2016	재료분리	1.50	0.10		0.15	㎡	1.00					2
11	2019	박리	0.20	0.40		0.08	㎡	1.00				신규	2
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	119

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

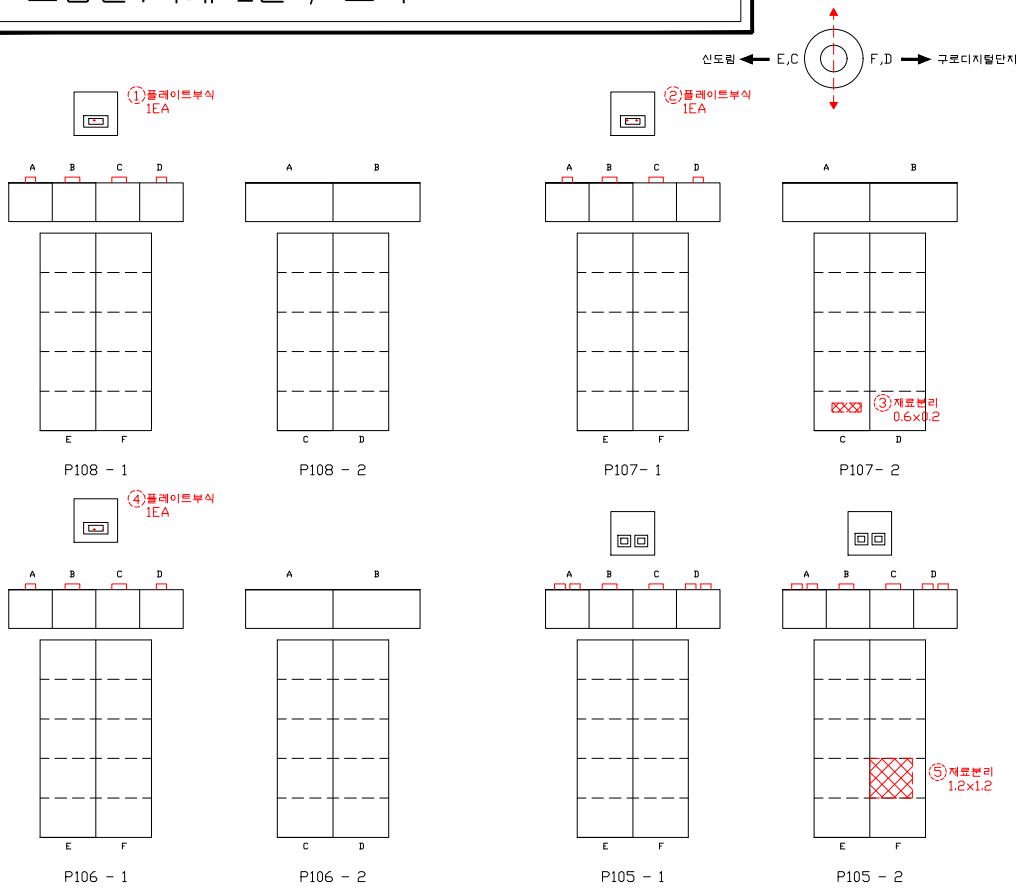


손 상 물 량 표

연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2016	재료분리	0.60	0.20		0.12	㎡	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2016	재료분리	1.20	1.20		1.44	㎡	1.00					2
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	120

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

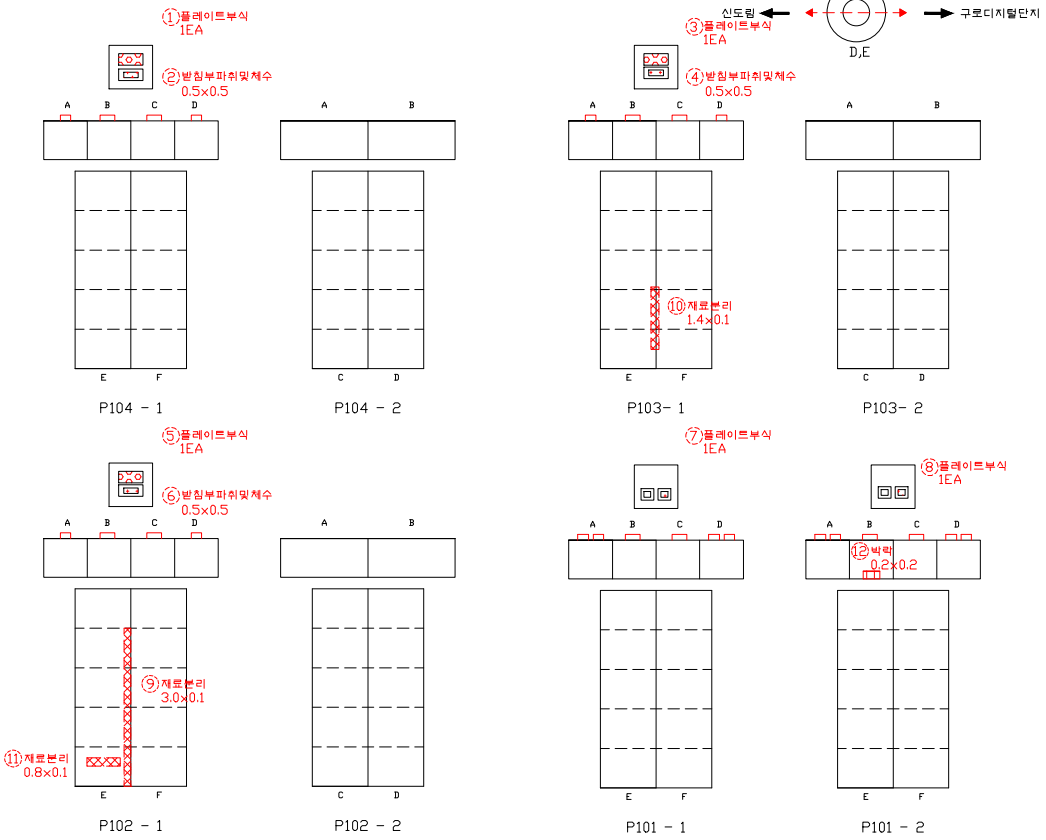


손 상 물 량 표

연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	받침부 파취 및 체수	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
7	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
8	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
9	2016	재료분리	3.00	0.10		0.30	㎡	1.00					2
10	2016	재료분리	1.40	0.10		0.14	㎡	1.00					2
11	2016	재료분리	0.80	0.10		0.08	㎡	1.00					2
12	2018	박락	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					2
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	121

ID : 도림천4복개 2련 / 교각



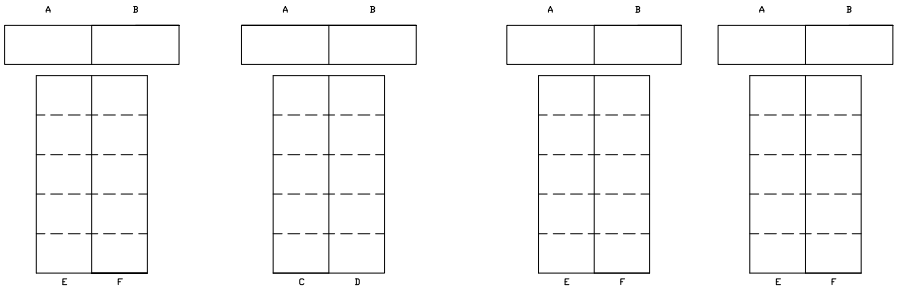


P100 - 1 P100 - 2 P99 - 1 P99 - 2

손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	122

ID : 도림천4복개 2련 / 교각



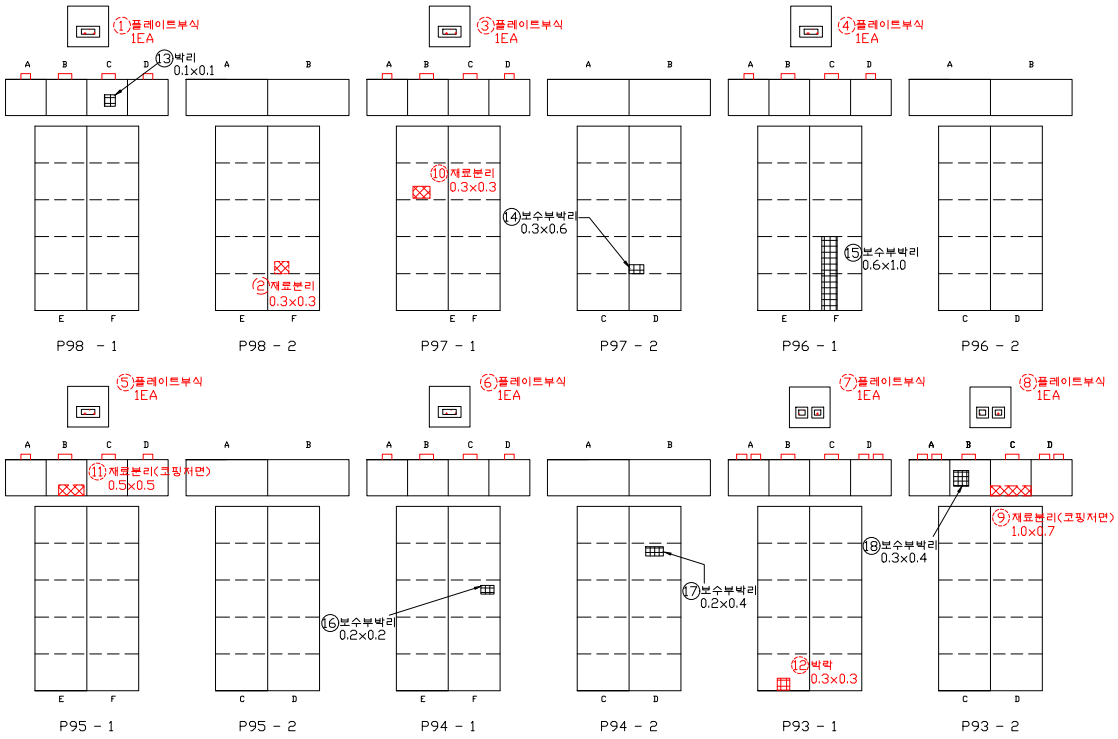


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2014	재료분리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
7	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
8	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
9	2016	재료분리	1.00	0.70		0.70	㎡	1.00					2
10	2016	재료분리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					2
11	2016	재료분리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
12	2016	박락	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					2
13	2019	박리	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00				신규	2
14	2019	보수부박리	0.30	0.60		0.18	㎡	1.00				신규	2
15	2019	보수부박리	0.60	1.00		0.60	㎡	1.00				신규	2
16	2019	보수부박리	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00				신규	2
17	2019	보수부박리	0.20	0.40		0.08	㎡	1.00				신규	2
18	2019	보수부박리	0.30	0.40		0.12	㎡	1.00				신규	2
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	123

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

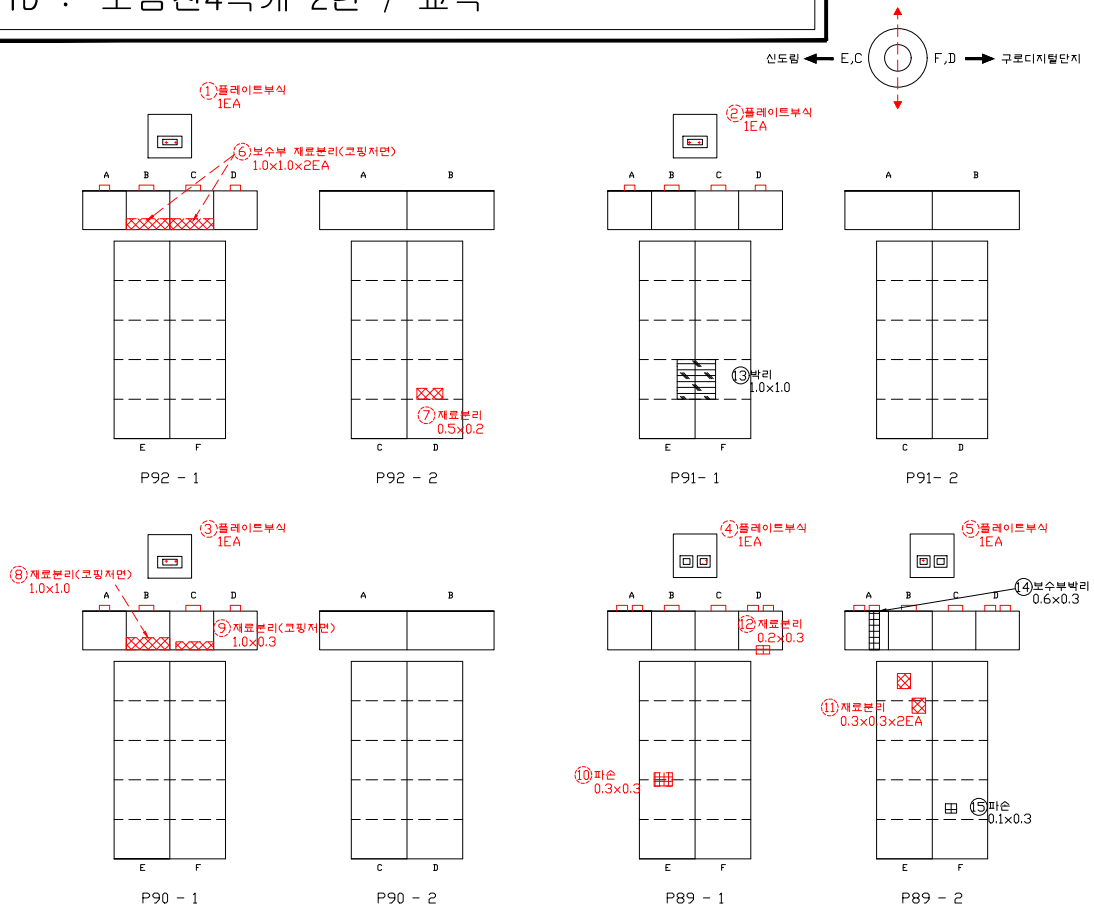


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2016	보수부 재료분리	1.00	1.00		2.00	㎡	2.00					2
7	2016	재료분리	0.50	0.20		0.10	㎡	1.00					2
8	2016	재료분리	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00					2
9	2016	재료분리	1.00	0.30		0.30	㎡	1.00					2
10	2016	파손	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					2
11	2016	재료분리	0.30	0.30		0.18	㎡	2.00					2
12	2018	재료분리	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00					2
13	2019	박리	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00				신규	2
14	2019	보수부박리	0.60	0.30		0.18	㎡	1.00				신규	2
15	2019	파손	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00				신규	2
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	124

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

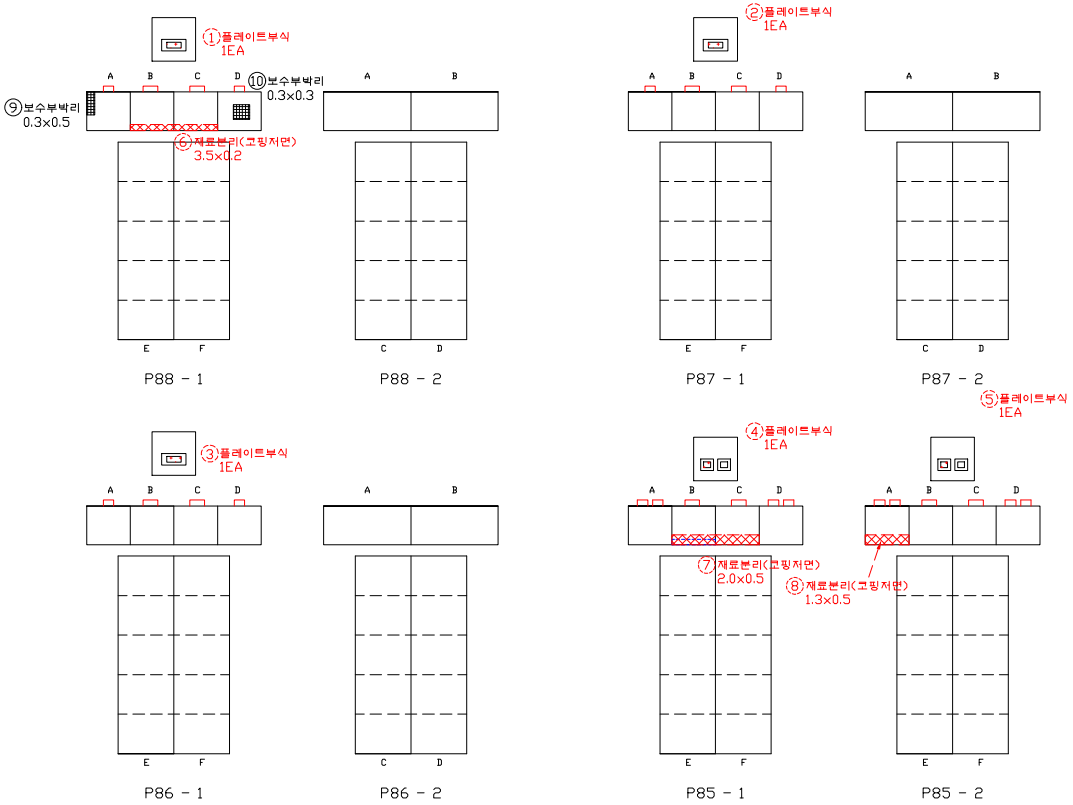


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2016	재료분리	3.50	0.20		0.70	㎡	1.00					2
7	2016	재료분리	2.00	0.50		1.00	㎡	1.00					2
8	2016	재료분리	1.30	0.50		0.65	㎡	1.00					2
9	2019	보수부박리	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00				신규	2
10	2019	보수부박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00				신규	2
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	125

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

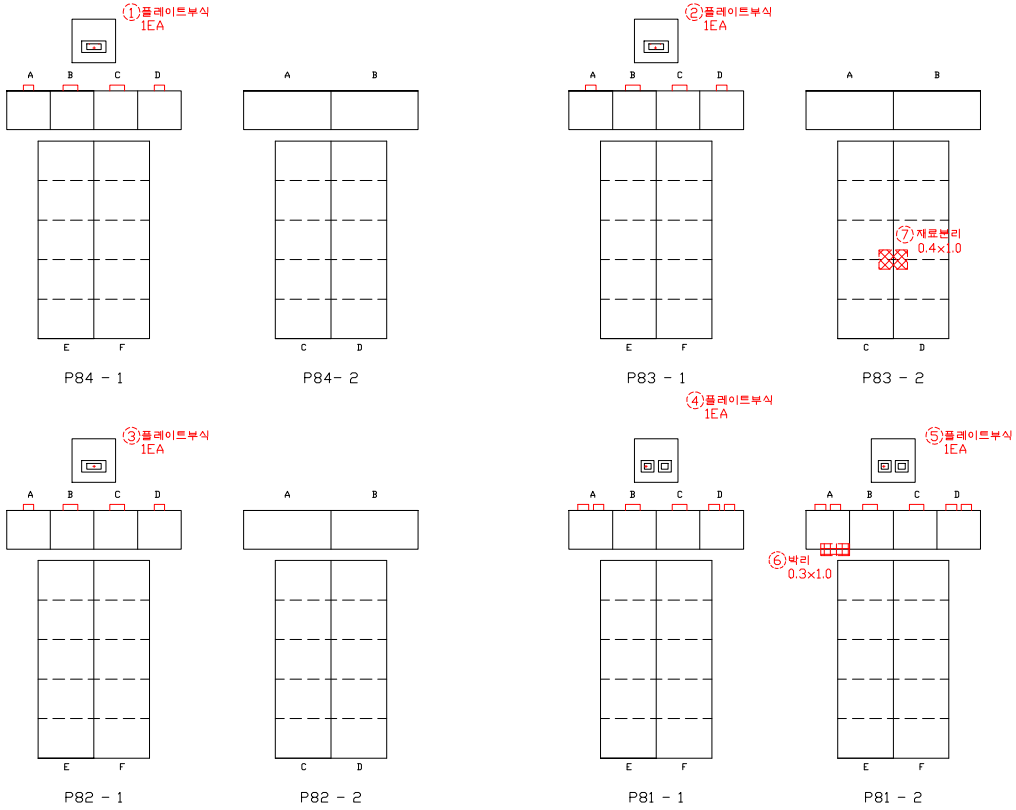


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2016	박리	0.30	1.00		0.30	㎡	1.00					2
7	2018	재료분리	0.40	1.00		0.40	㎡	1.00					2
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN





SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	126

ID : 도림천4복개 2련 / 교각



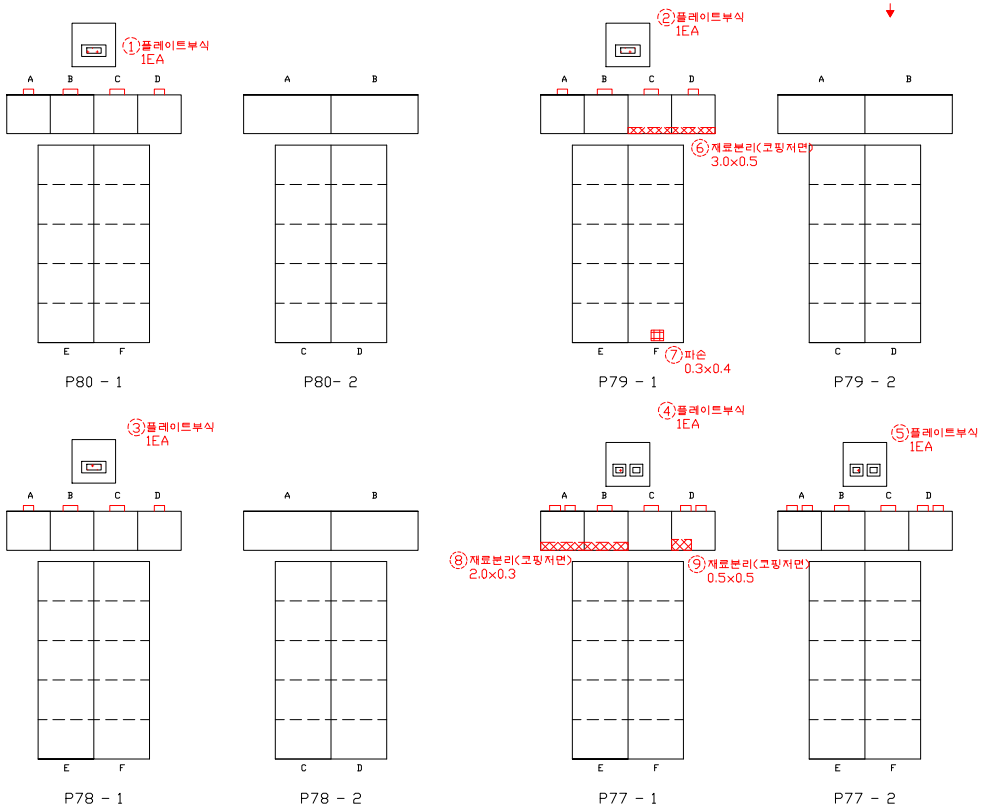


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2016	재료분리	3.00	0.50		1.50	㎡	1.00					2
7	2016	파손	0.30	0.40		0.12	㎡	1.00					2
8	2016	재료분리	2.00	0.30		0.60	㎡	1.00					2
9	2016	재료분리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	127

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

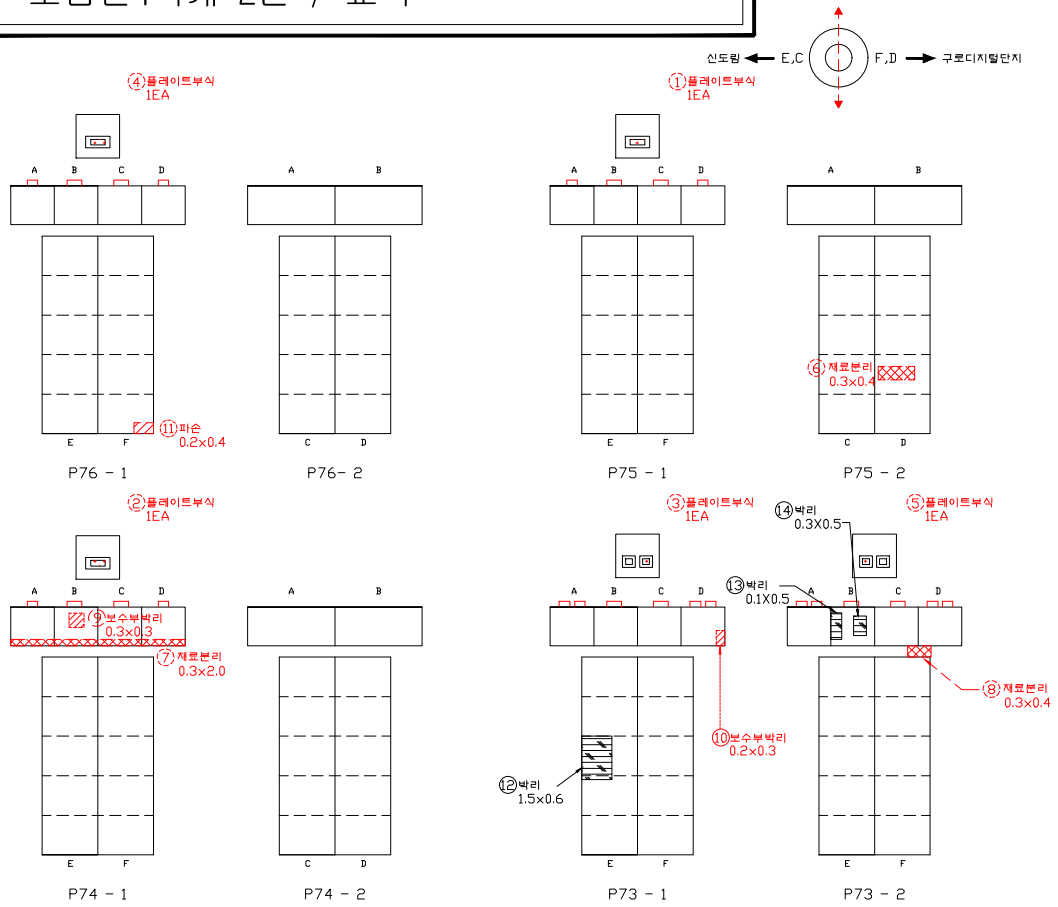


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2018	재료분리	0.30	0.40		0.12	㎡	1.00					2
7	2018	재료분리	0.30	2.00		0.60	㎡	1.00					2
8	2018	재료분리	0.30	0.40		0.12	㎡	1.00					2
9	2014	보수부박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					2
10	2011	보수부박리	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00					2
11	2016	재료분리	0.20	0.40		0.08	㎡	1.00					2
12	2019	박리	1.50	0.60		0.90	㎡	1.00				신규	2
13	2019	박리	0.10	0.50		0.05	㎡	1.00				신규	2
14	2019	박리	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00				신규	2
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	128

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

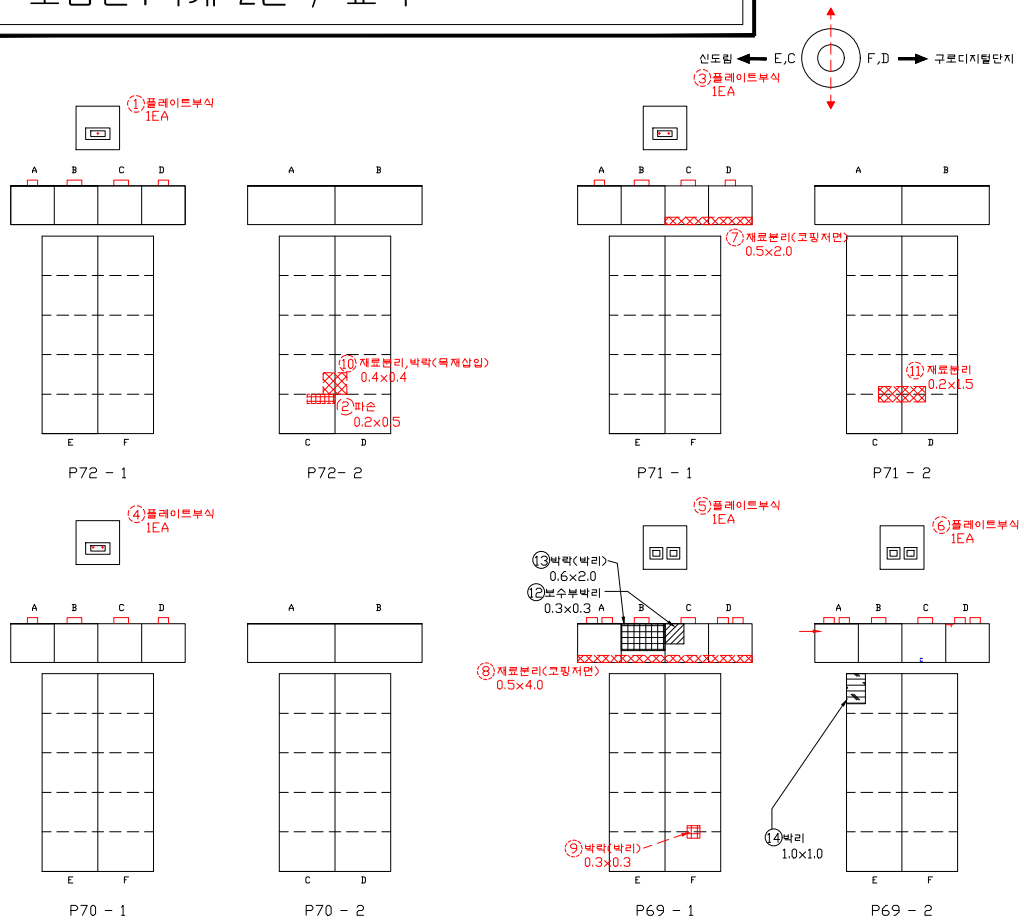


손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2014	파손	0.20	0.50		0.10	㎡	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
7	2016	재료분리	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
8	2016	재료분리	0.50	4.00		2.00	㎡	1.00					2
9	2016	박락(박리)	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					2
10	2018	재료분리,박락(목재삽입)	0.40	0.40		0.16	㎡	1.00					2
11	2018	재료분리	0.20	1.50		0.30	㎡	1.00					2
12	2019	보수부 박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00				신규	2
13	2019	박락(박리)	0.60	2.00		1.20	㎡	1.00				신규	2
14	2019	박리	1.00	1.00		1.00	㎡	1.00				신규	2
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	129

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

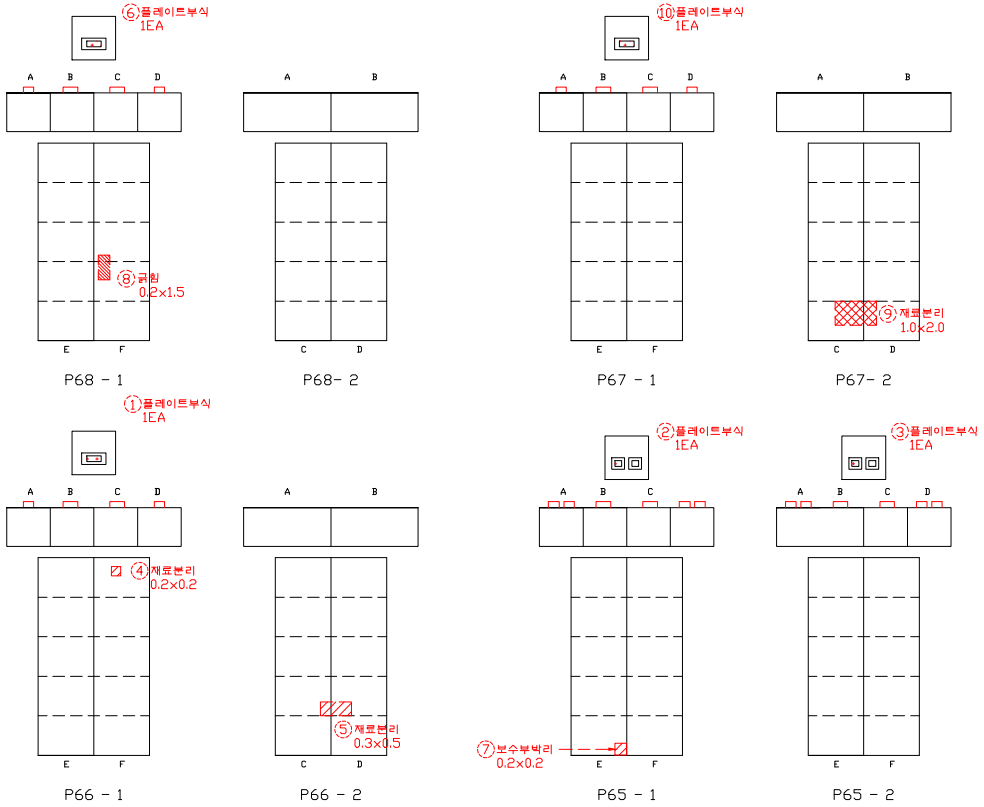


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2016	재료분리	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					2
5	2016	재료분리	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					2
6	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
7	2016	보수부 박리	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					2
8	2018	균열	0.20	1.50		0.30	㎡	1.00					2
9	2018	재료분리	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					2
10	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	130

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

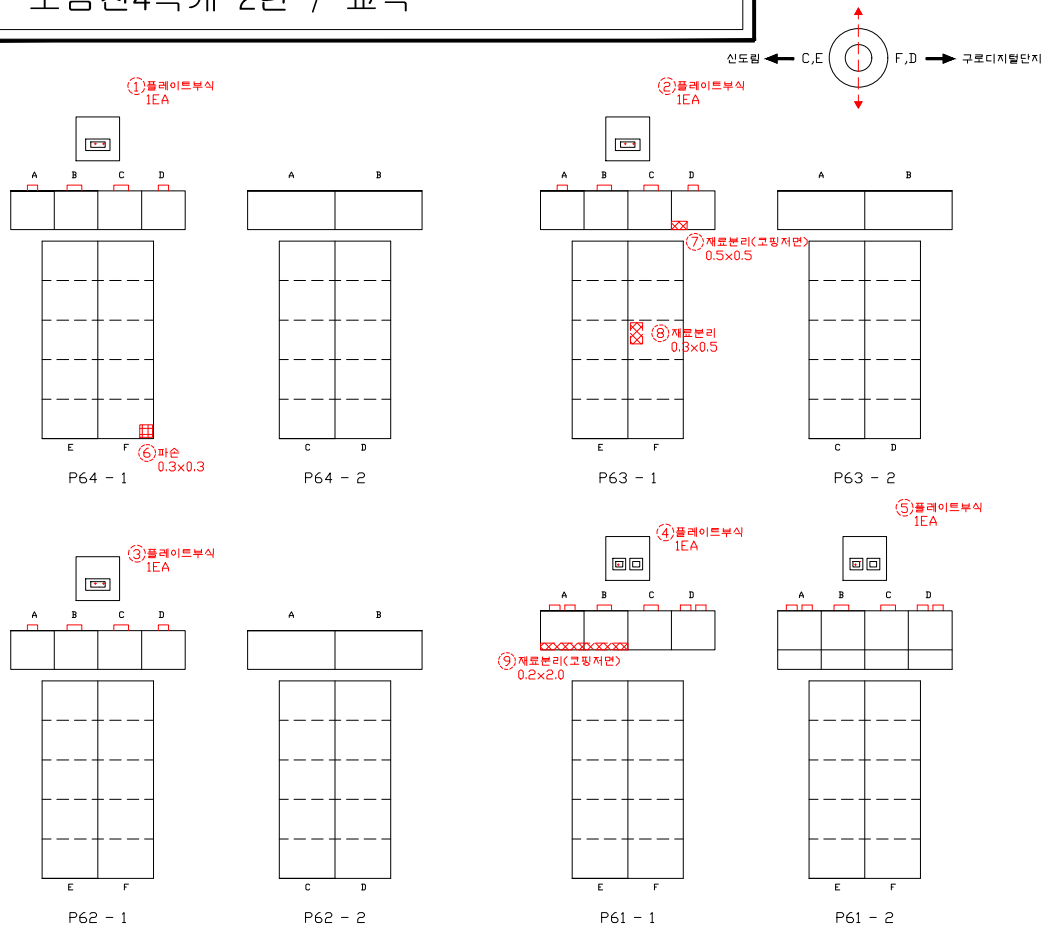


손 상 물 량 표

연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2016	파손	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00					2
7	2016	재료분리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
8	2016	재료분리	0.30	0.50		0.15	㎡	1.00					2
9	2016	재료분리	0.20	2.00		0.40	㎡	1.00					2
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	131

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

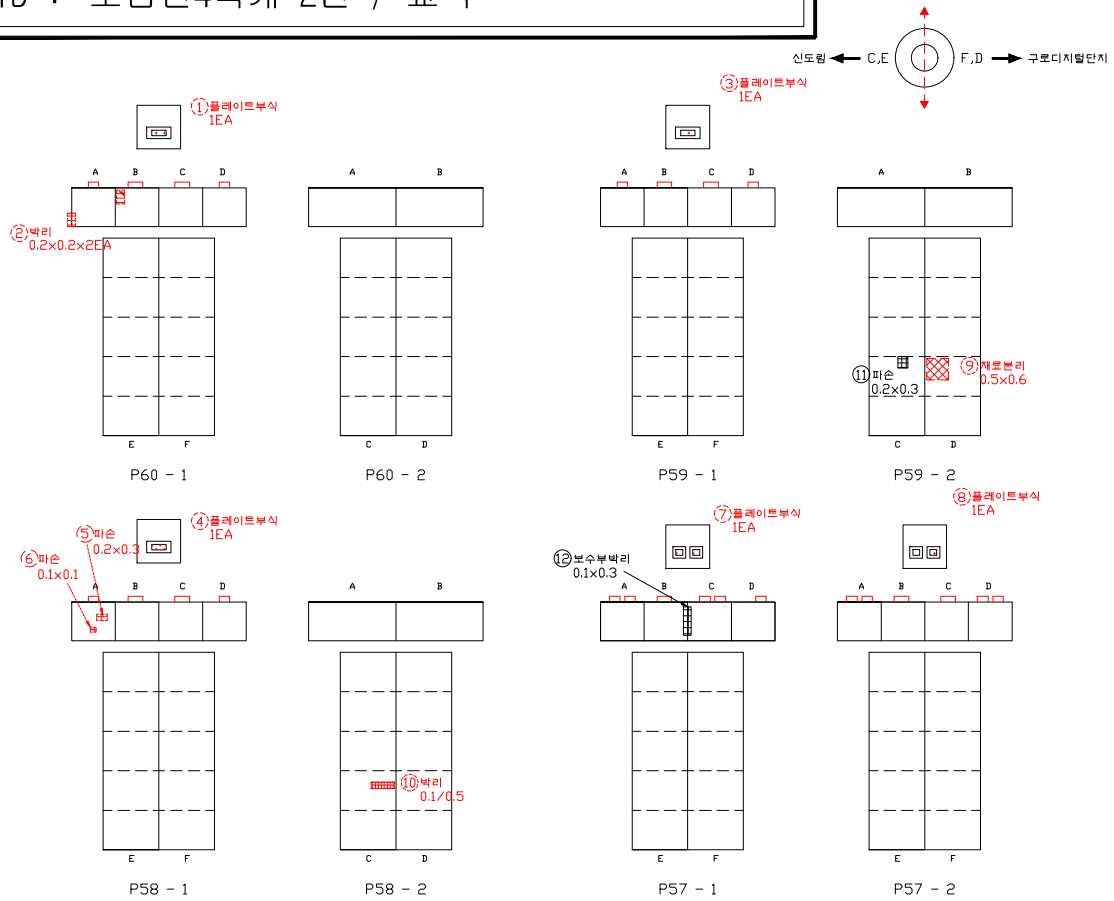


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	박리	0.20	0.20		0.08	㎡	2.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2014	파손	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00					2
6	2014	파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
7	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
8	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
9	2016	재료분리	0.50	0.60		0.30	㎡	1.00					2
10	2016	박리	0.10	0.50		0.05	㎡	1.00					2
11	2019	파손	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00				신규	2
12	2019	보수부박리	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00				신규	2
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	132

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

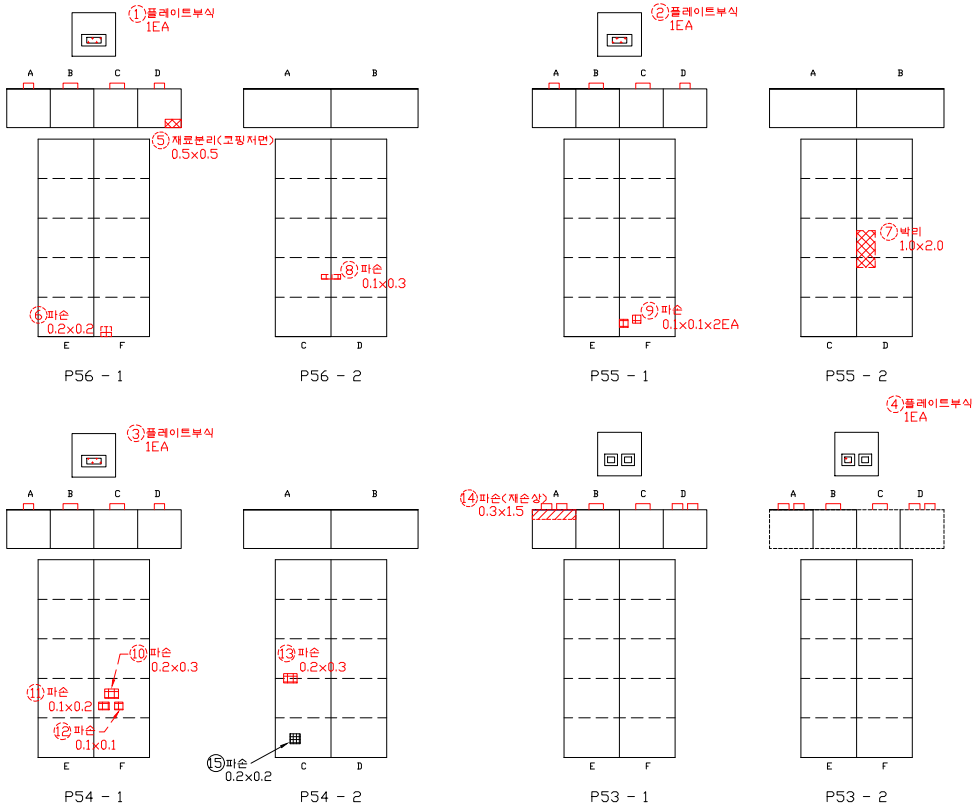


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2016	재료분리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
6	2016	파손	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					2
7	2016	박리	1.00	2.00		2.00	㎡	1.00					2
8	2018	파손	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00					2
9	2018	파손	0.10	0.10		0.02	㎡	2.00					2
10	2018	파손	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00					2
11	2018	파손	0.10	0.20		0.02	㎡	1.00					2
12	2018	파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
13	2018	파손	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00					2
14	2011	파손	0.30	1.50		0.45	㎡	1.00					2
15	2019	파손	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00				신규	2
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	133

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

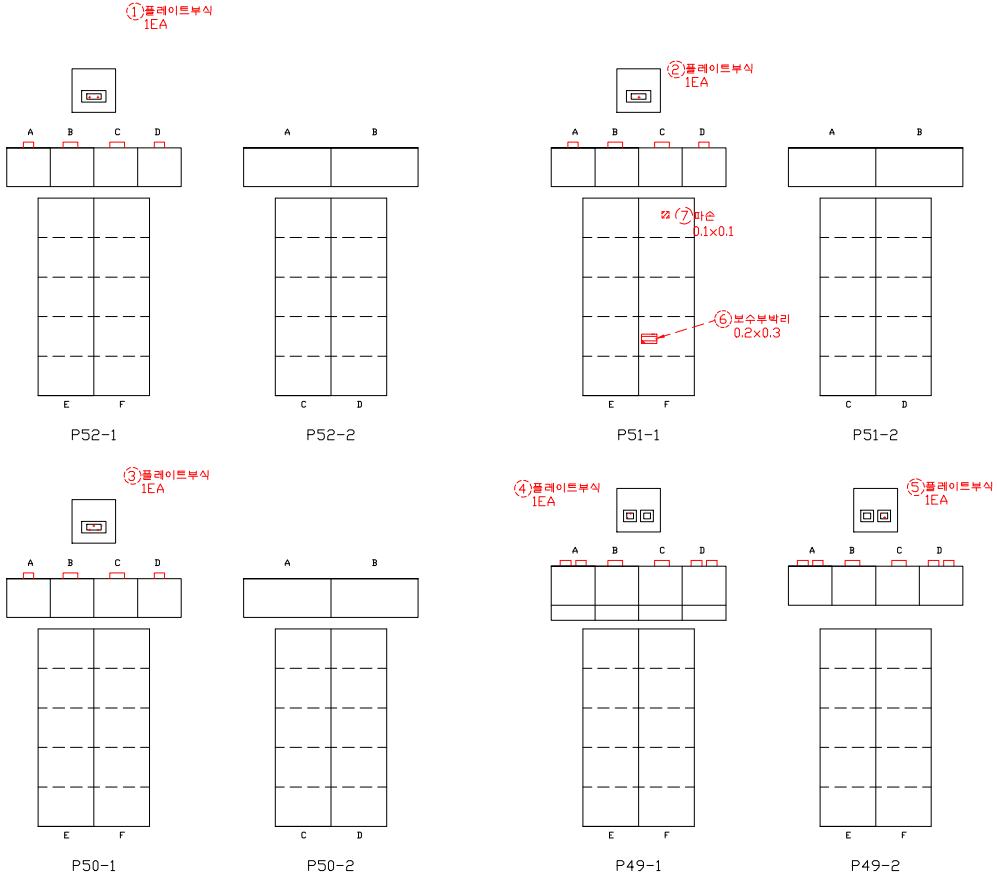


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2016	보수부 박리	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00					2
7	2018	파손	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	134

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

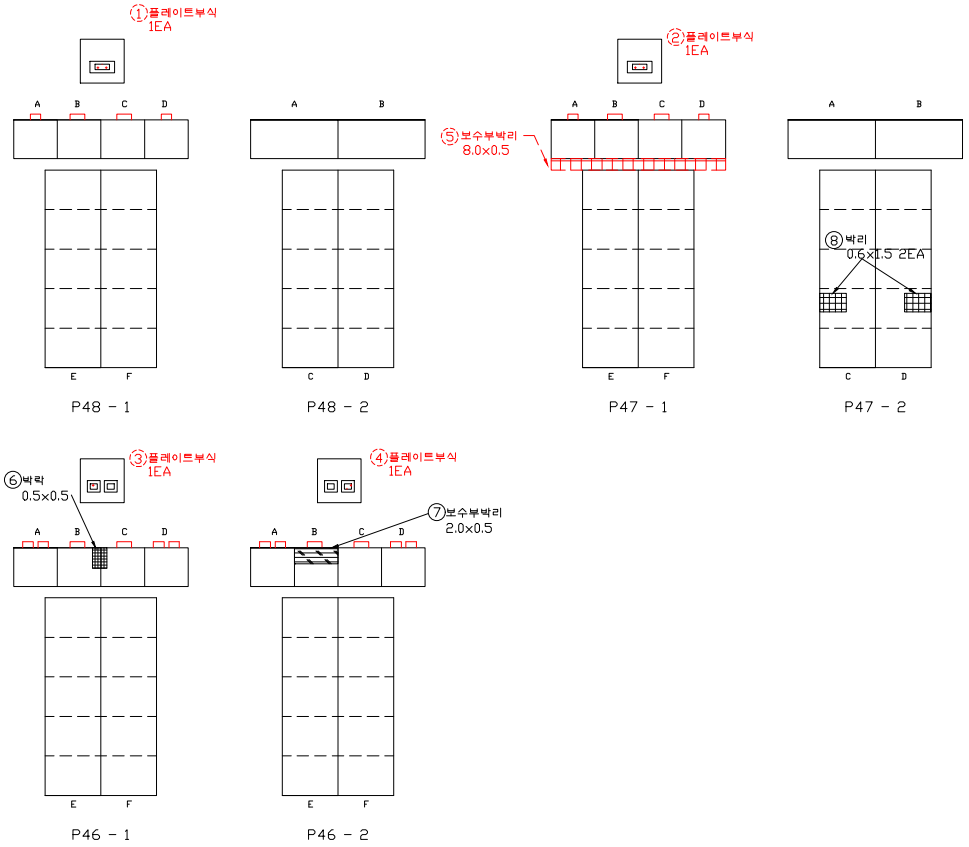


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2018	보수부박리	8.00	0.50		4.00	㎡	1.00					2
6	2019	박락	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00				신규	2
7	2019	보수부박리	2.00	0.50		1.00	㎡	1.00				신규	2
8	2019	박리	0.60	1.50		1.80	㎡	2.00				신규	2
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	135

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

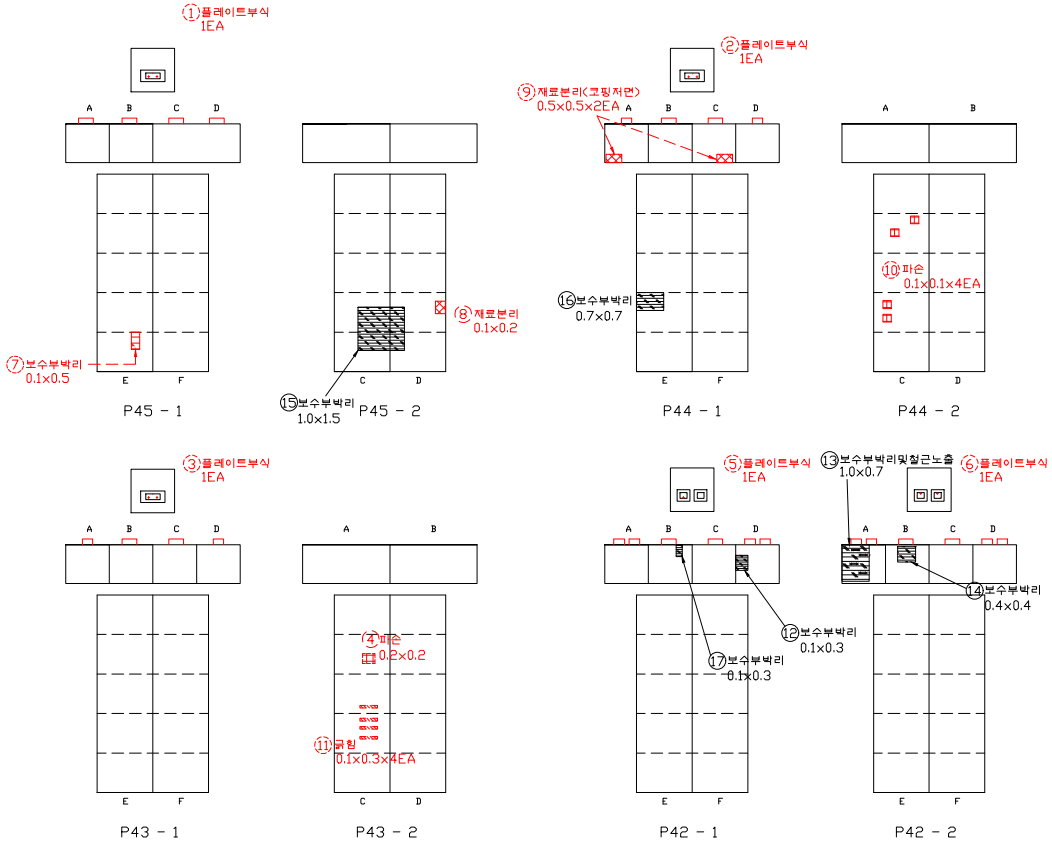


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2014	파손	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
7	2016	보수부 박리	0.10	0.50		0.05	㎡	1.00					2
8	2016	재료분리	0.10	0.20		0.02	㎡	1.00					2
9	2016	재료분리	0.50	0.50		0.50	㎡	2.00					2
10	2018	파손	0.10	0.10	10	0.04	㎡	4.00					2
11	2018	균열	0.10	0.03		0.12	㎡	4.00					2
12	2019	보수부박리	0.20	0.30		0.06	㎡	1.00				신규	2
13	2019	보수부박리 및 철근노출	1.00	0.70		0.70	㎡	1.00				신규	2
14	2019	보수부박리	0.40	0.40		0.16	㎡	1.00				신규	2
15	2019	보수부박리	1.00	1.50		1.50	㎡	1.00				신규	2
16	2019	보수부박리	0.70	0.70		0.49	㎡	1.00				신규	2
17	2019	보수부박리	0.10	0.30		0.03	㎡	1.00				신규	2
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	136

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

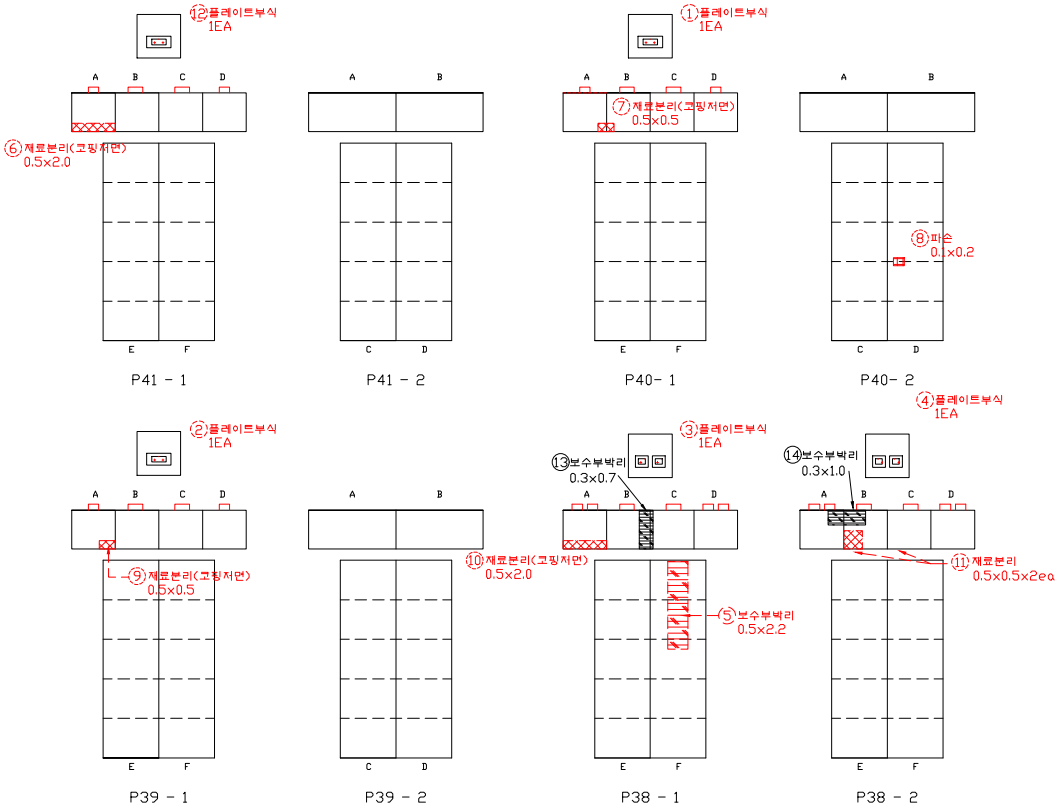


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2016	보수부박리	0.50	2.20		1.10	㎡	1.00					2
6	2016	재료분리	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
7	2016	재료분리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
8	2016	파손	0.10	0.20		0.02	㎡	1.00					2
9	2016	재료분리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
10	2016	재료분리	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
11	2018	재료분리	0.50	0.50		0.50	㎡	2.00					2
12	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
13	2019	보수부박리	0.30	0.70		0.21	㎡	1.00				신규	2
14	2019	보수부박리	0.30	1.00		0.30	㎡	1.00				신규	2
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	137

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

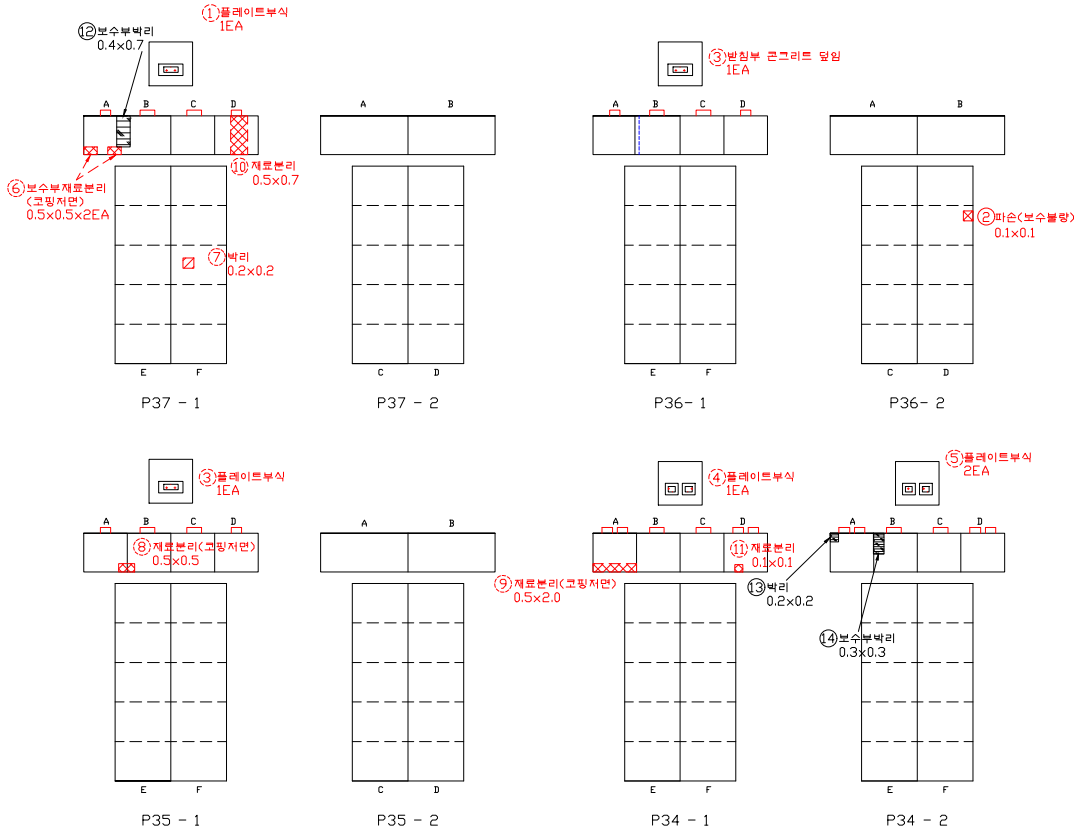


손 상 물 량 표

연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	깊이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2014	파손(보수불량)	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				2.00	EA	2.00					2
5	2011	플레이트 부식				2.00	EA	2.00					2
6	2016	보수부 재료분리	0.50	0.50		0.50	㎡	2.00					2
7	2016	박리	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00					2
8	2016	재료분리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
9	2016	재료분리	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
10	2018	재료분리	0.50	0.70		0.35	㎡	1.00					2
11	2018	재료분리	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00					2
12	2019	보수부박리	0.40	0.70		0.28	㎡	1.00				신규	2
13	2019	박리	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00				신규	2
14	2019	보수부박리	0.30	0.30		0.09	㎡	1.00				신규	2
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													


점 검 · 보 수 범 례

———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	138

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

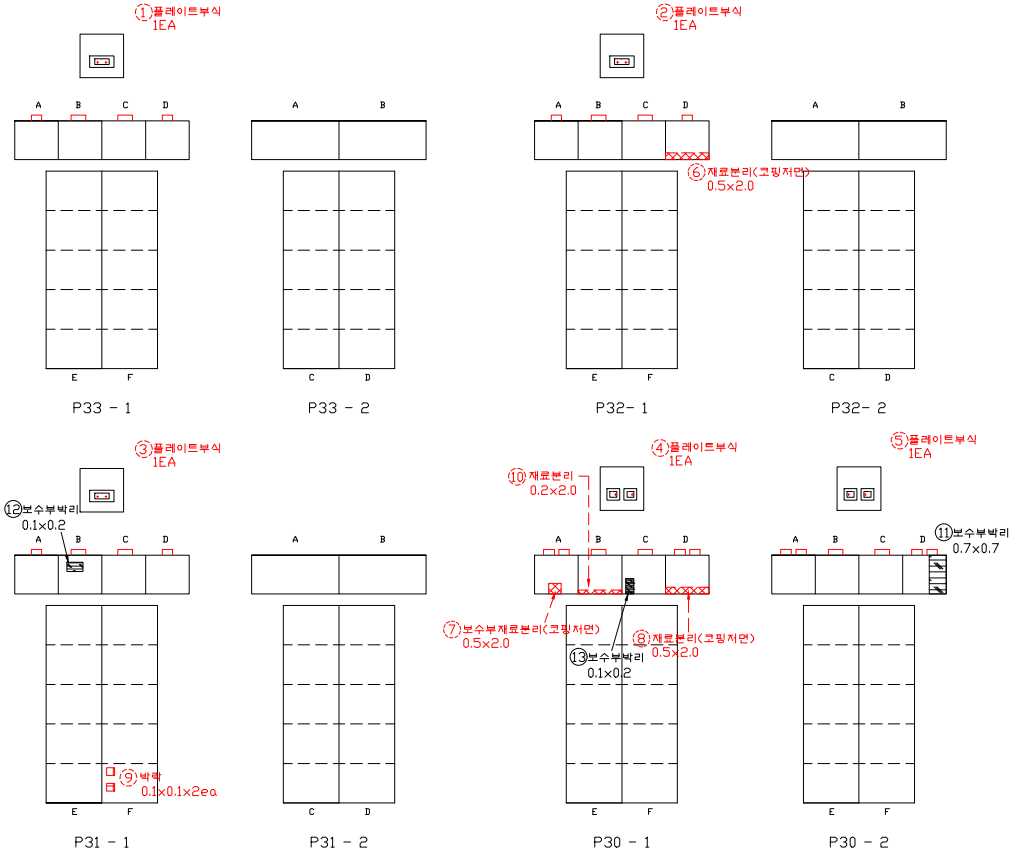


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
5	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
6	2016	재료분리	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
7	2016	보수부 재료분리	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
8	2016	재료분리	0.50	2.00		1.00	㎡	1.00					2
9	2018	박락	0.10	0.10		0.02	㎡	2.00					2
10	2018	재료분리	0.20	2.00		0.40	㎡	1.00					2
11	2019	보수부박리	0.70	0.70		0.49	㎡	1.00				신규	2
12	2019	보수부박리	0.10	0.20		0.02	㎡	1.00				신규	2
13	2019	보수부박리	0.10	0.20		0.02	㎡	1.00				신규	2
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역						
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08	
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열	
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환	
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	139	

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

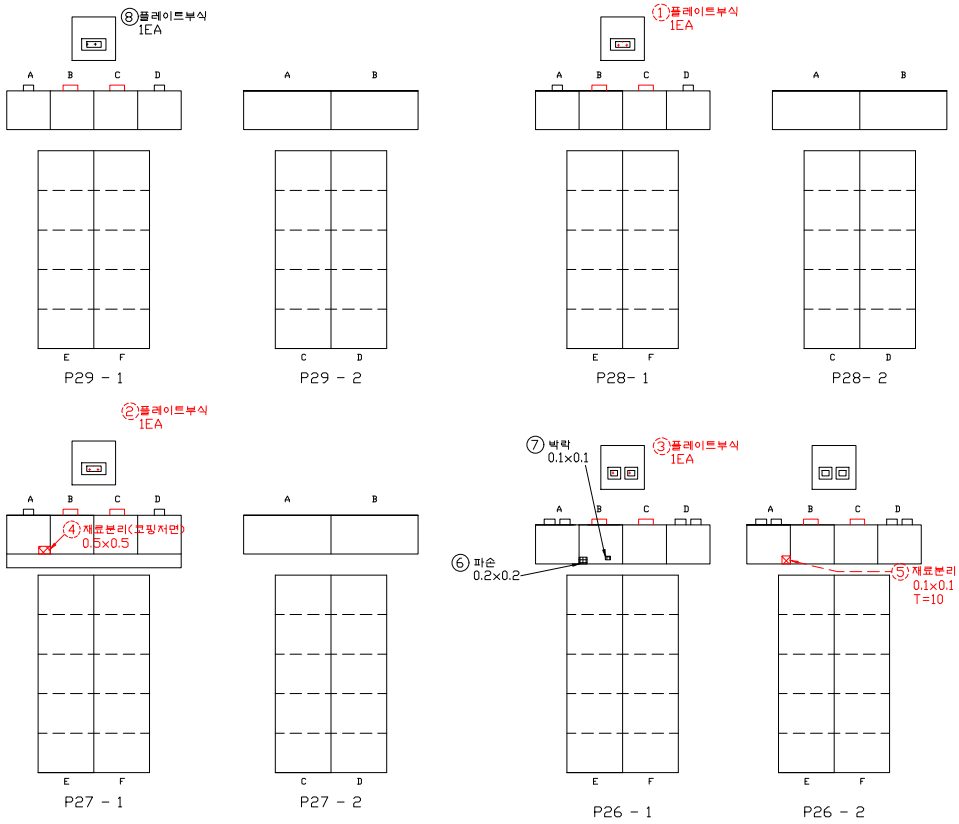


손 상 물 량 표


연번	작성년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
3	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
4	2016	재료분리	0.50	0.50		0.25	㎡	1.00					2
5	2018	재료분리	0.10	0.10	10	0.01	㎡	1.00					2
6	2019	파손	0.20	0.20		0.04	㎡	1.00				신규	2
7	2019	박락	0.10	0.10		0.01	㎡	1.00				신규	2
8	2019	플레이트 부식				1.00	EA	1.00				신규	2
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN




SECTION




용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	140

ID : 도림천4복개 2련 / 교각

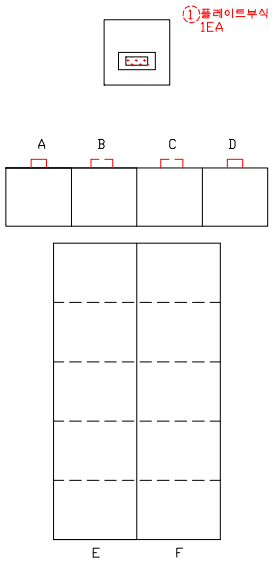

P25 - 1

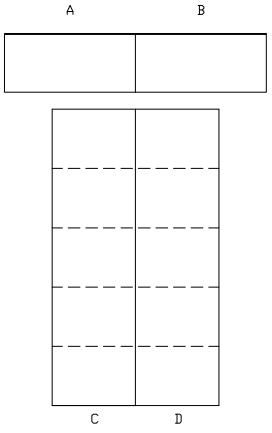


P25 - 2

손 상 물 량 표


연번	작출년도	결 함 종 류	결 함 규 모						최종보수내역			비고	보수순위
			폭 (㎜)	길이 (m)	깊이 (㎜)	물량	단위	개소	년월	공법명/자재명	물량		
1	2011	플레이트 부식				1.00	EA	1.00					2
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													

점 검 · 보 수 범 례	
———	금회차 손상
- - - - - - - -	전회차 미보수
- - - - - - - -	전회차 보수완료

KEY PLAN



SECTION



용 역 명	도림천4복개 외 2개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역					
범례	균열	망상균열	이물질퇴적	열화	조사일시	2019.04 ~ 2019.08
	파손,탈락 박리,박락	철근노출	철근부식	좌굴,변형	조 사 자	박기열
	들뜸	백태,결로	재료분리	소성변형	확 인 자	이승환
	부식	누수,습윤	배수구막힘	보수	도면번호	141


2. 보수공법

균 열 보 수 공 법 (건 식)


1. 개 요

■ 상판의 균열부에 에폭시 수지를 주입하고 콘크리트와의 일체를 꾀함.
■ 도로를 전면 공용 시공 가능
■ 상판의 방수성 향상
■ 콘크리트 노화방지
■ 철근의 방청 효과
■ 내하력 증대 효과 기대할 수 없음


1) 바 탕 처 리




2) 시일작업 및 주입파이프 설치



3) 수 지 주 입



4) 주입파이프 철거 및 표면 마무리



2. 시 공 방 법

바 탕 처 리
- ● 균열면의 유리석회 제거
- ● 먼 지 제 거
- ● 기름 부착 제거

⇩

주입파이프 설치 및 시일링
- ● 수성 에폭시계 수지로 주입파이프 고정
- ● 주입파이프 사이의 균열부위의 시일링 1~2일 양생

⇩

수 지 주 입
- ● 주입파이프 절단
- ● 그라인더 등으로 표면 마무리

3. 주 의 사 항

■ 주입 압력이 너무 크면 균열이 확대되어 버린다.

* 평균 주입압
- 수동식 : 4kg/㎠
- 폐달식 : 15kg/㎠
- 전동식 : 20kg/㎠
- 자동식 : 4kg/㎠

■ 시공시의 기온은 일반적으로 10~30℃, 콘크리트 균열표면의 온도는 10℃를 표준으로 한다

■ 에폭시계 수지는 항상 냉암소에 밀봉보관하여야 하며, 제조 후 6개월이상 경과한 것은 다시 시험하여 품질의 변질여부 확인

<균열이 작은 경우와 큰 경우(0.3mm이상)의 시공법 비교>


균열의 폭	작은 경우	큰 경우
파이프 설치 간격	20~30㎝	20~50㎝
파이프 종류	Washer 파이프	일반 파이프
균열부 V커트 방법		V커트 (폭=3~5㎝, 깊이=3~5㎝)
파이프 부착방법		

균 열 보 수 공 법 (습 식)


1. 개 요

- 균열부에 에폭시 수지를 주입하고 콘크리트와의 일체를 꾀함.
- 구체의 방수성 향상.
- 콘크리트의 노화 방지.
- 철근의 방청 효과.

2. 시공 방법

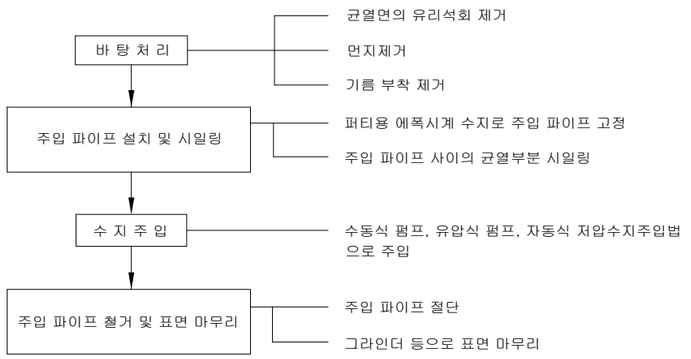

1) 바탕 처리




균열면의 유리석회 제거

먼지 제거

기름 부착 제거


2) 시일 작업 및 주입파이프 설치



퍼티용 에폭시계 수지로 주입파이프 고정

WP200 Epoxy Putty 씰링

3) 수지 주입




WG100 Epoxy 주입

수동식 펌프, 유압식 펌프, 자동식 저압수지주입법

으로 주입

4) 주입파이프 철거 및 표면 마무리





주입파이프 절단

그라인더 등으로 표면 마무리

3. 주의 사항

- 주입 압력이 너무 크면 균열이 확대 되어 버린다.
- 평균 주입압
  - 수동식 : 4kg/cm^2
  - 폐달식 : 15kg/cm^2
  - 전동식 : 20kg/cm^2
  - 자동식 : 4kg/cm^2
- 시공시의 온도는 일반적으로 10 ~ 30°C , 콘크리트 균열 표면의 온도는 10°C를 표준.
- 에폭시계 수지는 항상 냉암소에 밀봉보관하여야 하며, 제조후 6개월 이상 경과한 것은 다시 시험하여 품질의 변질여부 확인.

균열이 작은 경우와 큰 경우(0.3mm이상)의 시공법 비교

구 분	TYPE - A	TYPE - B
파이프 부착 공법		
균열부 V커트 방법		V 커트 (폭=3~5Cm 길이=3~5Cm)
파이프 종류	WASHER 파이프	일반 파이프
파이프 설치 간격	20 ~ 30Cm	20 ~ 50Cm
균 열 의 폭	0.3mm 미만	0.3mm 이상

◈ 주입팩카 설치(②) 상세도

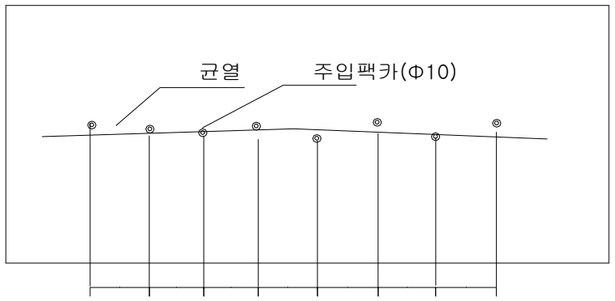


표 면 처 리 보 수 공 법


1. 개 요

콘크리트표면에 미세한 균열이
많이 있는 경우에 인력으로
균열이 정지된 상태의 미세균열을
단순히 표면처리하여 보수

2. 시공 흐름도



3. 시공개요도

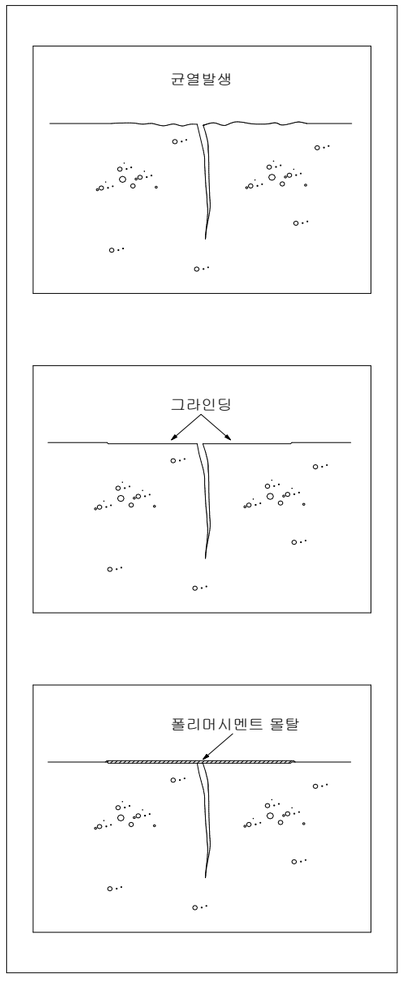

백 태 보 수 공 법

1. 개 요

콘크리트의 석회분인 백색 염출물이 형성된 부위나, 유입수의 동결작용으로 인한 팝아웃이 생긴 부위에 백태를 정리한 후 급결시멘트를 첨가한 접착강화제를 도포하여 표면을 강화시켜 보수하는 공법

2. 시공방법 및 유의사항

① 작업전 충분한 안전교육을 실시하고 개인 안전장구 착용여부를 반드시 확인한다.

② 기온이 5℃이하에서는 작업을 중지하여야 한다.

③ 기존 콘크리트의 백태부분은 그라인더를 이용하여 표면처리하고 깨끗이 청소한다.

④ 백태제거제는 주제와 경화재를 중량비에 의해 배합한다.

⑤ 기존 콘크리트 표면에 백태제거제를 고르게 도포한다.

⑥ 백태제거제 도포 후 2시간 정도 건조시킨 후 후속작업을 실시한다.

⑦ 콘크리트 탄산화 방지 및 방수를 위하여 탄산화 및 방수재를 도포한다.

3. 시공 흐름도



단 면 복 구 보 수 공 법

1. 개 요

* 폴리머계 몰탈로 단면을 복구하는 공법으로 콘크리트의 침식, 파손 및 부식, 박리 등 결함부위를 보수하기 위해 결함부를 제거한 다음 폴리머 몰탈로 보수하는 공법이다.

2. 시 공 방 법

콘크리트 손상 부위를 일정한 모양으로 면처리 ——— 햄머, 콘크리트 Breaker 등 사용

↓

이물질 제거 ——— 와이어 브러시 사용

↓

폴리머 몰탈로 파손부위 마감

↓

양　　생


↓


표면 마무리 ——— 그라인더 사용


3. 시공시 주의사항

* 폴리머 몰탈로 파손부위를 마감할 때에는 철근피복을 약 10mm이상 확보하여야 한다

4. 공법개요도







철 근 노 출 단 면 복 구 공 법

1. 개 요

* 폴리머계 몰탈로 단면을 복구하는 공법으로 콘크리트의 철근노출 및 부식, 박리 등 결함부위를 보수하기 위해 결함부를 제거한 다음 폴리머 몰탈로 보수하는 공법이다.

2. 시 공 방 법

콘크리트 손상 부위를 일정한 모양으로 면처리 ——— 햄머, 콘크리트 Breaker 등 사용

↓

이물질 제거 ——— 와이어 브러시 사용

↓

철근의 녹 제거, 방청제 도포

↓

폴리머 몰탈로 파손부위 마감

↓

양　　생


↓

표면 마무리 ——— 그라인더 사용

3. 시공시 주의사항

* 폴리머 몰탈로 파손부위를 마감할 때에는 철근피복을 약 10mm이상 확보하여야 한다

4. 공법개요도

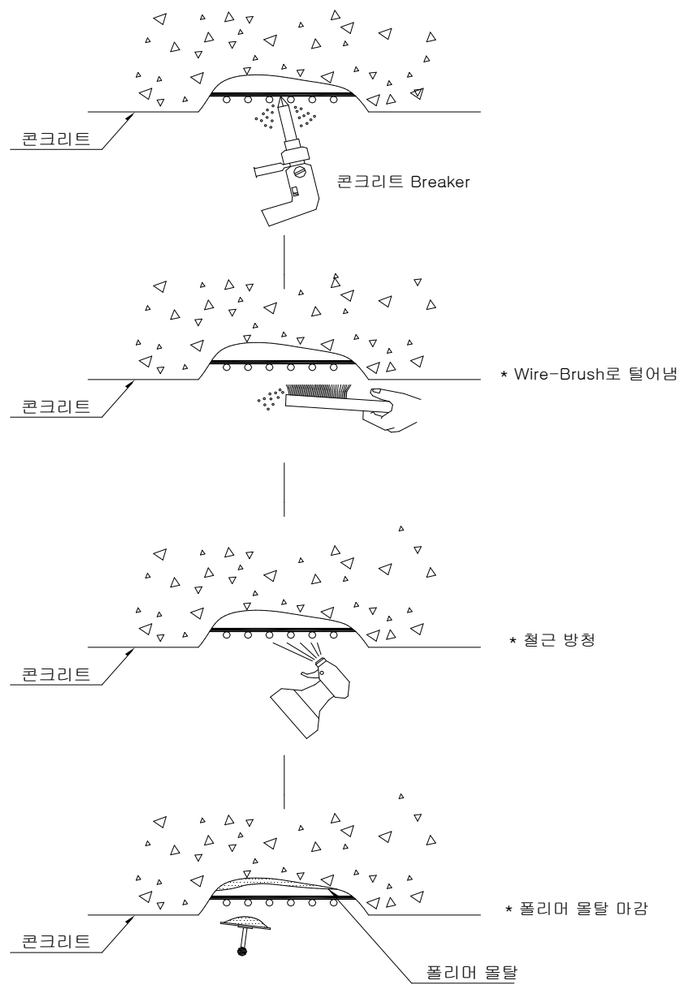

아스팔트 보수

● 아스팔트 팻칭 : 가열혼합식

일방향 균열과 망상균열이 발생된 부위가 조사되었으나 지속적인 관찰로서 손상의 건전여부를 확인하는 방법으로 유지관리하면 문제가 없을 것으로 보이지만 일부구간에서 아스콘 파손이 발생된 상태이므로 부분적인 보수가 필요하다. 가열 혼합식 공법에 의한 혼합물은 기존 포장과 부착이 좋고 내구성과 안정성이 우수하며 시공직후 안정되어 대형차 교통량이 많은 도로에 적합하다. 반면에 혼합물의 온도관리를 엄중히 하지 않아 온도가 떨어진 혼합물로 포설한 부분은 충분한 밀도가 얻어지지 않고 기존 포장과의 부착도 기대할 수 없게 된다. 따라서 혼합물의 운반에 있어 천막포 등으로 덮어 보온에 특히 주의하여 온도 강하를 방지해야 한다.

가. 사용재료

① 핸드 브레이커 또는 콘크리트 커트, 버너
② 아스팔트 유제 (PA-4, PK-4, 아스팔트(100~200), 스트레이트)
③ 전압기계

나. 유의사항

① 포장의 절취는 바닥판까지 행하며 손상이 가지 않도록 주의한다.
② 택 코우트는 상판면 뿐만아니라 측면까지 구석구석 잘 도포한다.
③ 마무리면은 주변의 포장표면과 같이 되도록 시공한다. 포설시의 성토여유높이는 다짐시의 혼합물 온도가 적당할 경우 두께 3㎝에 대하여 1㎝의 비율로 포설하면 좋다.

다. 시공순서

① 파손부 주위의 불량부분을 브레이크나 콘크리트 커트 등으로 장방형이나 수직으로 절취한다.
② 내측과 주위에 있는 먼지와 부스러기를 깨끗이 청소한다.
③ 젖어있는 경우는 버너 등을 사용하여 가열 건조시킨다.
④ 택코우트를 실시한다.
⑤ 가열 혼합물을 투입하여 고르게 편다.
⑥ 전압기계를 사용하여 다진다.
⑦ 표면온도가 손으로 댈 수 있을 정도가 되면 석분이나 가는 모래를 얇게 살포하고 교통을 개방한다.

