여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+000m ~ 0+020m)





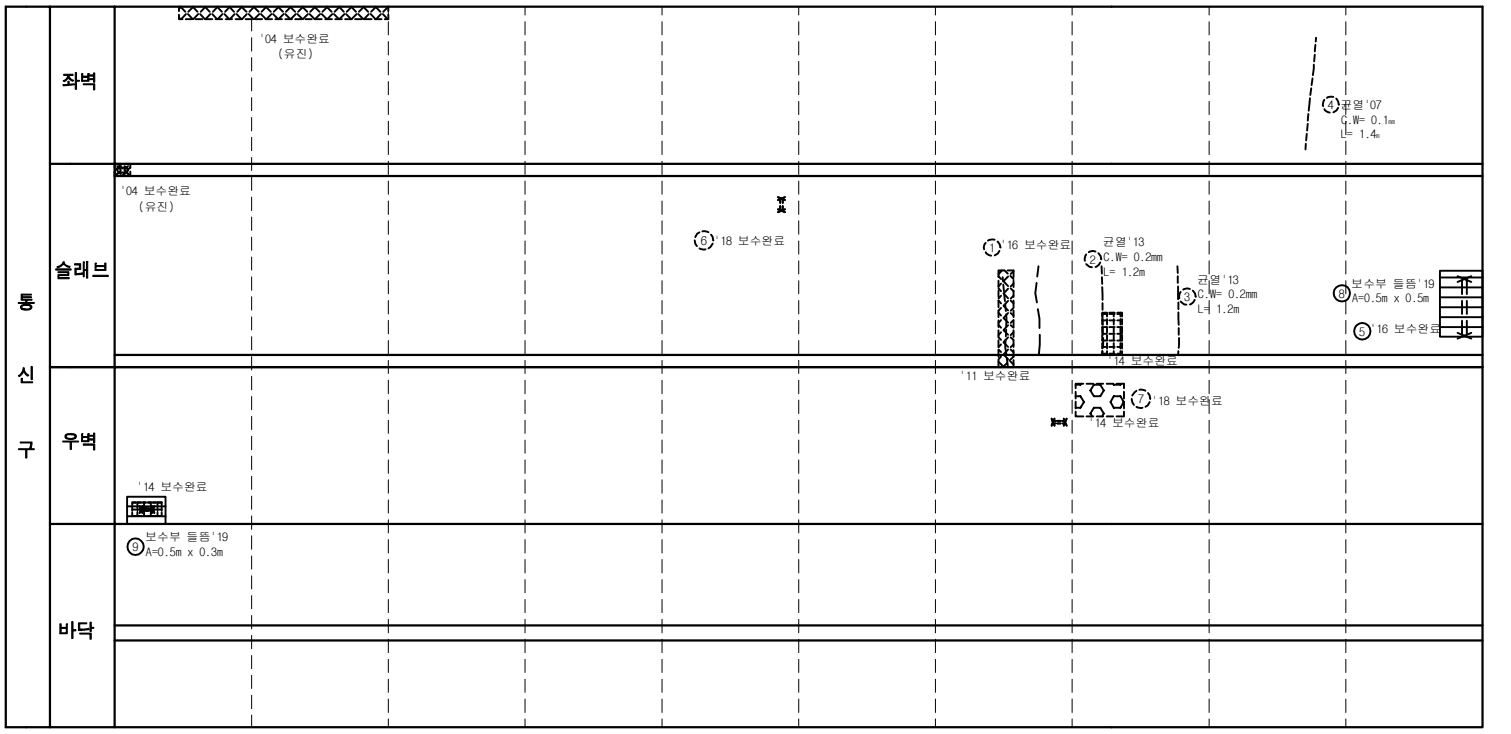

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.2	1.00		1.00	m	1	2016	표면처리공법	1.20	
2	2013	균열	0.2	1.20		1.20	m	1			-	
3	2013	균열	0.2	1.20		1.20	m	1			-	
4	2007	균열	0.1	1.40		1.40	m	1			-	
5	2015	철근노출	0.5	1.00		0.50	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.60	
6	2017	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.02	
7	2017	누수	1.0	1.00		1.00	㎡	1	2018	표면누수보수	1.20	
8	2019	보수부 들뜸	0.5	0.50		0.25	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.30	재결함
9	2019	보수부 들뜸	0.5	0.30		0.15	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+020m ~ 0+040m)





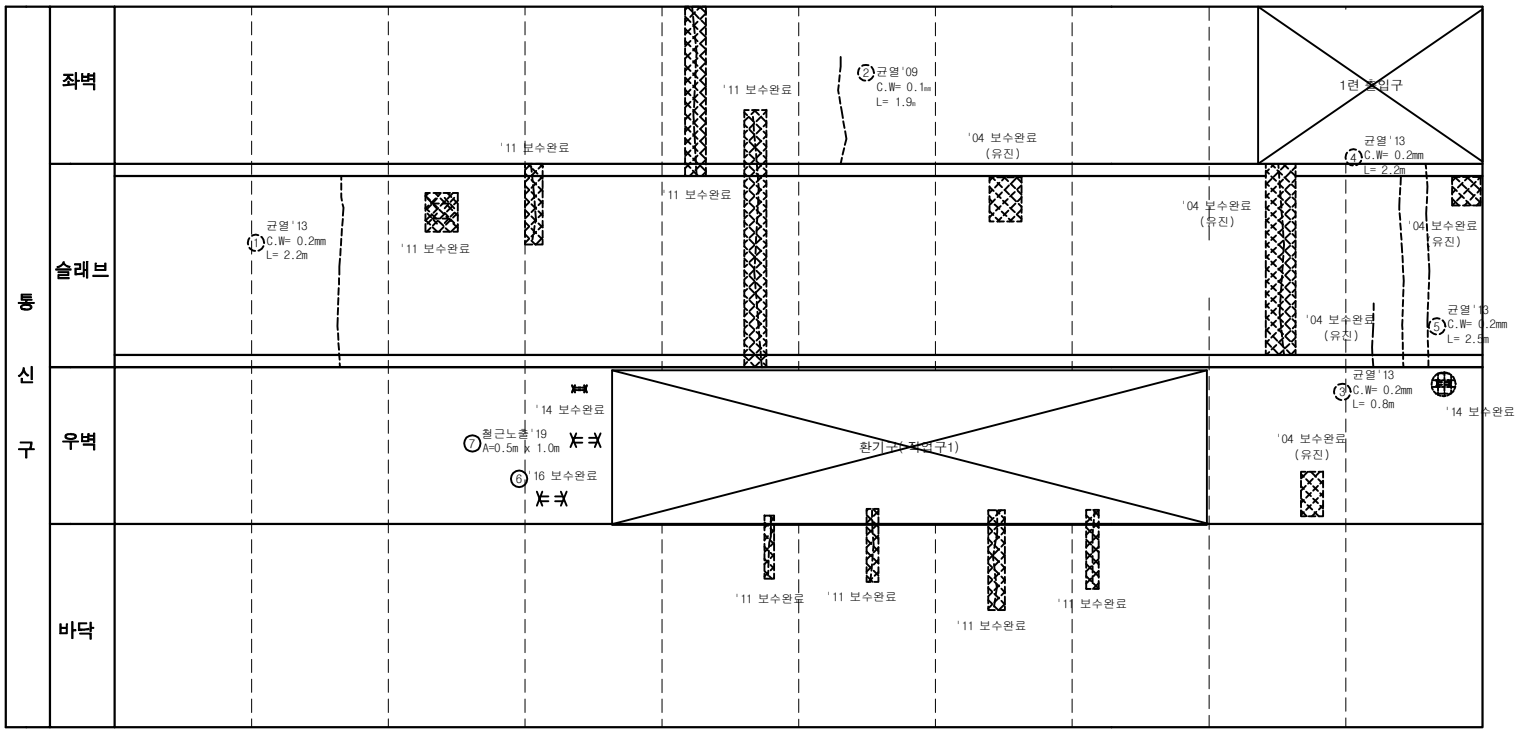

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.2	2.20		2.20	m	1			-	
2	2009	균열	0.1	1.90		1.90	m	1			-	
3	2013	균열	0.2	0.80		0.80	m	1			-	
4	2013	균열	0.2	2.20		2.20	m	1			-	
5	2013	균열	0.2	2.50		2.50	m	1			-	
6	2015	철근노출				0.08	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.10	
7	2019	철근노출	0.5	1.00		0.50	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 작업구 1번 (순환선 28m)

KEYPLAN

SECTION

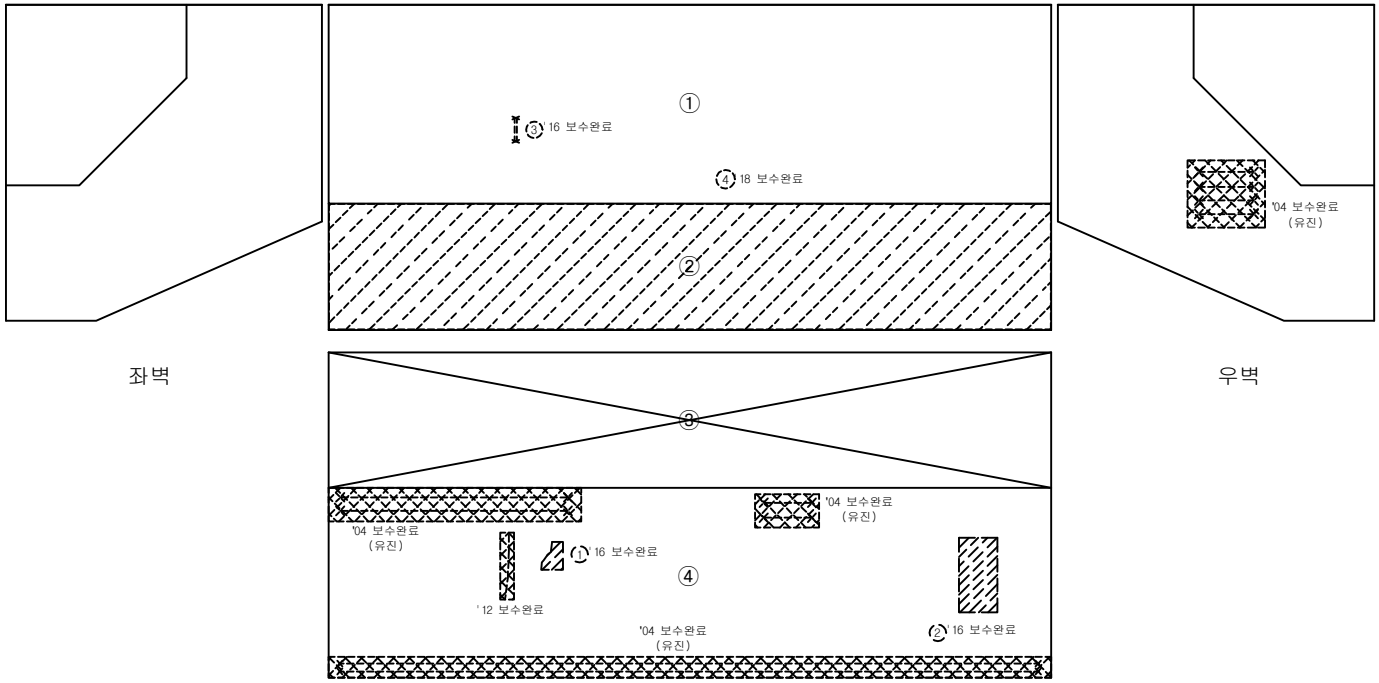

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	표면열화	0.4	1.00		0.40	㎡	1	2016	표면처리공법	0.48	
2	2013	표면열화	0.6	1.20		0.72	㎡	1	2016	표면처리공법	0.86	
3	2013	철근노출	0.1	0.30		0.03	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.04	
4	2017	재료분리,표면열화	5.0	2.00		10.00	㎡	1	2018	단면복구공법	12.0	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **작업구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+040m ~ 0+060m)





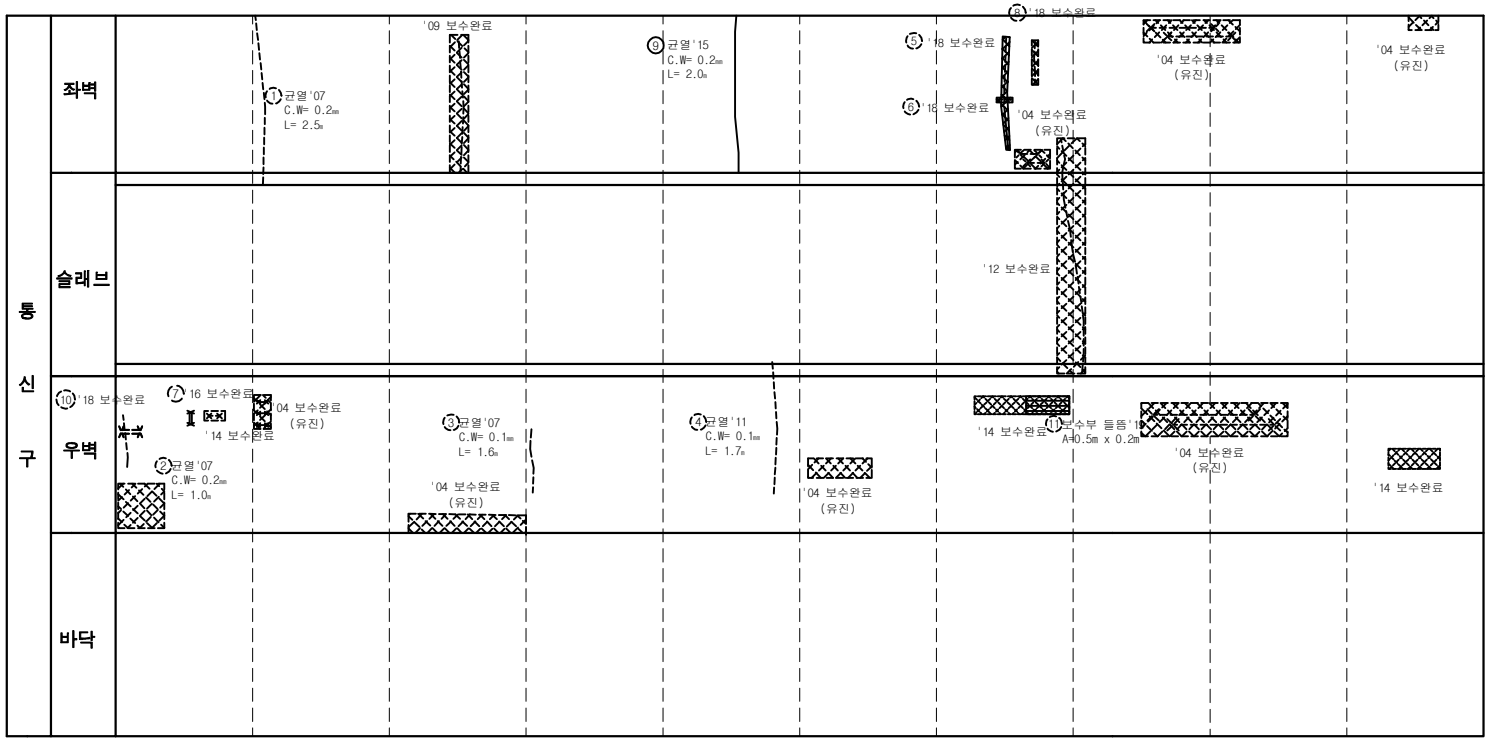

손 상 물 량 표

연번	적용년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	2.50		2.50	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	
3	2007	균열	0.1	1.60		1.60	m	1			-	
4	2011	균열	0.1	1.70		1.70	m	1			-	
5	2007	균열	0.2	0.60		0.60	m	1	2018	표면처리공법	0.72	
6	2007	균열	0.1	0.80		0.80	m	1	2018	표면처리공법	0.96	
7	2011	철근노출	0.1	0.30		0.03	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.04	
8	2013	균열	0.1	0.60		0.60	m	1	2018	표면처리공법	0.72	
9	2015	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
10	2017	철근노출	1.0	0.40		0.40	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.48	
11	2019	보수부 들뜸	0.5	0.20		0.10	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+060m ~ 0+080m)





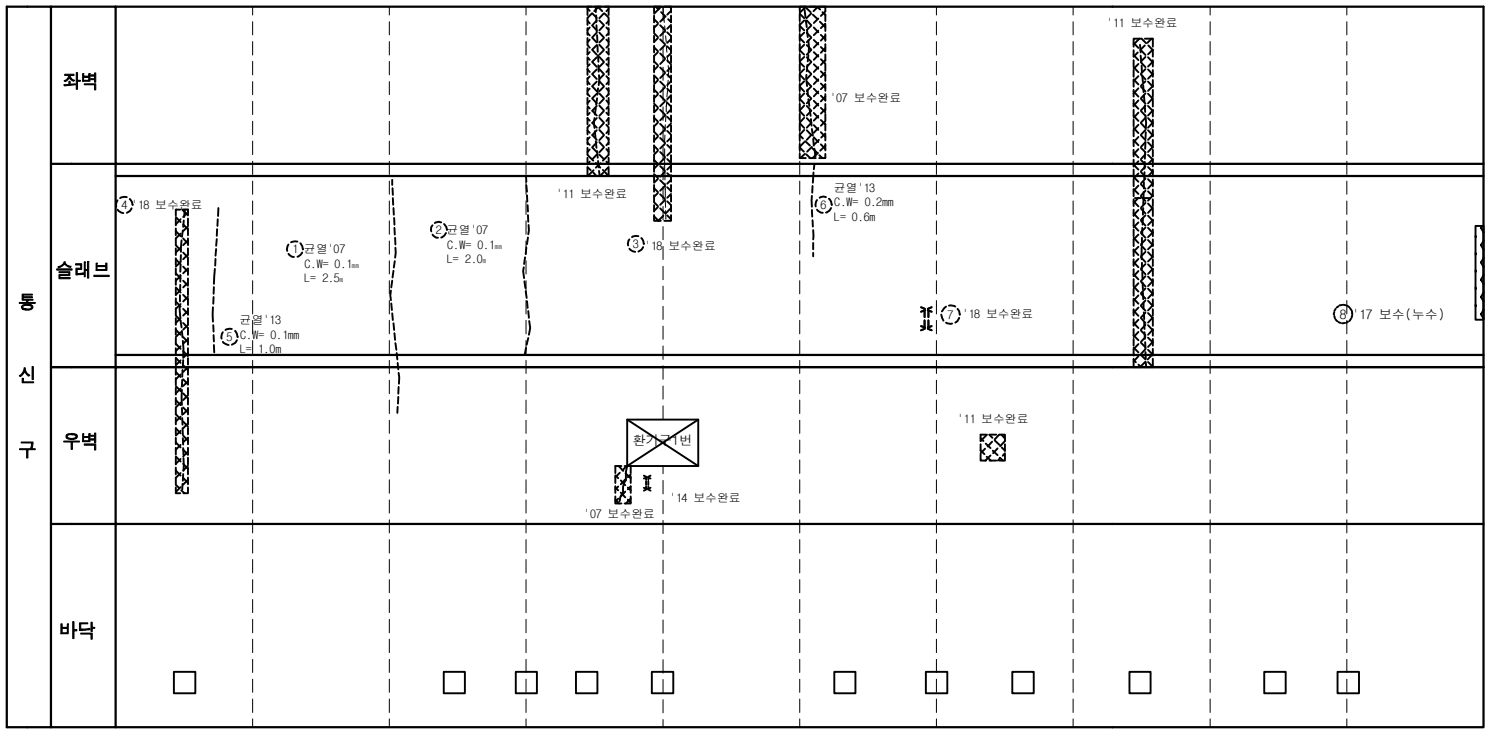

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.1	2.50		2.50	m	1			-	
2	2007	균열	0.1	2.00		2.00	m	1			-	
3	2011	균열	0.2	3.50		3.50	m	1	2018	표면처리공법	4.20	
4	2013	균열	0.1	3.30		3.30	m	1	2018	표면처리공법	3.96	
5	2013	균열	0.1	1.00		1.00	m	1			-	
6	2013	균열	0.2	0.60		0.60	m	1			-	
7	2017	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.02	
8	2017	누수				0.50	㎡	1	2017	누수보수공법	0.60	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

환기구 1번 (순환선 65m)

KEYPLAN

SECTION





천정



배면



좌벽



전면



우벽

손 상 물 량 표

연번	제품 년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT	TITLE OF SHIFT

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+080m ~ 0+100m)





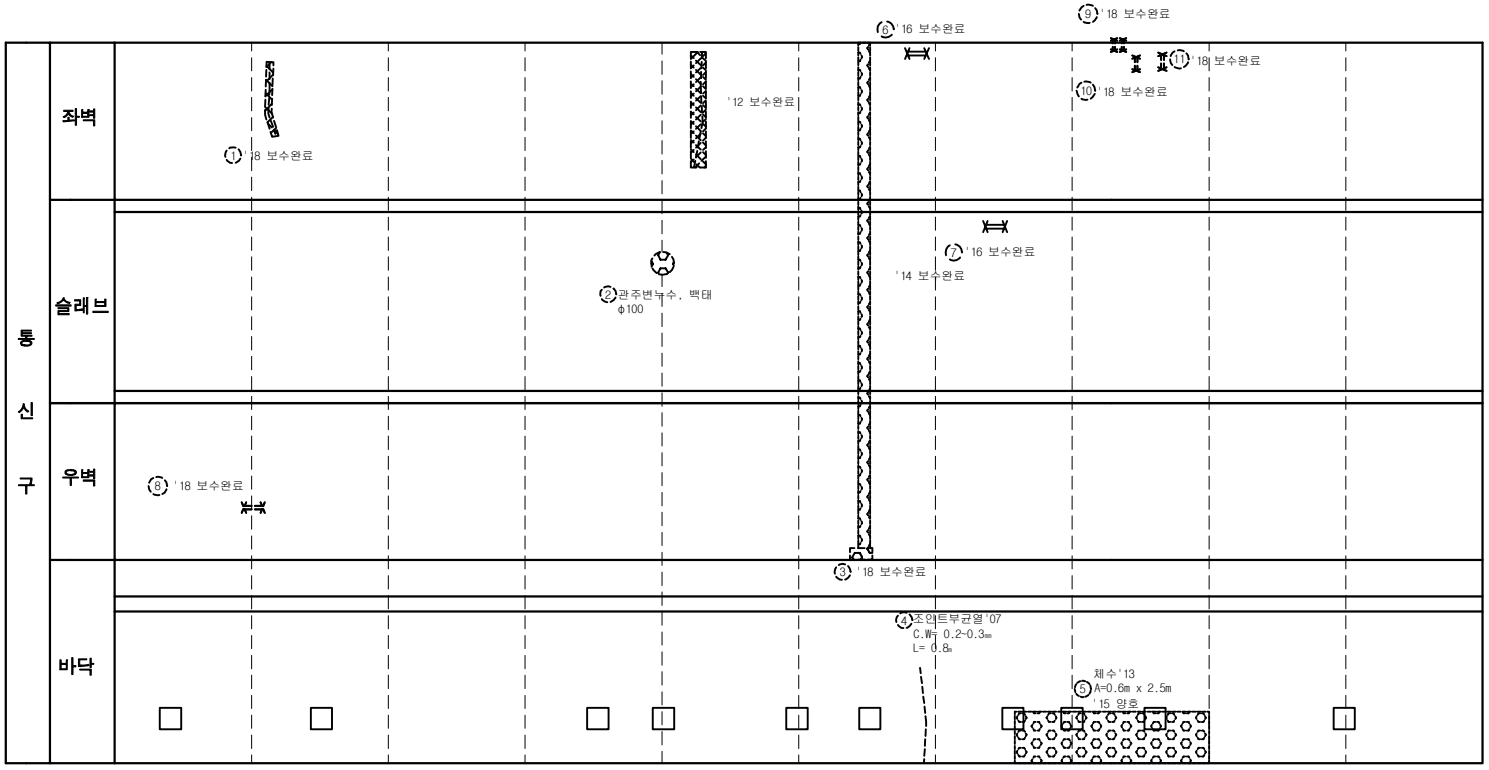

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	0.60		0.60	m	1	2018	표면처리공법	0.72	
2	2007	관주변누수,백태				1	EA	1			-	
3	2007	누수	0.2	0.30		0.06	㎡	1	2018	배면누수보수	0.07	
4	2007	균열	0.3	0.80		0.80	m	1			-	
5	2013	체수	0.6	2.50		1.50	㎡	1			-	
6	2015	철근노출	0.1	0.2		0.02	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.02	
7	2015	철근노출	0.1	0.1		0.01	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.01	
8	2017	철근노출	0.5	0.1		0.05	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.06	
9	2017	철근노출	0.1	0.3		0.06	㎡	2	2018	단면복구(방청)	0.07	
10	2017	철근노출	0.1	0.4		0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.05	
11	2017	철근노출	0.2	0.2		0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.05	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+100m ~ 0+120m)





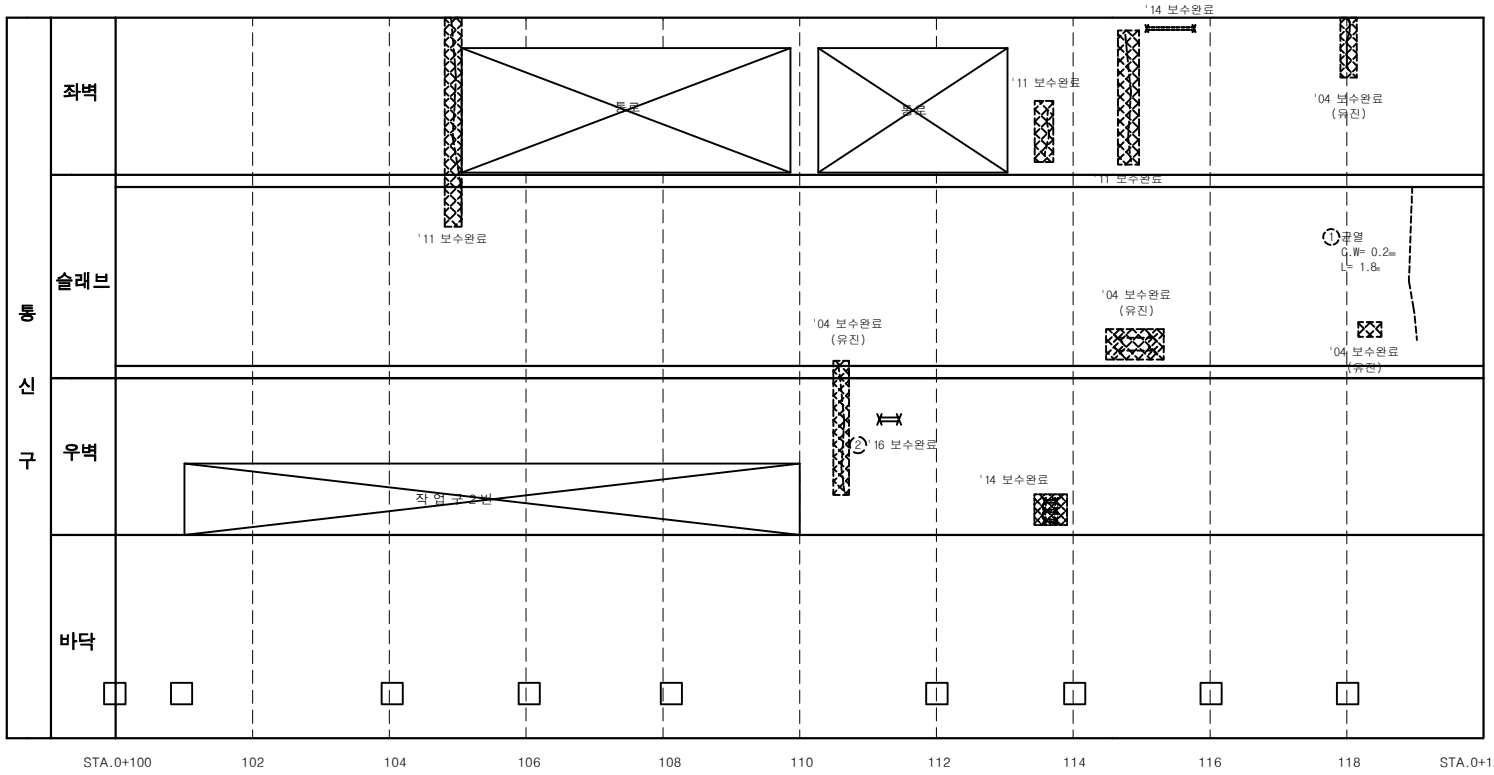

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	1.80		1.80	m	1			-	
2	2015	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.02	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 작업구 2번 (순환선 104m)

KEYPLAN

SECTION



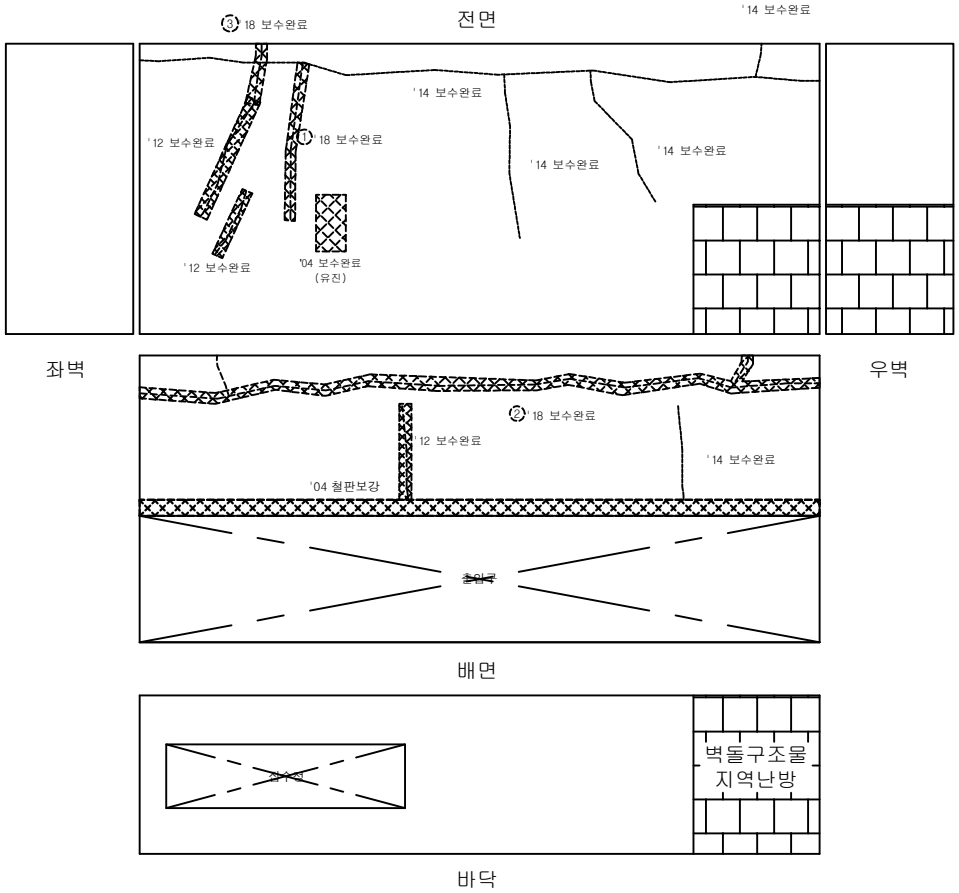

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.3	2.20		2.20	m	1	2018	주입보수공법	2.64	
2	2007	보수부 균열	2.0	6.50		6.50	m	1	2018	주입보수공법	7.80	
3	2013	균열	0.5	1.20		1.20	m	1	2018	주입보수공법	1.44	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **작업구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+120m ~ 0+140m)





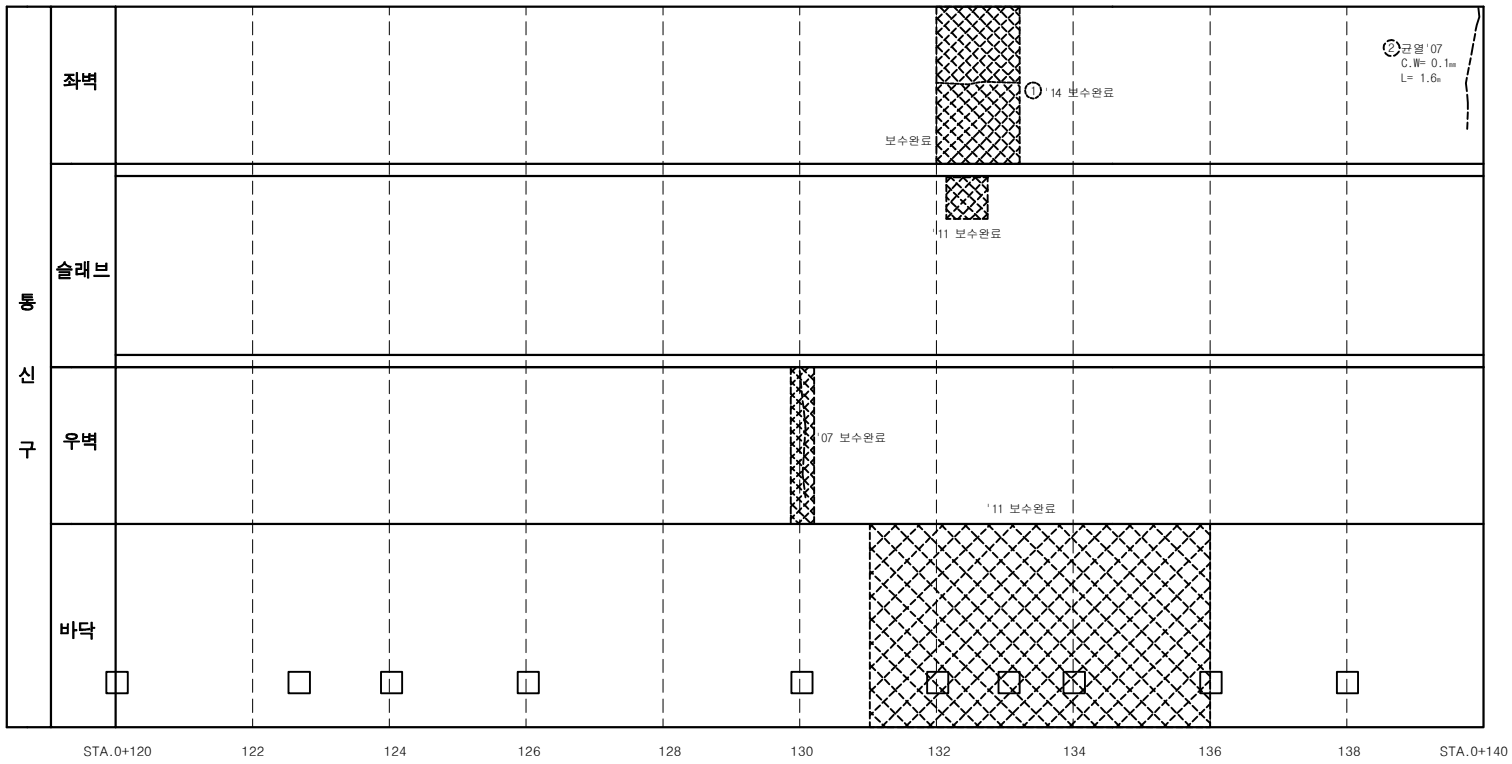

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.1	1.60		1.60	m	1	2016	표면처리공법	1.92	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+140m ~ 0+160m)





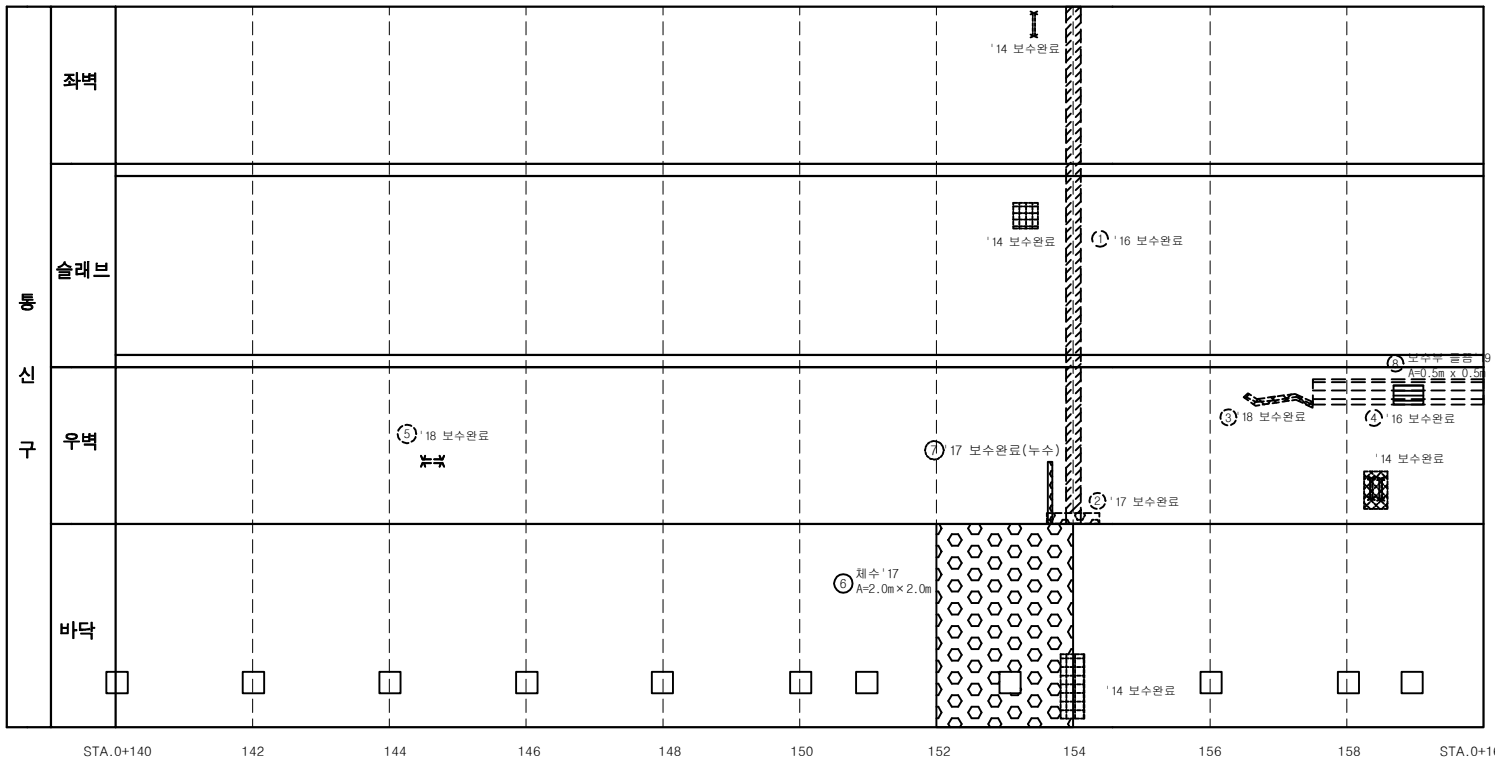

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	유도배수관 부식	0.2	7.00		1.40	㎡	1	2016	배수관교체	1.68	
2	2007	누수	0.2	0.10		0.02	㎡	1	2017	누수보수공법	0.02	
3	2007	누수 흔적	0.2	0.30		0.06	㎡	1	2018	누수보수공법	0.07	
4	2015	보수부 들뜸	0.3	1.50		0.45	㎡	1	2016	단면복구공법	0.54	
5	2017	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.02	
6	2017	체수(면재양호)	2.0	2.00		4.00	㎡	1			-	
7	2017	누수				0.50	m	1	2017	누수보수공법	0.60	
8	2019	보수부 들뜸	0.5	0.50		0.25	㎡	1	2016	단면복구공법	0.30	재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+160m ~ 0+180m)





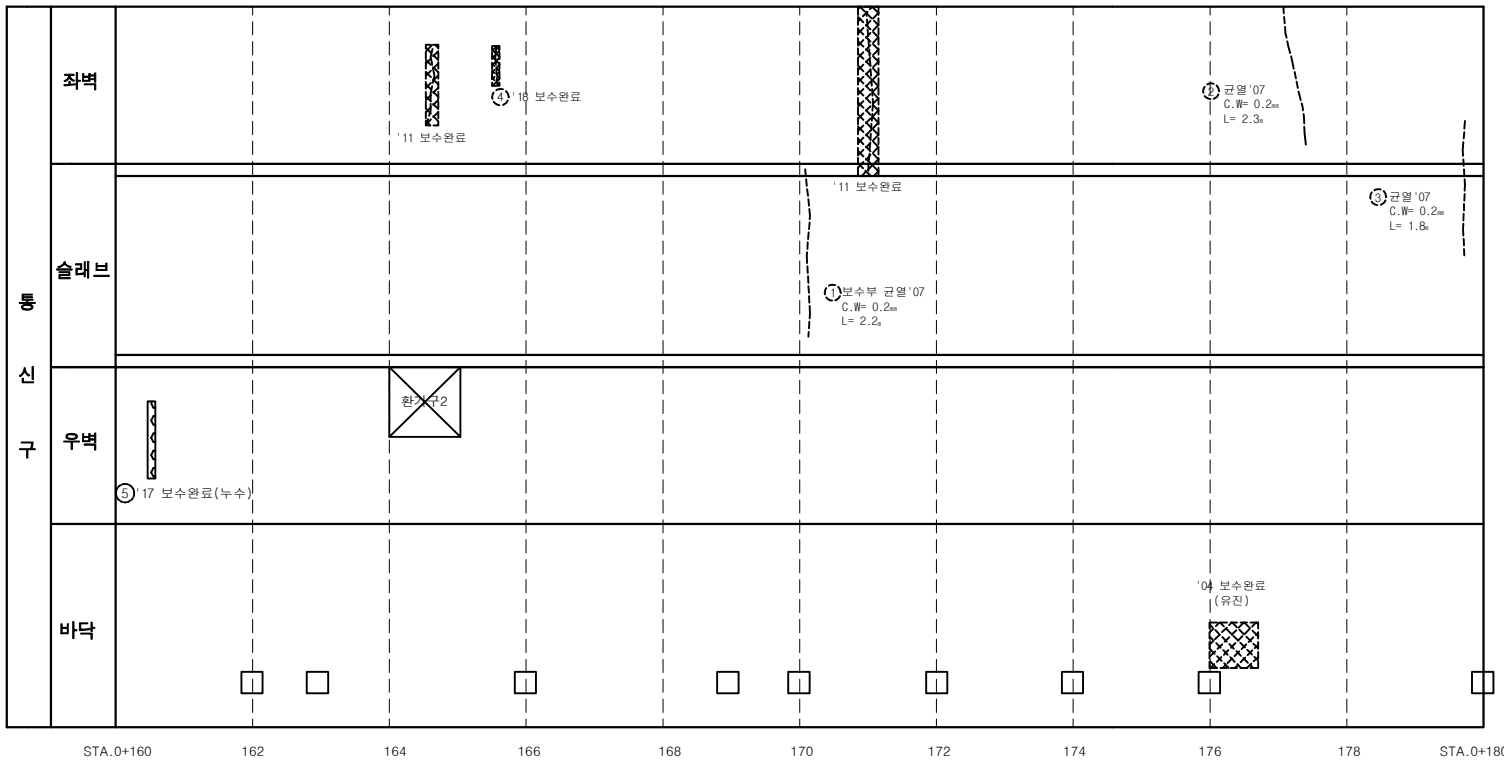

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	보수부 균열	0.2	2.20		2.20	m	1			-	재균열
2	2007	균열	0.2	2.30		2.30	m	1			-	
3	2007	균열	0.2	1.80		1.80	m	1			-	
4	2013	보수부 균열	0.1	0.6		0.6	m	1	2018	표면처리공법	0.72	
5	2017	누수				1.00	m	1	2017	누수보수공법	1.20	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

환기구 2번 (순환선 161m)

KEYPLAN

SECTION

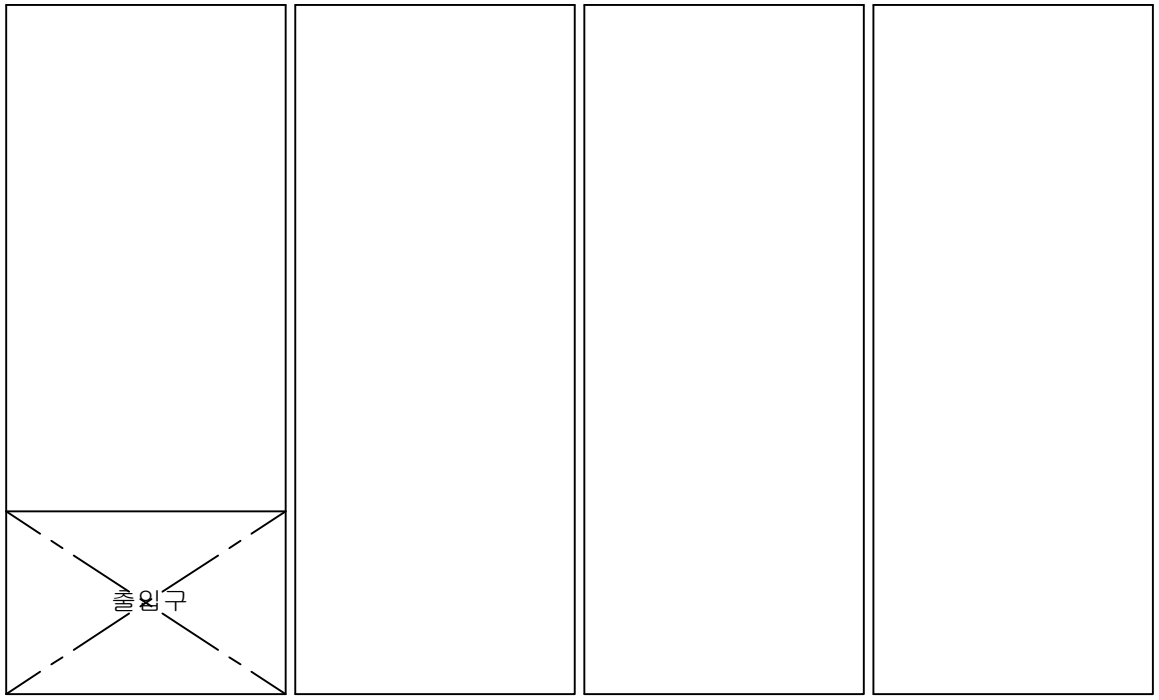

배면 좌벽 전면 우벽

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+180m ~ 0+200m)





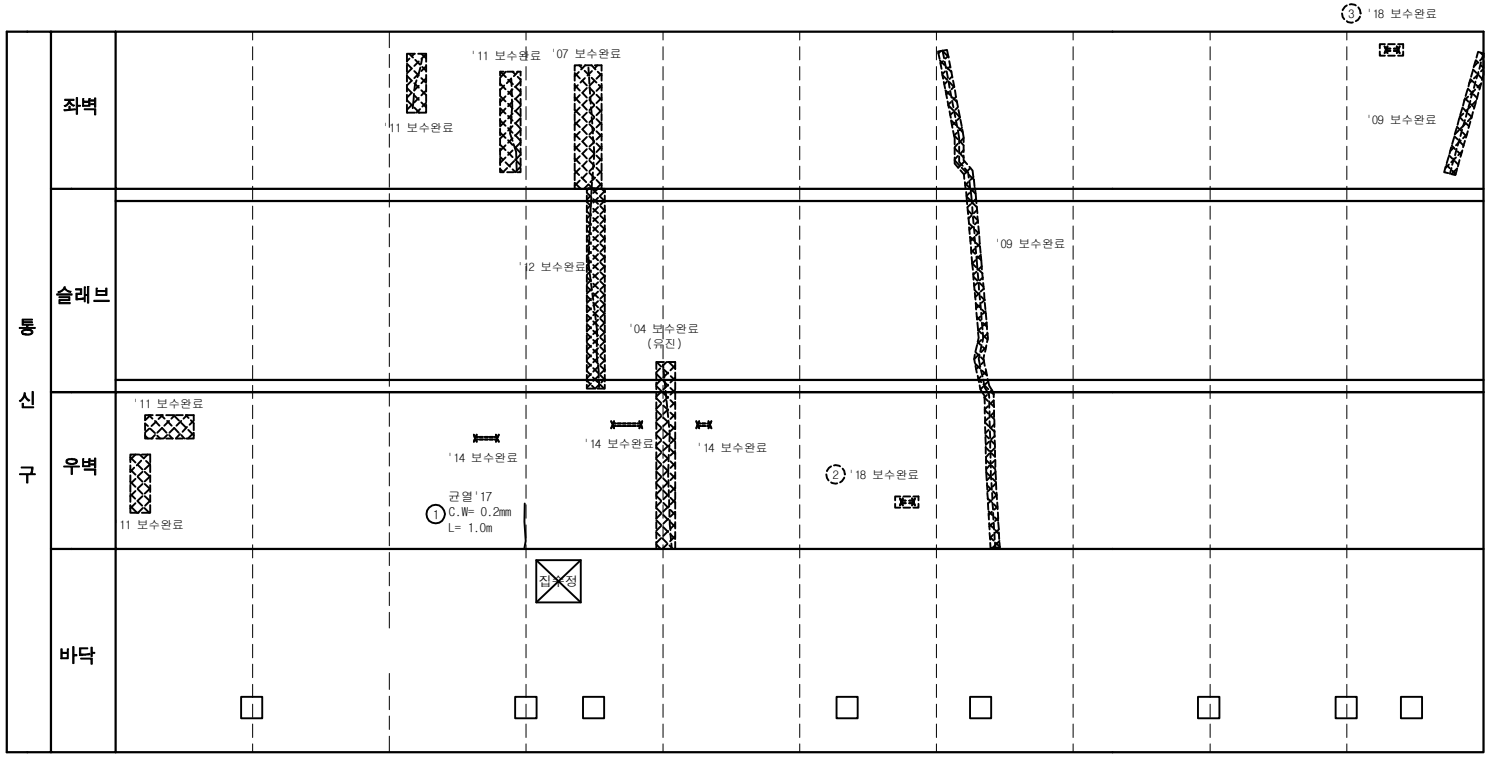

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2017	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	
2	2017	철근노출	0.2	0.20		0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.05	
3	2017	철근노출	0.5	0.40		0.20	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.24	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+200m ~ 0+220m)





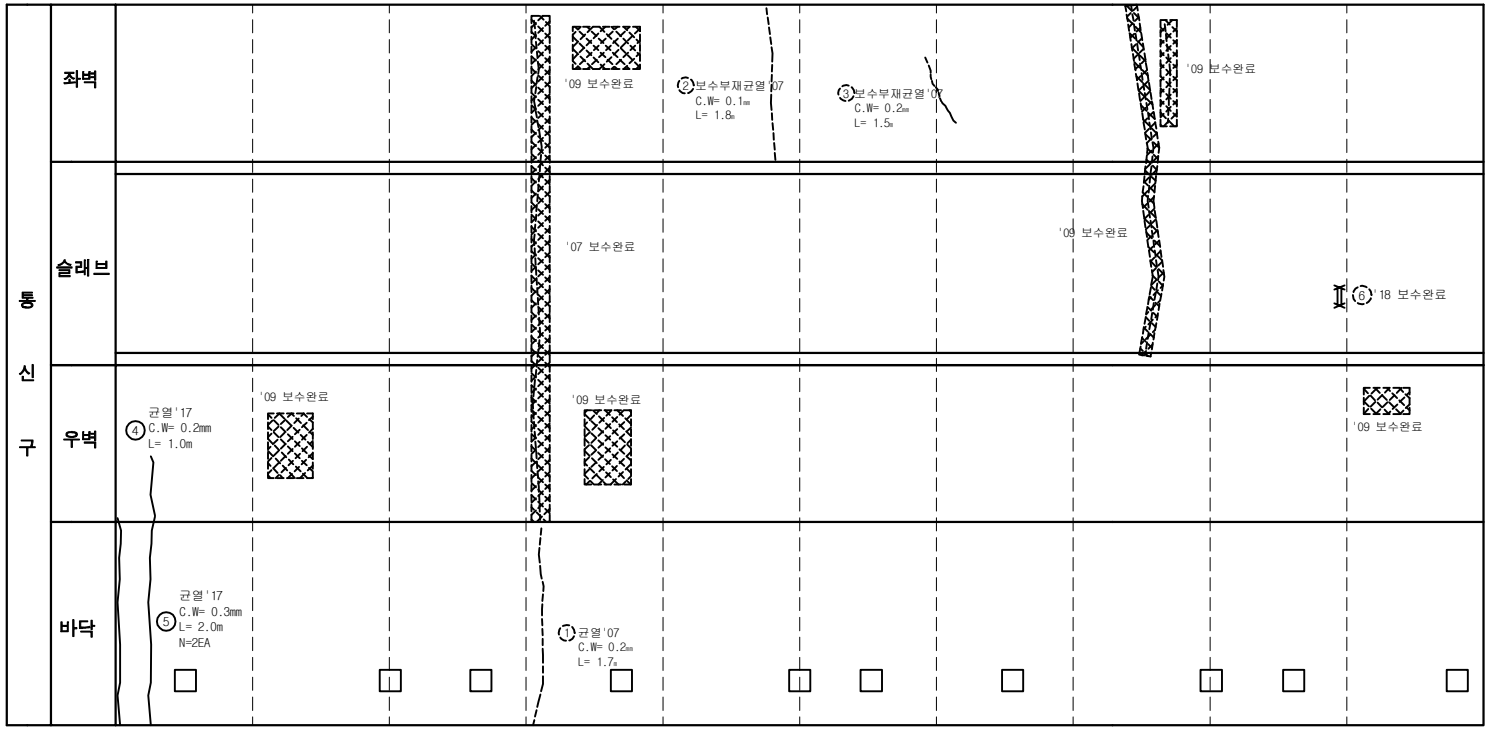

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	1.70		1.70	m	1			-	
2	2007	균열	0.1	1.80		1.80	m	1			-	
3	2007	균열	0.2	1.50		1.50	m	1			-	
4	2017	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	
5	2017	균열	0.3	2.00		4.00	m	2			-	중요
6	2017	철근노출	0.1	0.40		0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.05	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+220m ~ 0+240m)





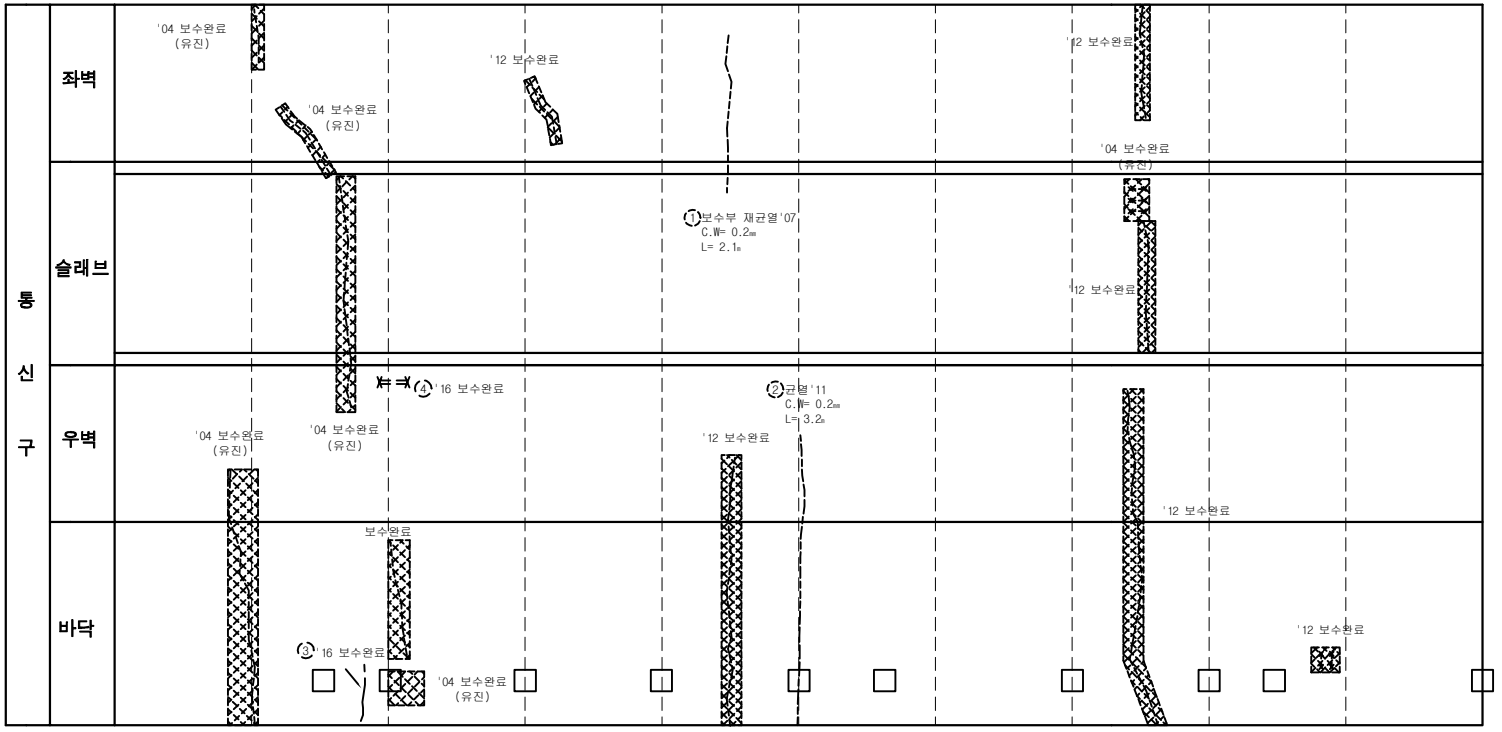

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	보수부 균열	0.2	2.10		2.10	m	1			-	재균열
2	2011	균열	0.2	3.20		3.20	m	1			-	
3	2015	균열	0.3	1.00		1.00	m	1	2016	주입보수공법	1.20	
4	2015	철근노출	0.2	0.4		0.08	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.10	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+240m ~ 0+260m)





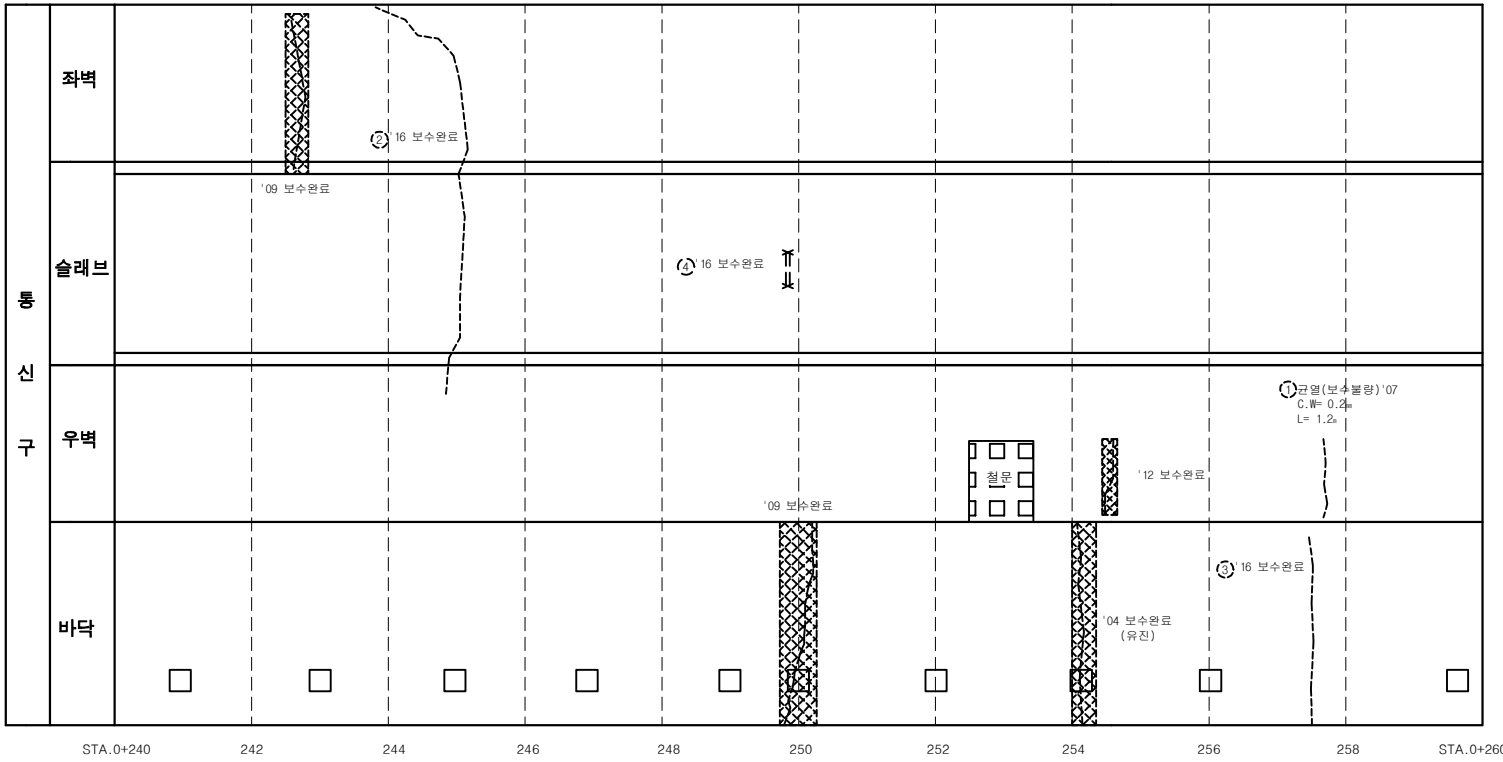

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	1.20		1.20	m	1			-	
2	2013	균열	0.3	4.50		4.50	m	1	2016	주입보수공법	5.40	
3	2013	균열	0.3	1.40		1.40	m	1	2016	주입보수공법	1.68	
4	2015	철근노출	0.2	0.50		0.10	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.12	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+260m ~ 0+280m)





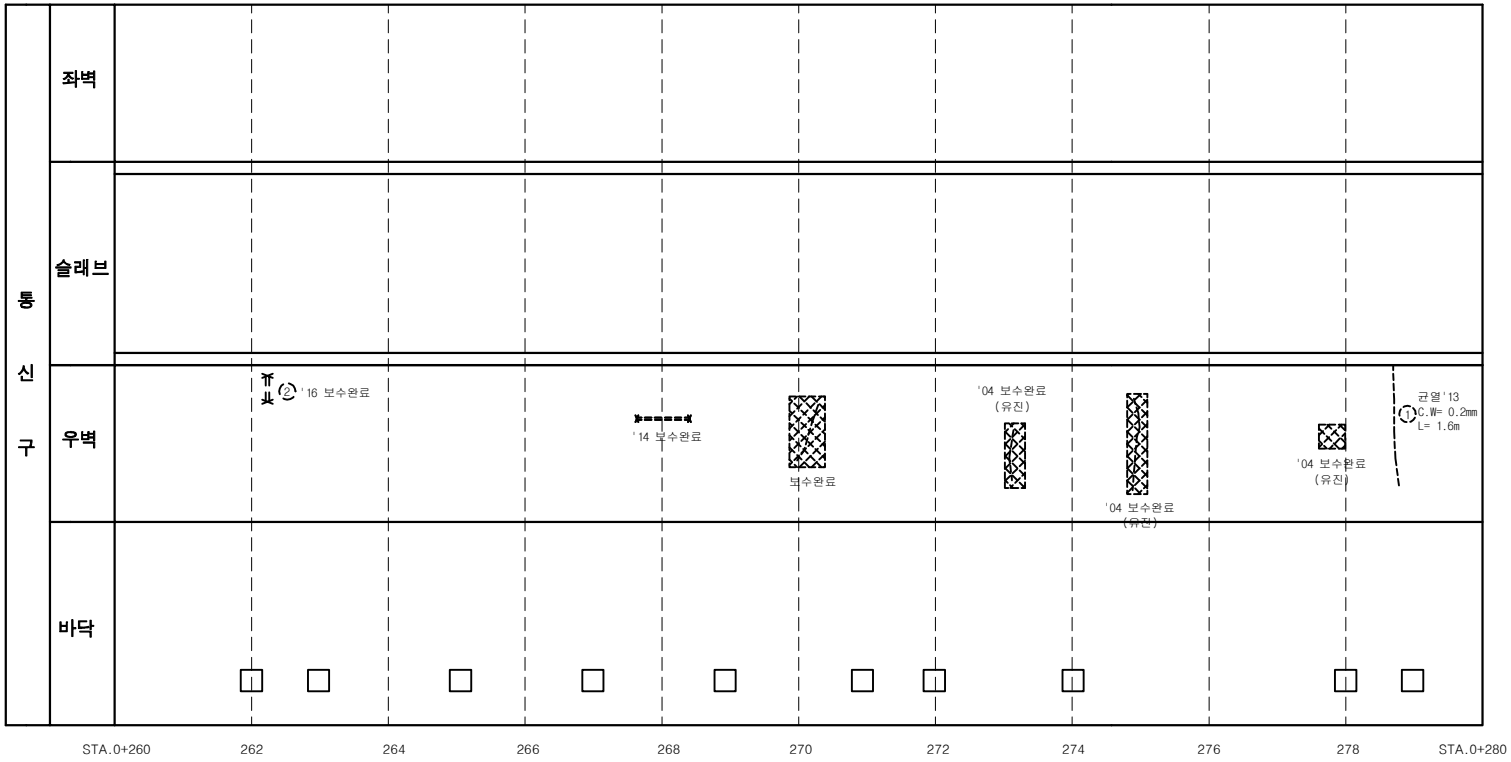

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.2	1.60		1.60	m	1			-	
2	2015	철근노출	0.1	0.40		0.04	㎡	1	2016	단면복구공법	0.05	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+280m ~ 0+300m)





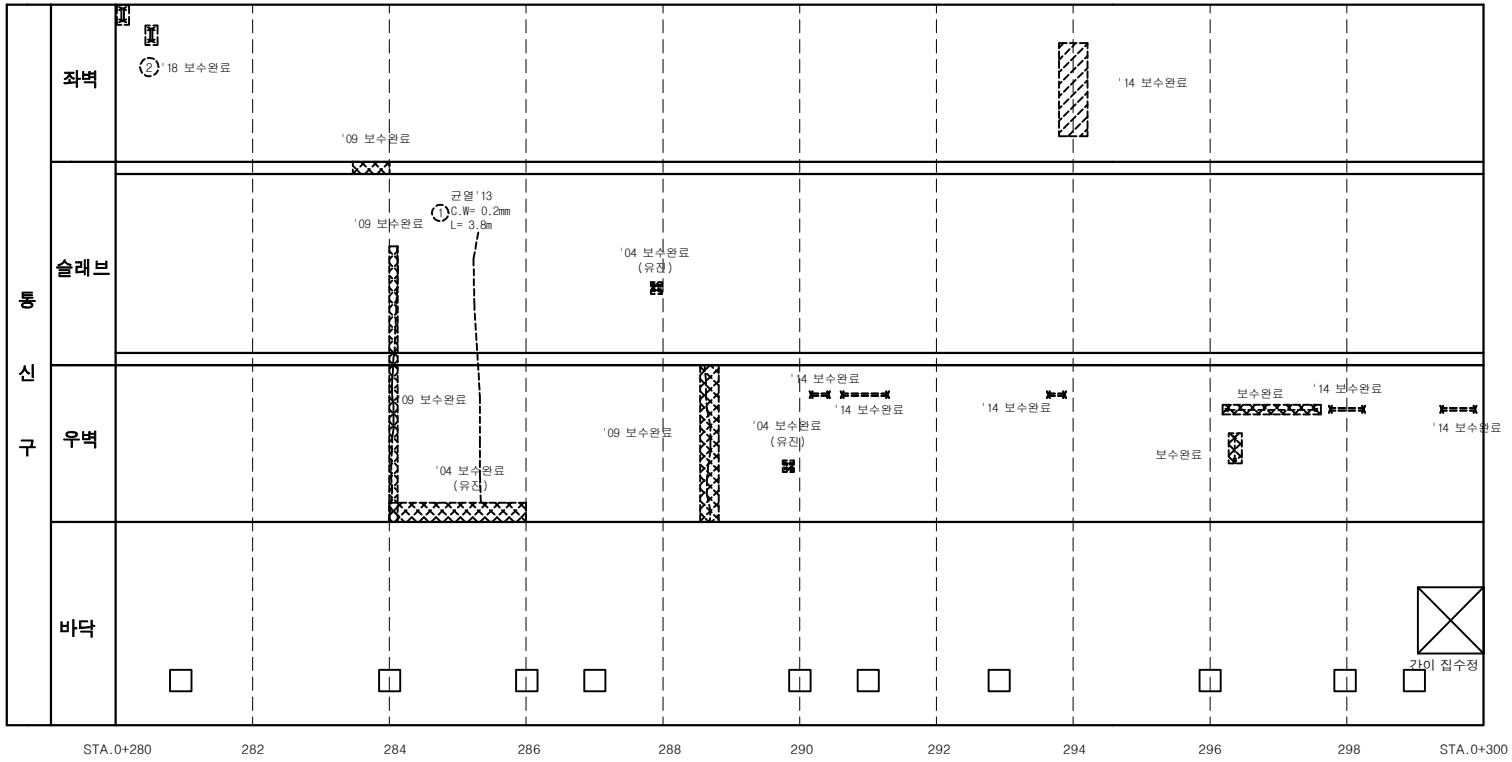

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.2	3.80		3.80	m	1			-	
2	2017	철근노출	0.2	0.20		0.08	㎡	2	2018	단면복구(방청)	0.10	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+300m ~ 0+320m)





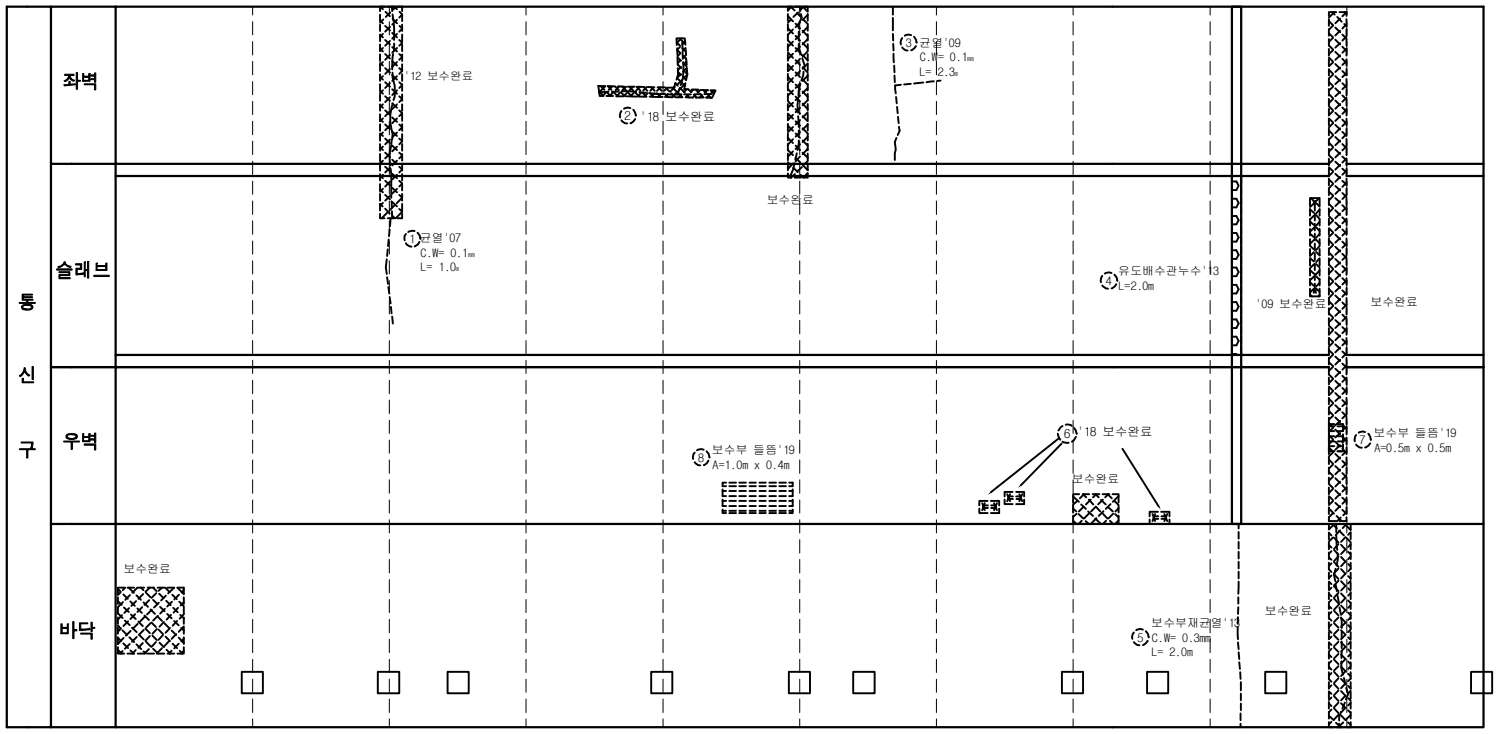

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.1	1.00		1.00	m	1			-	
2	2011	보수부 균열	0.1	1.30		1.30	m	1	2018	표면처리공법	1.56	
3	2009	균열	0.1	2.30		2.30	m	1			-	
4	2013	유도배수관누수		2.00		2.00	m	1			-	
5	2013	보수부 균열	0.3	2.00		2.00	m	1			-	재결함
6	2017	철근노출	0.2	0.20		0.12	㎡	3	2018	단면복구(방청)	1.56	
7	2019	보수부 들뜸	0.5	0.50		0.25	㎡	1			-	신규
8	2019	보수부 들뜸	1.0	0.40		0.40	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+320m ~ 0+340m)





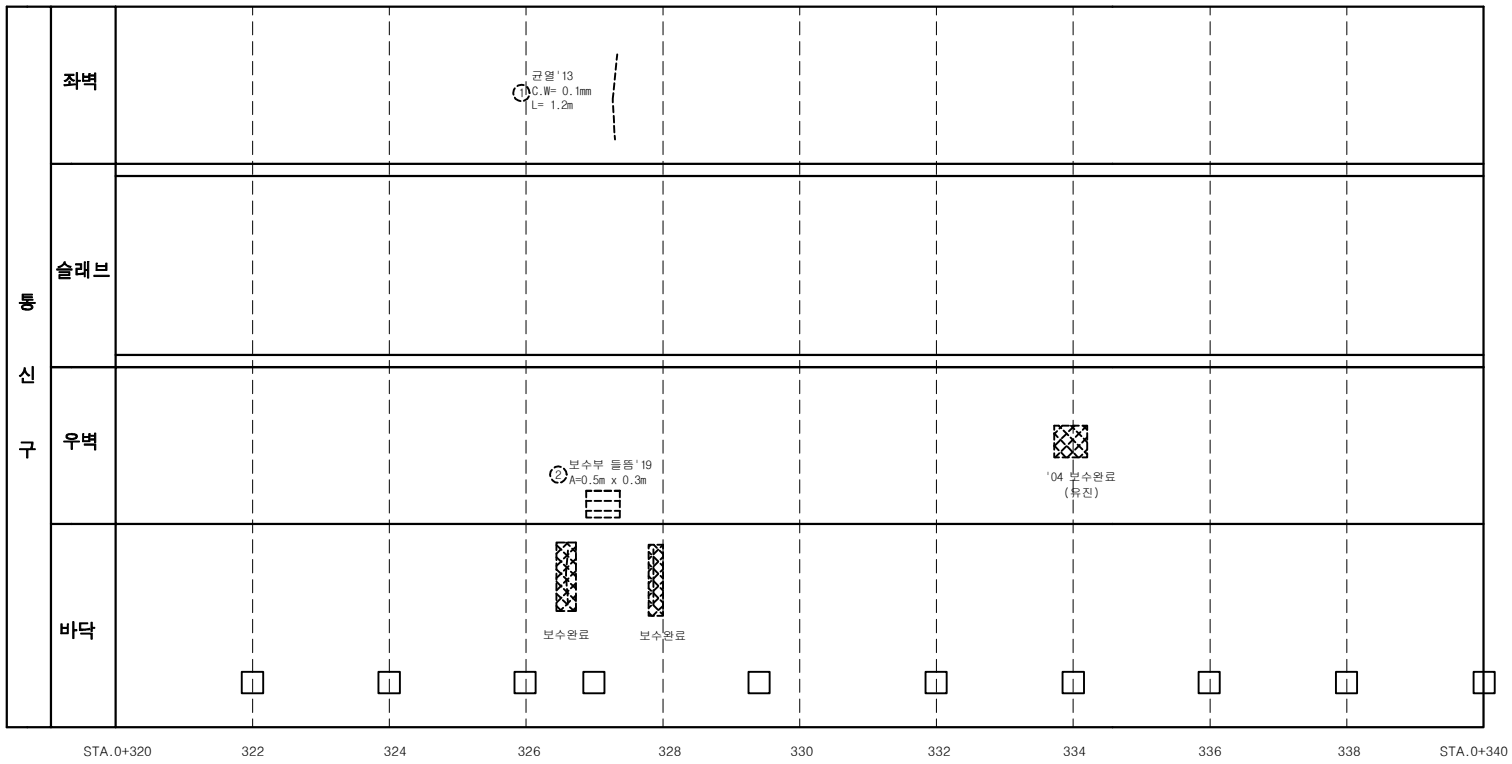

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.1	1.20		1.20	m	1			-	
2	2019	보수부 들뜸	0.5	0.30		0.15	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+340m ~ 0+360m)





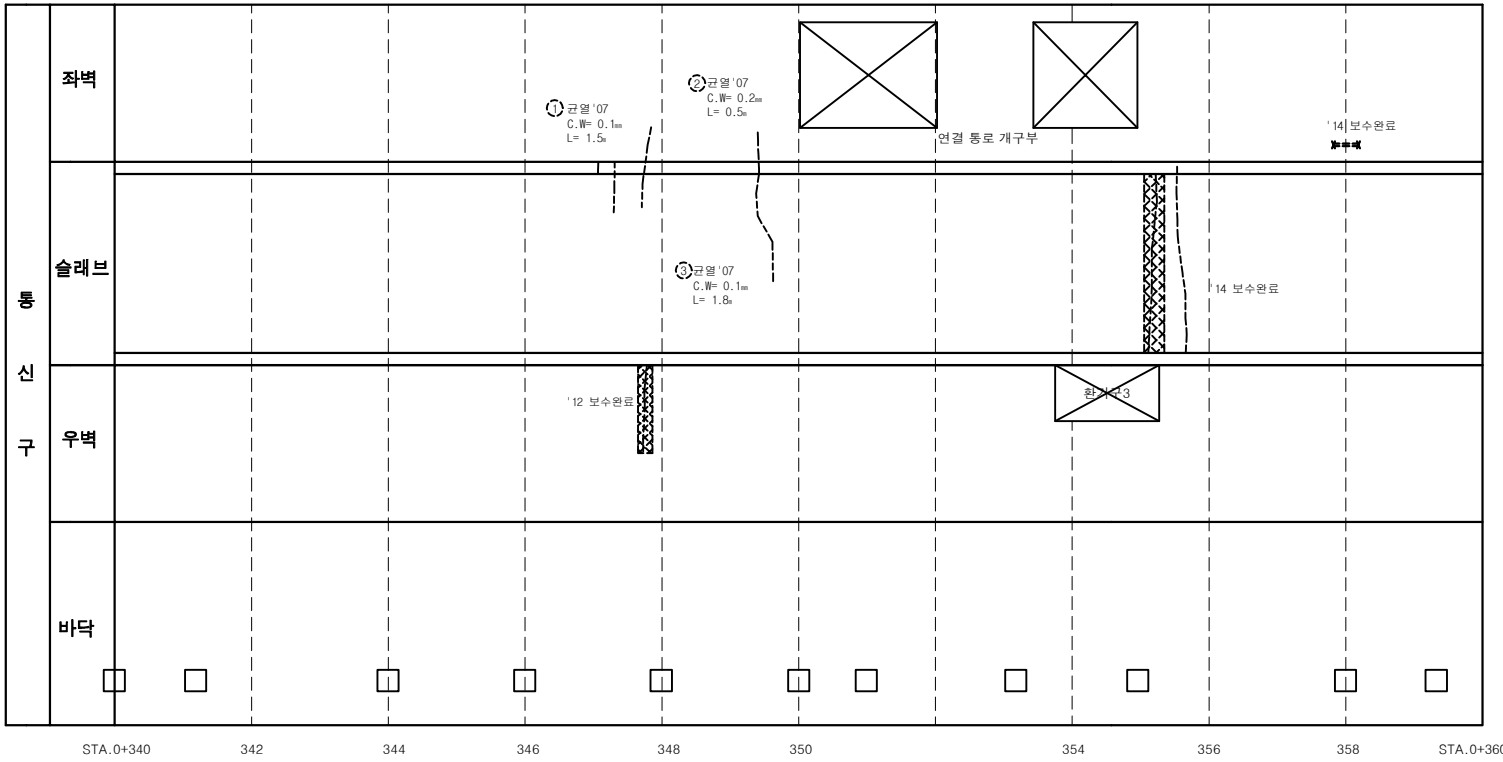

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.1	1.50		1.50	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	0.50		0.50	m	1			-	
3	2007	균열	0.1	1.80		1.80	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

환기구 3번 (순환선 349m)

KEYPLAN

SECTION

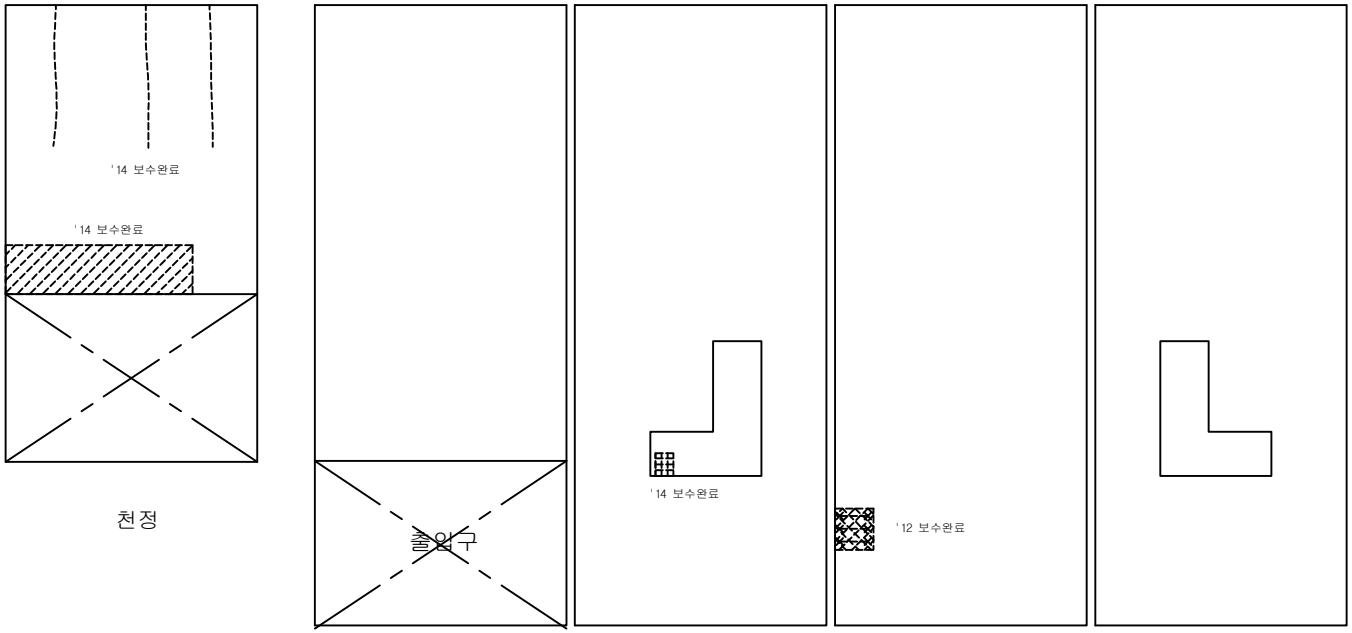

천정 배면 좌벽 전면 우벽

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT	TITLE OF SHIFT

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+360m ~ 0+380m)





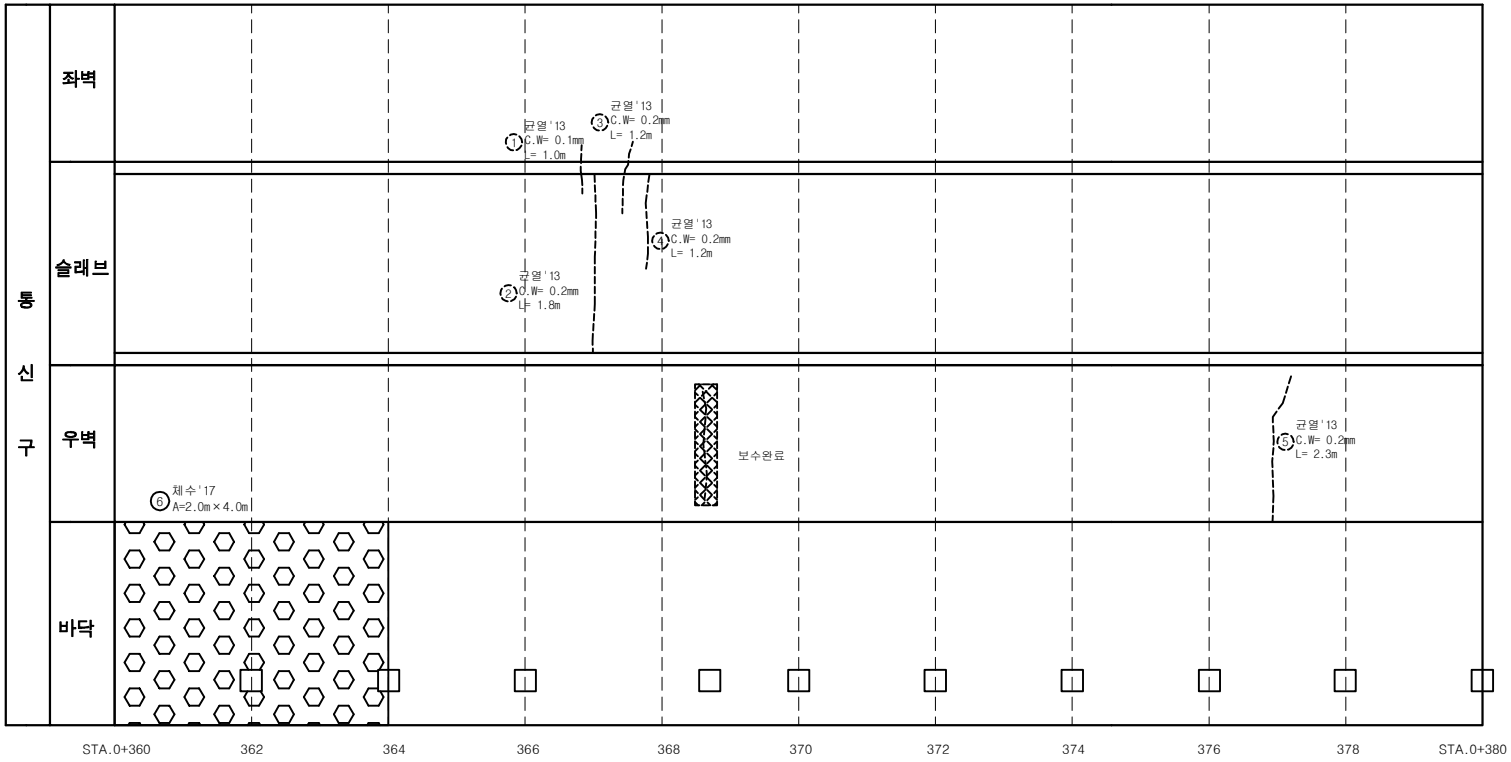

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.1	1.00		1.00	m	1			-	
2	2013	균열	0.2	1.80		1.80	m	1			-	
3	2013	균열	0.2	1.20		1.20	m	1			-	
4	2013	균열	0.2	1.20		1.20	m	1			-	
5	2013	균열	0.2	2.30		2.30	m	1			-	
6	2017	체수(면재망오)	2.0	4.00		8.00	㎡	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+380m ~ 0+400m)





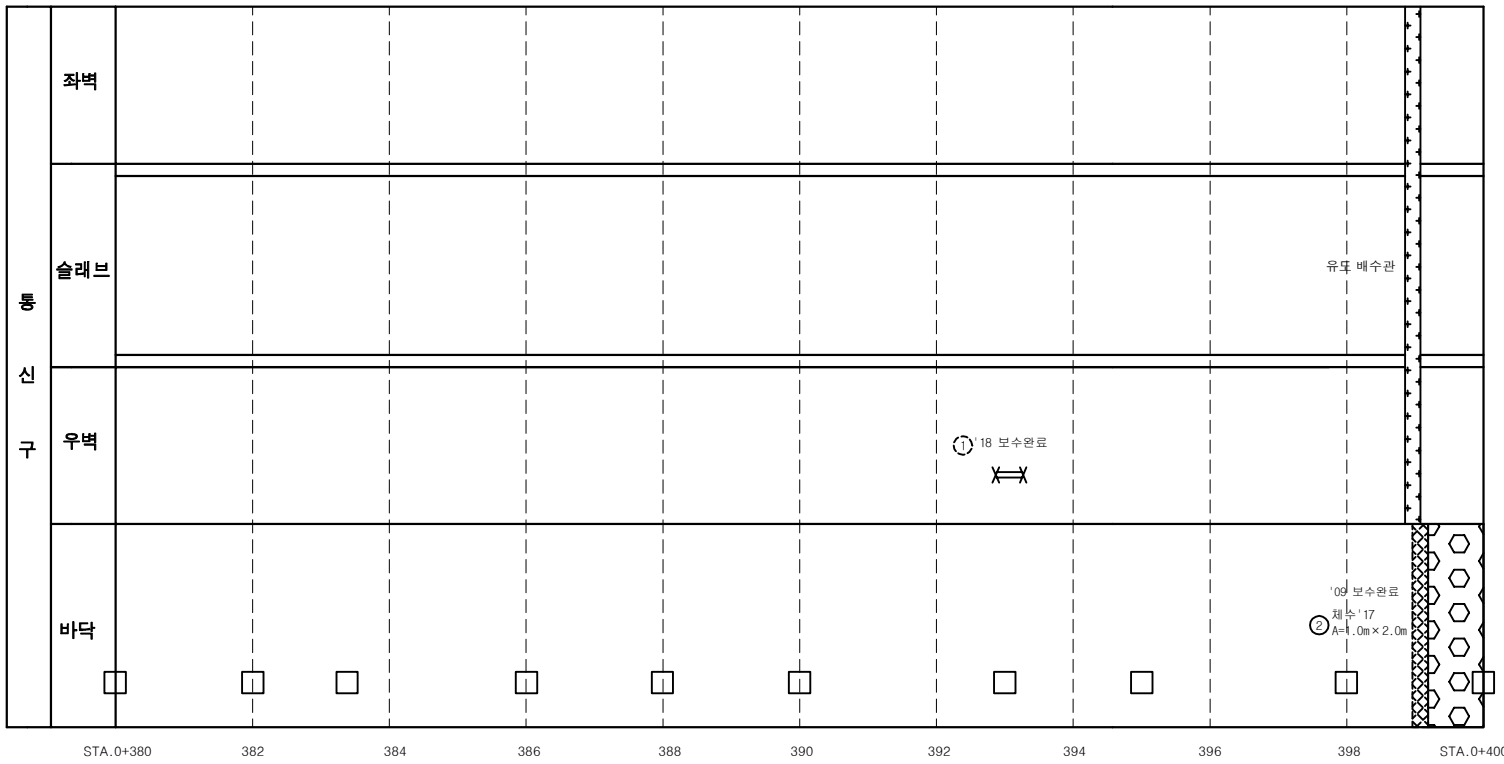

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2017	철근노출	0.1	0.60		0.06	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.07	
2	2017	체수(면재왕호)	1.0	2.00		2.00	㎡	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+400m ~ 0+420m)



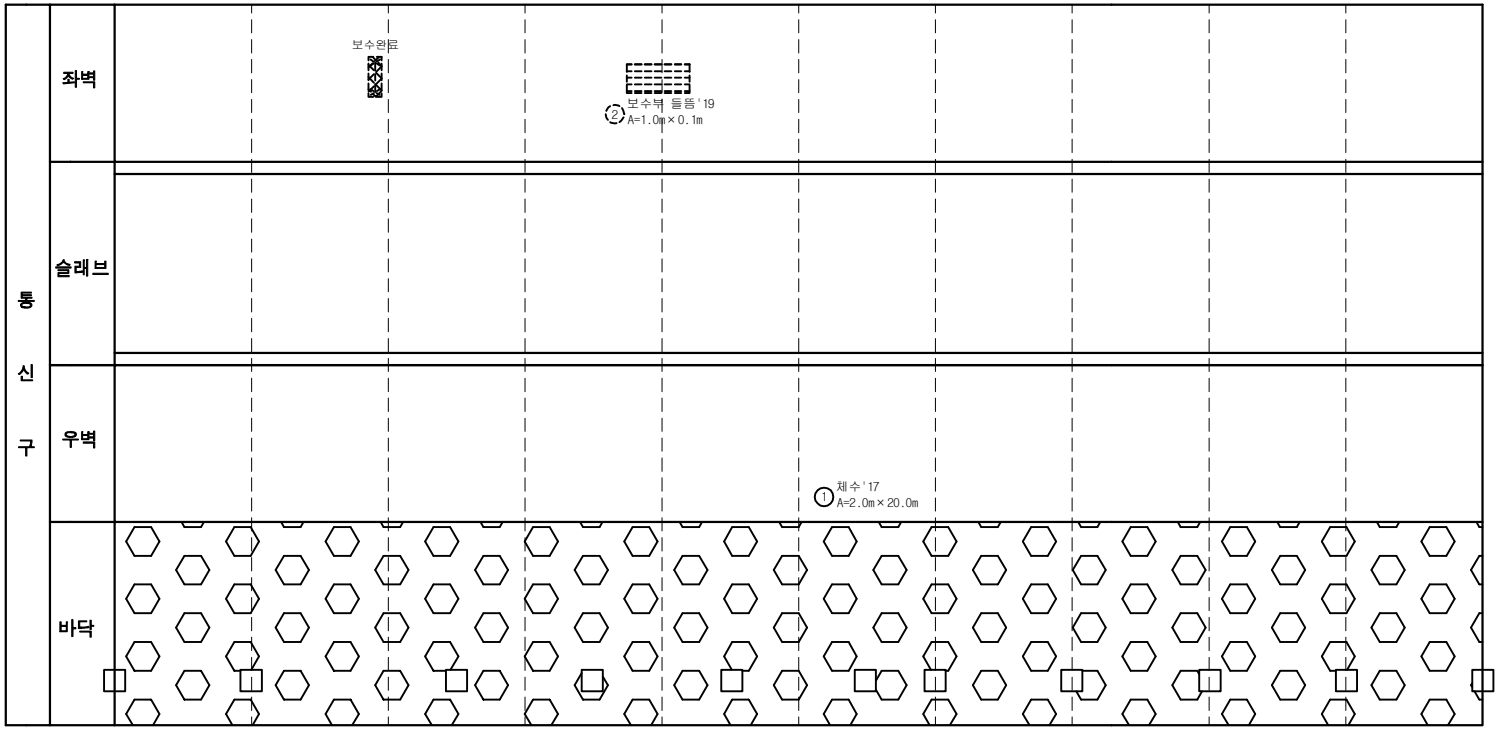

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2017	체수(현재양호)	2.0	20.00		40.00	㎡	1			-	
2	2019	보수부 들뜸	1.0	0.10		0.10	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+420m ~ 0+440m)



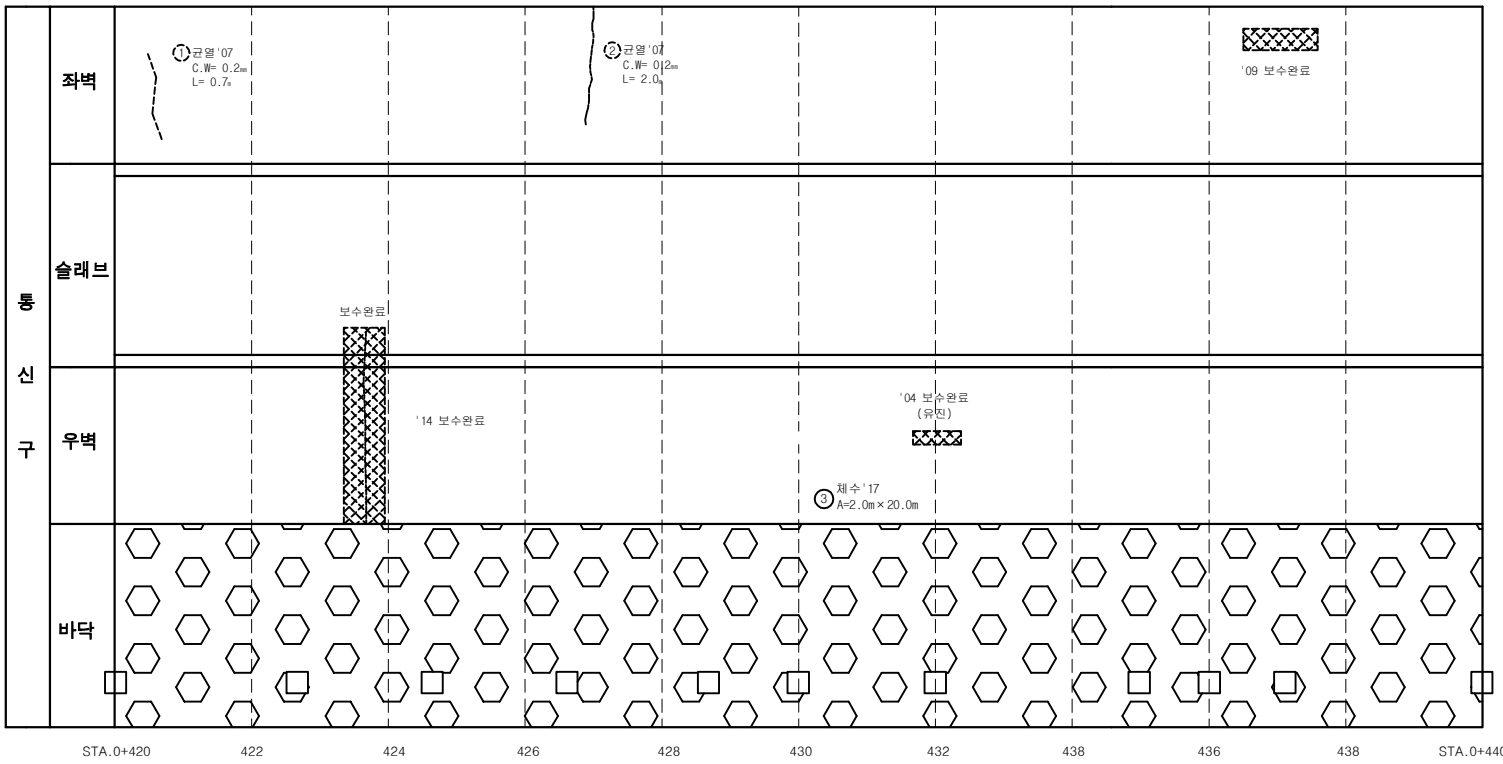

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수면도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	0.70		0.70	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
3	2017	체수(현재양호)	2.0	20.00		40.00	㎡	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+440m ~ 0+460m)



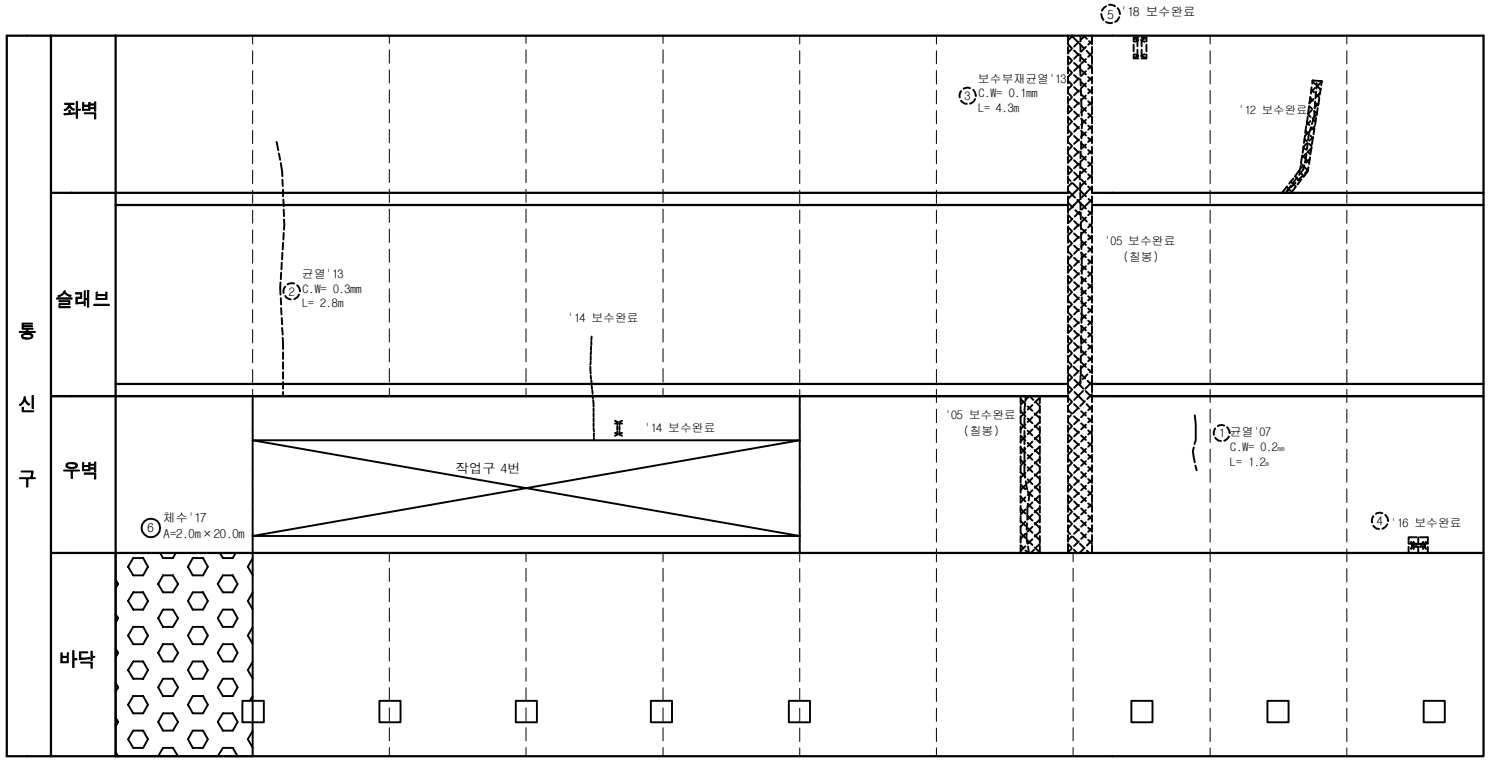

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	1.20		1.20	m	1			-	
2	2013	균열	0.2	2.80		2.80	m	1			-	
3	2013	보수부 균열	0.1	4.30		4.30	m	1			-	재결함
4	2013	철근노출,박락	0.1	0.10		0.01	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.01	
5	2017	철근노출	0.2	0.20		0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.05	
6	2017	체수(현재양호)	2.0	2.00		4.00	㎡	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 작업구 4번 (순환선 442m)

KEYPLAN

SECTION



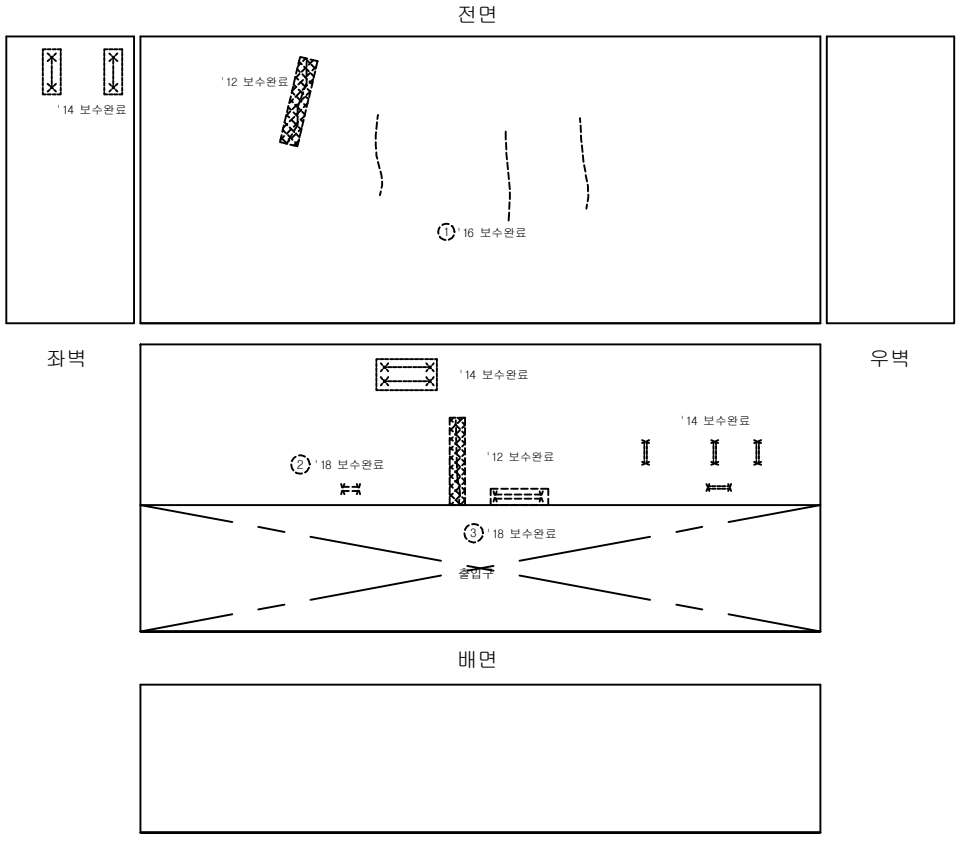

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.3	5.40		16.20	m	3	2016	주입보수공법	19.44	
2	2017	철근노출	0.3	0.10		0.03	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.04	
3	2017	철근노출,박리	1.0	0.40		0.40	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.48	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **작업구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+460m ~ 0+480m)



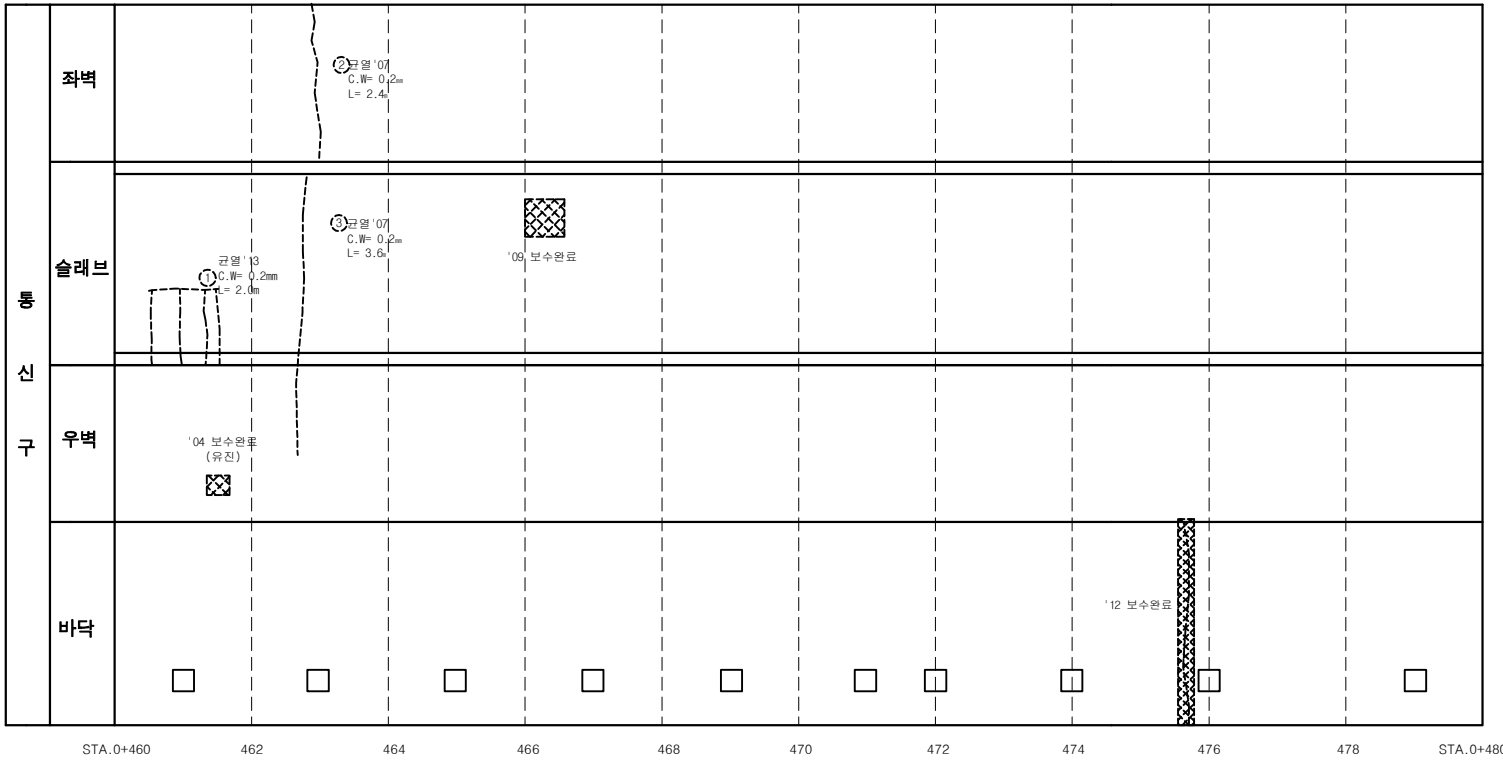

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.2		2.00	2.00	m	1			-	
2	2007	균열	0.2		2.40	2.40	m	1			-	
3	2007	균열	0.2		3.60	3.60	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+480m ~ 0+500m)



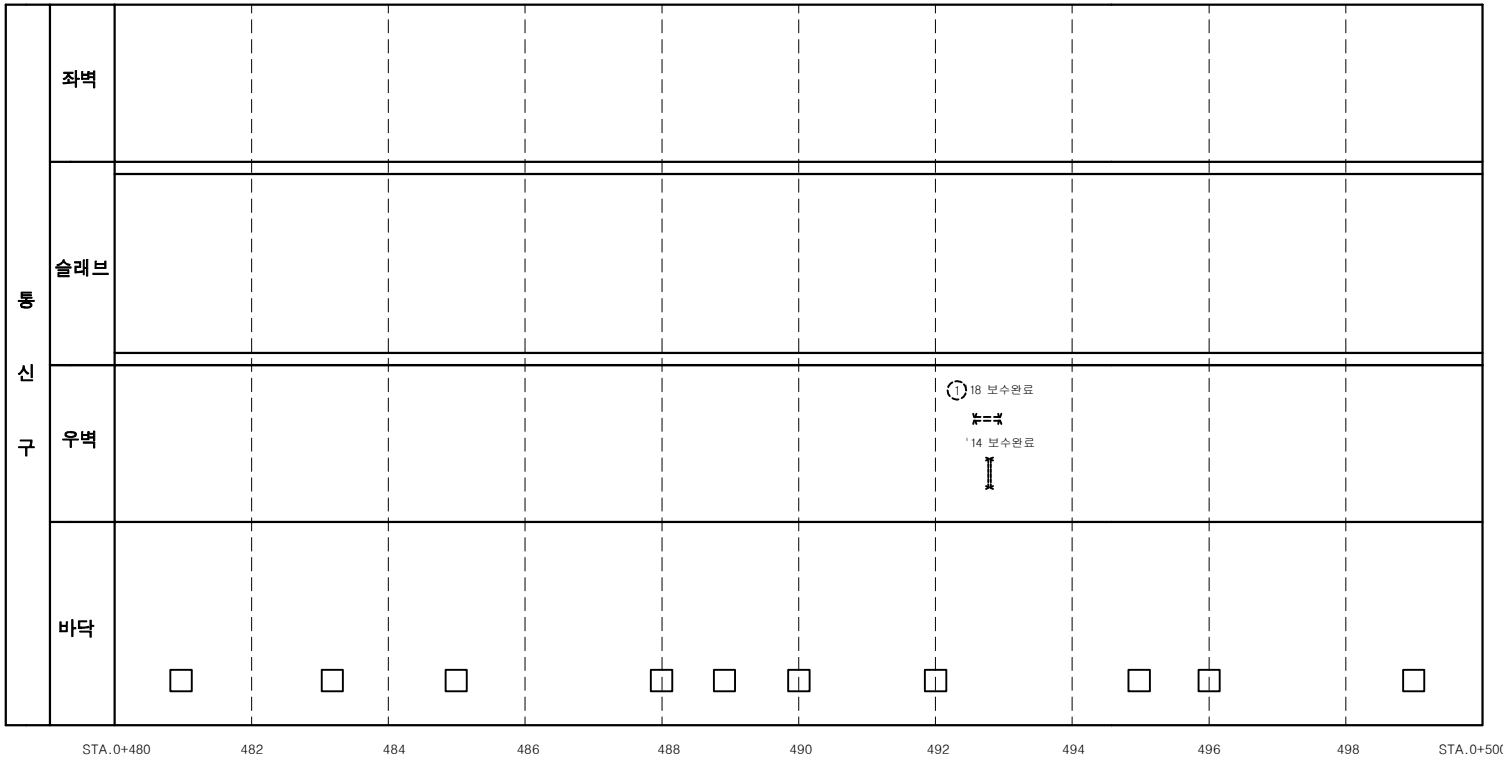

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2017	철근노출	0.1	1.00		0.10	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.12	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+500m ~ 0+520m)



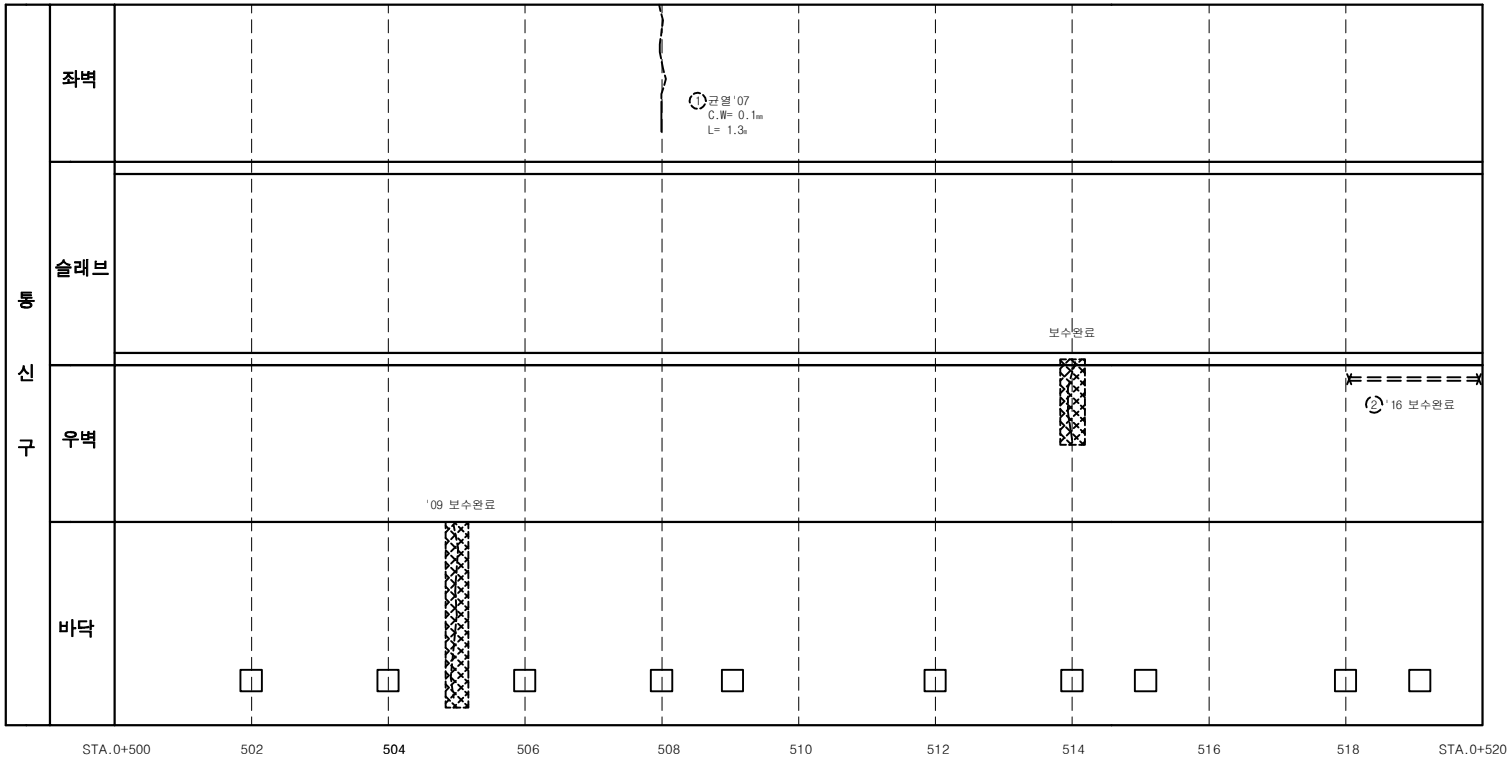

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.1	1.30		1.30	m	1			-	
2	2015	철근노출	0.1	2.00		0.20	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.24	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+520m ~ 0+540m)



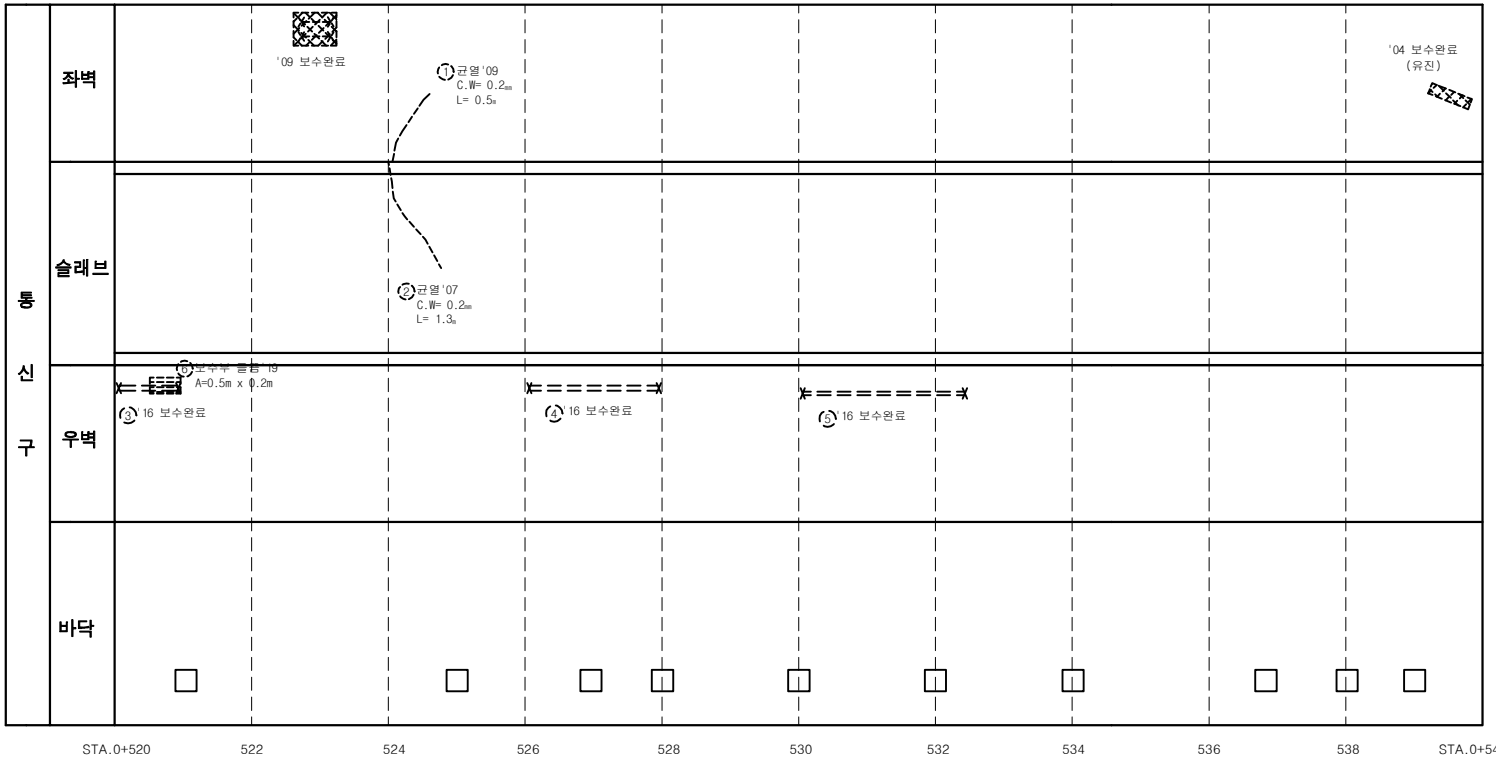

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2009	균열	0.2	0.50		0.50	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	1.30		1.30	m	1			-	
3	2015	철근노출	0.1	1.00		0.10	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.12	
4	2015	철근노출	0.2	2.00		0.40	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.48	
5	2015	철근노출	0.1	2.50		0.25	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.30	
6	2019	보수부 들뜸	0.5	0.20		0.10	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.12	재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+540m ~ 0+560m)



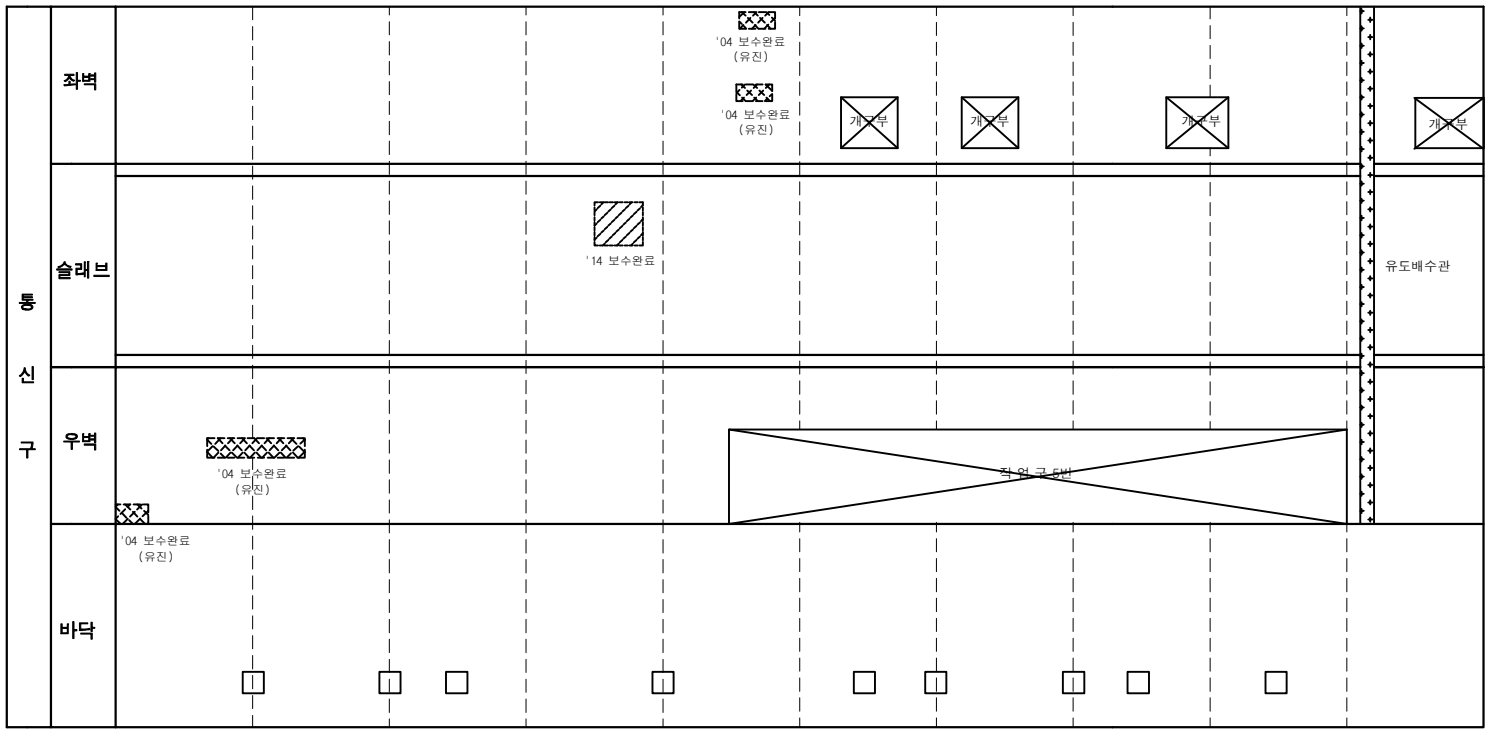

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 작업구 5번 (순환선 548m)

KEYPLAN

SECTION

전면

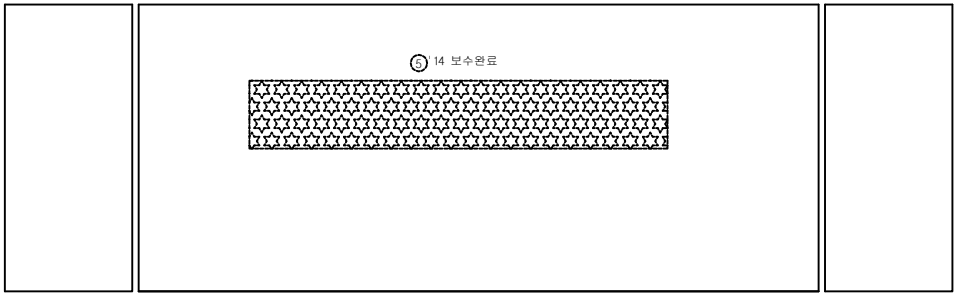

좌벽

우벽

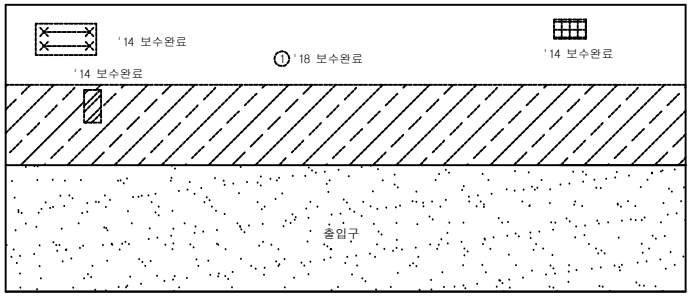

배면

바닥

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	표면오염	1.5	8.0		12.0	㎡	1	2018	표면처리공법	14.4	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **작업구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+560m ~ 0+580m)





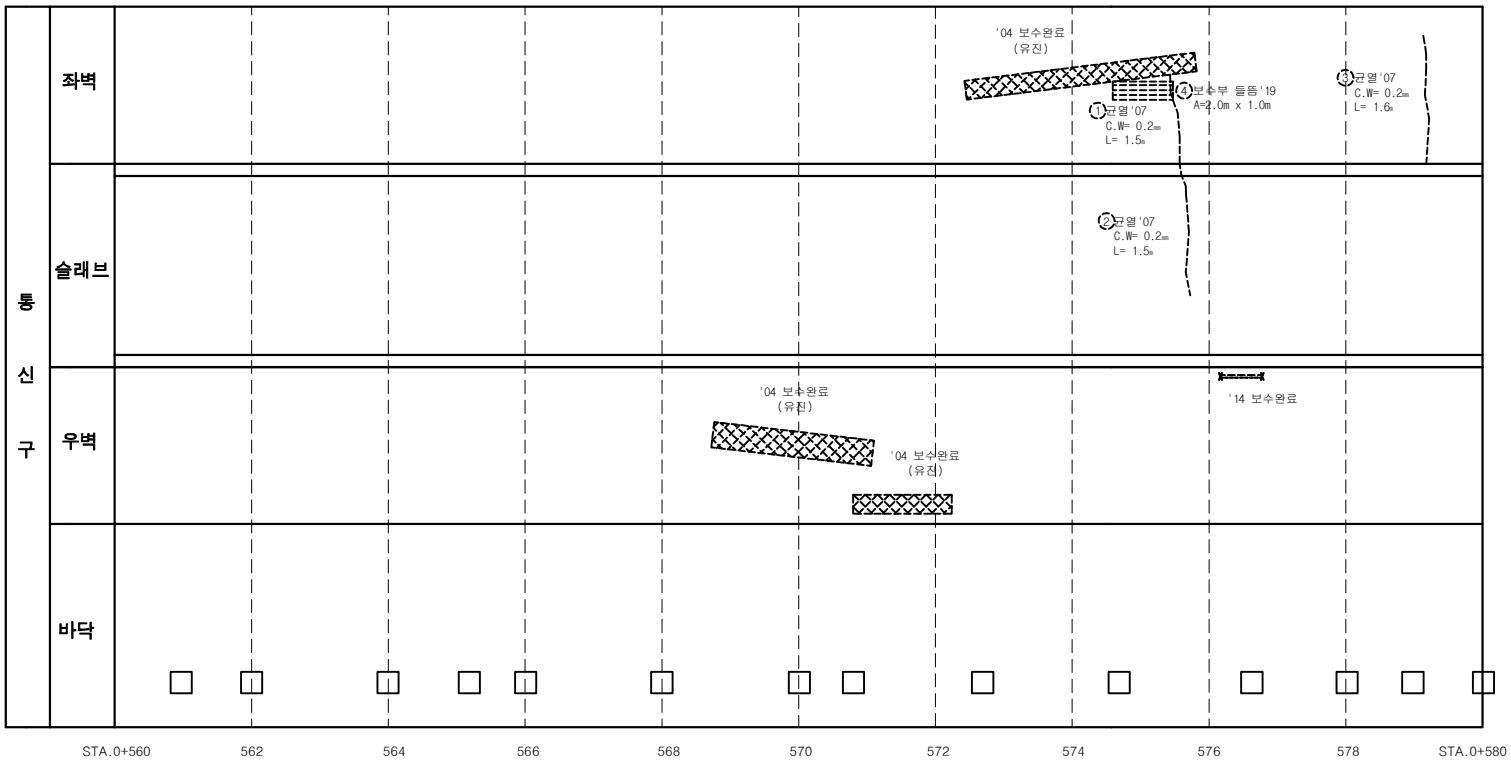

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	1.50		1.50	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	1.50		1.50	m	1			-	
3	2007	균열	0.2	1.60		1.60	m	1			-	
4	2019	보수부 들뜸	2.0	1.00		2.00	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+580m ~ 0+600m)





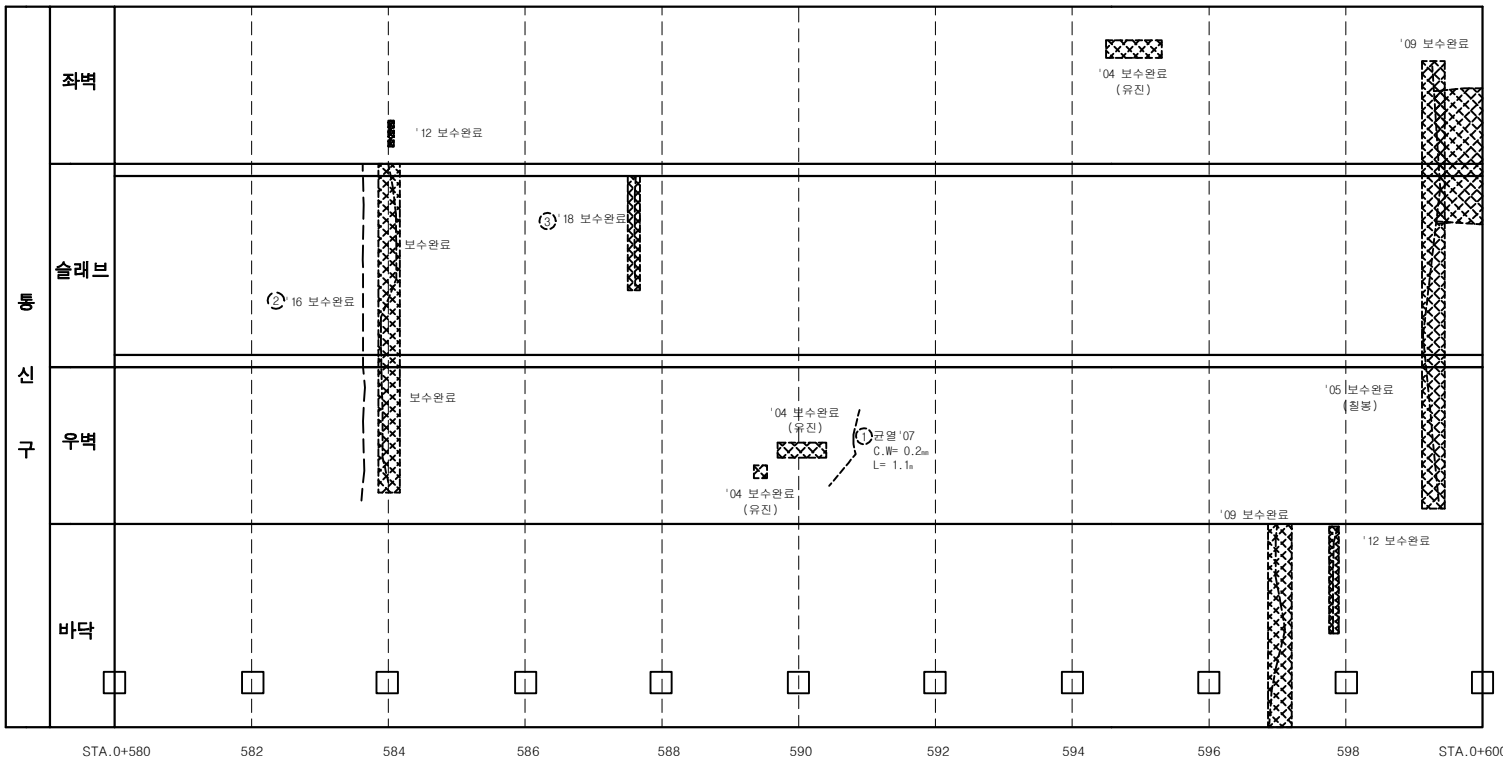

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	1.10		1.10	m	1			-	
2	2013	균열	0.3	4.00		4.00	m	1	2016	주입보수공법	4.80	
3	2013	균열	0.1	1.00		1.00	m	1	2018	표면처리공법	1.20	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+600m ~ 0+620m)





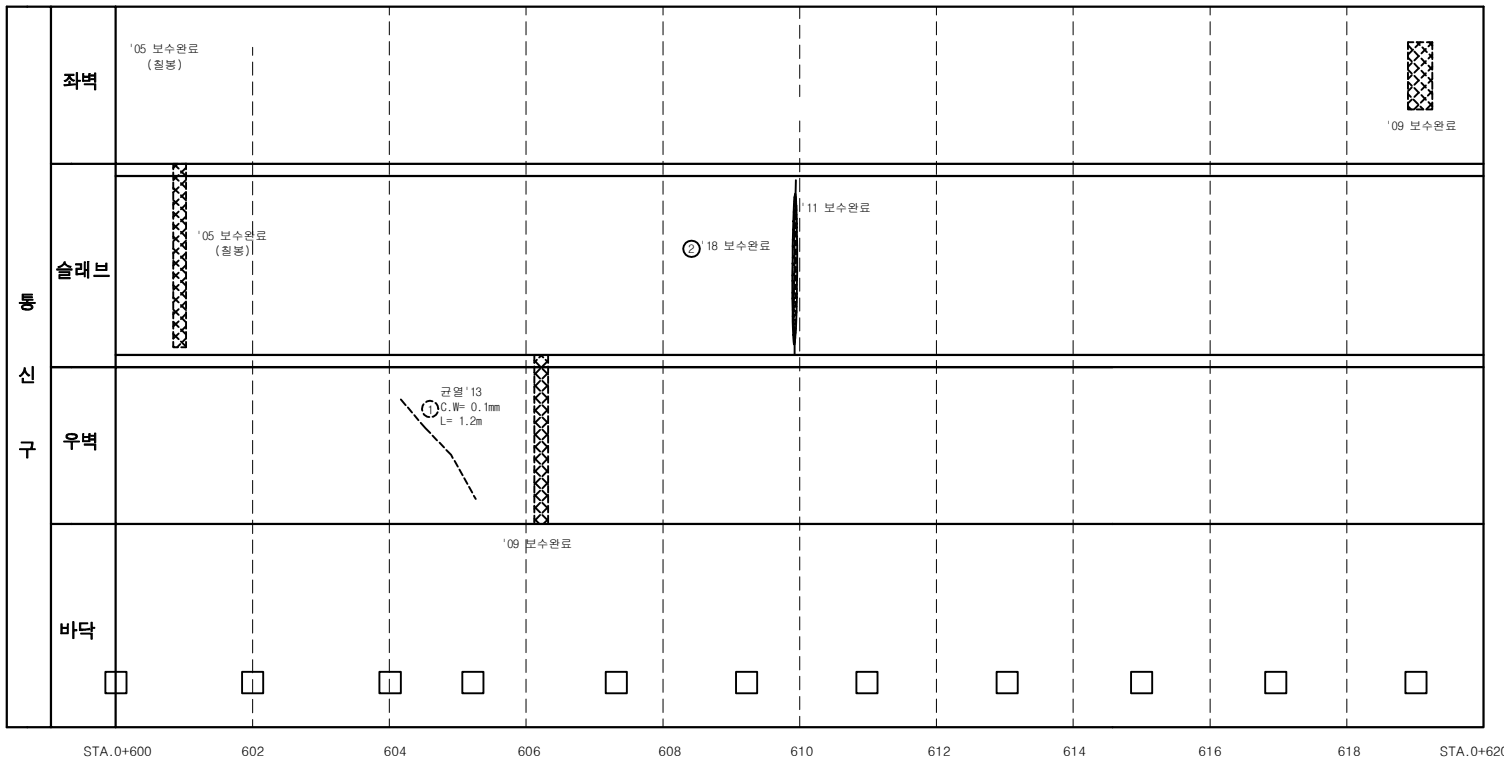

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.1	1.20		1.20	m	1			-	
2	2015	균열부백태	0.2	2.00		0.40	㎡	1	2018	표면처리공법	0.48	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+620m ~ 0+640m)



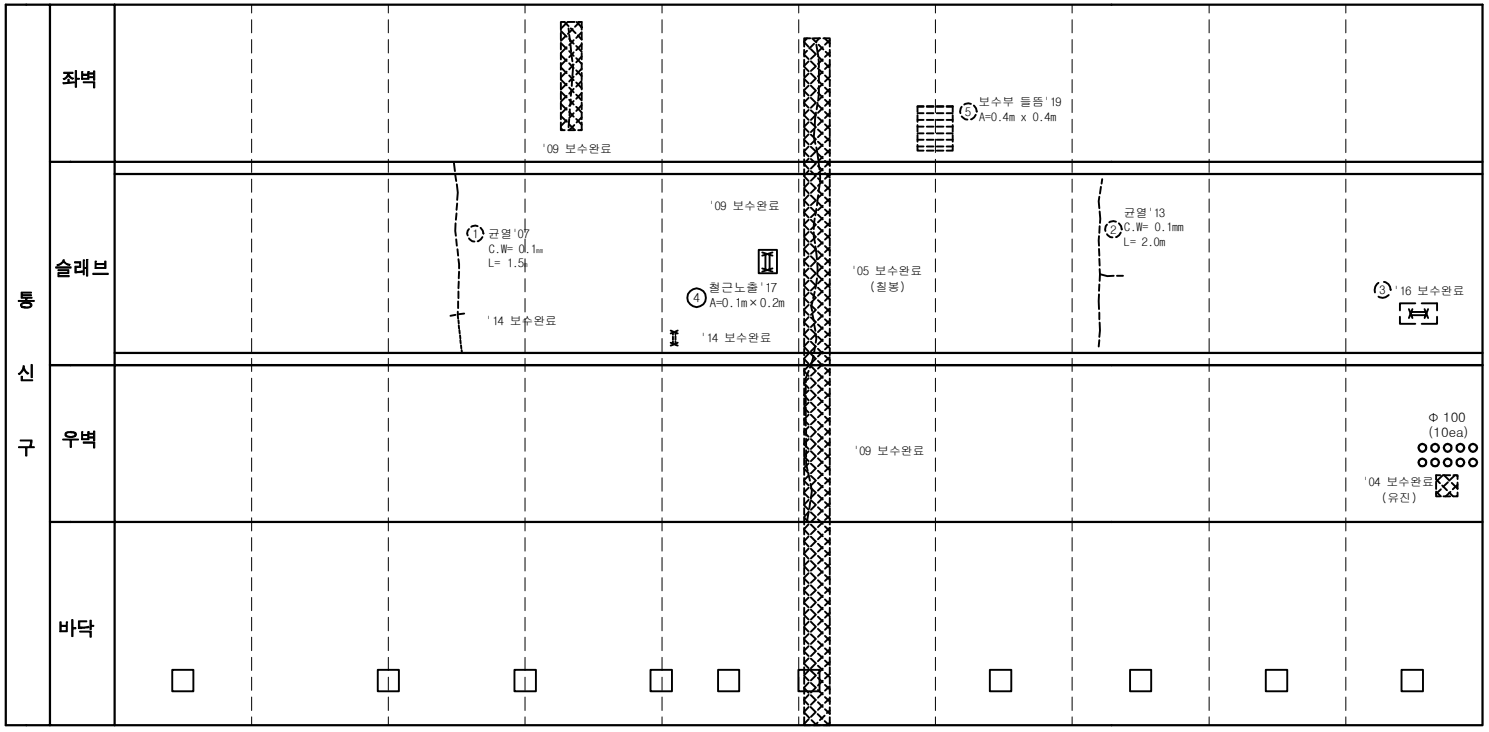

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.1	1.50		1.50	m	1			-	
2	2013	균열	0.1	2.00		2.00	m	1			-	
3	2015	철근노출	0.3	0.50		0.15	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.18	
4	2017	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.02	
5	2019	보수부 들뜸	0.4	0.40		0.16	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+640m ~ 0+660m)





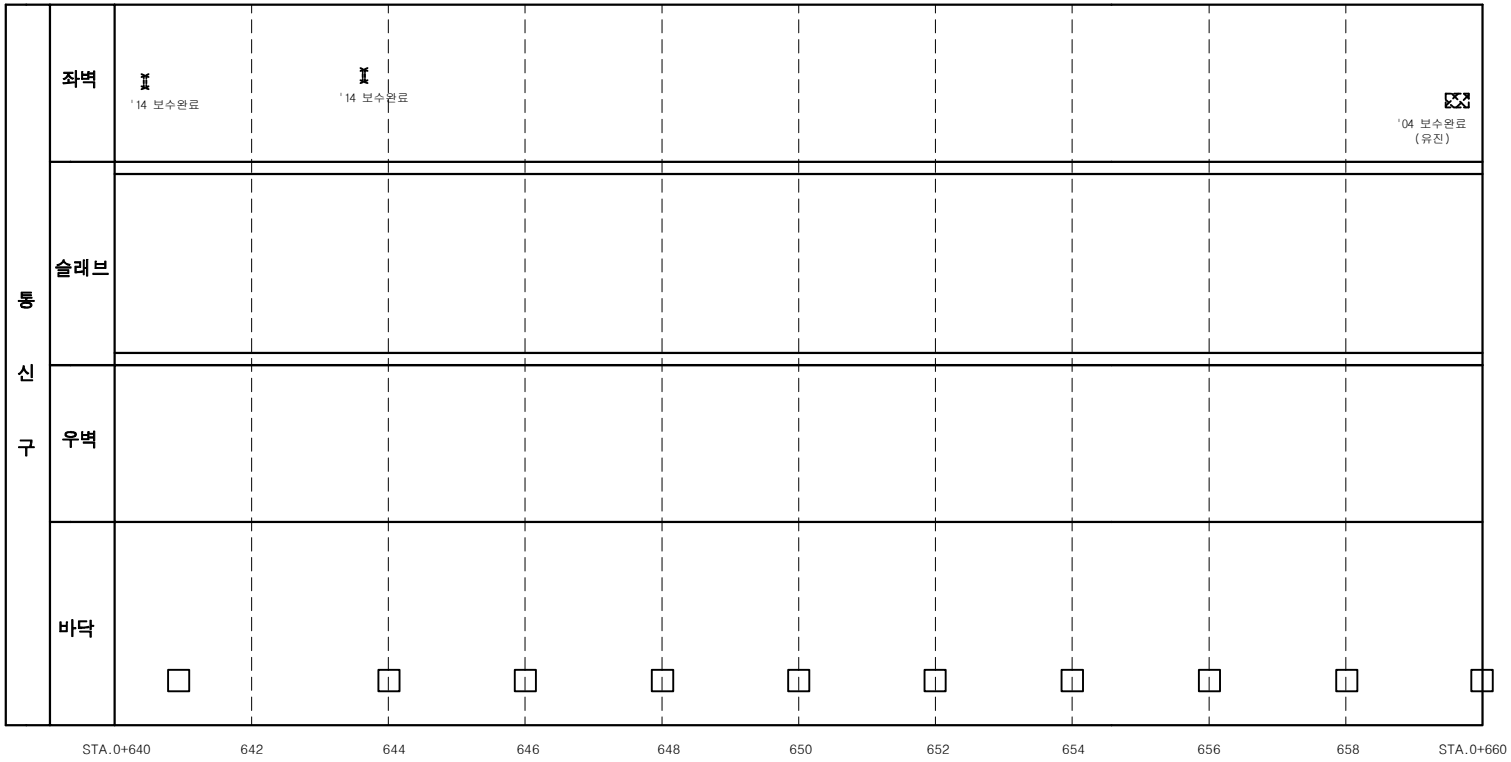

손상물량표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+660m ~ 0+680m)



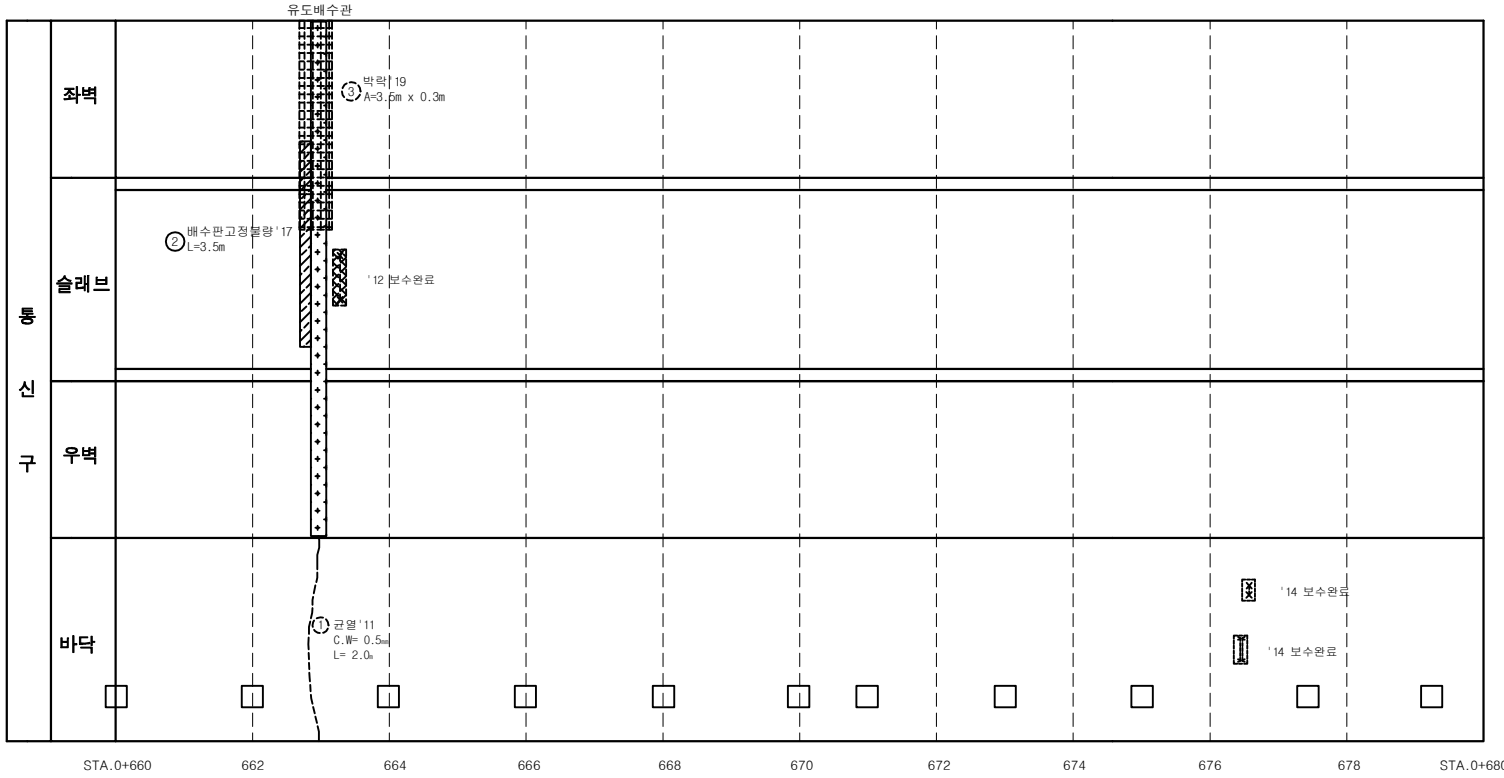

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2011	균열	0.5	2.00		2.00	m	1			-	
2	2017	배수판고정 불량		3.50		3.50	m	1			-	
3	2019	박락	3.5	0.30		1.05	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+680m ~ 0+700m)



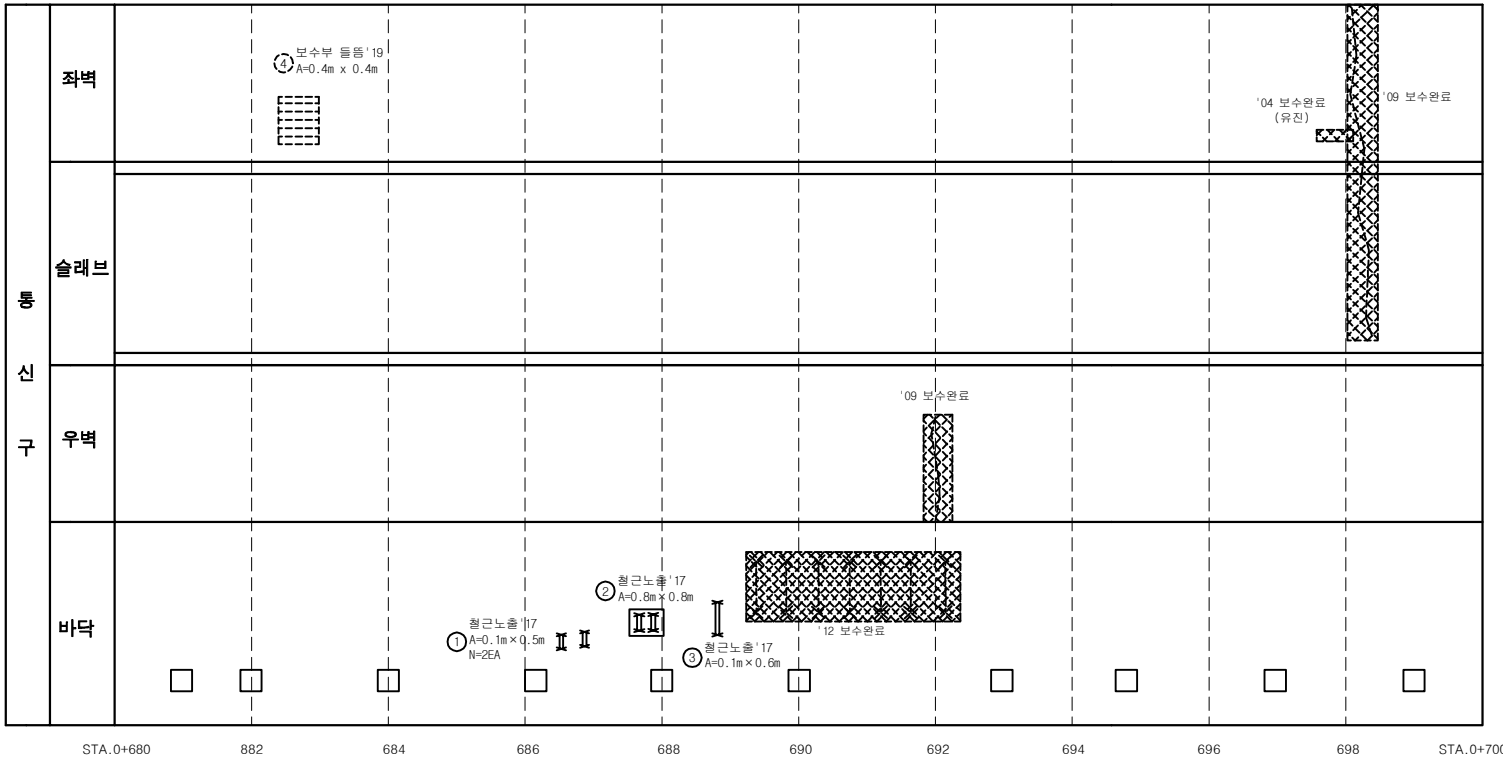

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2017	철근노출	0.1	0.50		0.10	㎡	2			-	중요
2	2017	철근노출	0.8	0.80		0.64	㎡	1			-	중요
3	2017	철근노출	0.1	0.60		0.06	㎡	1			-	중요
4	2019	보수부 들뜸	0.4	0.40		0.16	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+700m ~ 0+720m)



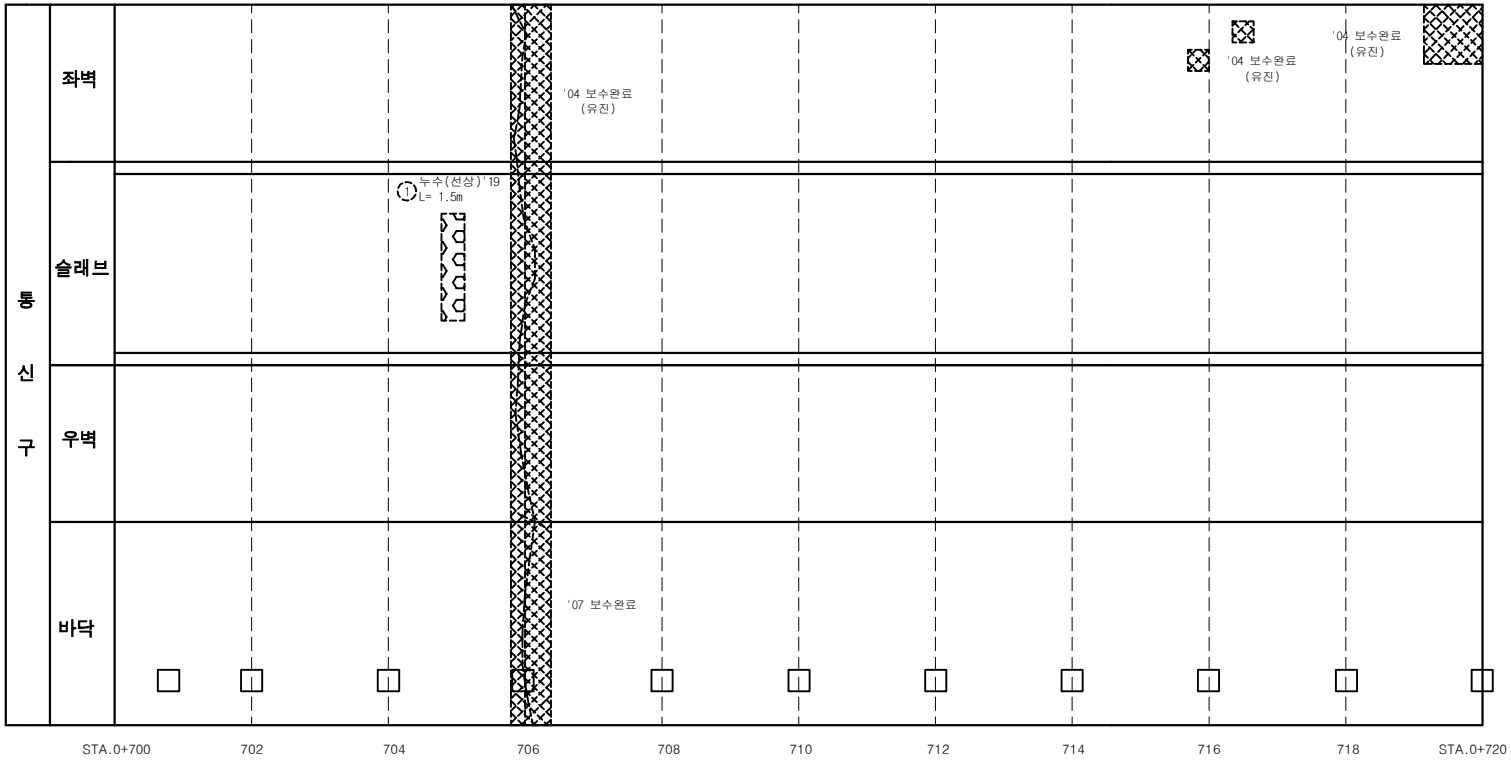

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2019	누수(선상)		1.50		1.50	m	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+720m ~ 0+740m)



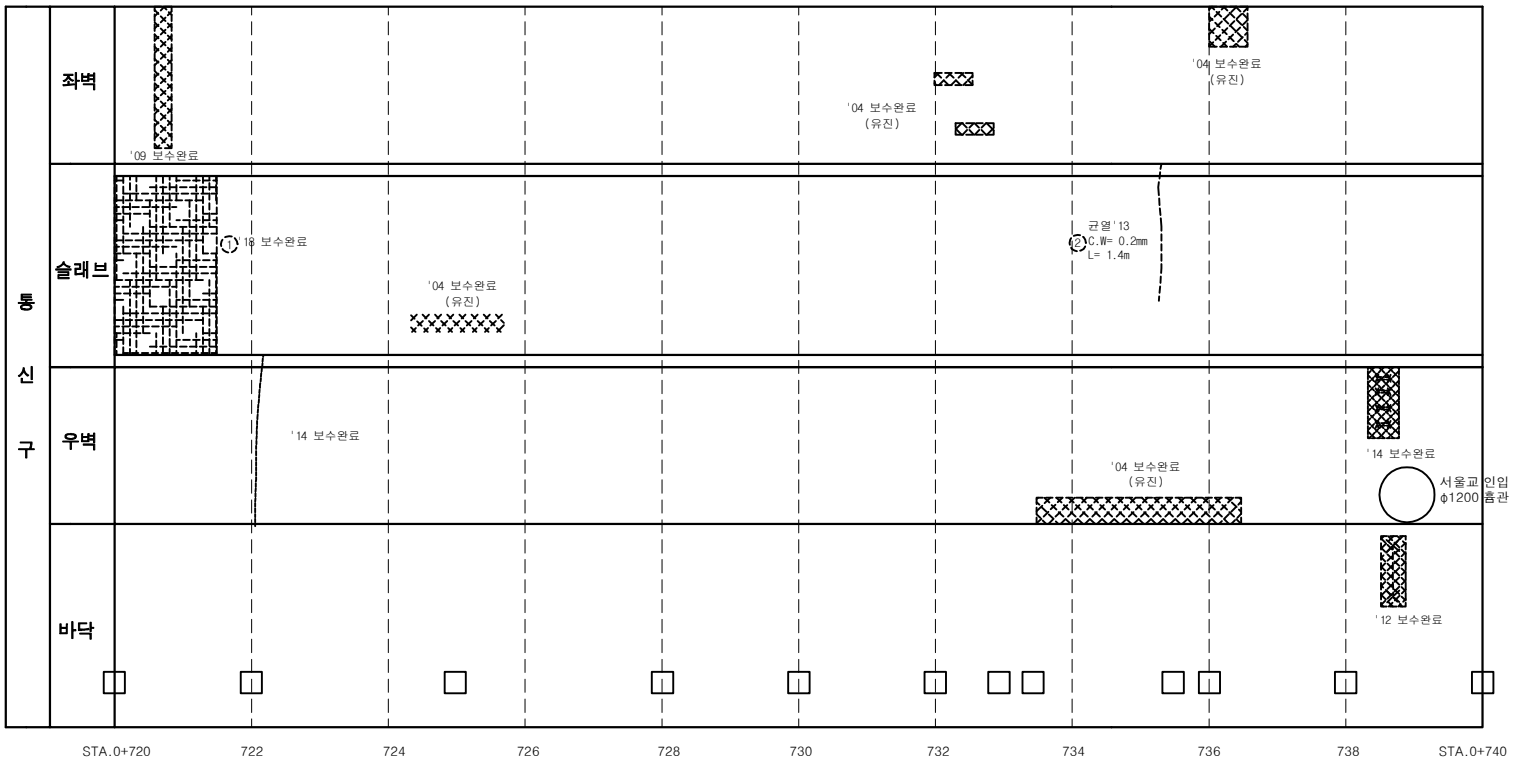

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	보수부 망상균열	2.0	1.50		3.00	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.12	
2	2013	균열	0.2	1.40		1.40	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+740m ~ 0+760m)



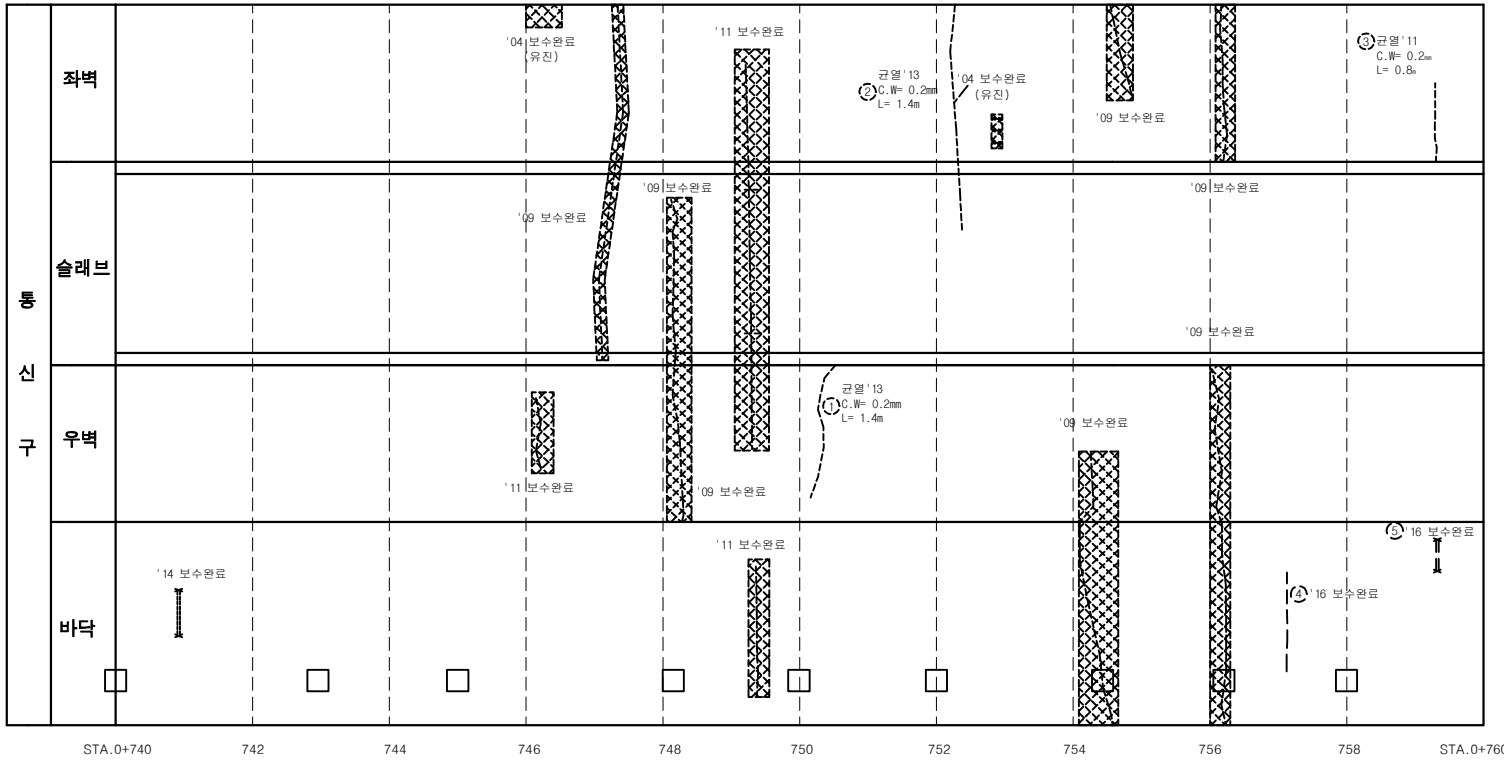

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
2	2013	균열	0.2	3.30		3.30	m	1			-	
3	2011	균열	0.2	0.80		0.80	m	1			-	
4	2011	균열	0.3	1.20		1.20	m	1	2016	주입보수공법	1.44	
5	2015	철근노출	0.2	0.50		0.10	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.12	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+760m ~ 0+780m)



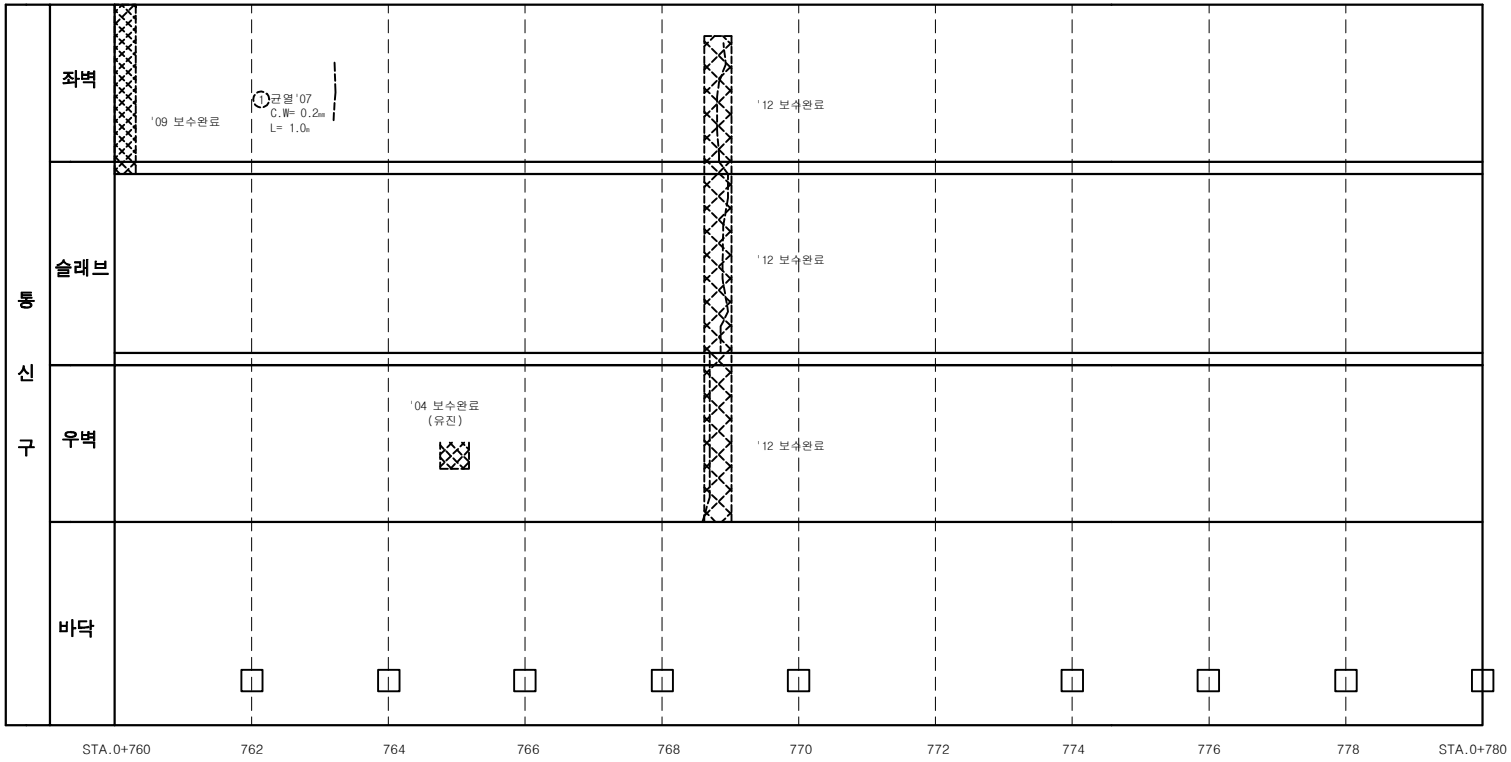

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+780m ~ 0+800m)



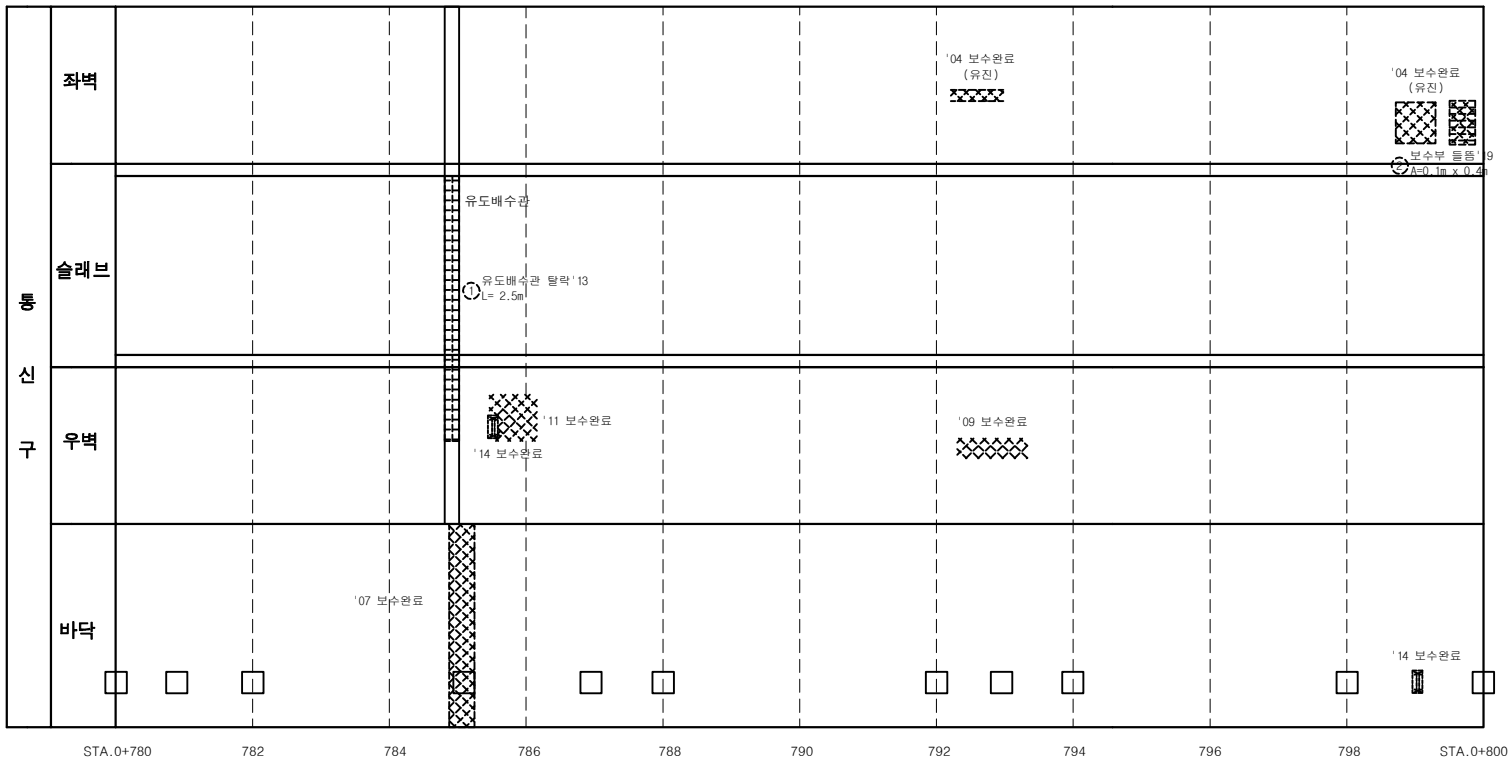

손 상 물 량 표

연번	적용년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	유도배수관탈락		2.50		1.00	EA	1			-	
2	2019	보수부 들뜸	0.1	0.40		0.04	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+800m ~ 0+820m)





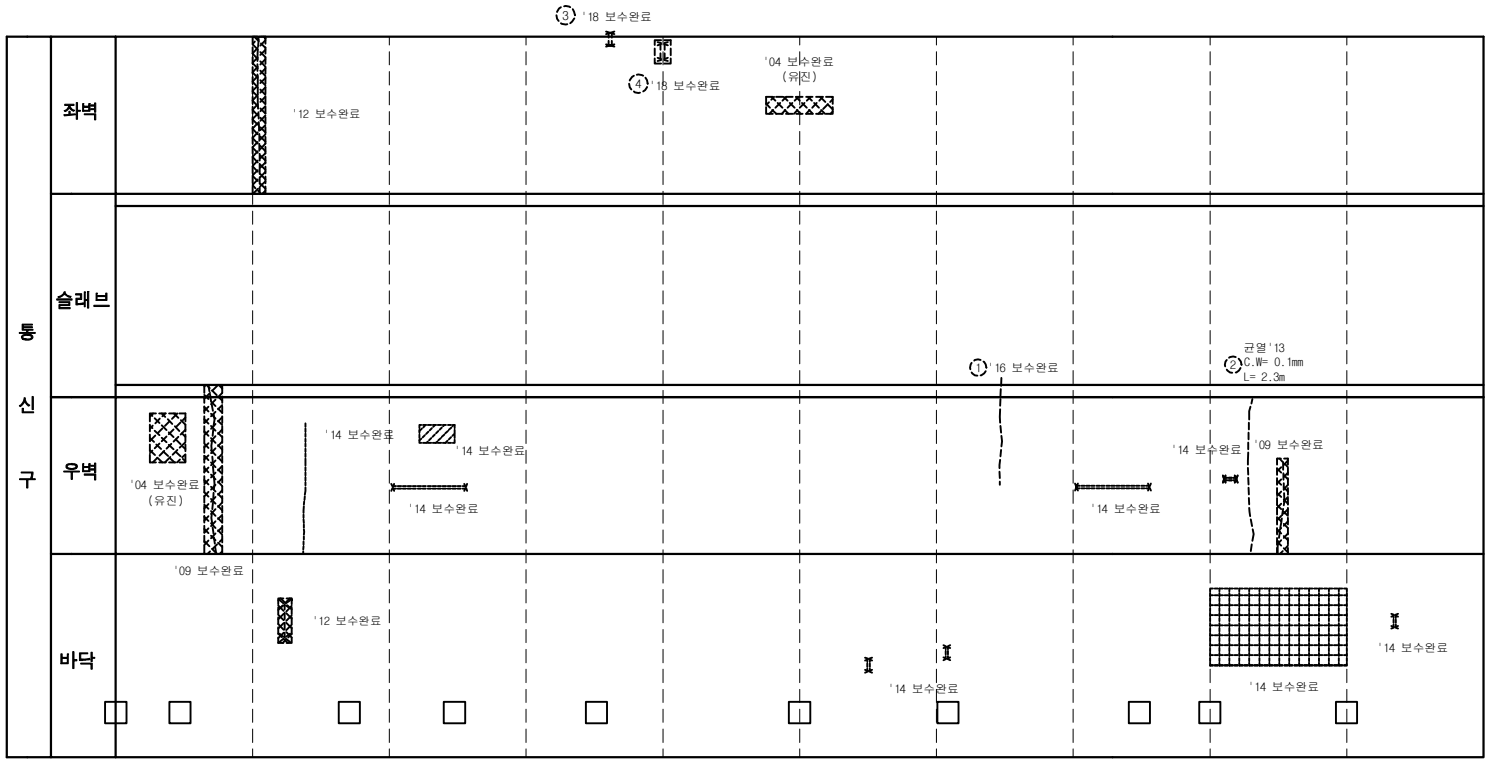

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	보수 불량		1.20		1.20	m	1	2016	단면복구공법	1.44	
2	2013	균열	0.1	2.30		2.30	m	1			-	
3	2017	철근노출	0.1	0.10		0.01	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.01	
4	2017	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.02	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+820m ~ 0+840m)





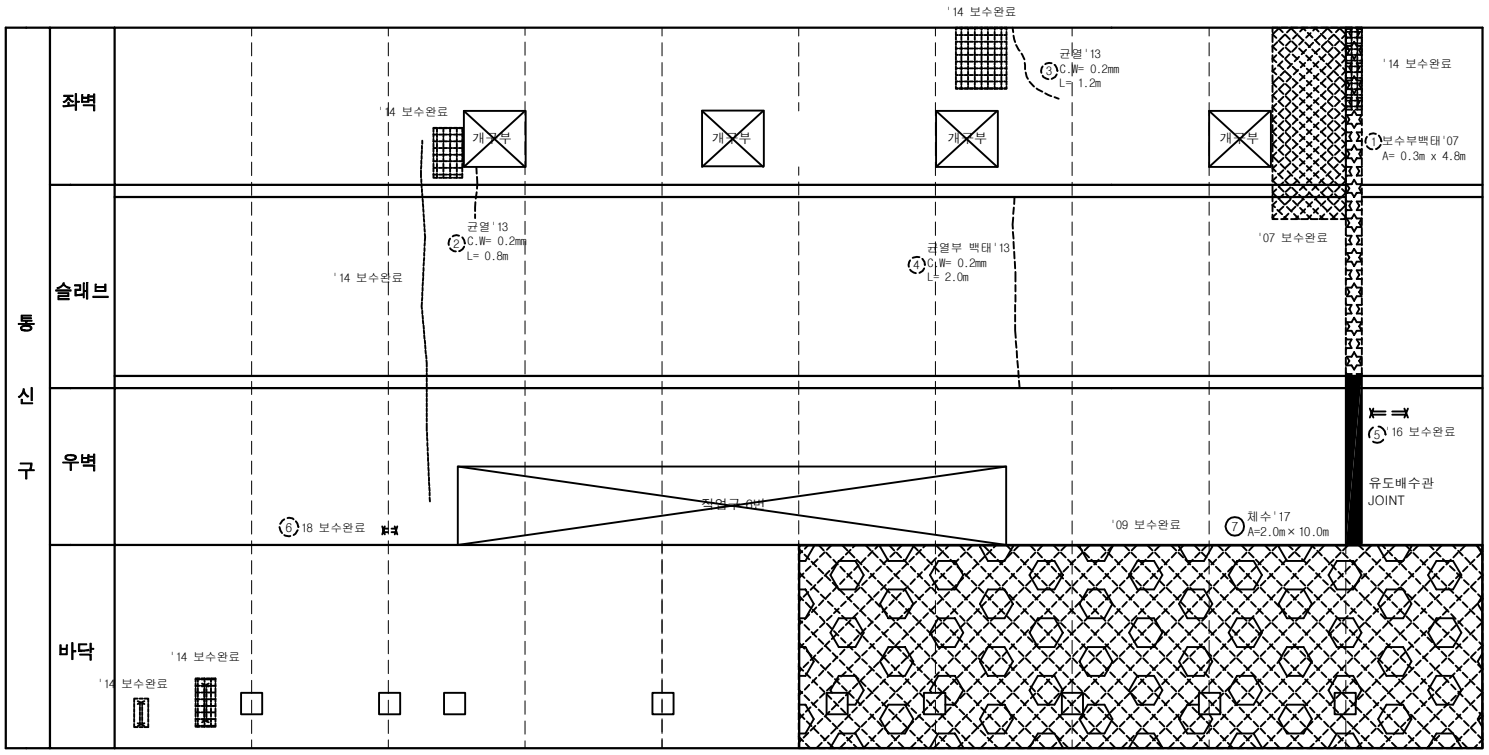

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	보수부 백태	0.3	4.80		1.44	㎡	1			-	재결함
2	2013	균열	0.2	0.80		0.80	m	1			-	
3	2013	균열	0.2	1.20		1.20	m	1			-	
4	2013	균열부백태	0.2	2.00		0.40	㎡	1			-	
5	2015	철근노출	0.1	0.50		0.05	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.06	
6	2017	철근노출	0.1	0.40		0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.05	
7	2017	체수(현재양호)	2.0	10.00		20.00	㎡	1			-	

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)

TITLE OF SHIFT

순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 작업구 6번 (순환선 825m)

KEYPLAN

SECTION



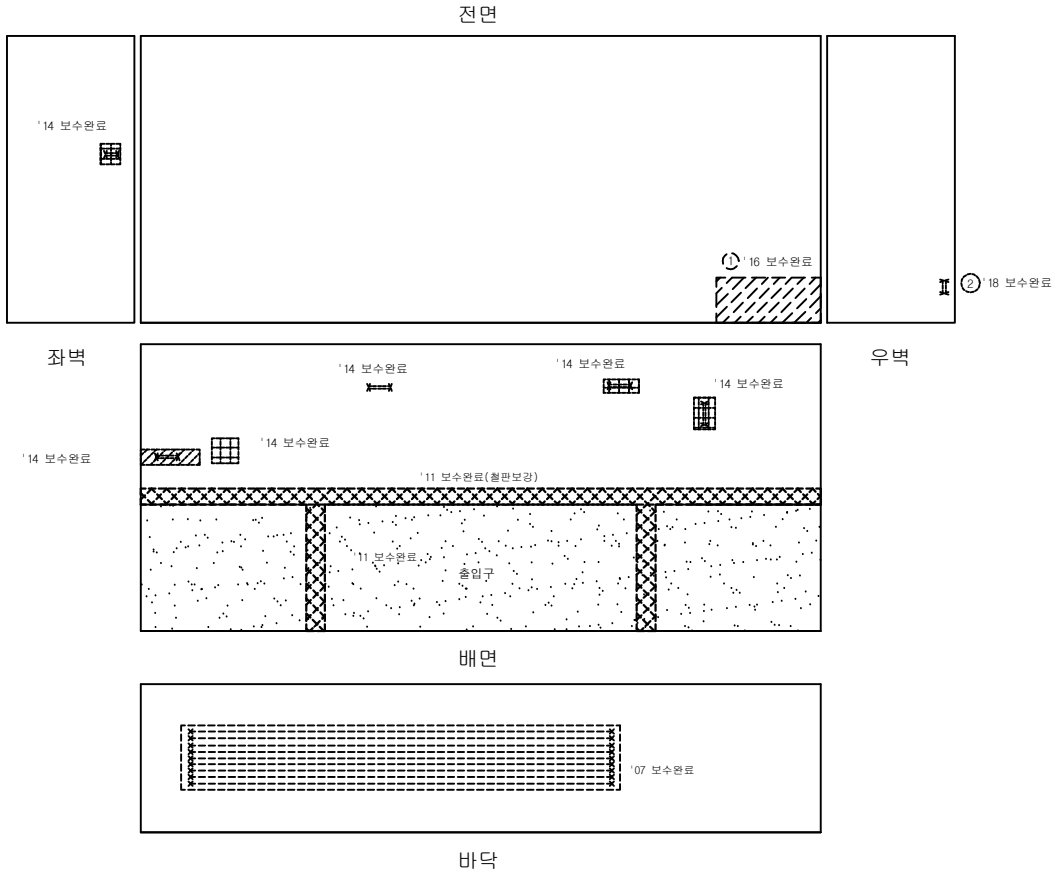

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2015	재료분리	1.5	2.00		3.00	㎡	1	2016	단면복구공법	3.60	
2	2017	철근노출	0.1	0.40		0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.05	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 작업구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+840m ~ 0+860m)





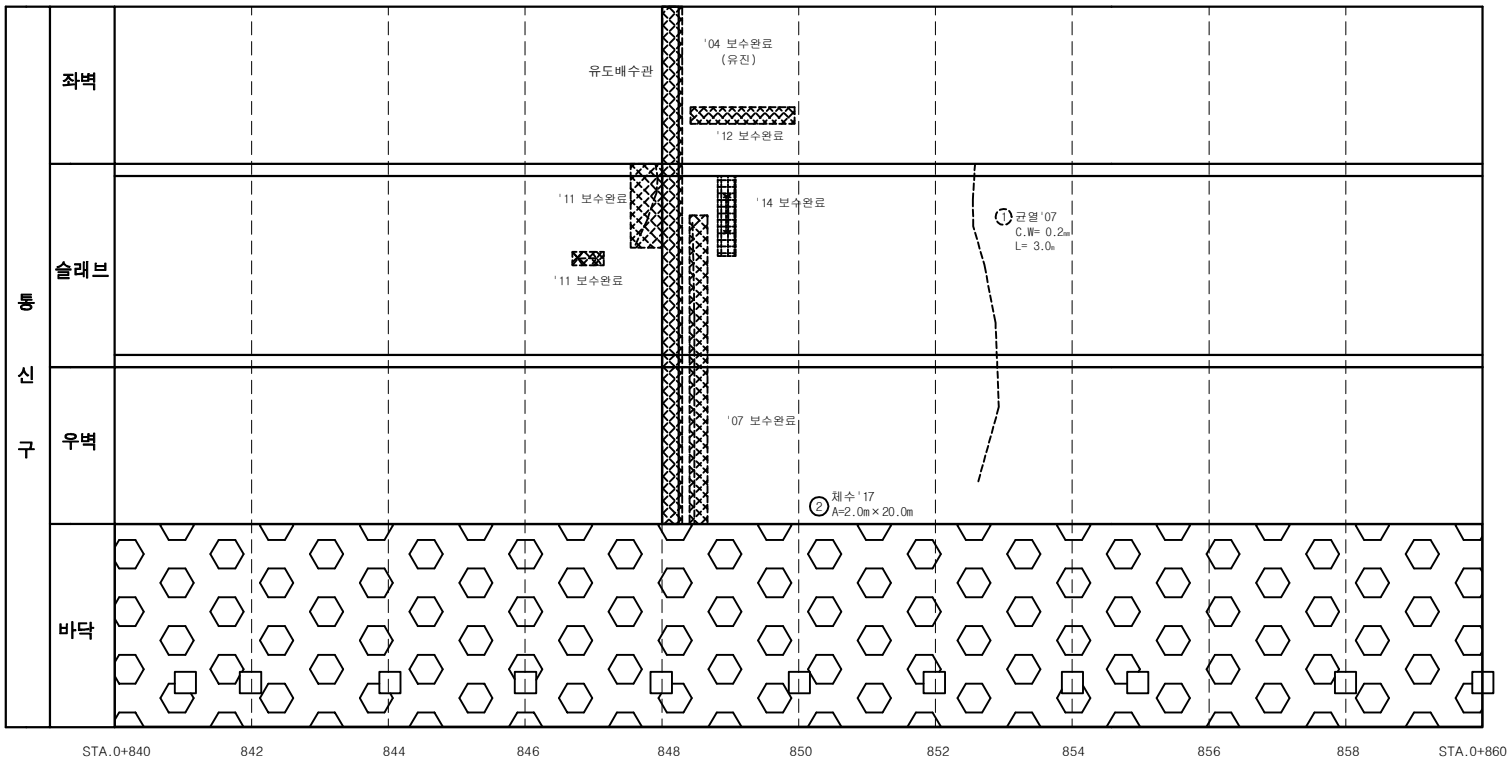

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	3.00		3.00	m	1			-	
2	2017	체수(현재양호)	2.0	20.00		40.00	㎡	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+860m ~ 0+880m)





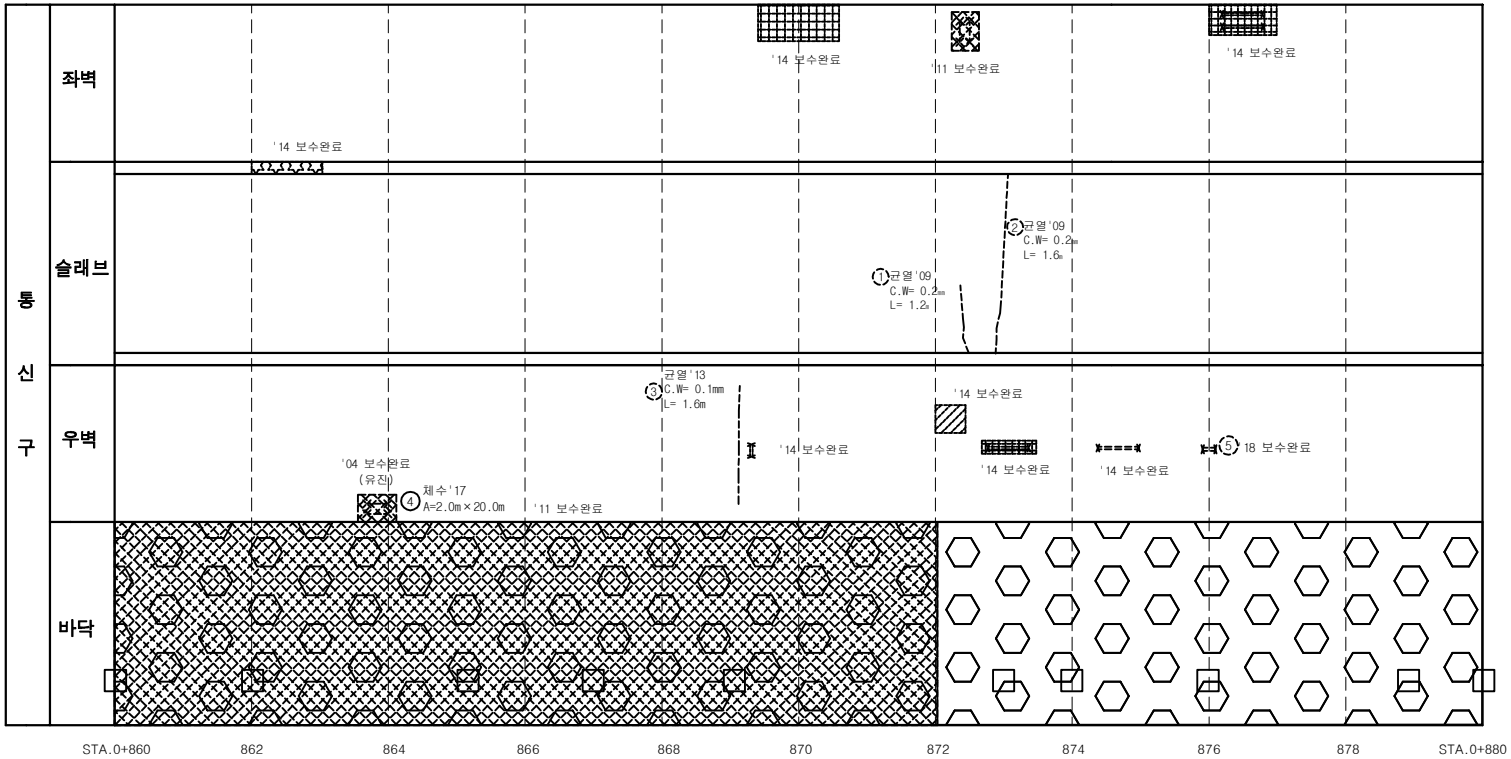

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2009	균열	0.2	1.20		1.20	m	1			-	
2	2009	균열	0.2	1.60		1.60	m	1			-	
3	2013	균열	0.1	1.60		1.60	m	1			-	
4	2017	체수(면재양호)	2.0	20.00		40.00	㎡	1			-	
5	2017	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.02	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+880m ~ 0+900m)





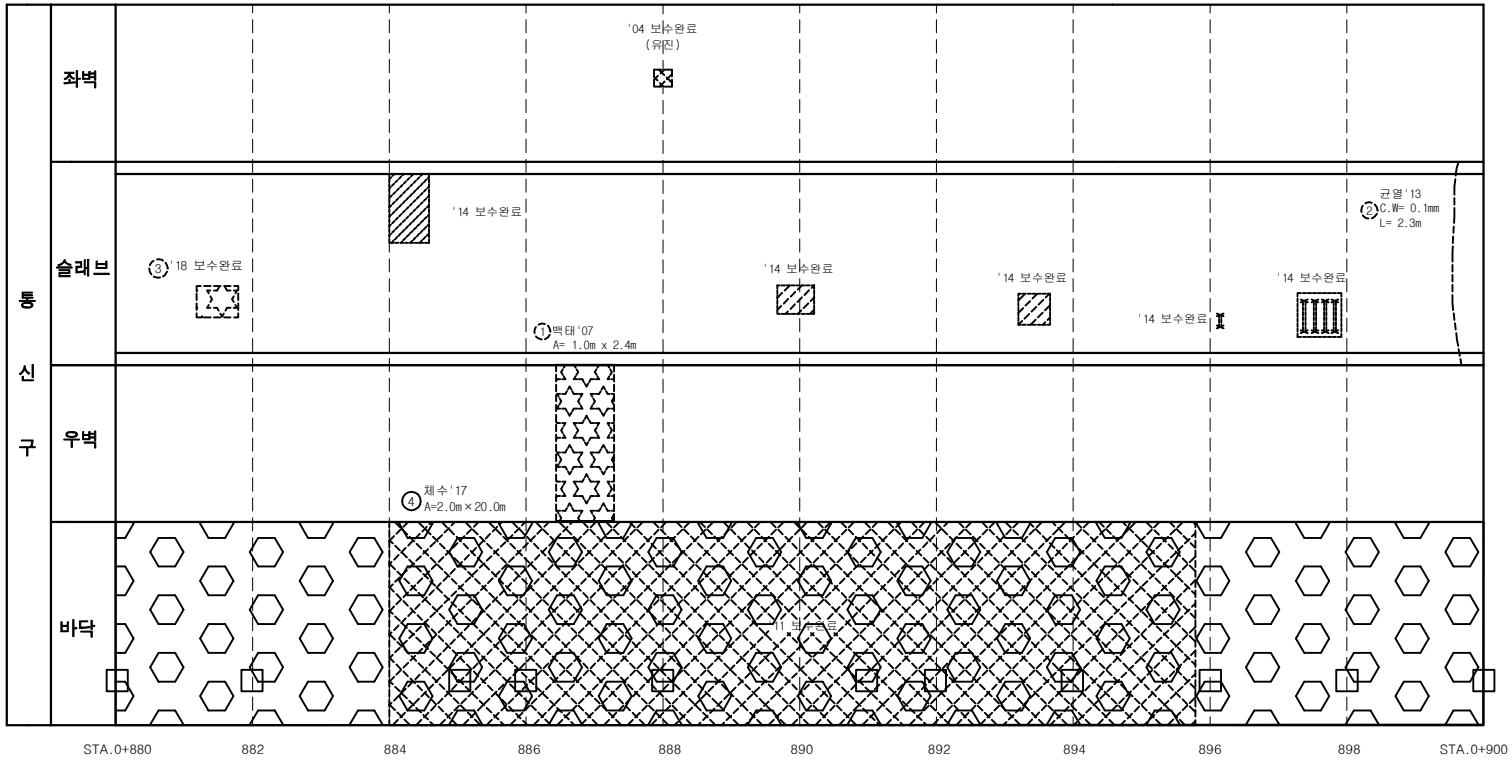

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	백태	1.0	2.40		2.40	㎡	1			-	
2	2013	균열	0.1	2.30		2.30	m	1			-	
3	2017	백태	0.4	0.4		0.16	㎡	1	2018	표면처리공법	0.19	
4	2017	체수(현재양호)	2.0	20.0		40.00	㎡	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+900m ~ 0+920m)





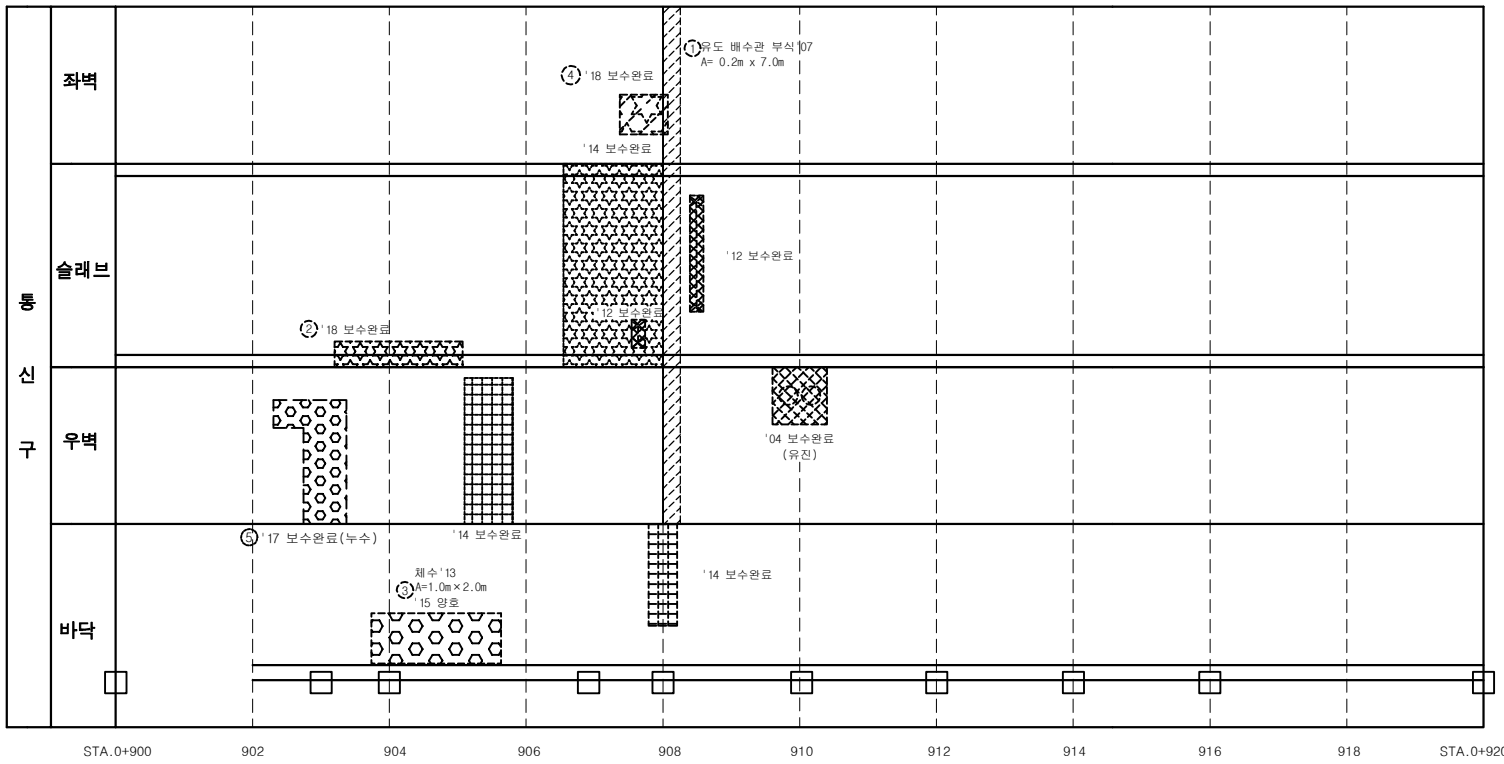

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	유도배수관부식	0.2	7.00		1.40	㎡	1			-	
2	2013	백태	0.4	2.20		0.88	㎡	1	2018	표면처리공법	1.06	
3	2013	체수(현재양호)	1.0	2.00		2.00	㎡	1			-	
4	2017	백태,열화	1.0	1.50		1.50	㎡	1	2018	표면처리공법	1.80	
5	2017	누수				0.38	㎡	1	2017	누수보수공법	0.46	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA.0+920 m ~0+940 m)





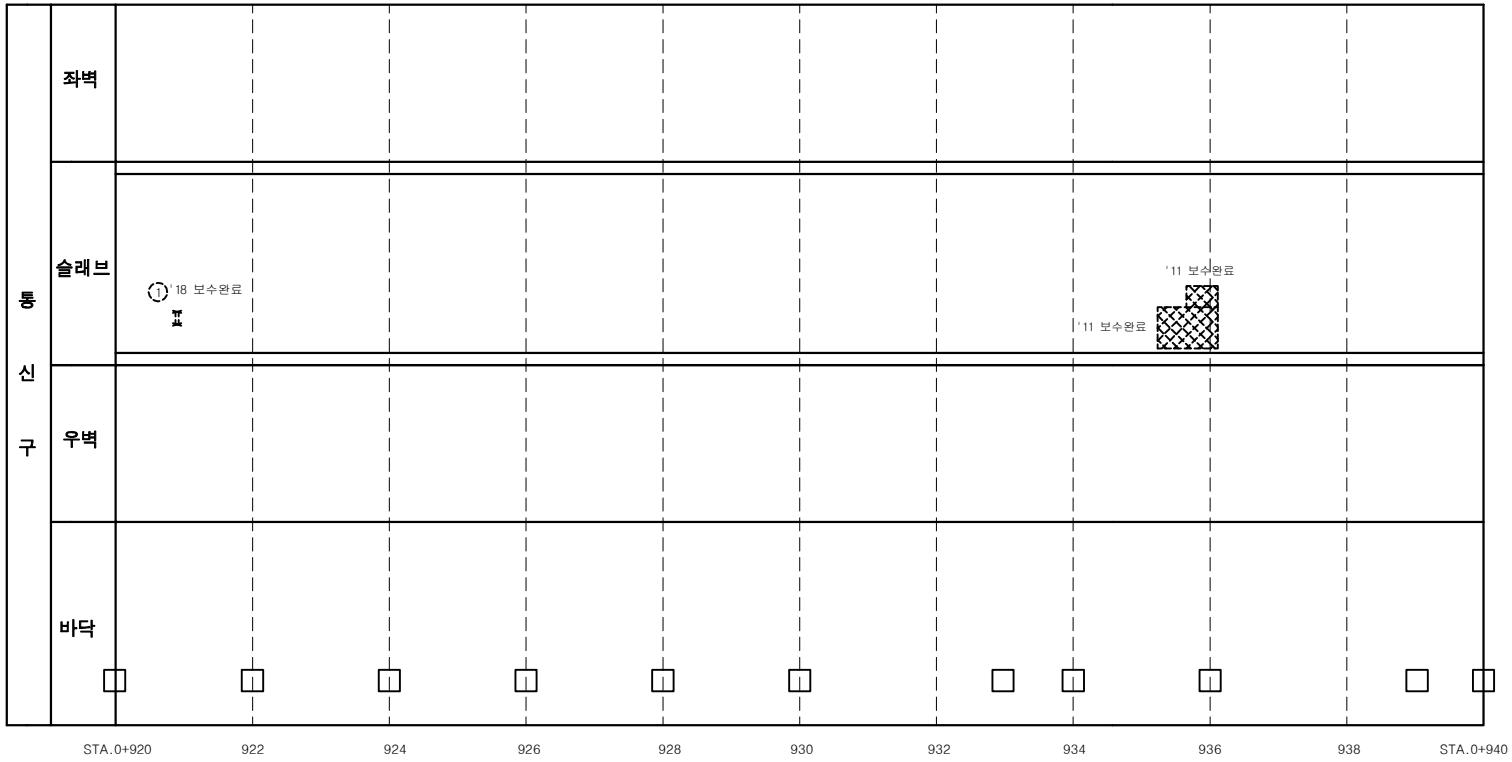

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2017	철근노출	0.1	2.00		0.20	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.24	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+940m ~ 0+960m)





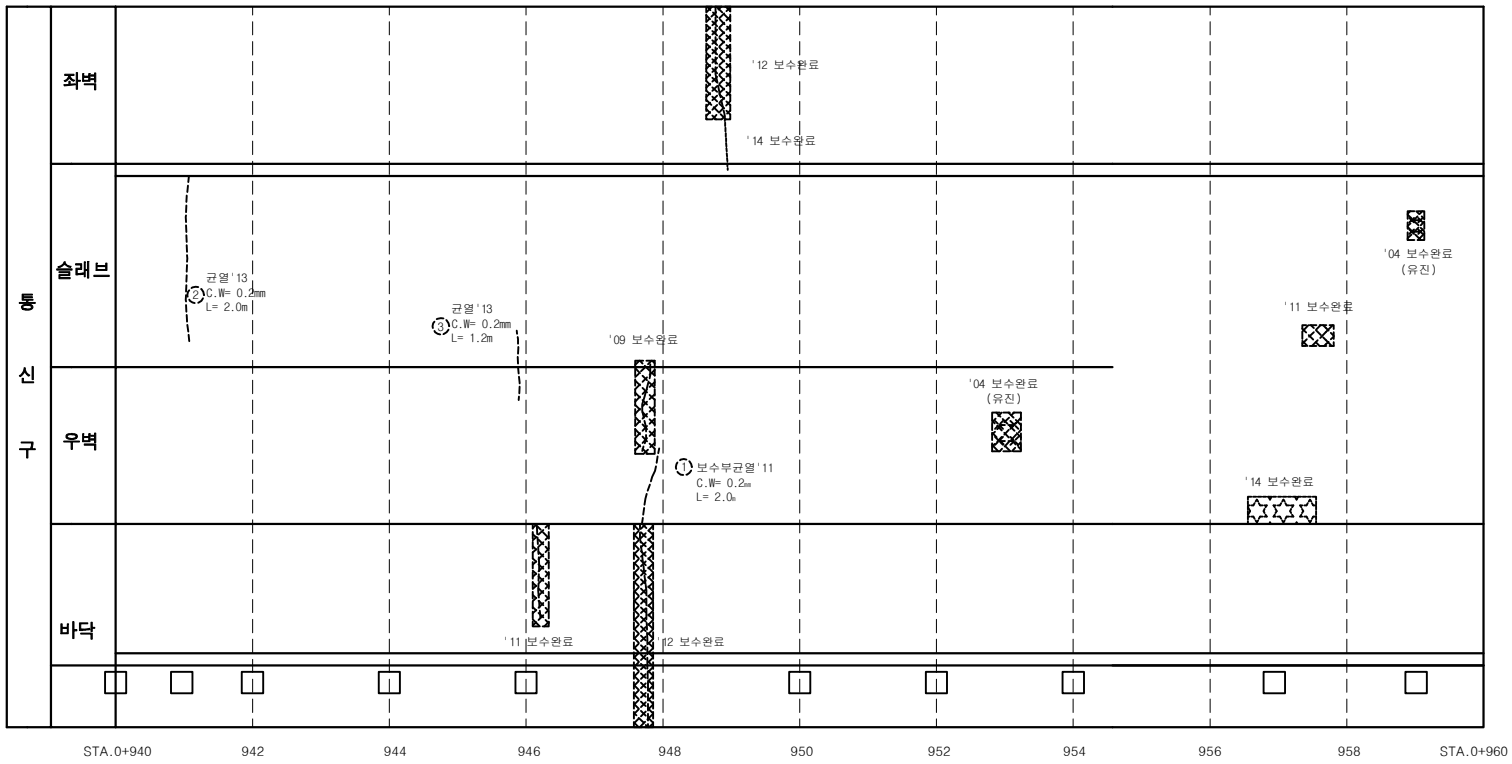

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2011	보수부 균열	0.2		1.00	1.00	m	1			-	재결함
2	2013	균열	0.2		2.00	2.00	m	1			-	
3	2013	균열	0.2		1.20	1.20	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+960m ~ 0+980m)





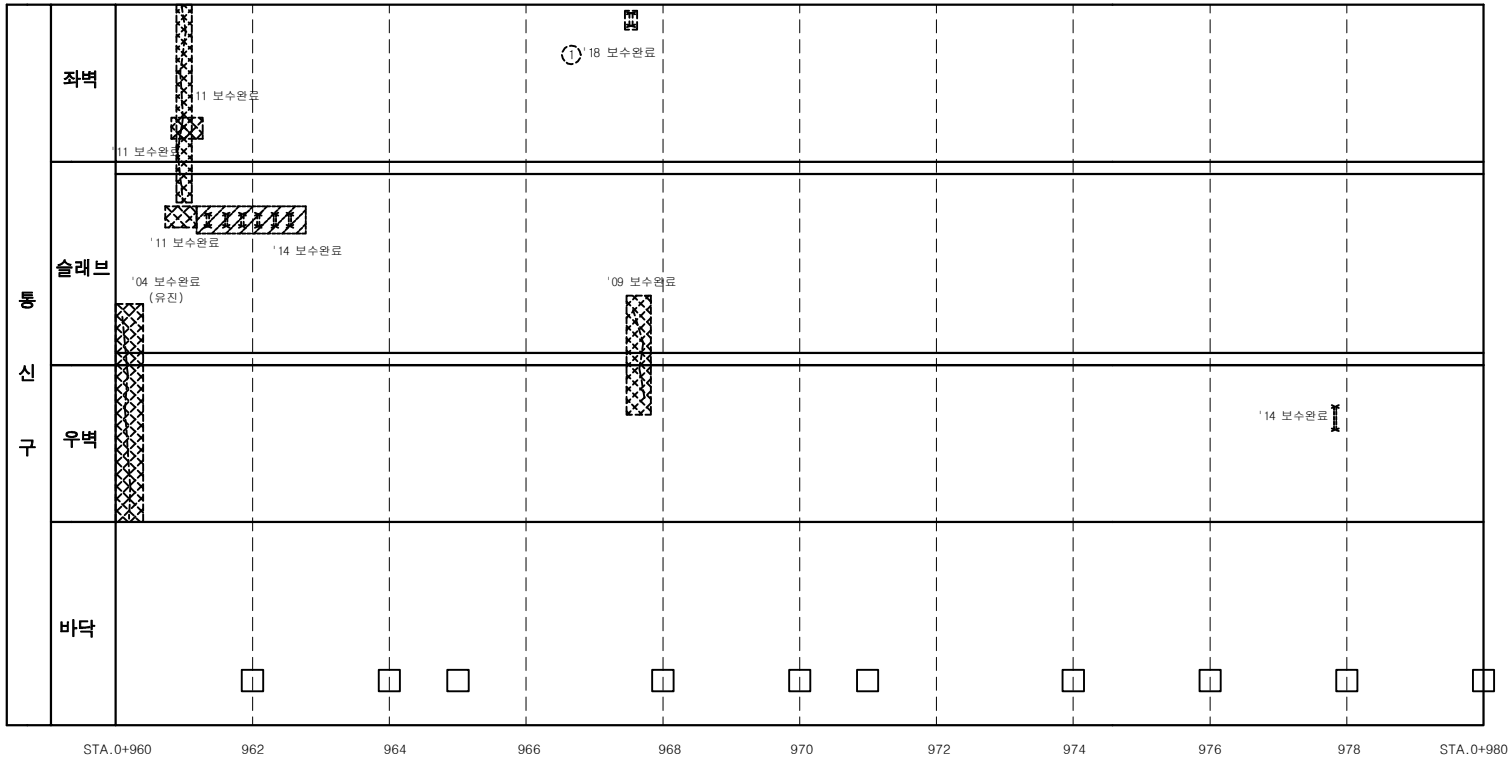

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2017	철근노출	0.2	0.20		0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.05	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 0+980m ~ 1+000m)





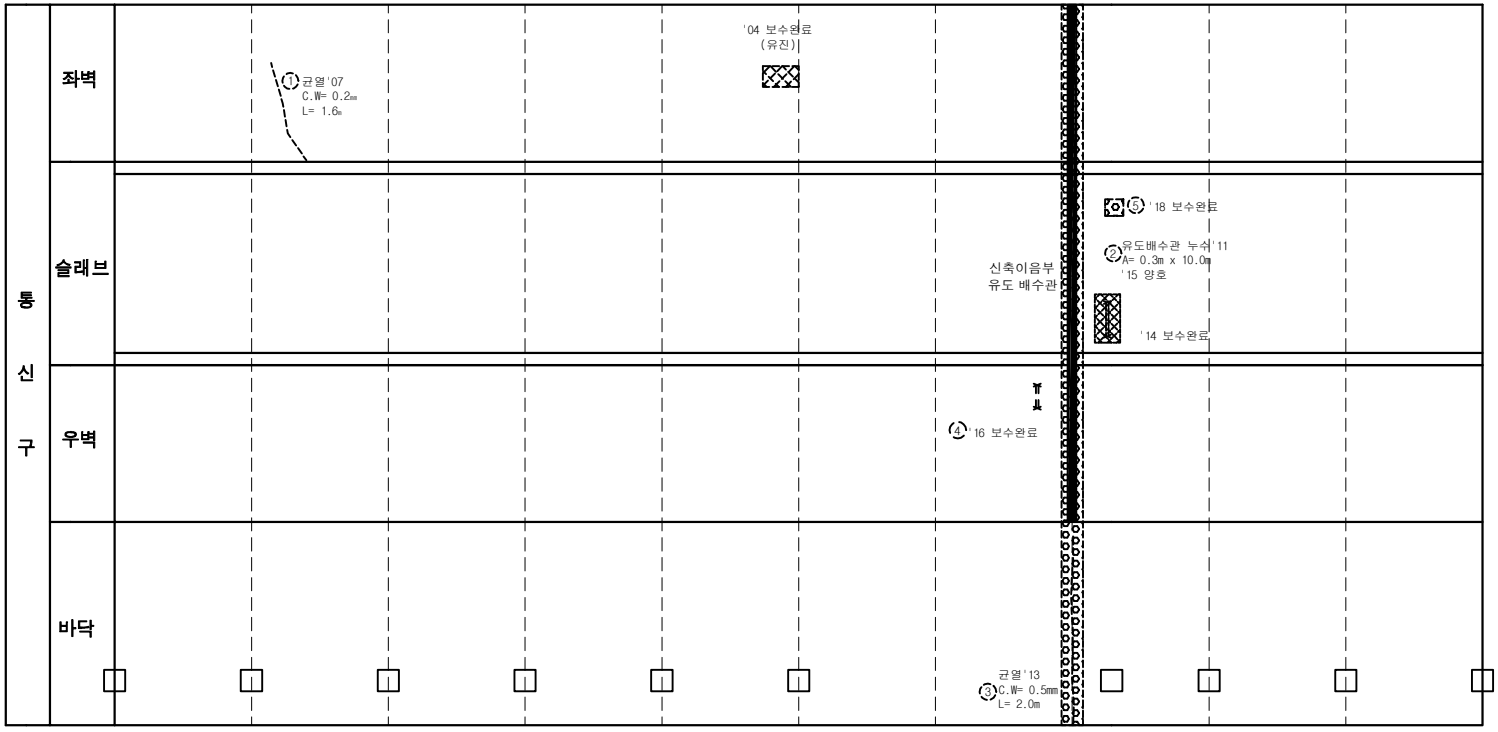

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	1.60		1.60	m	1			-	
2	2011	유도배수관누수	0.3	10.00		10.00	m	1			-	
3	2013	균열	0.5	2.00		2.00	m	1			-	중요
4	2015	철근노출	0.4	0.50		0.20	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.24	
5	-	누수	0.3	0.50		0.15	㎡	1	2018	배면누수보수	0.18	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+000m ~ 1+020m)





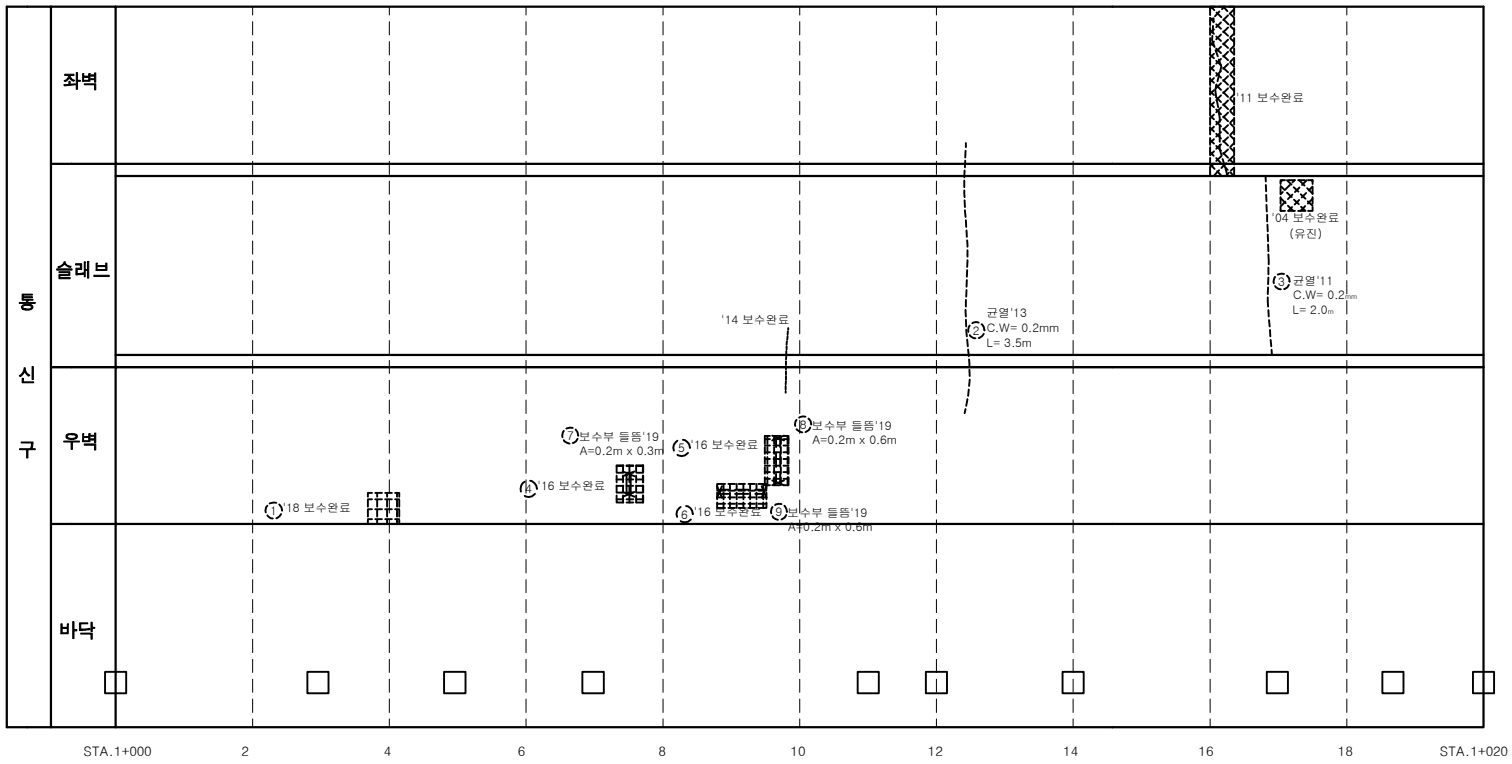

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	박락	0.3	0.30		0.09	㎡	1	2018	단면복구공법	0.11	
2	2013	균열	0.2	3.50		3.50	m	1			-	
3	2011	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
4	2015	철근노출	0.1	0.30		0.03	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.04	
5	2015	철근노출	0.2	0.60		0.12	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.14	
6	2015	철근노출	0.2	0.60		0.12	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.14	
7	2019	보수부 들뜸	0.2	0.30		0.06	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.04	재결함
8	2019	보수부 들뜸	0.2	0.60		0.12	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.14	재결함
9	2019	보수부 들뜸	0.2	0.60		0.12	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.14	재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+020m ~ 1+040m)





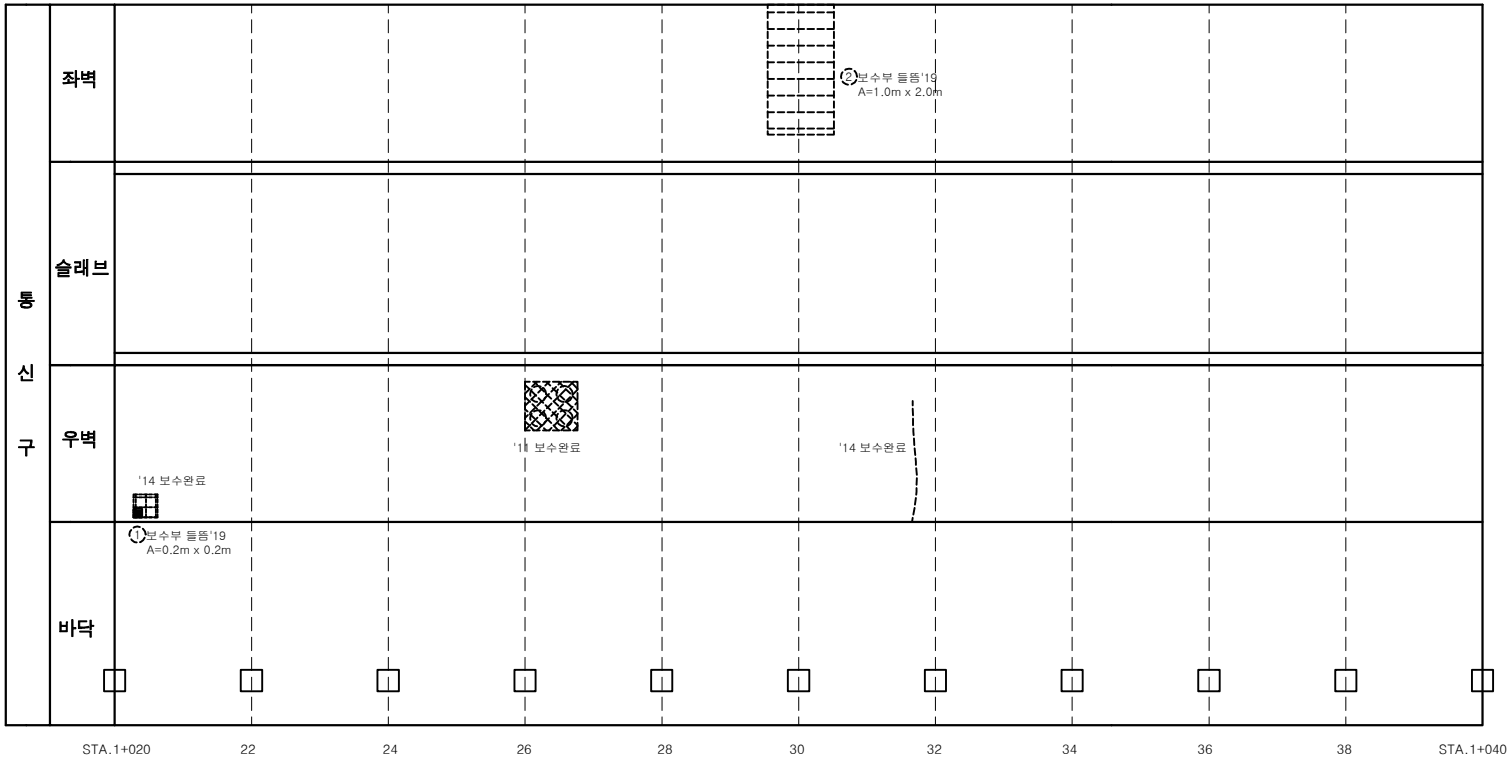

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2019	보수부 들뜸	0.2	0.20		0.04	㎡	1			-	신규
2	2019	보수부 들뜸	1.0	2.00		2.00	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+040m ~ 1+060m)





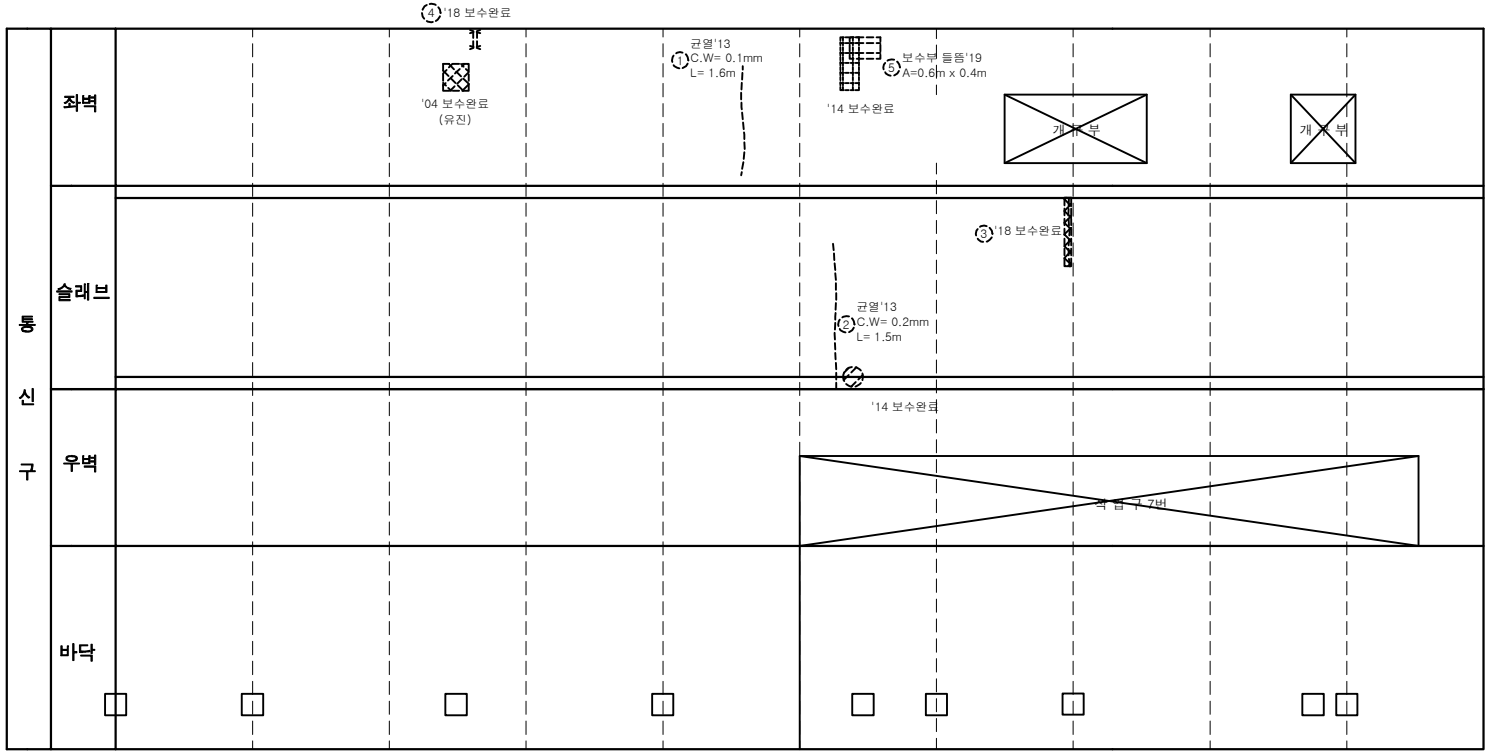

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.1	1.60		1.60	m	1			-	
2	2013	균열	0.2	1.50		1.50	m	1			-	
3	2013	균열	0.3	1.00		1.00	m	1	2018	주입보수공법	1.20	
4	2017	철근노출	0.2	0.20		0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.05	
5	2019	보수부 들뜸	0.6	0.40		0.24	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 작업구 7번 (순환선 1,050m)

KEYPLAN

SECTION



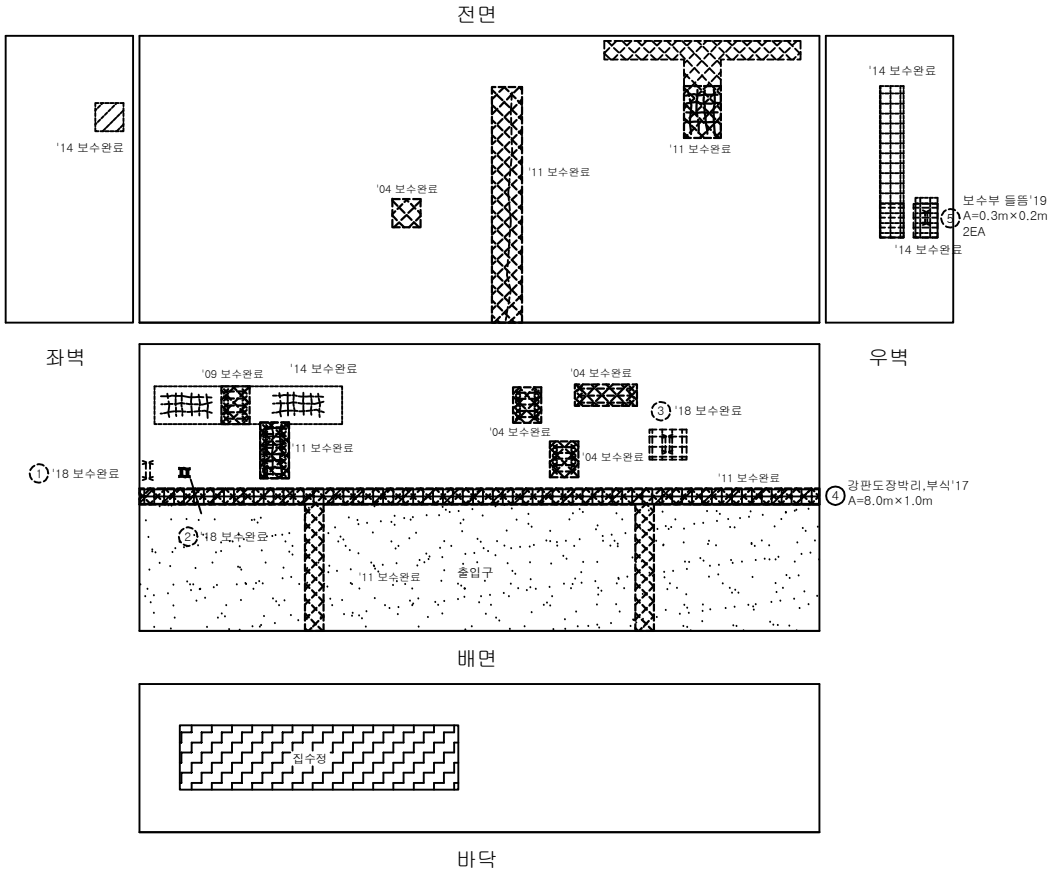

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2017	철근노출	0.2	0.40		0.08	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.10	
2	2017	철근노출	0.2	0.20		0.08	㎡	2	2018	단면복구(방청)	0.10	
3	2017	박리,철근노출	0.2	0.20		0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.05	
4	2017	강판도장박리,부식	8.0	1.00		8.00	㎡	1			-	
5	2019	보수부 들뜸	0.3	0.20		0.12	㎡	2			-	신규

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)

TITLE OF SHIFT

작업구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+060m ~ 1+080m)



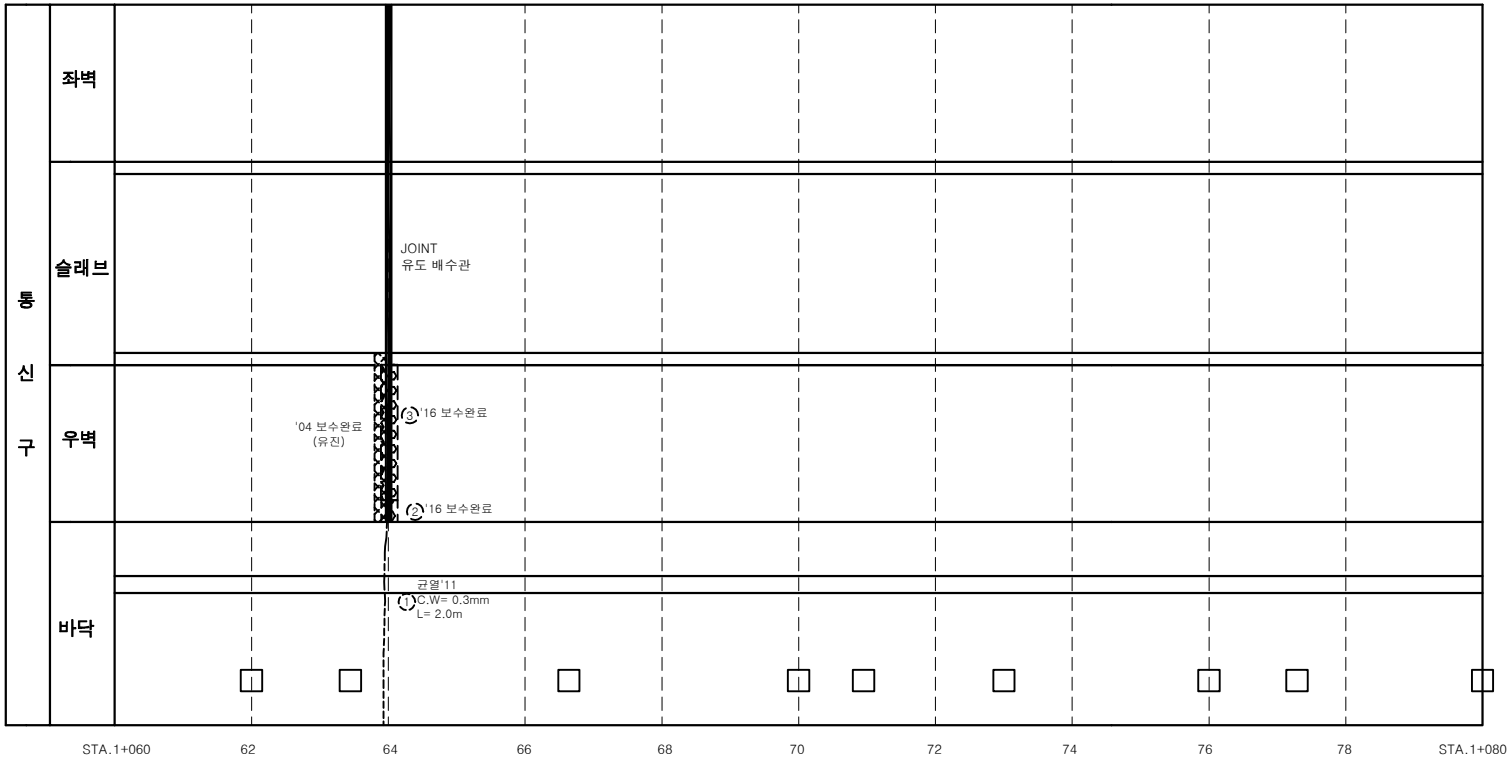

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2011	균열	0.3	2.00		2.00	m	1			-	중요
2	2013	누수		0.30		0.30	m	1	2016	누수보수공법	0.36	
3	2013	누수		2.00		2.00	m	1	2016	누수보수공법	2.40	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+080m ~ 1+100m)





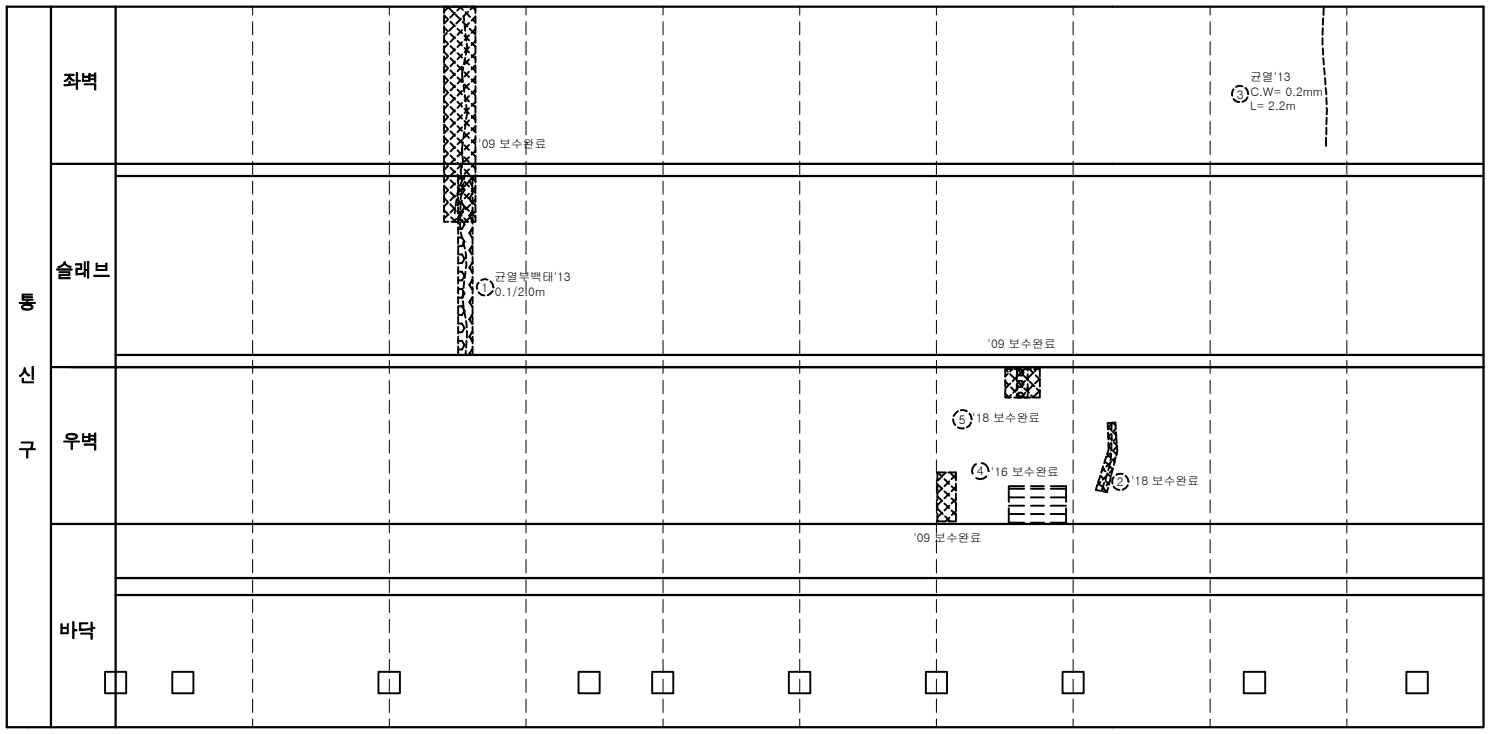

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열부백태	0.1	2.00		0.20	㎡	1			-	
2	2013	균열	0.1	0.80		0.80	m	1	2018	표면처리공법	0.96	
3	2013	균열	0.1	2.20		2.20	m	1			-	
4	2015	보수부 들뜸	1.0	1.00		1.00	㎡	1	2016	단면복구공법	1.20	
5	2017	누수		0.60		0.60	m	1	2018	습식균열보수	0.72	

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)

TITLE OF SHIFT

순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+100m ~ 1+120m)





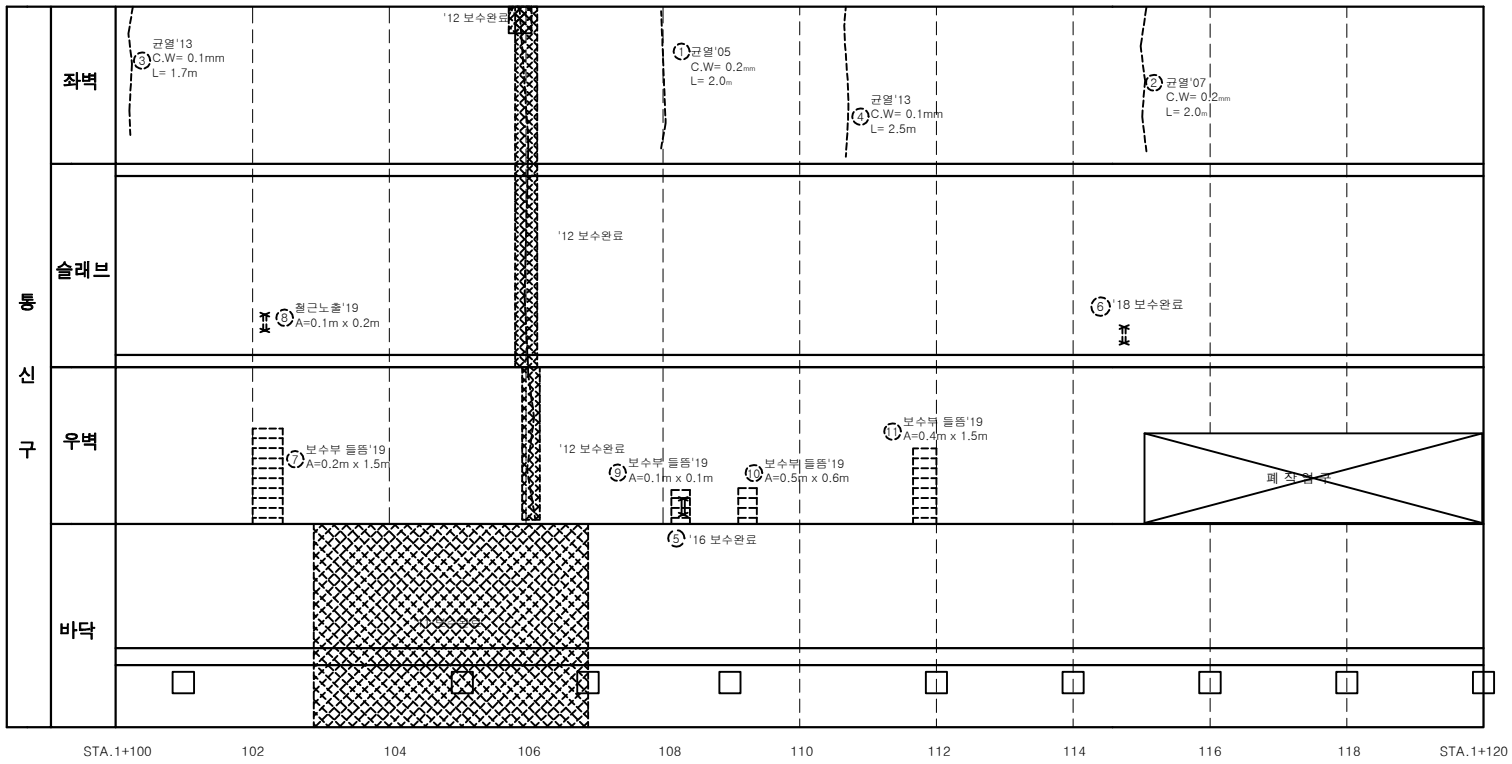

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2005	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
3	2013	균열	0.1	1.70		1.70	m	1			-	
4	2013	균열	0.1	2.50		2.50	m	1			-	
5	2015	철근노출	0.1	0.10		0.01	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.01	
6	2017	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.02	
7	2019	보수부 들뜸	0.2	1.50		0.30	㎡	1			-	신규
8	2019	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1			-	신규
9	2019	보수부 들뜸	0.1	0.10		0.01	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.01	재결함
10	2019	보수부 들뜸	0.5	0.60		0.30	㎡	1			-	신규
11	2019	보수부 들뜸	0.2	1.50		0.30	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 폐 작업구 (순환선 1,120m)

KEYPLAN

SECTION



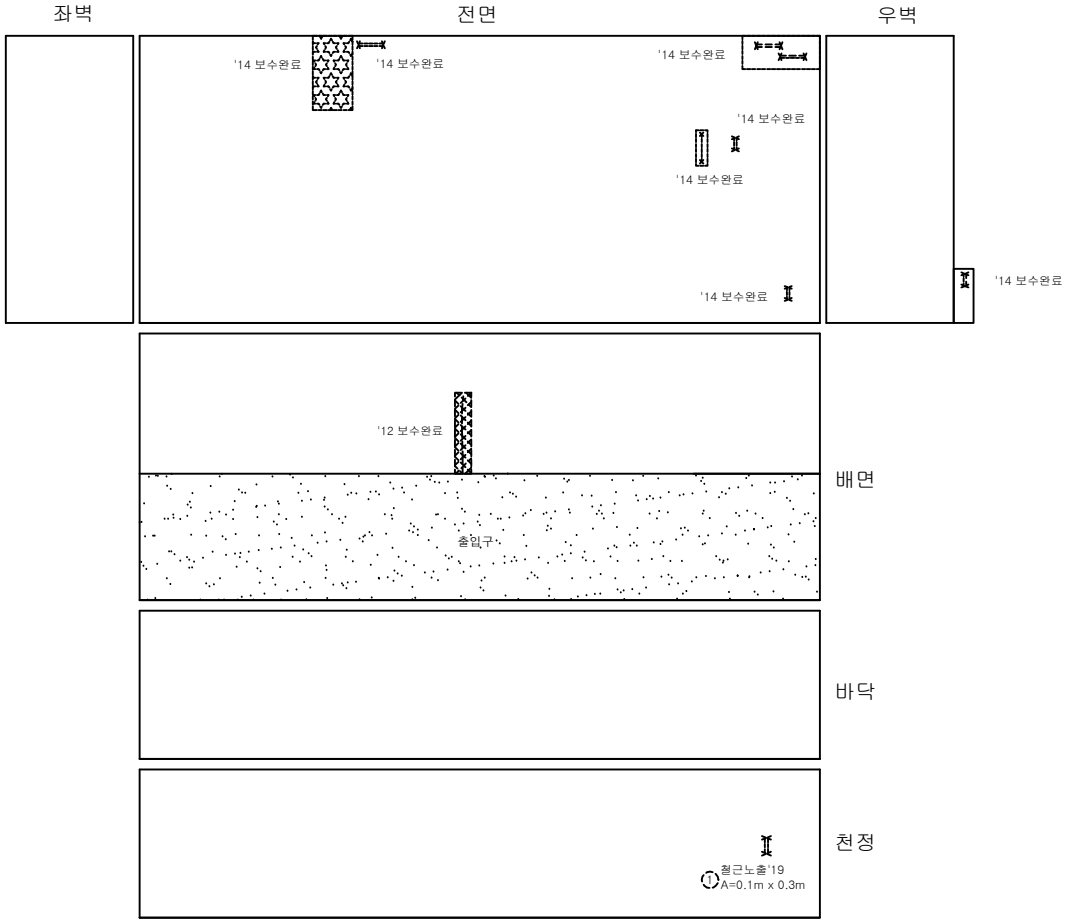

손 상 물 량 표

연번	적용 년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2019	철근노출	0.1	0.30		0.03	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **작업구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+120m ~ 1+140m)





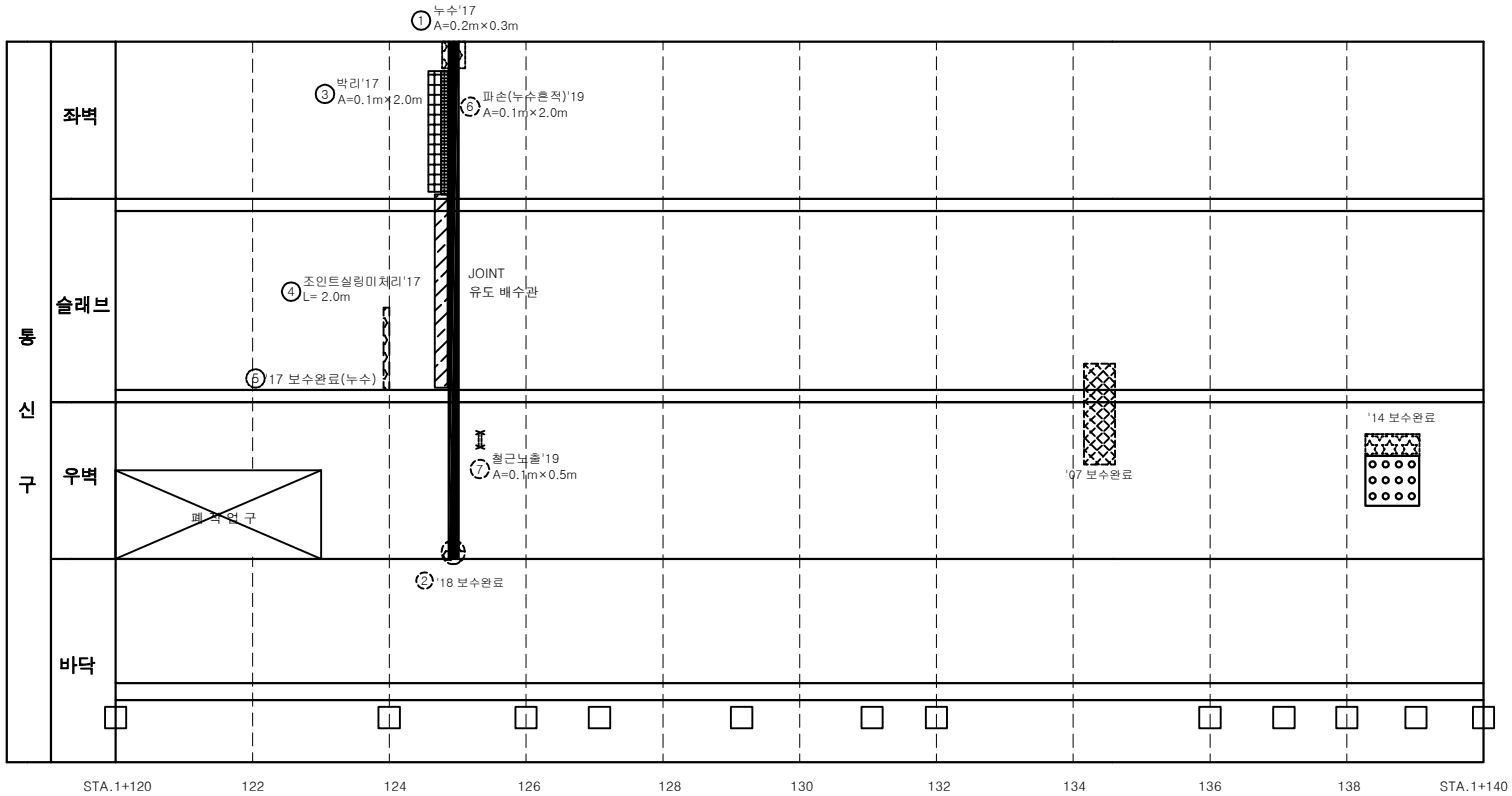

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2017	누수	0.2	0.30		0.06	㎡	1			-	
2	2013	누수		0.30		0.30	m	1	2018	습식균열보수	0.36	
3	2017	박리	0.1	2.00		0.20	㎡	1			-	
4	2017	조인트실링미처리		2.00		2.00	m	1			-	
5	2017	누수				1.00	m	1	2017	누수보수공법	1.20	
6	2019	파손(누수흔적)	0.1	2.00		0.20	㎡	1			-	신규
7	2019	철근노출	0.1	0.50		0.05	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+140m ~ 1+160m)





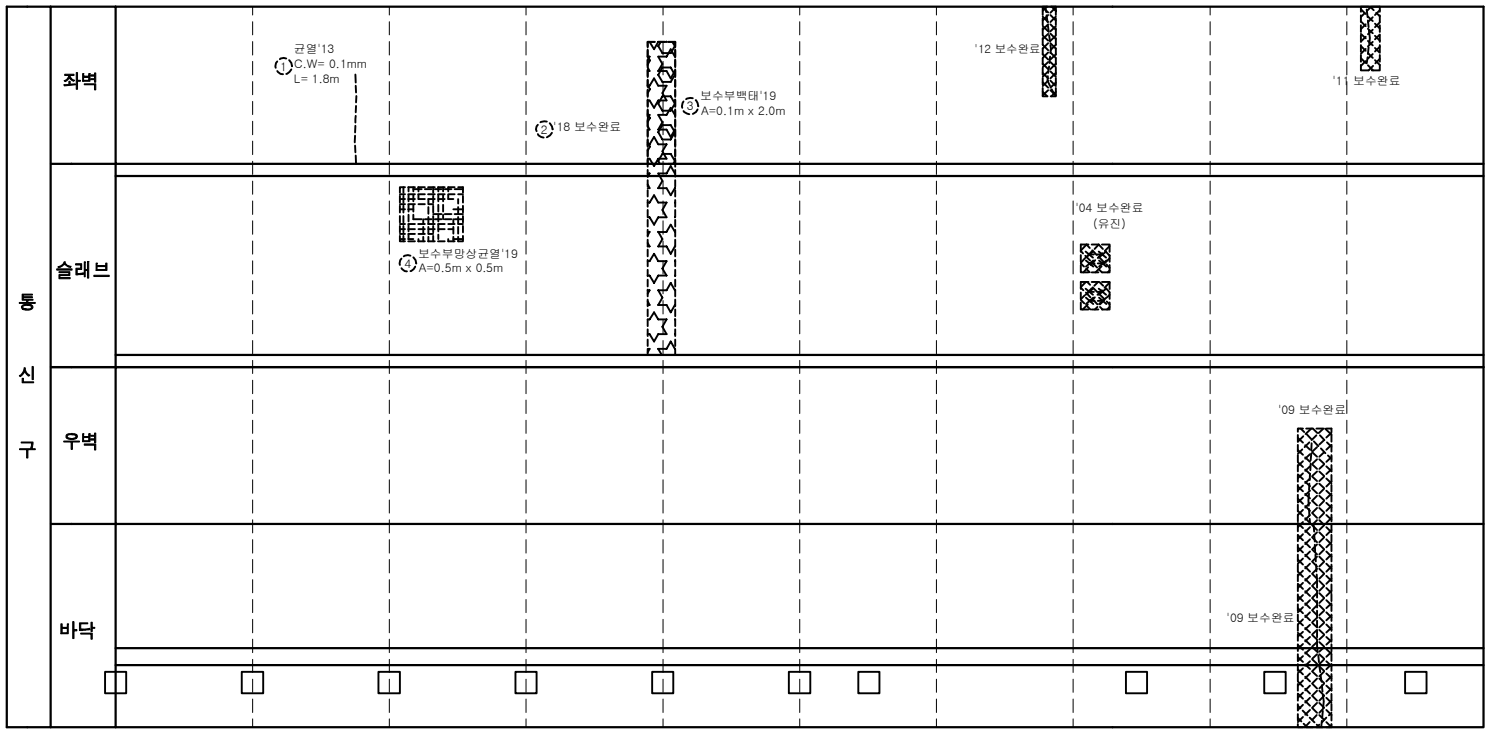

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.1	1.80		1.80	m	1			-	
2	2013	백태	0.2	4.00		0.80	㎡	1	2018	표면처리공법	0.96	
3	2019	보수부 백태	0.1	2.00		0.20	㎡	1	2018	표면처리공법	0.96	재결함
4	2019	보수부 망상균열	0.5	0.50		0.25	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+160m ~ 1+180m)





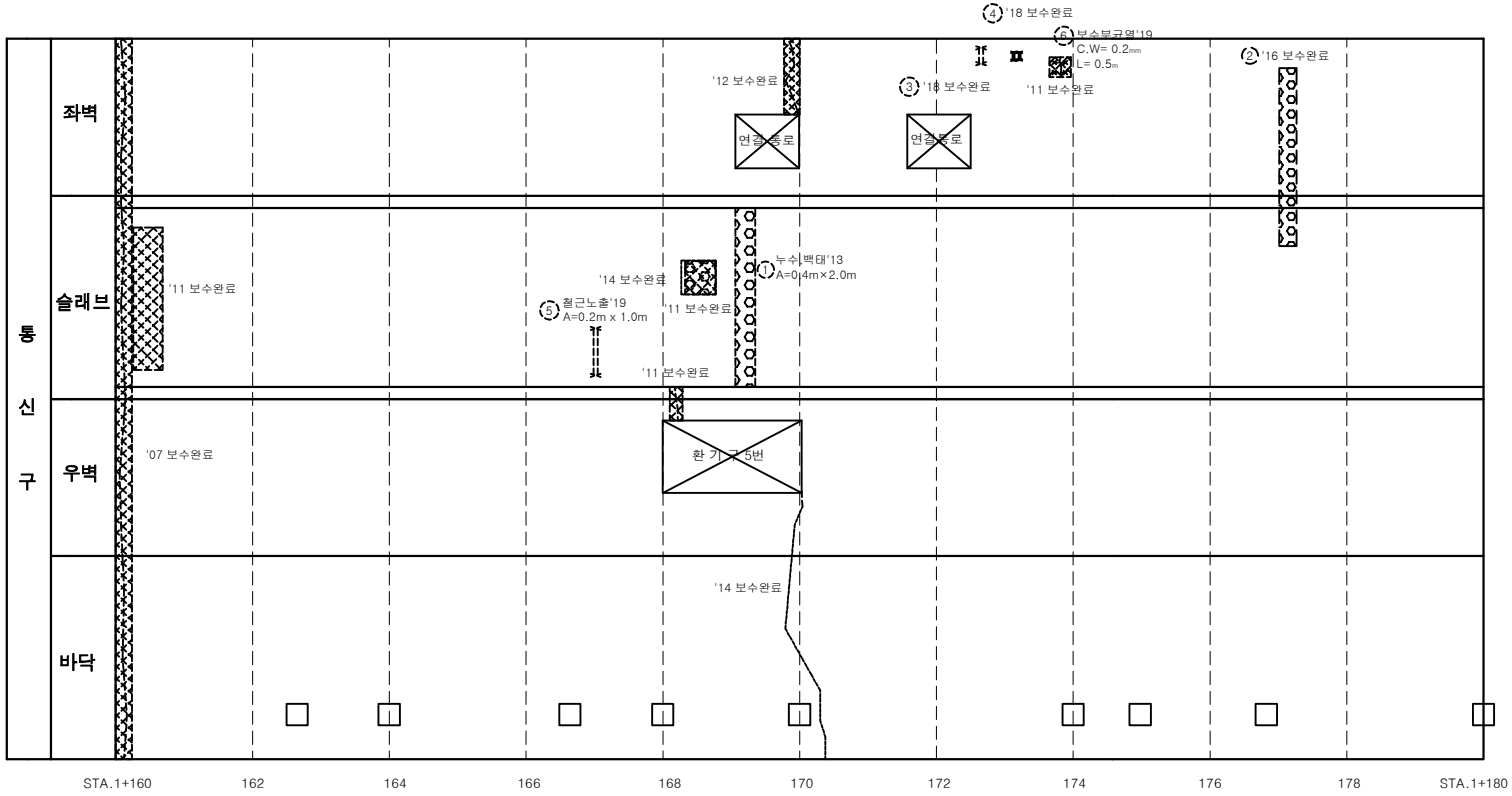

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	누수|백태	0.4	2.00		0.80	㎡	1			-	
2	2015	누수흔적	0.2	2.00		0.40	㎡	1	2016	누수보수공법	0.48	
3	2017	철근노출	0.2	0.30		0.06	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.07	
4	2017	철근노출	0.1	0.20		0.04	㎡	2	2018	단면복구(방청)	0.05	
5	2019	철근노출	0.2	1.00		0.20	㎡	1			-	신규
6	2019	보수부균열	0.2	0.50		0.50	m	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

환기구 5번 (순환선 1,166m)

KEYPLAN

SECTION

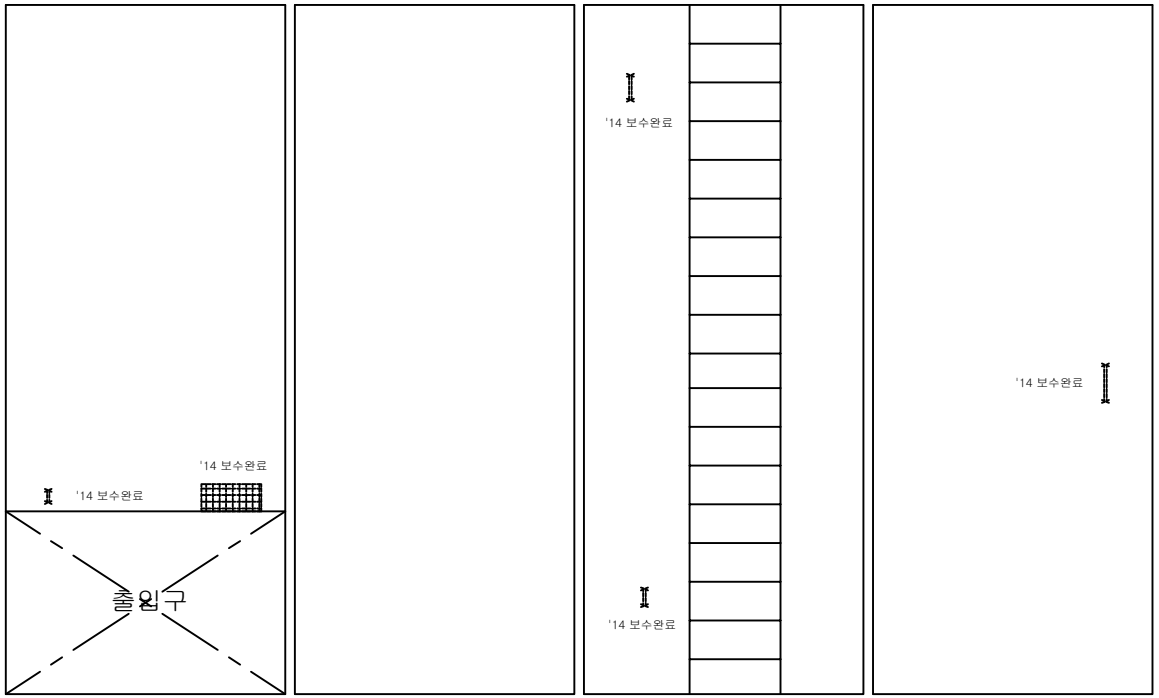

배면 좌벽 전면 우벽

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+180m ~ 1+200m)





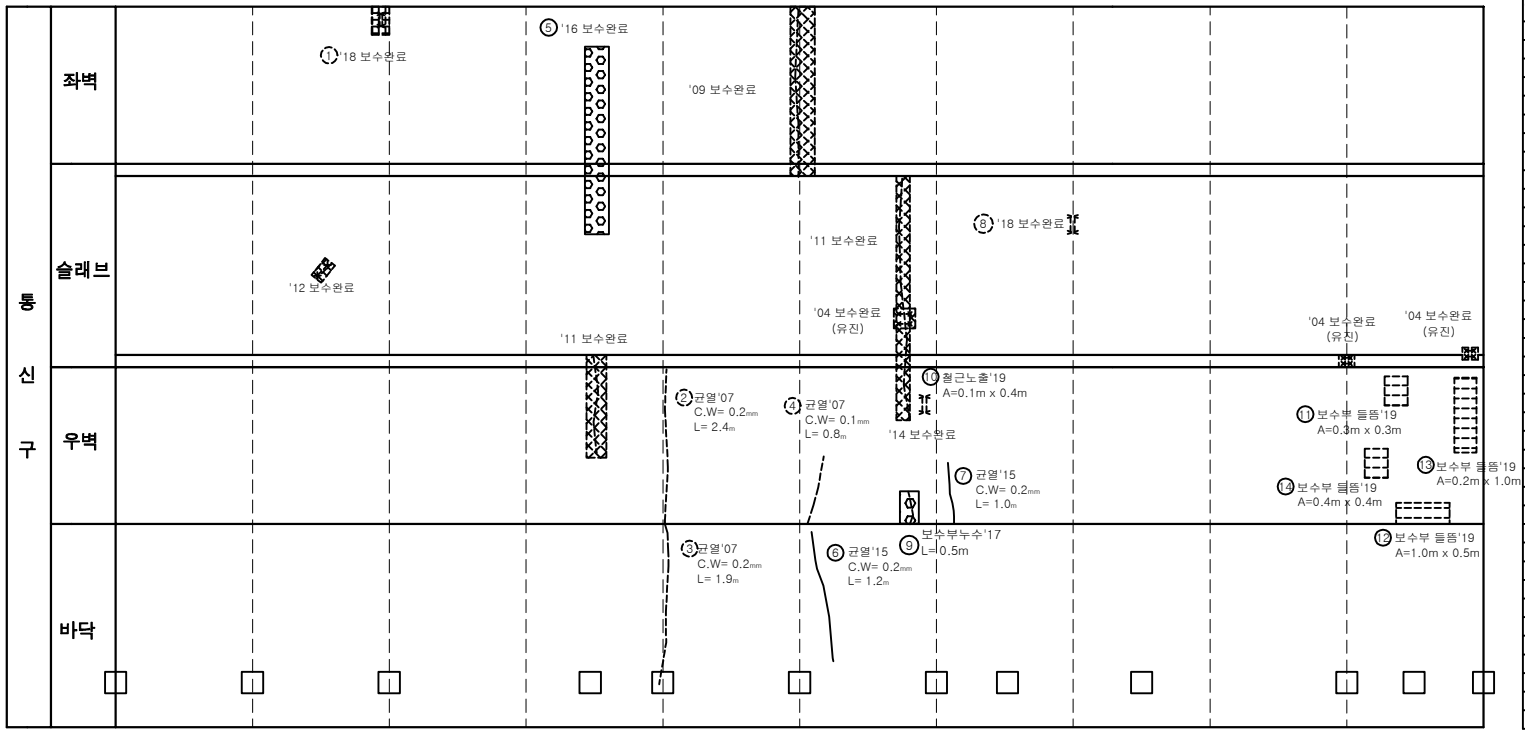

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	철근노출,박락	0.1	0.20		0.02	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.02	중요
2	2007	균열	0.2	2.40		2.40	m	1			-	
3	2007	균열	0.2	1.90		1.90	m	1			-	
4	2007	균열	0.1	0.80		0.80	m	1			-	
5	2015	누수흔적	0.1	2.00		0.20	㎡	1	2016	누수보수공법	0.24	
6	2015	균열	0.2	1.20		1.20	m	1			-	
7	2015	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	
8	2017	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.02	
9	2017	보수부 누수		0.50		0.50	m	1			-	재결함
10	2019	철근노출	0.1	0.40		0.04	㎡	1			-	신규
11	2019	보수부 들뜸	0.3	0.30		0.09	㎡	1			-	신규
12	2019	보수부 들뜸	1.0	0.50		0.50	㎡	1			-	신규
13	2019	보수부 들뜸	0.2	1.00		0.20	㎡	1			-	신규
14	2019	보수부 들뜸	0.4	0.40		0.16	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)

TITLE OF SHIFT

순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+200m ~ 1+220m)





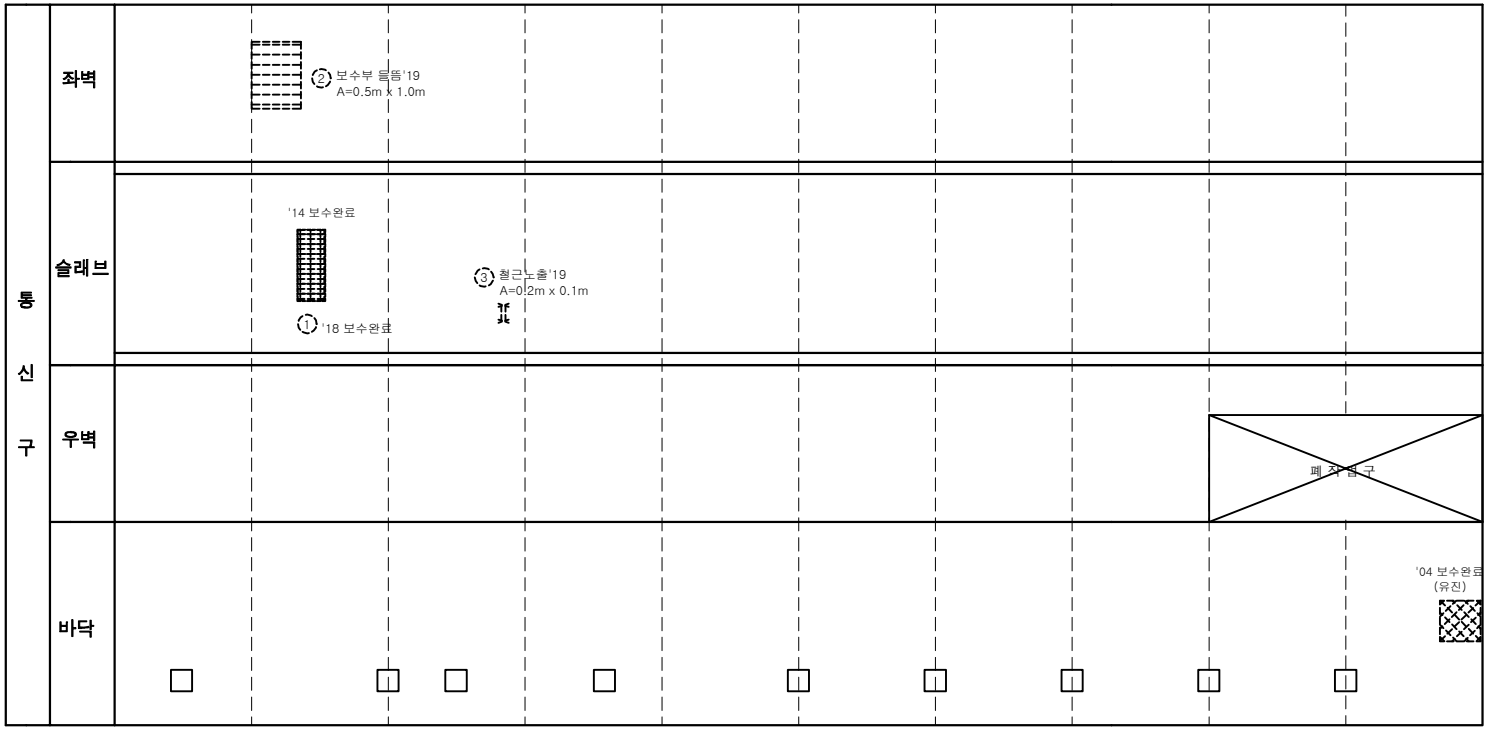

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2017	보수부 들뜸	0.5	0.60		0.30	㎡	1	2018	단면복구공법	0.36	
2	2019	보수부 들뜸	0.5	1.00		0.50	㎡	1			-	신규
3	2019	철근노출	0.2	0.10		0.02	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 폐 작업구 (순환선 1220m)

KEYPLAN

SECTION



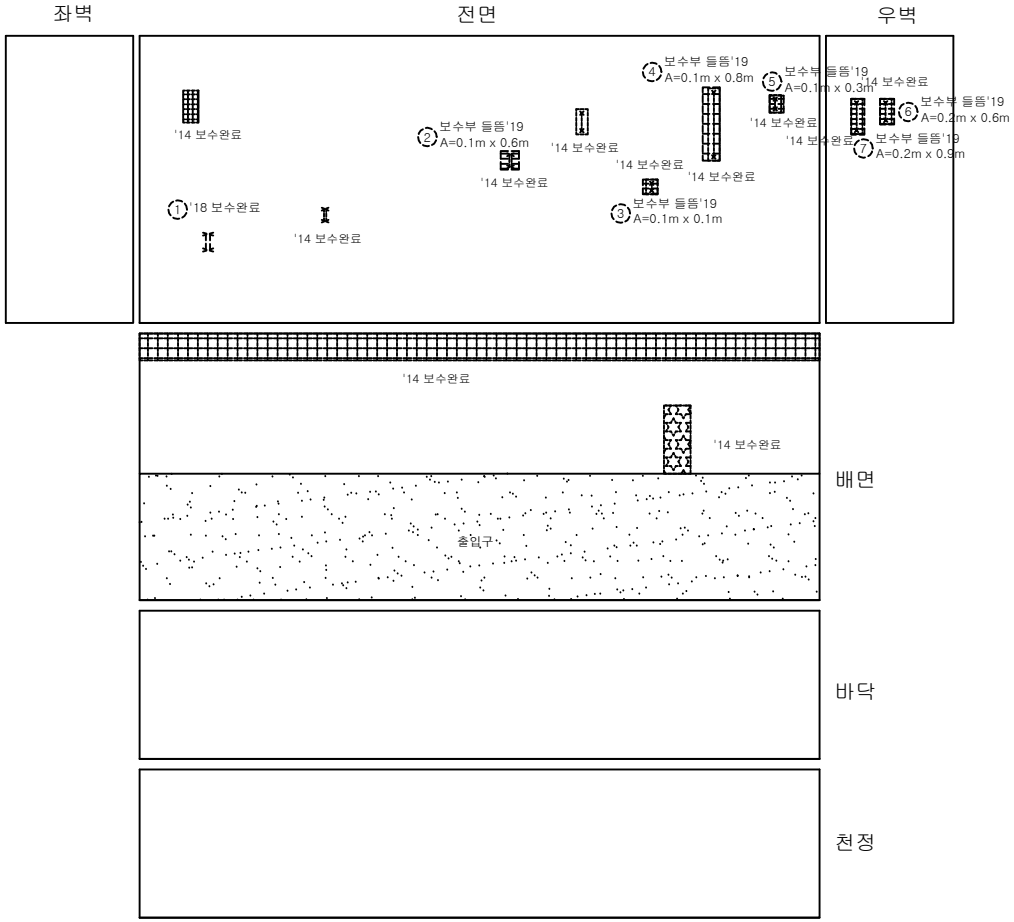

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2017	철근노출	0.1	0.40		0.04	㎡	1			-	중요
2	2019	보수부 들뜸	0.1	0.60		0.06	㎡	1			-	신규
3	2019	보수부 들뜸	0.1	0.10		0.01	㎡	1			-	신규
4	2019	보수부 들뜸	0.1	0.80		0.08	㎡	1			-	신규
5	2019	보수부 들뜸	0.1	0.30		0.03	㎡	1			-	신규
6	2019	보수부 들뜸	0.2	0.60		0.12	㎡	1			-	신규
7	2019	보수부 들뜸	0.2	0.90		0.18	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **작업구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+220m ~ 1+240m)





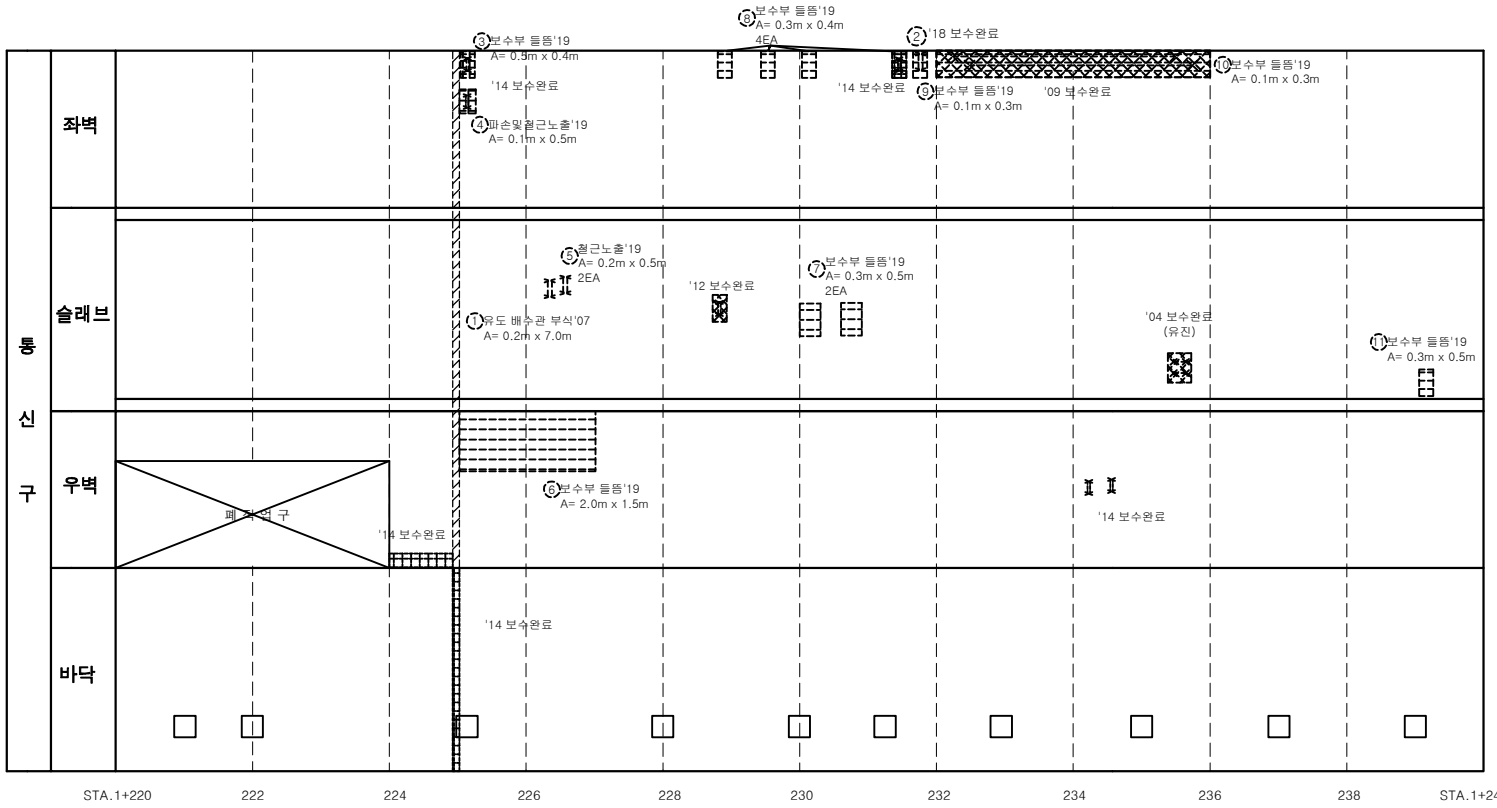

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	유도배수관부식	0.2	7.00		1.40	㎡	1			-	
2	2017	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.02	
3	2019	보수부 들뜸	0.5	0.40		0.20	㎡	1			-	신규
4	2019	파손및철근노출	0.1	0.50		0.05	㎡	1			-	신규
5	2019	철근노출	0.2	0.50		0.20	㎡	2			-	신규
6	2019	보수부 들뜸	2.0	1.50		3.00	㎡	1			-	신규
7	2019	보수부 들뜸	0.3	0.50		0.30	㎡	2			-	신규
8	2019	보수부 들뜸	0.3	0.40		0.48	㎡	4			-	신규
9	2019	보수부 들뜸	0.3	0.40		0.12	㎡	1			-	신규
10	2019	보수부 들뜸	0.1	0.30		0.03	㎡	1			-	신규
11	2019	보수부 들뜸	0.3	0.50		0.15	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+240m ~ 1+260m)





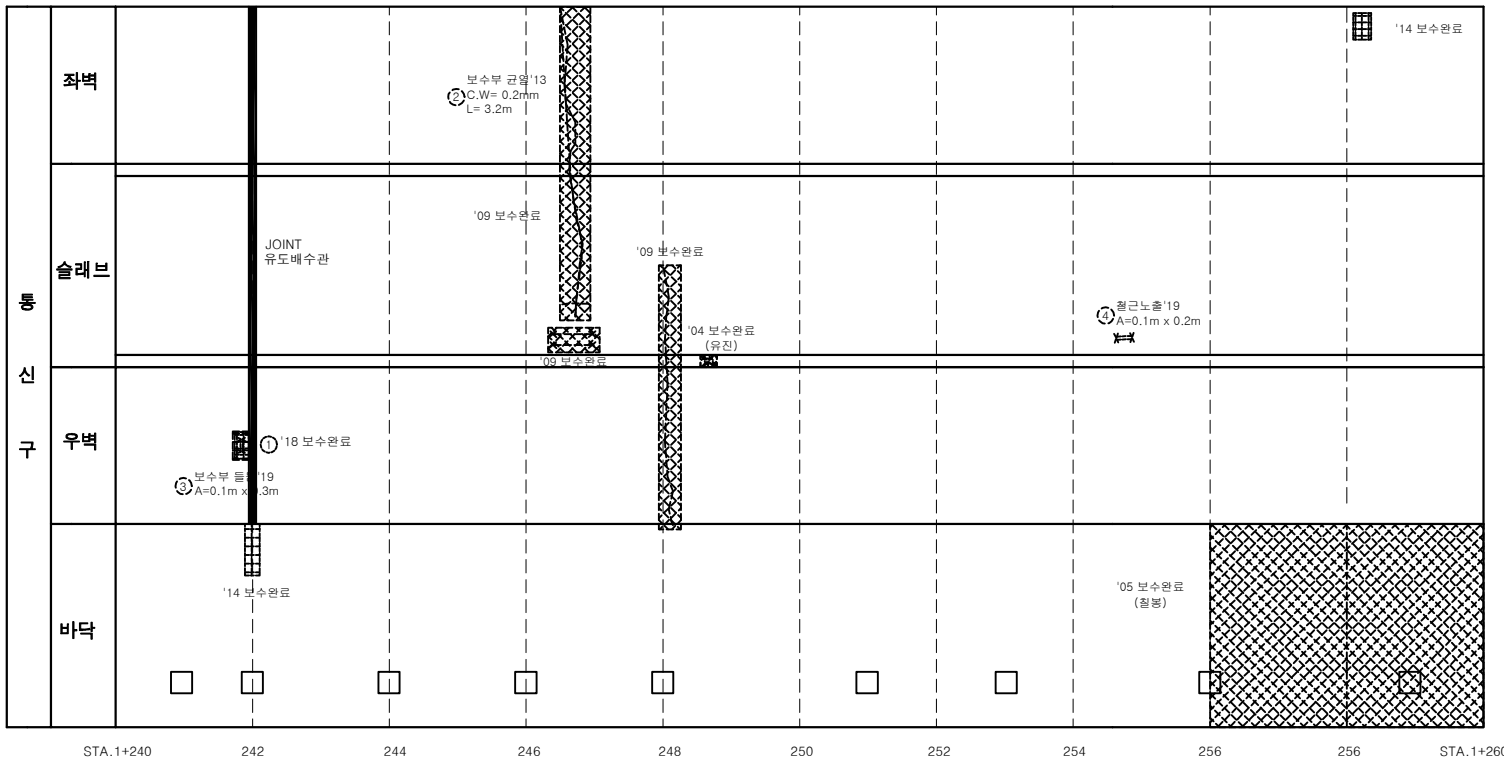

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2017	철근노출,박락				0.06	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.02	
2	2013	보수부 균열	0.2	3.20		3.20	m	1			-	재결함
3	2019	보수부 들뜸	0.1	0.30		0.03	㎡	1	2018	단면복구공법	0.04	재결함
4	2019	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+260m ~ 1+280m)





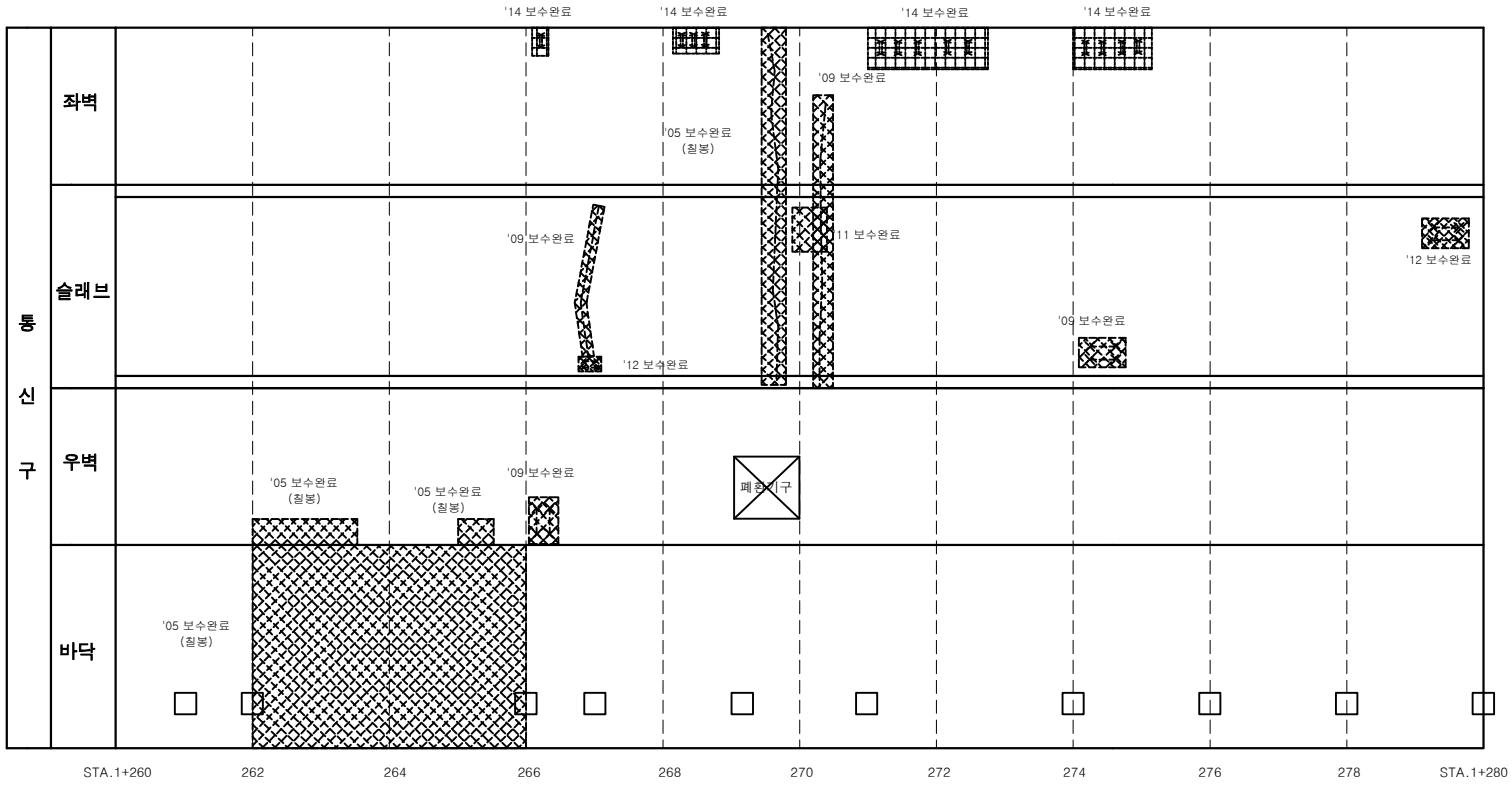

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

M 폐환기구 6번 (순환선 1,270m)

KEYPLAN



SECTION





천정



배면

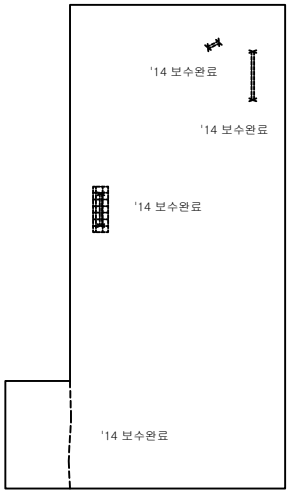

좌벽



전면

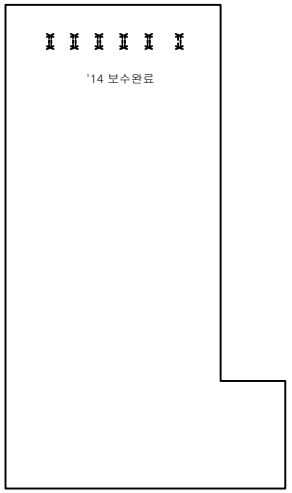

우벽

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+280m ~ 1+300m)





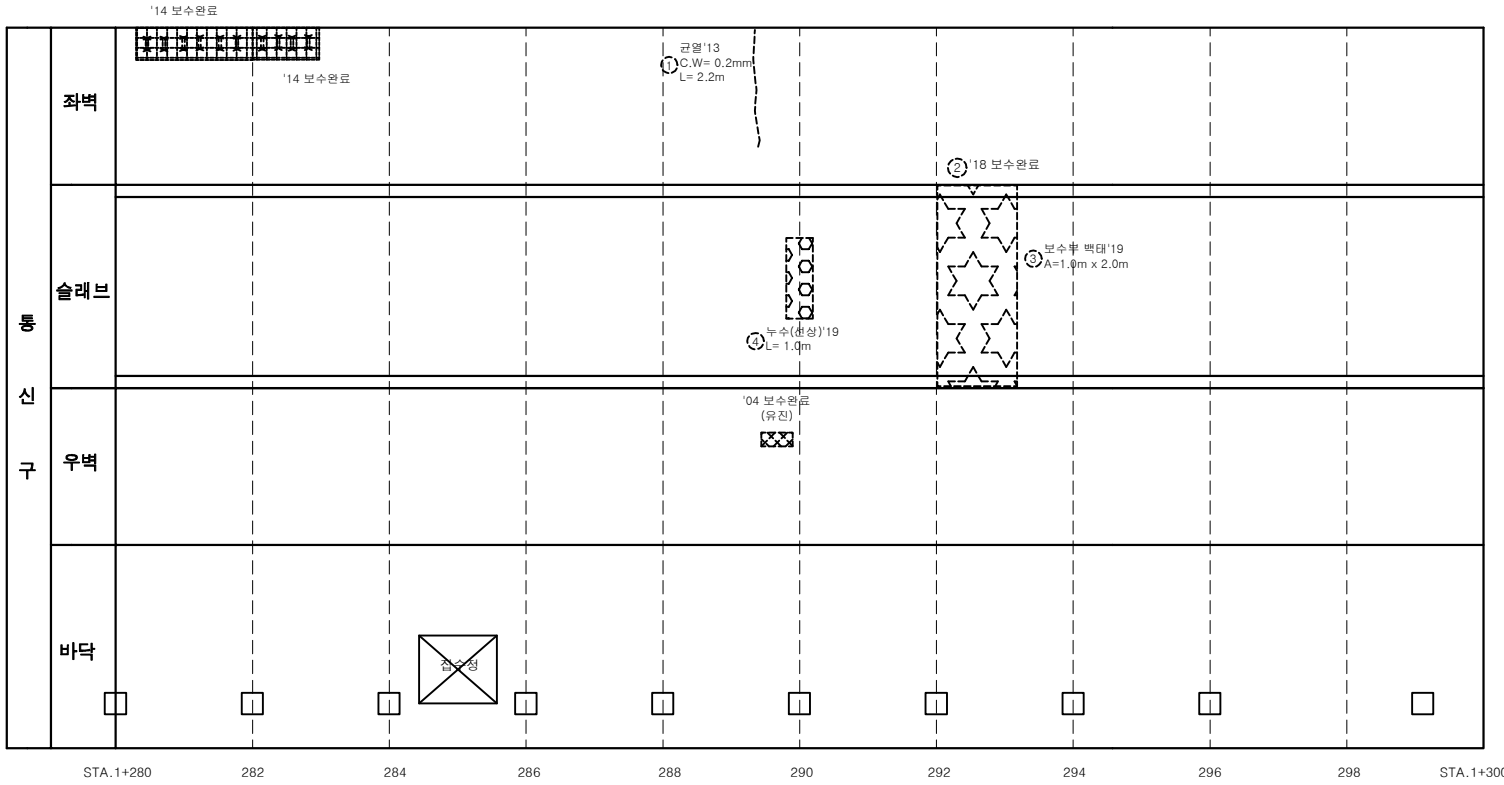

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.2	2.20		2.20	m	1			-	
2	2017	보수부 백태	1.0	2.00		2.00	㎡	1	2018	표면처리공법	2.40	
3	2019	보수부 백태	1.0	2.00		2.00	㎡	1	2018	표면처리공법	2.40	재결함
4	2019	누수(선상)		1.00		1.00	m	1			-	신규

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)

TITLE OF SHIFT

순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+300m ~ 1+320m)





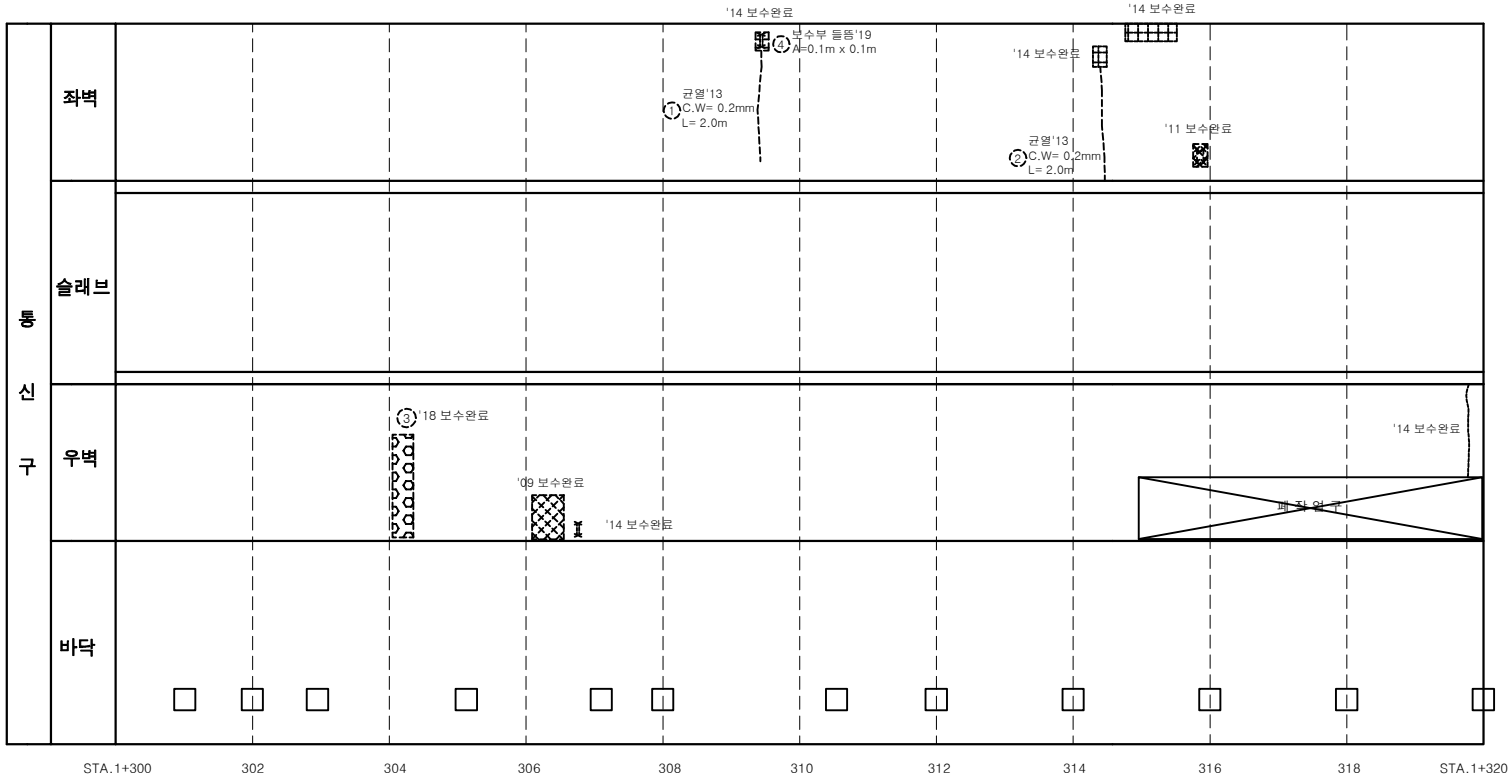

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
2	2013	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
3	2017	누수		1.50		1.50	m	1	2018	습식균열보수	1.80	
4	2019	보수부 들뜸	0.1	0.10		0.01	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+320m ~ 1+340m)





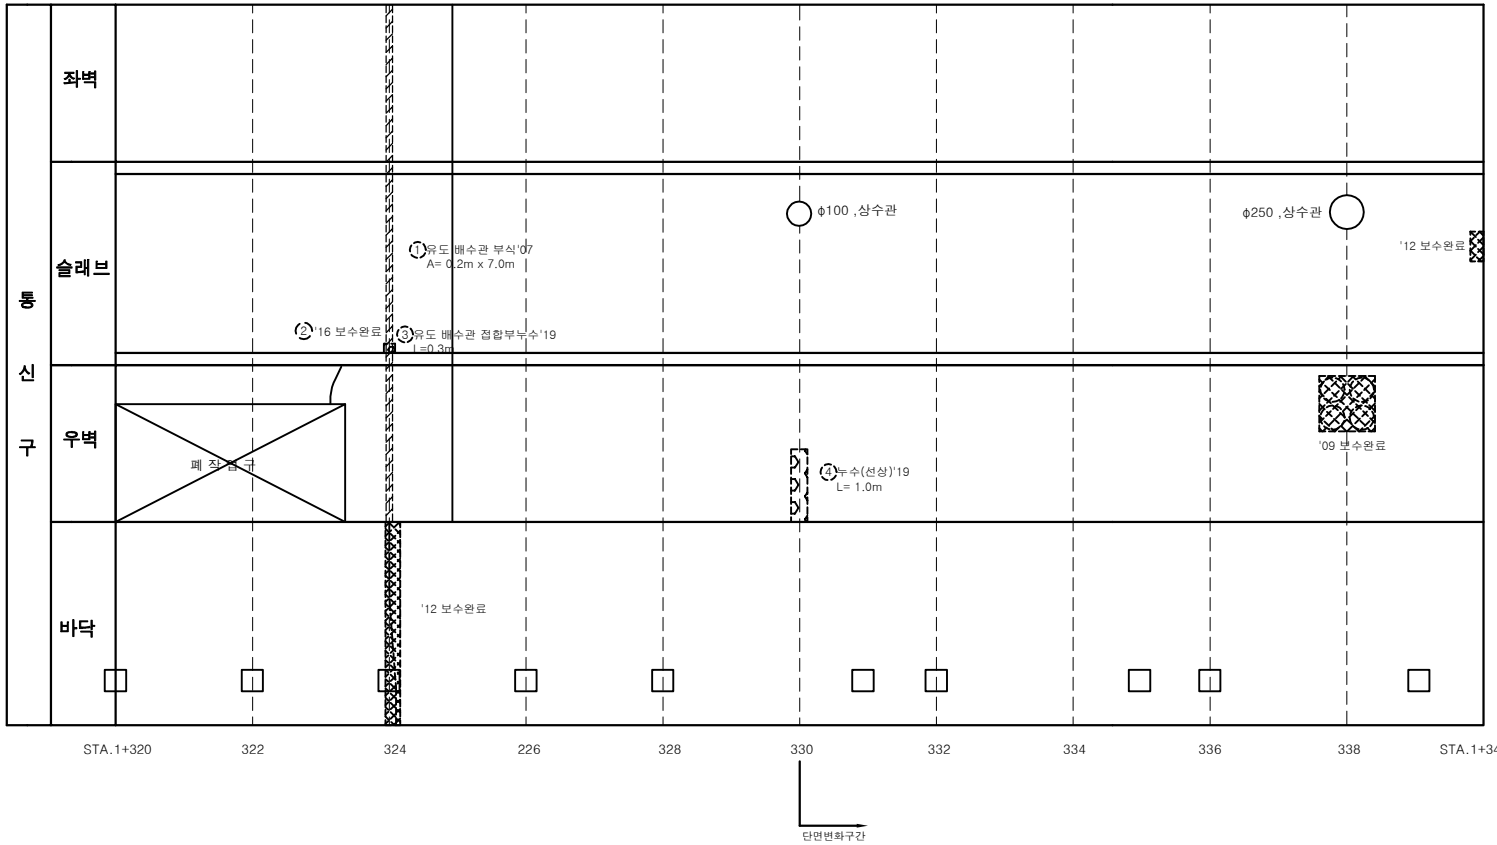

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	유도배수관부식	0.2	7.00		1.40	㎡	1			-	
2	2015	균열	0.3	1.00		1.00	m	1	2016	주입보수공법	1.20	
3	2019	유도배수관접합부누수		0.30		0.30	m	1			-	신규
4	2019	누수(선상)		1.00		1.00	m	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 폐 작업구 (순환선 1320m)

KEYPLAN

SECTION

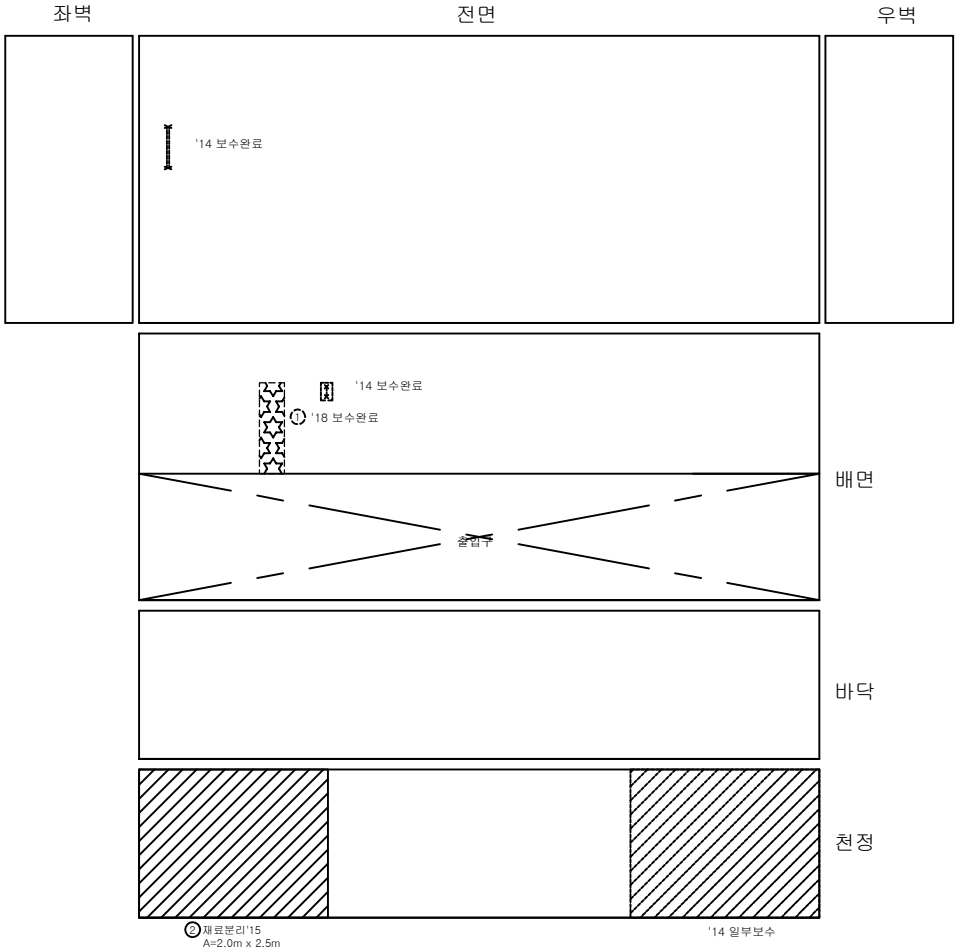

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	백태	0.2	1.80		0.36	㎡	1	2018	표면처리공법	0.43	
2	2015	재료분리	2.0	2.50		5.00	㎡	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **작업구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+340m ~ 1+360m)





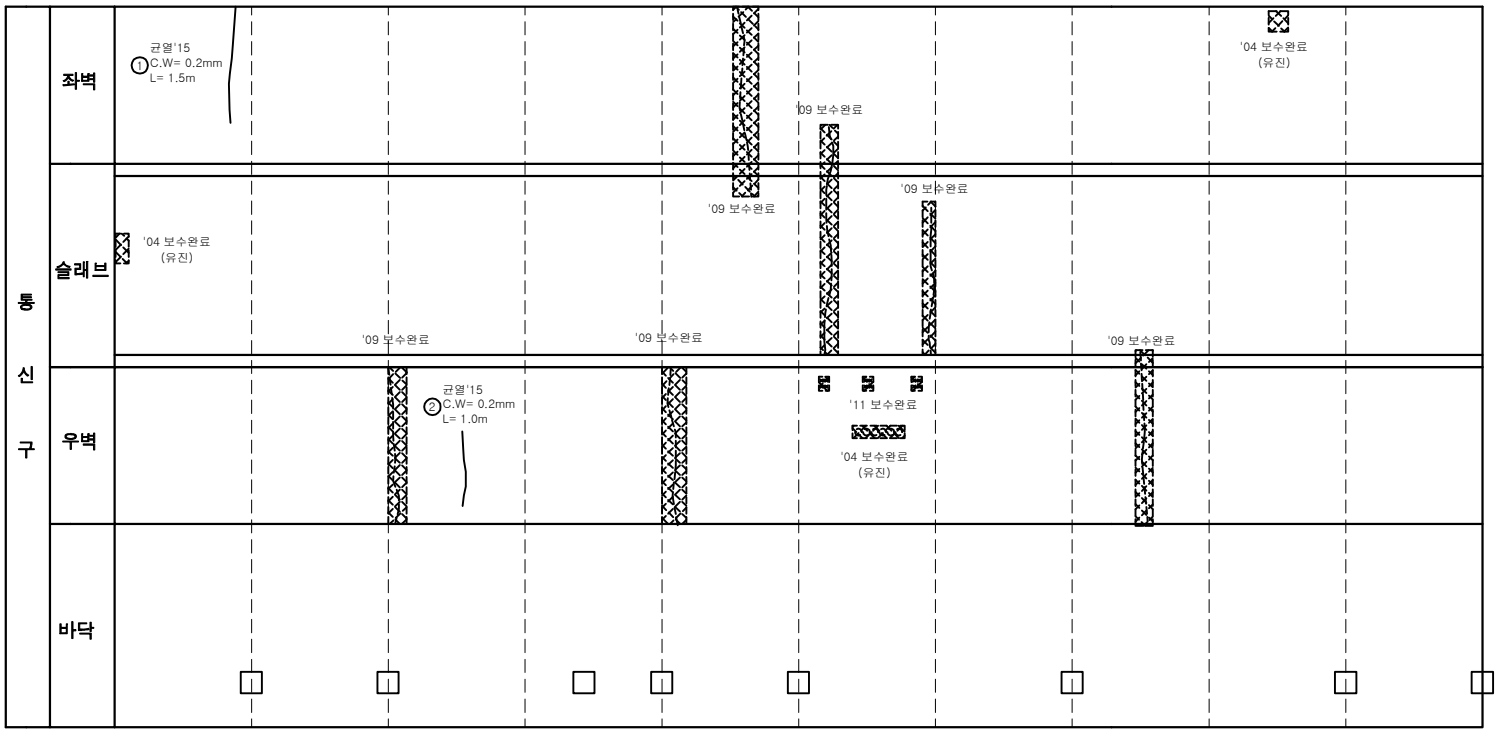

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2015	균열	0.2		1.50	1.50	m	1			-	
2	2015	균열	0.2		1.00	1.00	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+360m ~ 1+380m)





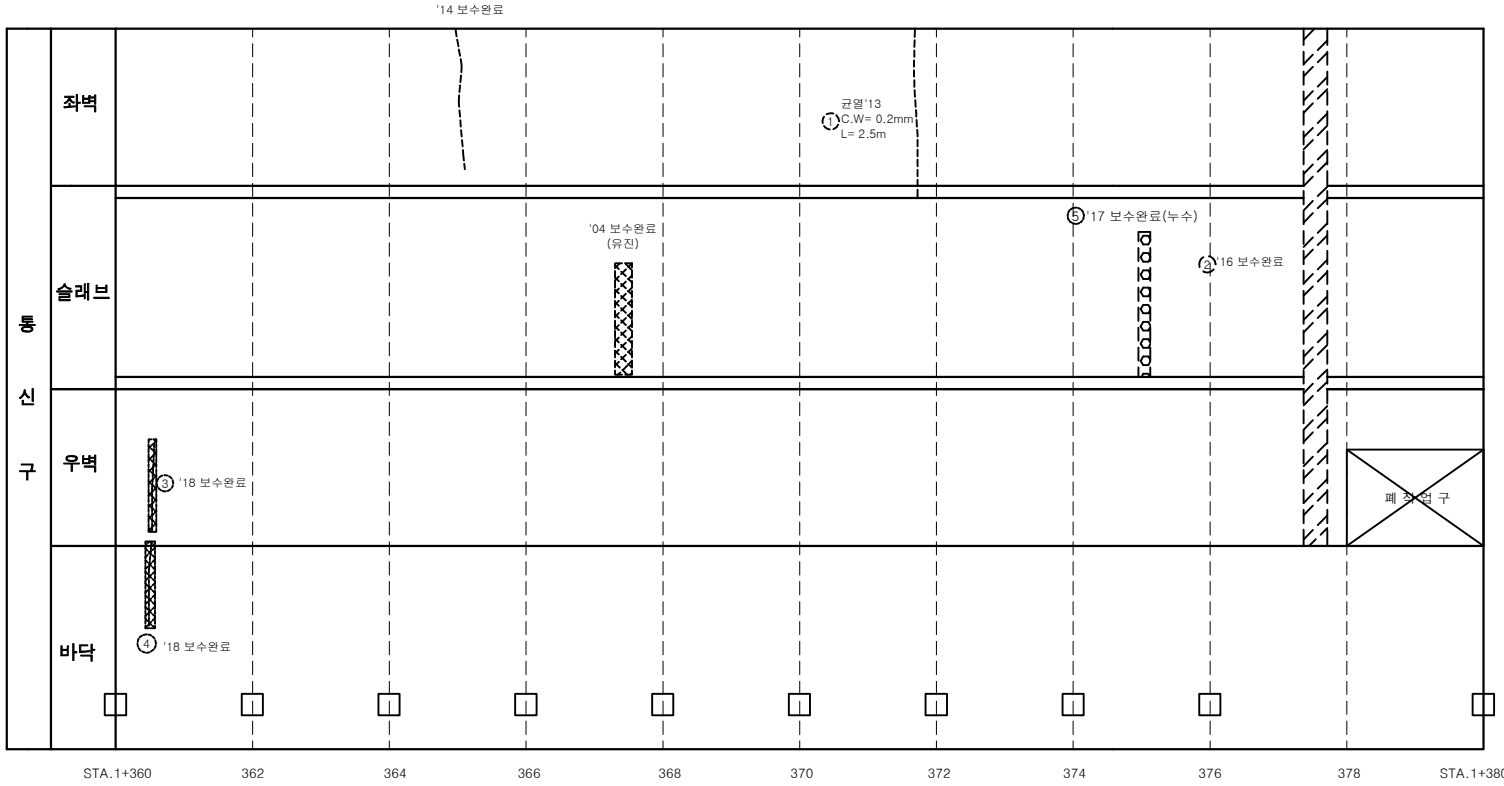

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.2	2.50		2.50	m	1			-	
2	2013	보수 불량	0.3	7.00		2.10	㎡	1	2016	단면복구공법	2.52	
3	2015	균열	0.3	1.70		1.70	m	1			-	중요
4	2015	균열	0.3	1.00		1.00	m	1			-	중요
5	2017	누수				1.70	m	1	2017	누수보수공법	2.04	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 폐 작업구 (순환선 1,380m)

KEYPLAN

SECTION



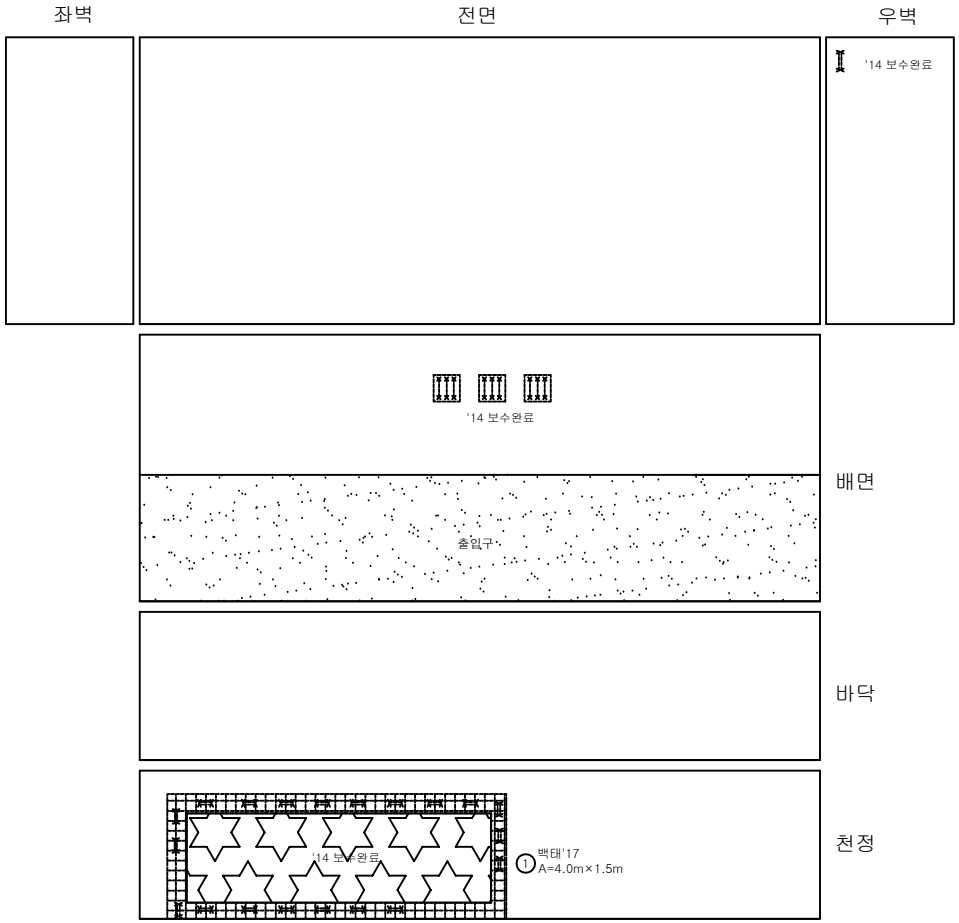

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2017	백태	4.0	1.50		6.00	㎡	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2015년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 작업구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+380m ~ 1+400m)





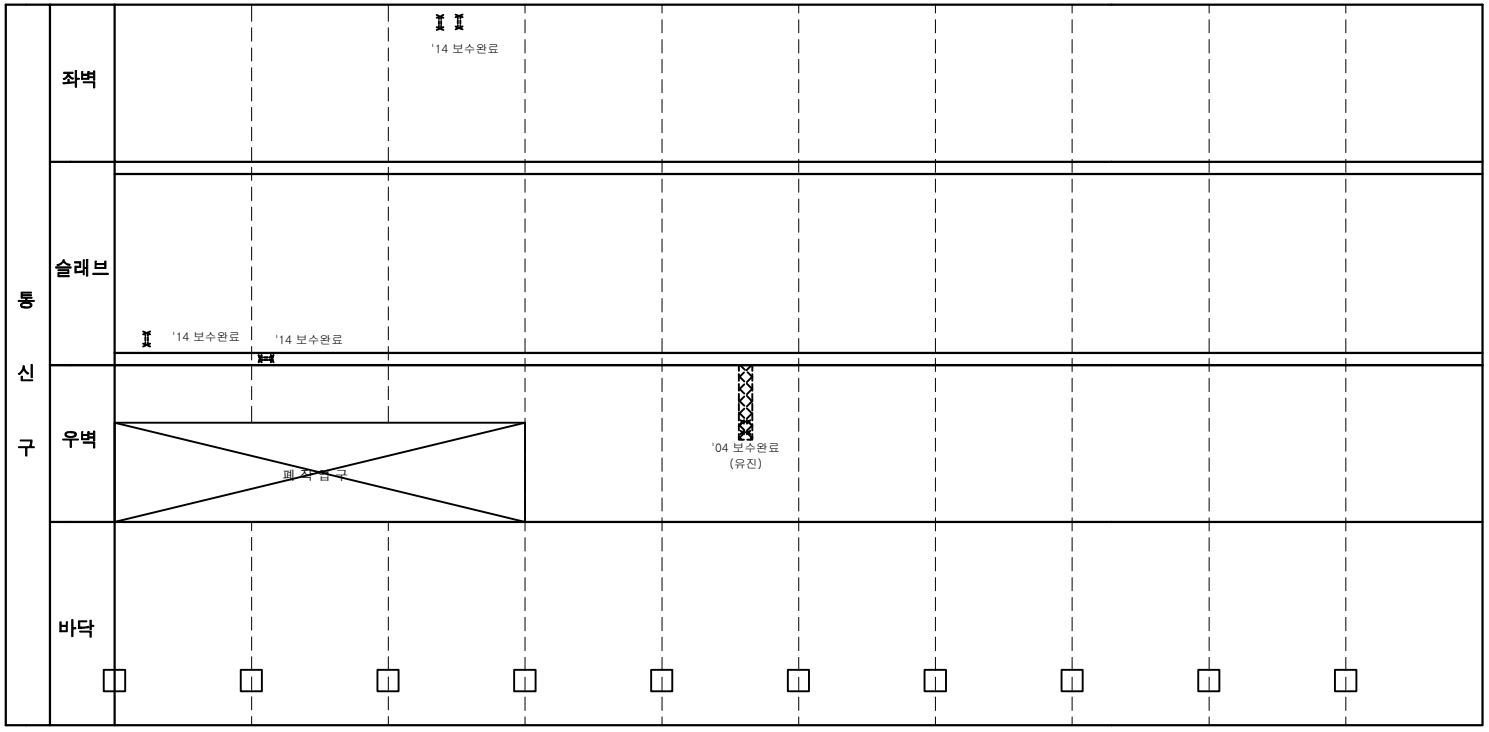

손상물량표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+400m ~ 1+420m)





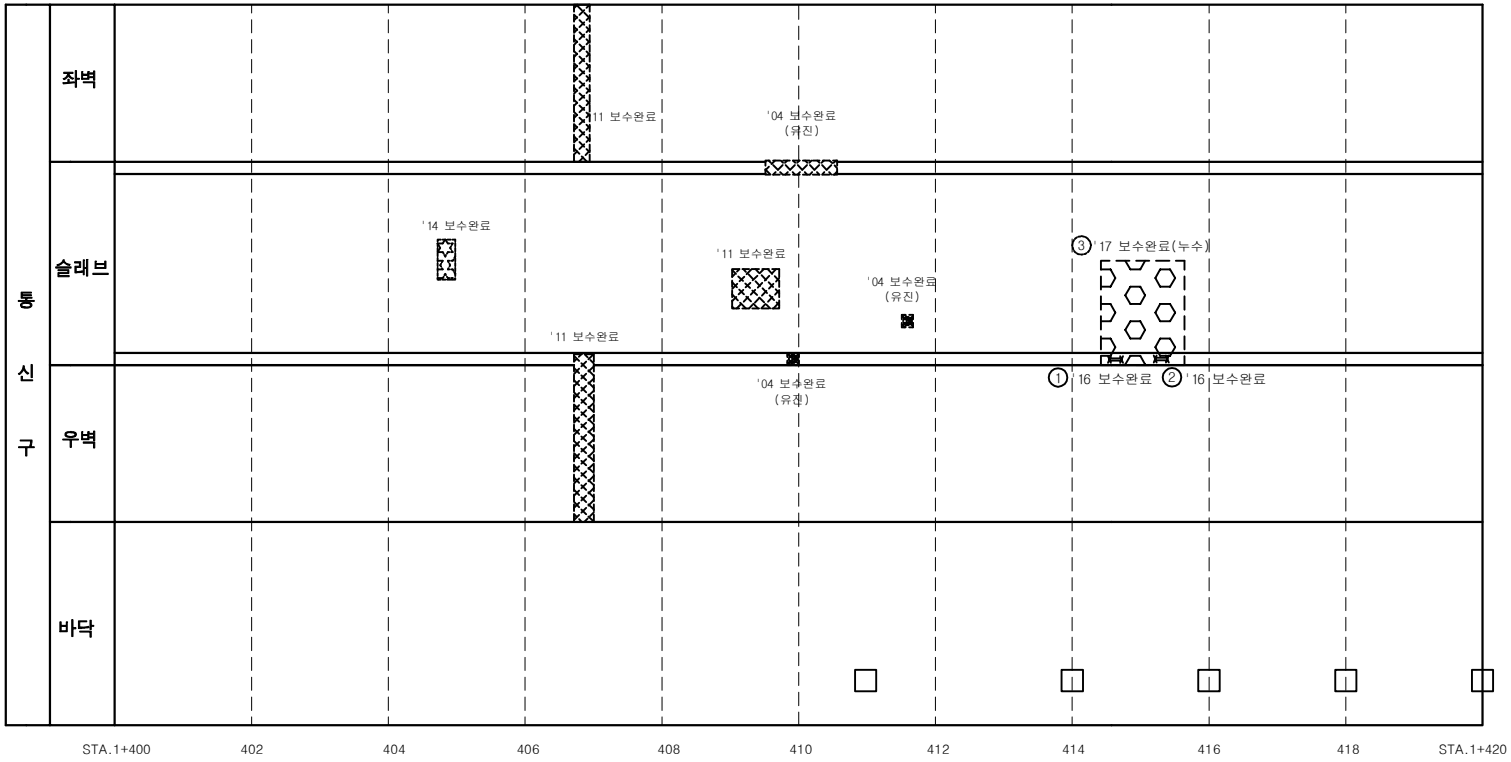

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2015	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.02	
2	2015	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.02	
3	2017	누수				1.00	㎡	1	2017	누수보수공법	1.20	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+420m ~ 1+440m)





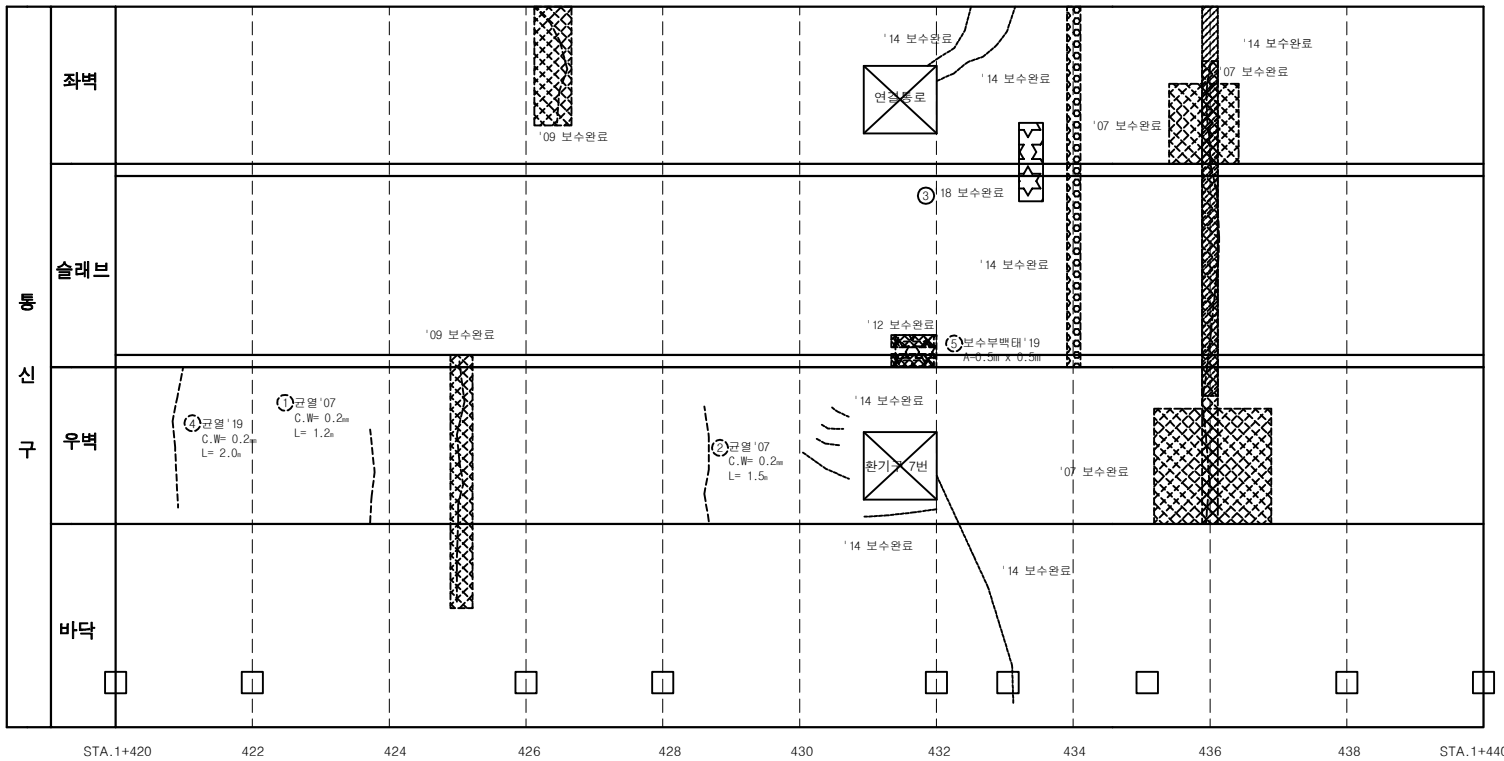

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	1.20		1.20	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	1.50		1.50	m	1			-	
3	2015	백태	0.4	0.80		0.32	㎡	1	2018	표면처리공법	0.38	
4	2019	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	신규
5	2019	보수부 백태	0.5	0.50		0.25	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

환기구 7번 (순환선 1,427m)

KEYPLAN

SECTION

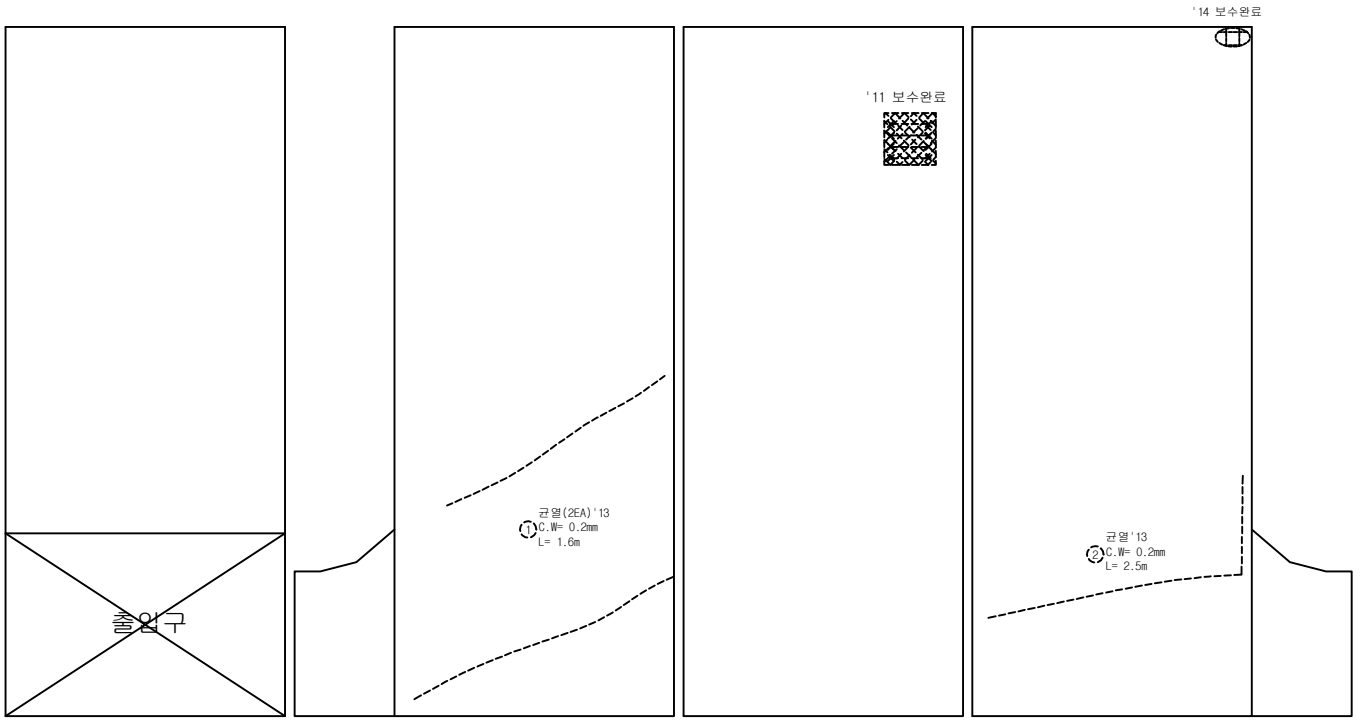

배면 좌벽 전면 우벽

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.2	3.20		6.40	m	2			-	
2	2013	균열	0.2	2.50		2.50	m	1			-	

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)

TITLE OF SHIFT

환기구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+440m ~ 1+460m)





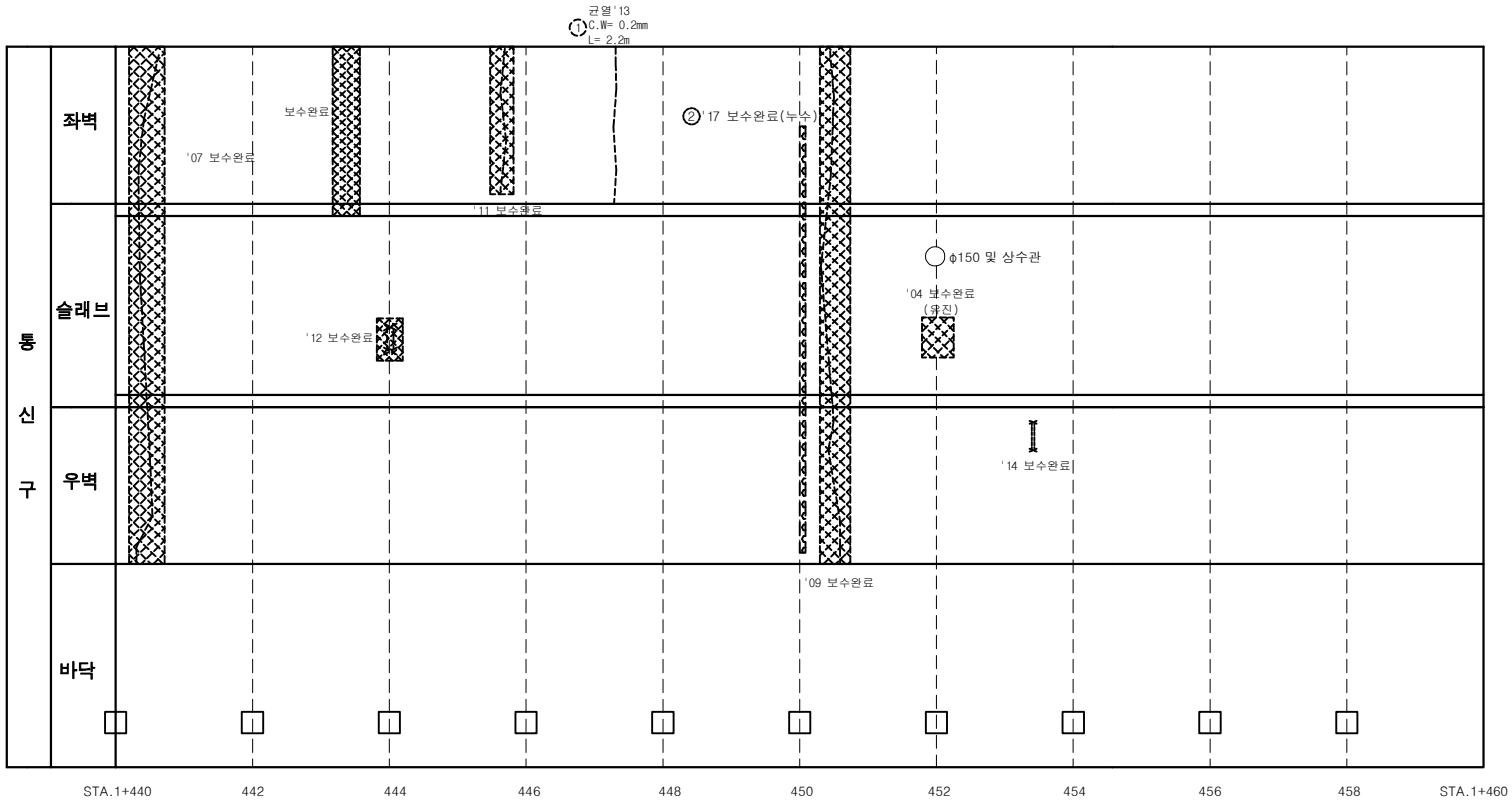

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.2	2.20		2.20	m	1			-	
2	2017	누수				4.30	m	1	2017	누수보수공법	5.16	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+460m ~ 1+480m)





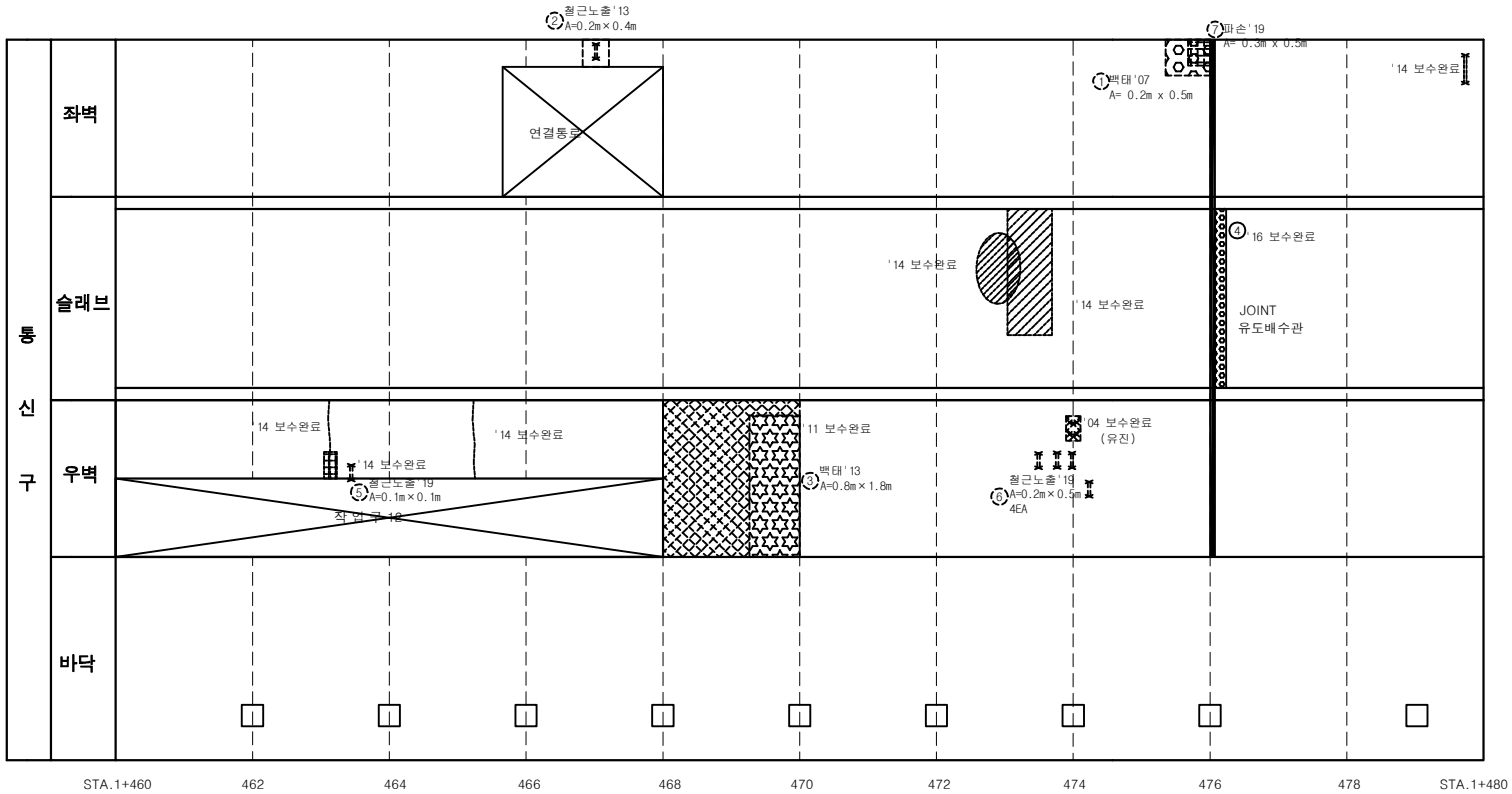

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	백태	0.2	0.50		0.10	㎡	1			-	
2	2013	철근노출	0.2	0.40		0.08	㎡	1			-	중요
3	2013	백태	0.8	1.80		1.44	㎡	1			-	
4	2015	누수		2.00		2.00	m	1	2016	누수보수공법	2.40	
5	2019	철근노출	0.1	0.10		0.01	㎡	1			-	신규
6	2019	철근노출	0.2	0.50		0.40	㎡	4			-	신규
7	2019	파손	0.3	0.50		0.15	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 작업구 12번 (순환선 1,461m)

KEYPLAN

SECTION



전면

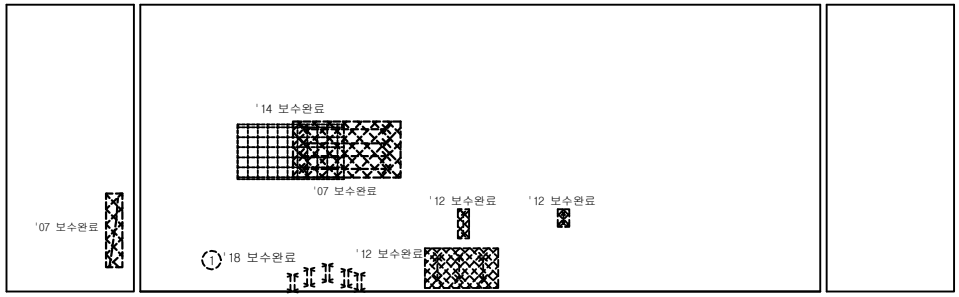

좌벽

우벽

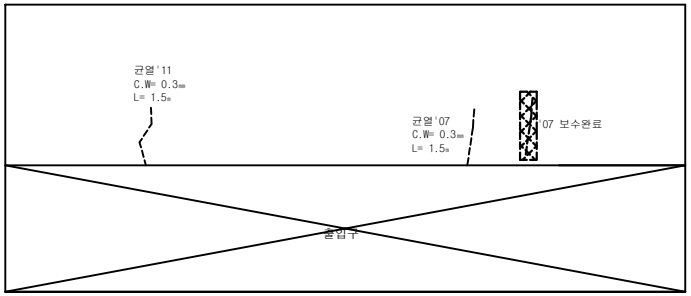

배면



슬래브

바닥



손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2017	철근노출	0.1	0.20		0.10	㎡	5	2018	단면복구(방청)	0.12	
2	2019	ㄷ빔 부식		21.0		21.0	m	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **작업구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+480m ~ 1+500m)





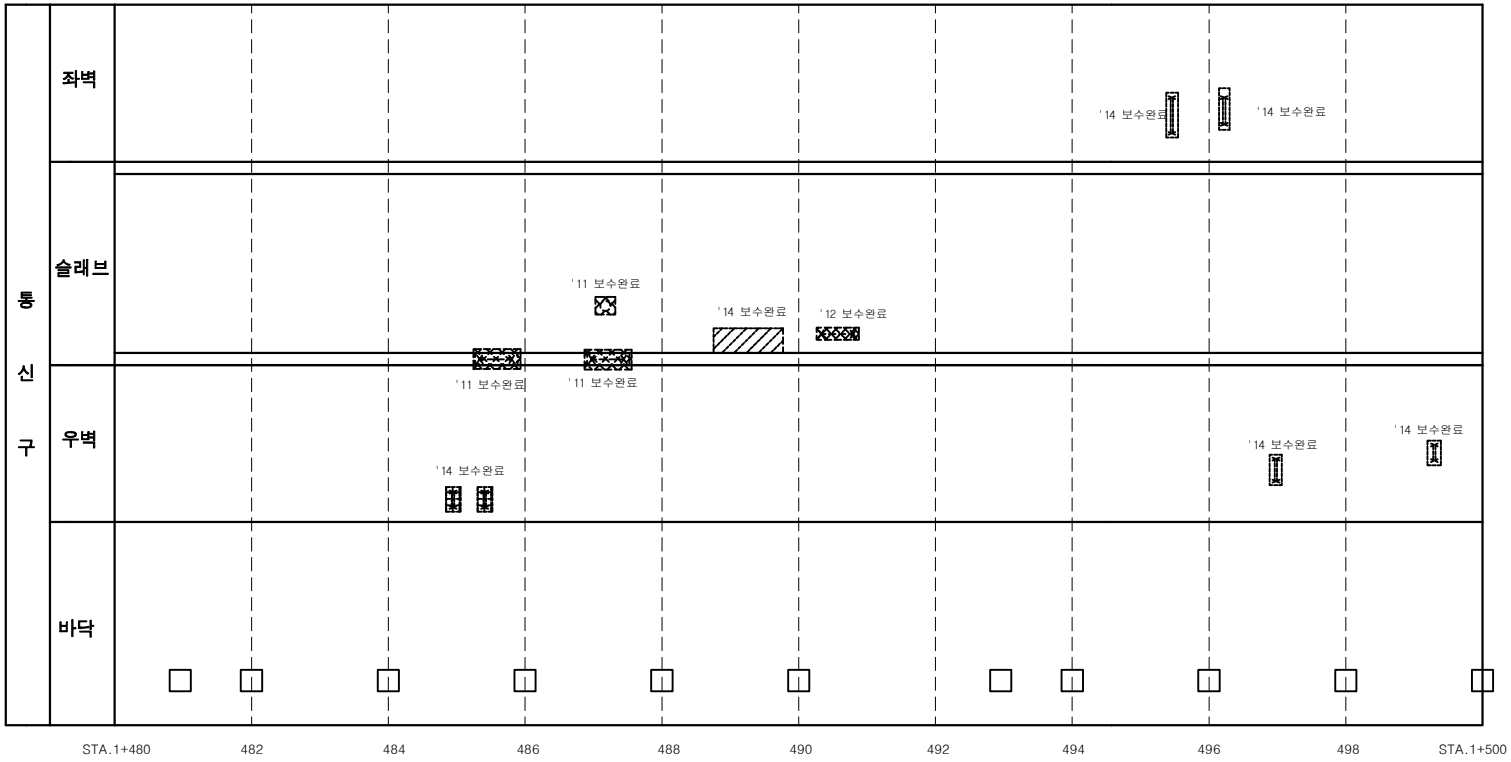

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+500m ~ 1+520m)





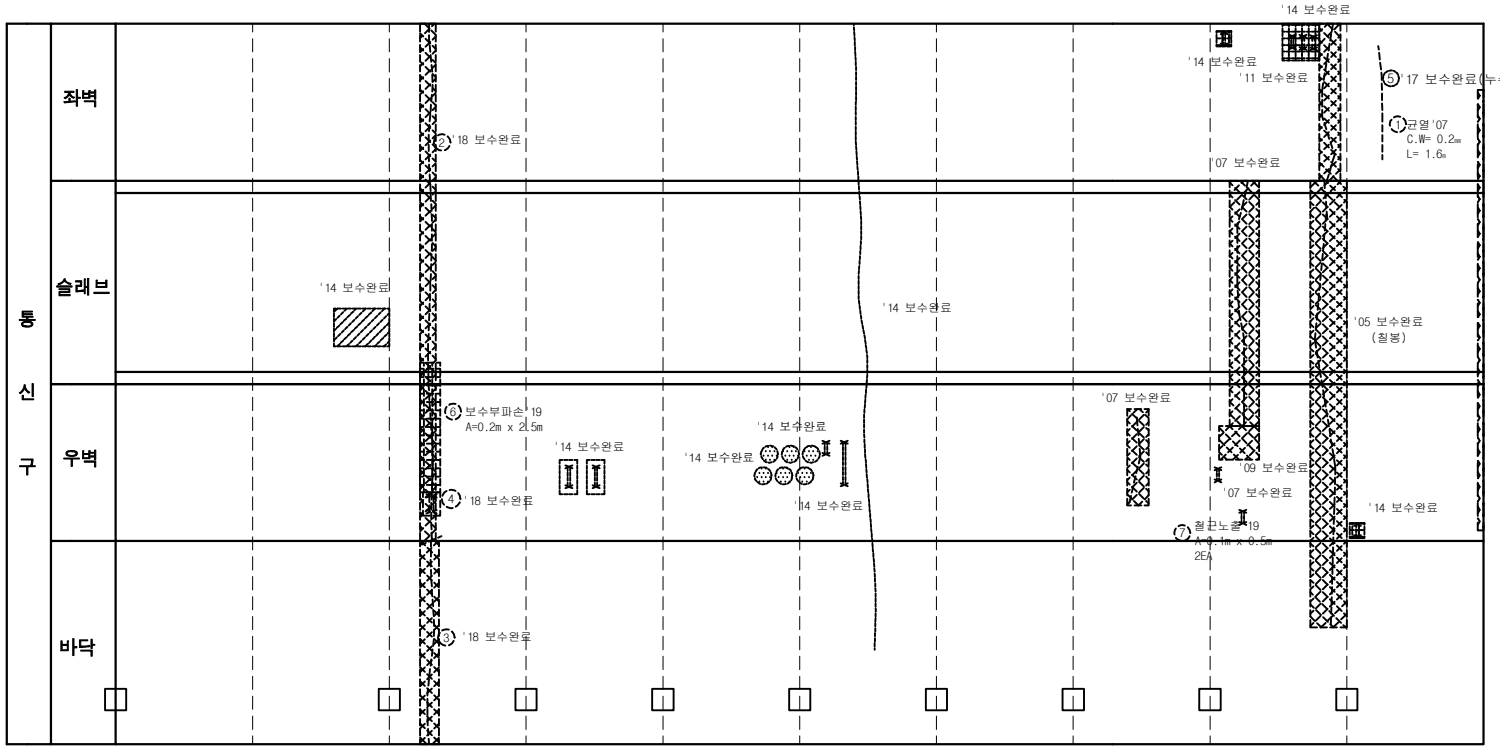

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	1.60		1.60	m	1			-	
2	2007	보수부 균열	0.5	7.00		7.00	m	1	2018	주입보수공법	8.40	
3	2013	균열	0.5	2.00		2.00	m	1	2018	주입보수공법	2.40	
4	2017	철근노출	0.2	0.30		0.06	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.07	
5	2017	누수				6.60	m	1	2017	누수보수공법	7.92	
6	2019	보수부 파손	0.2	2.50		0.50	㎡	1	2018	단면복구공법	0.60	재결함
7	2019	철근노출	0.1	0.50		0.10	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+520m ~ 1+540m)





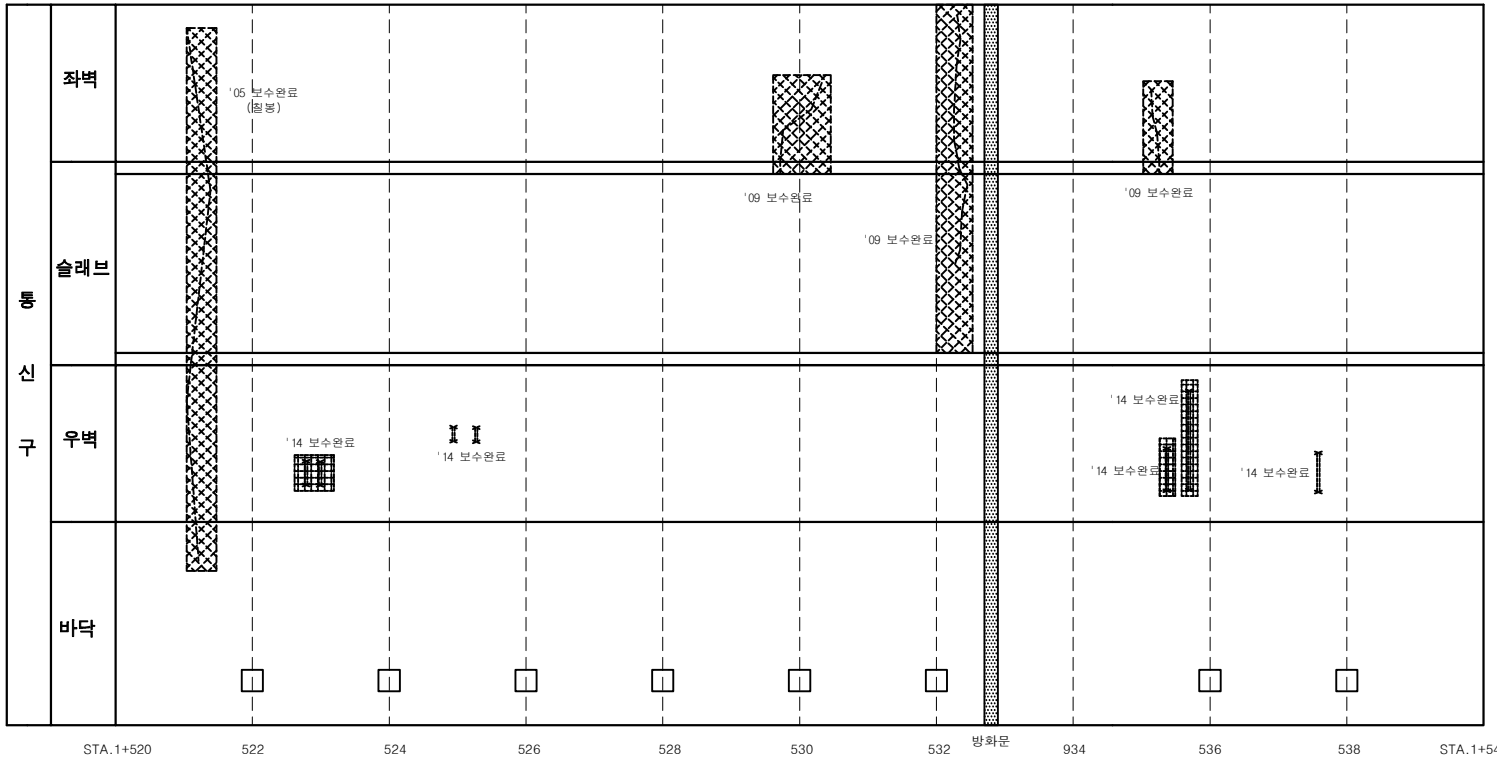

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수면	공법명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+540m ~ 1+560m)





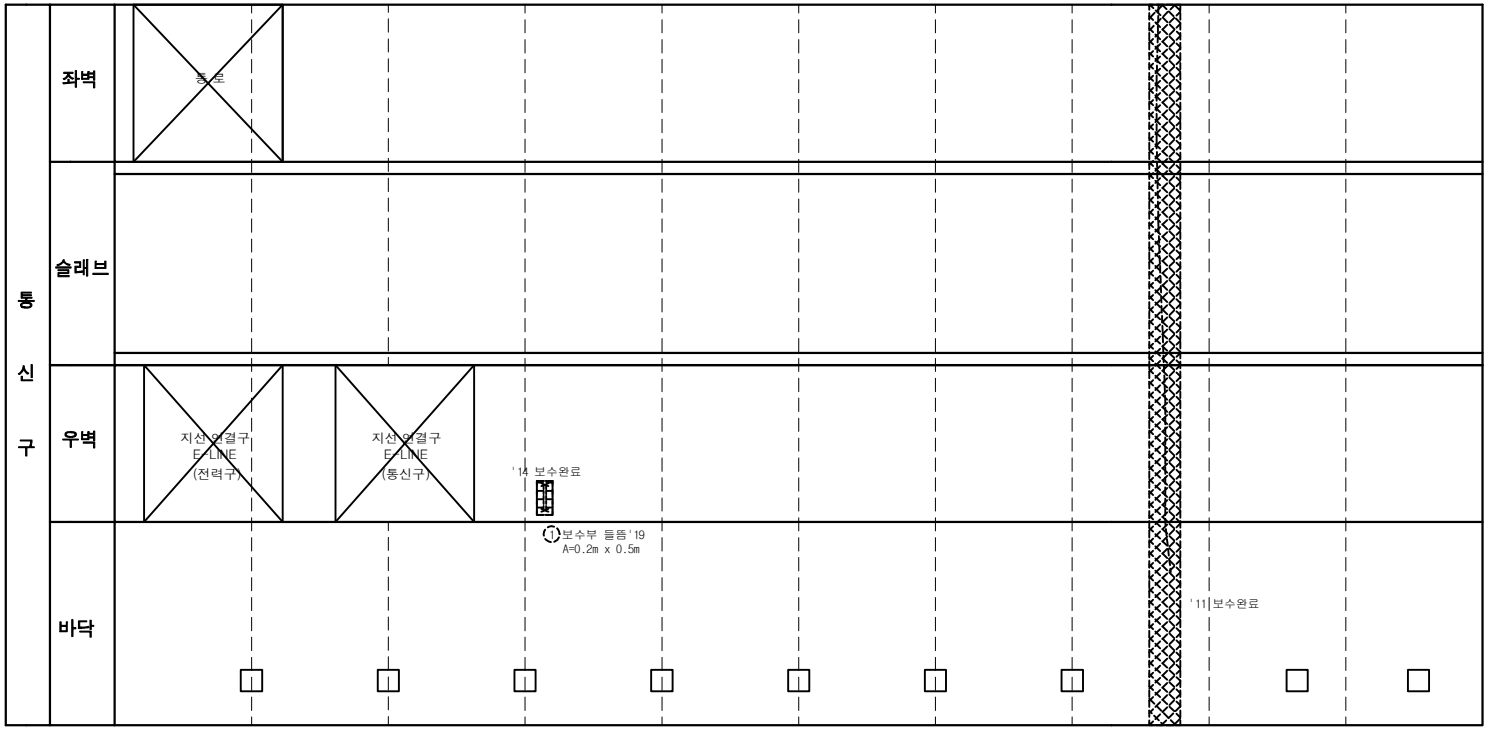

손 상 물 량 표

연번	적용년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2019	보수부 들뜸	0.2	0.50		0.10	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+560m ~ 1+580m)





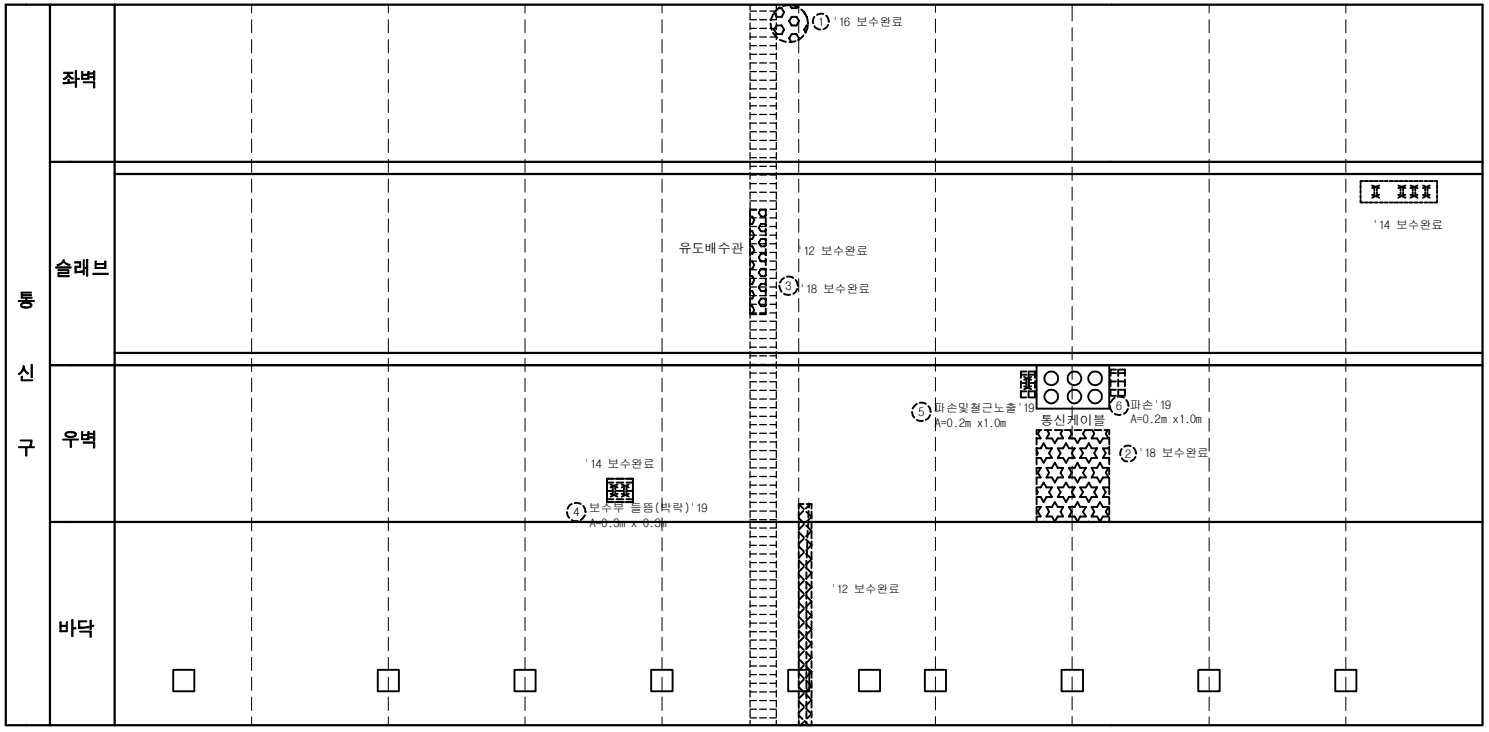

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2011	누수	0.2	0.20		0.04	㎡	1	2016	누수보수공법	0.05	
2	2011	백태	1.0	1.20		1.20	㎡	1	2018	표면처리공법	1.44	
3	2017	누수		1.00		1.00	m	1	2018	습식균열보수	1.20	
4	2019	보수부 들뜸(박락)	0.3	0.30		0.09	㎡	1			-	신규
5	2019	파손및철근노출	0.2	1.00		0.20	㎡	1			-	신규
6	2019	파손	0.2	1.00		0.20	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+580m ~ 1+600m)





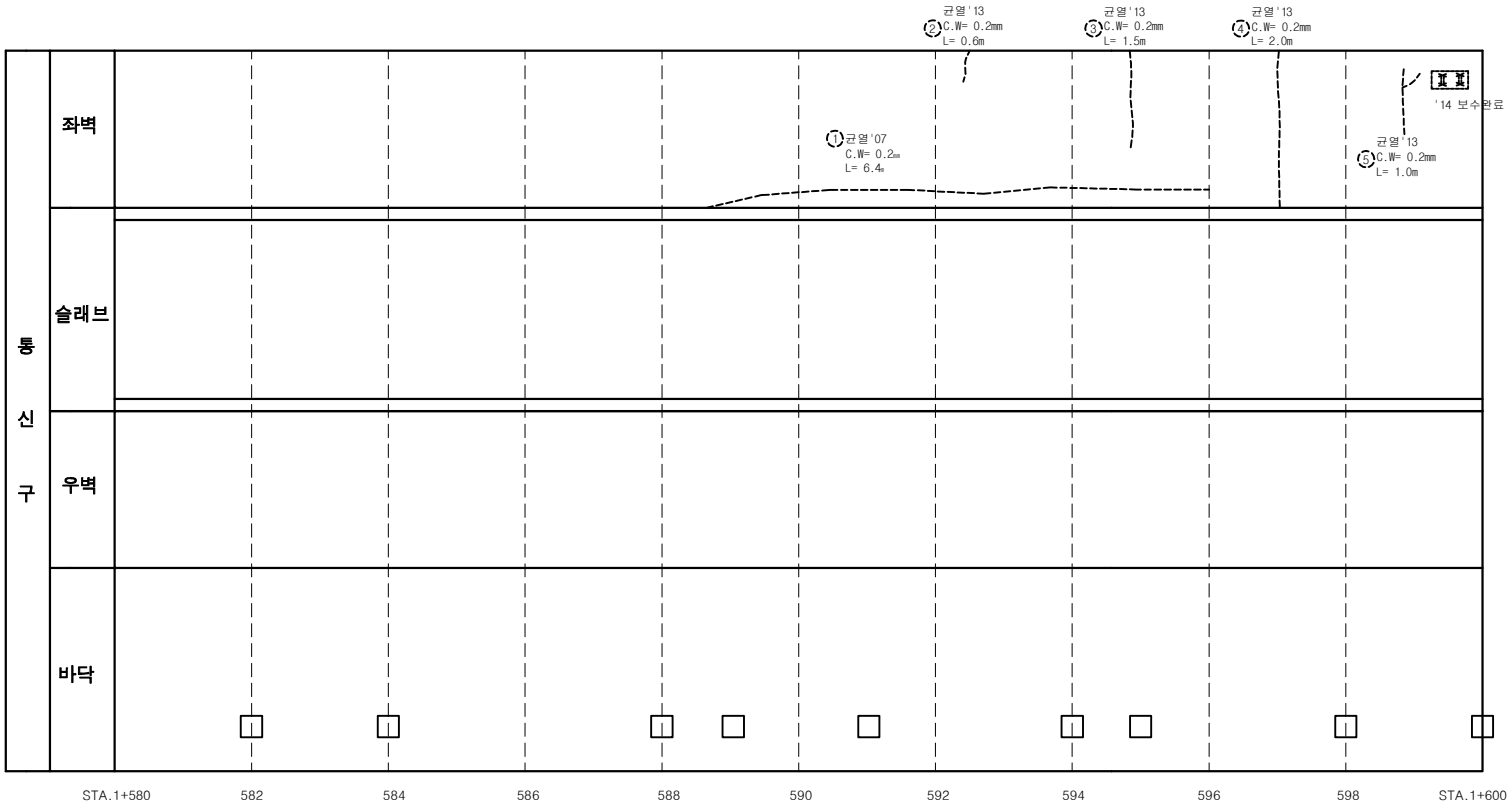

손상물량표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	6.40		6.40	m	1			-	
2	2013	균열	0.2	0.60		0.60	m	1			-	
3	2013	균열	0.2	1.50		1.50	m	1			-	
4	2013	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
5	2013	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+600m ~ 1+620m)





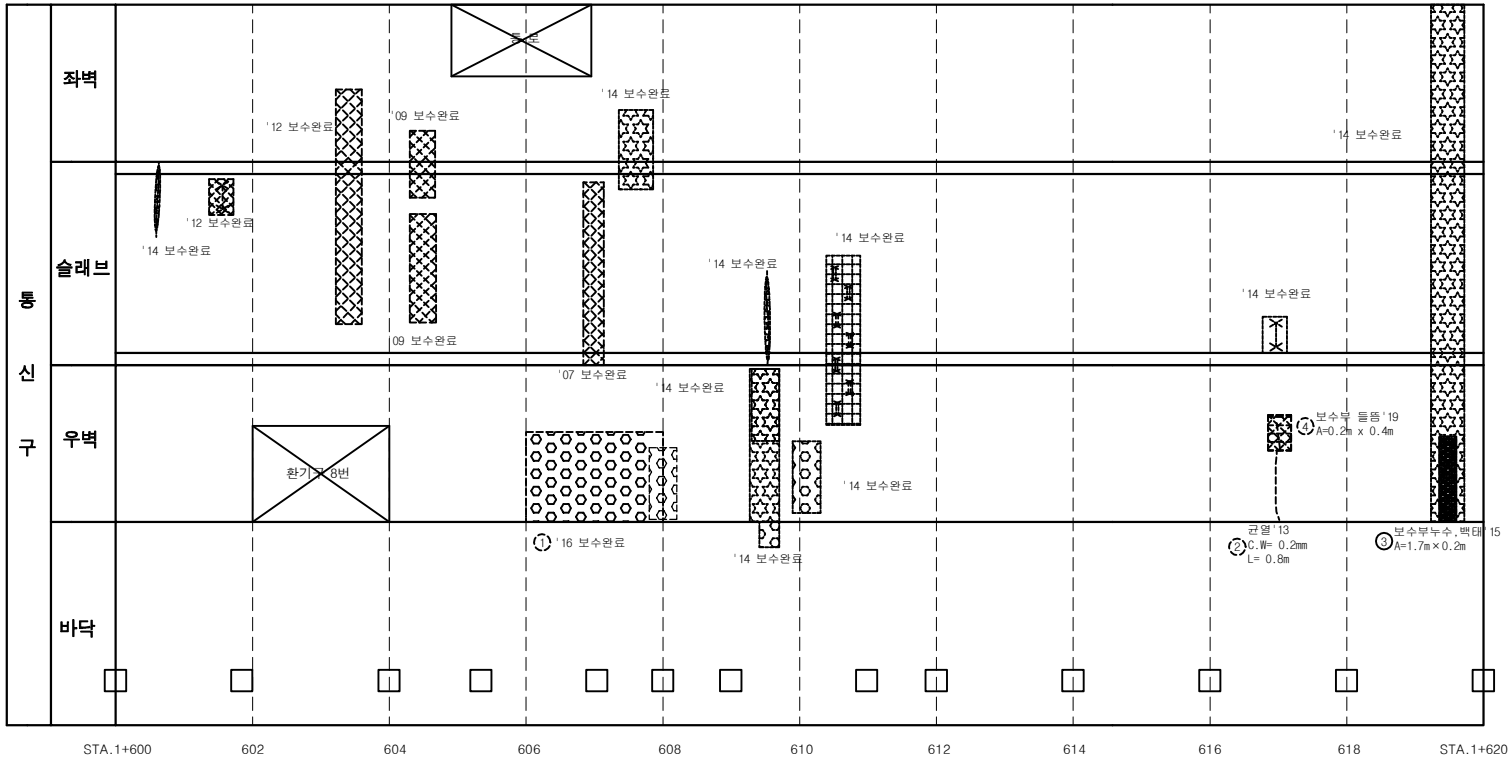

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	누수흔적,백태	1.5	2.00		3.00	㎡	1	2016	누수보수공법	3.60	
2	2013	균열	0.2	0.80		0.80	m	1			-	
3	2015	보수부 누수,백태	1.7	0.20		0.34	㎡	1			-	재결함
4	2019	보수부 들뜸	0.2	0.40		0.08	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

환기구 8번 (순환선 1,607m)

KEYPLAN

SECTION

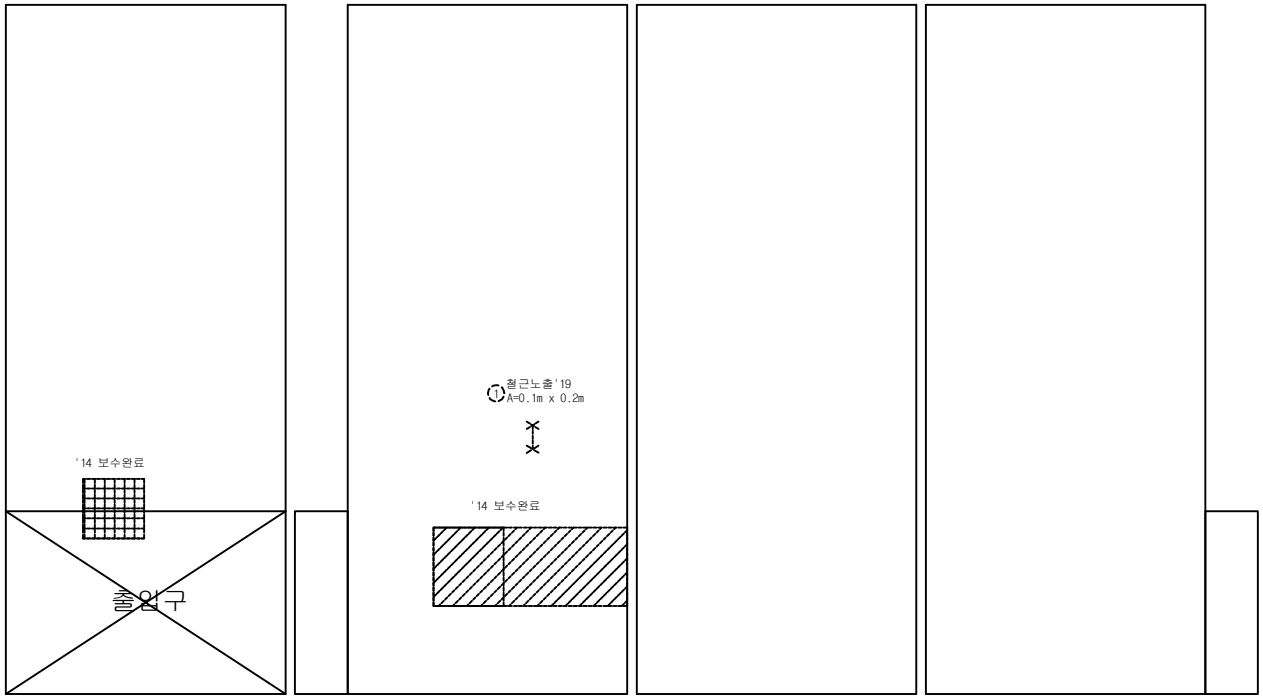

배면 좌벽 전면 우벽

손 상 물 량 표

연번	적용년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2019	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **환기구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+620m ~ 1+640m)





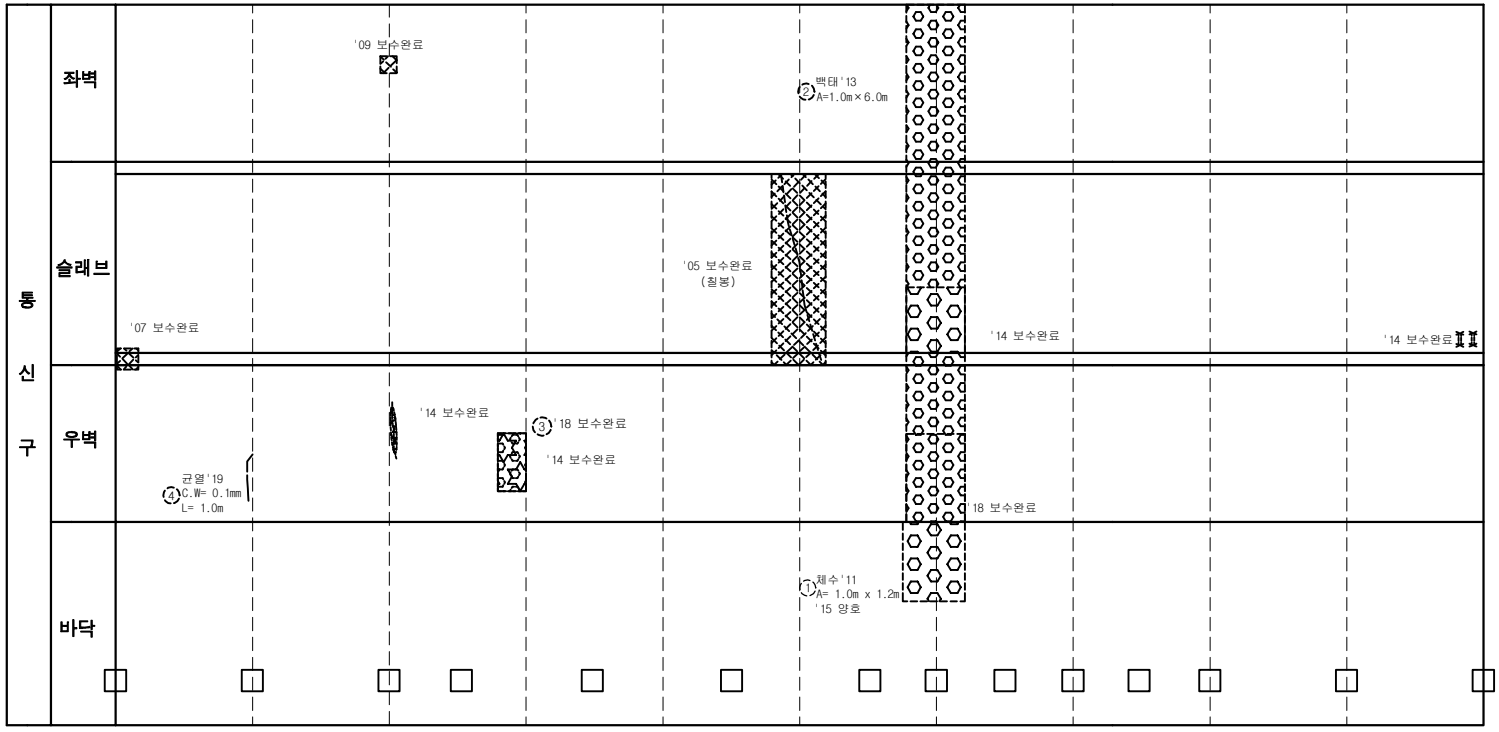

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2011	체수	1.0	1.20		1.20	㎡	1			-	
2	2013	백태	1.0	6.00		7.00	㎡	1			-	
3	2017	보수부 백태	0.5	1.00		0.50	㎡	1	2018	표면처리공법	0.60	
4	2019	균열	0.1	1.00		1.00	m	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+640m ~ 1+660m)





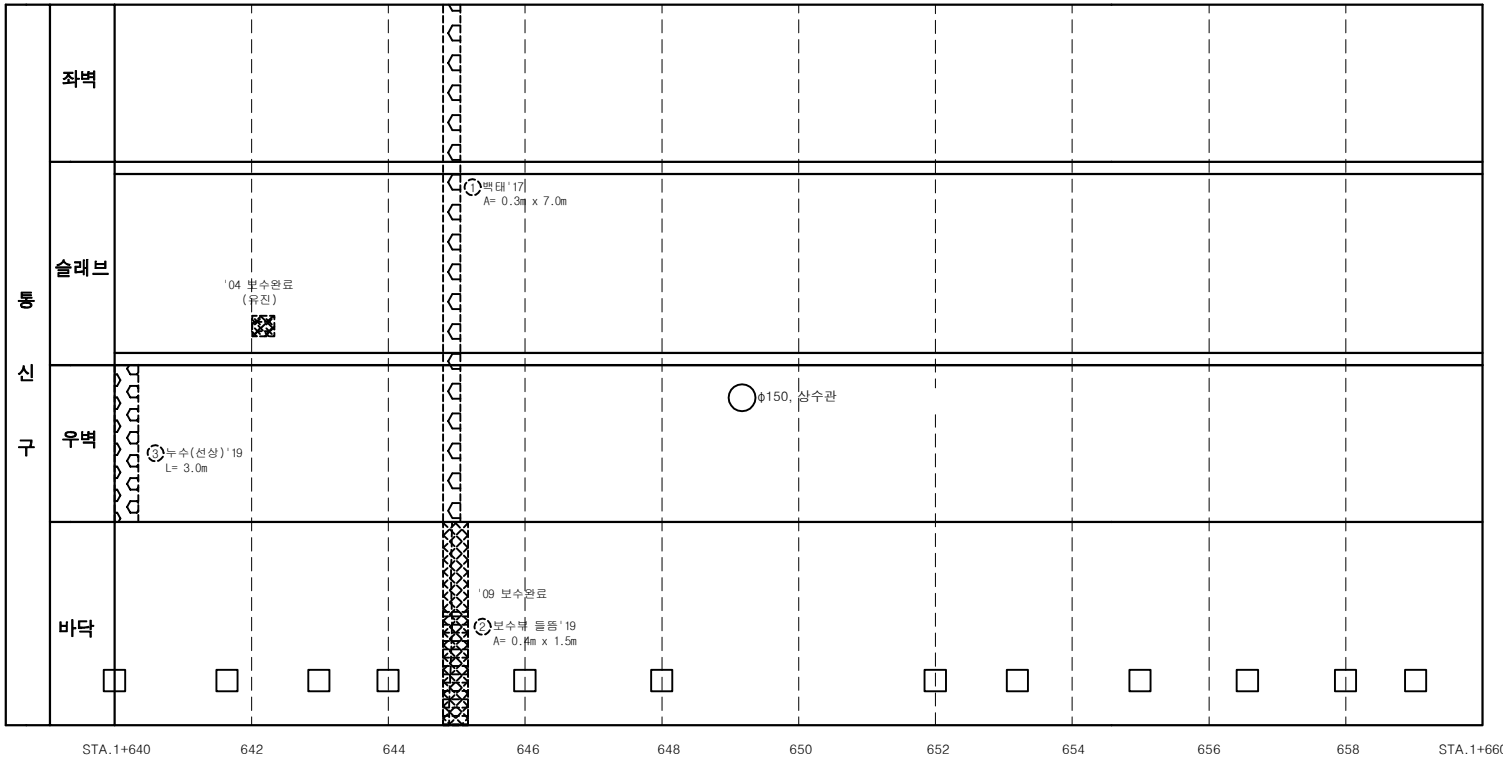

손 상 물 량 표

연번	적용년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2017	백태	0.3	7.00		2.10	㎡	1			-	
2	2019	보수부 들뜸	0.4	1.50		0.60	㎡	1			-	신규
3	2019	누수(선상)		3.00		3.00	m	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+660m ~ 1+680m)





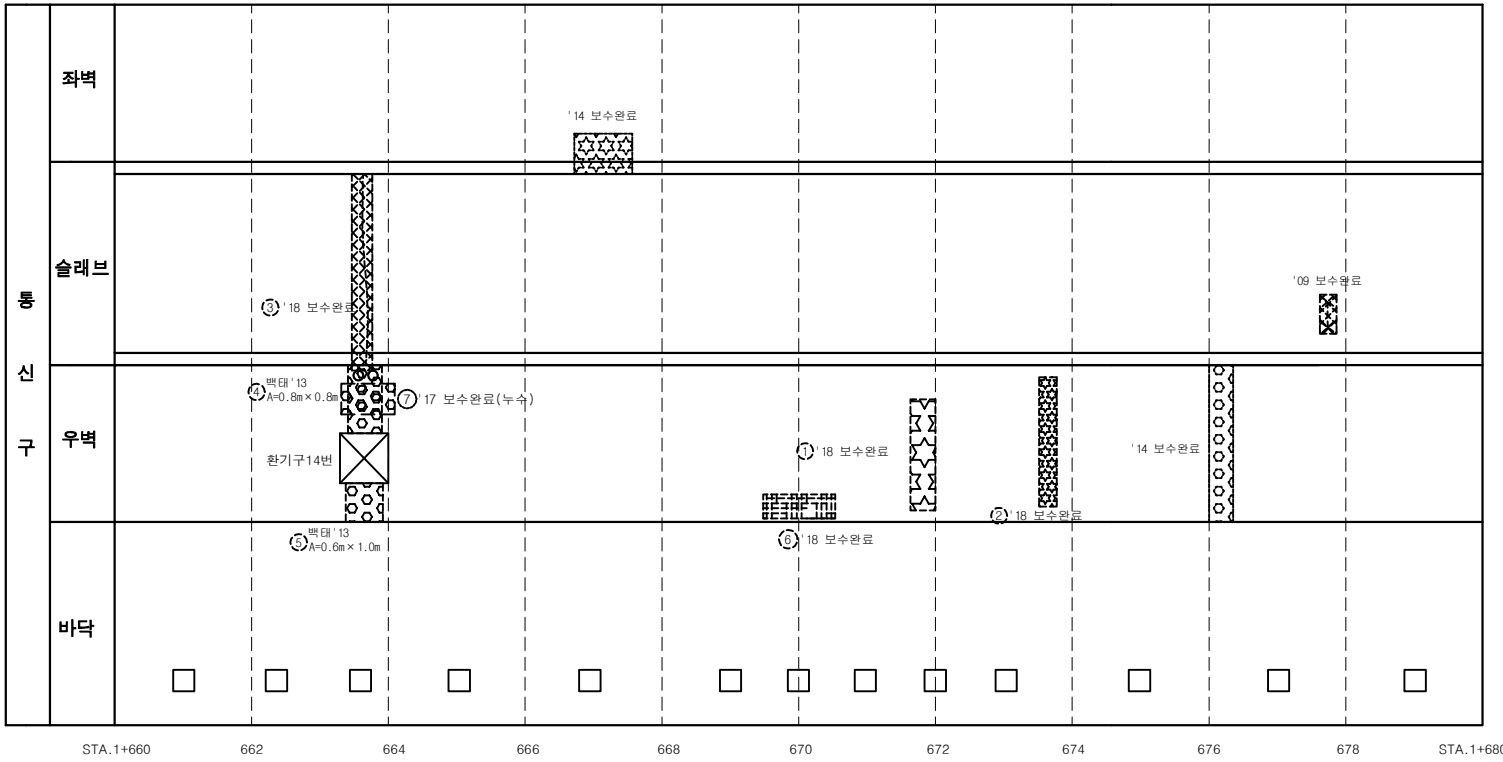

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	백태	0.5	1.80		0.90	㎡	1	2018	표면처리공법	1.08	
2	2007	백태	0.3	2.50		0.75	㎡	1	2018	표면처리공법	0.90	
3	2013	균열부누수	0.2	2.00		2.00	m	1	2018	습식균열보수	2.40	
4	2013	백태	0.8	0.80		0.64	㎡	1			-	
5	2013	백태	0.6	1.00		0.60	㎡	1			-	
6	2017	망상균열	1.0	0.70		0.70	㎡	1	2018	표면처리공법	0.84	
7	2017	누수				0.30	㎡	1	2017	누수보수공법	0.36	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

환기구 9번 (순환선 1,660m)

KEYPLAN

SECTION



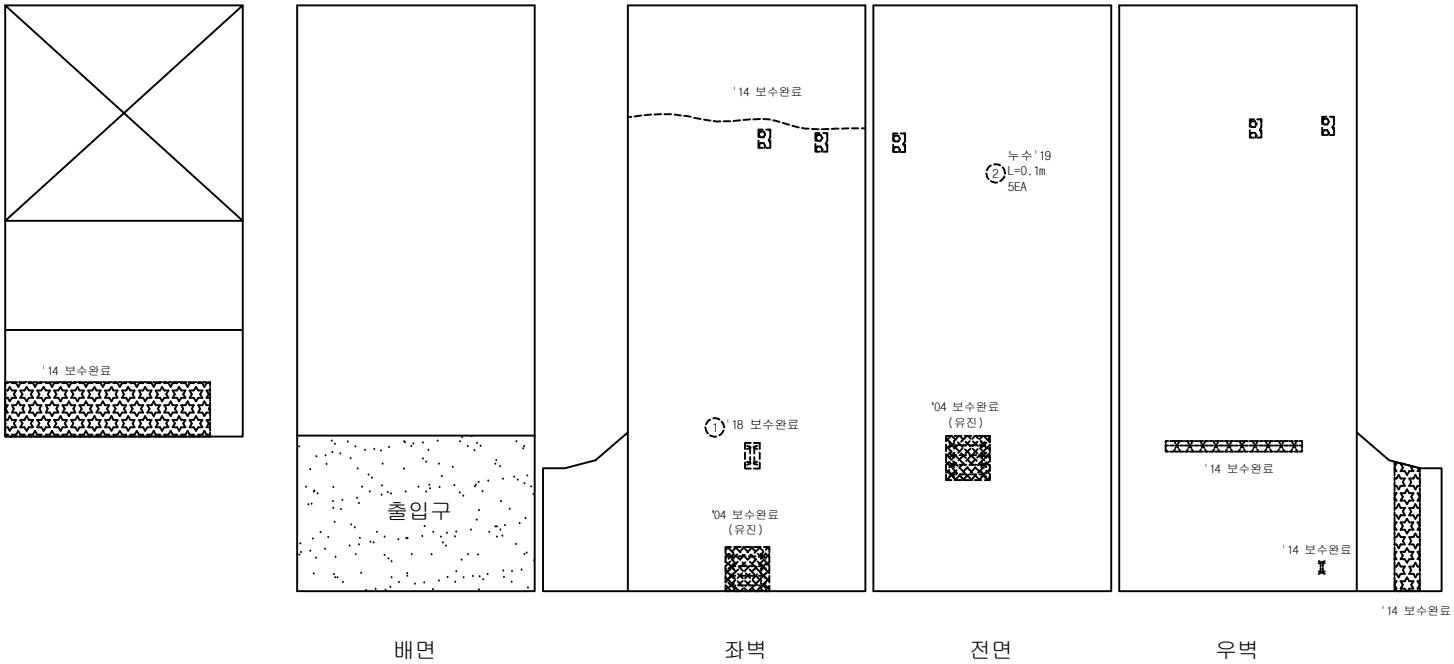

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2017	철근노출	0.2	0.20		0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.05	
2	2019	누수		0.10		0.50	m	5			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 환기구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+680m ~ 1+700m)





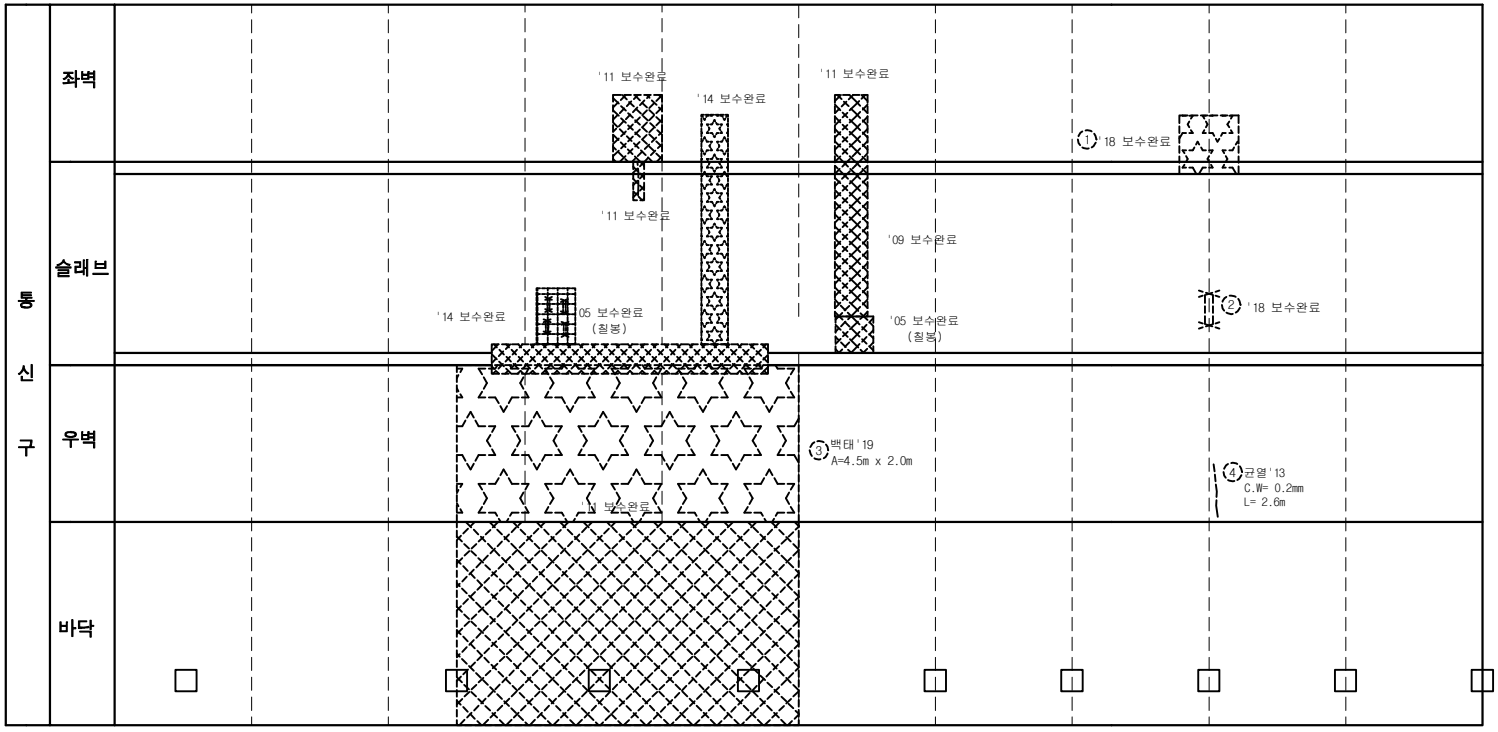

손 상 물 량 표

연번	적용년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2017	백태	1.0	1.00		1.00	㎡	1	2018	표면처리공법	1.20	
2	2017	철근노출	0.1	0.80		0.08	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.10	
3	2019	백태	4.5	2.00		9.00	㎡	1			-	신규
4	2019	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+700m ~ 1+720m)





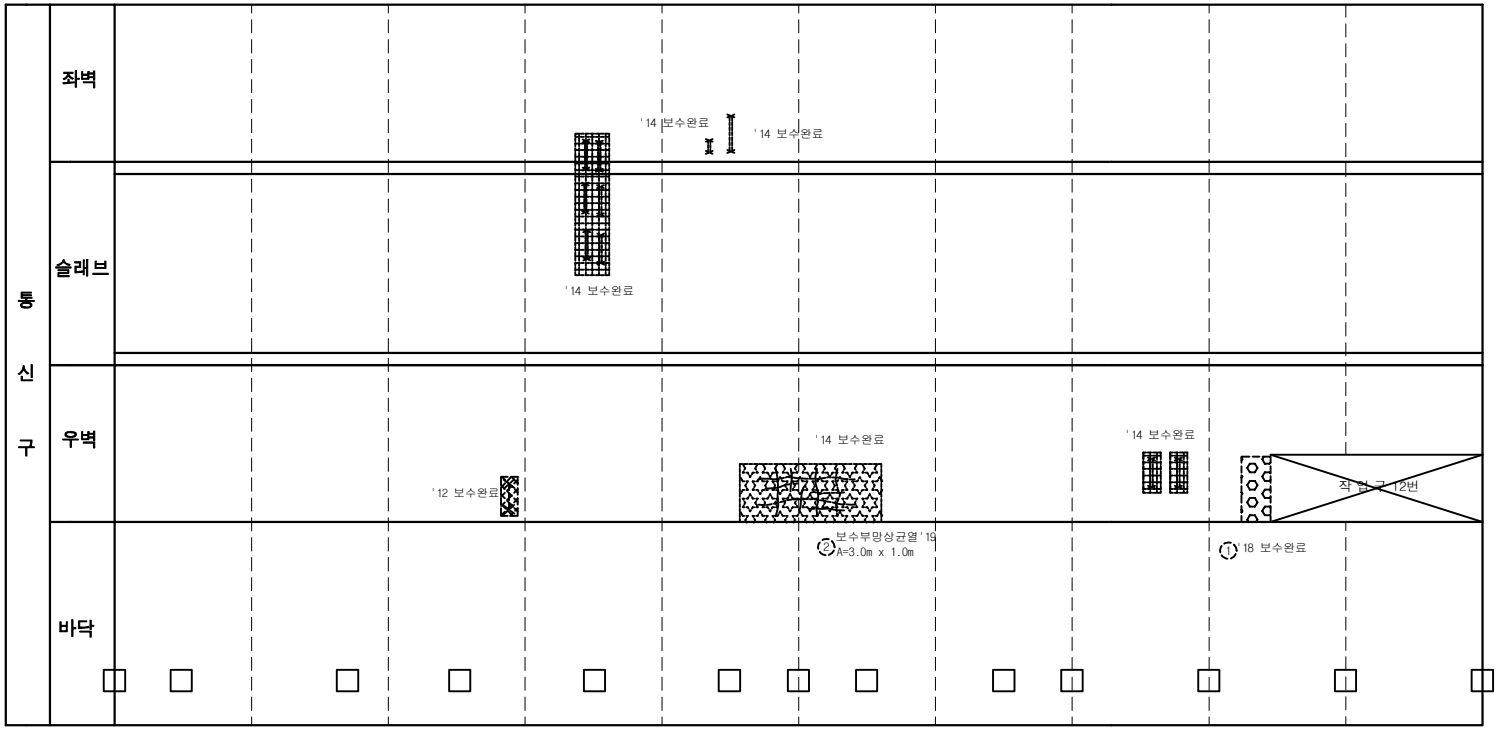

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	백태,누수흔적	0.3	1.50		0.45	㎡	1	2018	누수보수공법	0.54	
2	2019	보수부 망상균열	3.0	1.00		3.00	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 작업구 13번 (순환선 1,722m)

KEYPLAN

SECTION

전면

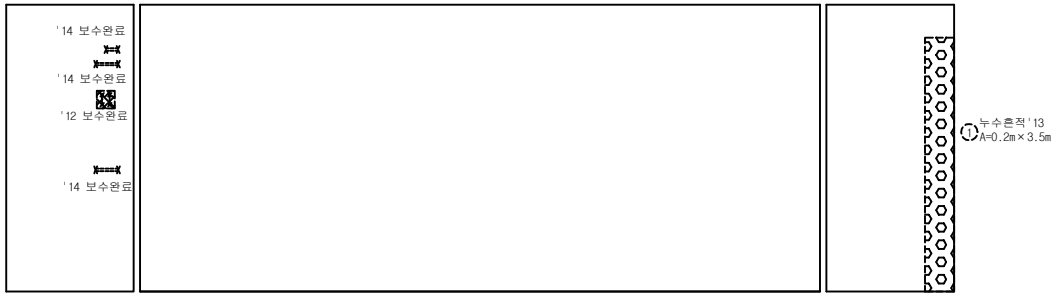

좌벽

우벽



배면



바닥

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	누수흔적	0.2	3.50		0.70	㎡	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **작업구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+720m ~ 1+740m)





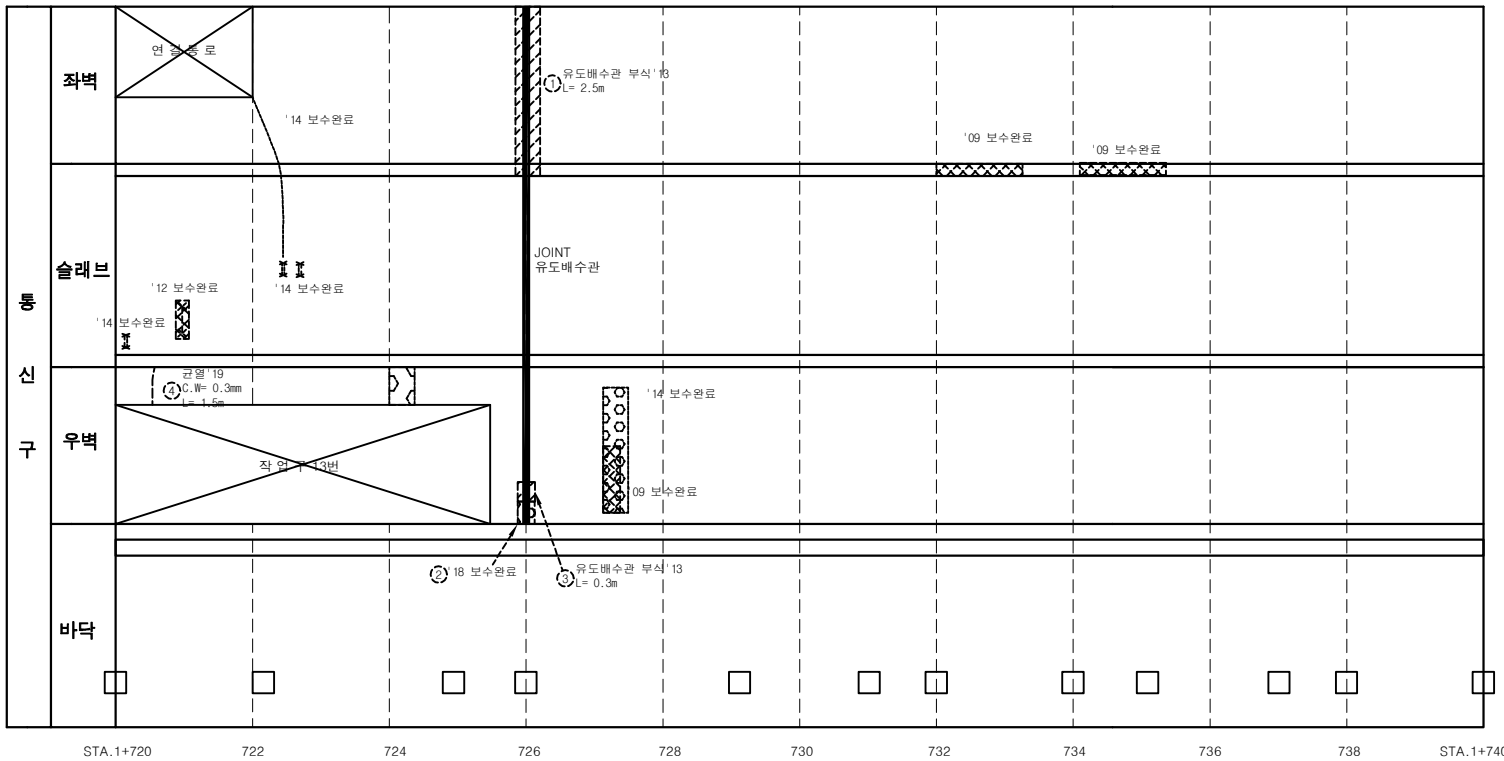

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	유도배수관부식		2.50		2.50	m	1			-	
2	2013	누수		0.40		0.40	m	1	2018	습식균열보수	0.48	
3	2013	유도배수관부식		0.30		0.30	m	1			-	
4	2019	균열	0.3	1.50		1.50	m	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+740m ~ 1+760m)





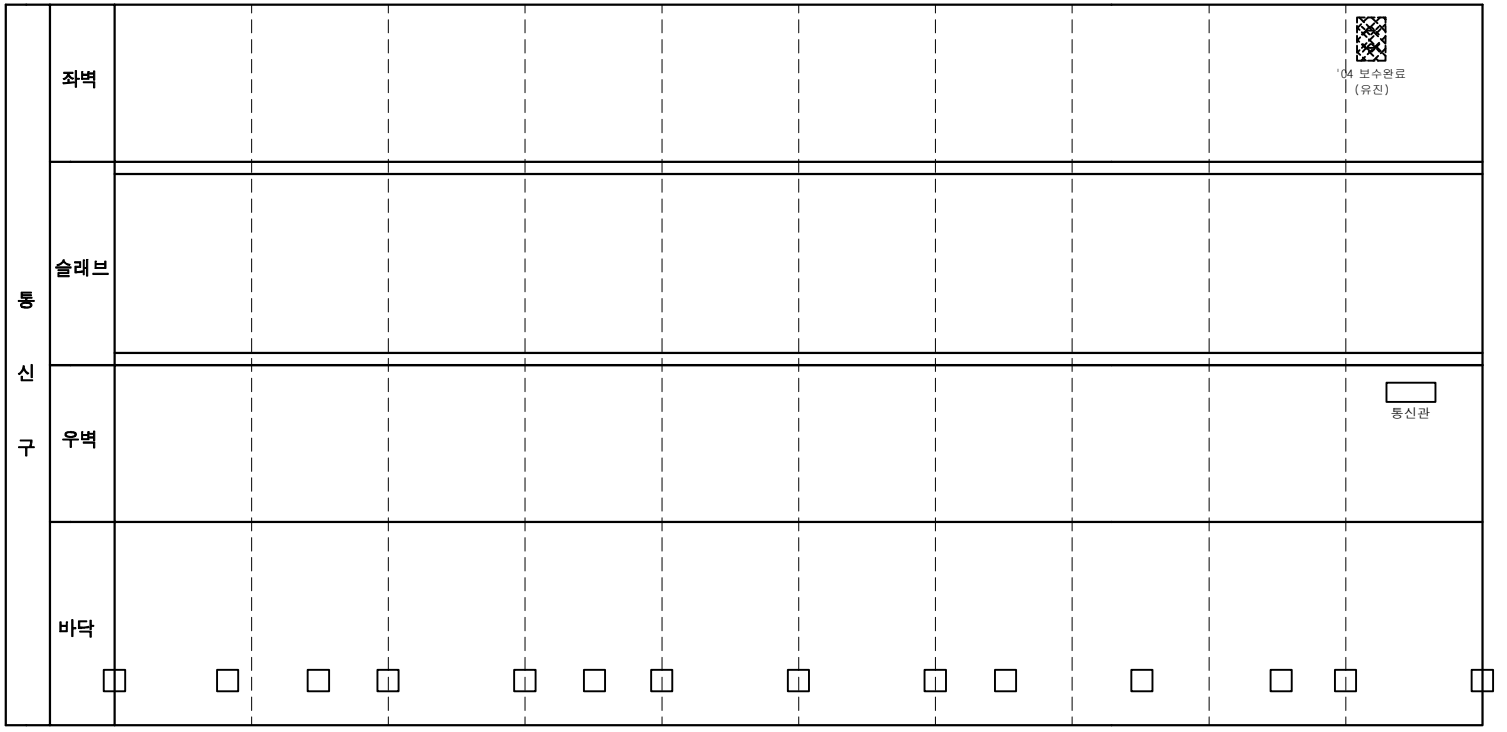

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+760m ~ 1+780m)





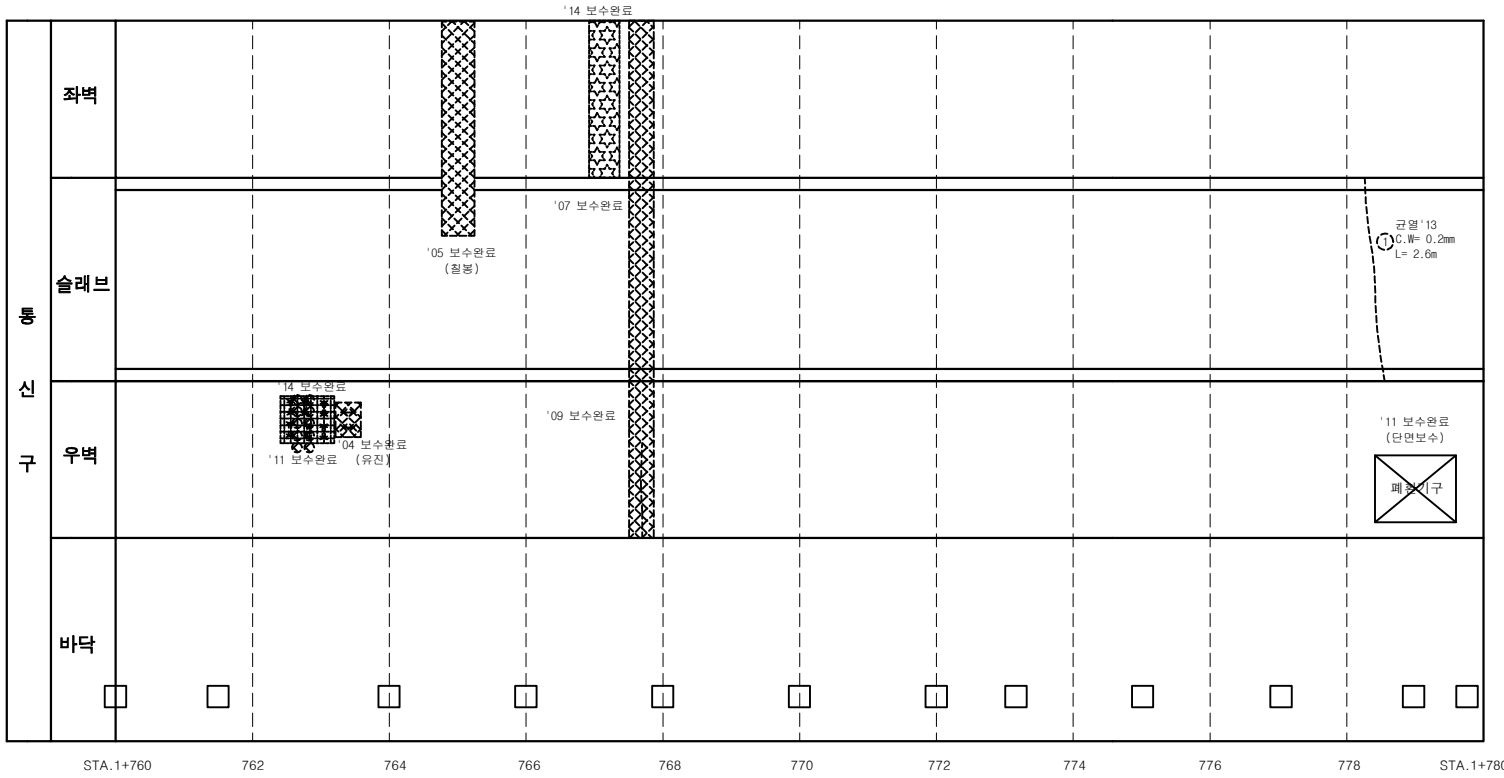

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.2	2.60		2.60	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+780m ~ 1+800m)





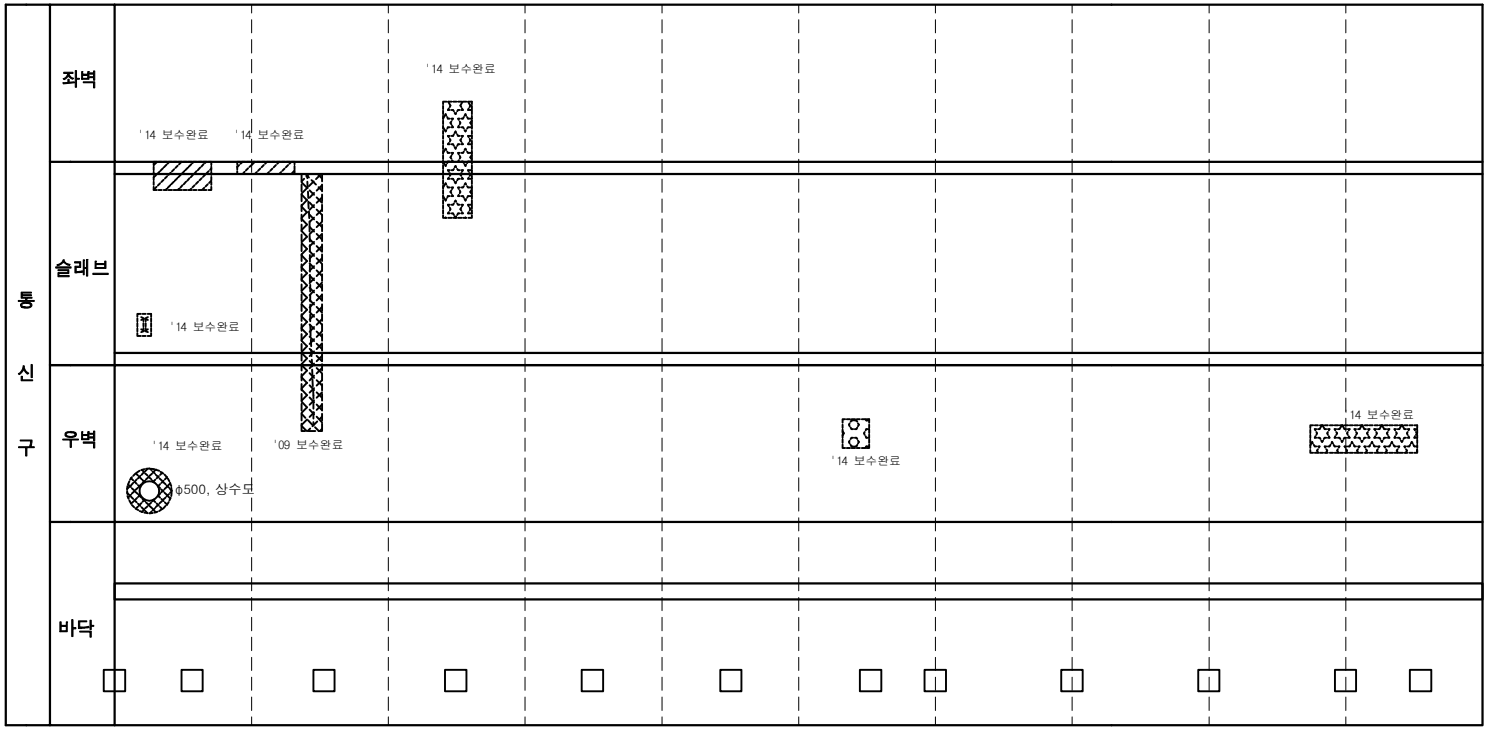

손 상 물 량 표

연번	제품 년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수면	공법명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+800m ~ 1+820m)





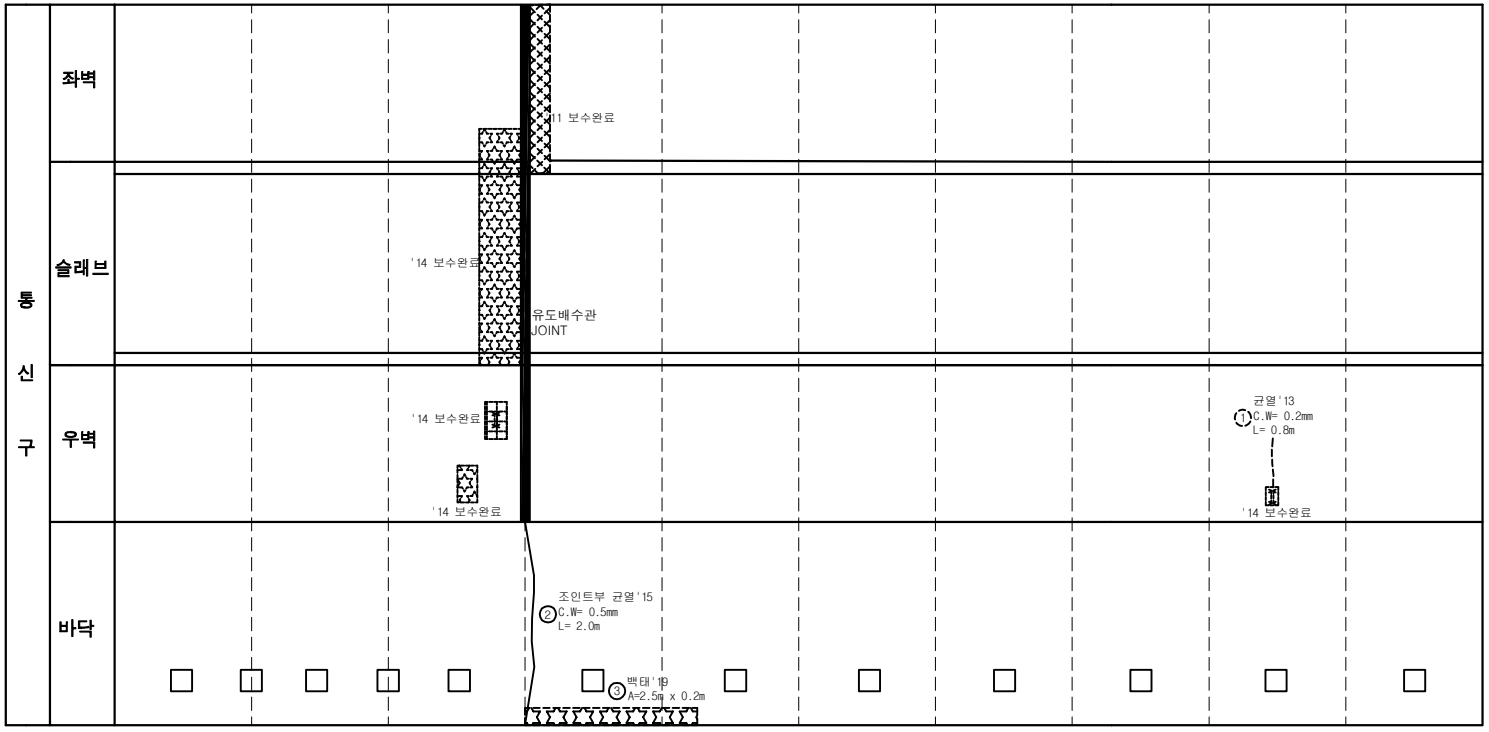

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.2	0.80		0.80	m	1			-	
2	2015	조인트부 균열	0.5	2.00		2.00	m	1			-	
3	2019	백태	2.5	0.20		0.50	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+820m ~ 1+840m)





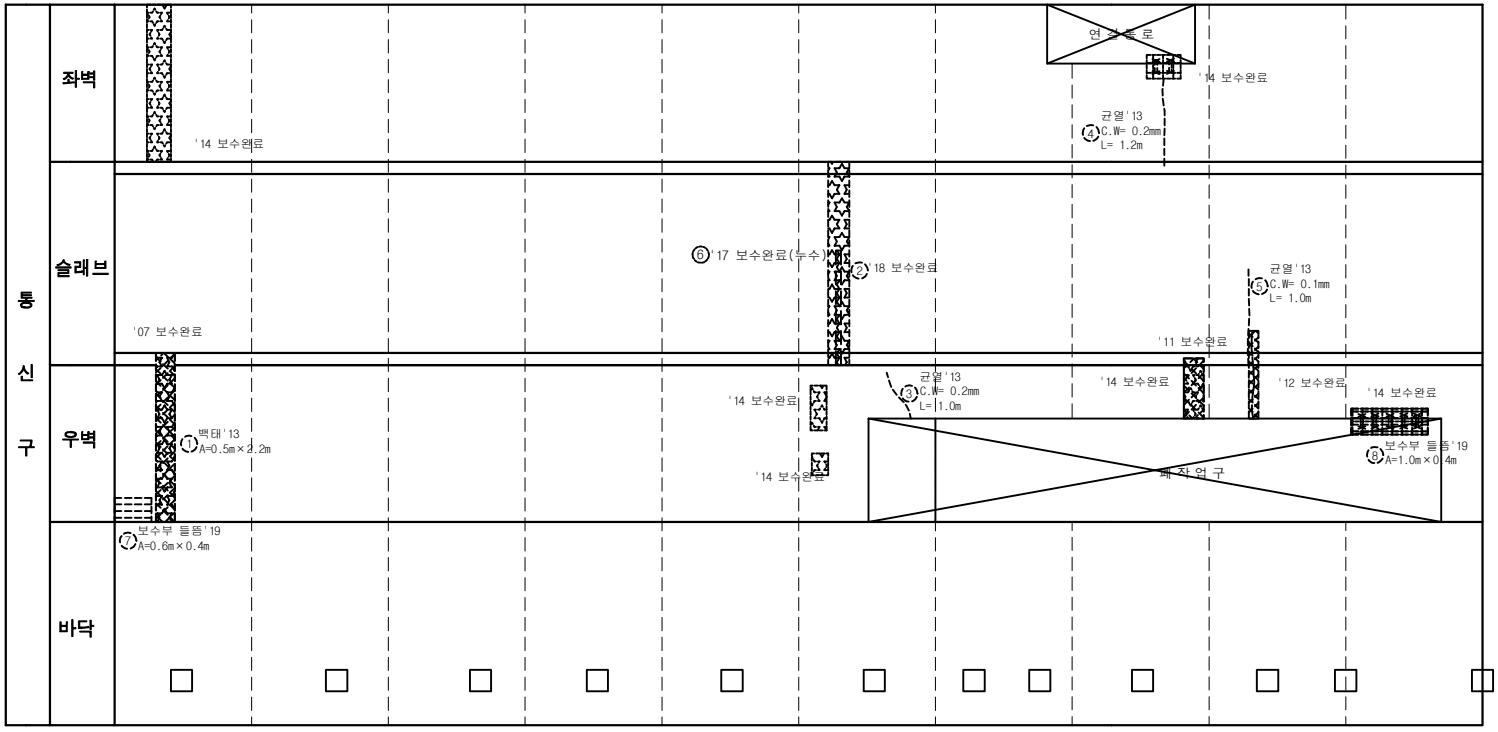

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	백태	0.5	2.20		1.10	㎡	1			-	
2	2013	백태	0.3	2.30		0.69	㎡	1	2018	표면처리공법	0.83	
3	2013	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	
4	2013	균열	0.2	1.20		1.20	m	1			-	
5	2013	균열	0.1	1.00		1.00	m	1			-	
6	2017	누수		1.00		1.00	m	1	2017	누수보수공법	1.20	
7	2019	보수부 들뜸	0.6	0.40		0.24	㎡	1			-	신규
8	2019	보수부 들뜸	1.0	0.40		0.40	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 폐 작업구 (순환선 1,835m)

KEYPLAN

SECTION



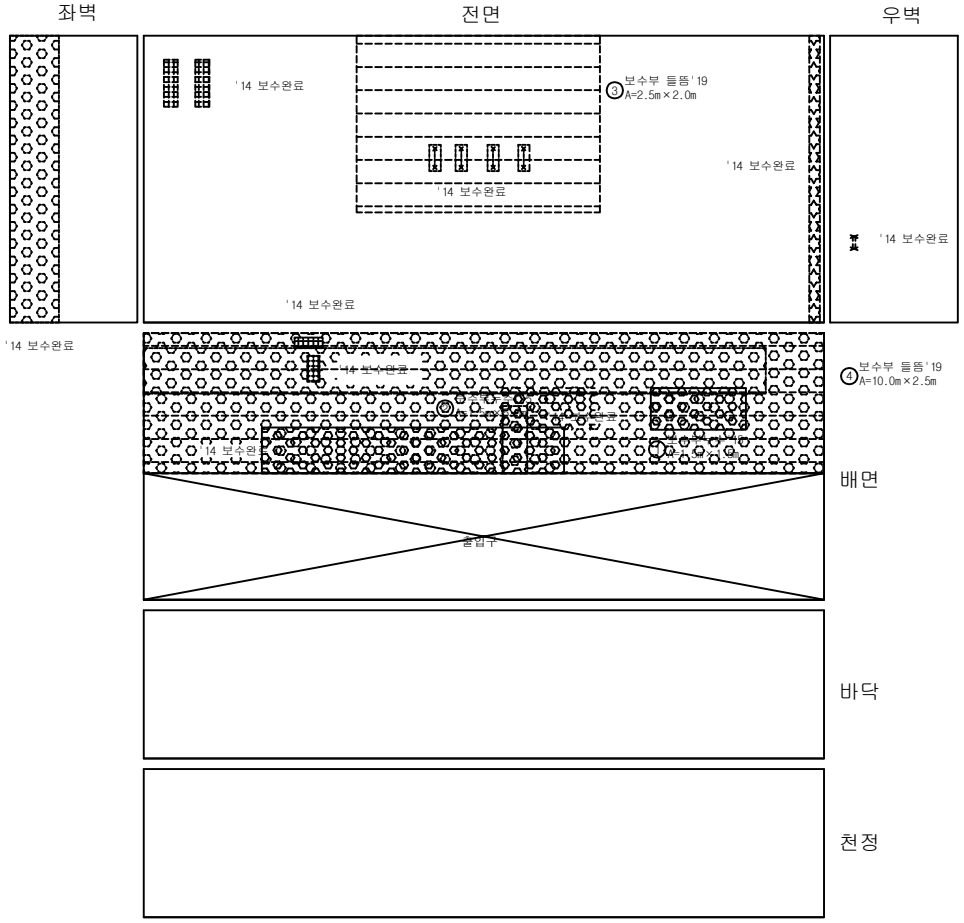
좌벽
전면
우벽
'14 보수완료
③ 보수부 들뜸'19
A=2.5m×2.0m
'14 보수완료
'14 보수완료
'14 보수완료
'14 보수완료
'14 보수완료
'14 보수완료
④ 보수부 들뜸'19
A=10.0m×2.5m
'14 보수완료
'14 보수완료
'14 보수완료
'14 보수완료
'14 보수완료
'14 보수완료

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+840m ~ 1+860m)





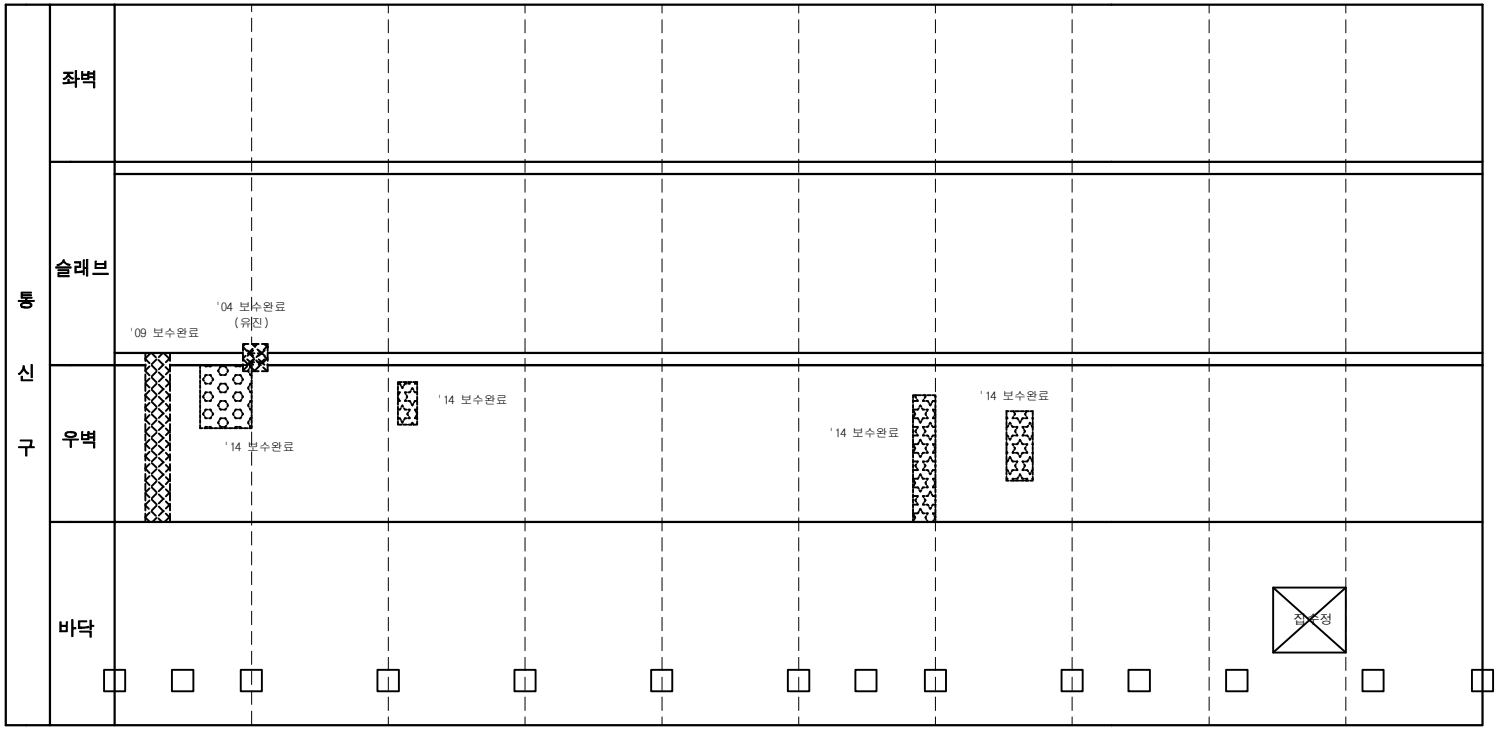

손상물량표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수면	공법명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+860m ~ 1+880m)





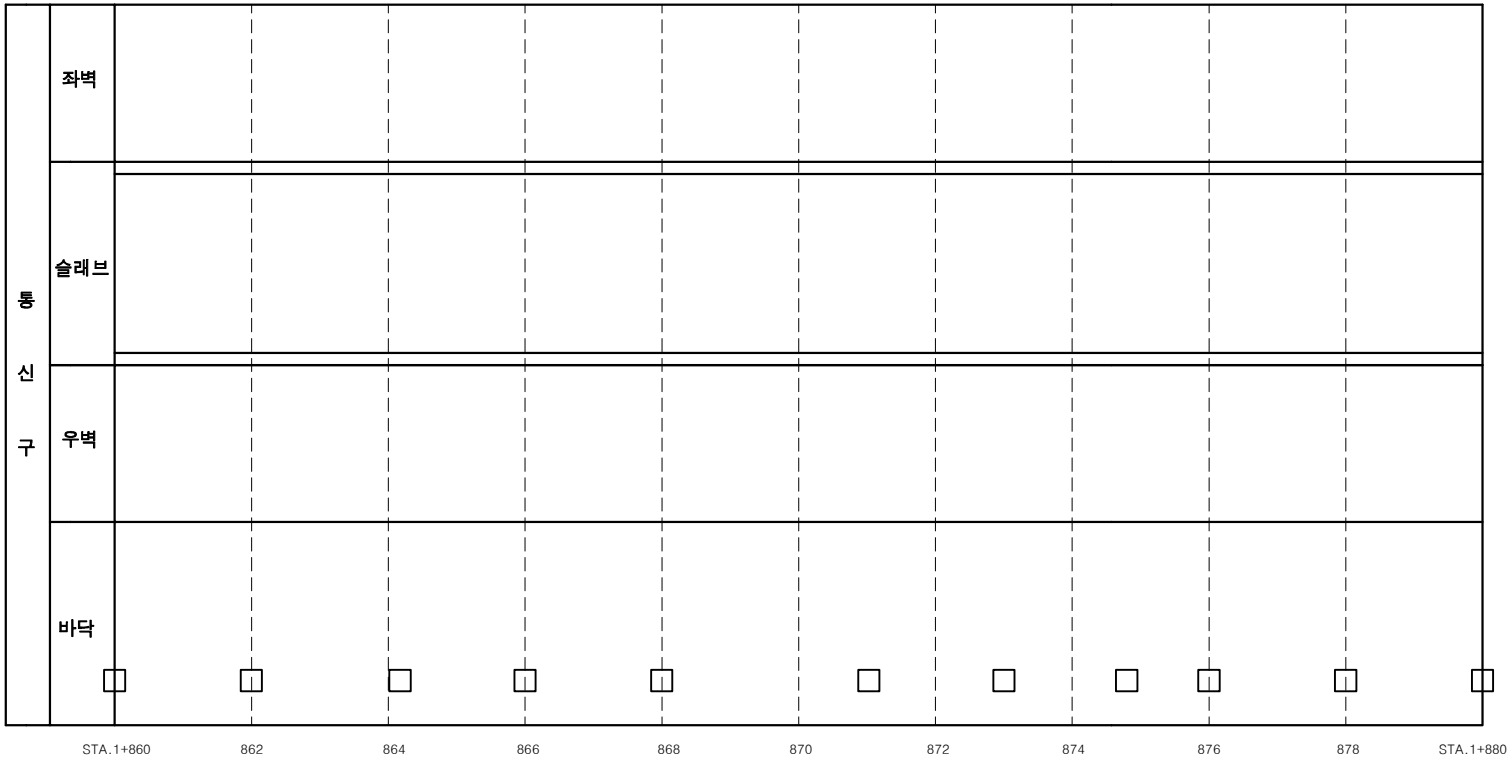

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수면	공법명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+880m ~ 1+900m)





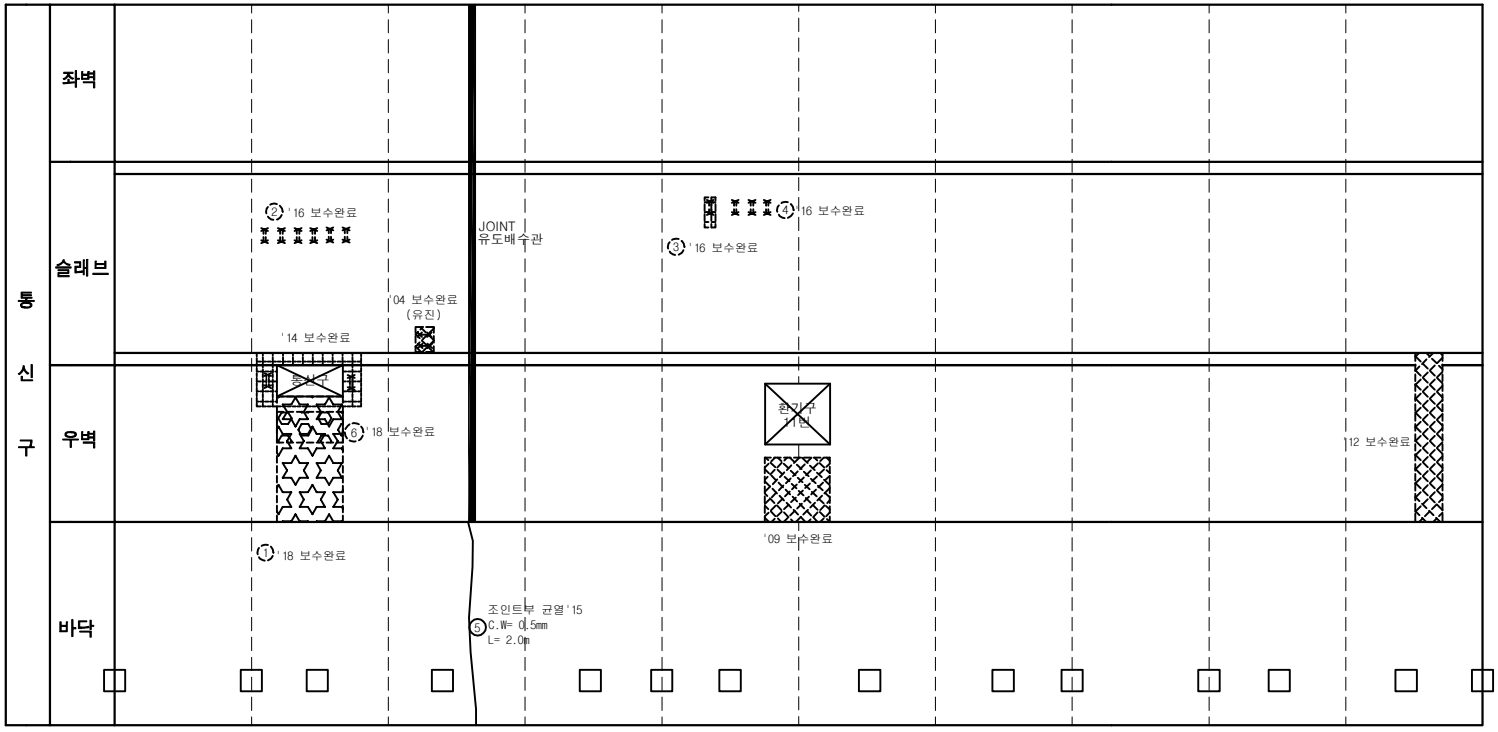

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	백태	1.0	1.50		1.50	㎡	1	2018	표면처리공법	1.80	
2	2013	철근노출	0.1	0.10		0.06	㎡	6	2016	단면복구(방청)	0.07	
3	2013	철근노출,박락	0.1	1.00		0.10	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.12	
4	2013	철근노출	0.1	0.10		0.03	㎡	3	2016	단면복구(방청)	0.04	
5	2015	조인트부 균열	1.5	2.00		2.00	m	1			-	
6	2017	누수	1.0	0.50		0.50	㎡	1	2018	배면누수보수	0.60	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

환기구 11번 (순환선 1,887m)

KEYPLAN

SECTION

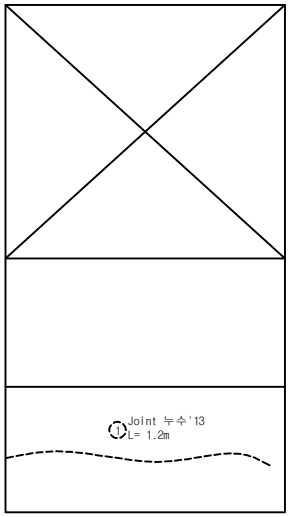

배면

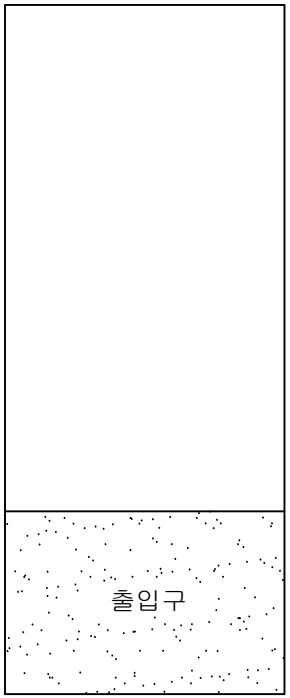

좌벽

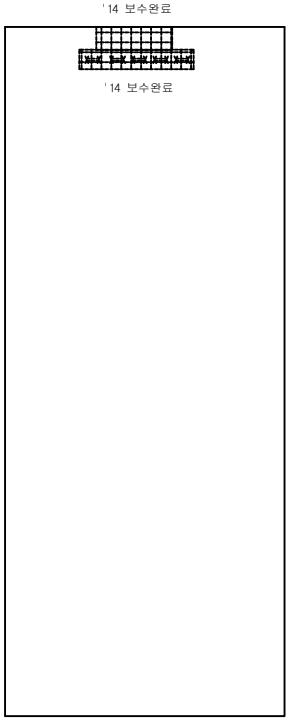

전면

우벽

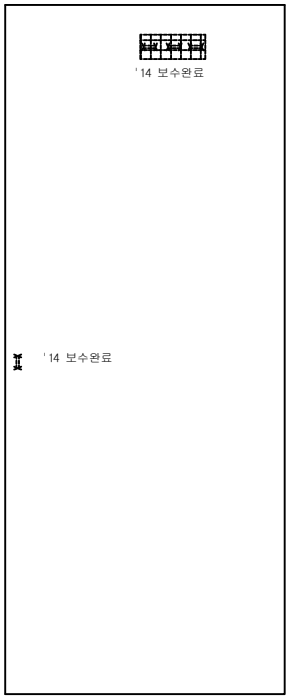

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	신축이음부누수		1.20		1.20	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **환기구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+900m ~ 1+920m)





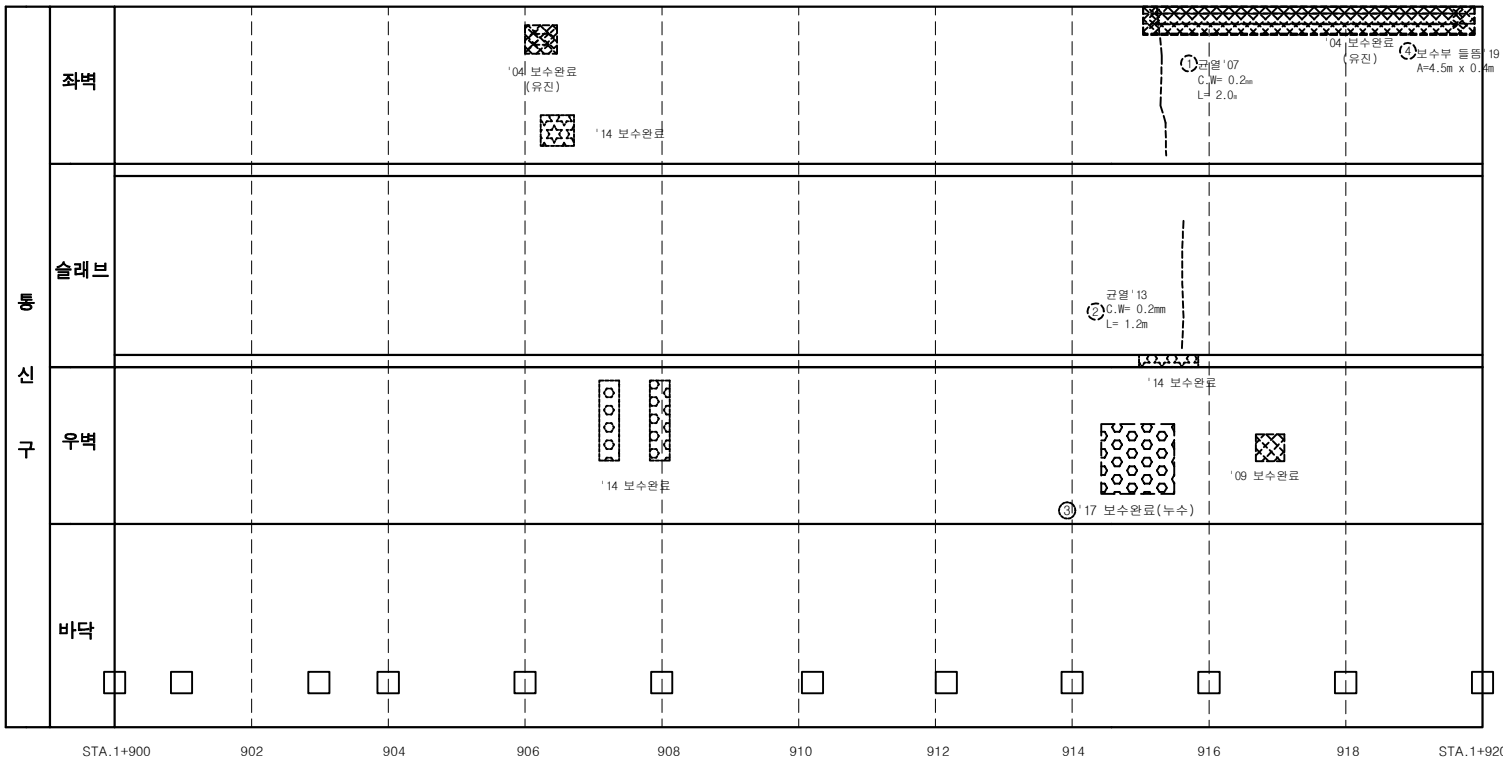

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
2	2013	균열	0.2	1.20		1.20	m	1			-	
3	2017	누수				0.68	㎡	1	2017	누수보수공법	0.82	
4	2019	보수부 들뜸	4.5	0.40		1.80	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+920m ~ 1+940m)





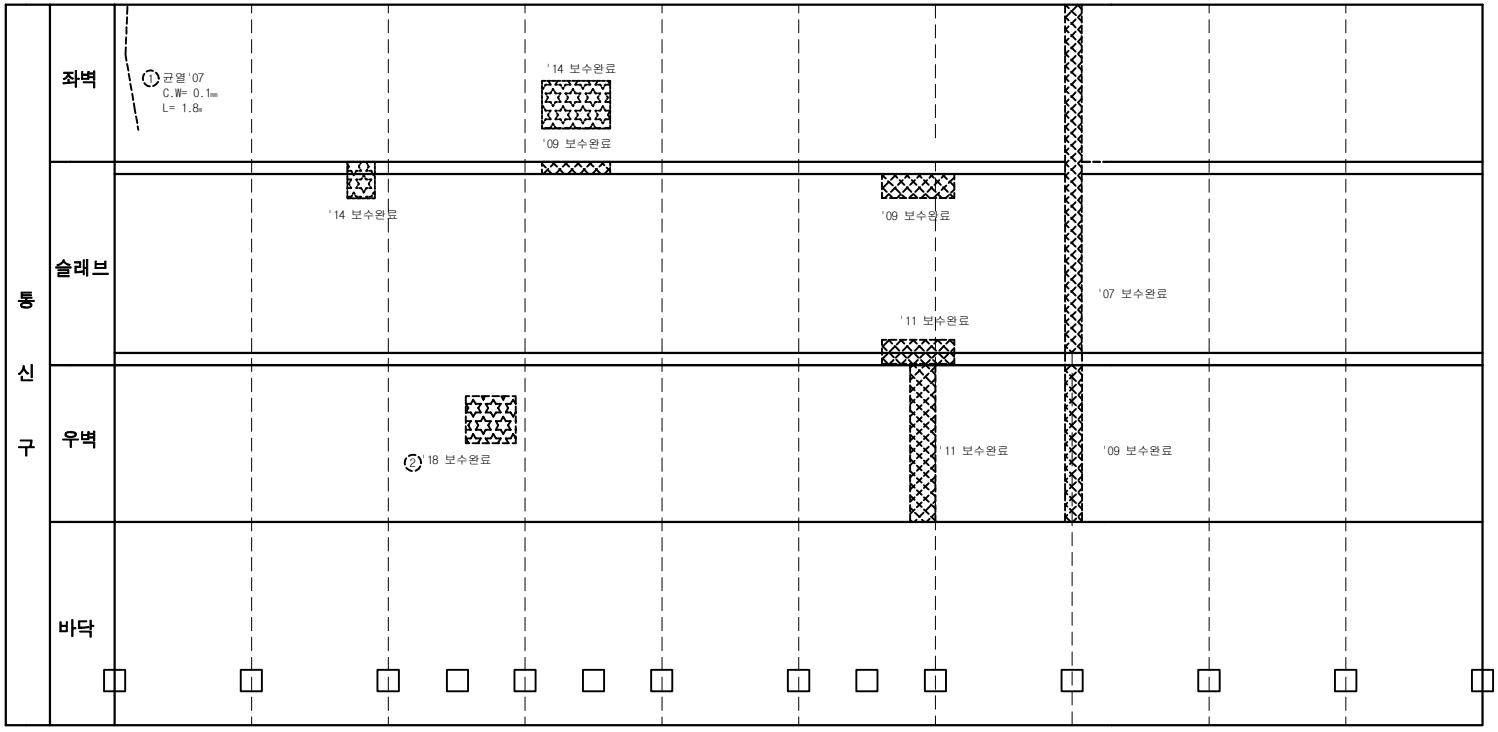

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.1	1.80		1.80	m	1			-	
2	2013	백태	0.8	0.80		0.64	㎡	1	2018	표면처리공법	0.77	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+940m ~ 1+960m)





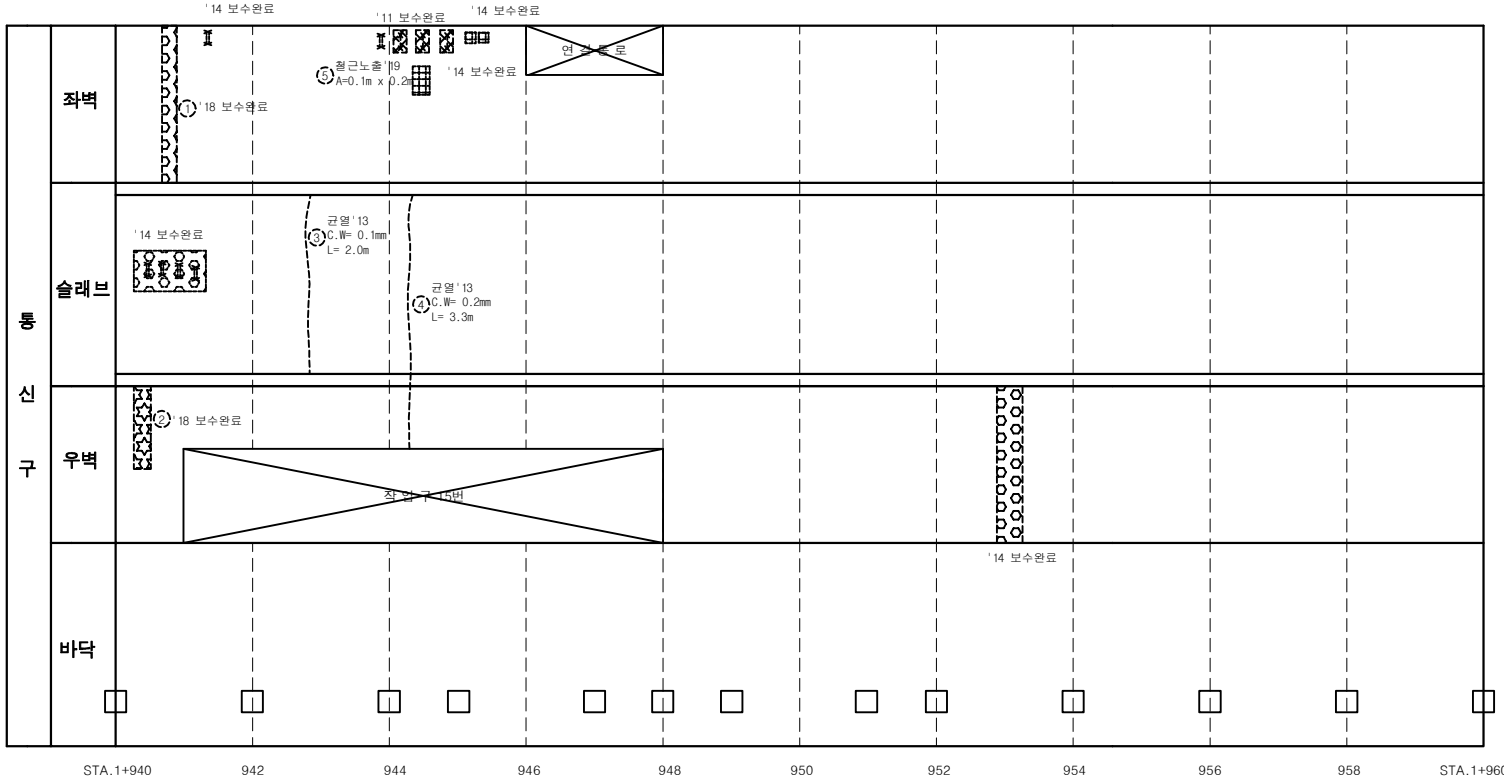

손상물량표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	누수,백태	0.4	2.20		0.88	㎡	1	2018	배면누수보수	1.06	
2	2013	누수	0.2	1.00		0.20	㎡	1	2018	배면누수보수	0.24	
3	2013	균열	0.1	2.00		2.00	m	1			-	
4	2013	균열	0.2	3.30		3.30	m	1			-	
5	2013	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 작업구 15번 (순환선 1,941m)

KEYPLAN

SECTION



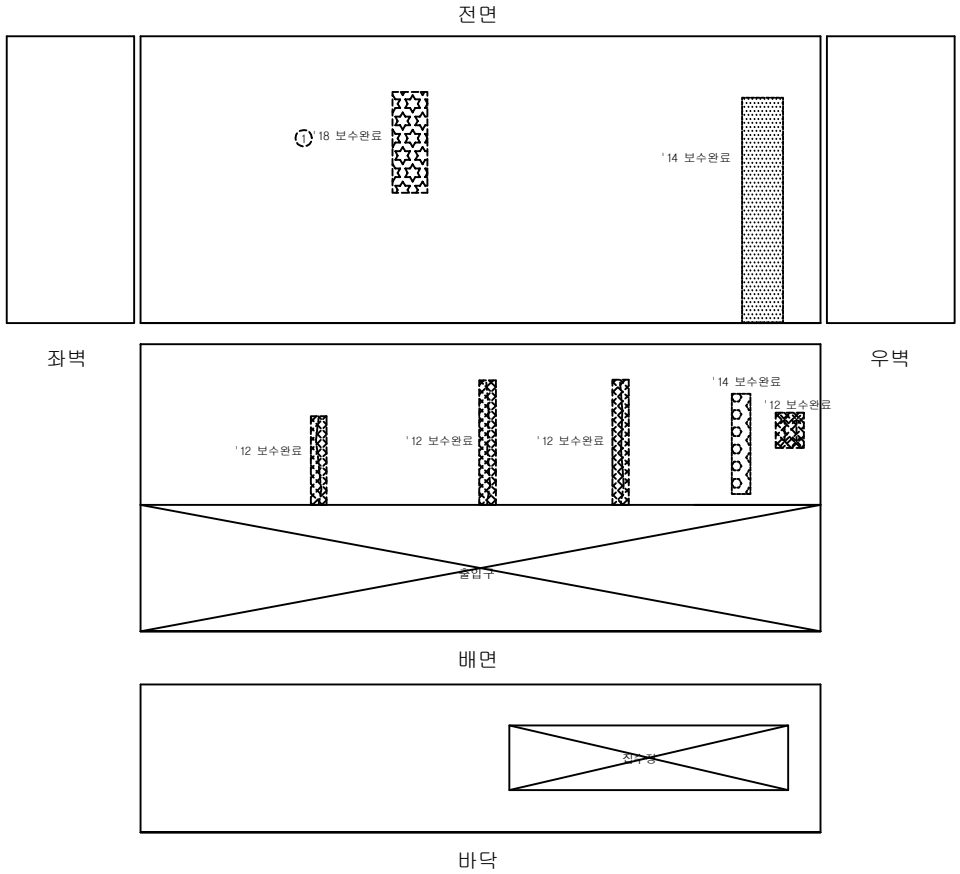

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	백태	0.2	1.20		0.24	㎡	1	2018	표면처리공법	0.29	

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)

TITLE OF SHIFT

작업구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+960m ~ 1+980m)





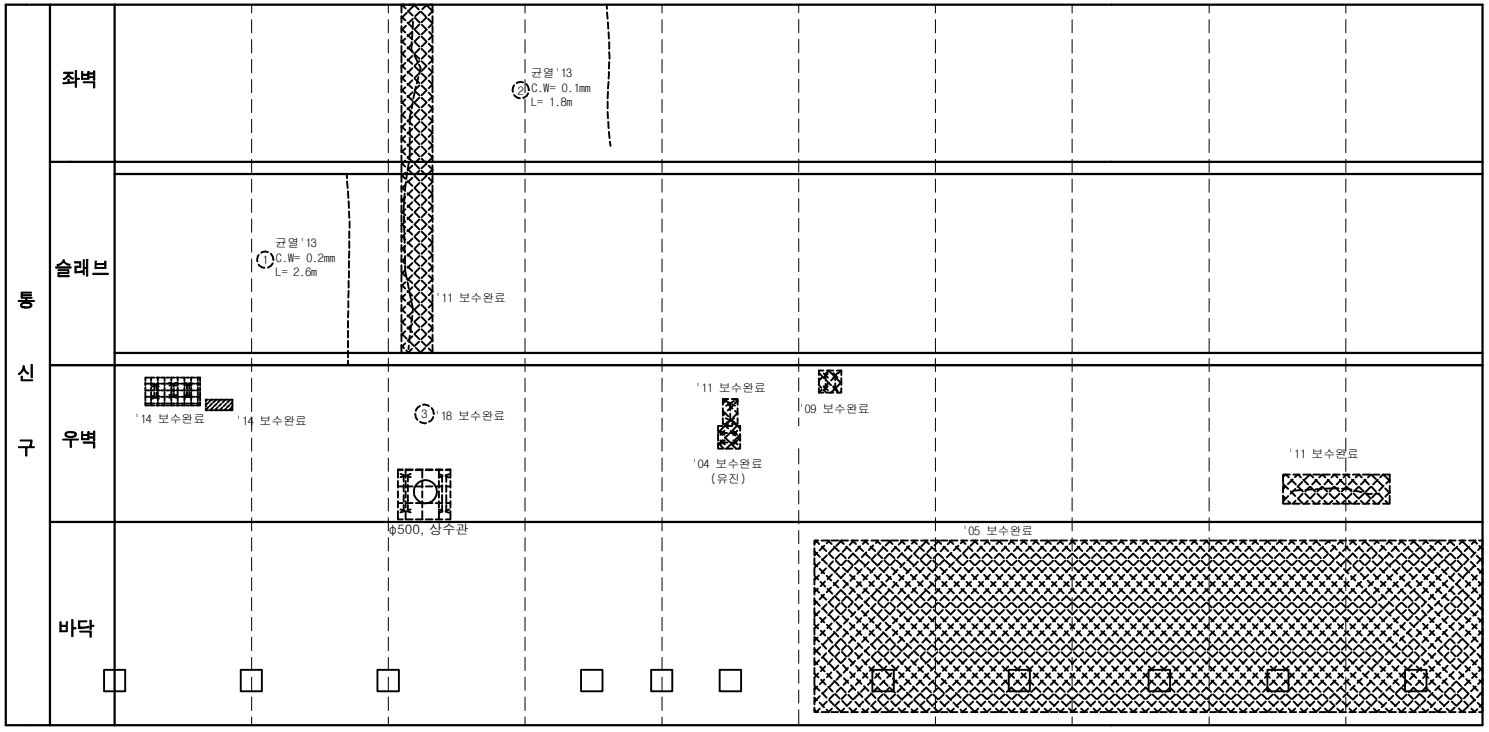

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.2	2.60		2.60	m	1			-	
2	2013	균열	0.1	1.80		1.80	m	1			-	
3	2017	박리,철근노출	1.0	1.00		1.00	㎡	1	2018	단면복구(방청)	1.20	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 1+980m ~ 2+000m)



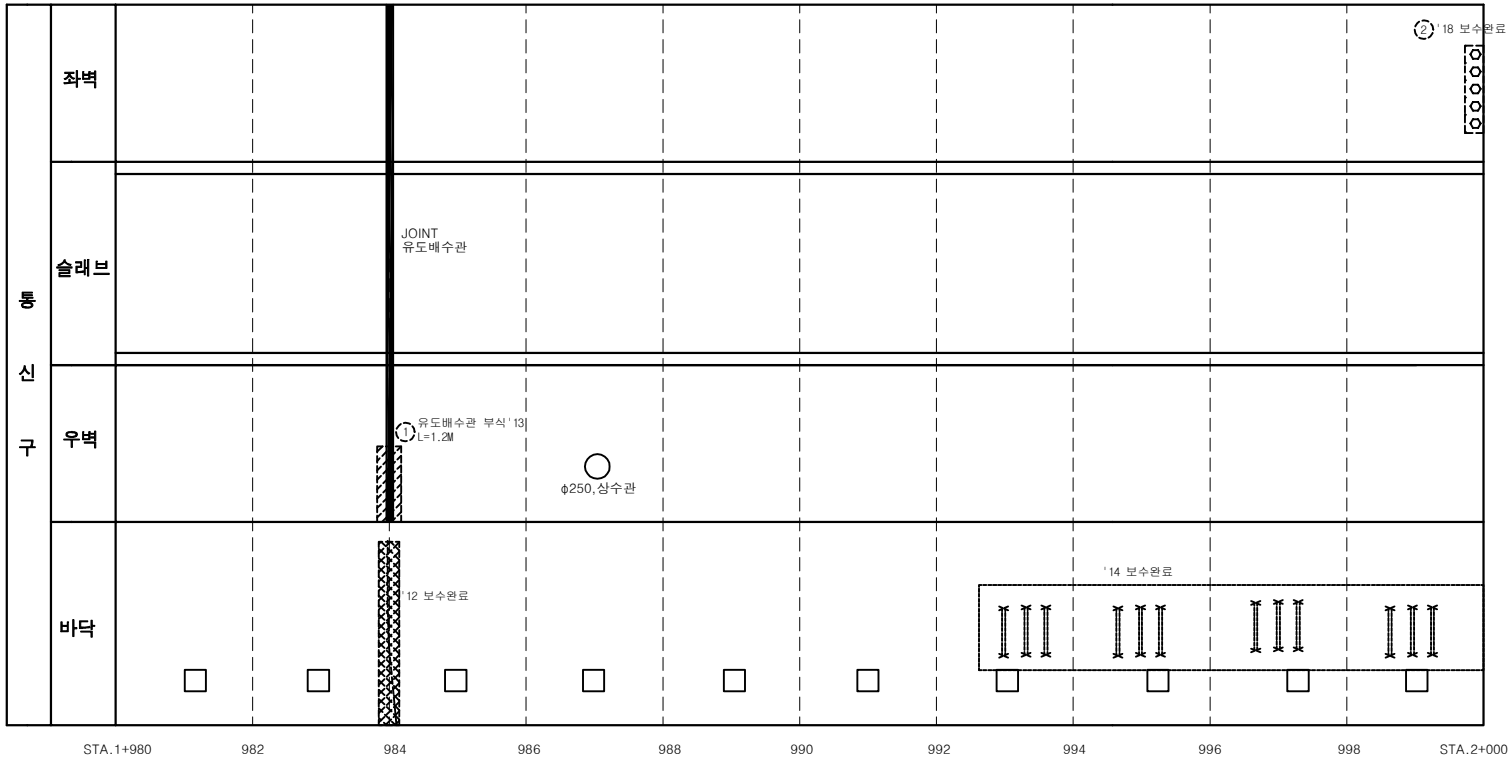

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	유도배수관부식			1.20	1.20	m	1			-	
2	2017	누수			1.00	1.00	m	1	2018	습식균열보수	1.20	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+000m ~ 2+020m)



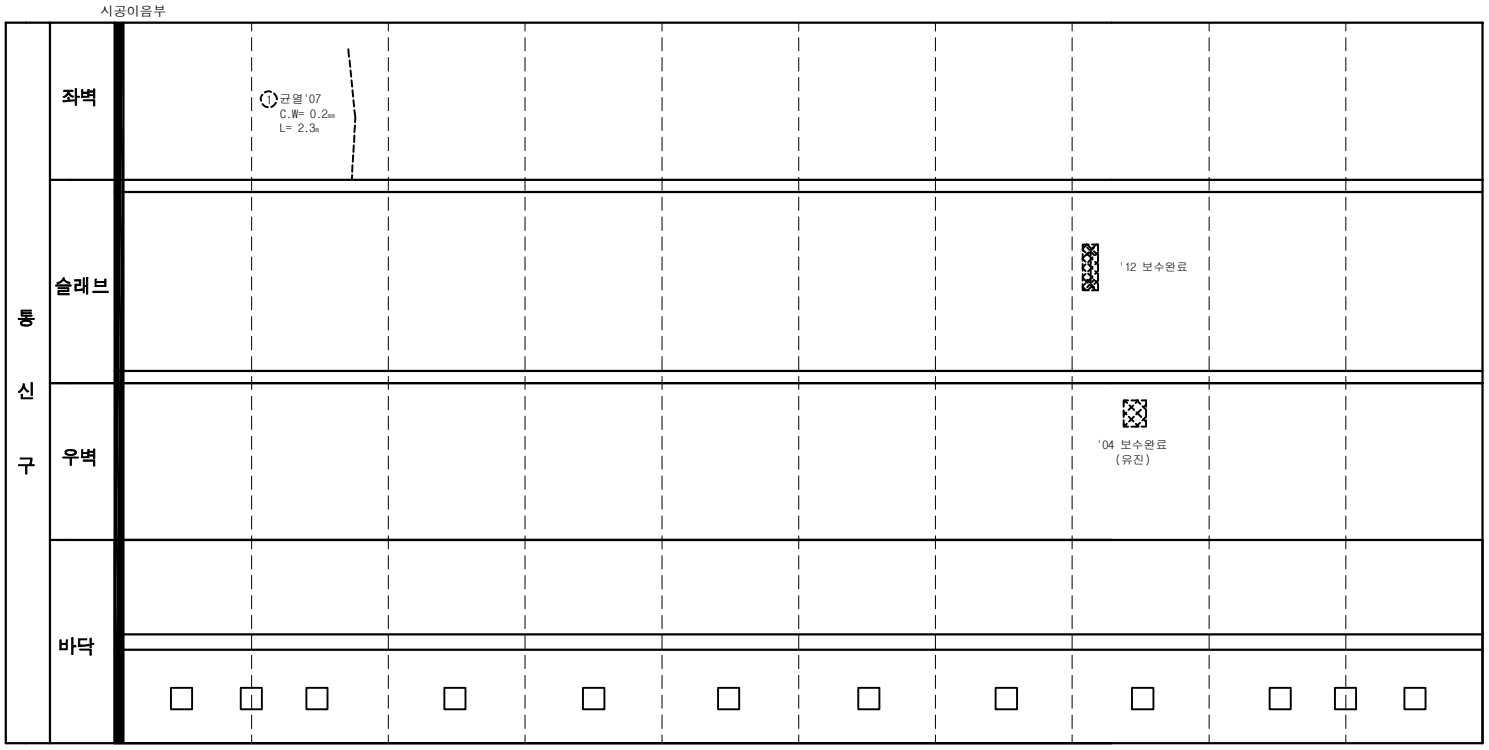

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.2	2.30		2.30	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+020m ~ 2+040m)





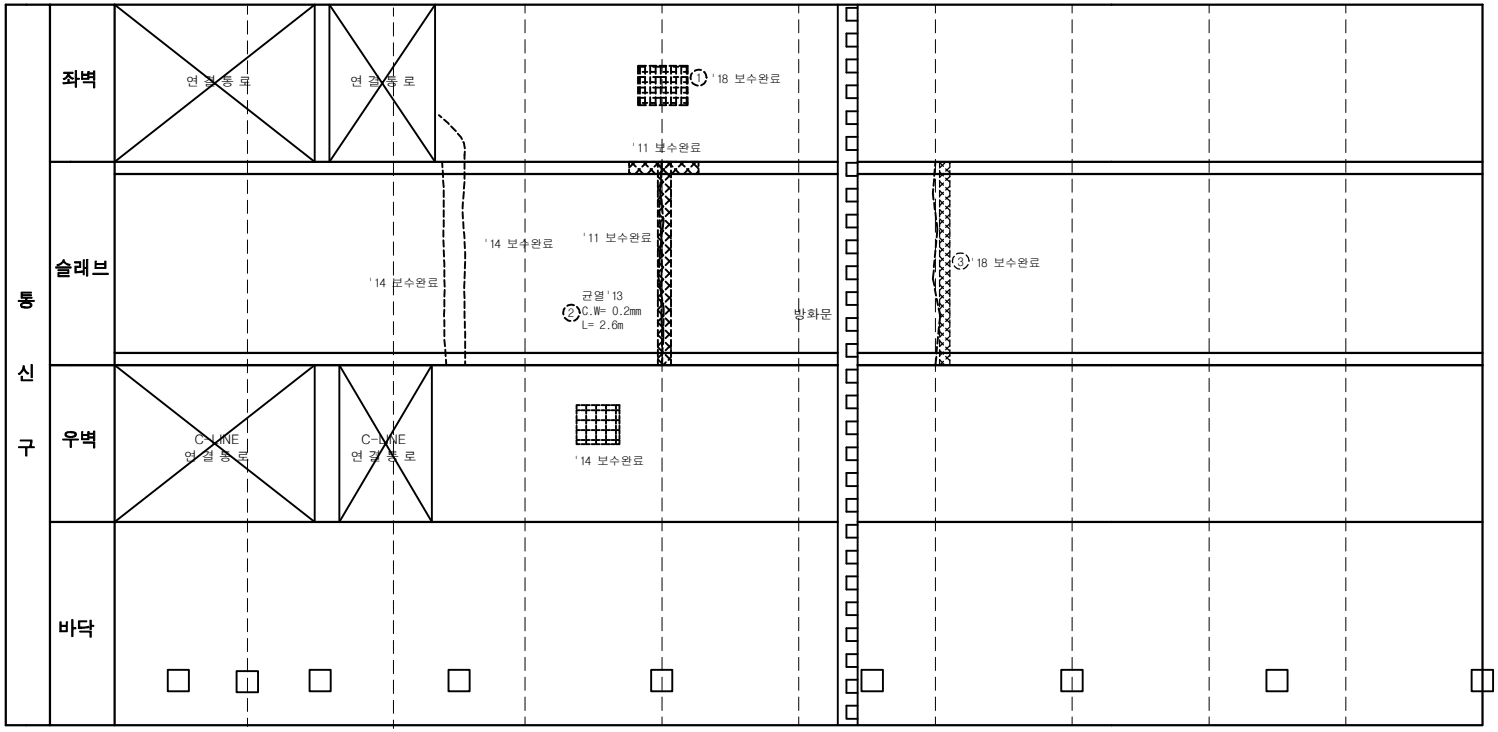

손상물량표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	보수부 망상균열	1.0	1.00		1.00	㎡	1	2018	표면처리공법	1.20	
2	2013	균열	0.2	2.60		2.60	m	1			-	
3	2013	보수불량,백태	0.1	2.60		0.26	㎡	1	2018	표면처리공법	0.31	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+040m ~ 2+060m)





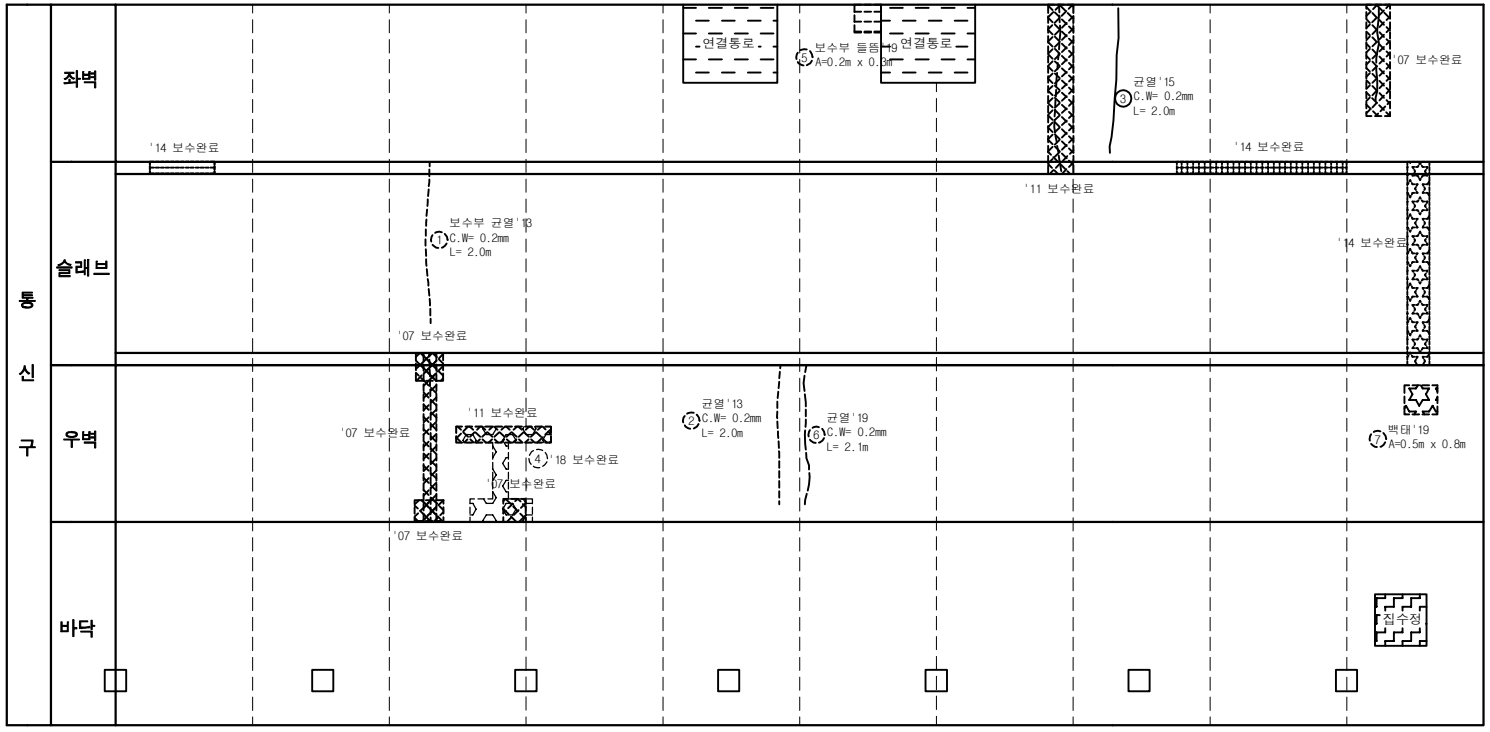

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	보수부 균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	재결함
2	2013	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
3	2015	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
4	2017	누수	0.5	3.00		1.50	㎡	1	2018	배면누수보수	1.80	
5	2019	보수부 들뜸	0.2	0.30		0.06	㎡	1			-	신규
6	2019	균열	0.2	2.10		2.10	m	1			-	신규
7	2019	백태	0.5	0.80		0.40	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+060m ~ 2+080m)





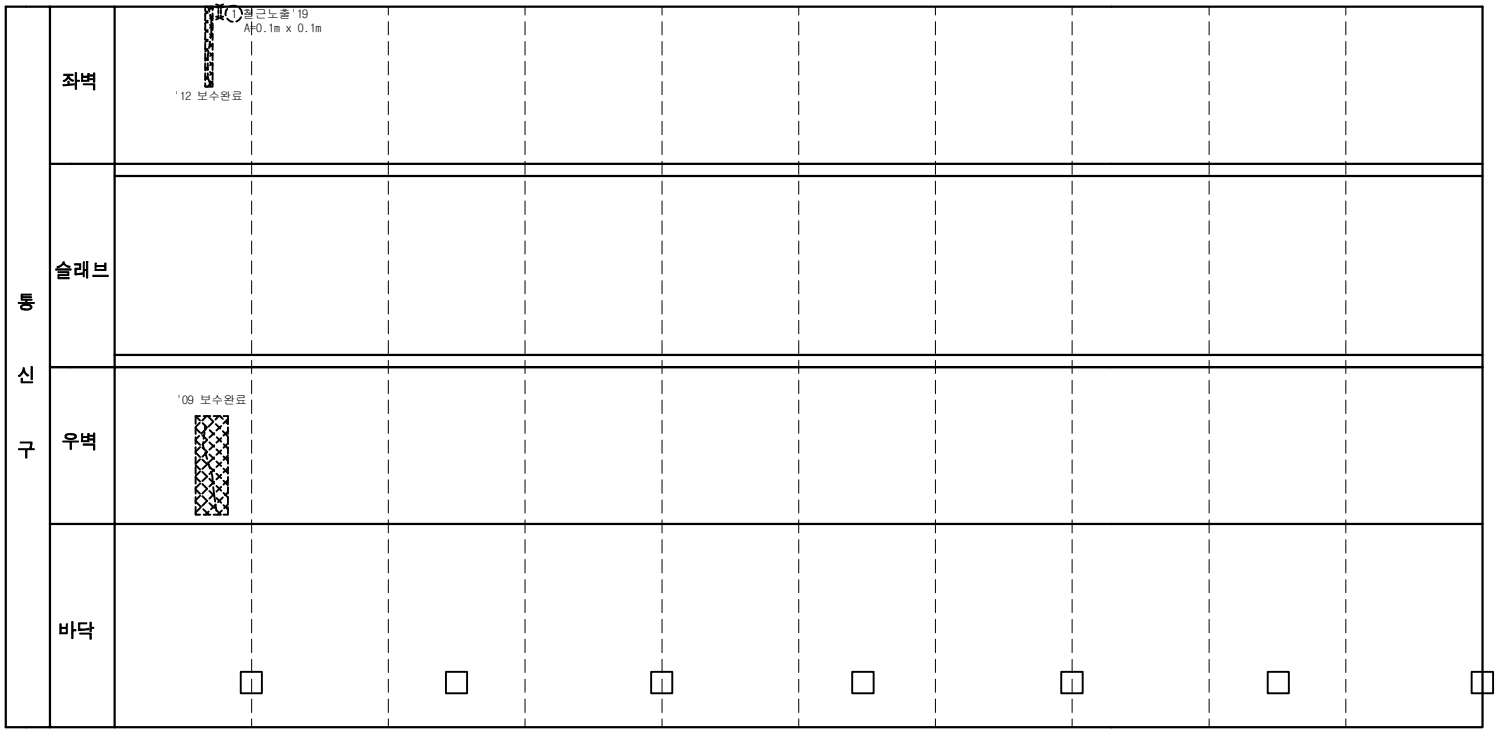

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2019	철근노출	0.1	0.10		0.01	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+080m ~ 2+100m)





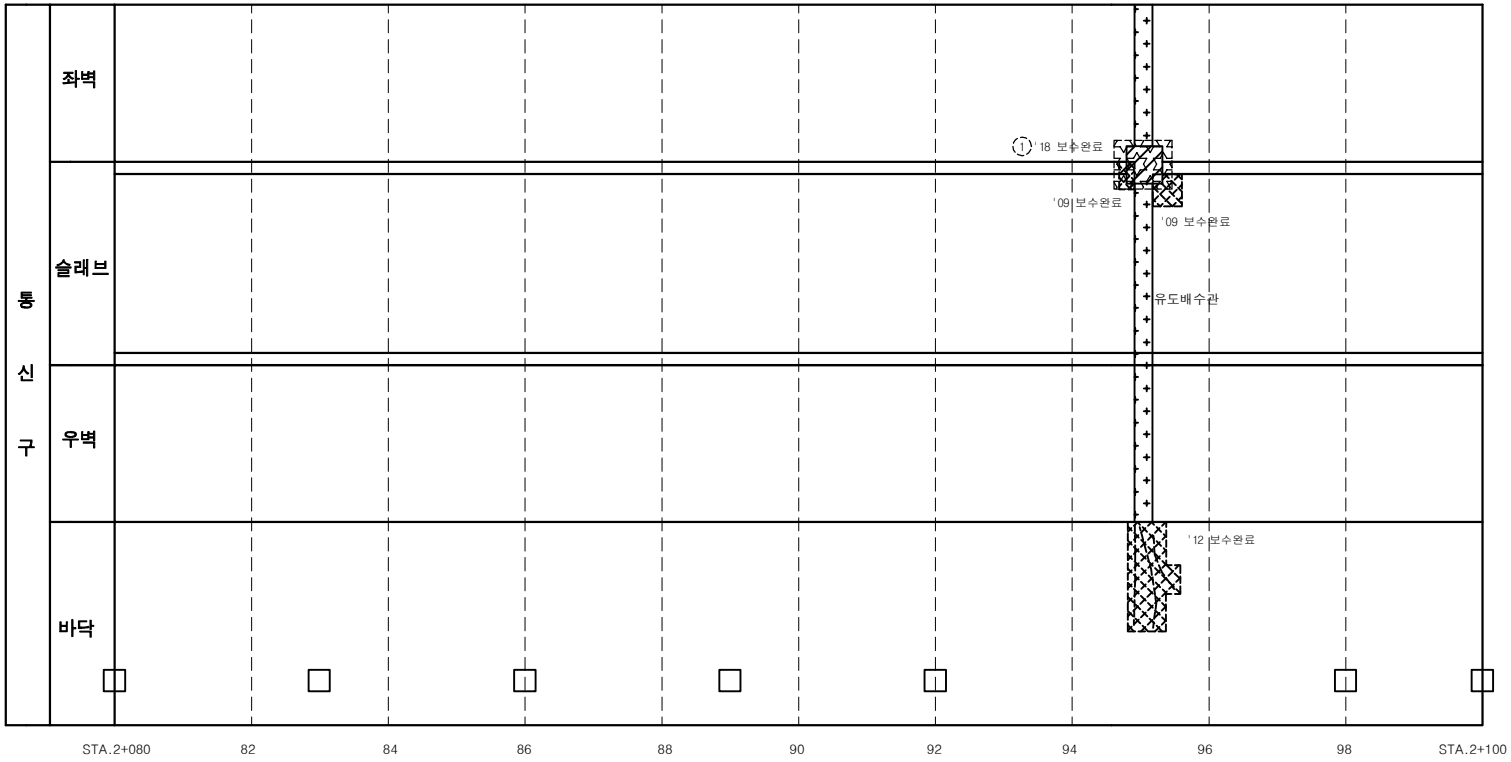

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2017	백태	1.5	1.00		1.50	㎡	1	2018	표면처리공법	1.80	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+100m ~ 2+120m)





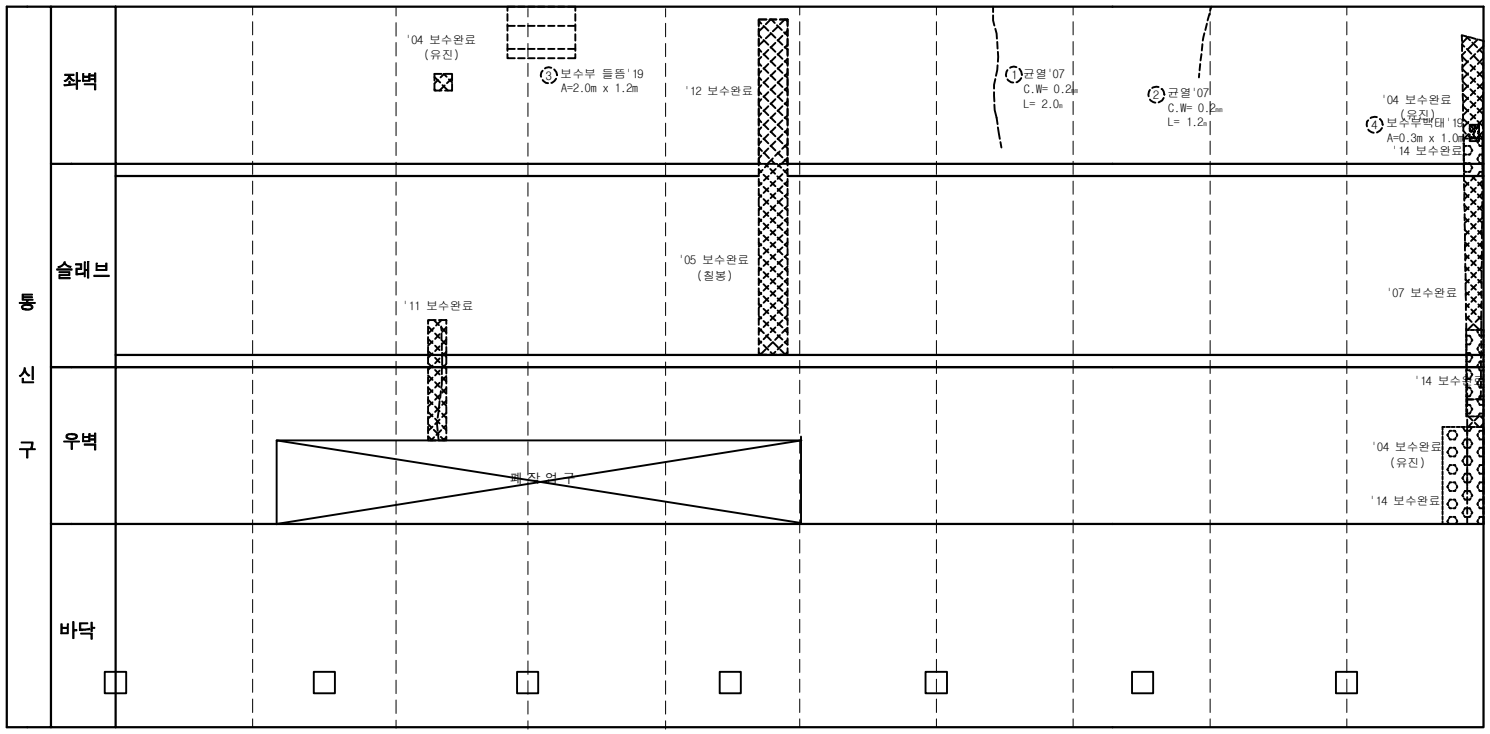

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	1.20		1.20	m	1			-	
3	2019	보수부 들뜸	2.0	1.20		2.40	㎡	1			-	신규
4	2019	보수부 백태	0.3	1.00		0.30	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 폐 작업구 (순환선 2,103m)

KEYPLAN

SECTION



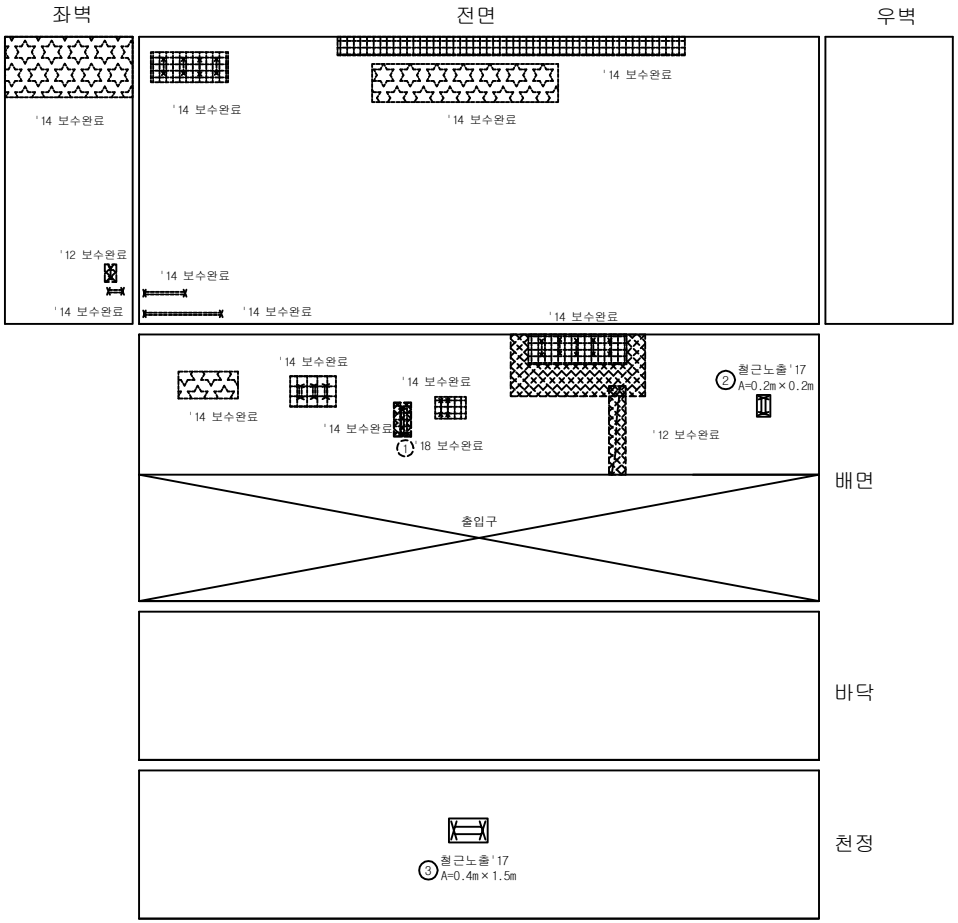

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	보수부 들뜸	0.1	0.60		0.06	㎡	1	2018	단면복구공법	0.07	
2	2017	철근노출	0.2	0.20		0.04	㎡	1			-	중요
3	2017	철근노출	0.4	1.50		0.60	㎡	1			-	중요

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)

TITLE OF SHIFT

작업구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+120m ~ 2+140m)



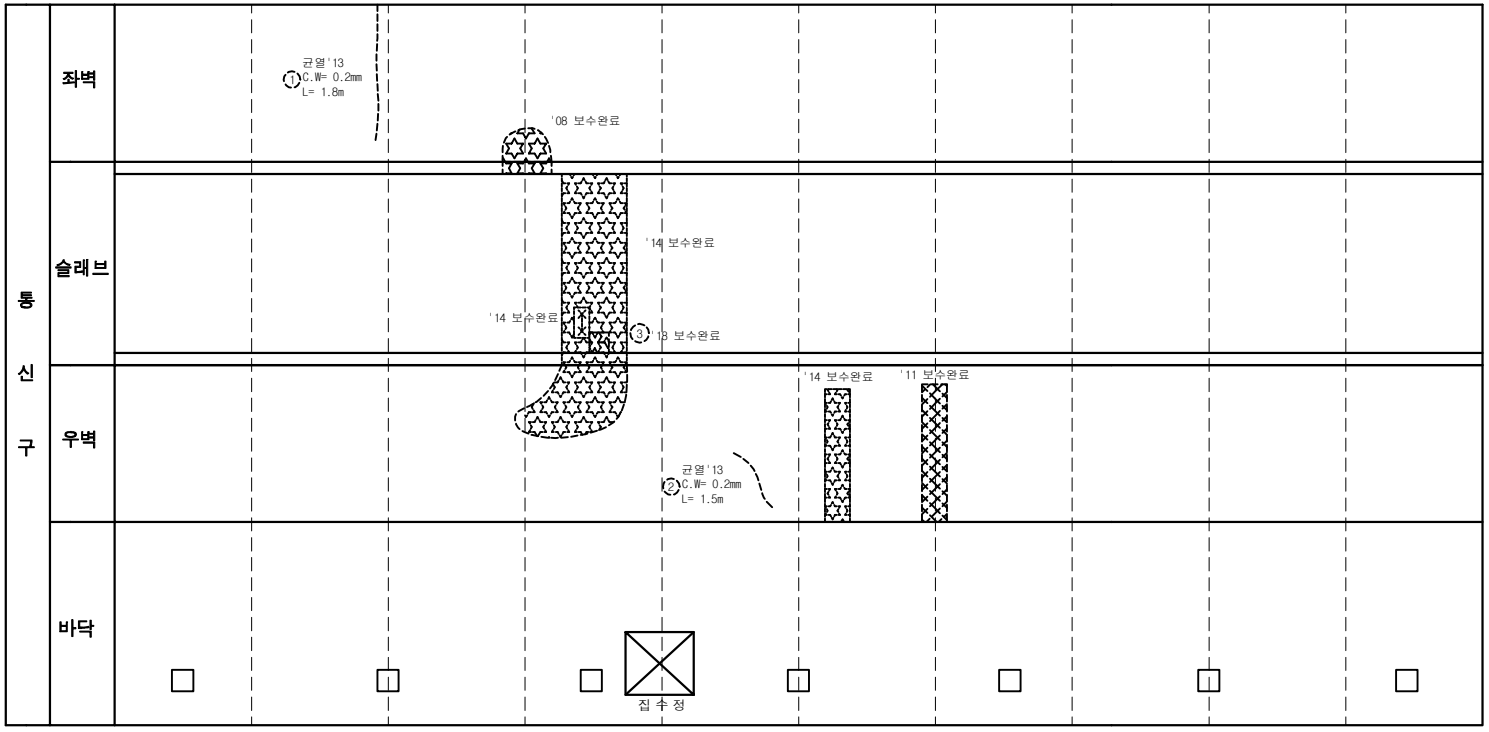

손상물량표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.2	1.80		1.80	m	1			-	
2	2013	균열	0.2	1.50		1.50	m	1			-	
3	2017	보수부 박태	0.4	0.40		0.16	㎡	1	2018	표면처리공법	0.19	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+140m ~ 2+160m)





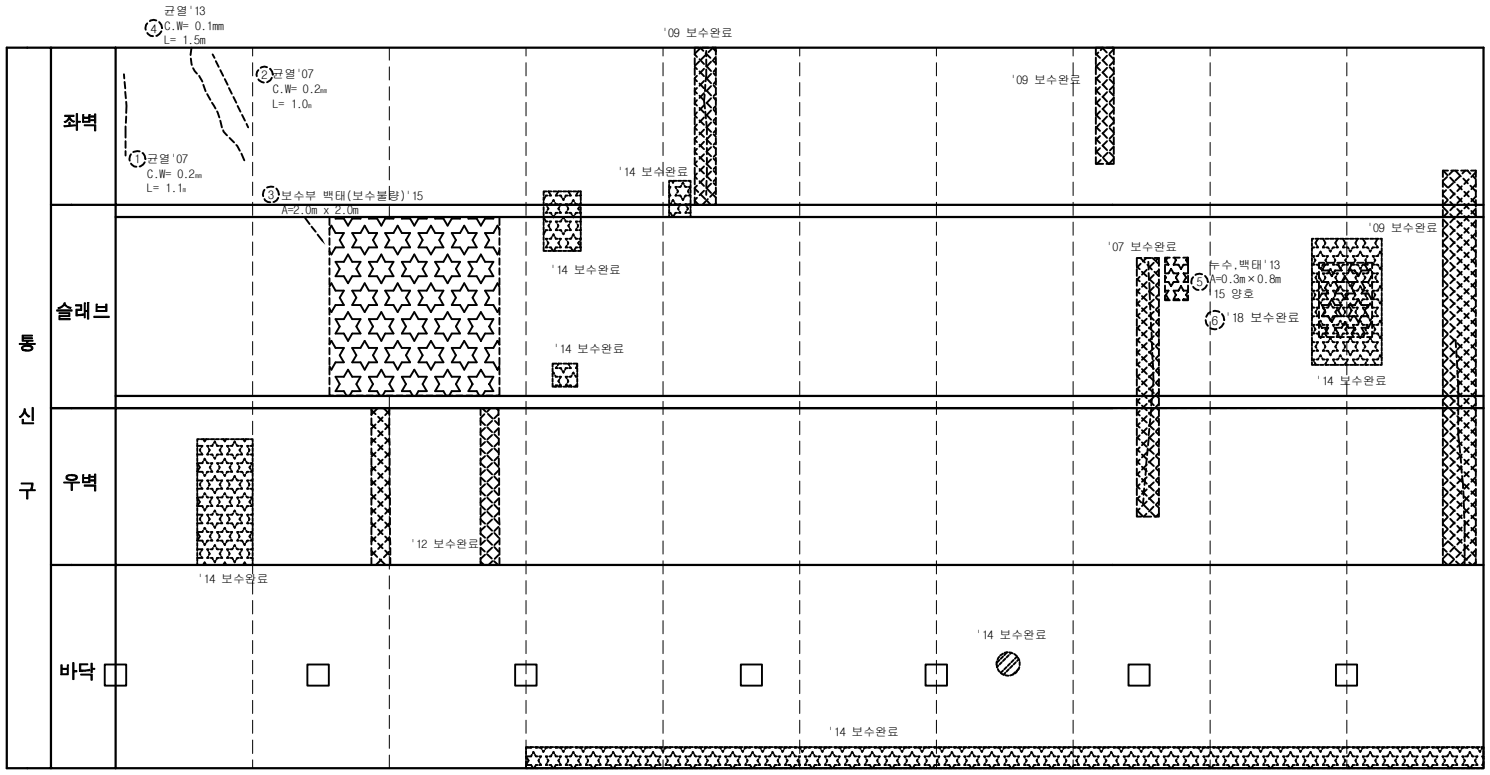

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	1.10		1.10	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	
3	2015	보수부 백태	2.0	2.00		4.00	㎡	1			-	재결함
4	2013	균열	0.1	1.50		1.50	m	1			-	
5	2013	누수,백태(현재양호)	0.3	0.80		0.24	㎡	1			-	
6	2017	보수부 백태	1.0	1.00		1.00	㎡	1	2018	표면처리공법	1.20	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

환기구 12번 (순환선 2,162m)

KEYPLAN

SECTION



출입구상면

출입구바닥



배면

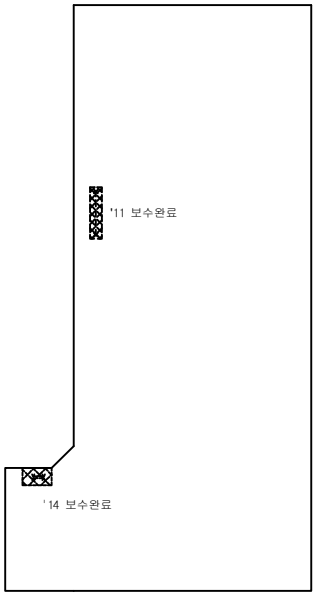

좌벽



전면

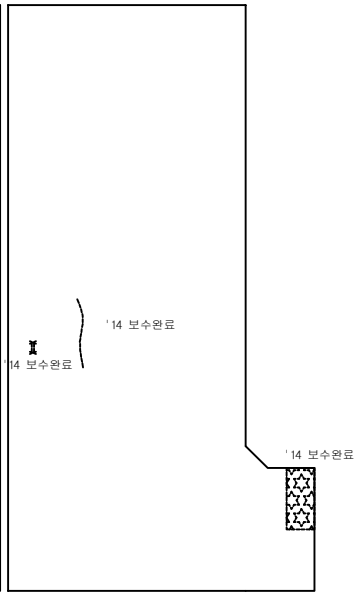

우벽

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **환기구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+160m ~ 2+180m)





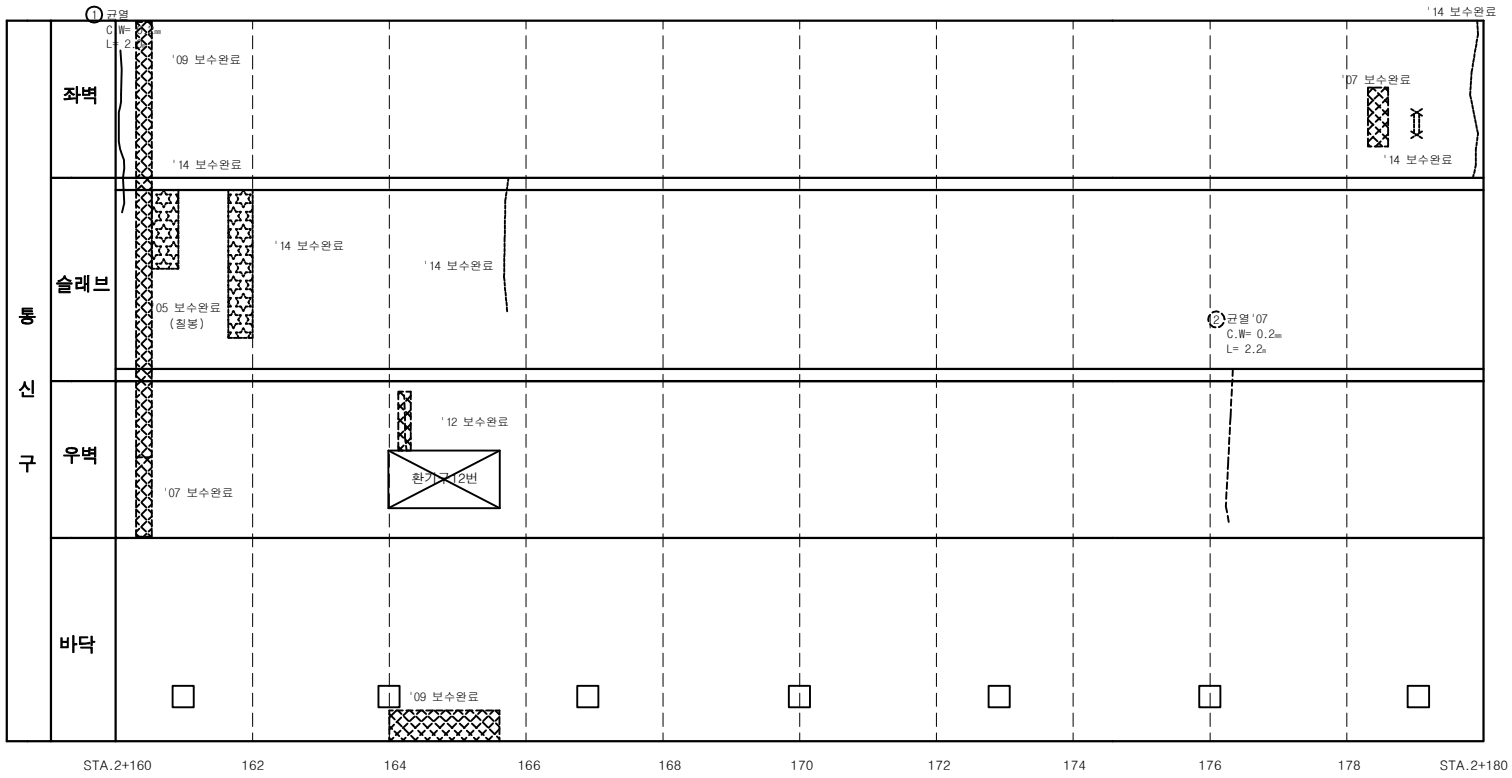

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	2.20		2.20	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+180m ~ 2+200m)





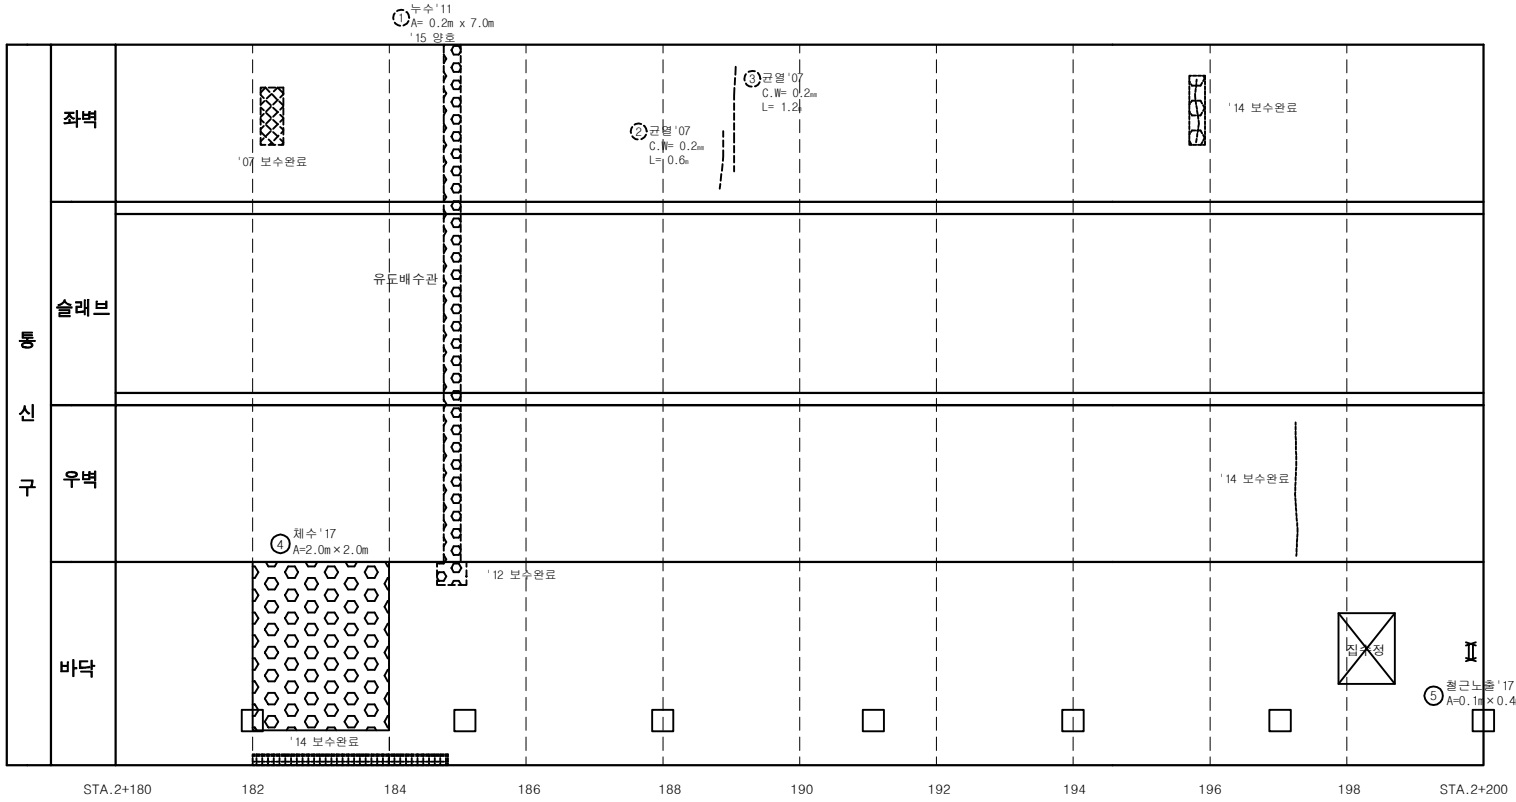

손상물량표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2011	누수	0.2	7.00		1.40	㎡	1			-	
2	2007	균열	0.2	0.60		0.60	m	1			-	
3	2007	균열	0.2	1.20		1.20	m	1			-	
4	2017	체수(현재양호)	2.0	2.00		4.00	㎡	1			-	
5	2017	철근노출	0.1	0.40		0.04	㎡	1			-	중요

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+200m ~ 2+220m)





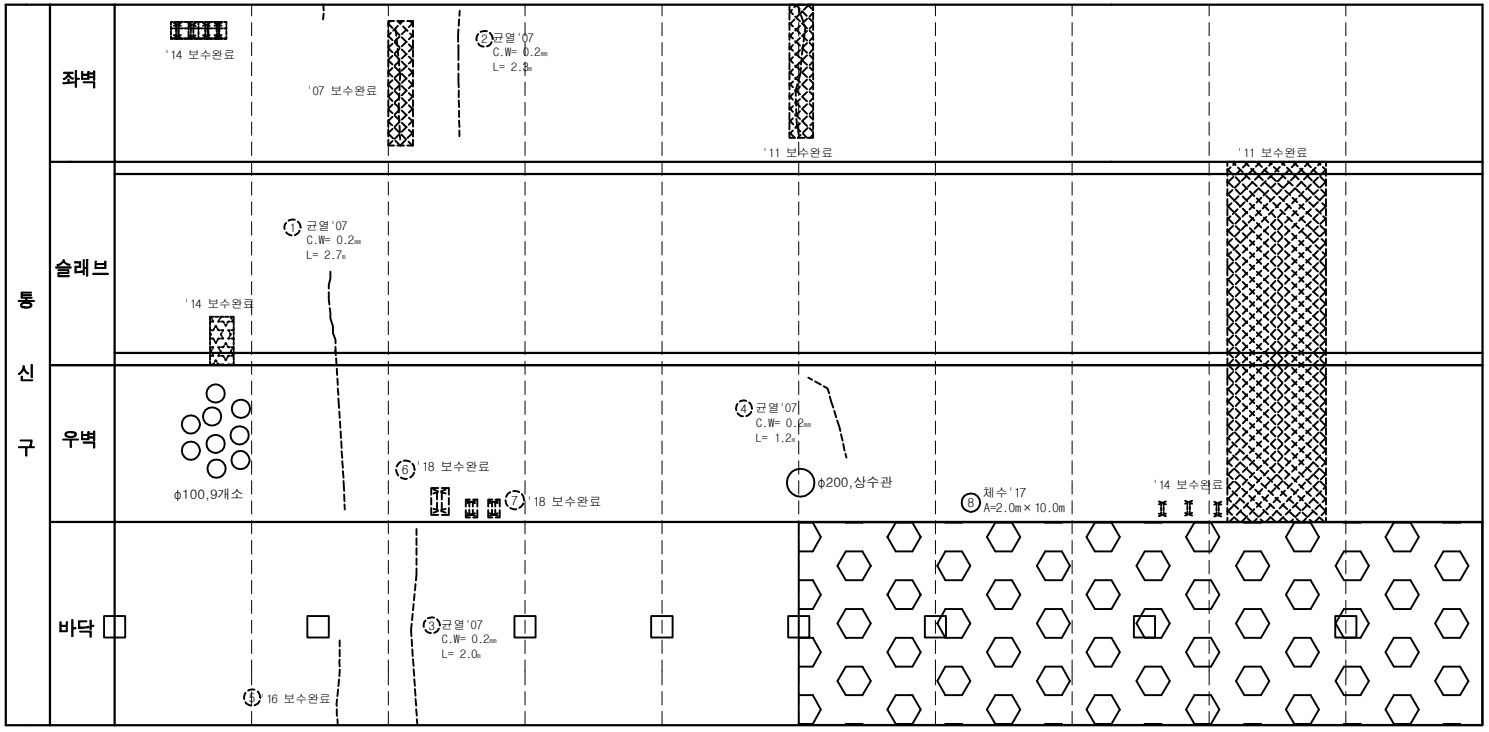

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	2.70		2.70	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	2.30		2.30	m	1			-	
3	2007	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
4	2007	균열	0.2	1.20		1.20	m	1			-	
5	2013	균열	0.3	1.20		1.20	m	1	2016	주입보수공법	1.44	
6	2017	철근노출	0.2	0.30		0.06	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.07	
7	2017	철근노출	0.2	0.20		0.08	㎡	2	2018	단면복구(방청)	0.09	
8	2017	체수(면재영호)	2.0	10.00		20.00	㎡	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+220m ~ 2+240m)





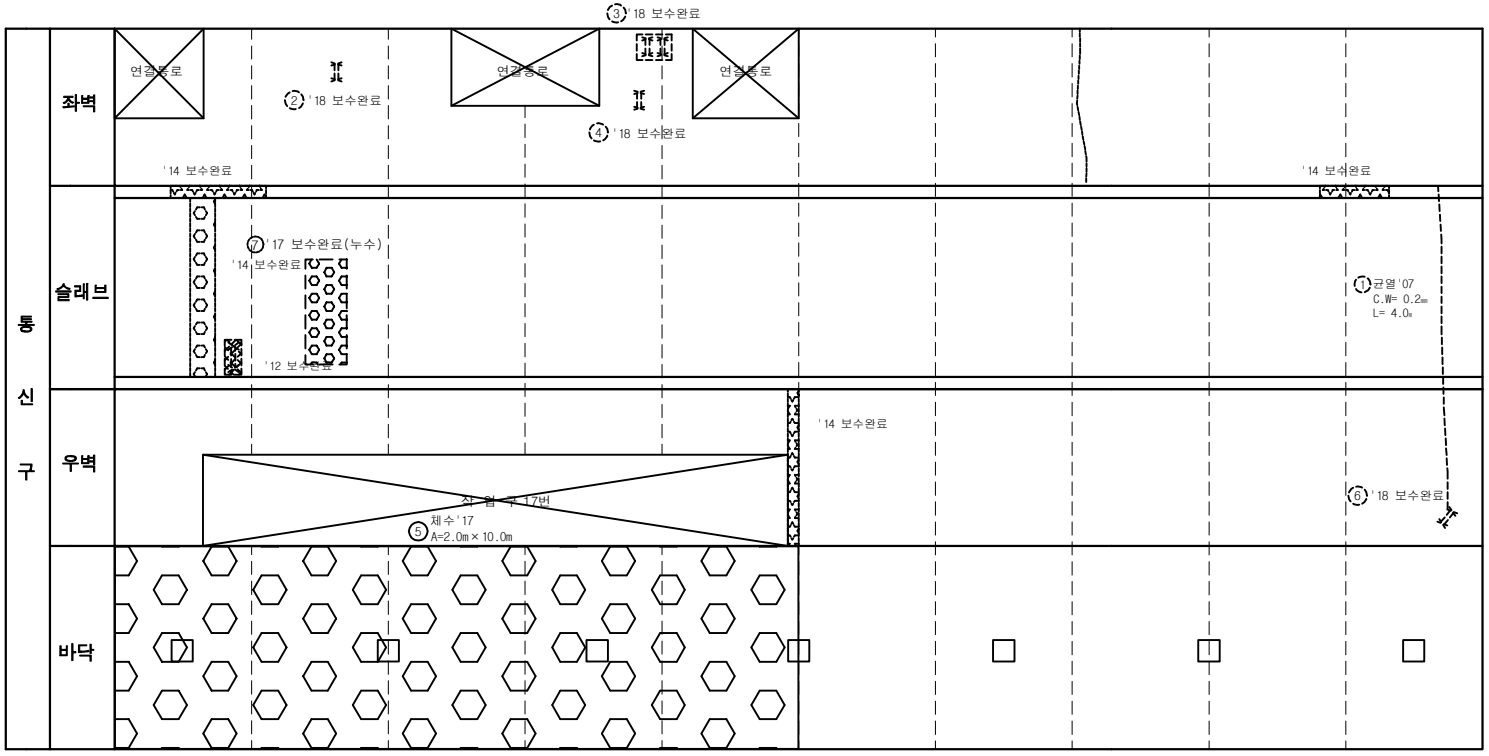

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	4.00		4.00	m	1			-	
2	2017	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.02	
3	2017	철근노출	0.3	0.30		0.09	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.11	
4	2017	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.02	
5	2017	체수(면재영호)	2.0	10.00		20.00	㎡	1			-	
6	2017	철근노출	0.1	0.30		0.03	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.04	
7	2013	누수				1.05	㎡	1	2017	누수보수공법	1.26	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 작업구 17번 (순환선 2,225m)

KEYPLAN

SECTION



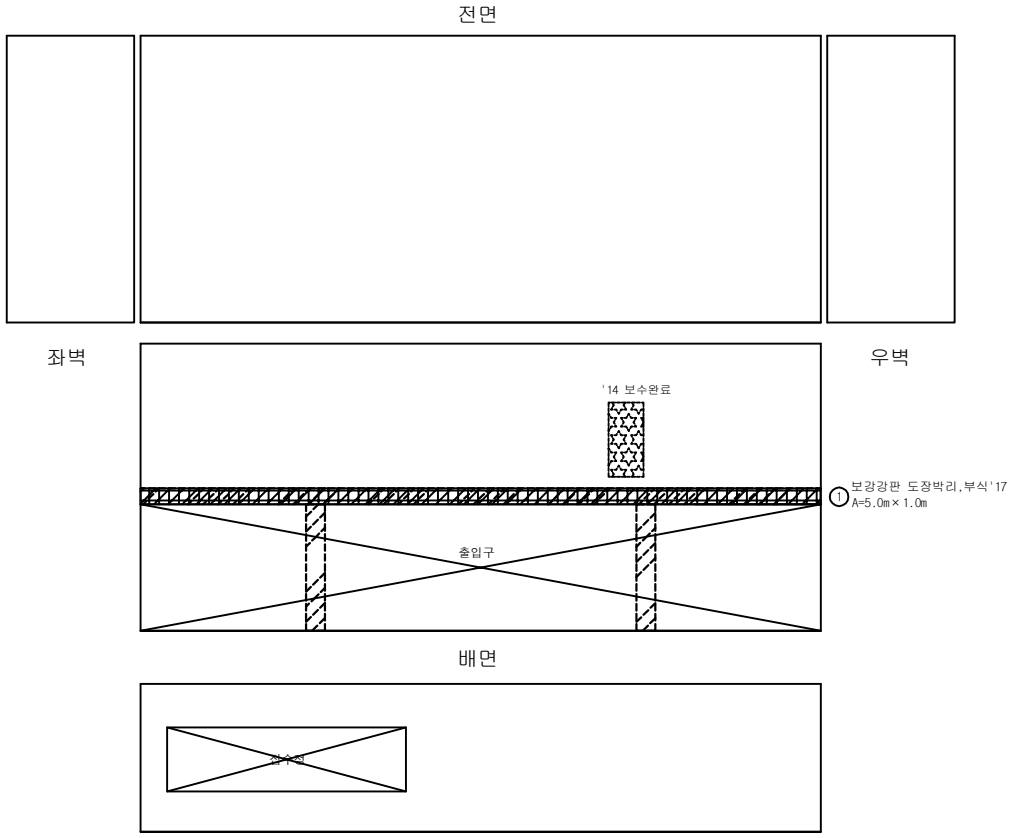

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2017	보강강판 도장박리, 부식		5.0	1.00	5.00	㎡	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **작업구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+240m ~ 2+260m)





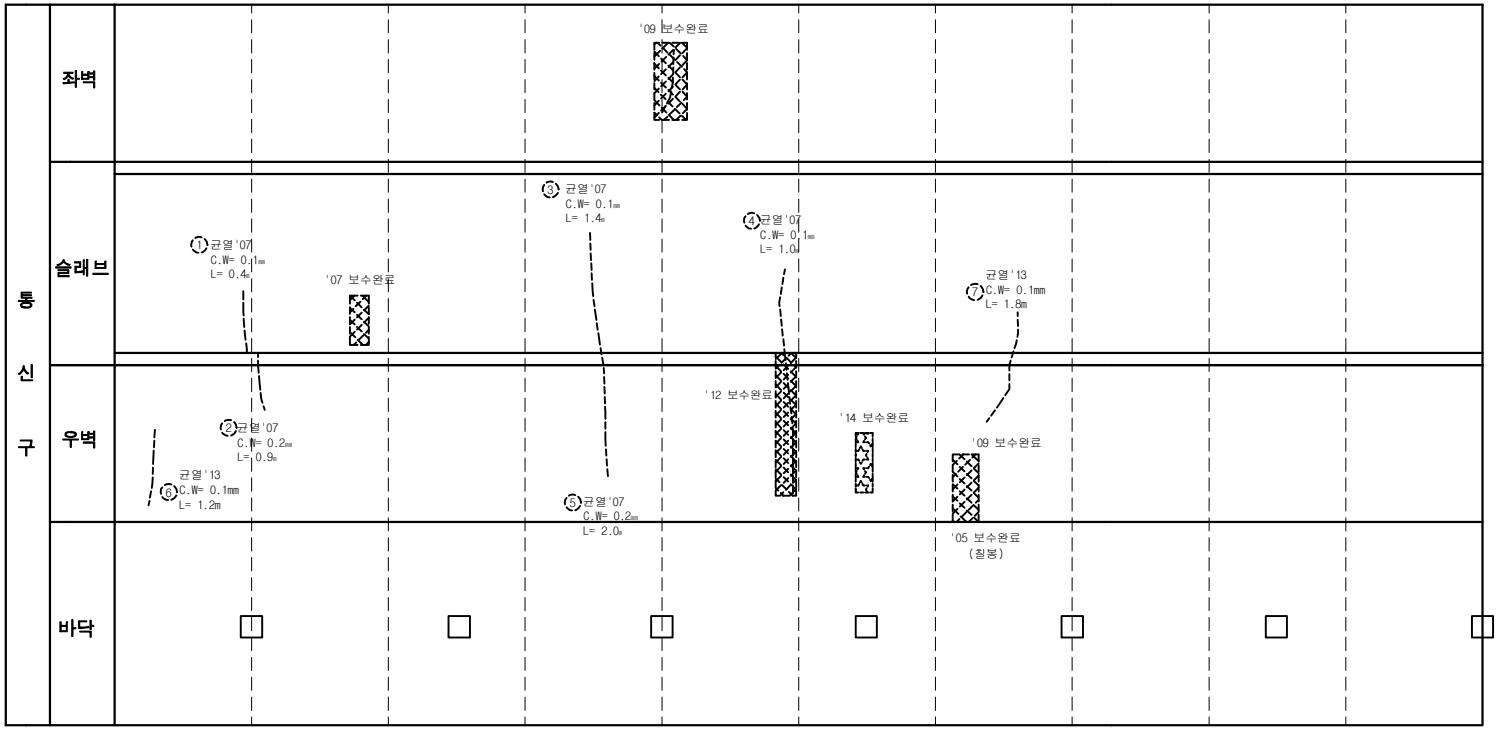

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.1	0.40		0.40	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	0.90		0.90	m	1			-	
3	2007	균열	0.1	1.40		1.40	m	1			-	
4	2007	균열	0.1	1.00		1.00	m	1			-	
5	2007	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
6	2013	균열	0.1	1.20		1.20	m	1			-	
7	2013	균열	0.1	1.80		1.80	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+260m ~ 2+280m)





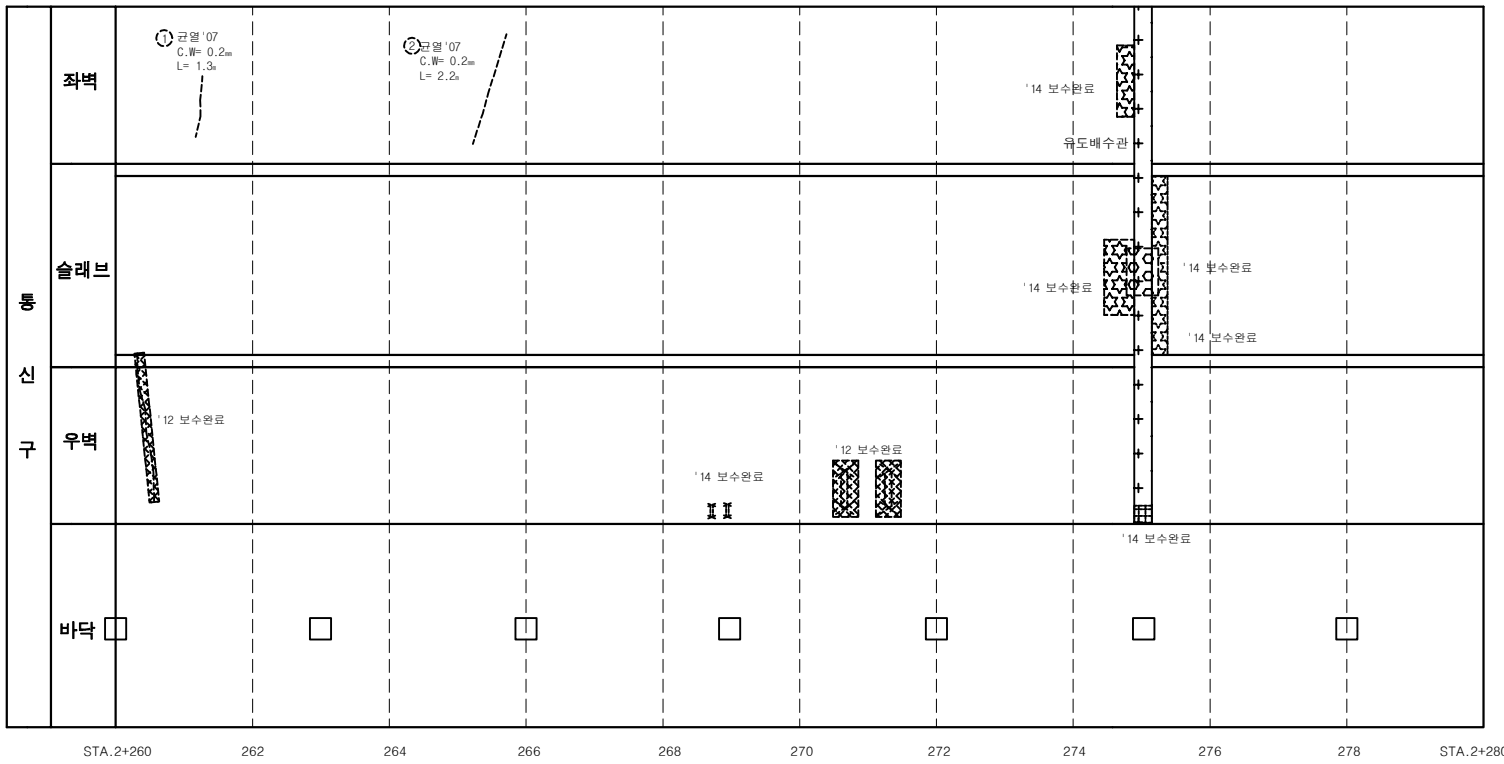

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	1.30		1.30	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	2.20		2.20	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+280m ~ 2+300m)





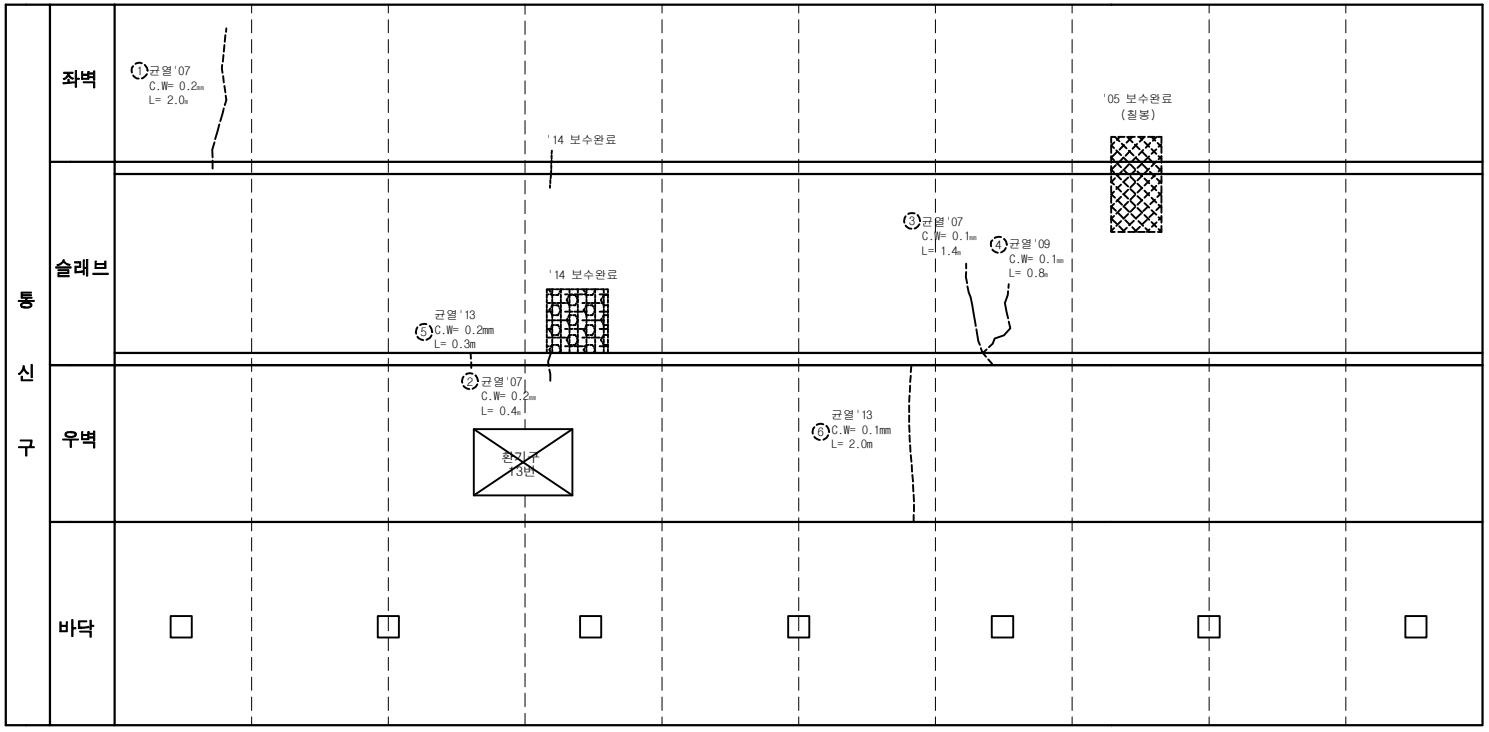

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2		2.00	2.00	m	1			-	
2	2007	균열	0.2		0.40	0.40	m	1			-	
3	2007	균열	0.1		1.40	1.40	m	1			-	
4	2009	균열	0.1		0.80	0.80	m	1			-	
5	2013	균열	0.2		0.30	0.30	m	1			-	
6	2013	균열	0.1		2.00	2.00	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

환기구 13번 (순환선 2,283m)

KEYPLAN

SECTION

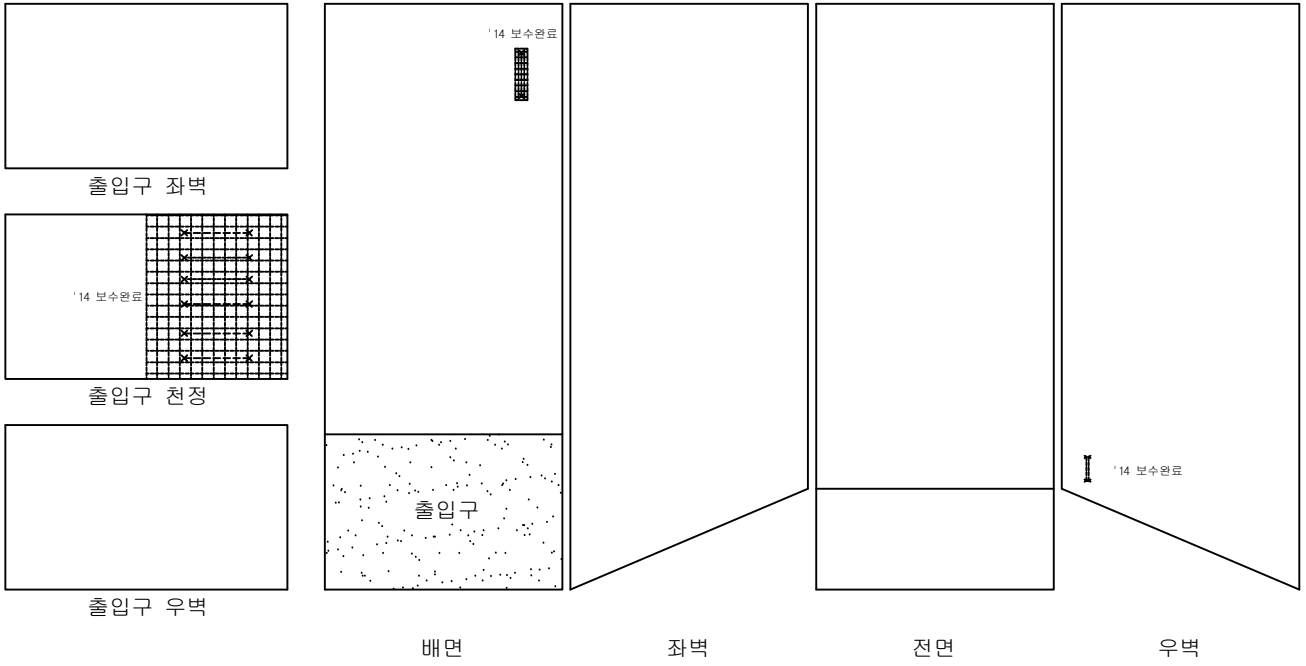

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **환기구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+300m ~ 2+320m)





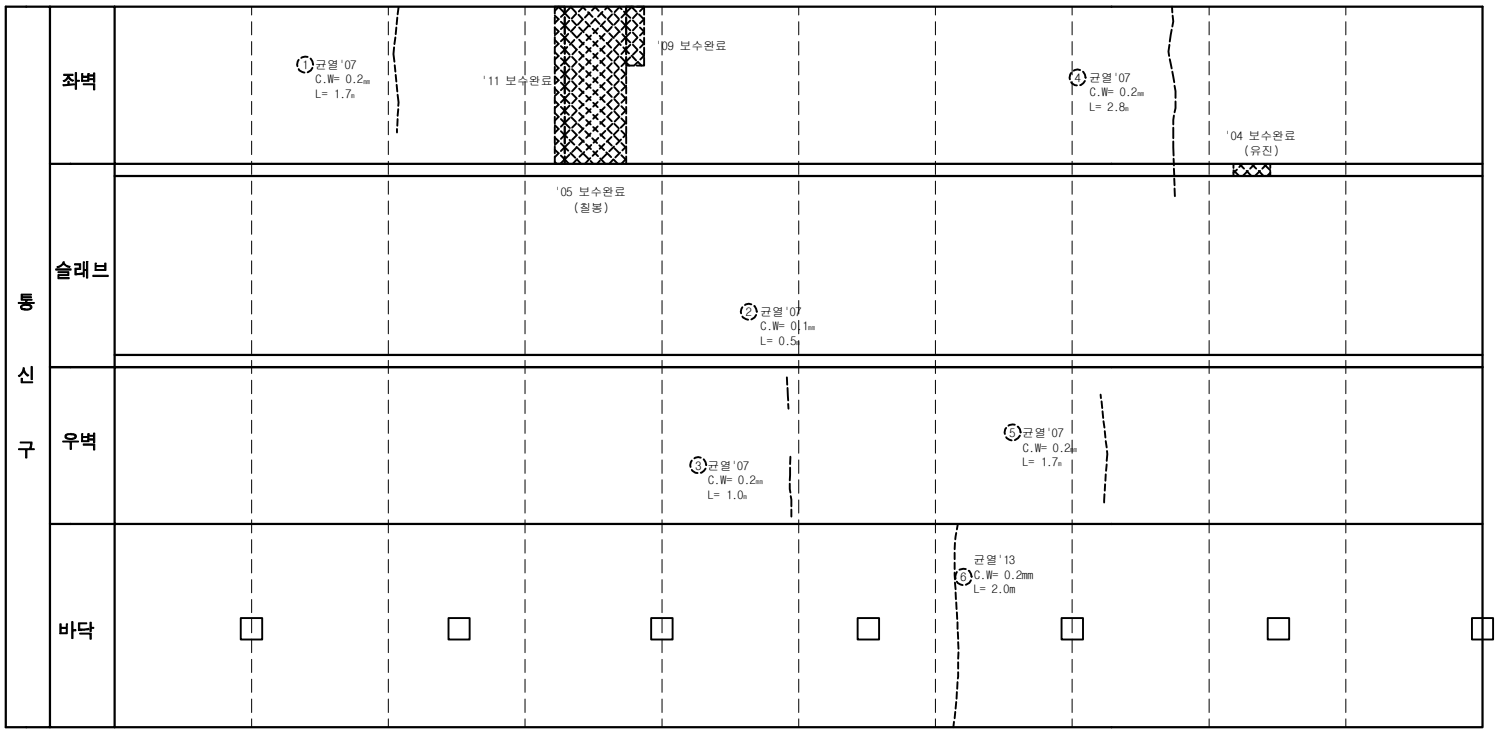

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	1.70		1.70	m	1			-	
2	2007	균열	0.1	0.50		0.50	m	1			-	
3	2007	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	
4	2007	균열	0.2	2.80		2.80	m	1			-	
5	2007	균열	0.2	1.70		1.70	m	1			-	
6	2013	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+320m ~ 2+340m)





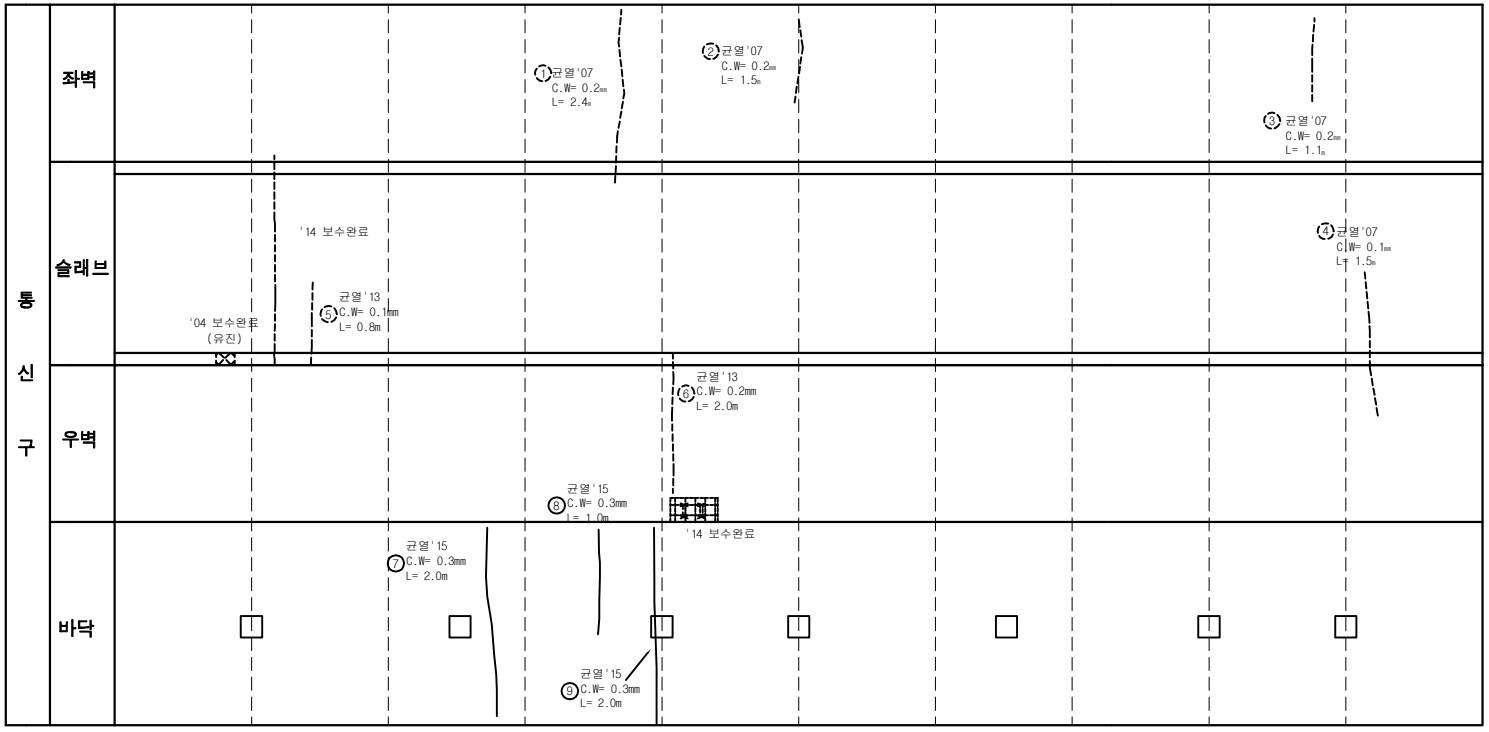

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2		2.40	2.40	m	1			-	
2	2007	균열	0.2		1.50	1.50	m	1			-	
3	2007	균열	0.2		1.10	1.10	m	1			-	
4	2007	균열	0.1		1.50	1.50	m	1			-	
5	2013	균열	0.1		0.80	0.80	m	1			-	
6	2013	균열	0.2		2.00	2.00	m	1			-	
7	2015	균열	0.3		2.00	2.00	m	1			-	중요
8	2015	균열	0.3		1.00	1.00	m	1			-	중요
9	2015	균열	0.3		2.00	2.00	m	1			-	중요

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

환기구 14번 (순환선 2,340m)

KEYPLAN

SECTION



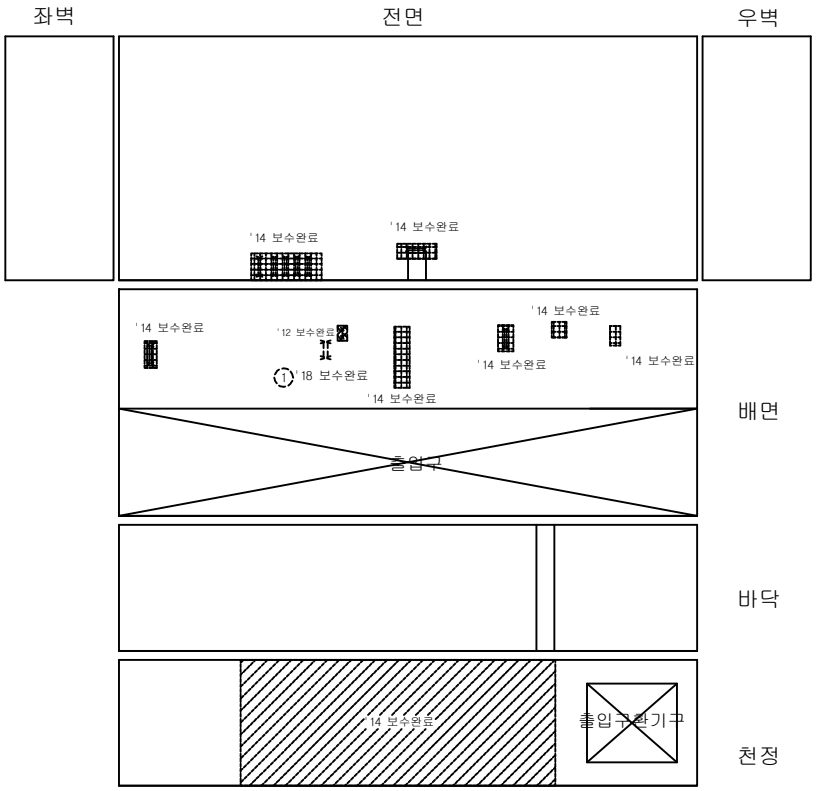

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2017	철근노출	0.2	0.20		0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.05	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **환기구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+340m ~ 2+360m)



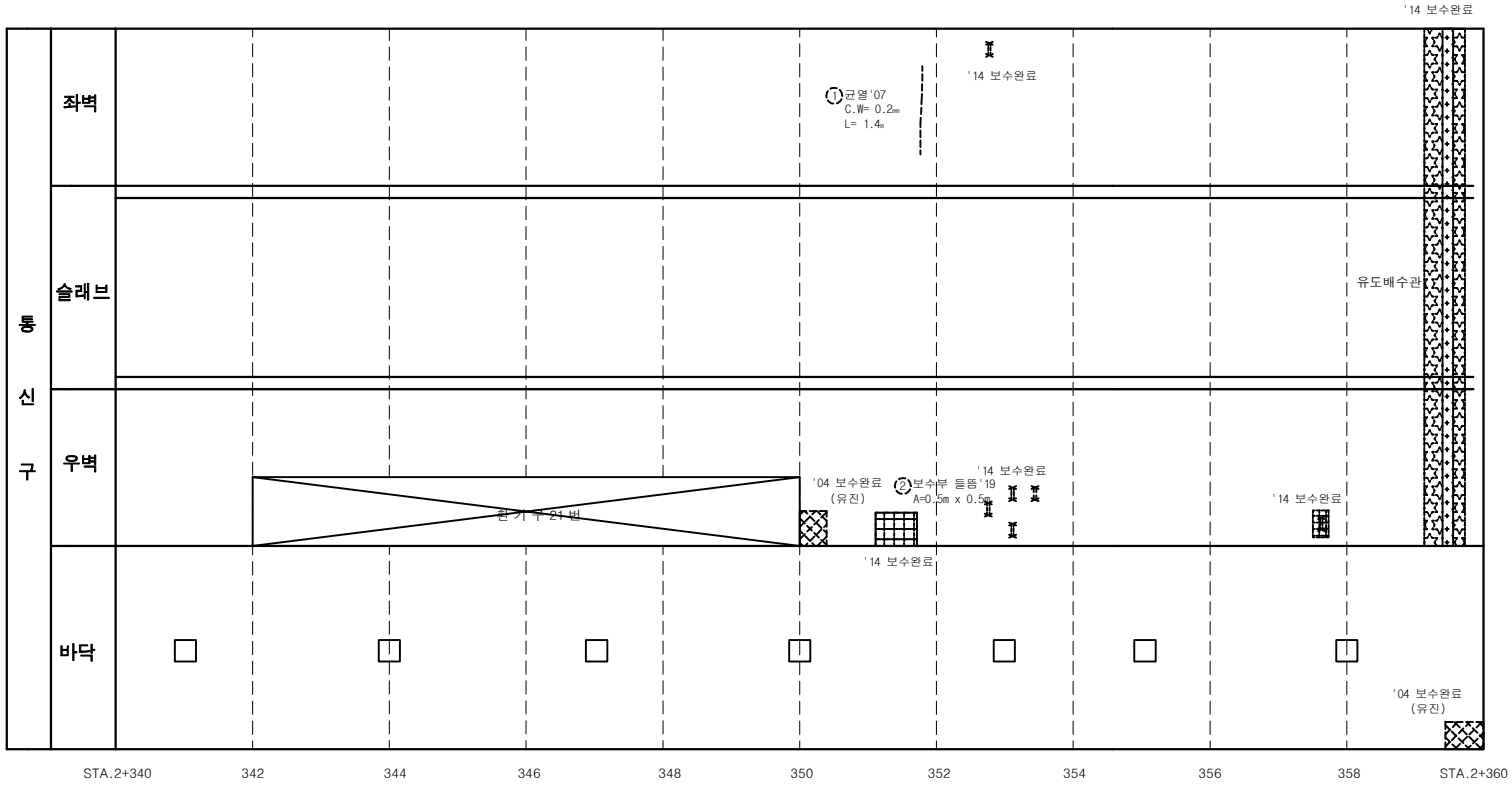

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	1.40		1.40	m	1			-	
2	2019	보수부 들뜸	0.5	0.50		0.25	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+360m ~ 2+380m)





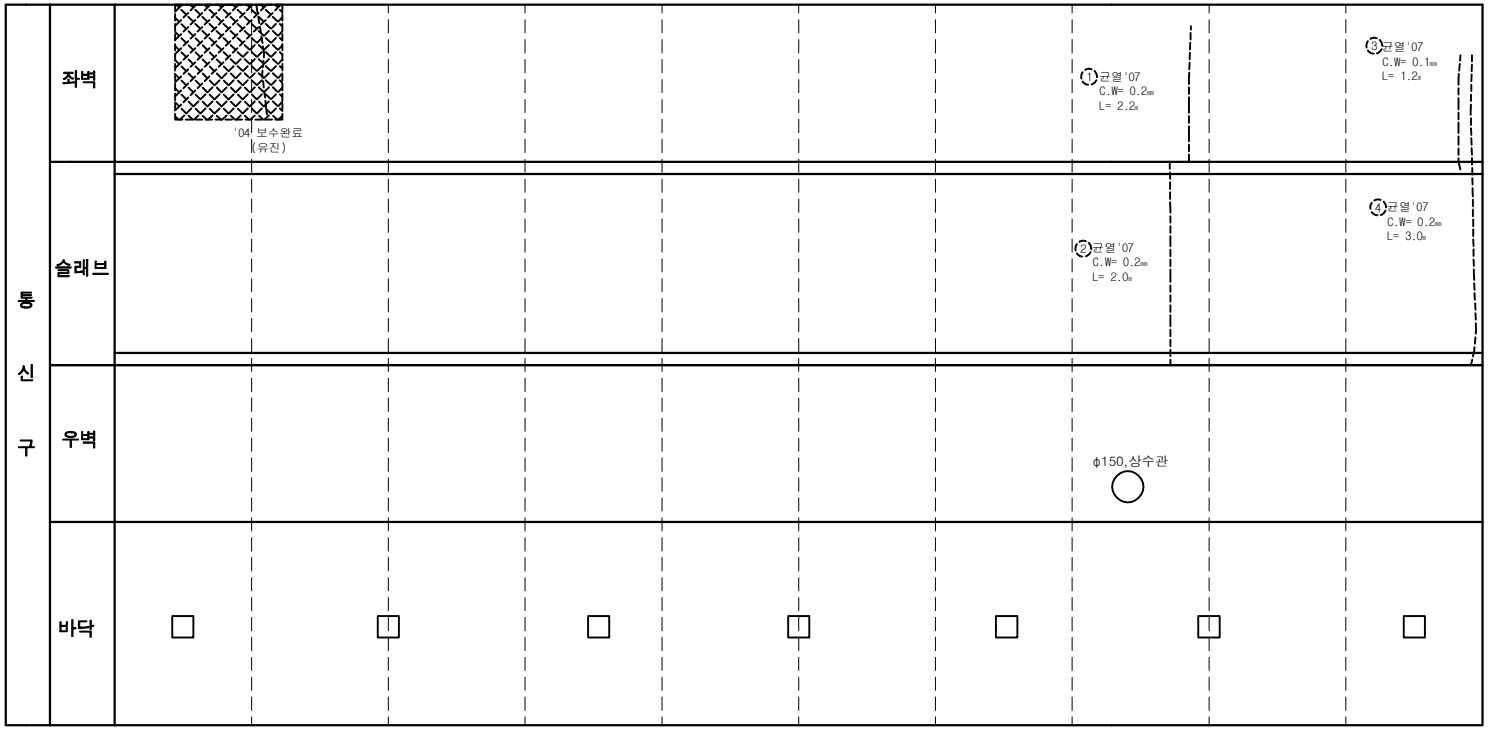

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	2.20		2.20	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
3	2007	균열	0.1	1.20		1.20	m	1			-	
4	2007	균열	0.2	3.00		3.00	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+380m ~ 2+400m)





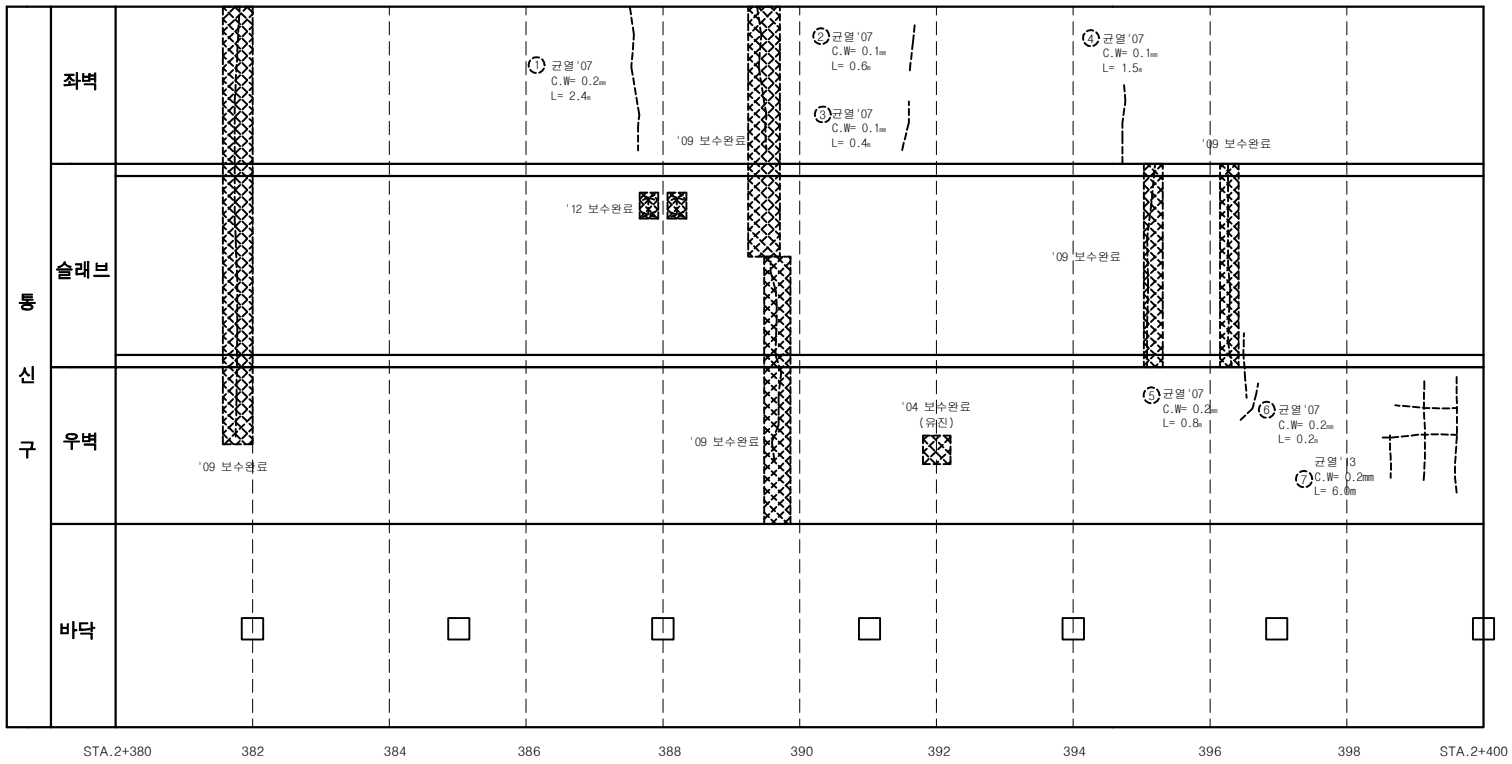

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	2.40		2.40	m	1			-	
2	2007	균열	0.1	0.60		0.60	m	1			-	
3	2007	균열	0.1	0.40		0.40	m	1			-	
4	2007	균열	0.1	1.50		1.50	m	1			-	
5	2007	균열	0.2	0.80		0.80	m	1			-	
6	2007	균열	0.2	0.20		0.20	m	1			-	
7	2013	균열	0.2	6.00		6.00	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+400m ~ 2+420m)





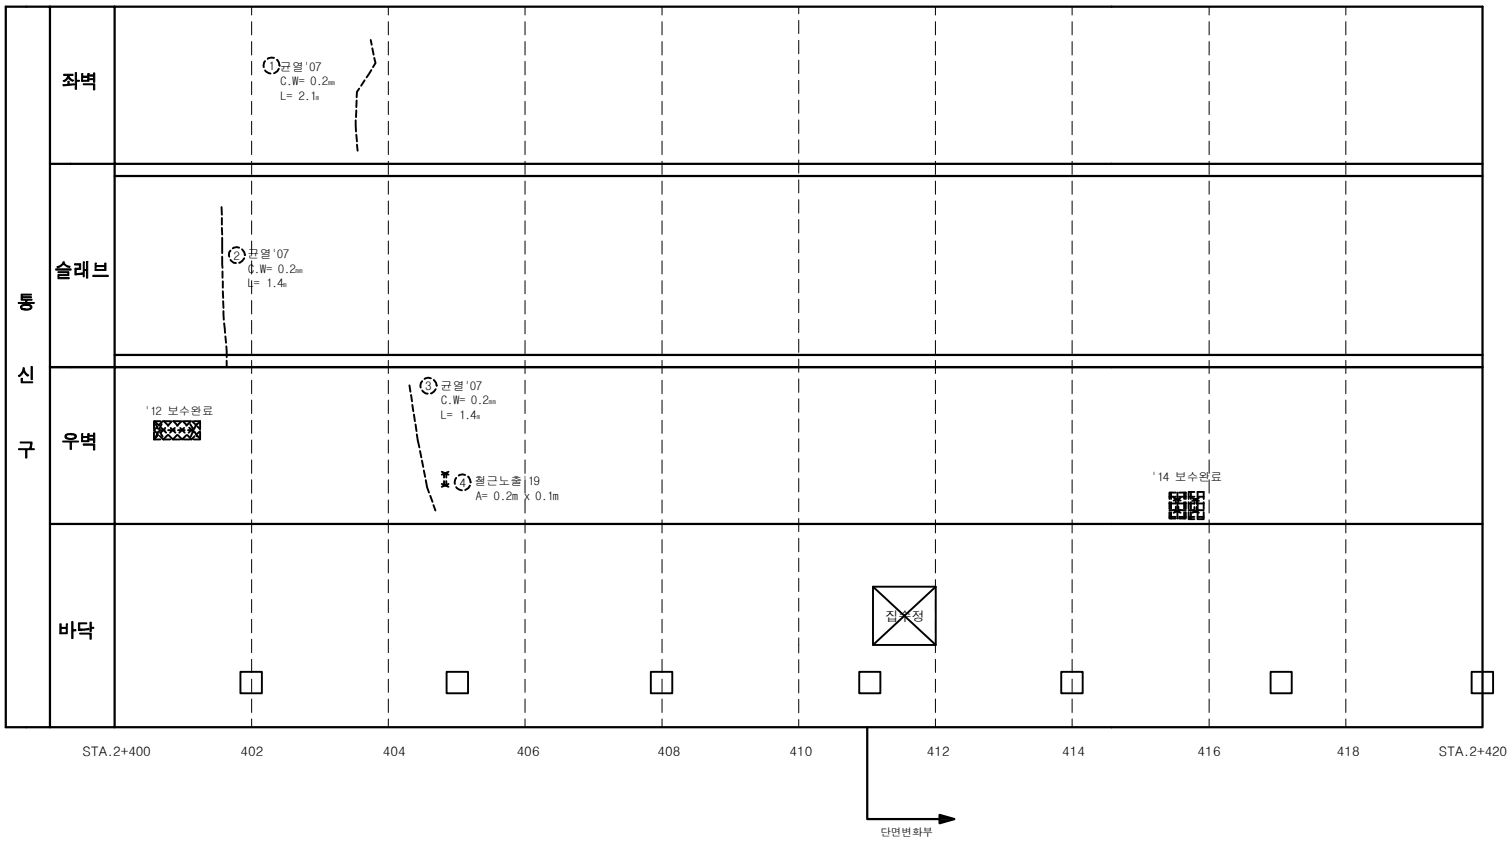

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	2.10		2.10	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	1.40		1.40	m	1			-	
3	2007	균열	0.2	1.40		1.40	m	1			-	
4	2019	철근노출	0.2	0.10		0.02	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+420m ~ 2+440m)





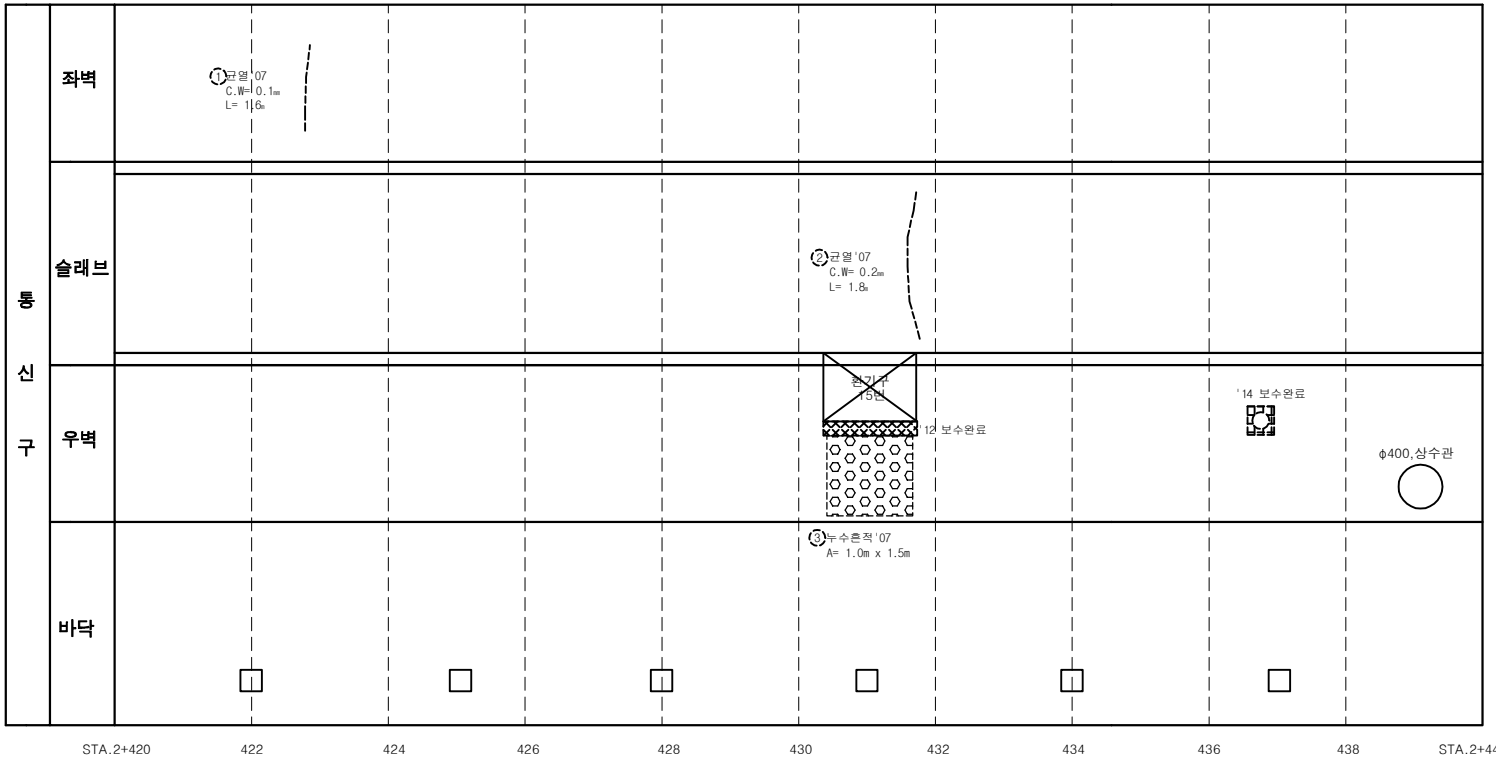

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.1		1.60	1.60	m	1			-	
2	2007	균열	0.2		1.80	1.80	m	1			-	
3	2007	누수흔적		1.0	1.50	1.50	㎡	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

환기구 15번 (순환선 2,429m)

KEYPLAN

SECTION



슬래브



바닥

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	

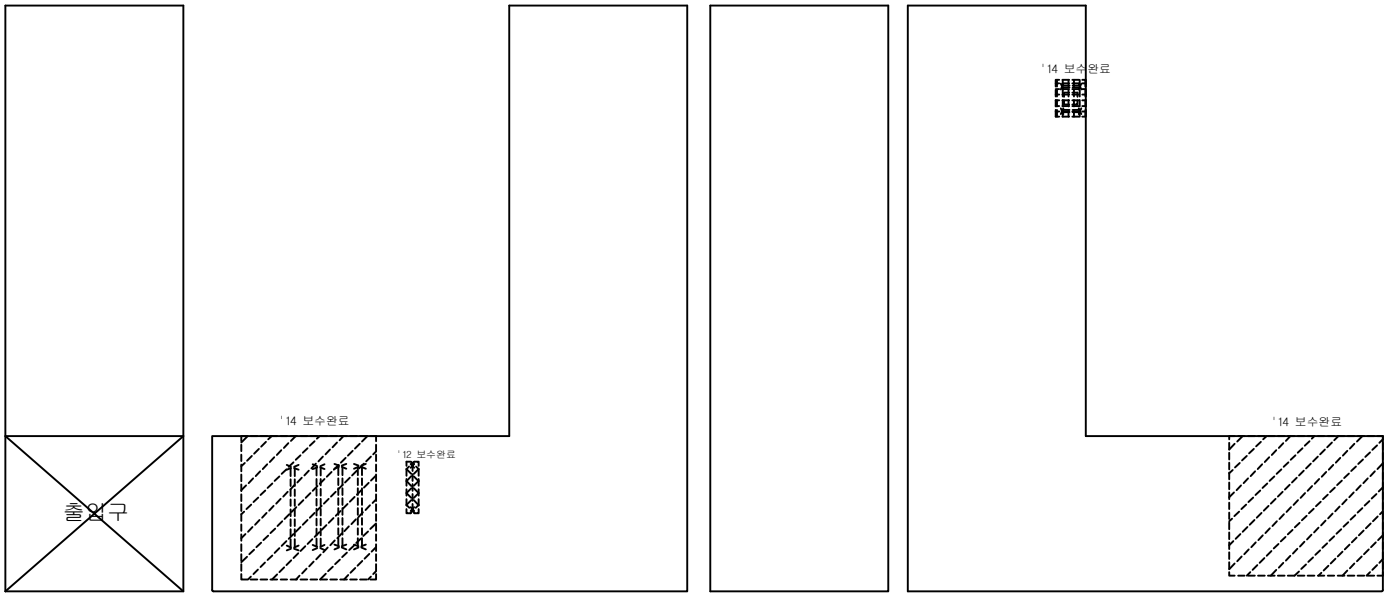

배면 좌벽 전면 우벽

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **환기구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+440m ~ 2+460m)





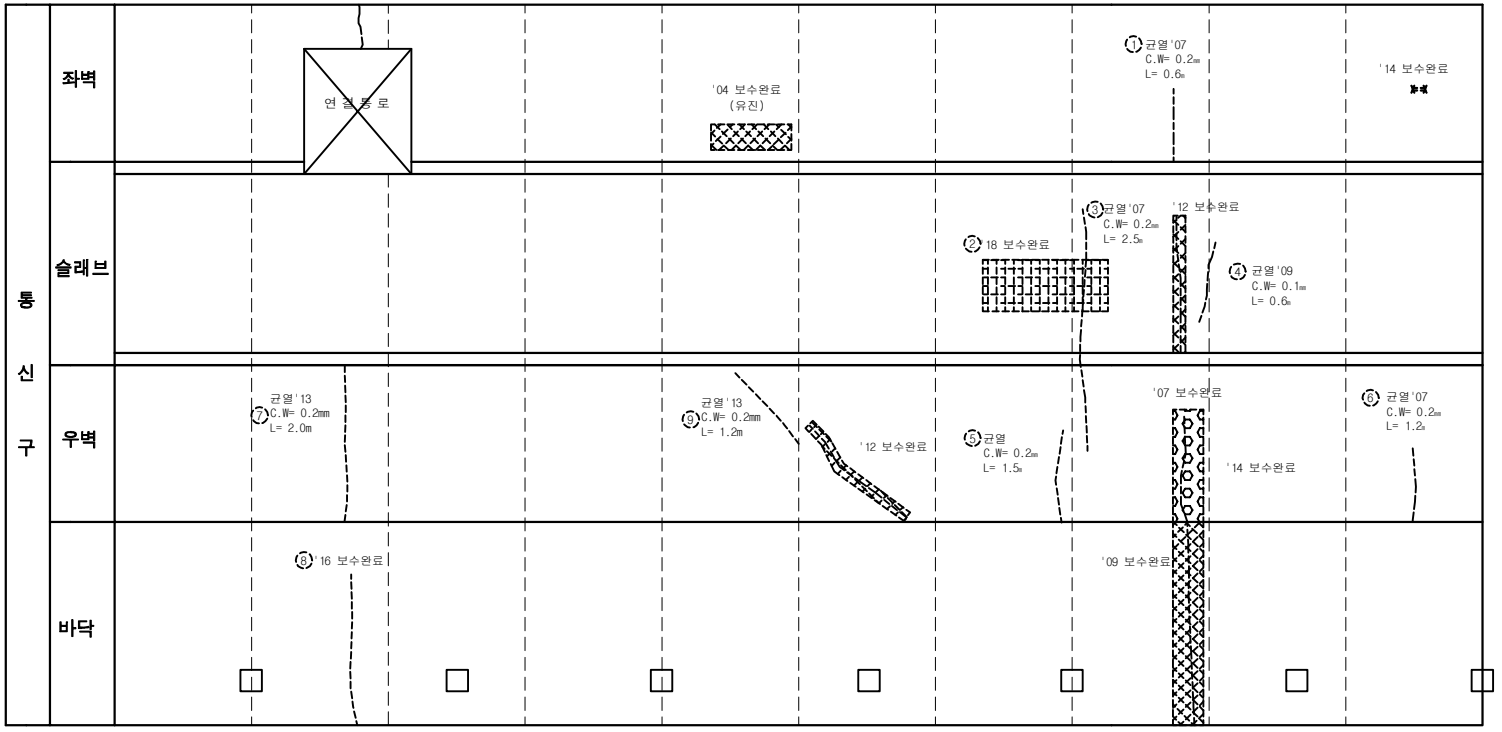

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	0.60		0.60	m	1			-	
2	2007	망상균열	1.0	2.20		2.20	㎡	1	2018	표면처리공법	2.64	
3	2007	균열	0.2	2.50		2.50	m	1			-	
4	2009	균열	0.1	0.60		0.60	m	1			-	
5	2007	균열	0.2	1.50		1.50	m	1			-	
6	2007	균열	0.2	1.20		1.20	m	1			-	
7	2013	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
8	2013	균열	0.3	2.00		2.00	m	1	2016	주입보수공법	2.40	
9	2013	균열	0.2	1.20		1.20	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+460m ~ 2+480m)





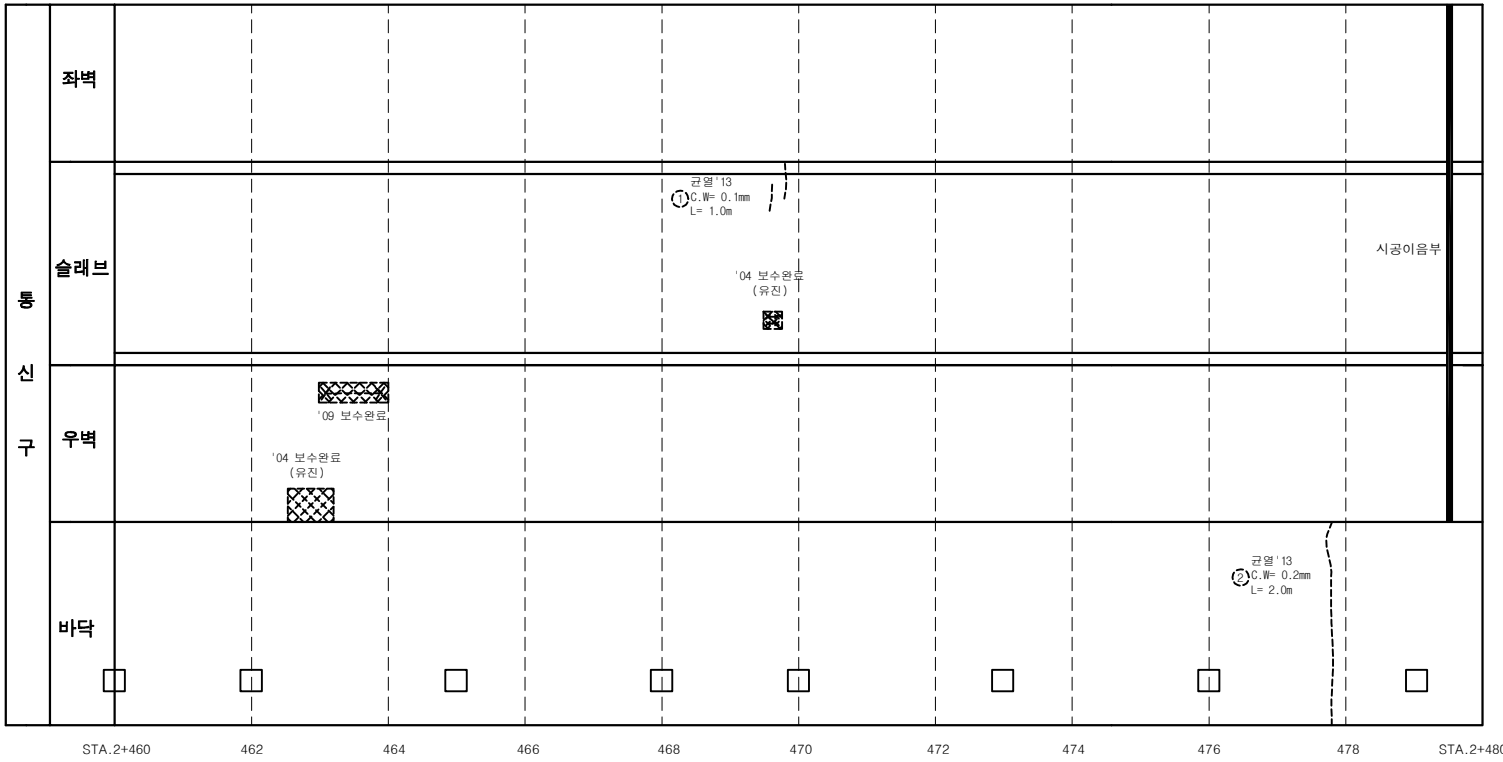

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.1	1.00		1.00	m	1			-	
2	2013	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+480m ~ 2+500m)





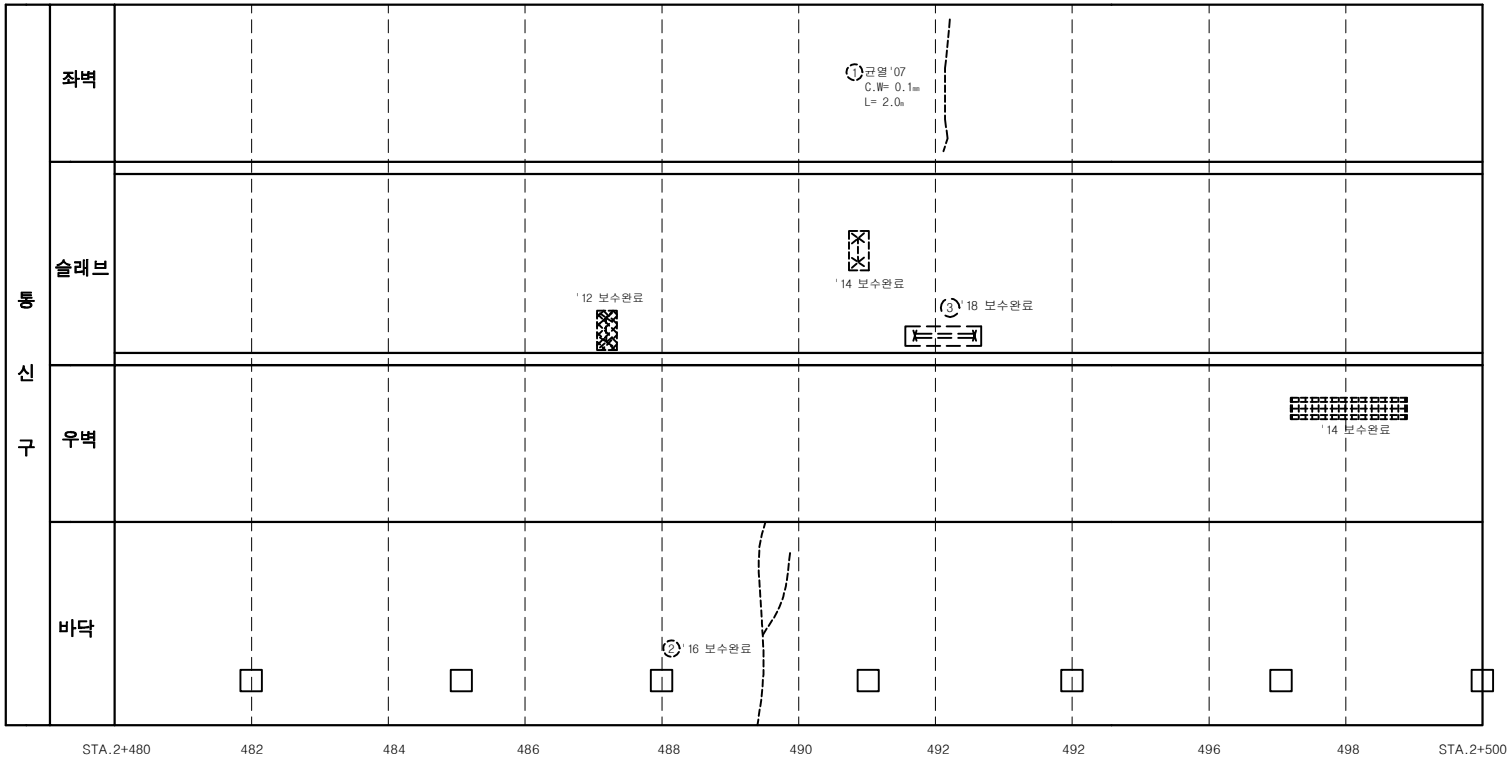

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.1	2.00		2.00	m	1			-	
2	2013	균열	0.3	2.00		2.00	m	1	2016	주입보수공법	2.40	
3	2017	철근노출	0.2	1.00		0.20	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.24	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+500m ~ 2+520m)





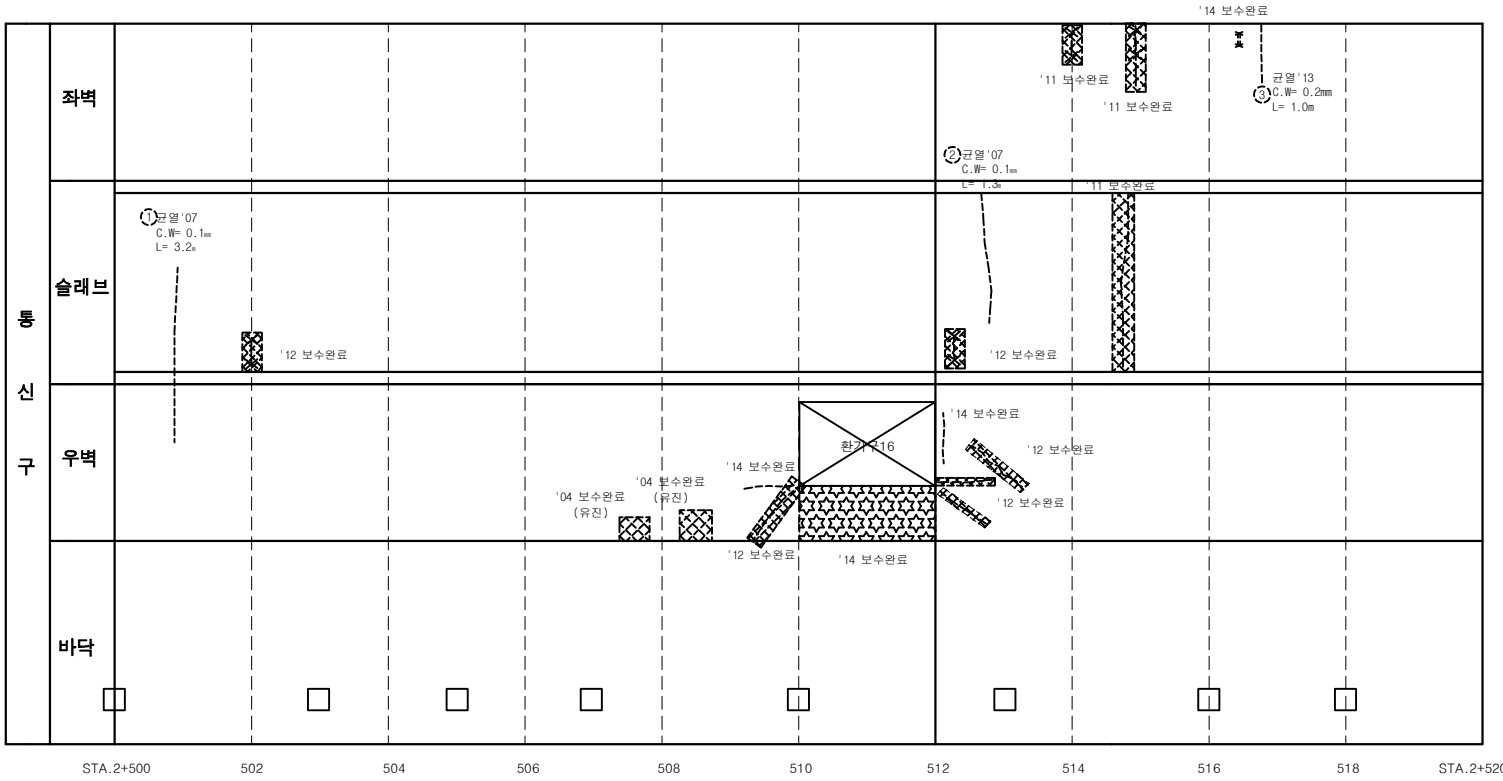

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.1	3.20		3.20	m	1			-	
2	2007	균열	0.1	1.30		1.30	m	1			-	
3	2013	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

환기구 16번 (순환선 2,508m)

KEYPLAN

SECTION



슬래브

바닥

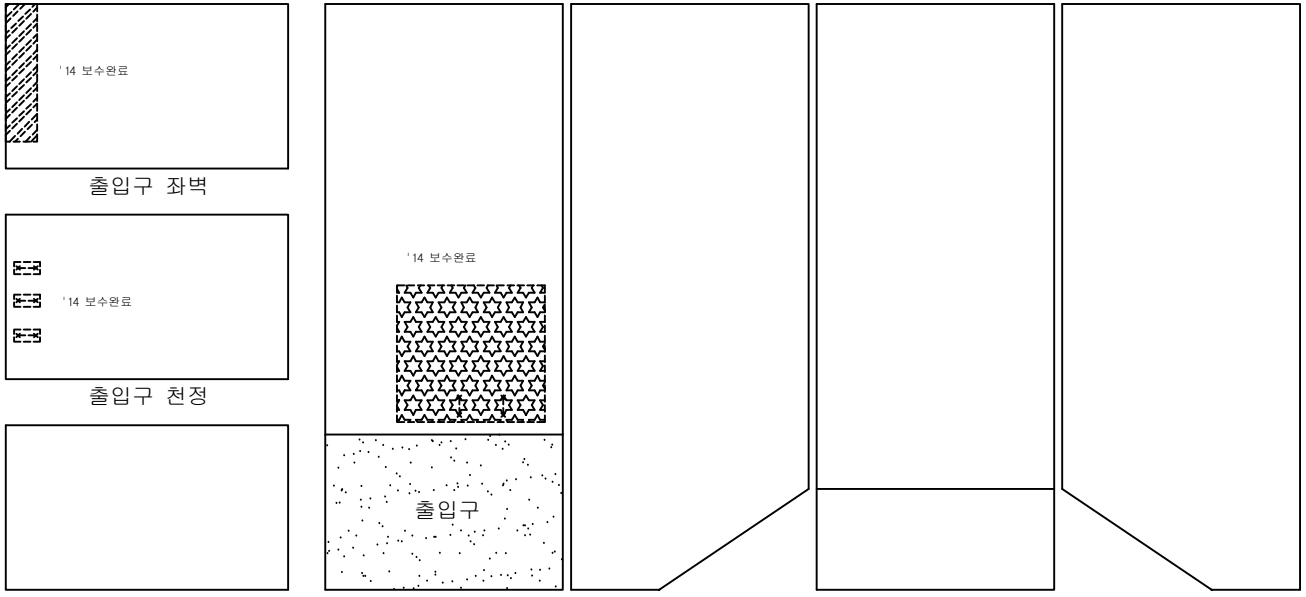

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수면	공법명	물량	

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+520m ~ 2+540m)





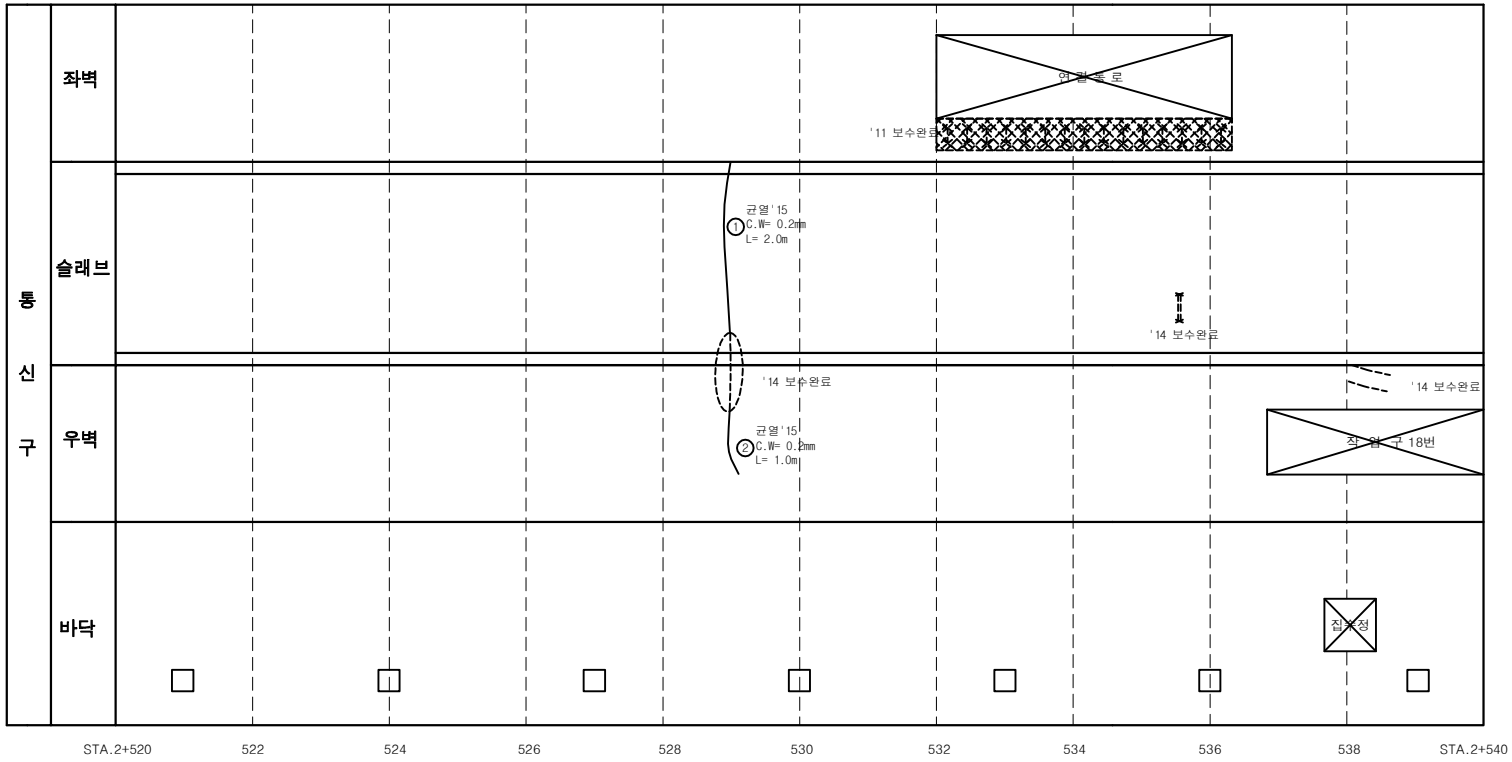

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2015	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
2	2015	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 작업구 18번 (순환선 2,537m)

KEYPLAN

SECTION



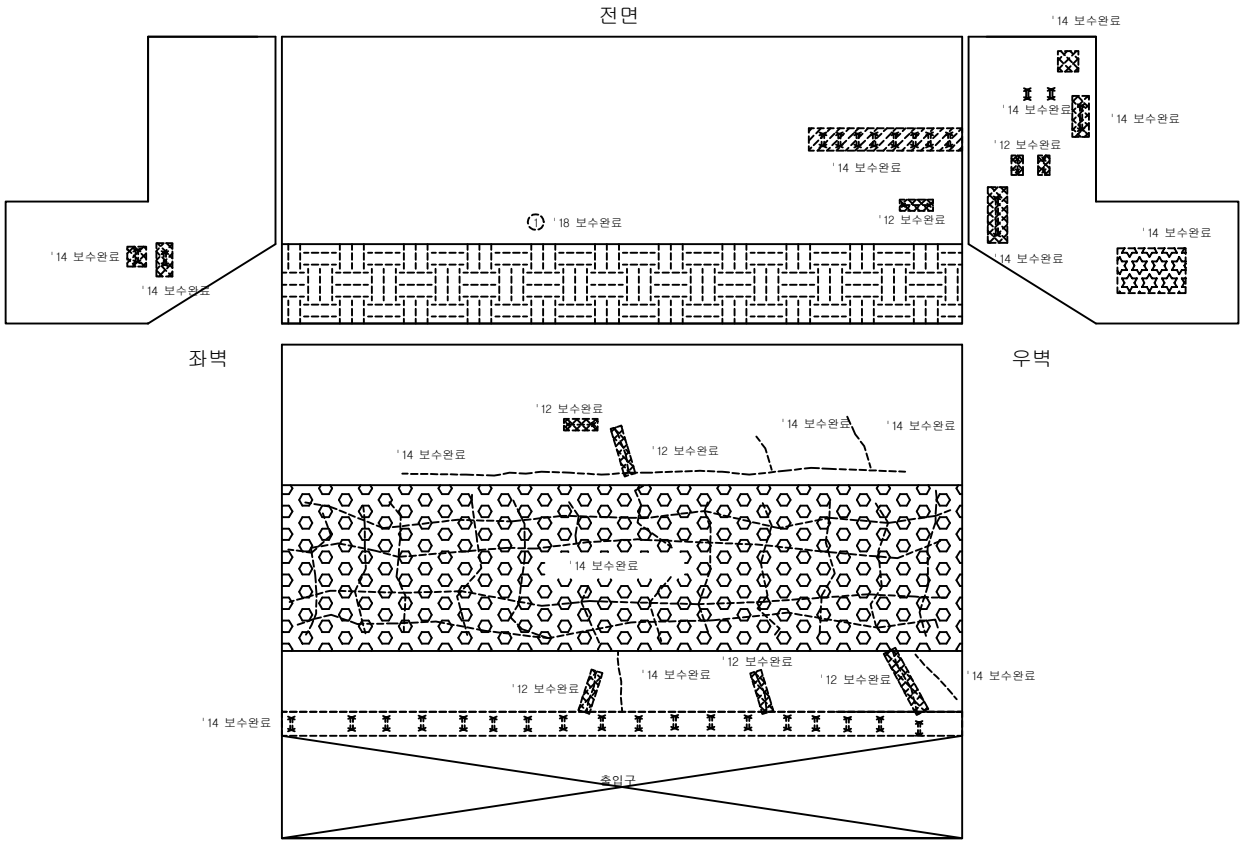
전면
'14 보수완료
'12 보수완료
'18 보수완료
좌벽
우벽
'14 보수완료
'12 보수완료
'14 보수완료
'12 보수완료
'14 보수완료
'14 보수완료
'12 보수완료
'14 보수완료
'12 보수완료
'14 보수완료
'14 보수완료
'12 보수완료
'14 보수완료
'12 보수완료
'14 보수완료
'14 보수완료
'14 보수완료
'12 보수완료
'14 보수완료
'14 보수완료
'14

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+540m ~ 2+560m)





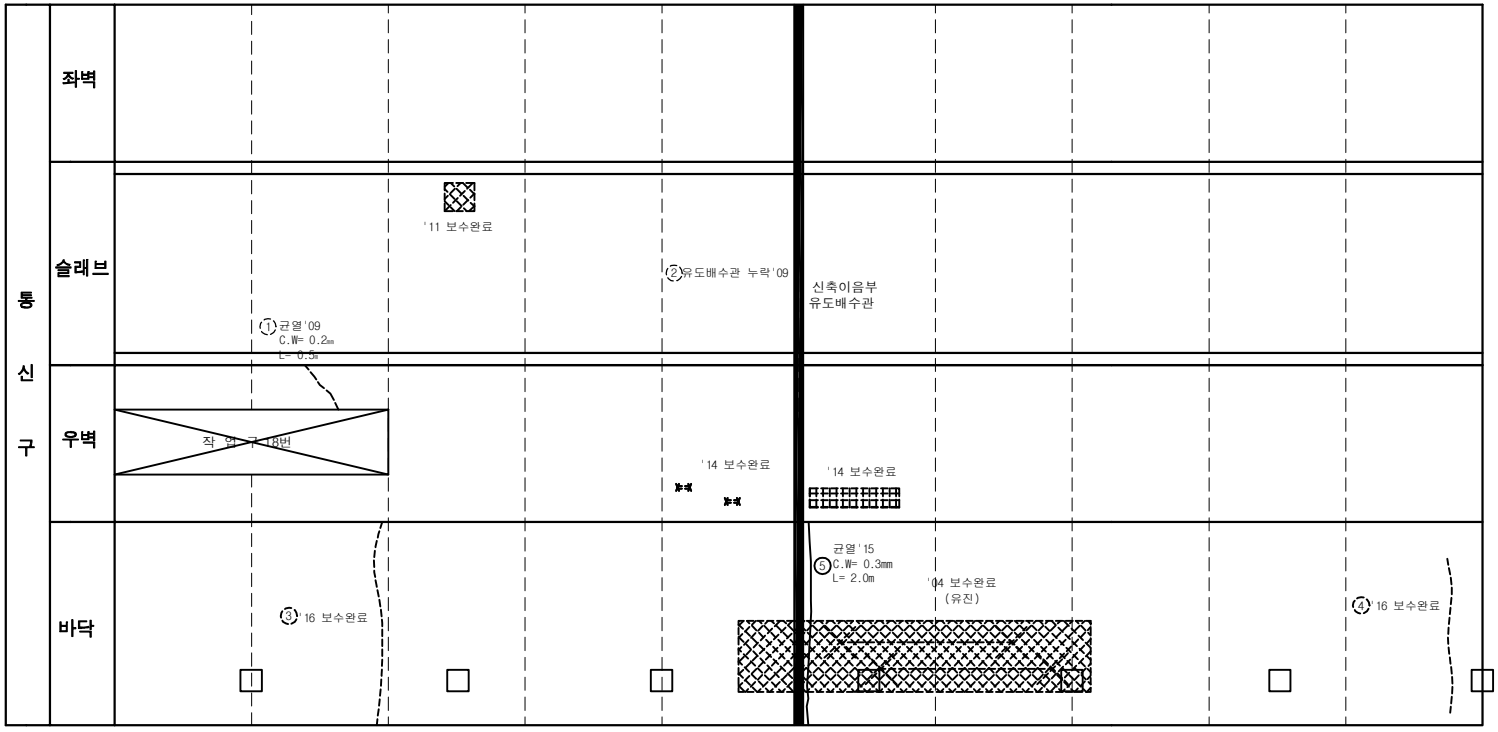

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2009	균열	0.2	0.50		0.50	m	1			-	
2	2009	유도배수관누락				1	EA	1			-	
3	2013	균열	0.3	2.00		2.00	m	1	2016	주입보수공법	2.40	
4	2013	균열	0.3	2.00		2.00	m	1	2016	주입보수공법	2.40	
5	2013	균열	0.3	2.00		2.00	m	1			-	중요

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+560m ~ 2+580m)





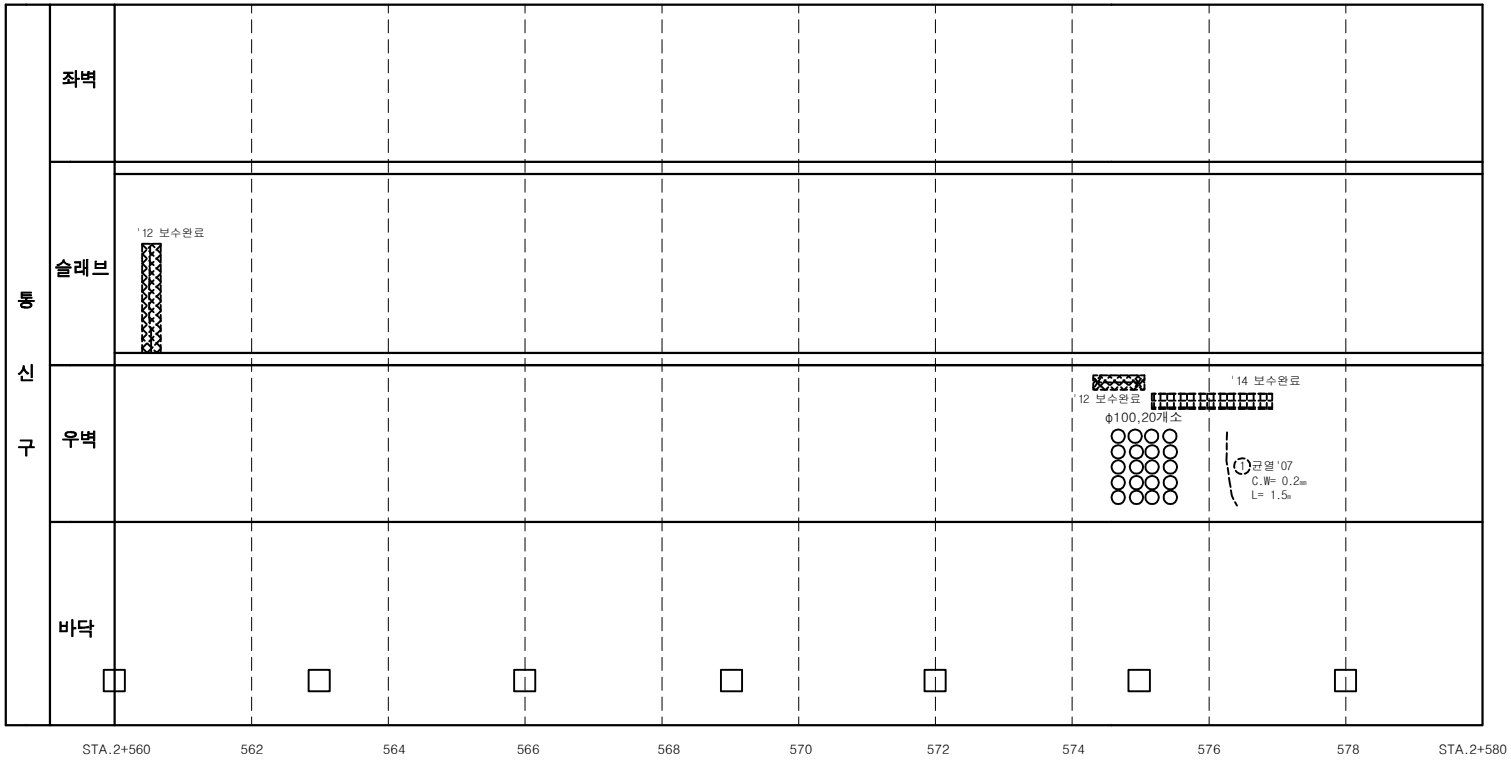

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	1.50		1.50	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+580m ~ 2+600m)





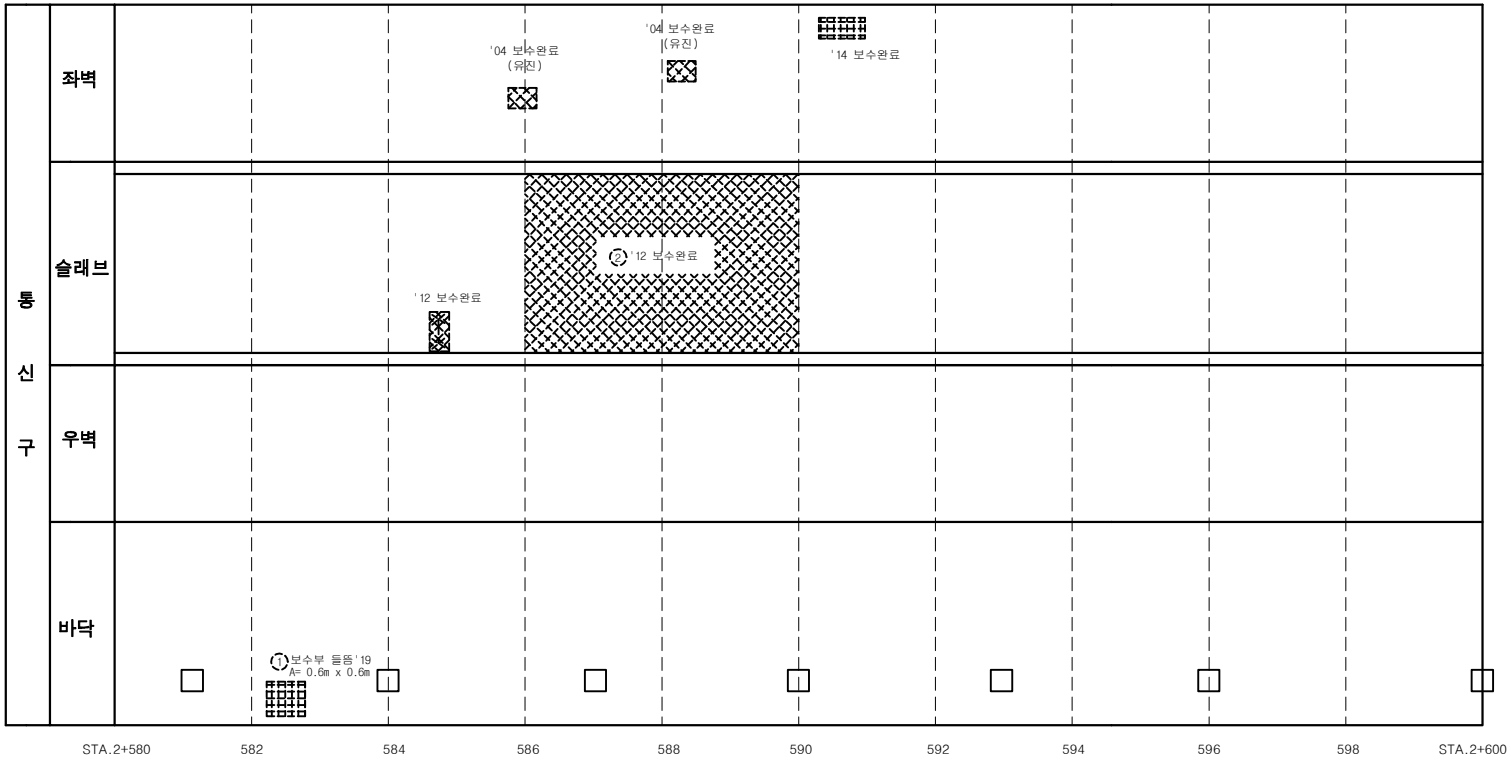

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2019	철근노출	0.6	0.60		0.36	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+600m ~ 2+620m)





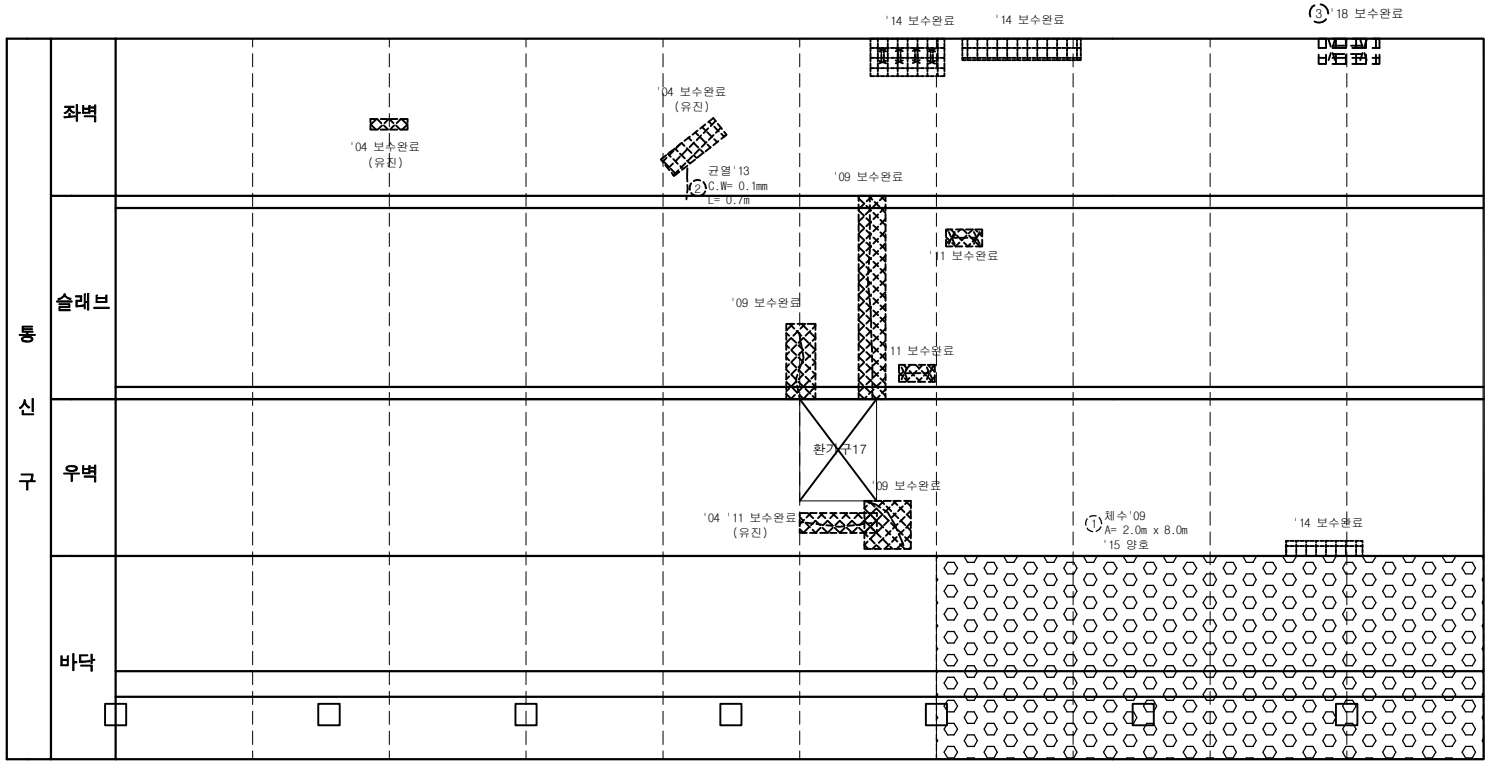

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2009	체수	2.0	8.00		16.00	㎡	1			-	
2	2013	균열	0.1	0.70		0.70	m	1			-	
3	2017	박리,철근노출	1.2	0.40		0.48	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.58	
									-			

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

환기구 17번 (순환선 2,608m)





슬래브 바닥

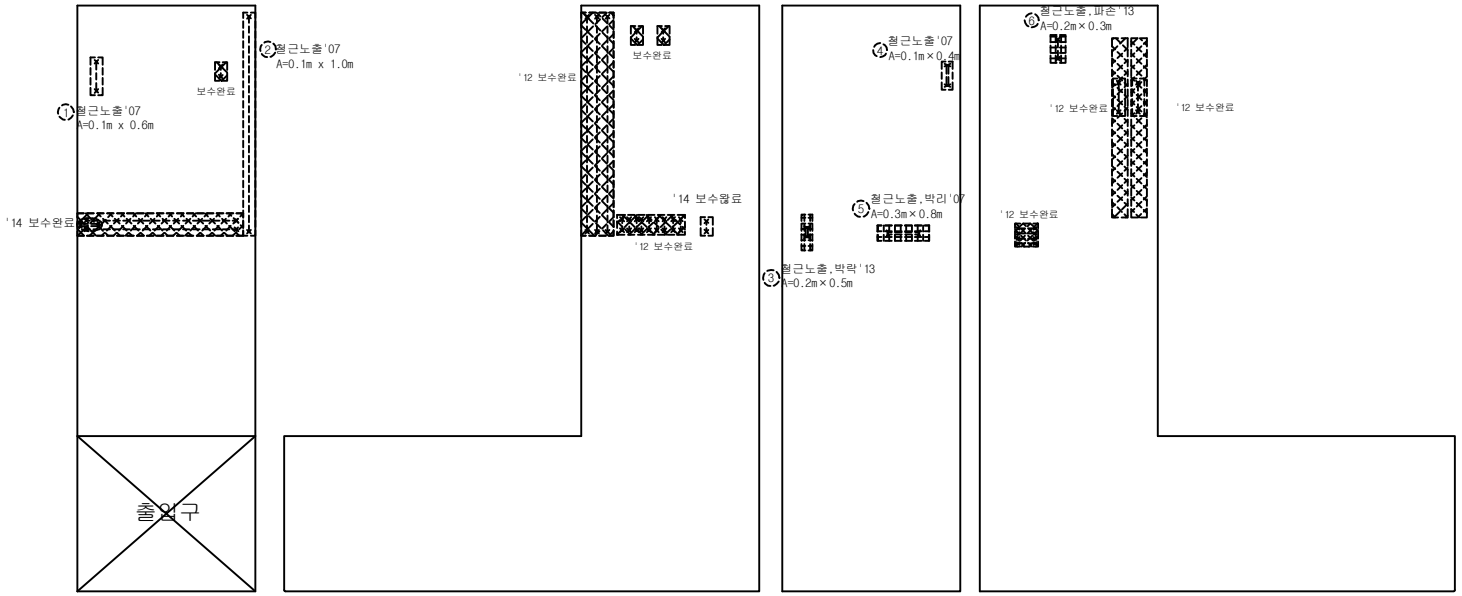

배면 좌벽 전면 우벽

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	철근노출	0.1	0.06		0.01	㎡	1			-	중요
2	2007	철근노출	0.1	0.10		0.01	㎡	1			-	중요
3	2013	철근노출,박락	0.2	0.50		0.10	㎡	1			-	중요
4	2007	철근노출	0.1	0.40		0.04	㎡	1			-	중요
5	2007	철근노출,박리	0.3	0.80		0.24	㎡	1			-	중요
6	2013	철근노출,파손	0.2	0.30		0.06	㎡	1	-		-	중요

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **환기구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+620m ~ 2+640m)





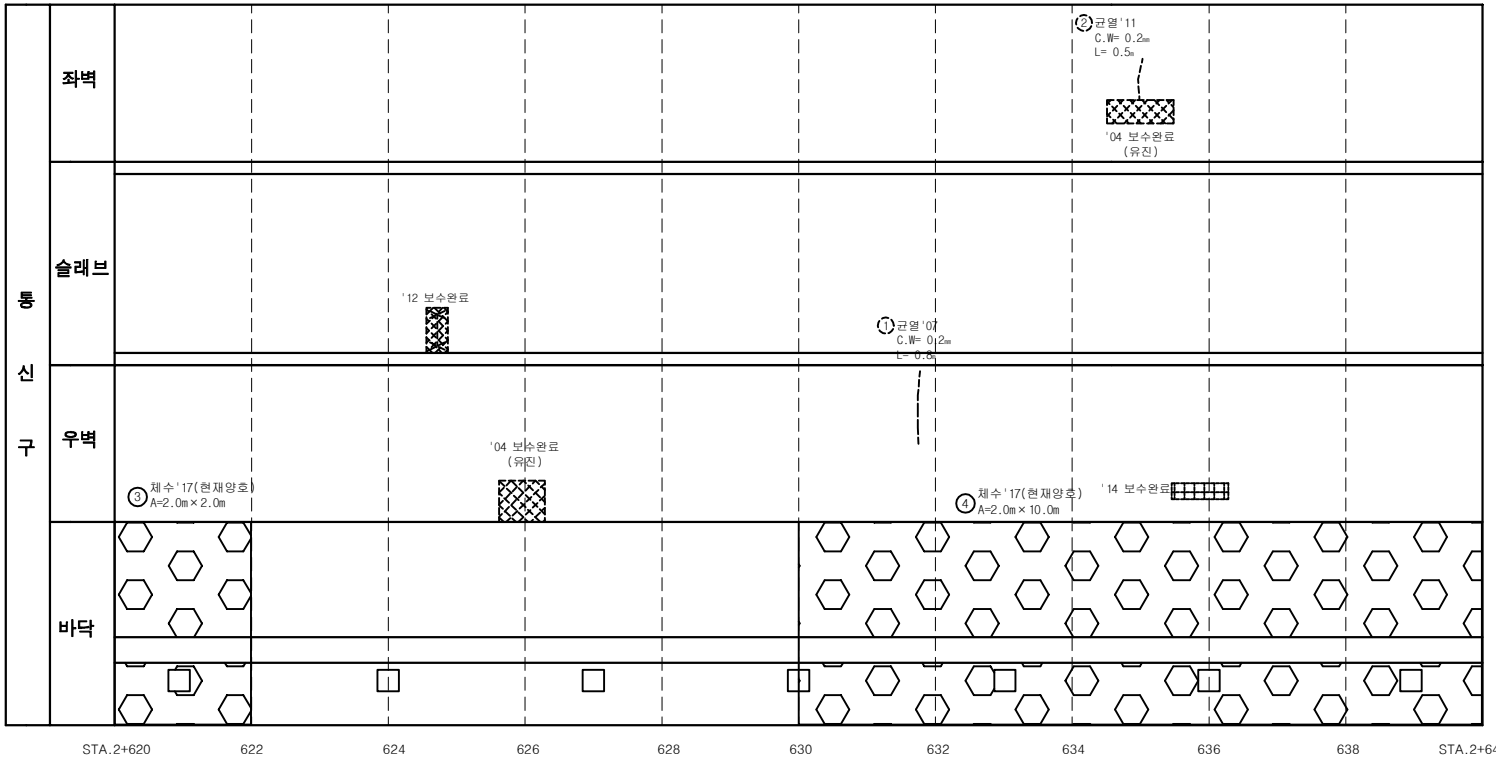

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	0.80		0.80	m	1			-	
2	2011	균열	0.2	0.50		0.50	m	1			-	
3	2017	체수	2.0	2.00		4.00	㎡	1			-	
4	2017	체수	2.0	10.00		20.00	㎡	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+640m ~ 2+660m)





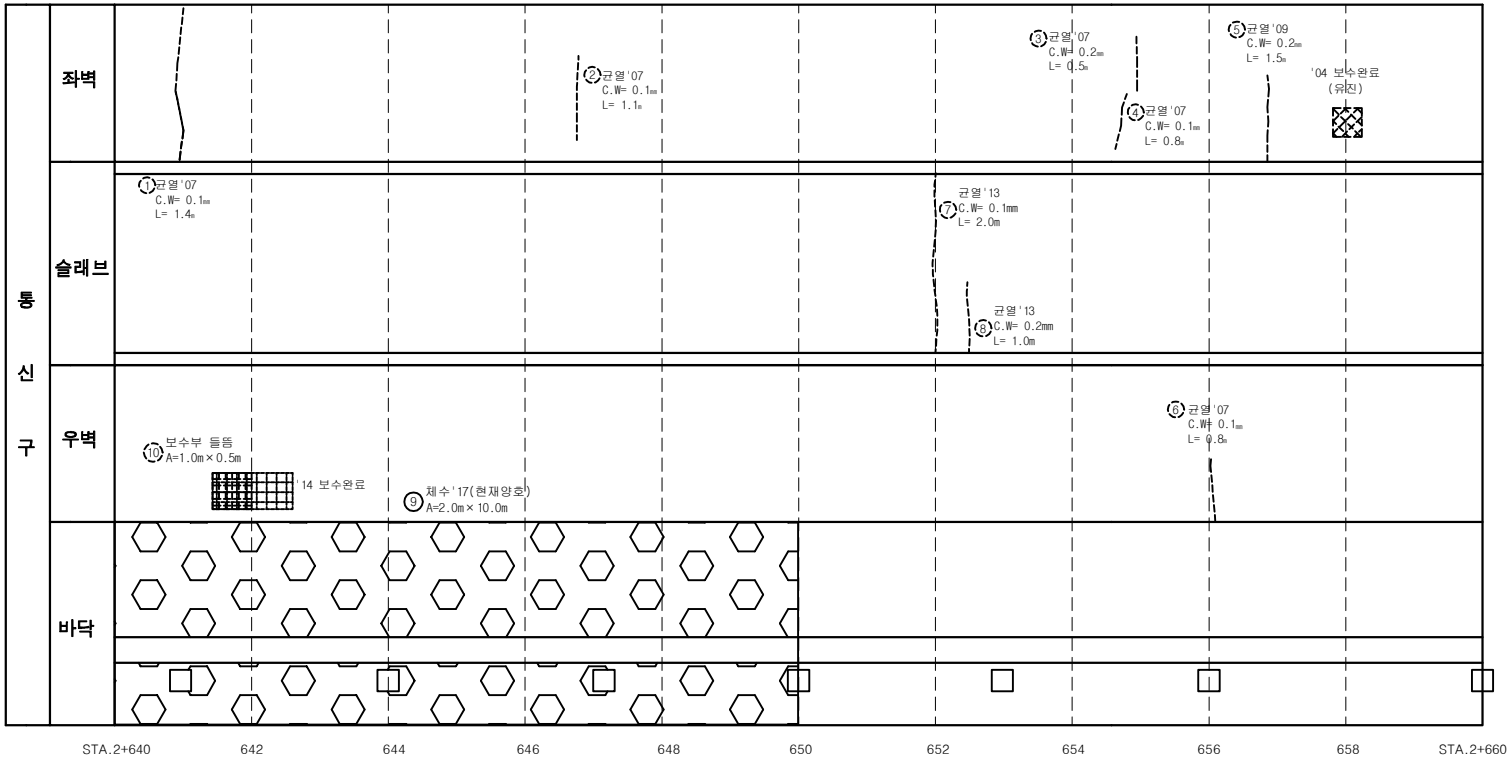

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.1	1.40		1.40	m	1			-	
2	2007	균열	0.1	1.10		1.10	m	1			-	
3	2007	균열	0.2	0.50		0.50	m	1			-	
4	2007	균열	0.1	0.80		0.80	m	1			-	
5	2009	균열	0.2	1.50		1.50	m	1			-	
6	2007	균열	0.1	0.80		0.80	m	1			-	
7	2013	균열	0.1	2.00		2.00	m	1			-	
8	2013	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	
9	2017	체수	2.0	10.00		20.00	㎡	1			-	
10	2019	보수부 들뜸	1.0	0.50		0.50	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+660m ~ 2+680m)





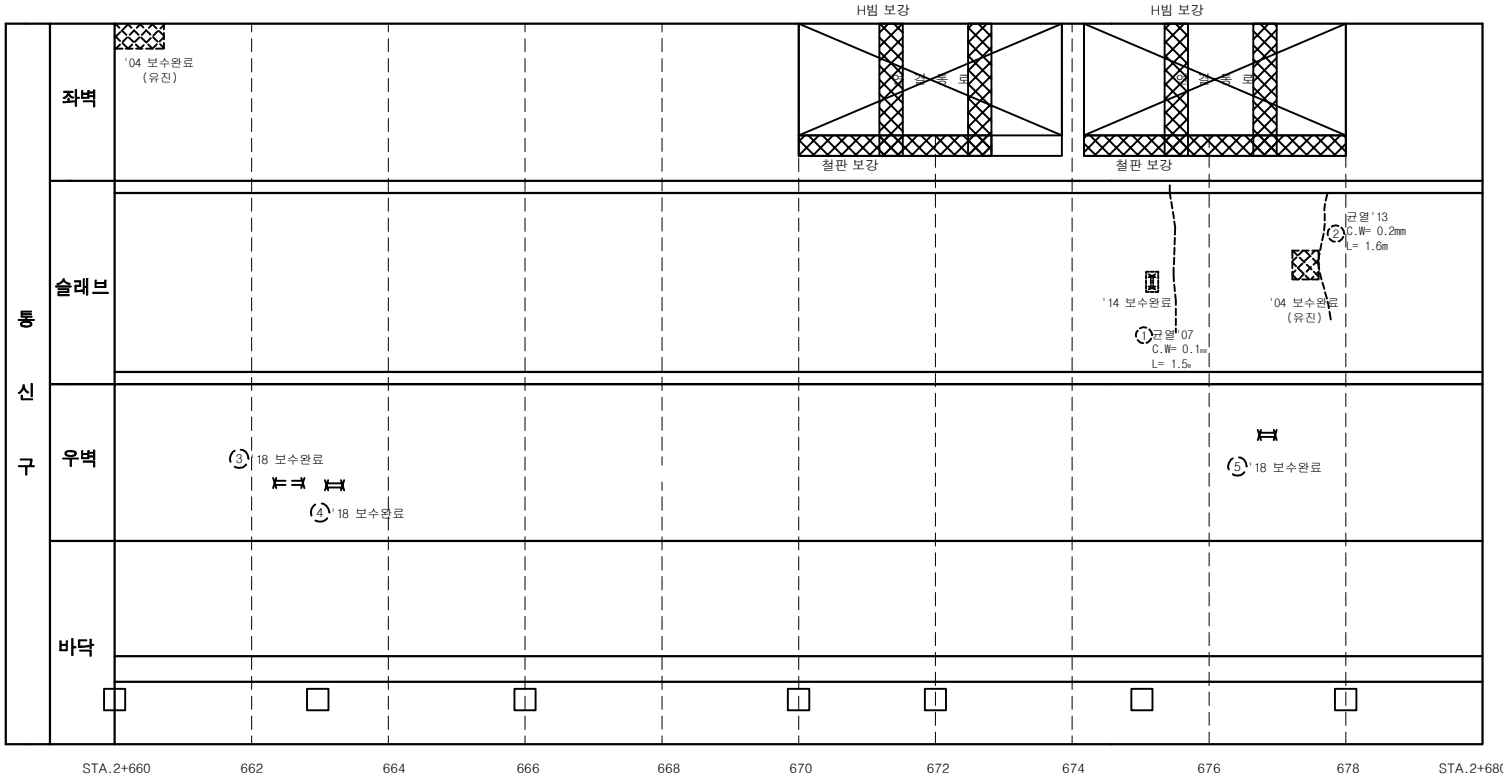

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.1	1.50		1.50	m	1			-	
2	2013	균열	0.2	1.60		1.60	m	1			-	
3	2017	철근노출	0.1	0.80		0.08	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.10	
4	2017	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.04	
5	2017	철근노출	0.1	0.60		0.06	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.07	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+680m ~ 2+700m)





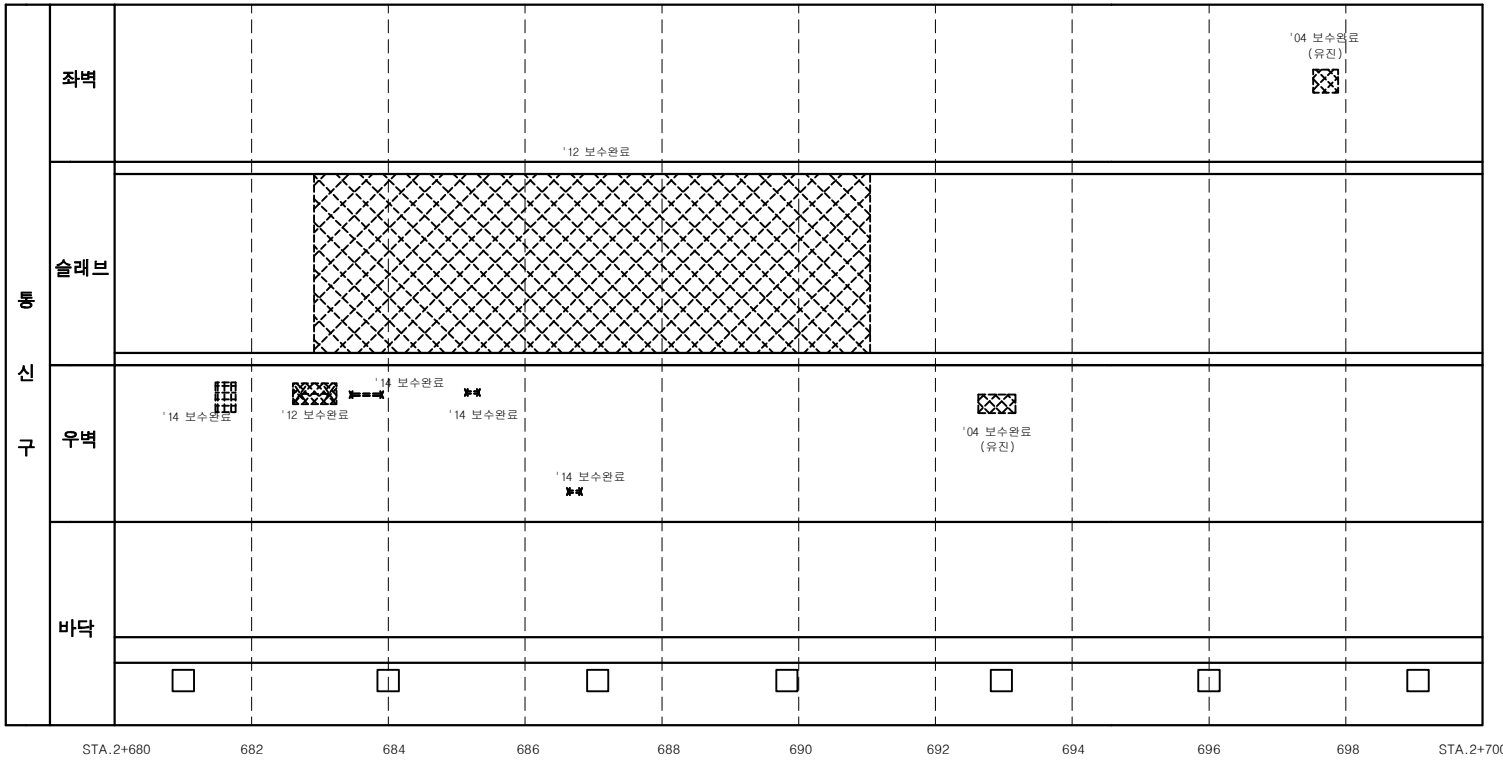

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+700m ~ 2+720m)





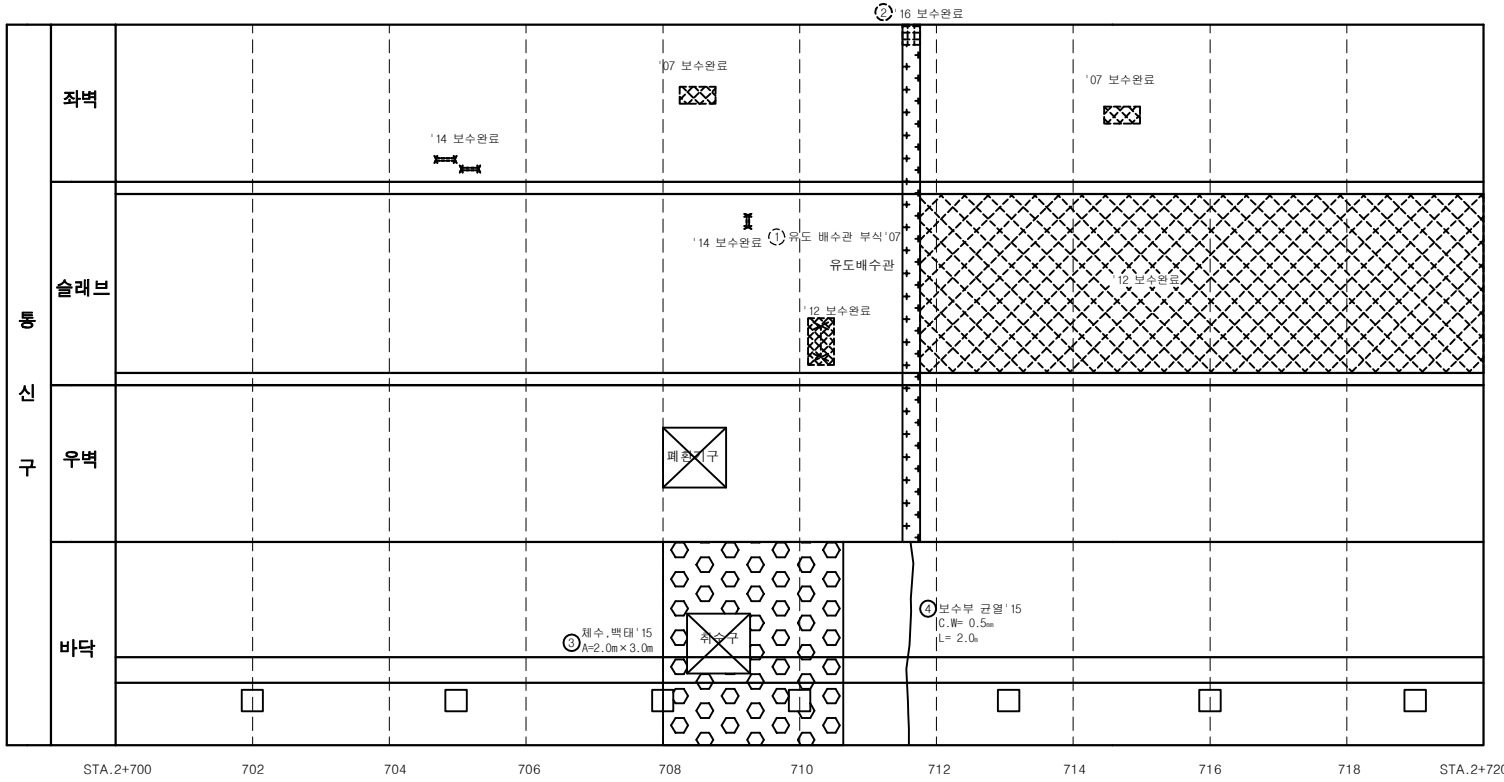

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	유도배수관부식			7	7	m	1			-	
2	2013	파손		0.3	0.30	0.09	㎡	1	2016	단면복구공법	0.11	
3	2015	체수, 백태		2.0	3.00	6.00	㎡	1			-	
4	2015	보수부 균열	0.5		2.00	2.00	m	1			-	재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

M 폐환기구 18번 (순환선 2,710m)

KEYPLAN

SECTION





슬래브

바닥

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2005	철근노출,누수		1.4	1.40	1.96	㎡	1			-	중요
2	2013	체수		1.3	2.50	3.25	㎡	1			-	



배면

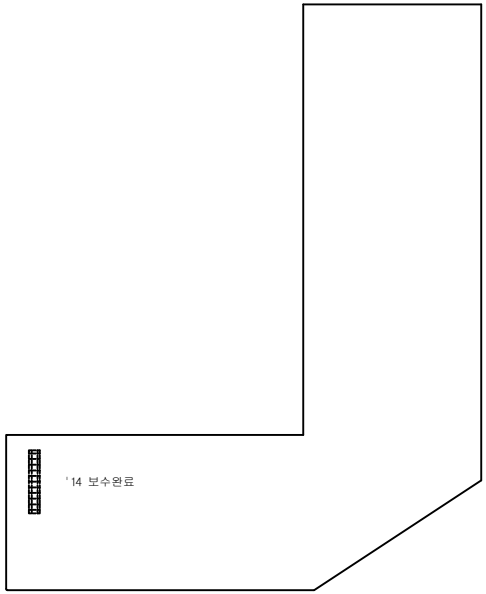

좌벽



전면

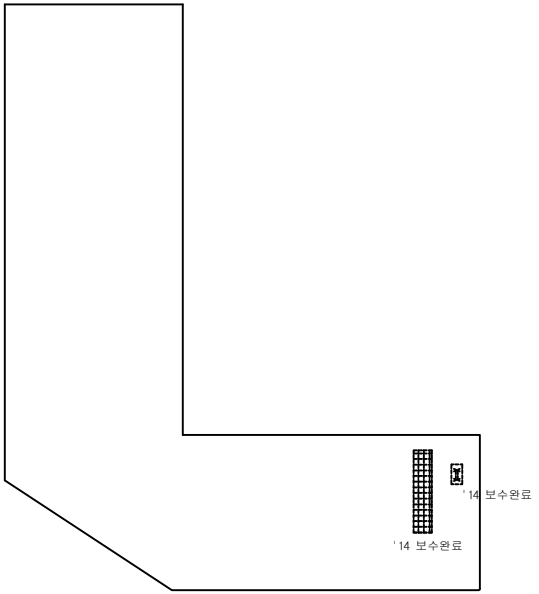

우벽

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **환기구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+720m ~ 2+740m)





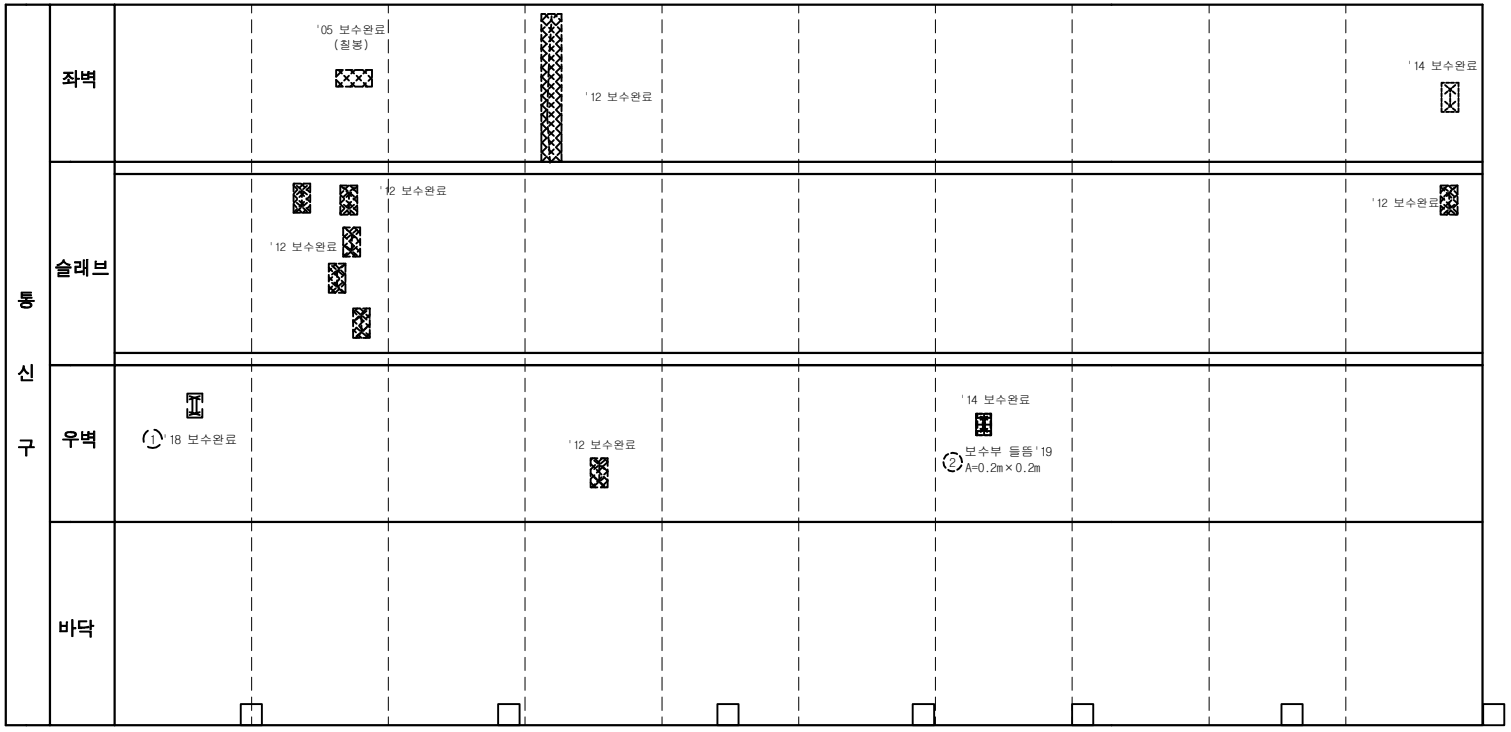

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2017	철근노출	0.2	0.20		0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.05	
2	2019	보수부 들뜸	0.2	0.20		0.04	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+740m ~ 2+760m)





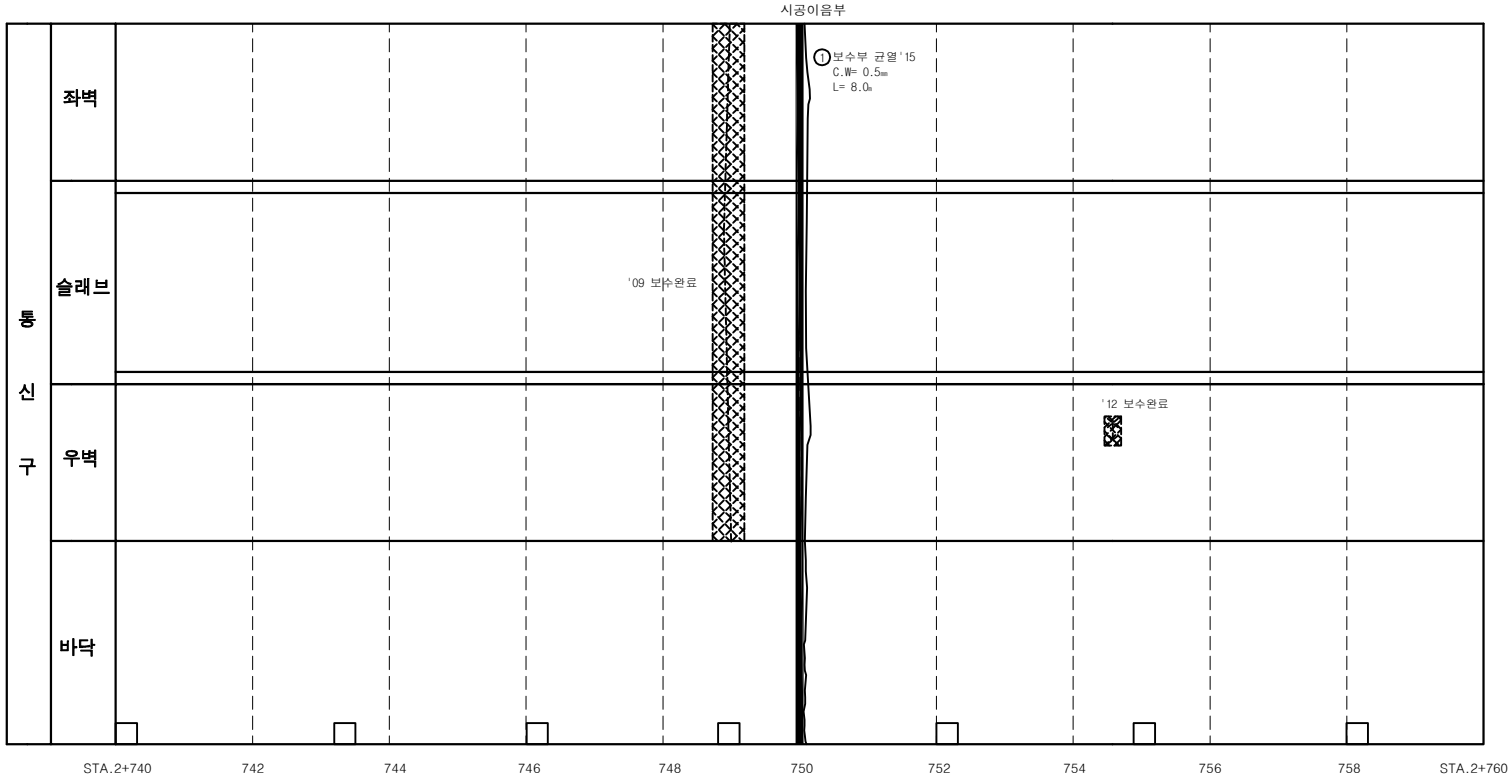

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2015	보수부 균열	0.5	8.00		8.00	m	1			-	재균열

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+760m ~ 2+780m)





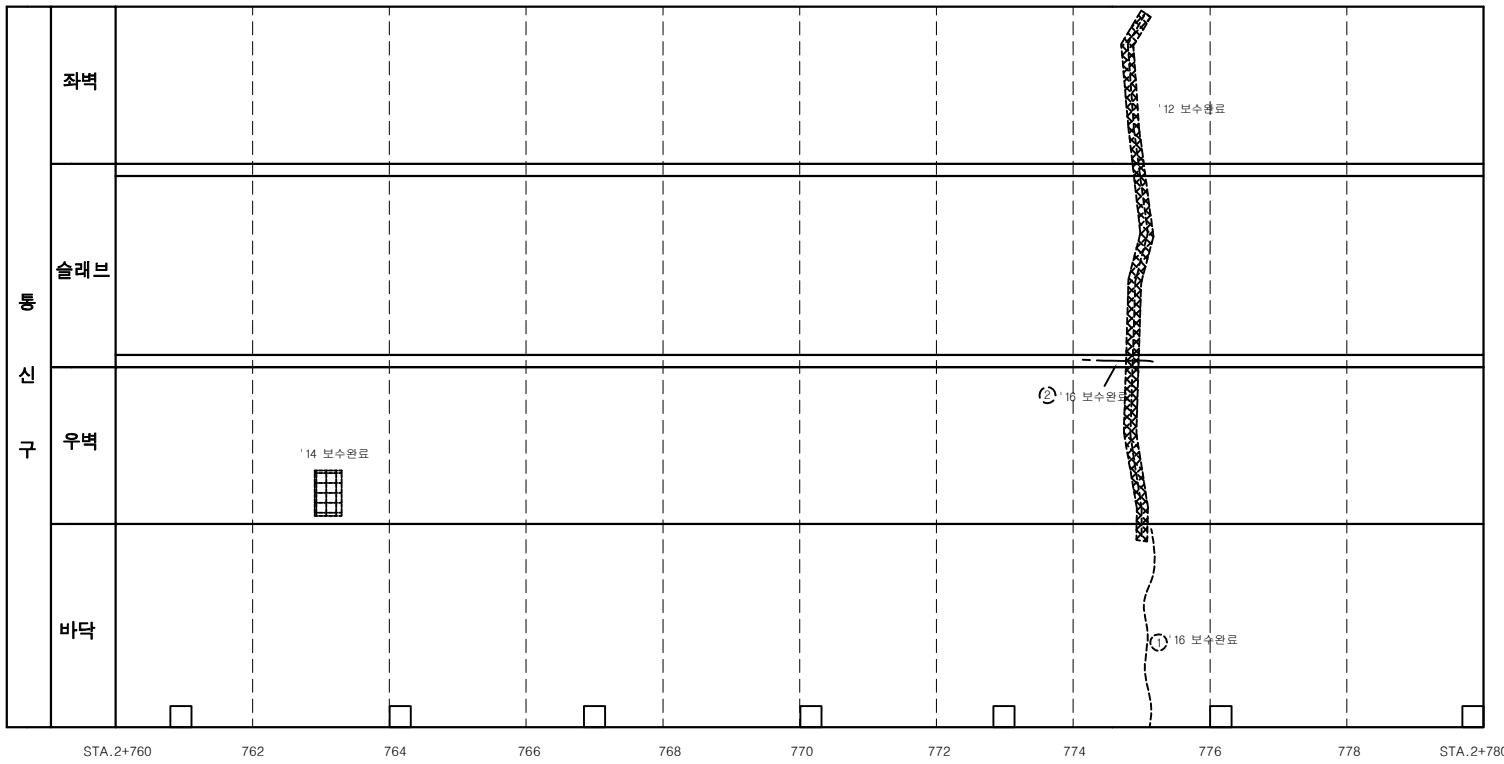

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.3	2.00		2.00	m	1	2016	주입보수공법	2.40	
2	2015	균열	0.3	1.00		1.00	m	1	2016	주입보수공법	1.20	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+780m ~ 2+800m)





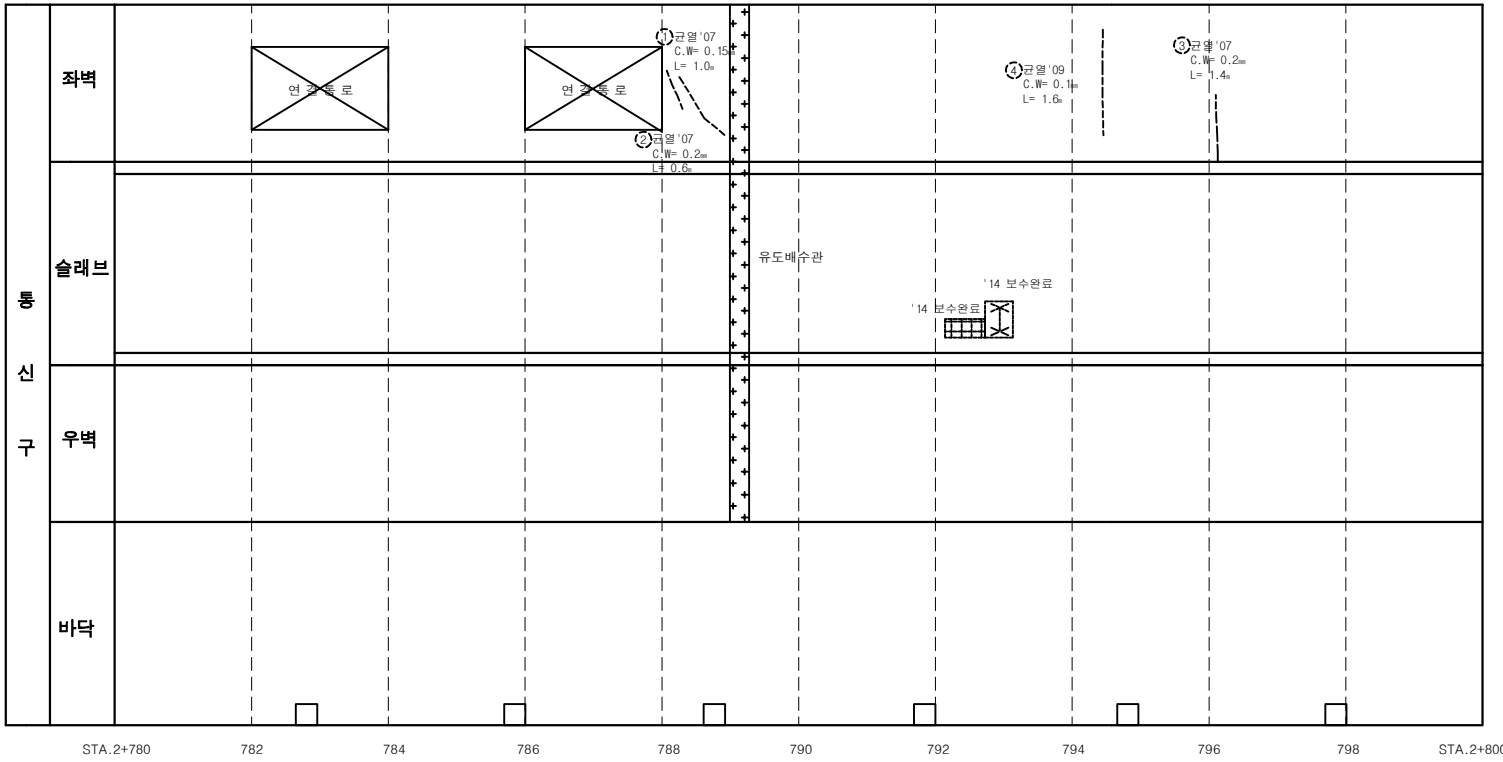

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	0.60		0.60	m	1			-	
3	2007	균열	0.2	1.40		1.40	m	1			-	
4	2009	균열	0.1	1.60		1.60	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+800m ~ 2+820m)





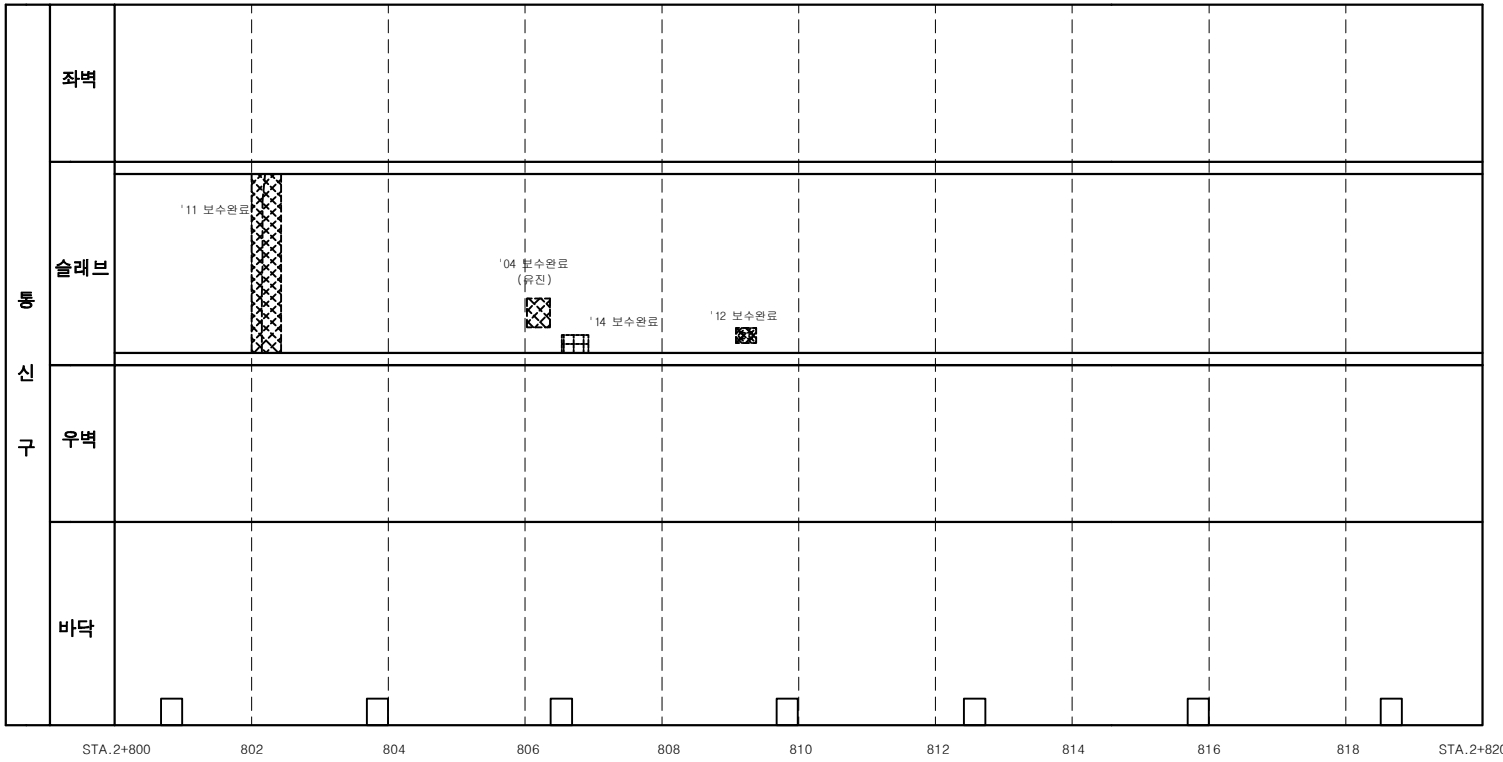

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+820m ~ 2+840m)





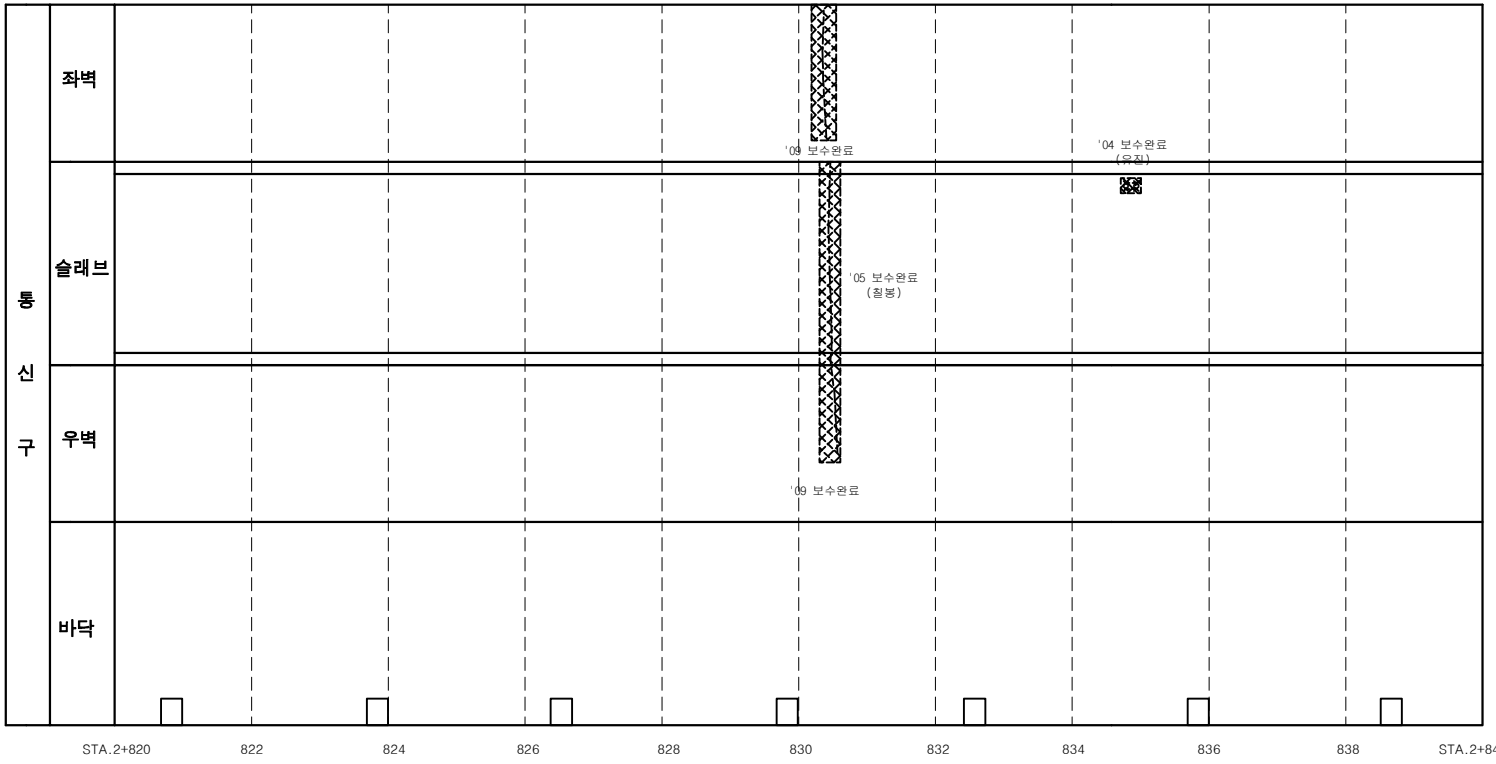

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+840m ~ 2+860m)





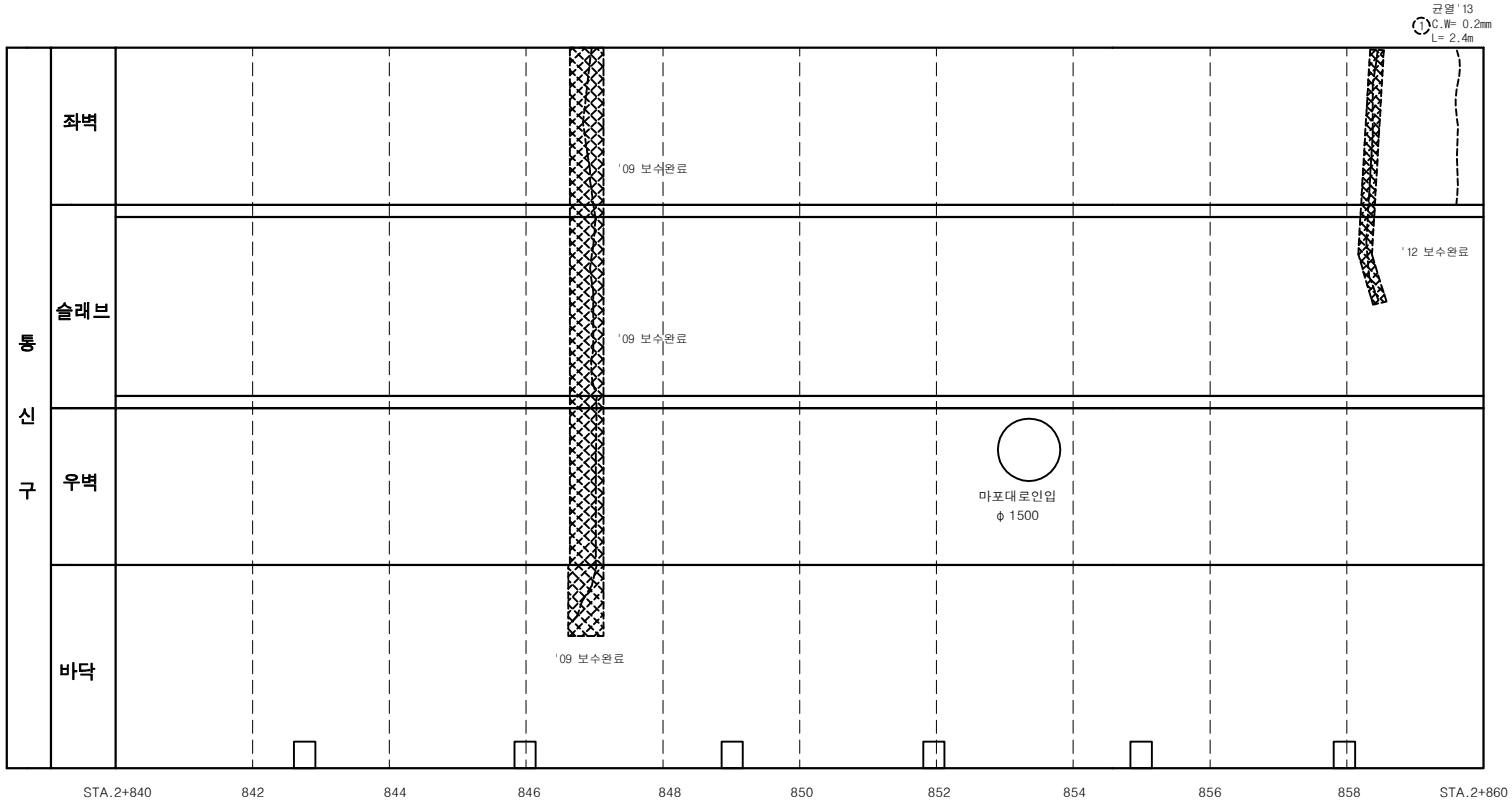

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.2	2.40		2.40	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+860m ~ 2+880m)





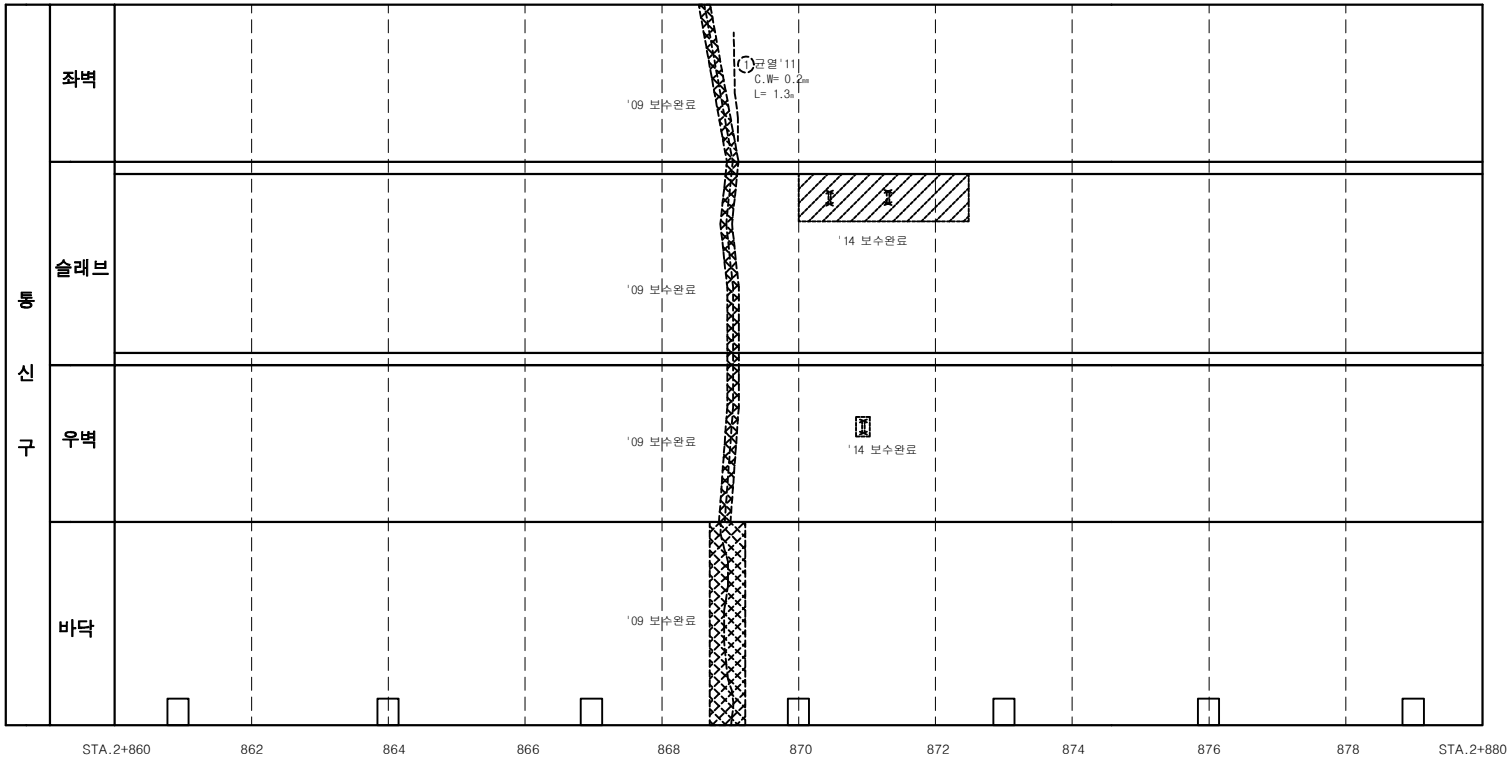

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2011	균열	0.2	1.30		1.30	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+880m ~ 2+900m)





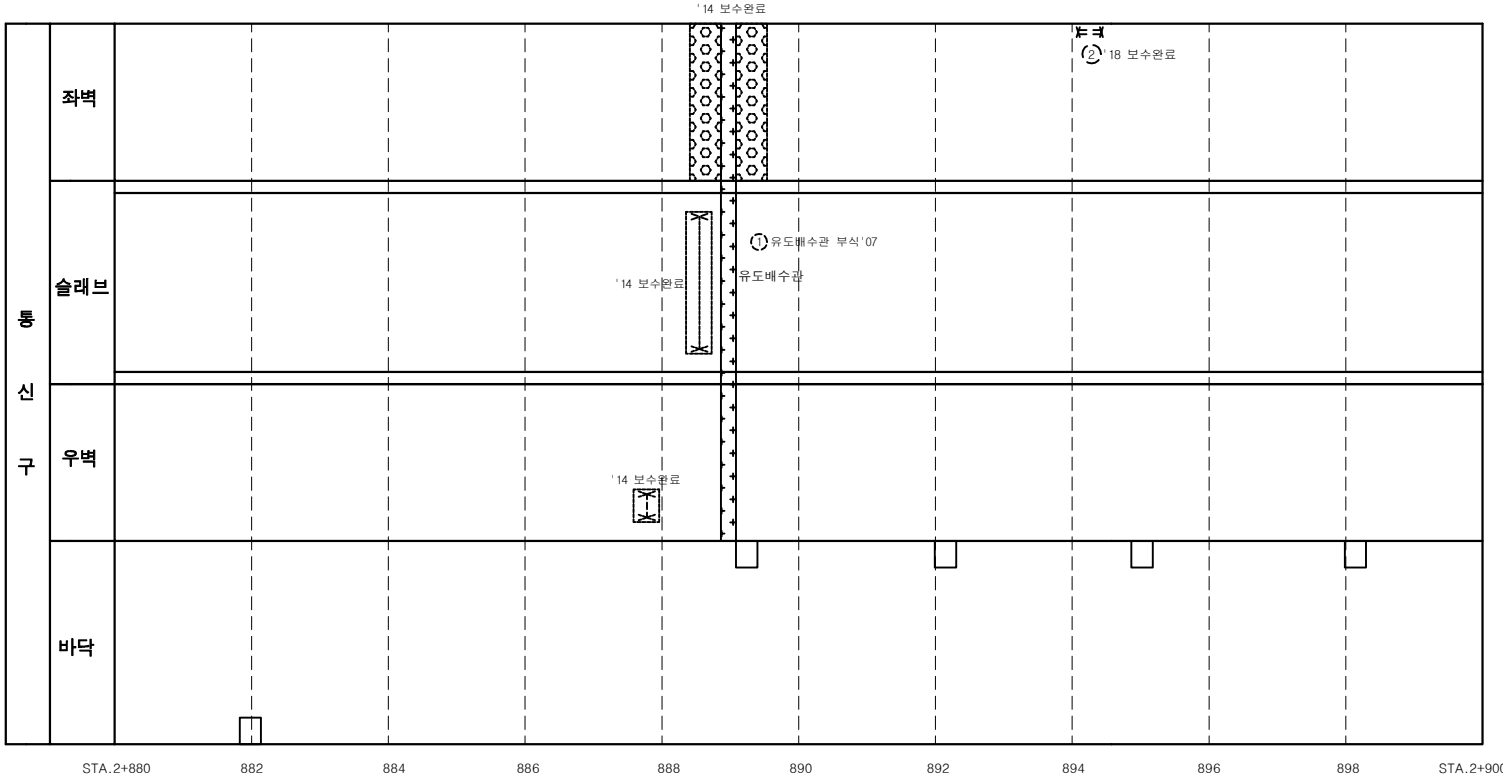

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	유도배수관부식		7.00		7.00	m	1			-	
2	2017	철근노출	0.1	0.40		0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.05	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+900m ~ 2+920m)





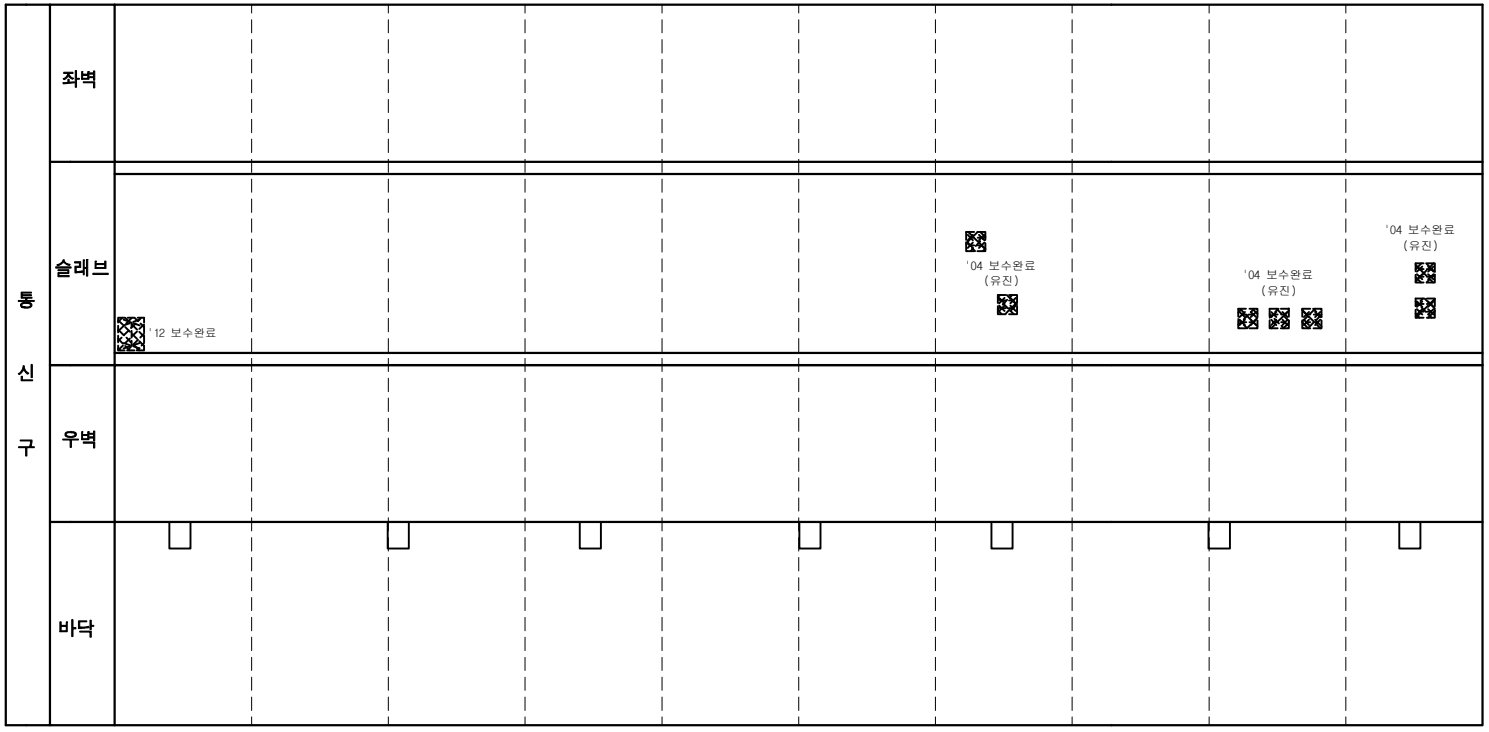

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+920m ~ 2+940m)





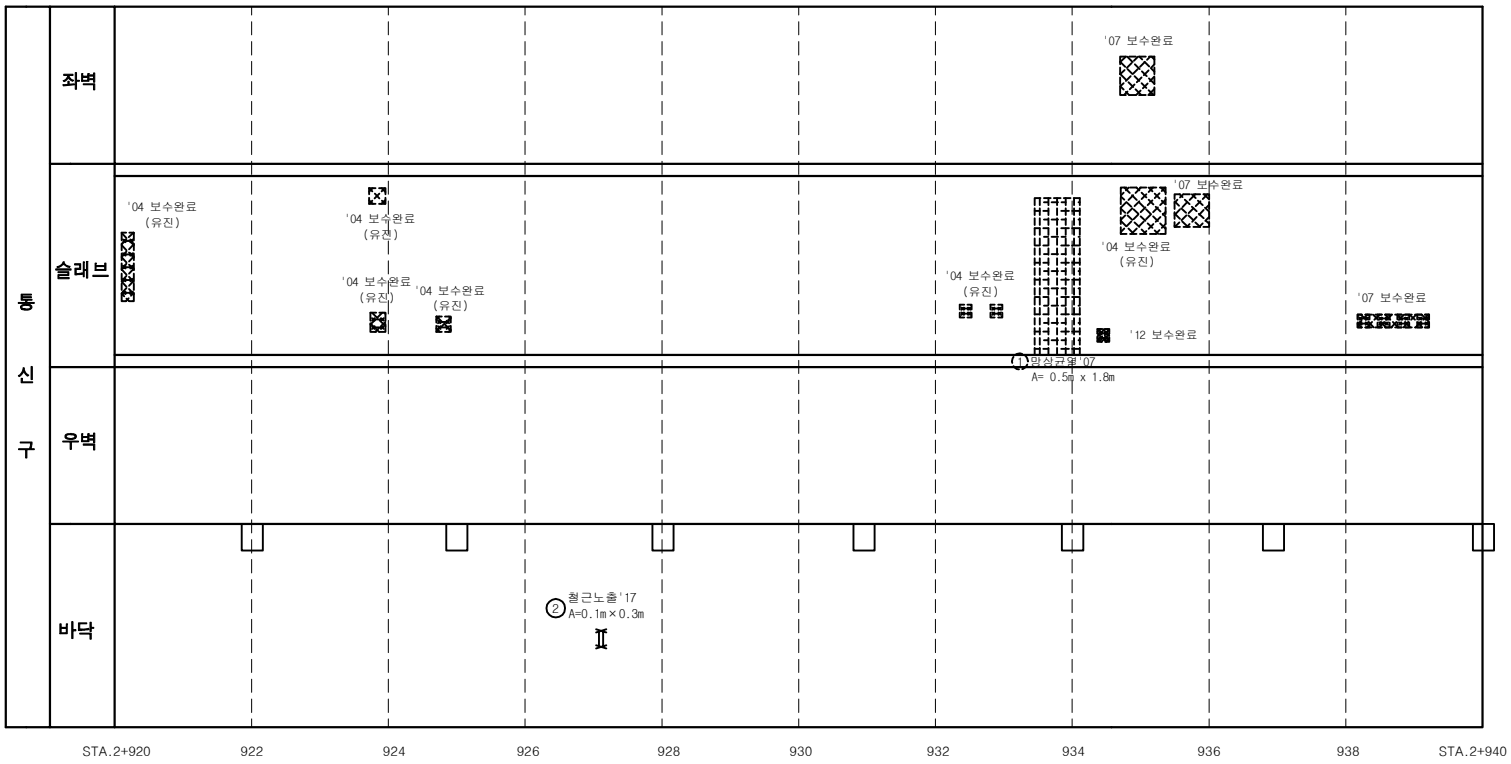

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	망상균열	0.5	1.80		0.90	㎡	1			-	
2	2017	철근노출	0.1	0.30		0.03	㎡	1			-	중요

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+940m ~ 2+960m)





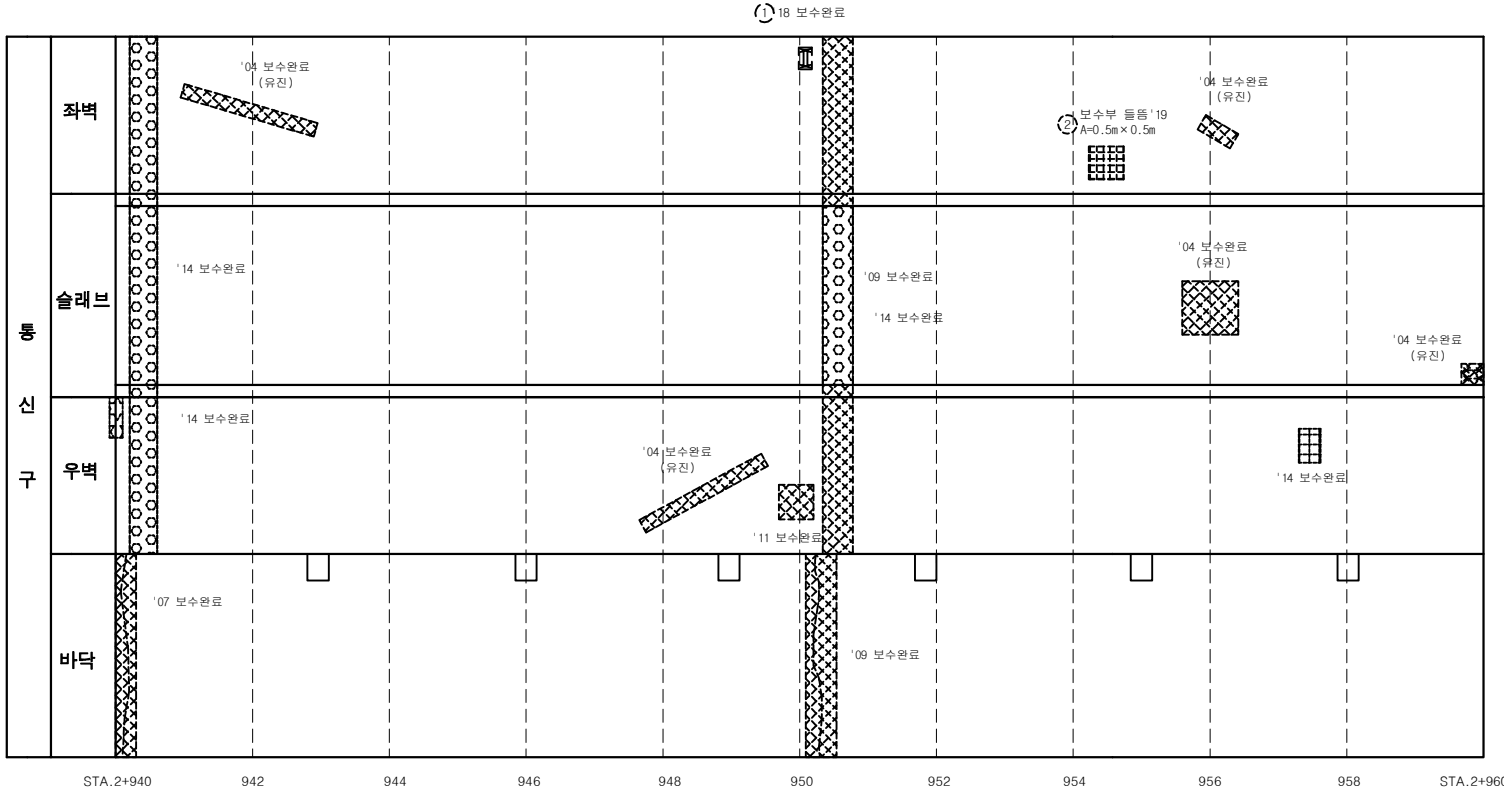

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2017	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.02	
2	2019	보수부 들뜸	0.5	0.50		0.25	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+960m ~ 2+980m)





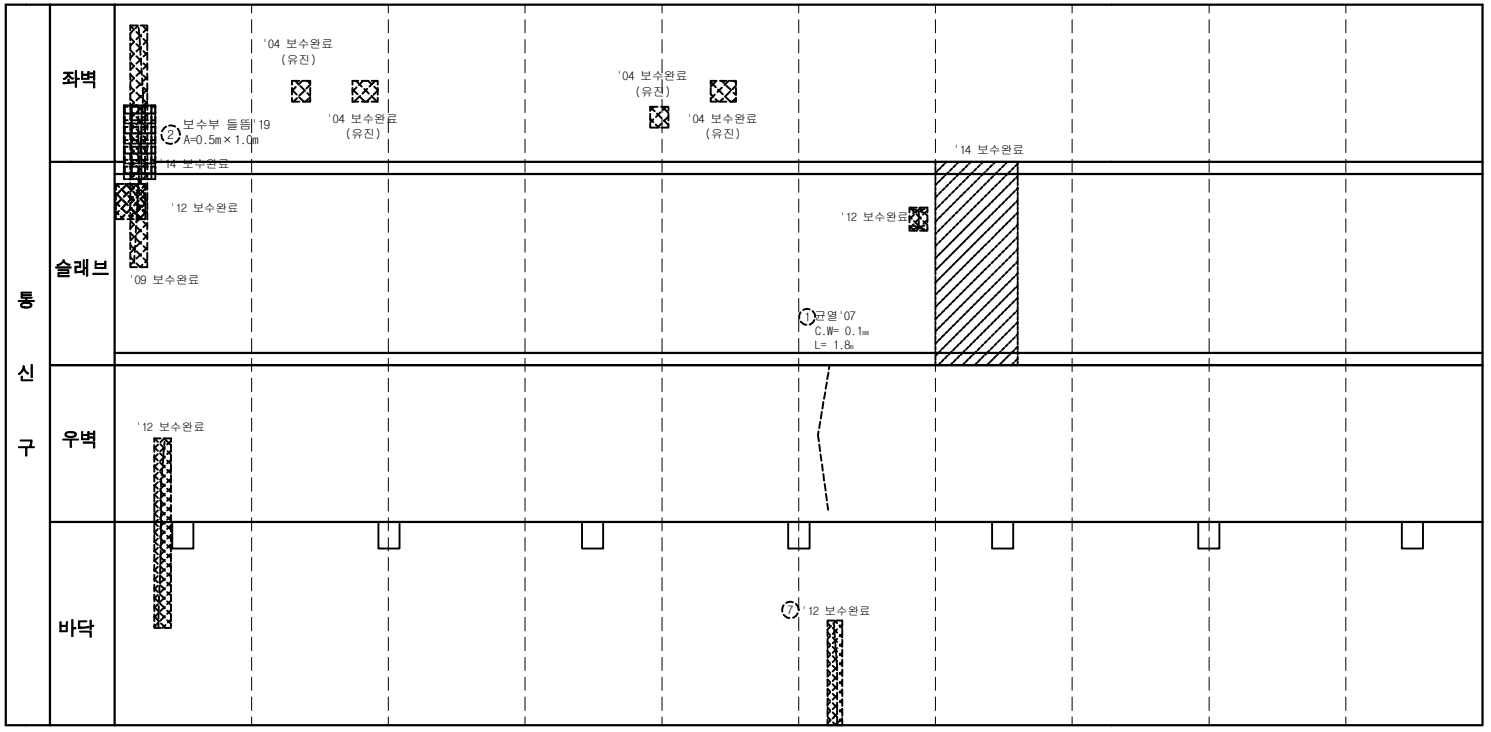

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.1		1.80	1.80	m	1			-	
2	2019	보수부 들뜸	0.5	0.50		0.25	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 2+980m ~ 3+000m)





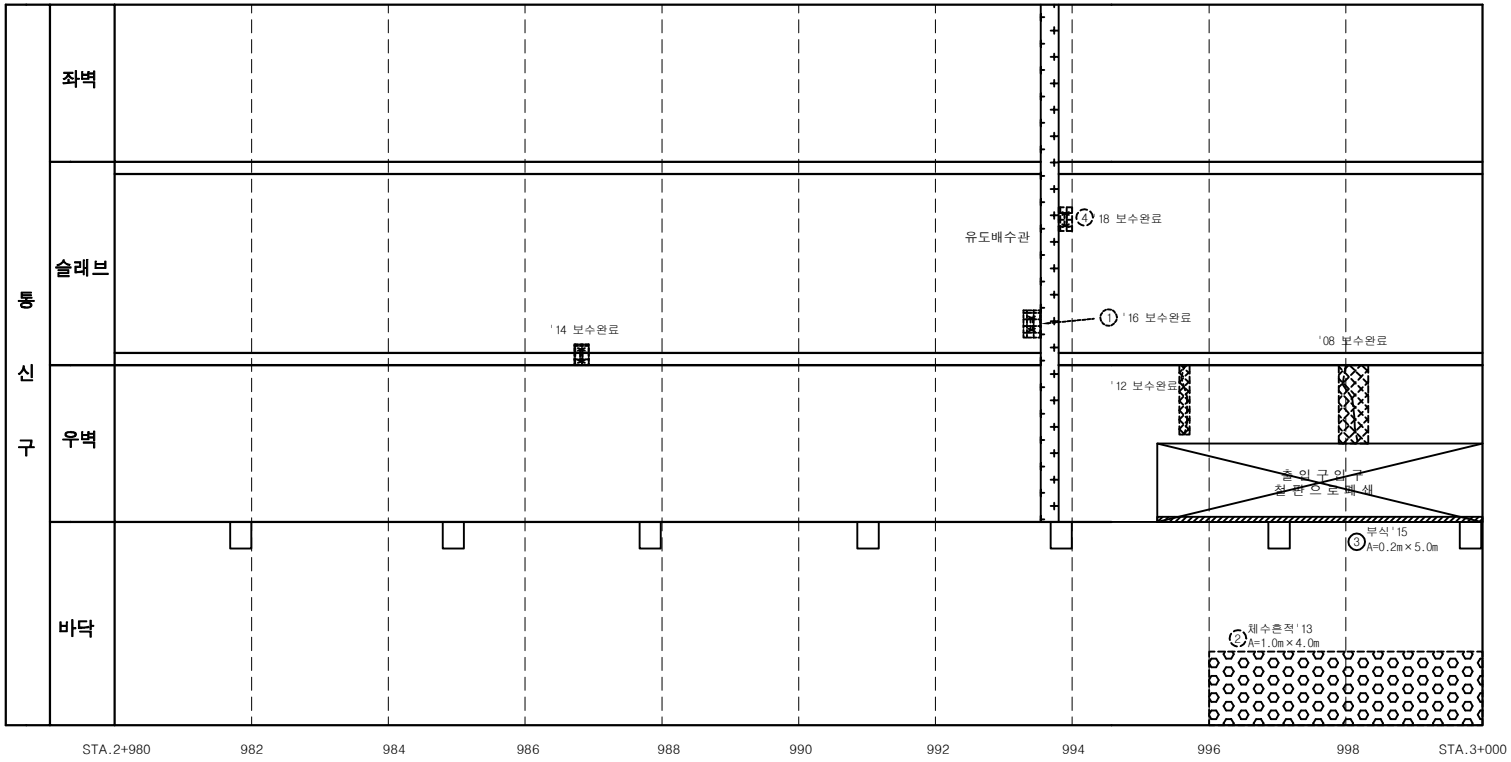

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	철근노출,박락	0.2	0.10		0.02	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.02	
2	2013	체수흔적	1.0	4.00		4.00	㎡	1			-	
3	2015	철판부식	0.2	5.00		1.00	㎡	1			-	
4	2013	철근노출,박락	0.2	0.10		0.02	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.02	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+000m ~ 3+020m)





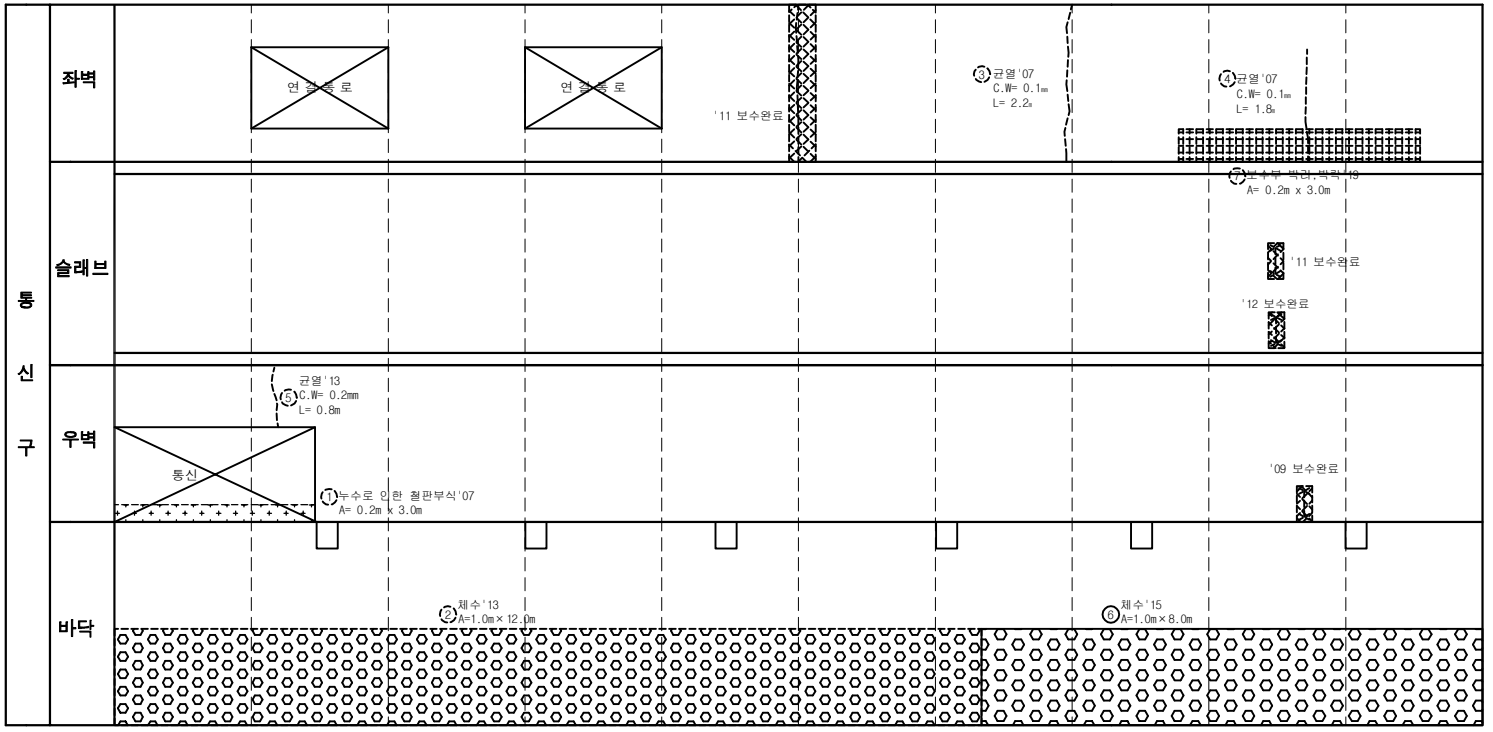

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	철판부식	0.2	3.00		0.60	㎡	1			-	
2	2013	체수	1.0	12.00		12.00	㎡	1			-	
3	2007	균열	0.1	2.20		2.20	m	1			-	
4	2007	균열	0.1	1.80		1.80	m	1			-	
5	2013	균열	0.2	0.80		0.80	m	1			-	
6	2015	체수	1.0	8.00		8.00	㎡	1			-	
7	2019	보수부 박리, 박락	2.5	1.00		2.50	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+020m ~ 3+040m)





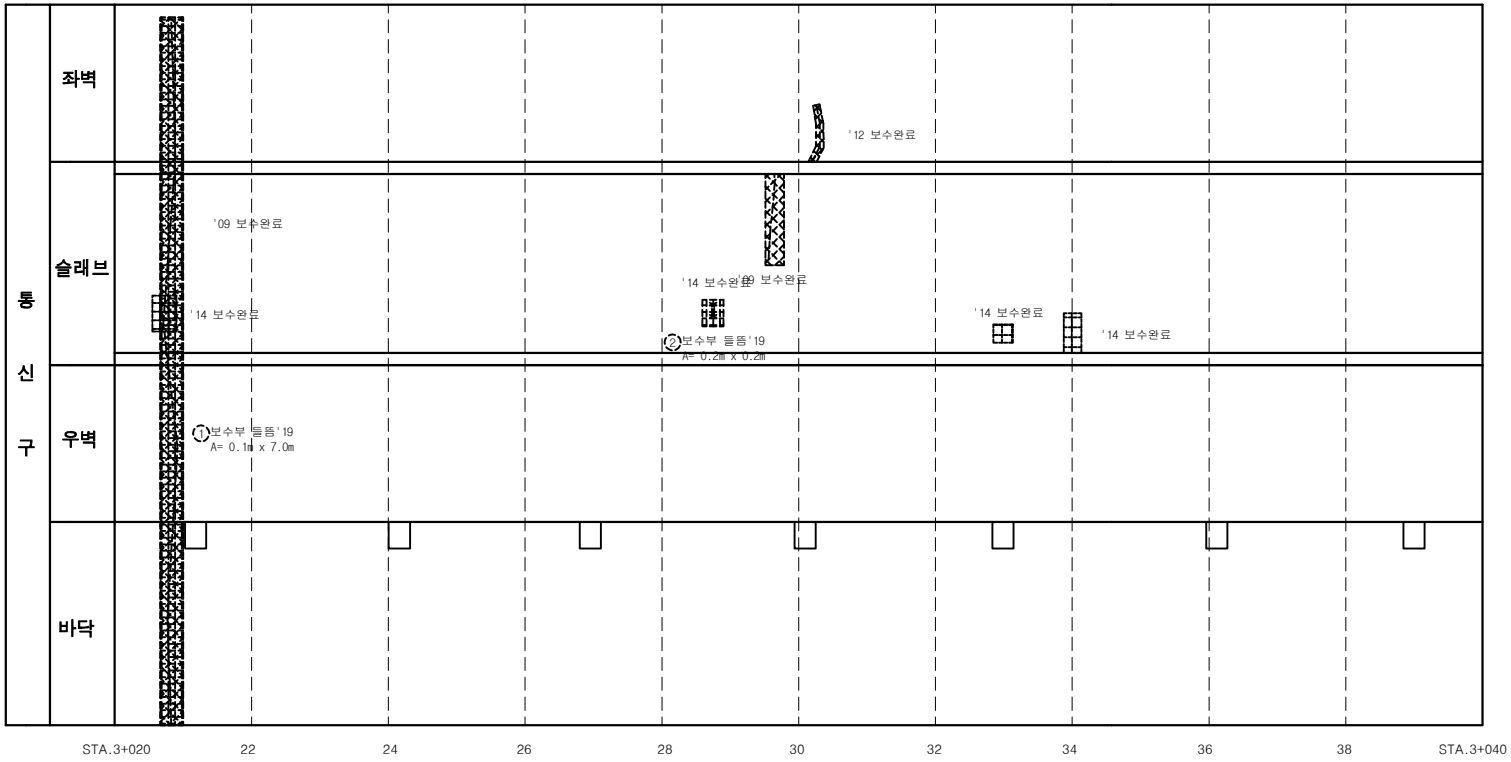

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2019	보수부 들뜸	0.1	7.00		0.70	㎡	1			-	신규
2	2019	보수부 들뜸	0.2	0.20		0.04	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+040m ~ 3+060m)





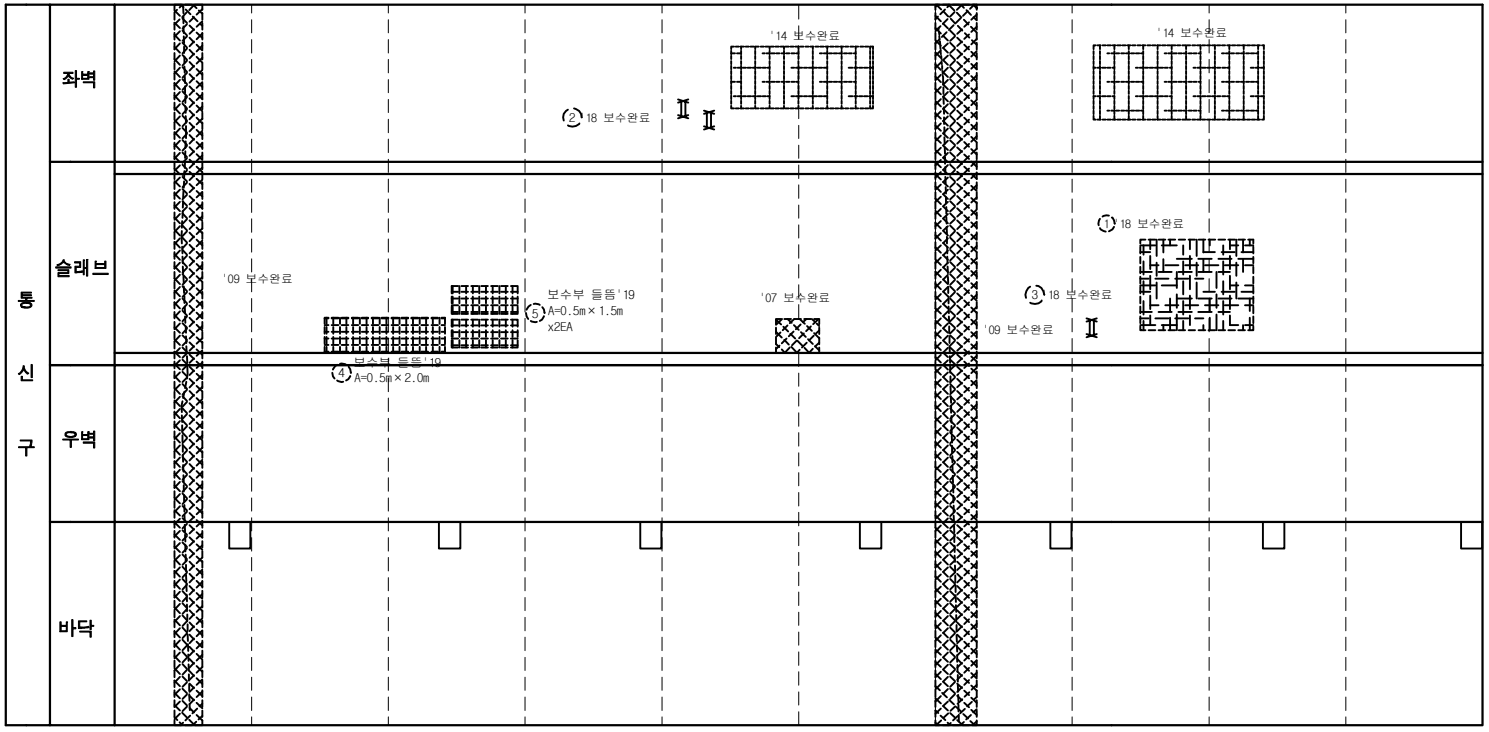

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	보수부 망상균열	1.5	2.00		3.00	㎡	1	2018	표면처리공법	3.60	
2	2017	철근노출	0.1	0.20		0.04	㎡	2	2018	단면복구(방청)	0.05	
3	2017	철근노출	0.1	0.10		0.01	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.01	
4	2019	보수부 들뜸	0.5	2.00		1.00	㎡	1			-	신규
5	2019	보수부 들뜸	0.5	1.50		1.50	㎡	2			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+060m ~ 3+080m)





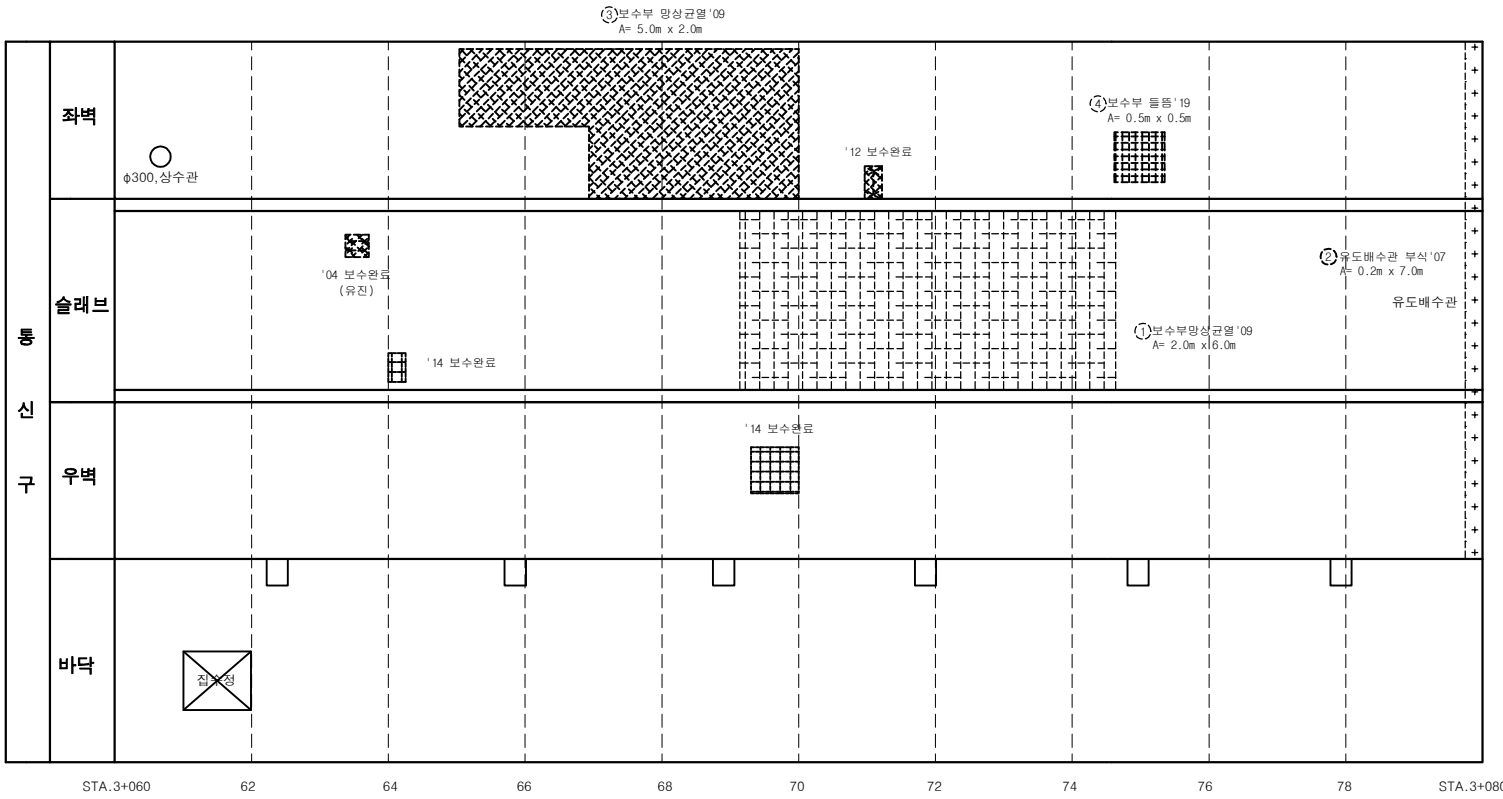

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2009	보수부 망상균열	2.0	6.0		12.0	㎡	1			-	재결함
2	2007	유도배수관부식	0.2	7.00		1.40	m	1			-	
3	2013	보수부 망상균열	5.0	2.00		10.00	㎡	1			-	신규
4	2013	보수부 들뜸	0.5	0.50		0.25	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+080m ~ 3+100m)





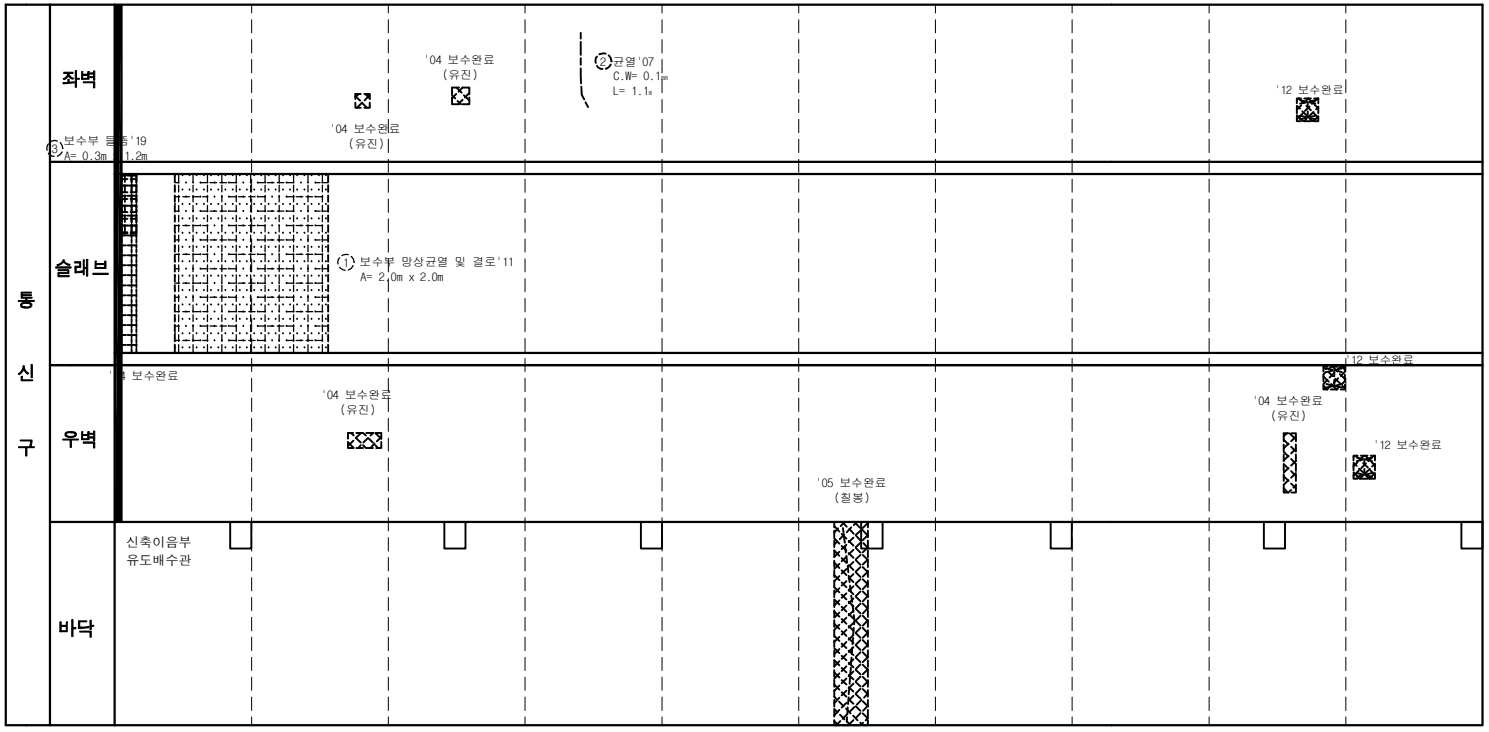

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2011	보수부 망상균열,결로	2.0	2.00		4.00	㎡	1			-	재결함
2	2007	균열	0.1	1.10		1.10	m	1			-	
3	2019	보수부 들뜸	0.3	1.20		0.36	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+100m ~ 3+120m)





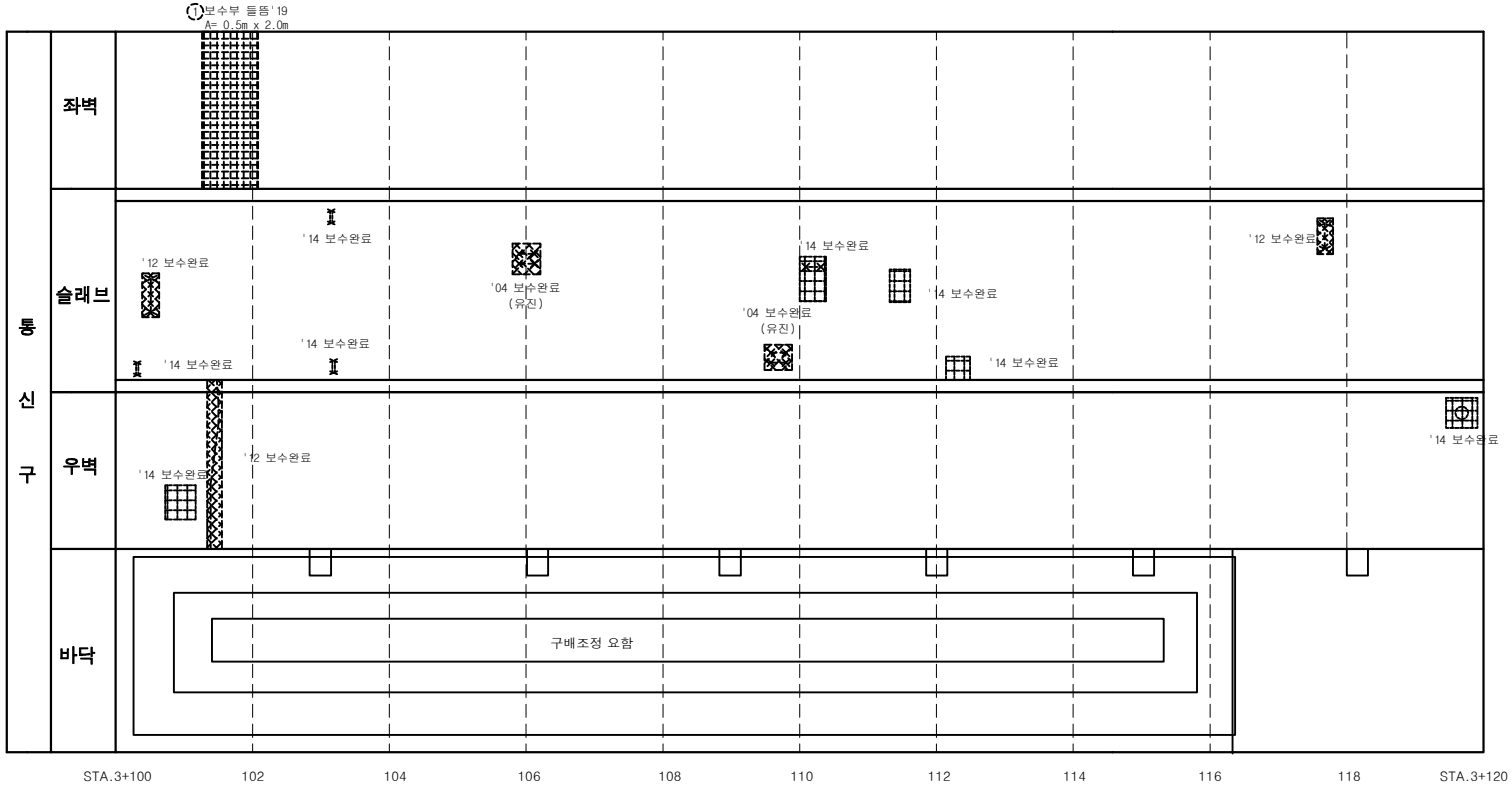

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2019	철근노출	0.5	2.00		1.00	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+120m ~ 3+140m)





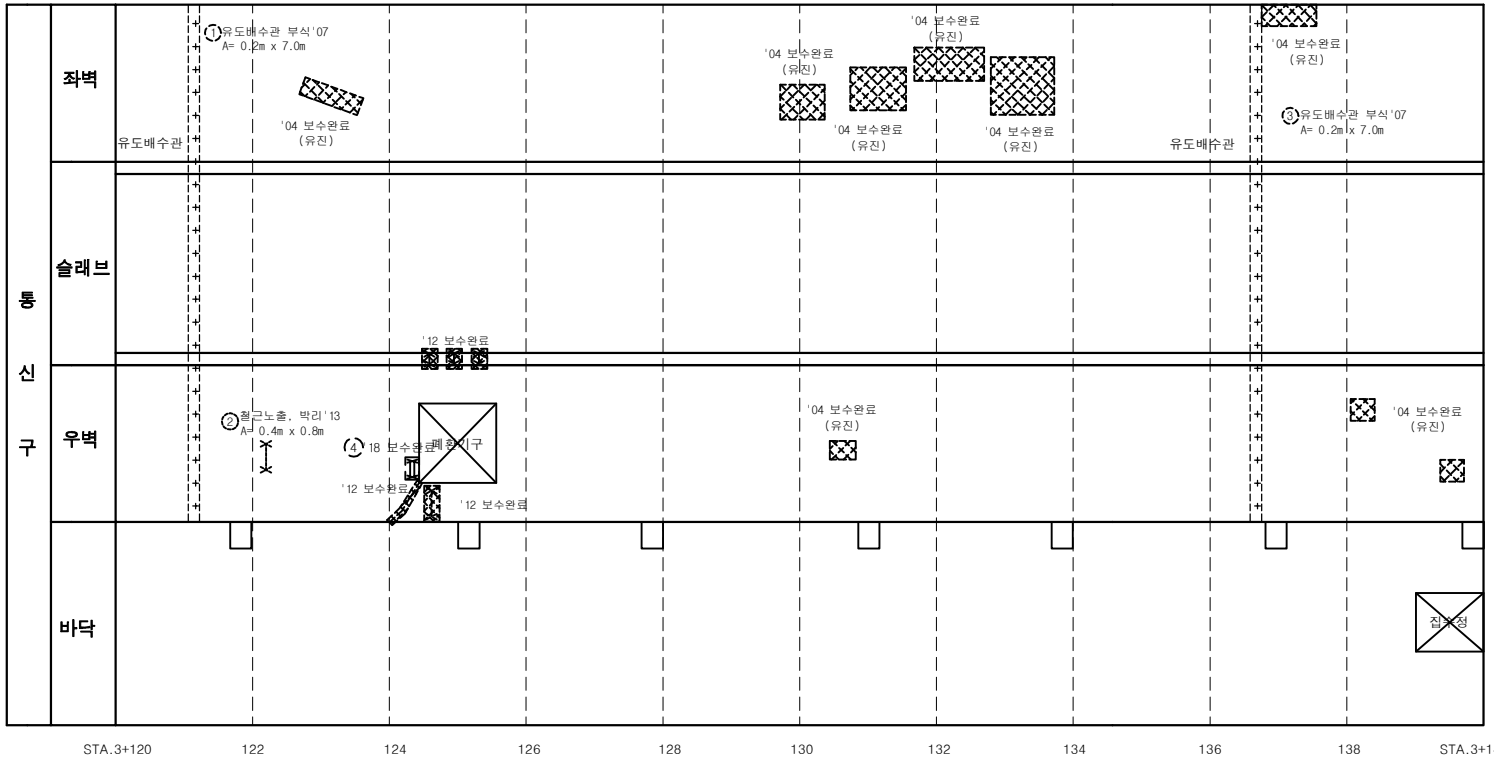

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	유도배수관부식		0.2	7.00	1.40	㎡	1			-	
2	2013	철근노출,박리	0.4	0.80		0.32	㎡	1			-	
3	2007	유도배수관부식		0.2	7.00	1.40	㎡	1			-	
4	2017	철근노출		0.2	0.40	0.08	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.10	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

폐 환기구 (순환선 3,125m)

KEYPLAN

SECTION

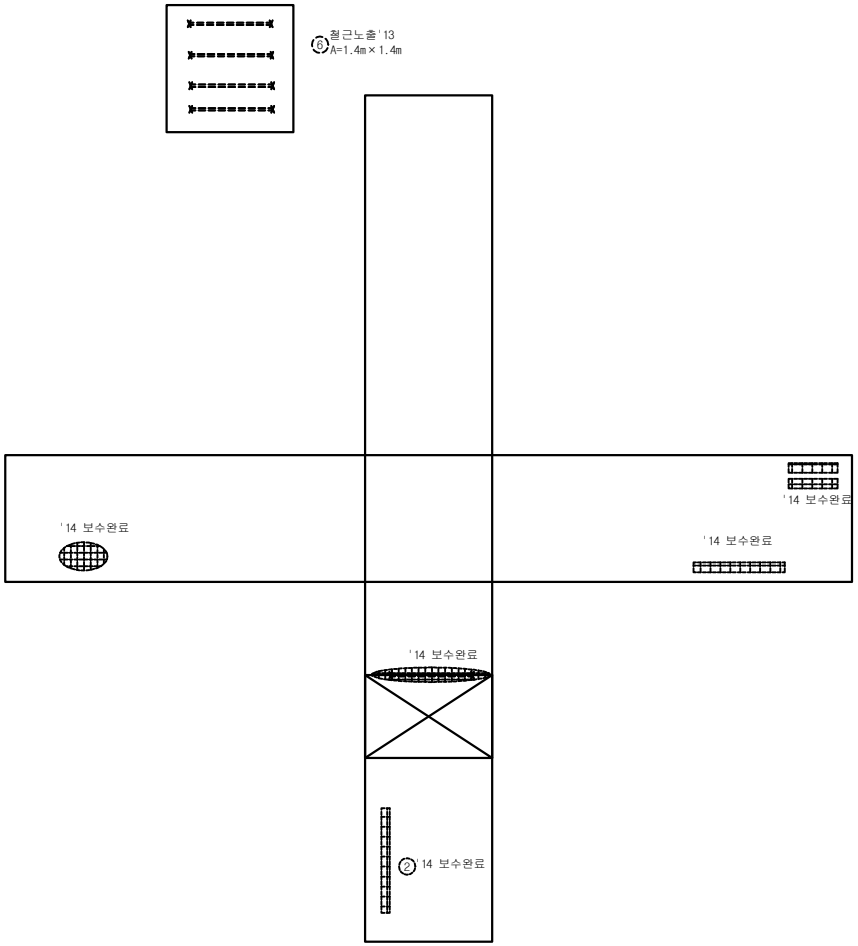

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	철근노출		1.4	1.40	1.96	㎡	1			-	중요

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 환기구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+140m ~ 3+160m)





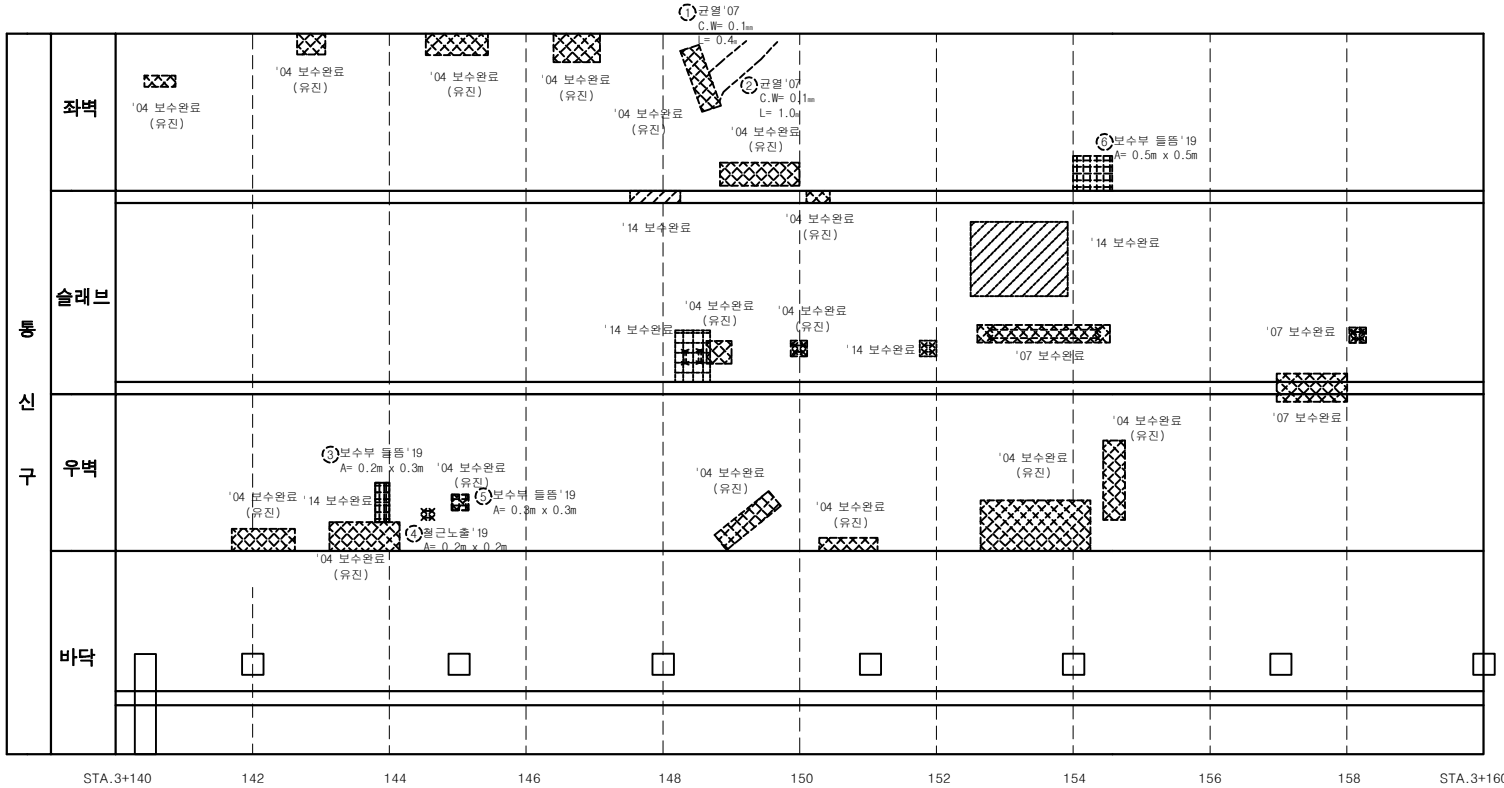

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.1	0.40		0.40	m	1			-	
2	2007	균열	0.1	1.00		1.00	m	1			-	
3	2019	보수부 들뜸	0.2	0.30		0.06	㎡	1			-	신규
4	2019	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1			-	신규
5	2019	보수부 들뜸	0.3	0.30		0.09	㎡	1			-	신규
6	2019	보수부 들뜸	0.5	0.50		0.25	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+160m ~ 3+180m)





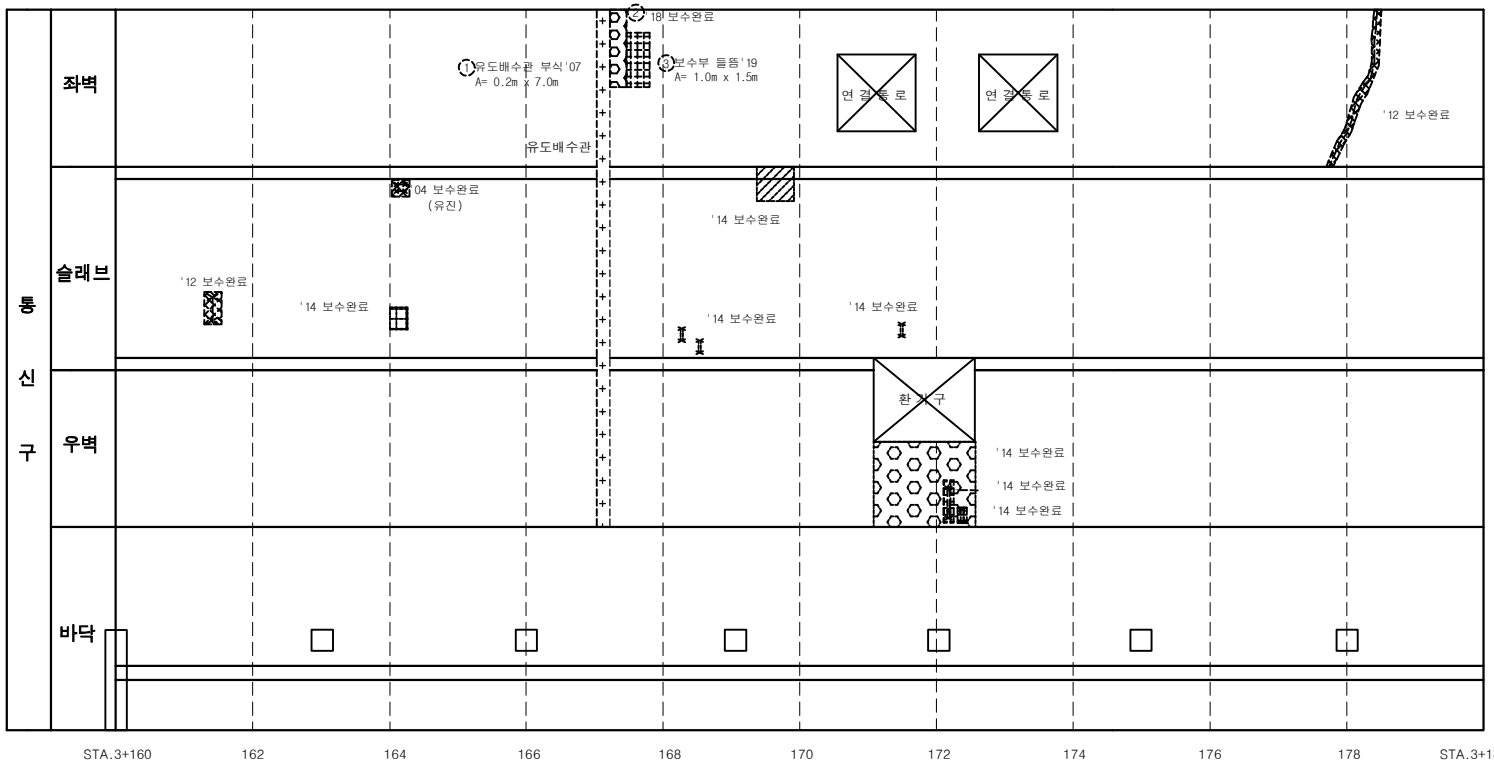

손상물량표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	유도배수관부식	0.2	7.00		1.40	㎡	1			-	
2	2013	누수,백태	0.2	0.80		0.16	㎡	1	2018	특면누수보수	0.19	
3	2019	보수부 들뜸	1.00	1.50		1.50	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

환기구 22번 (순환선 3,170m)

KEYPLAN

SECTION



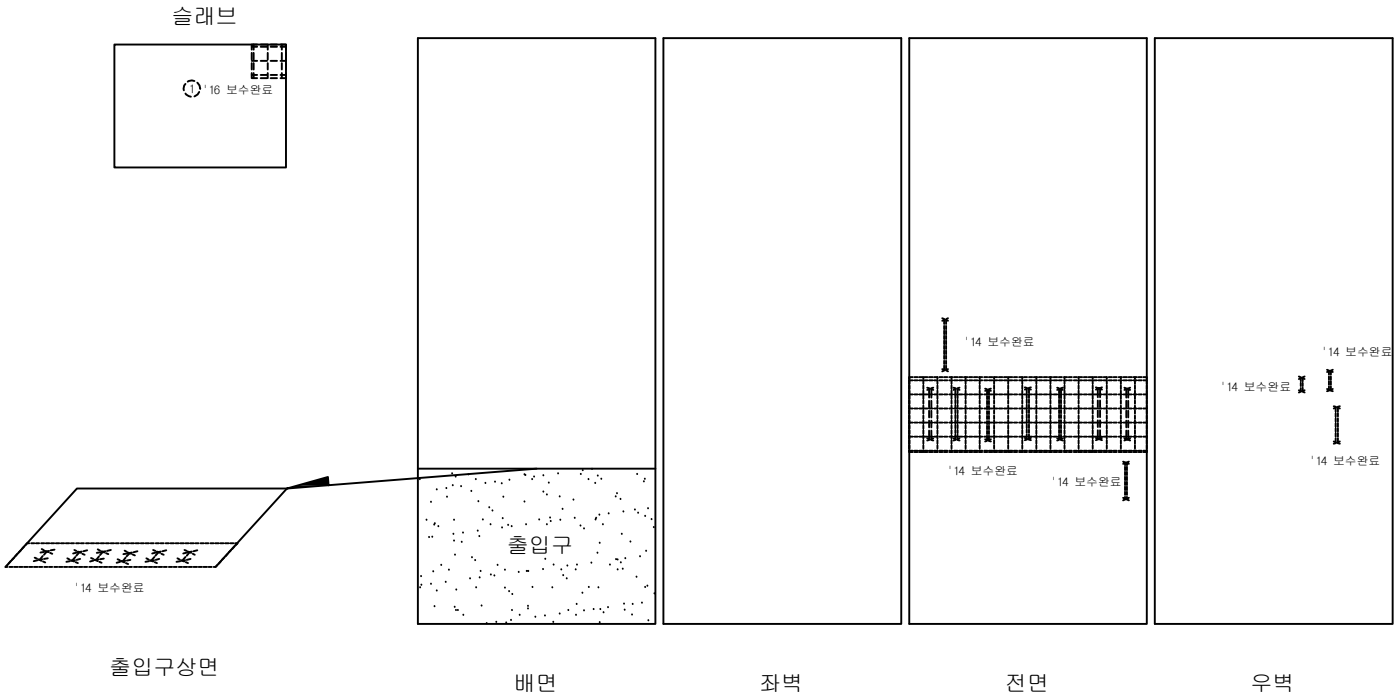

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	파손	0.6	0.60		0.36	㎡	1	2016	단면복구공법	0.43	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **환기구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+180m ~ 3+200m)





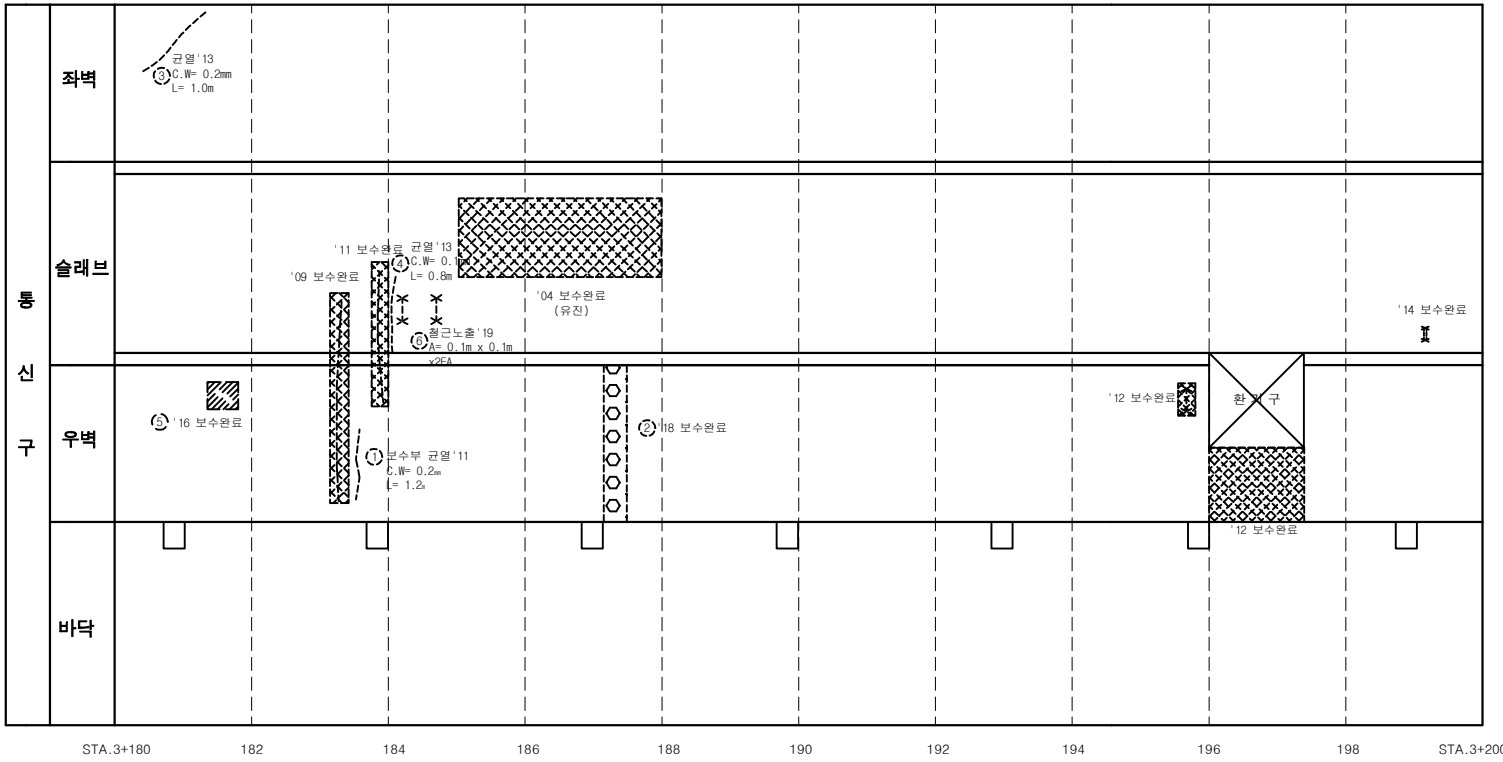

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2011	보수부 균열	0.2	1.20		1.20	m	1			-	재결함
2	2011	누수	2.0	0.50		1.00	㎡	1	2018	표면누수보수	1.20	
3	2013	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	
4	2013	균열	0.1	0.80		0.80	m	1			-	
5	2015	재료분리	0.1	0.10		0.01	㎡	1	2016	단면복구공법	0.01	
6	2019	철근노출	0.1	0.10		0.02	㎡	2			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

환기구 (순환선 3,196m)

KEYPLAN

SECTION

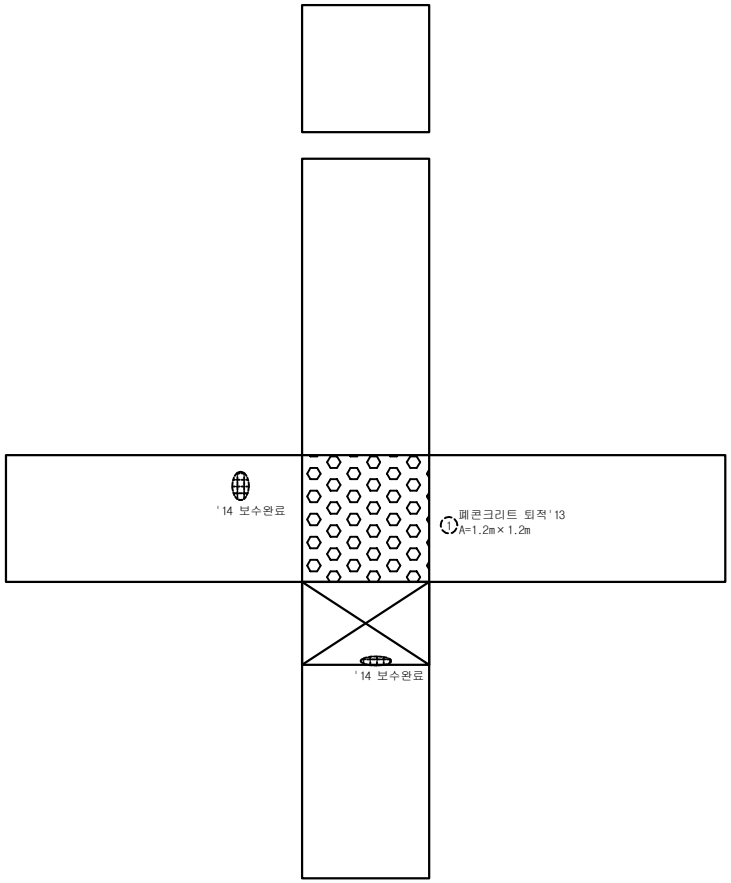

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	페콘크리트 퇴적	1.2	1.20		1.44	㎡	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 환기구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+200m ~ 3+220m)

KEYPLAN



SECTION



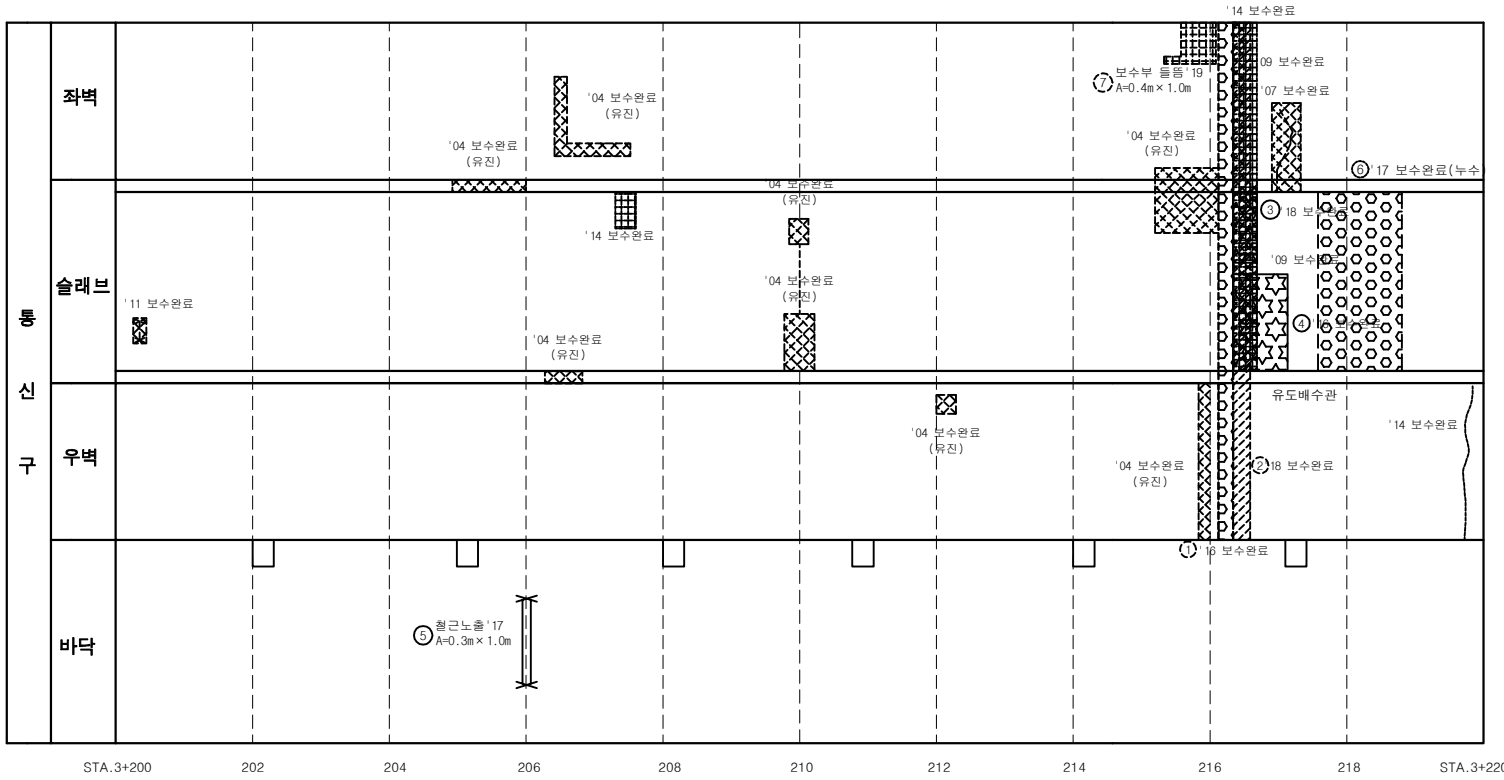

손 상 물 량 표

연번	적용년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2011	누수	0.2	7.00		1.40	㎡	1	2016	누수보수공법	1.68	
2	2013	유도배수관부식	0.2	7.00		1.40	㎡	1	2018	유도배수관교체	1.40	
3	2015	보수부 박태	0.3	1.00		0.30	㎡	1	2018	표면처리공법	0.36	
4	2015	누수,백태	1.5	2.00		3.00	㎡	1	2016	누수보수공법	3.60	
5	2017	철근노출	0.3	1.00		0.30	㎡	1			-	중요
6	2015	누수				5.61	㎡	1	2017	누수보수공법	6.73	
7	2019	보수부 들뜸	0.3	1.00		0.30	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+220m ~ 3+240m)

KEYPLAN



SECTION



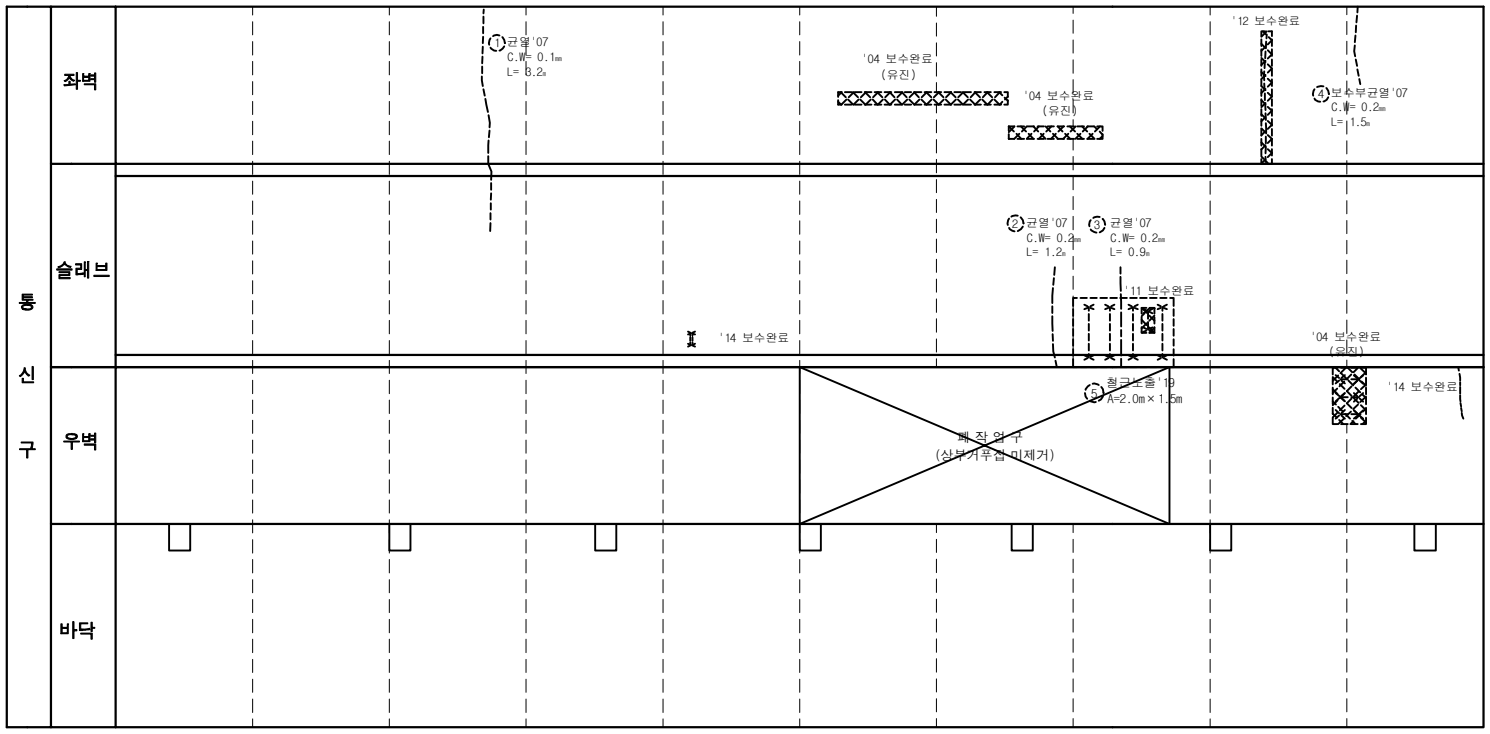

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.1	3.20		3.20	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	1.20		1.20	m	1			-	
3	2007	균열	0.2	0.90		0.90	m	1			-	
4	2007	균열	0.2	1.50		1.50	m	1			-	
5	2019	철근노출	2.0	1.50		3.00	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 폐 작업구 (순환선 3,230m)

KEYPLAN

SECTION

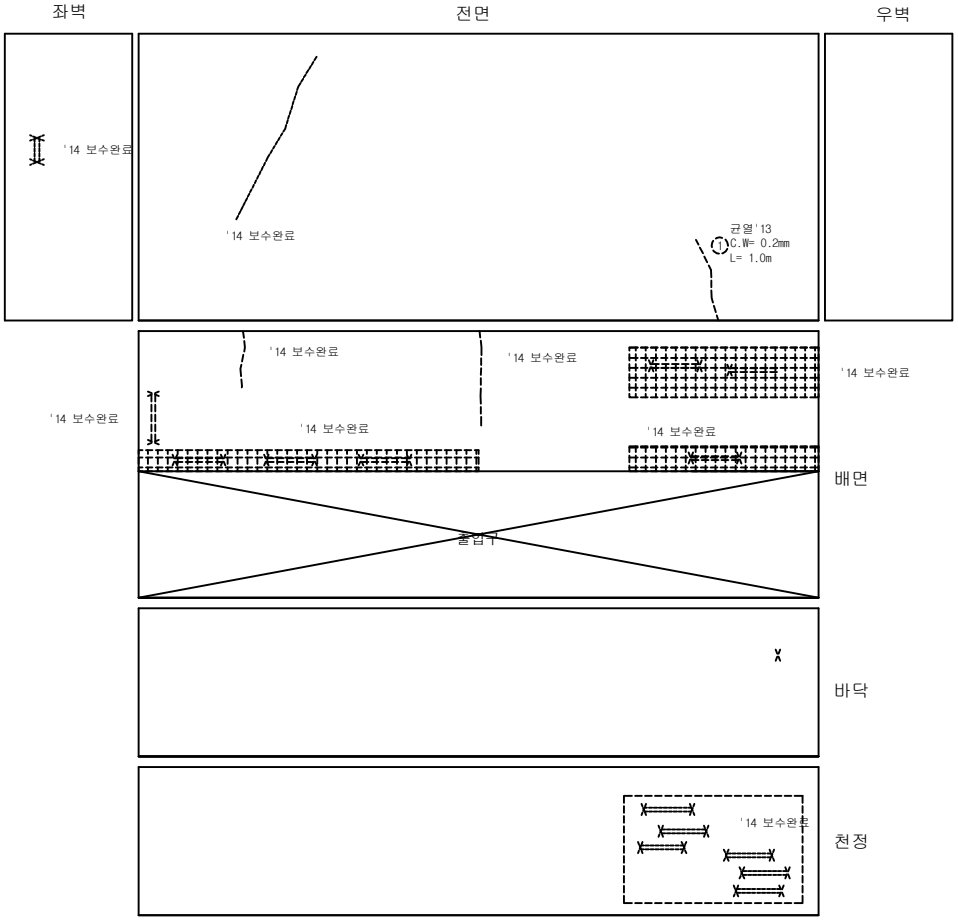

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **작업구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+240m ~ 3+260m)

KEYPLAN



SECTION



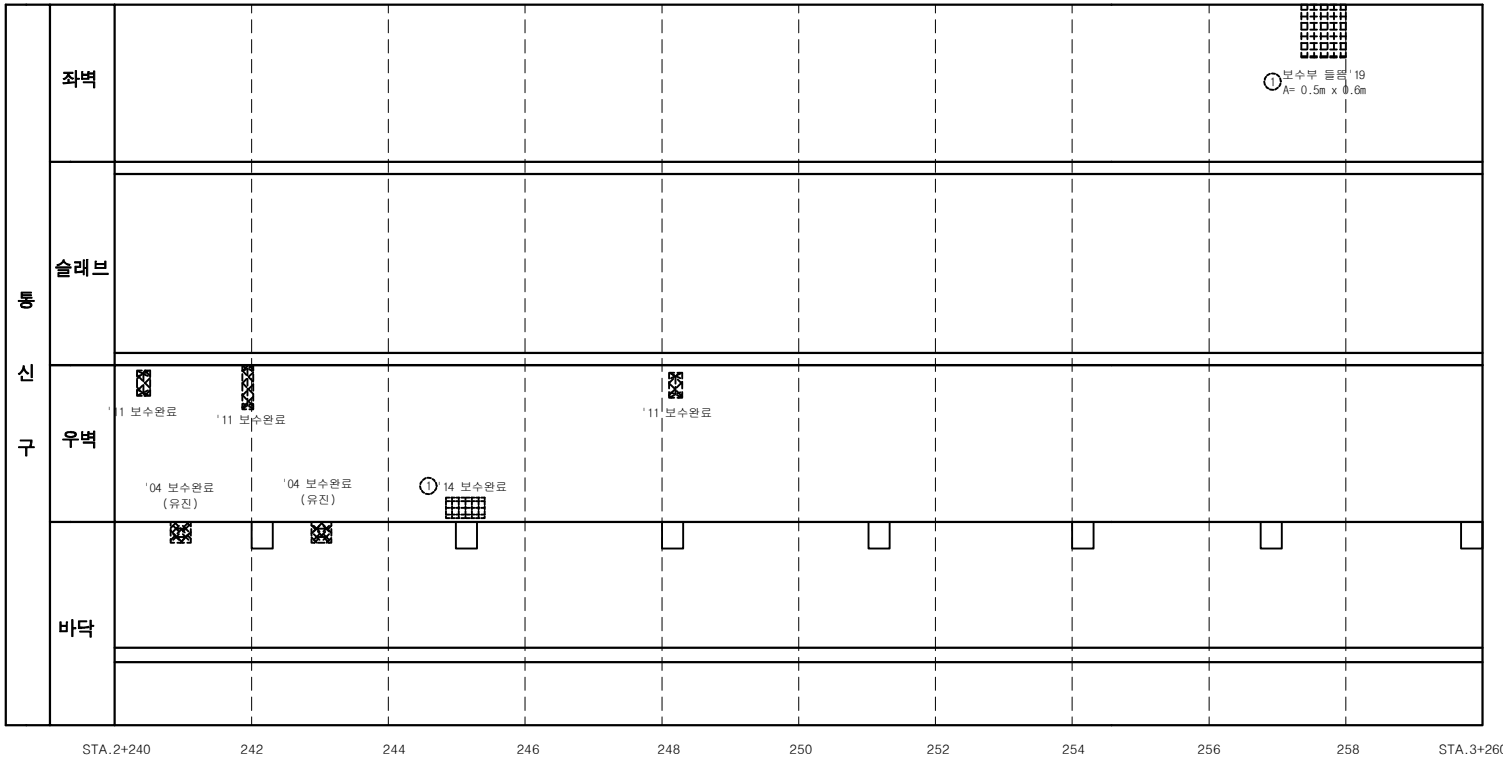

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2019	보수부 들뜸	0.5	0.60		0.30	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+260m ~ 3+280m)

KEYPLAN



SECTION



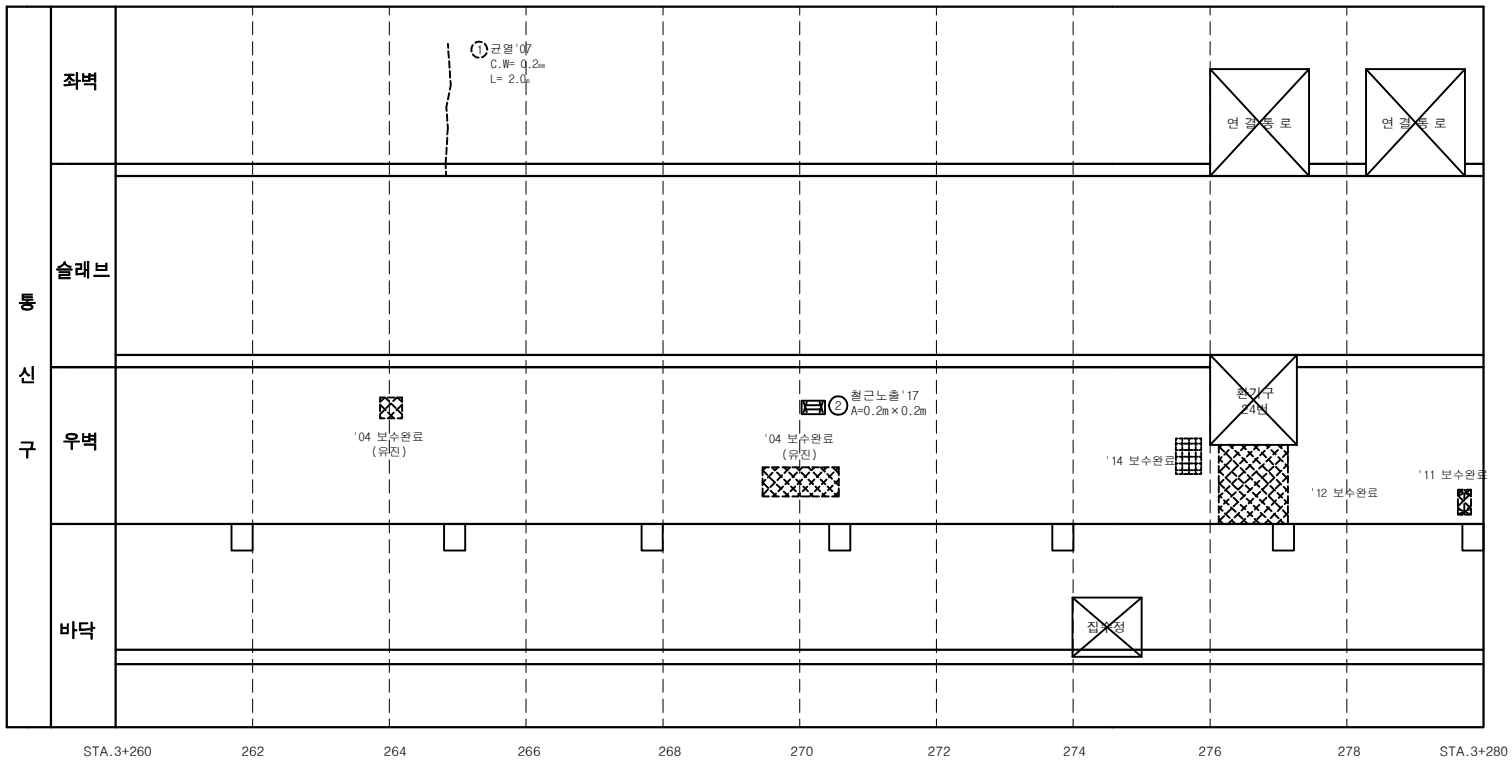

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
2	2017	철근노출	0.2	0.20		0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.05	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

환기구 24번 (순환선 3,270m)

KEYPLAN

SECTION



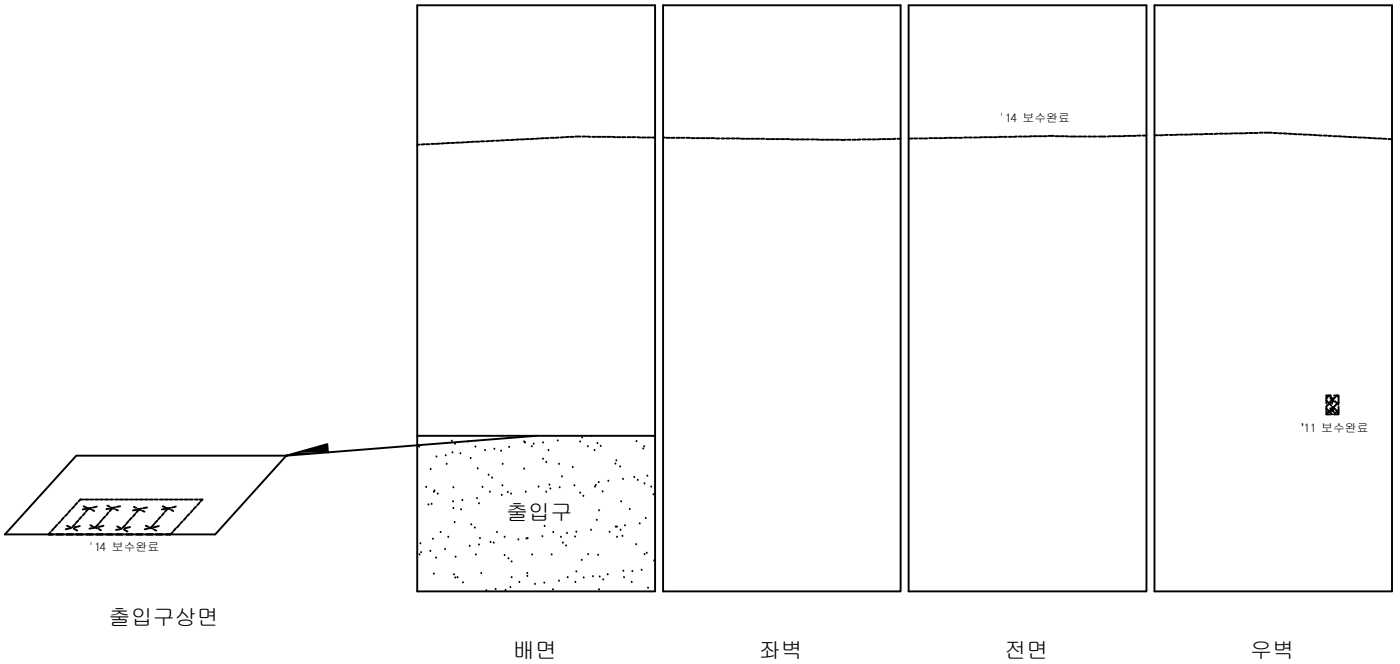

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+280m ~ 3+300m)

KEYPLAN



SECTION



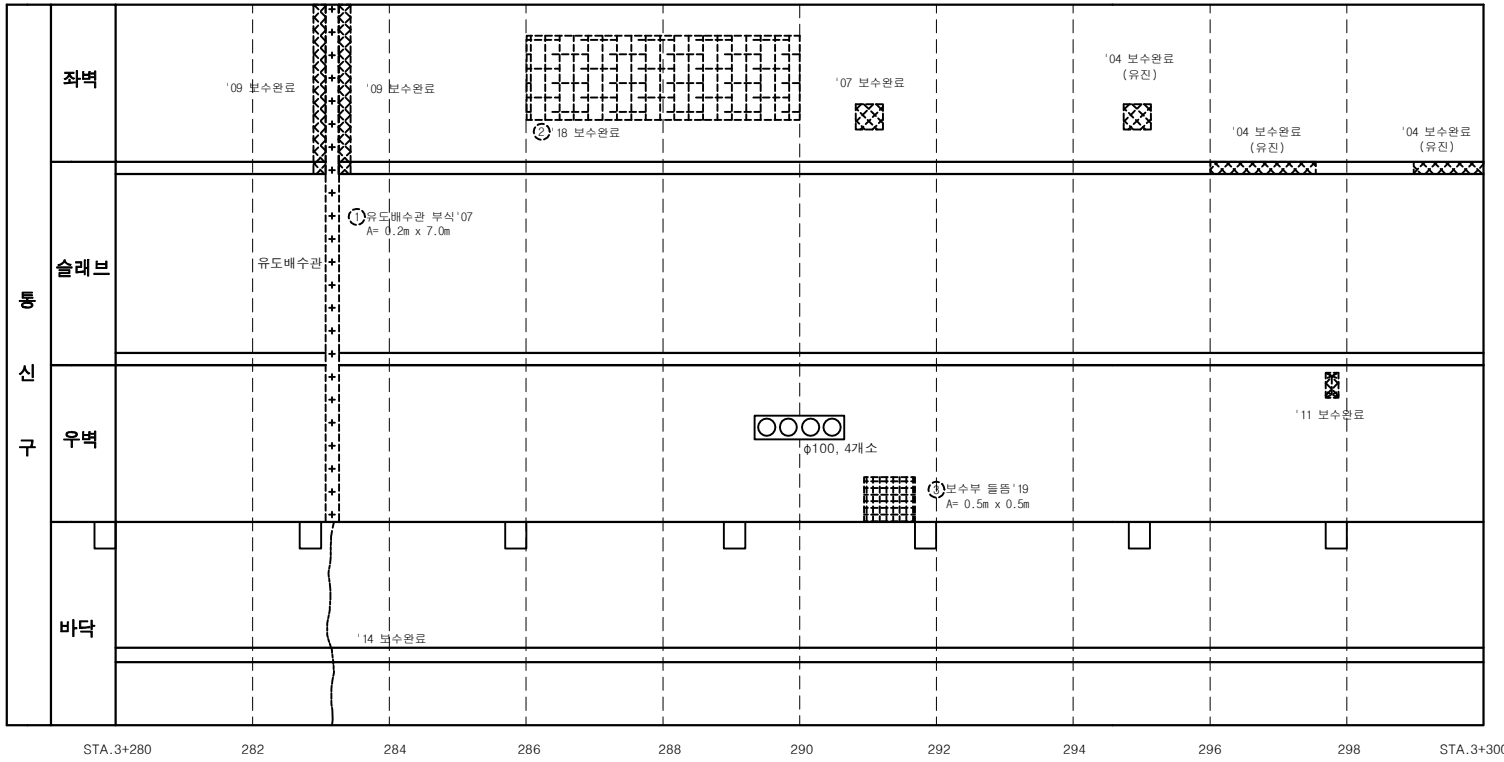

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	유도배수관부식	0.2	7.00		1.40	㎡	1			-	
2	2007	보수부 망상균열	1.5	4.00		6.00	㎡	1	2018	표면처리공법	7.20	
3	2019	보수부 들뜸	0.5	0.50		0.25	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+300m ~ 3+320m)

KEYPLAN



SECTION



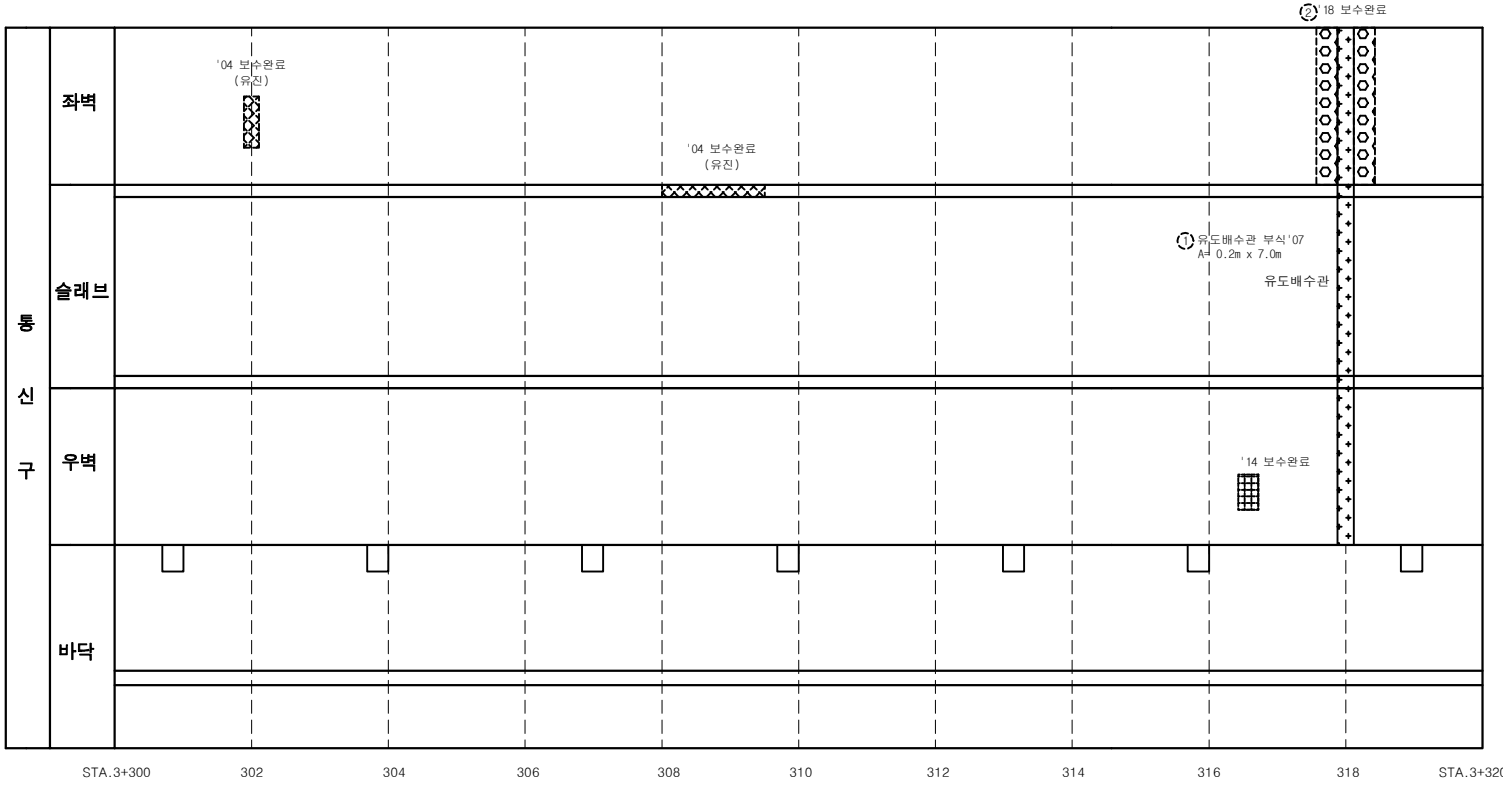

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	유도배수관부식	0.2	7.00		1.40	㎡	1			-	
2	2013	누수,백태	0.2	2.40		0.48	㎡	1	2018	표면누수보수	0.58	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+320m ~ 3+340m)

KEYPLAN



SECTION



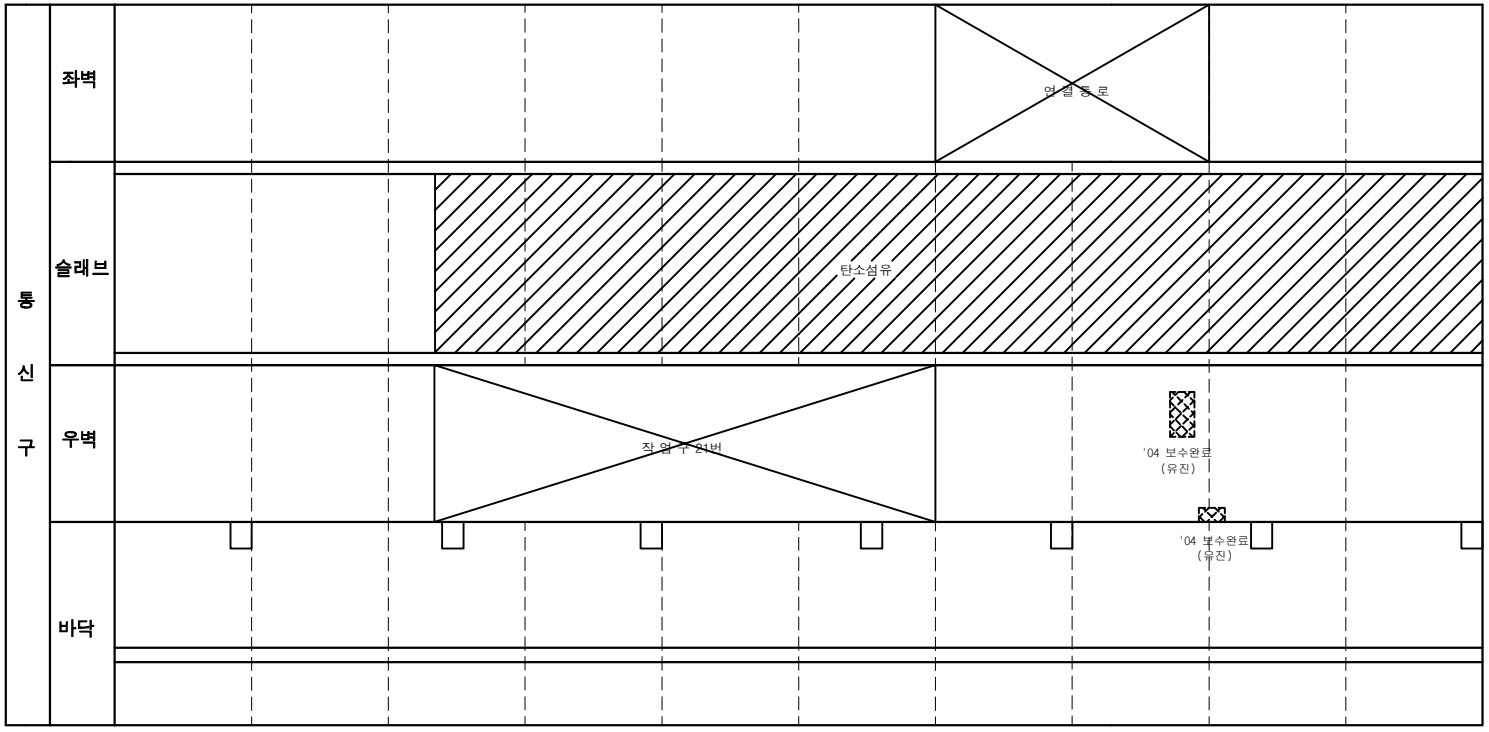

손상물량표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수면	공법명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 작업구 21번 (M Line 3,322m)

KEYPLAN

SECTION



전면

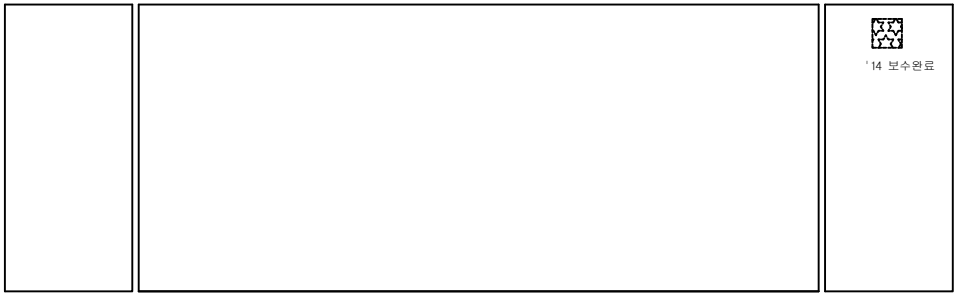

좌벽

우벽

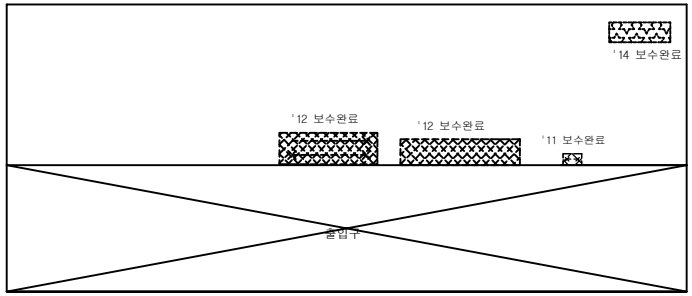

배면

바닥

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **작업구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+340m ~ 3+360m)

KEYPLAN



SECTION



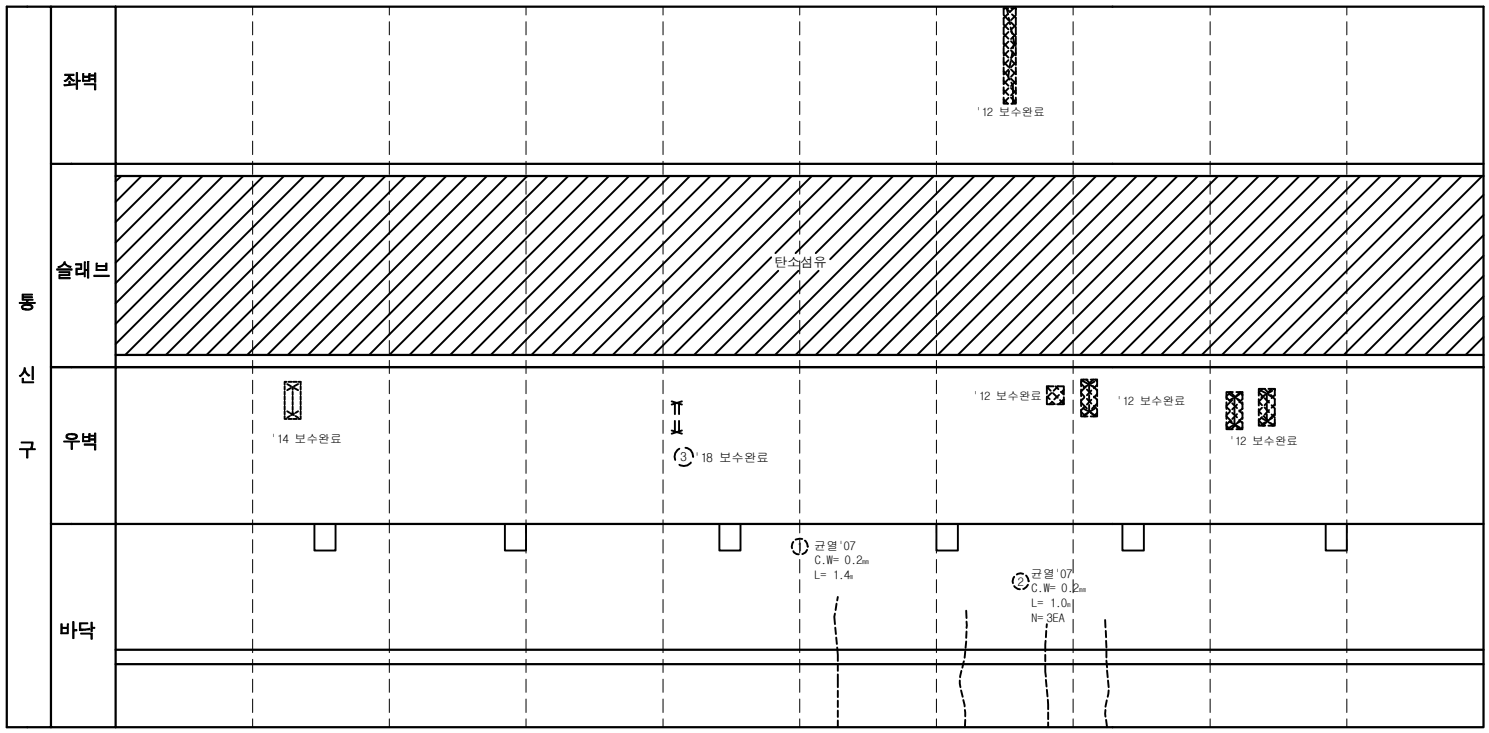

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	1.40		1.40	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	3.00		9.00	m	3			-	
3	2017	철근노출	0.1	0.40		0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.05	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+360m ~ 3+380m)

KEYPLAN



SECTION



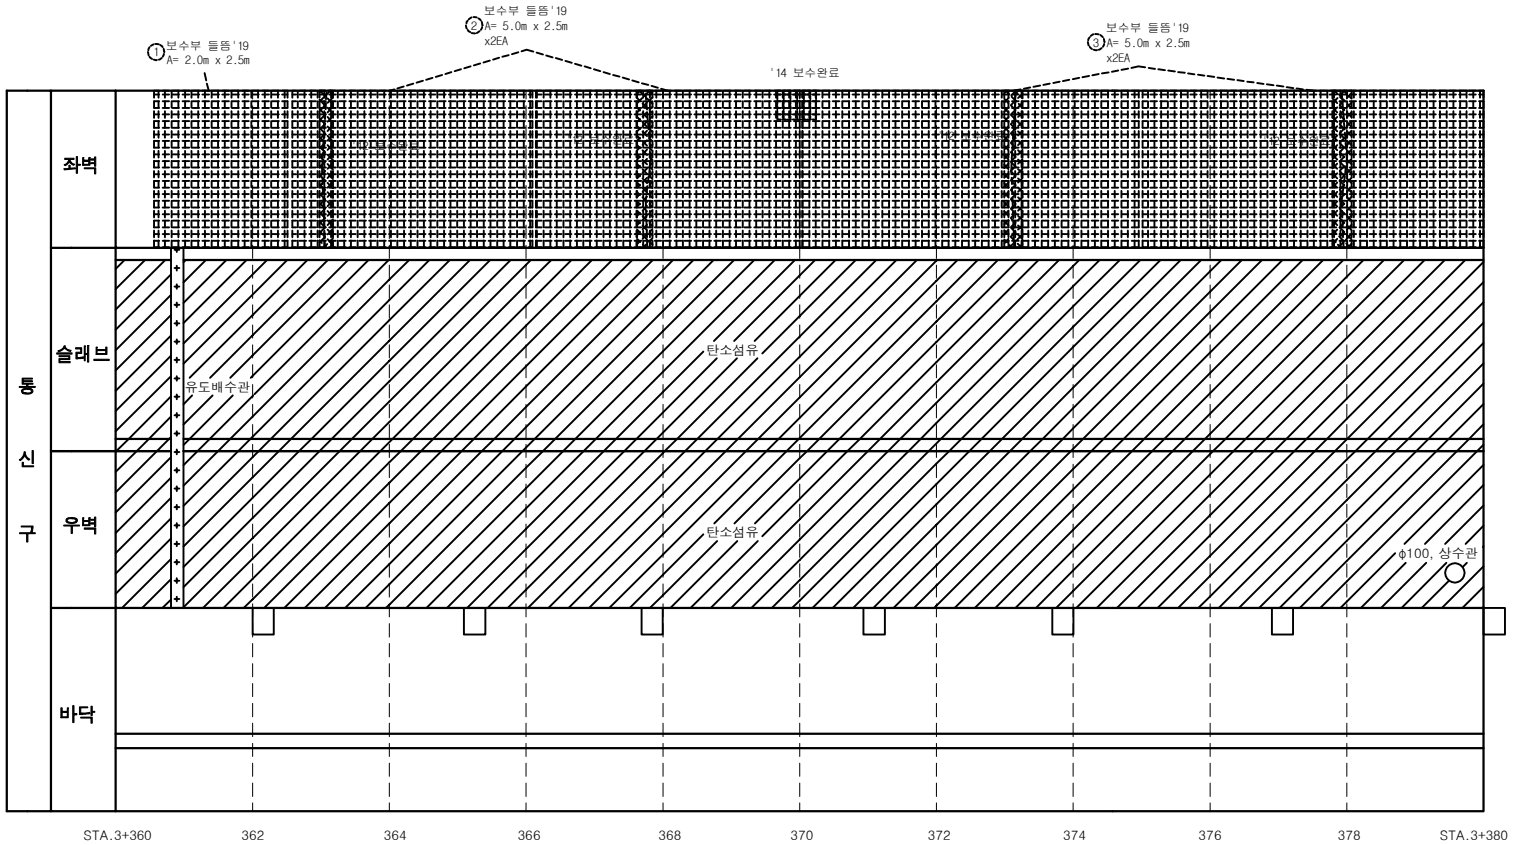

손상물량표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2019	보수부 들뜸	2.0	2.50		5.00	㎡	1			-	신규
2	2019	보수부 들뜸	5.00	2.50		25.00	㎡	2			-	신규
3	2019	보수부 들뜸	5.00	2.50		25.00	㎡	2			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+380m ~ 3+400m)

KEYPLAN



SECTION



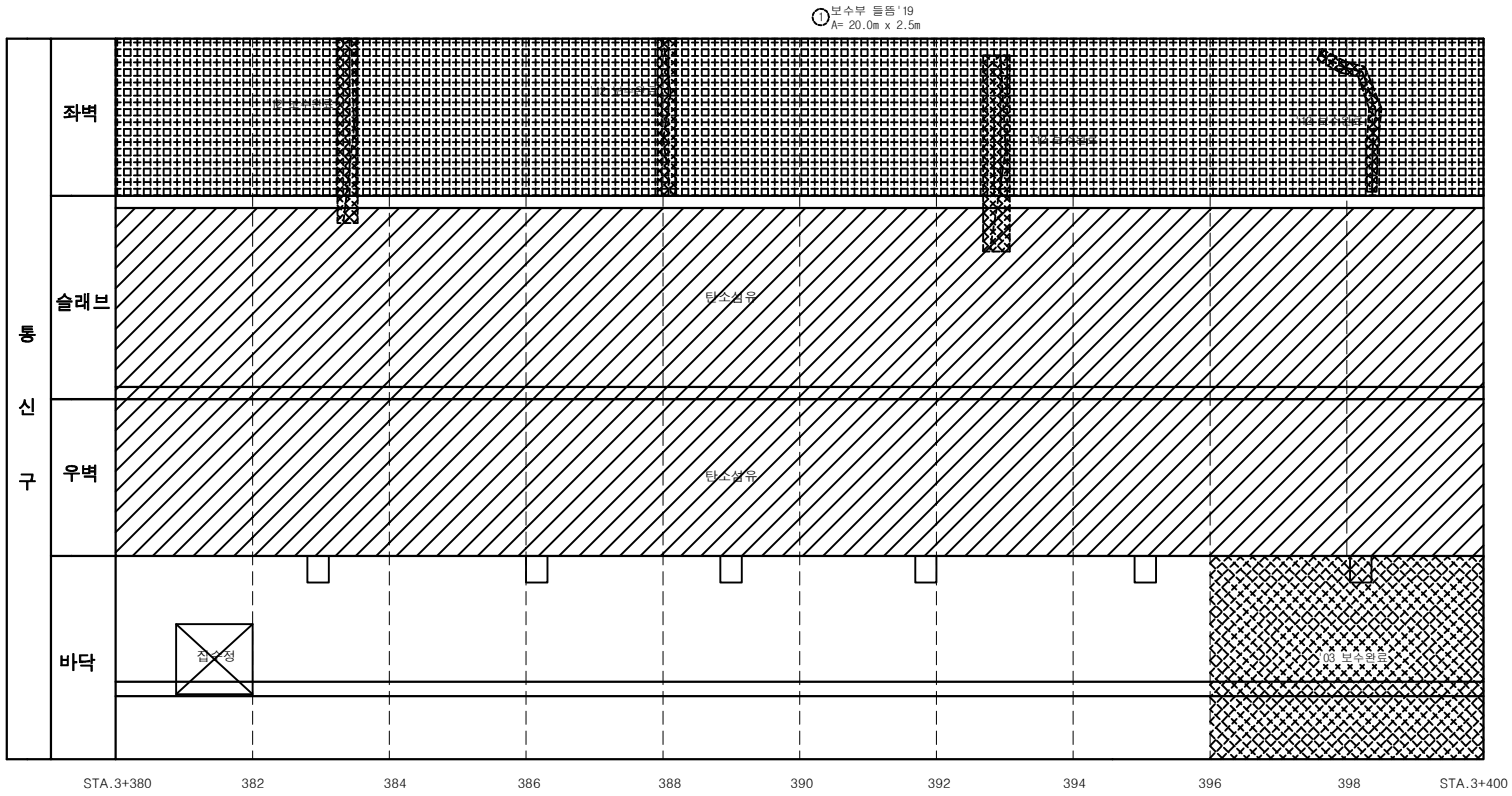

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2019	보수부 들뜸	20.00	2.50		50.00	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+400m ~ 3+420m)

KEYPLAN



SECTION



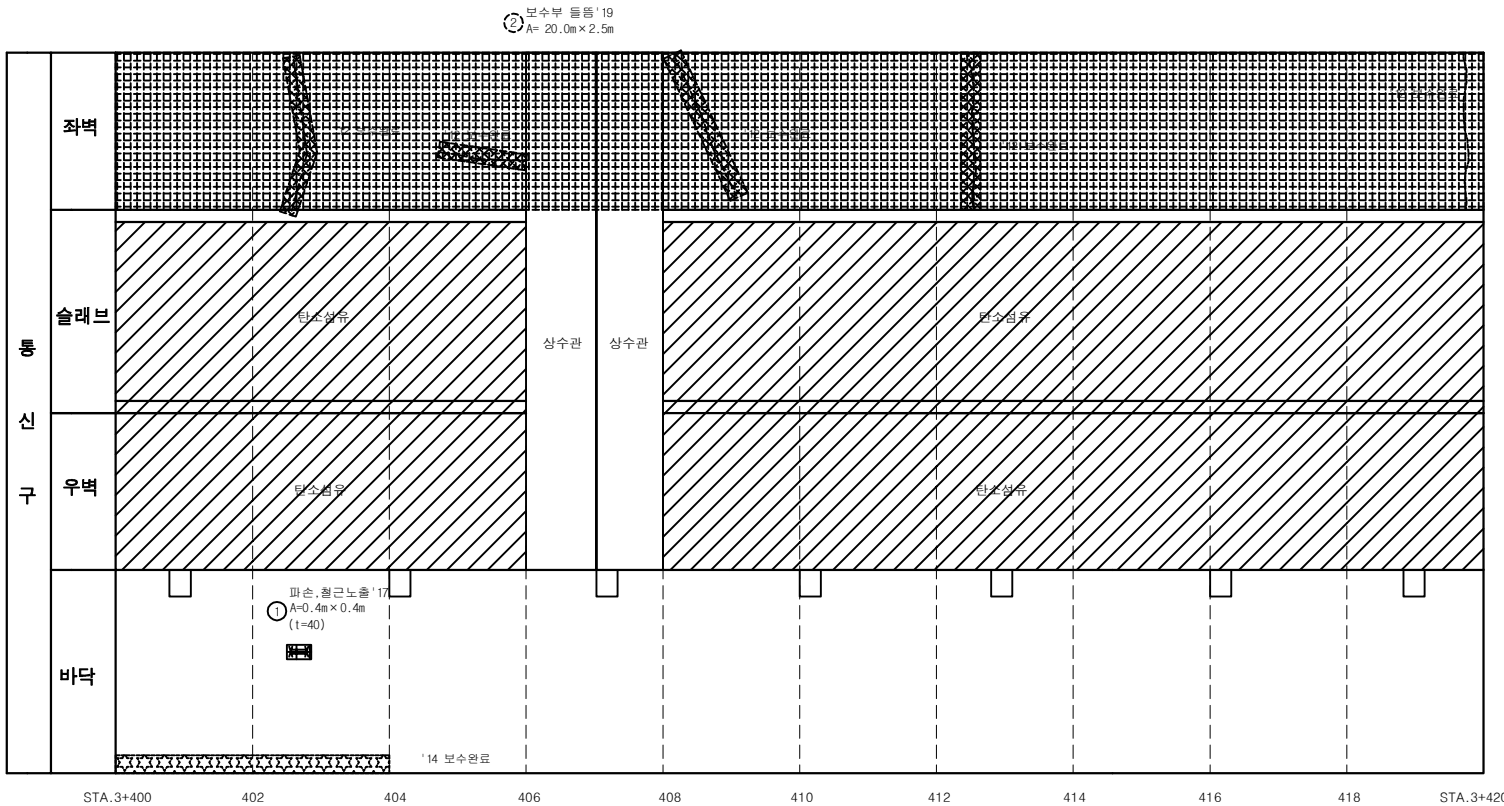

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2017	파손,철근노출	0.4	0.40		0.16	㎡	1			-	종요
2	2019	보수부 들뜸	20.0	2.50		50.00	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+420m ~ 3+440m)

KEYPLAN



SECTION



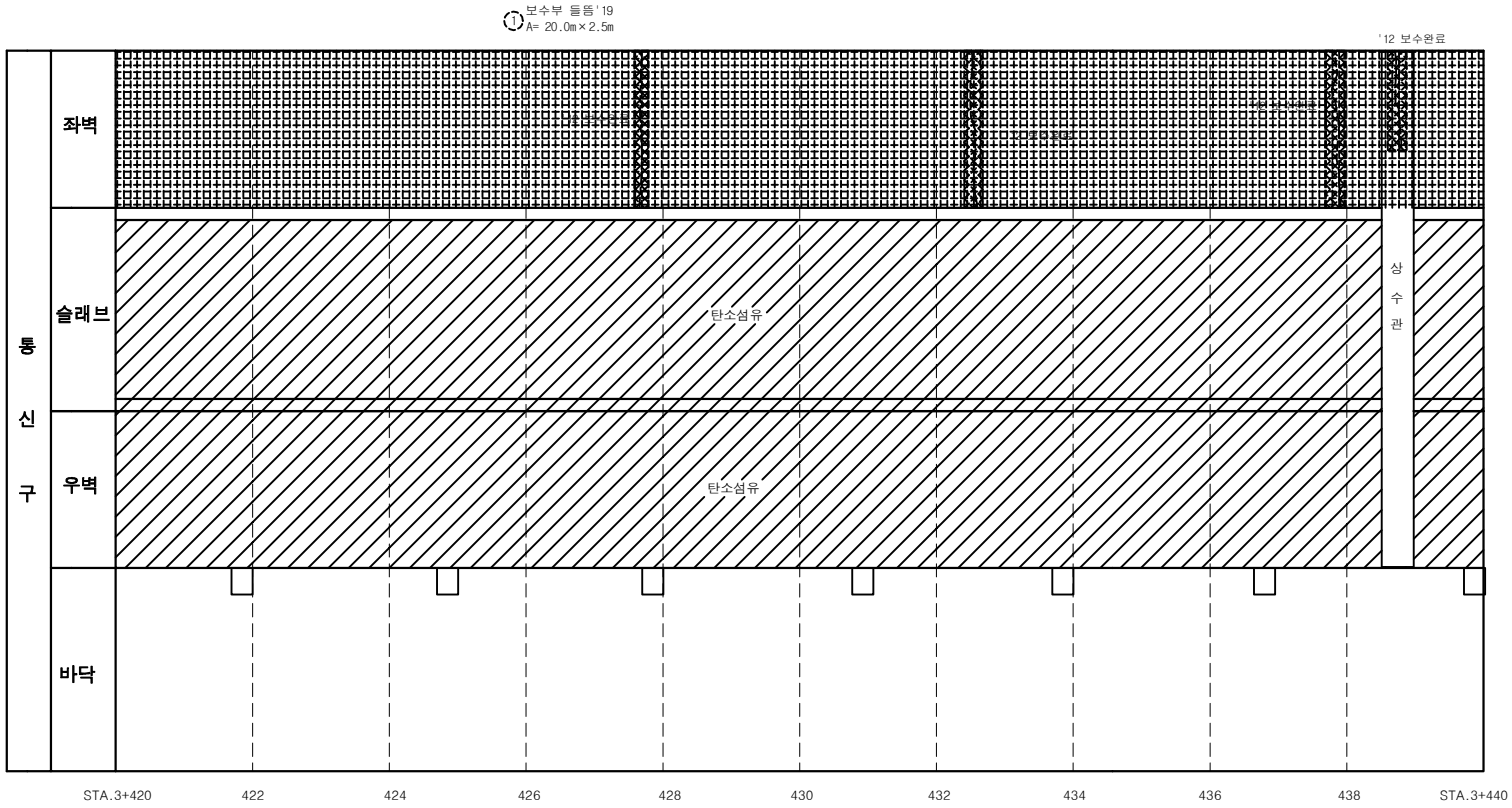

손상물량표

연번	적출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2019	보수부 들뜸	20.0	2.50		50.00	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+440m ~ 3+460m)

KEYPLAN



SECTION



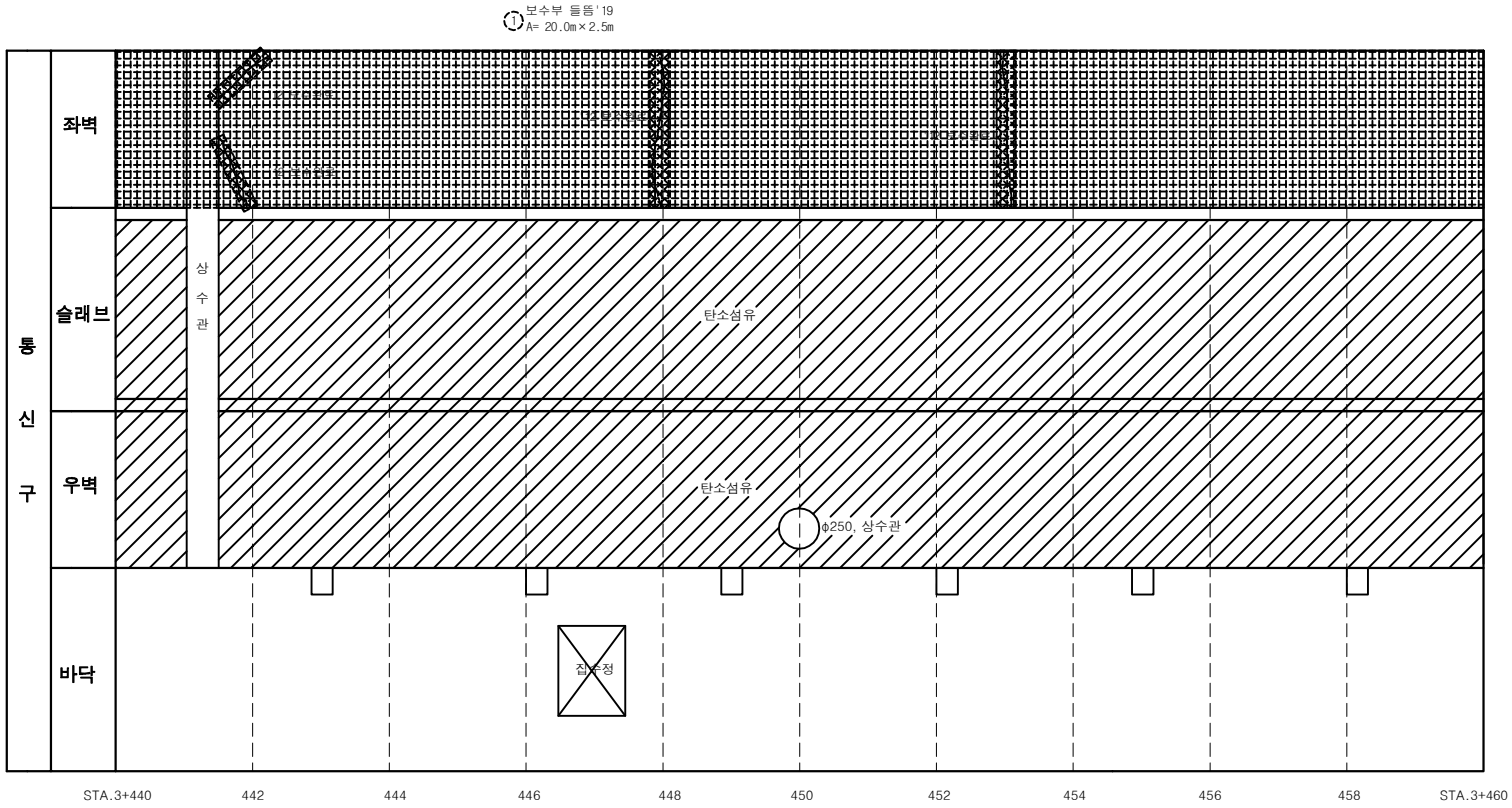

손상물량표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수면	공법명	물량	
1	2019	보수부 들뜸	20.0	2.50		50.00	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+460m ~ 3+480m)

KEYPLAN



SECTION



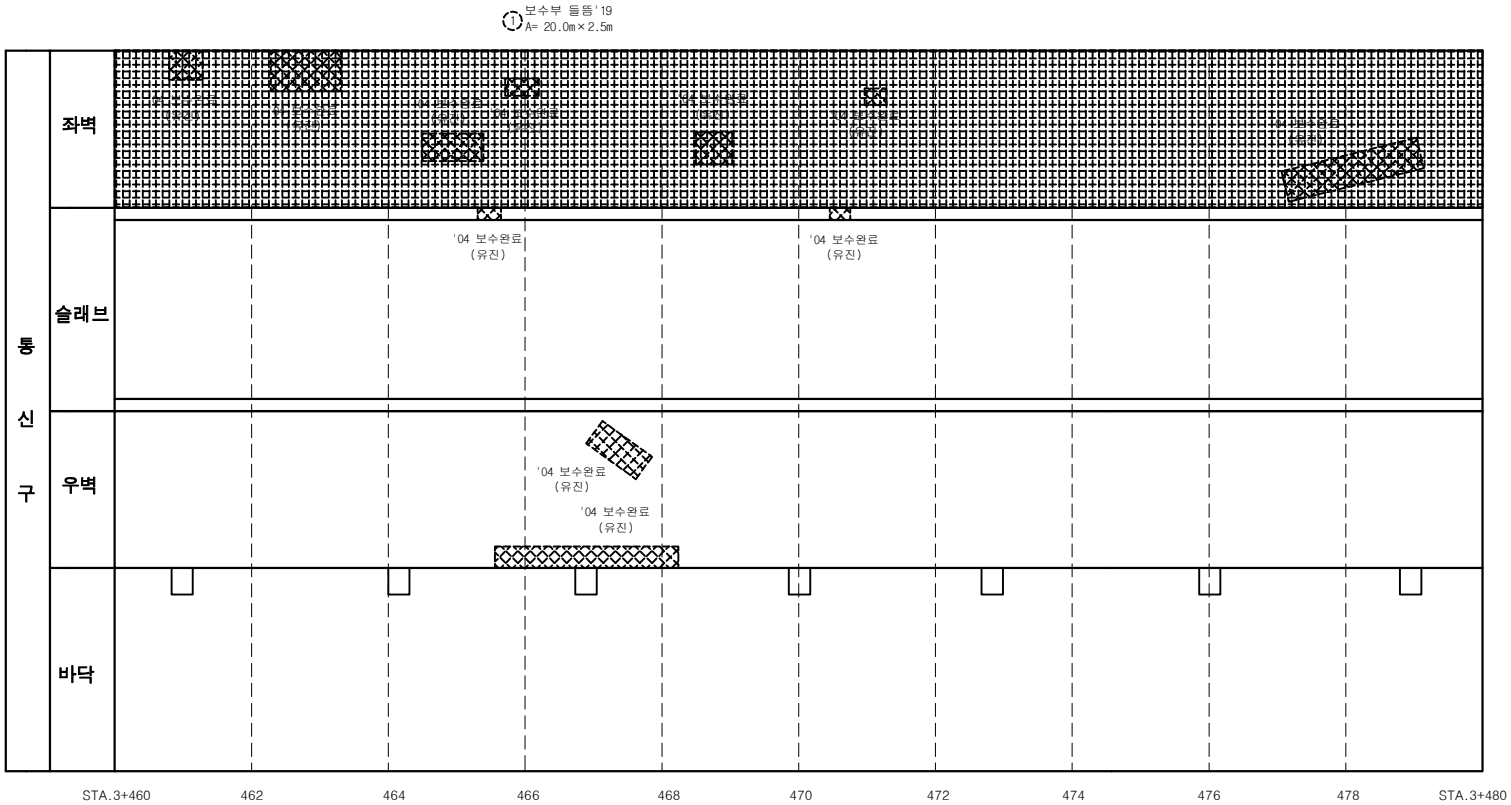

손상물량표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2019	보수부 들뜸	20.0	2.50		50.00	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+480m ~ 3+500m)

KEYPLAN



SECTION



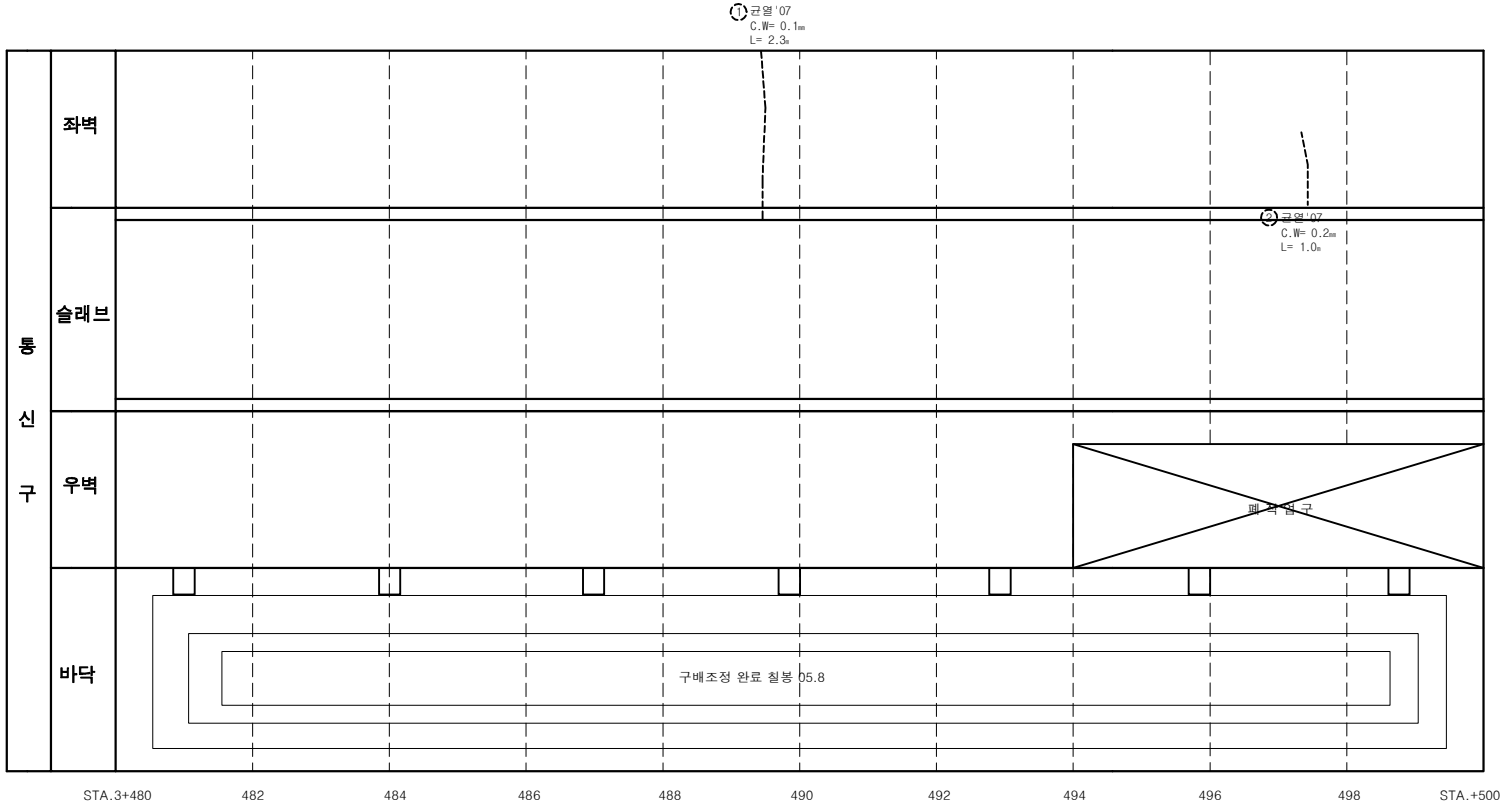

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.1	2.30		2.30	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 폐 작업구 (순환선 3,500m)

KEYPLAN

SECTION



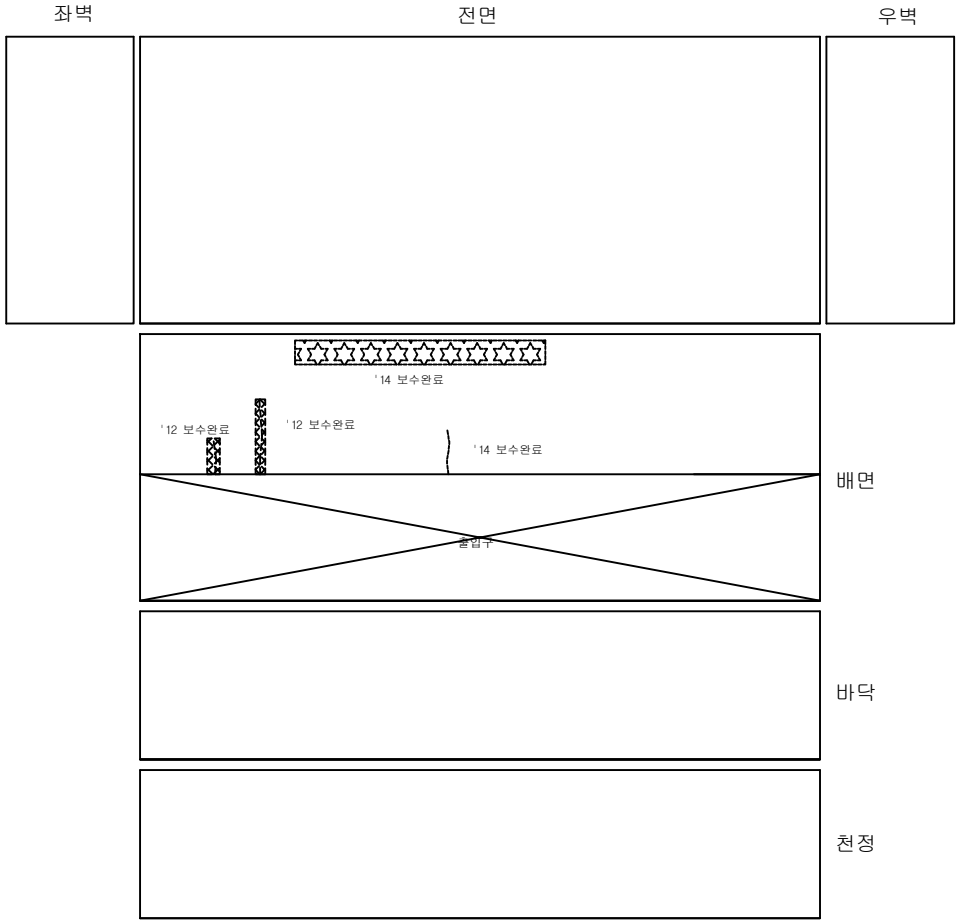

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+500m ~ 3+520m)





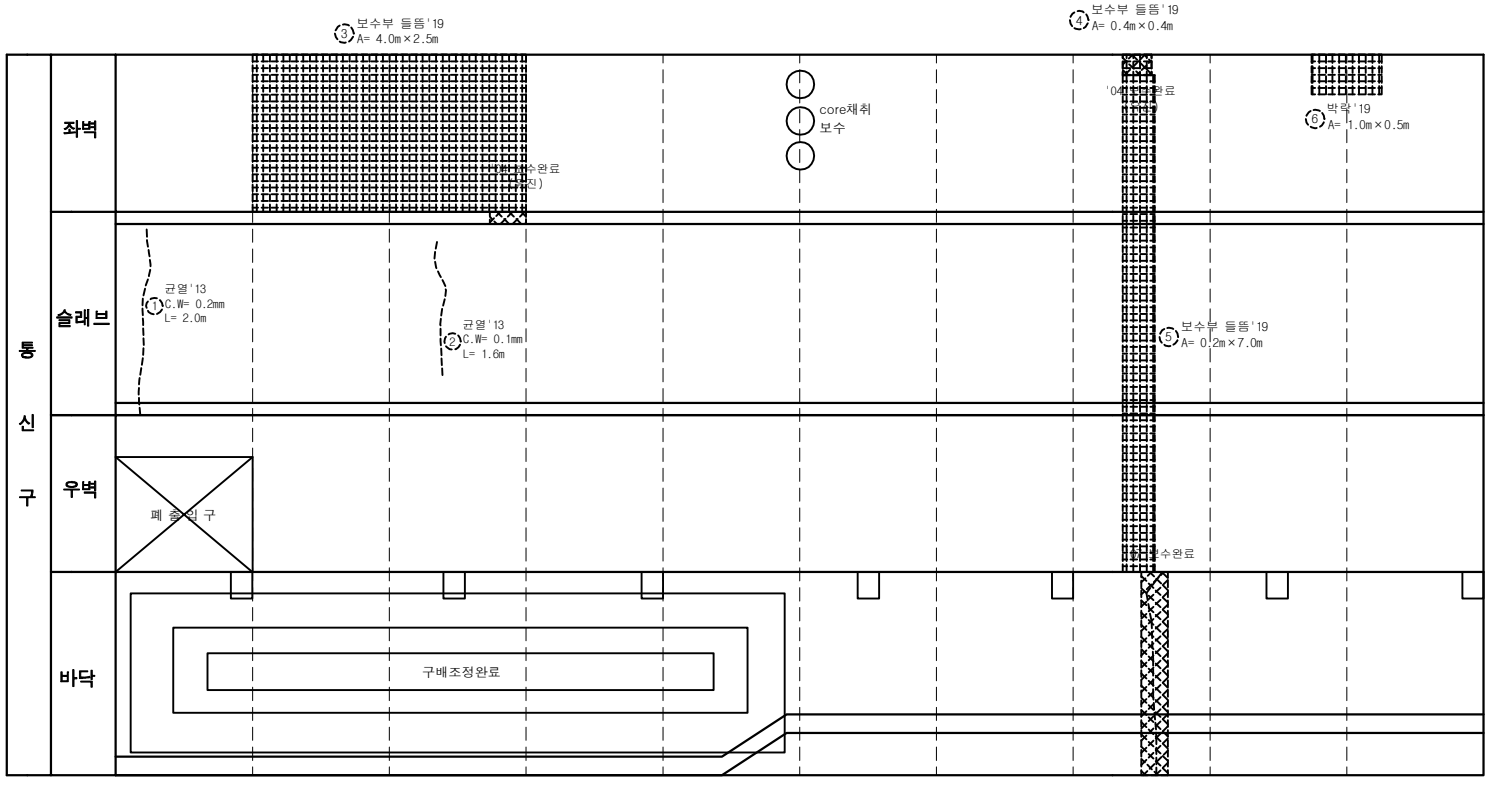

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수면	공법명	물량	
1	2013	균열	0.2		2.00	2.00	m	1			-	
2	2013	균열	0.1		1.60	1.60	m	1			-	
3	2019	보수부 들뜸	4.0	2.50		10.00	㎡	1			-	신규
4	2019	보수부 들뜸	0.4	0.40		0.16	㎡	1			-	신규
5	2019	보수부 들뜸	0.2	7.00		1.40	㎡	1			-	신규
6	2019	박락	1.0	0.50		0.50	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+520m ~ 3+540m)

KEYPLAN



SECTION



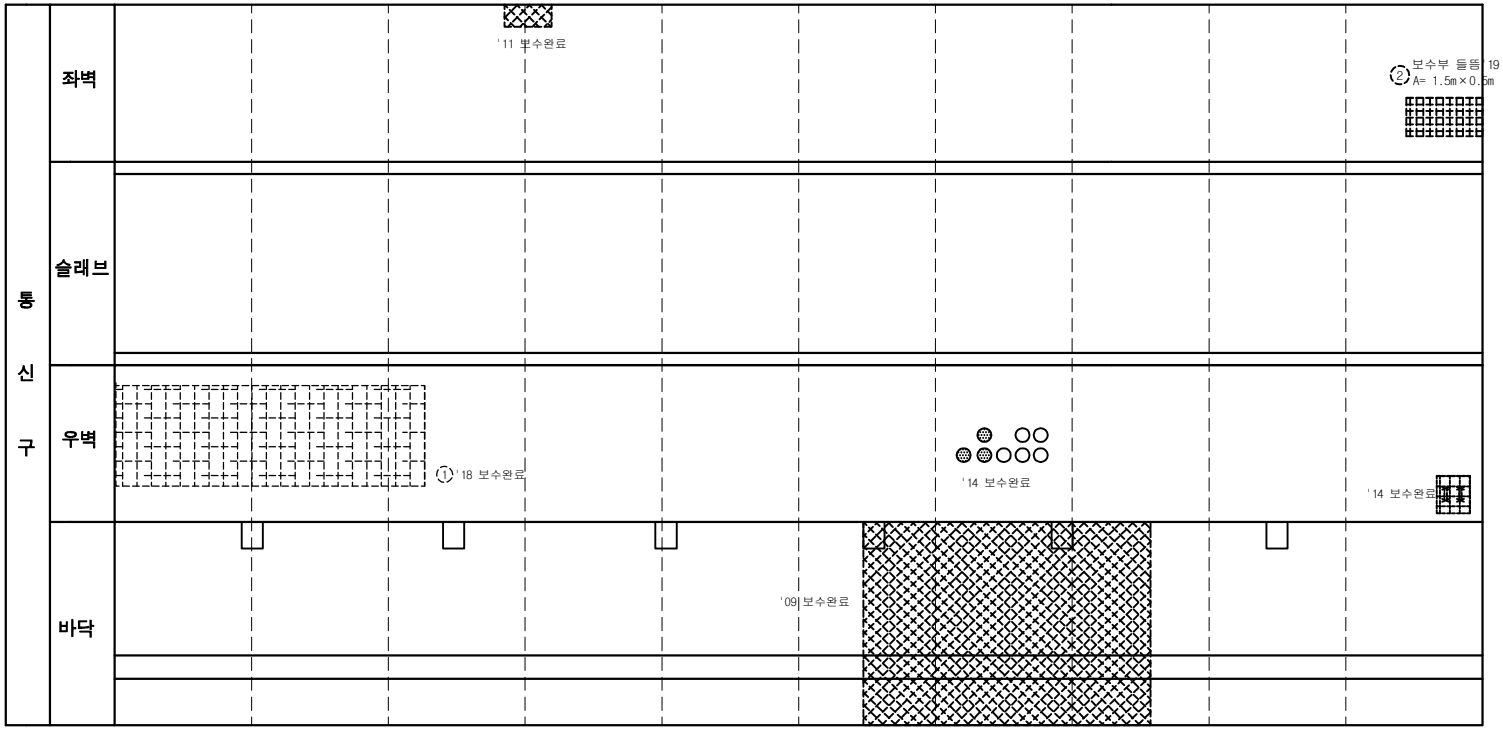

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2009	보수부 망상균열	1.5	5.00		7.50	㎡	1	2018	표면처리공법	9.00	
2	2019	보수부 들뜸	1.5	0.50		0.75	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+540m ~ 3+560m)

KEYPLAN



SECTION



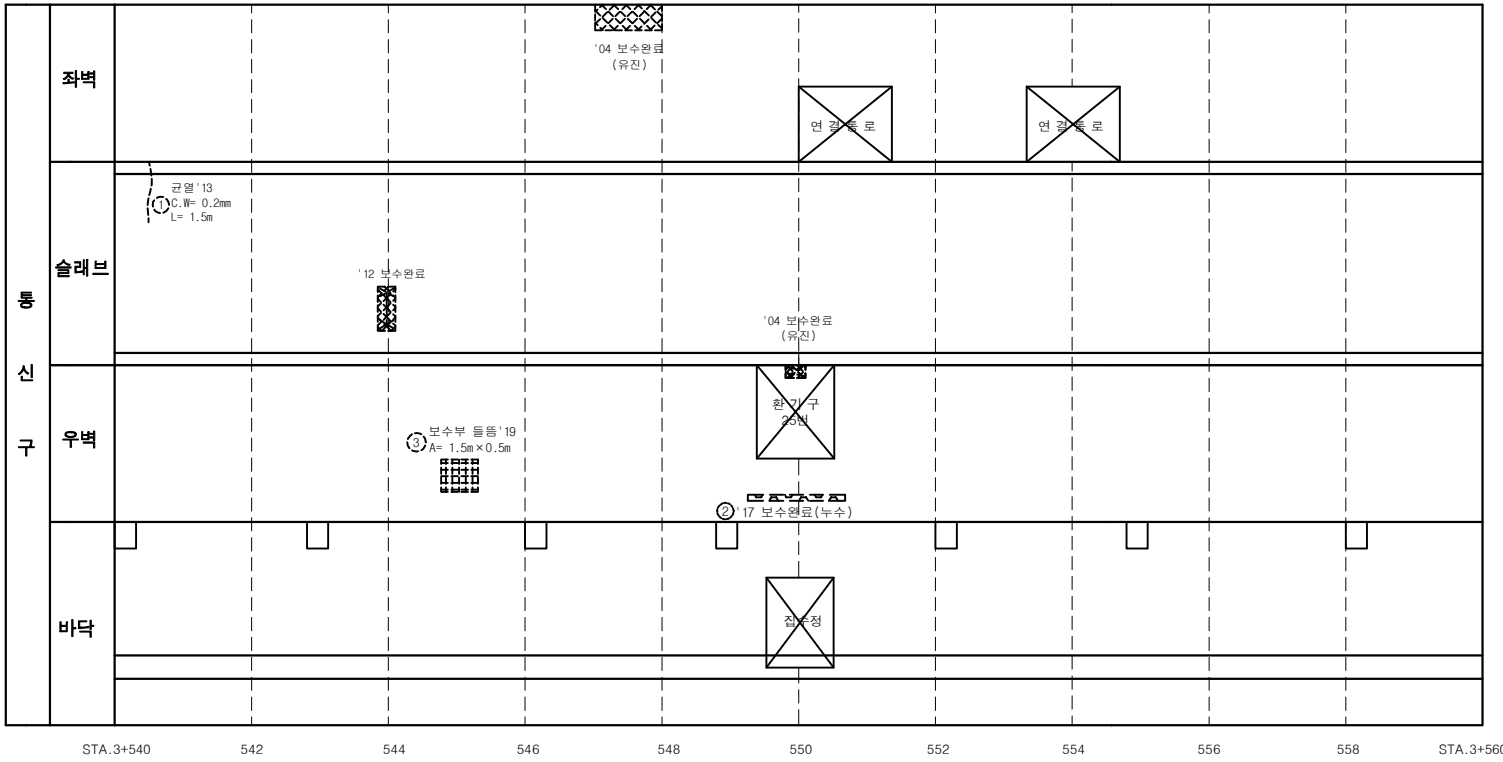

손상물량표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.2	1.50		1.50	m	1			-	
2	2007	누수				2.00	m	1	2017	누수보수공법	2.40	
3	2019	보수부 들뜸	0.4	0.40		0.16	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

환기구 25번 (순환선 3,546m)

KEYPLAN

SECTION





출입구 상면

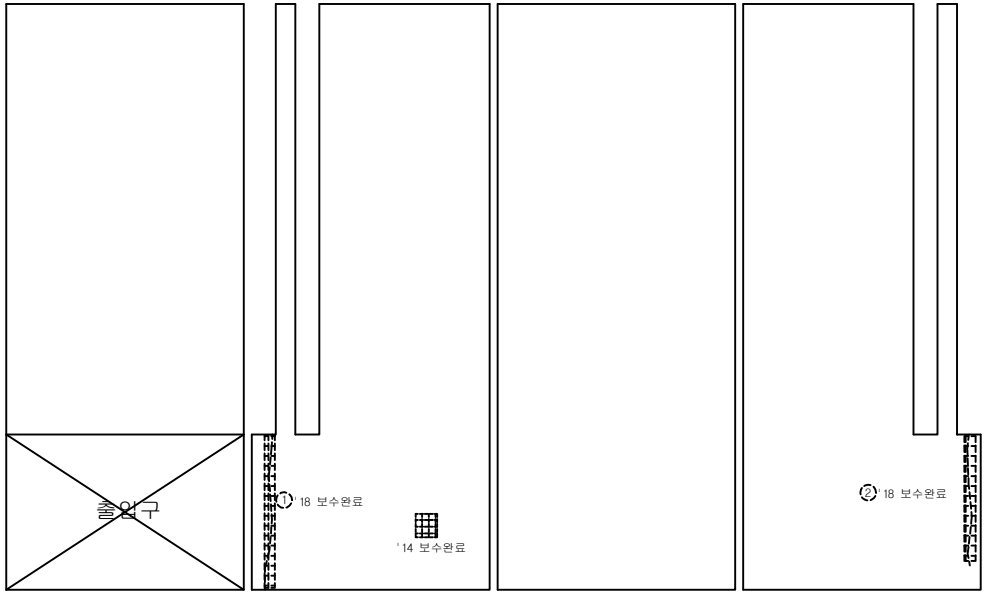

배면 좌벽 전면 우벽

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	보수부 박리	0.1	1.50		0.15	㎡	1	2018	단면복구공법	0.18	
2	2007	보수부 박리	0.1	1.50		0.15	㎡	1	2018	단면복구공법	0.18	

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)

TITLE OF SHIFT

환기구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+560m ~ 3+580m)





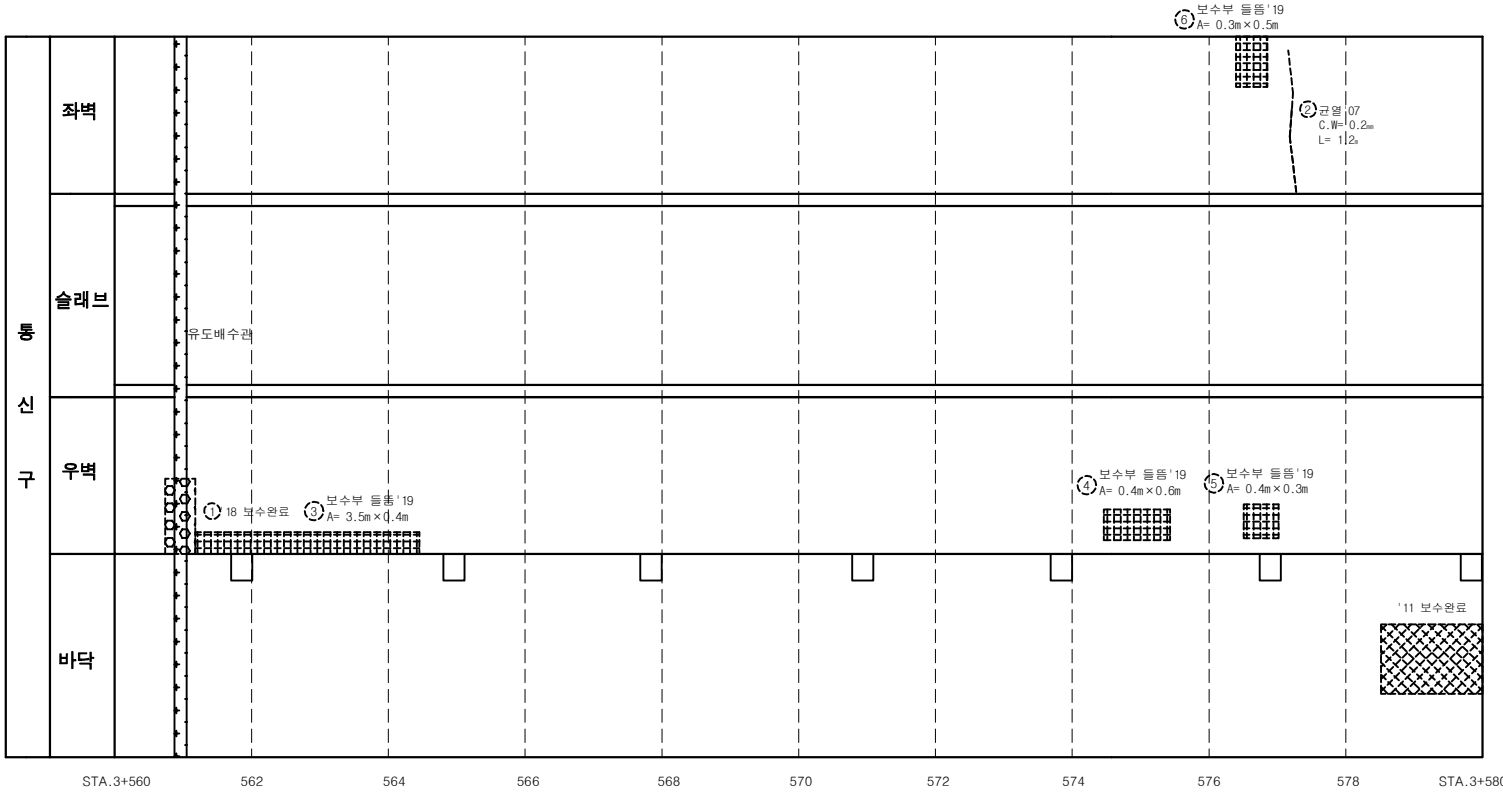

손상물량표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2011	누수	0.2	1.00		0.20	㎡	1	2018	패면누수보수	0.24	
2	2007	균열	0.2	1.20		1.20	m	1			-	
3	2019	보수부 들뜸	3.5	0.40		1.40	㎡	1			-	신규
4	2019	보수부 들뜸	0.4	0.60		0.24	㎡	1			-	신규
5	2019	보수부 들뜸	0.4	0.30		0.12	㎡	1			-	신규
6	2019	보수부 들뜸	0.3	0.50		0.15	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+580m ~ 3+600m)

KEYPLAN



SECTION



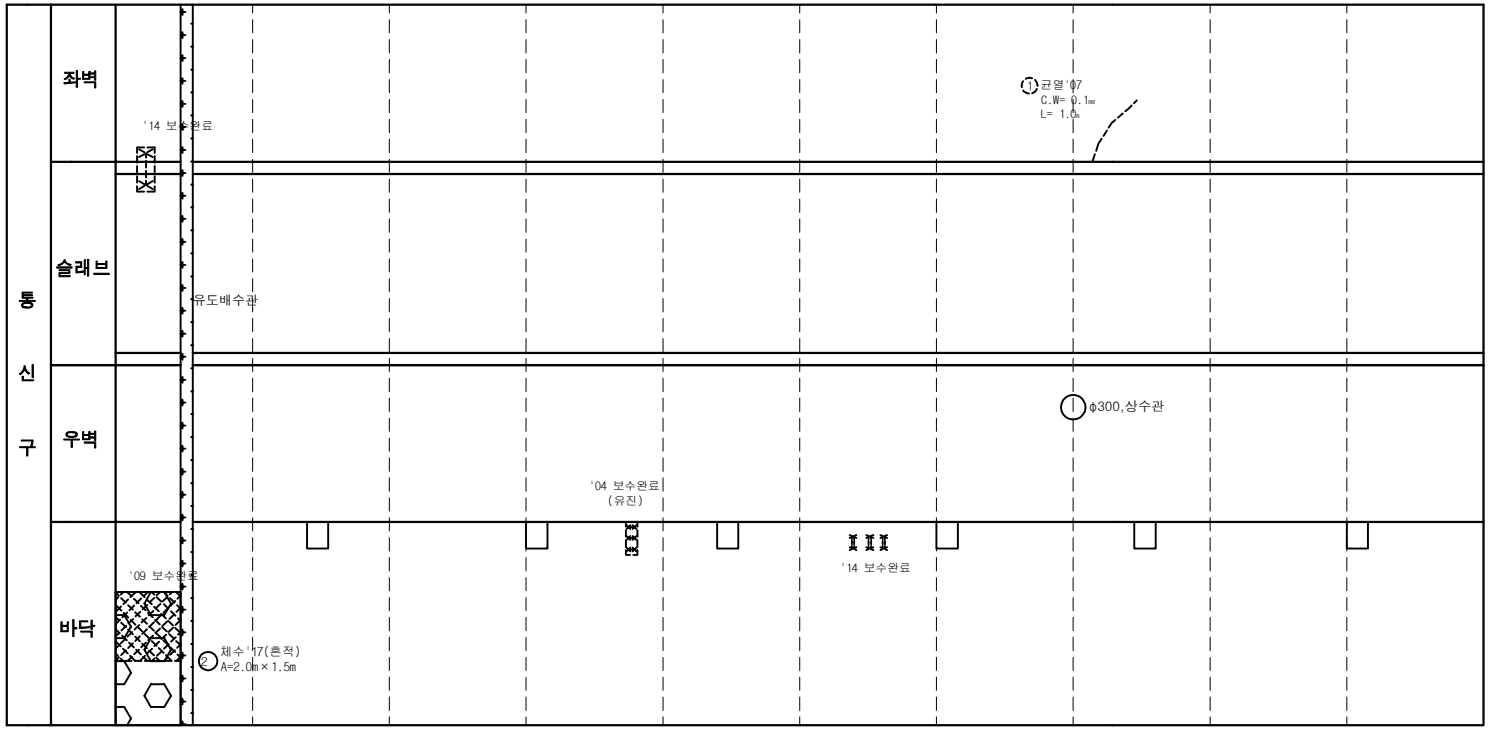

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.1	1.00		1.00	m	1			-	
2	2017	체수	2.0	1.50		3.00	㎡	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+600m ~ 3+620m)

KEYPLAN



SECTION



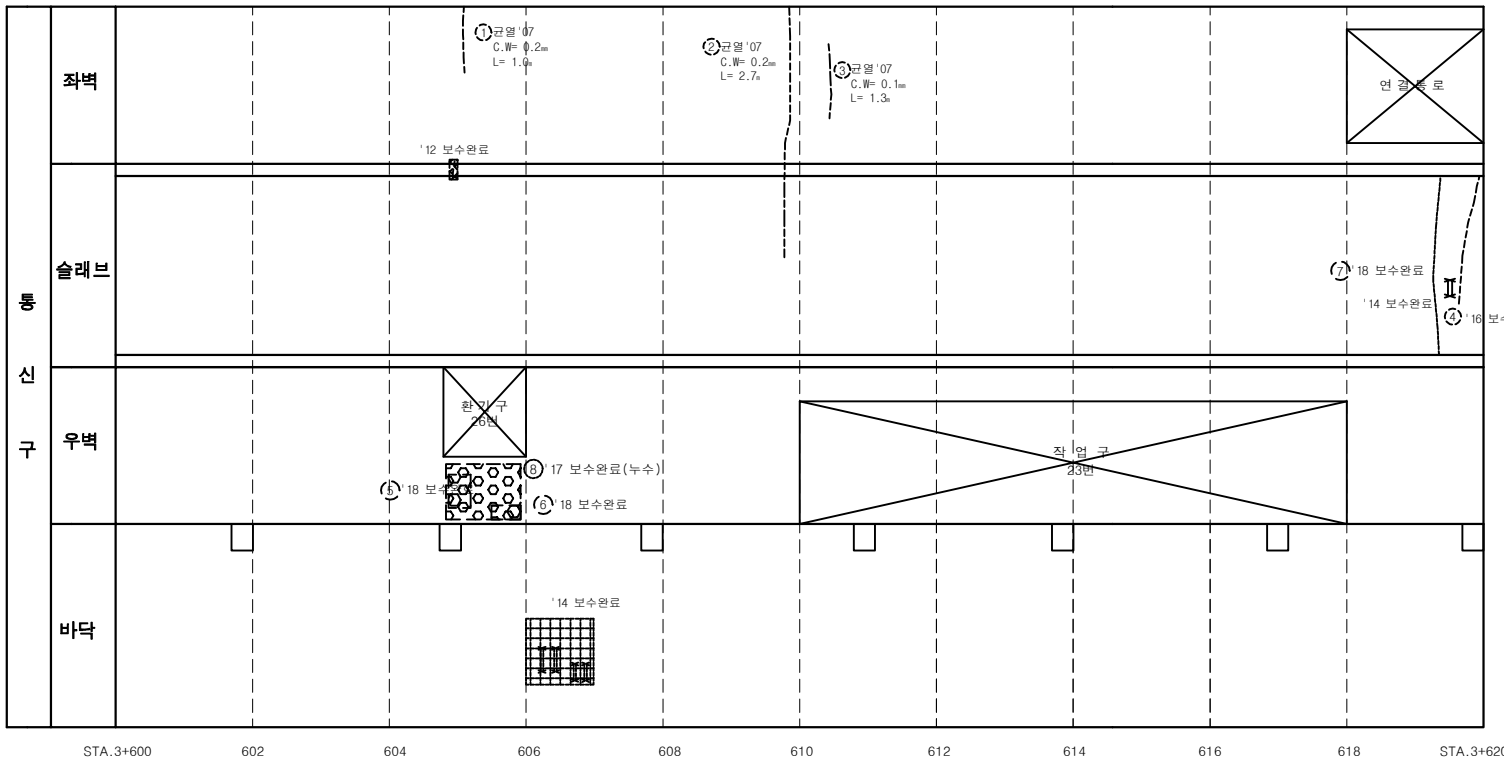

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2		1.00	1.00	m	1			-	
2	2007	균열	0.2		2.70	2.70	m	1			-	
3	2007	균열	0.1		1.30	1.30	m	1			-	
4	2013	균열	0.3		1.30	1.30	m	1	2016	주입보수공법	1.56	
5	2017	누수			1.00	1.00	m	1	2018	습식균열보수	1.20	
6	2017	누수			0.50	0.50	m	1	2018	습식균열보수	0.60	
7	2017	철근노출		0.1	0.40	0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.05	
8	2017	누수				1.05	㎡	1	2017	누수보수공법	1.26	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

환기구 26번 (순환선 3,600m)

KEYPLAN

SECTION



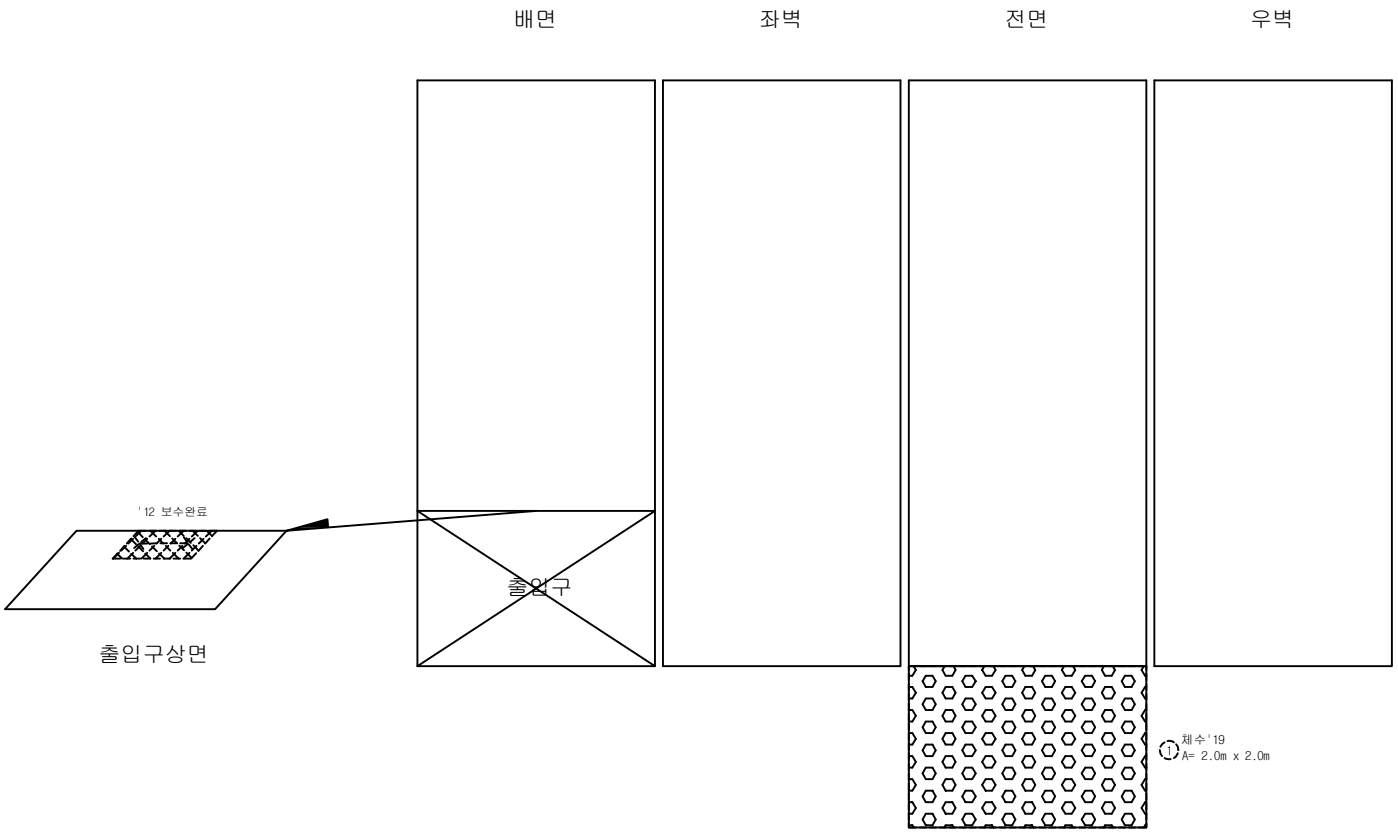

손 상 물 량 표

연번	적용년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2019	체수	2.0	2.00		4.00	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **환기구 외관조사망도**

여의도 공동구 작업구 23번 (순환선 3,610m)

KEYPLAN

SECTION



전면

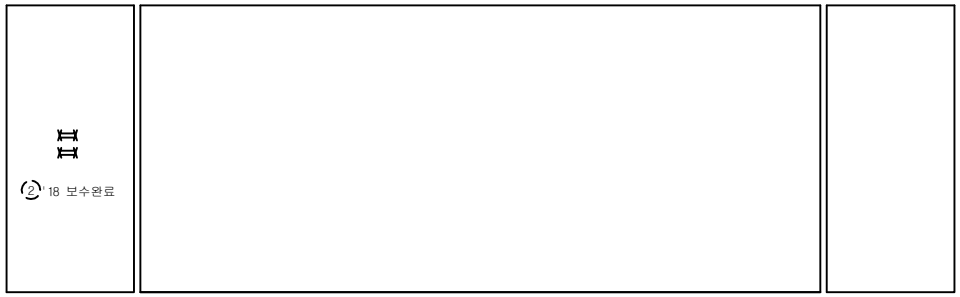

좌벽

우벽

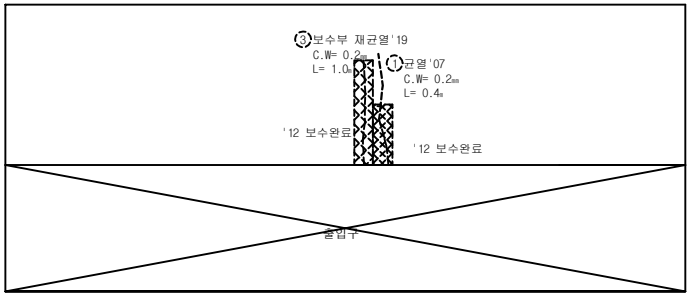

배면

바닥

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	0.40		0.40	m	1			-	
2	2017	철근노출	0.2	0.40		0.16	㎡	2	2018	단면복구(방청)	0.19	
3	2019	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	신규

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)

TITLE OF SHIFT

작업구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+620m ~ 3+640m)

KEYPLAN



SECTION



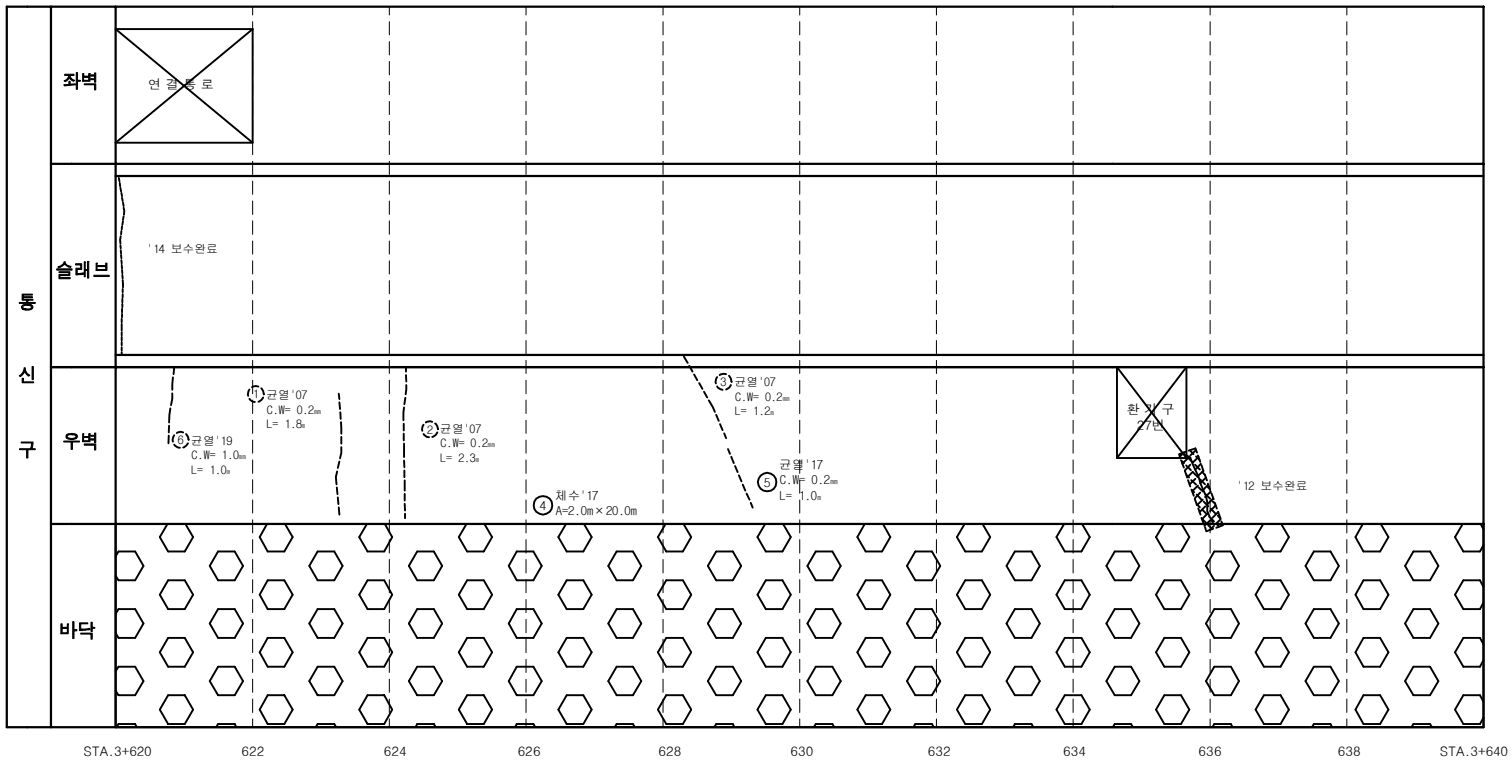

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	1.80		1.80	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	2.30		2.30	m	1			-	
3	2007	균열	0.2	2.50		2.50	m	1			-	
4	2017	체수	2.0	20.00		40.00	㎡	1			-	
5	2017	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	
6	2019	균열	1.0	1.00		1.00	m	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

환기구 27번 (순환선 3,632m)

KEYPLAN

SECTION



슬래브

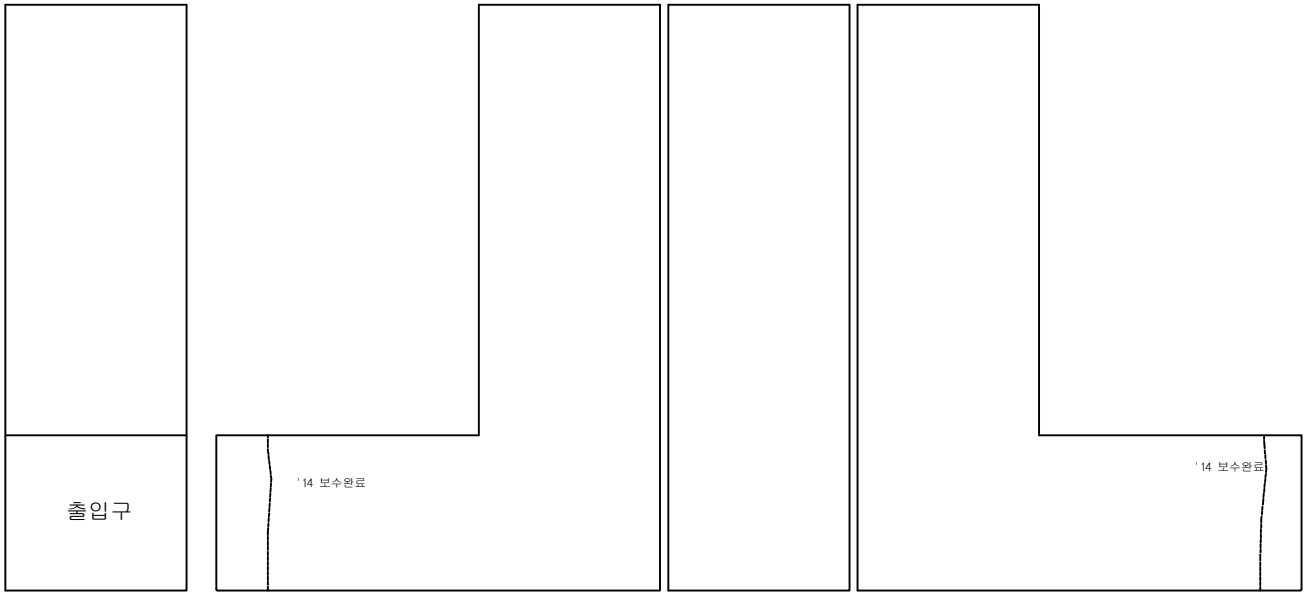

배면 좌벽 전면 우벽

손 상 물 량 표

연번	제품 년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **환기구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+640m ~ 3+660m)

KEYPLAN



SECTION



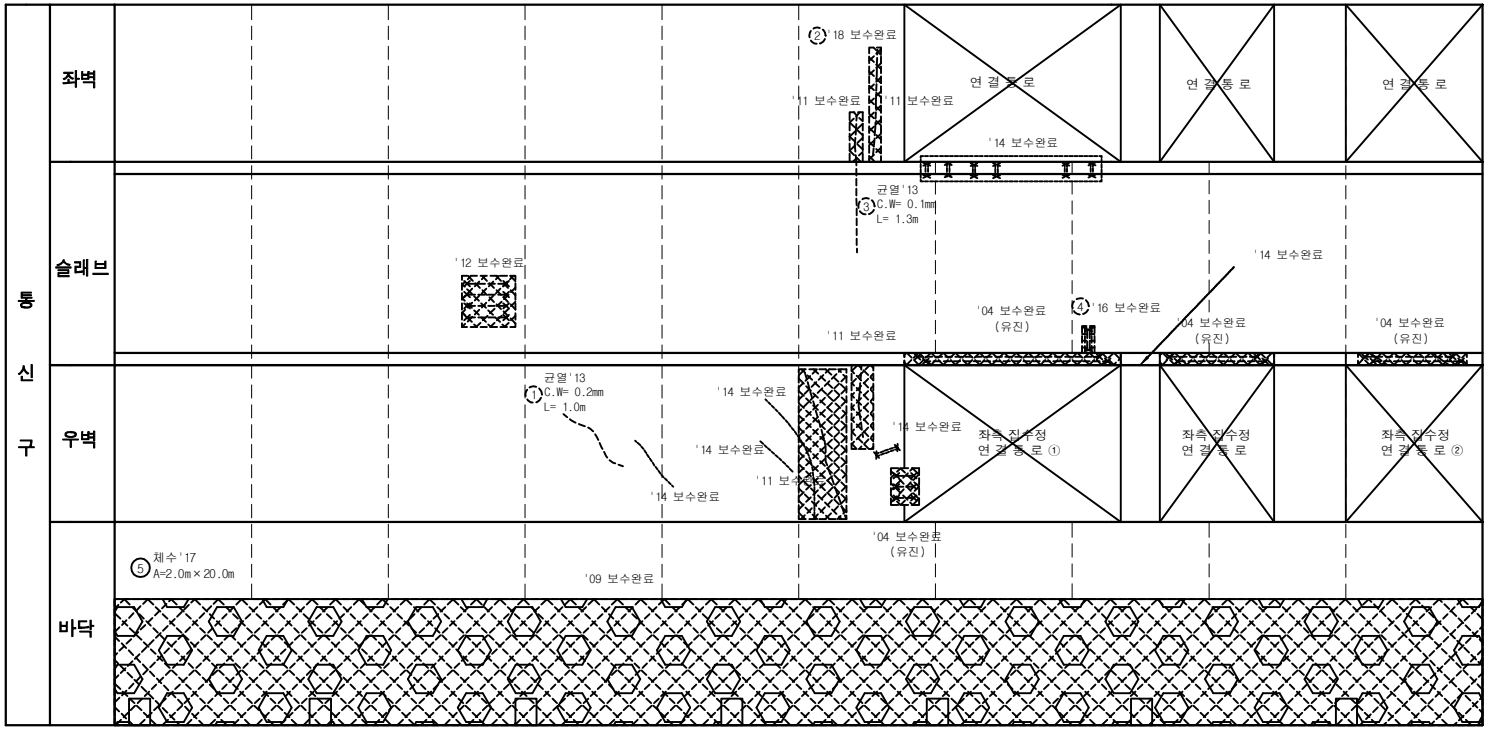

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.2		1.00	1.00	m	1			-	
2	2013	보수부 균열	0.1		1.30	1.30	m	1	2018	표면처리공법	1.56	
3	2013	균열	0.1		1.60	1.60	m	1			-	
4	2013	철근노출,박리	0.1		0.60	0.06	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.07	
5	2017	체수		2.0	20.00	40.00	㎡	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 집수정 연결통로 (순환선)

KEYPLAN

SECTION

우측 집수정 연결통로 ①

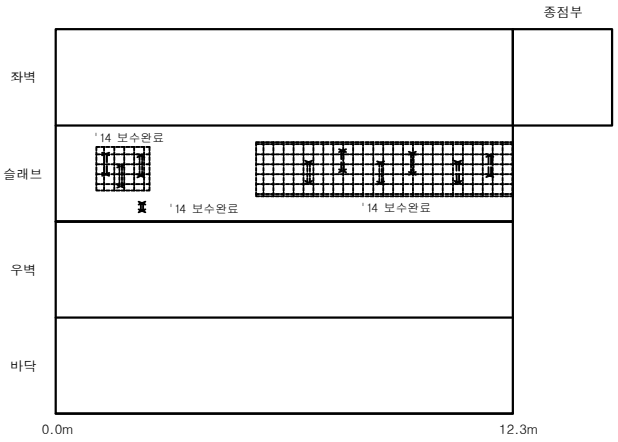

우측 집수정 연결통로 ②

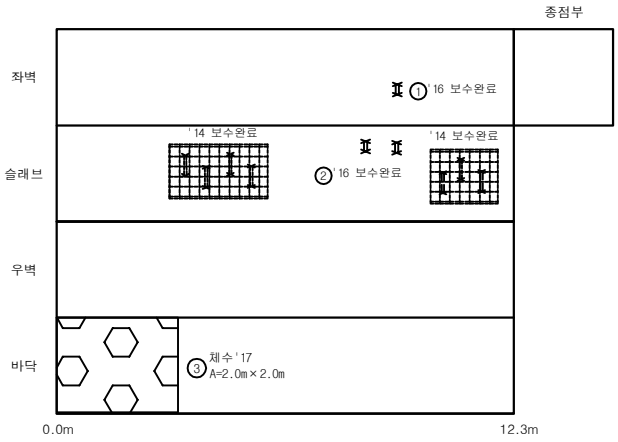

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2015	철근노출		0.1	0.10	0.01	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.01	
2	2015	철근노출		0.1	0.10	0.02	㎡	2	2016	단면복구(방청)	0.02	
3	2017	제수		2.0	2.00	4.00	㎡	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 연결통로 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+660m ~ 3+680m)

KEYPLAN



SECTION



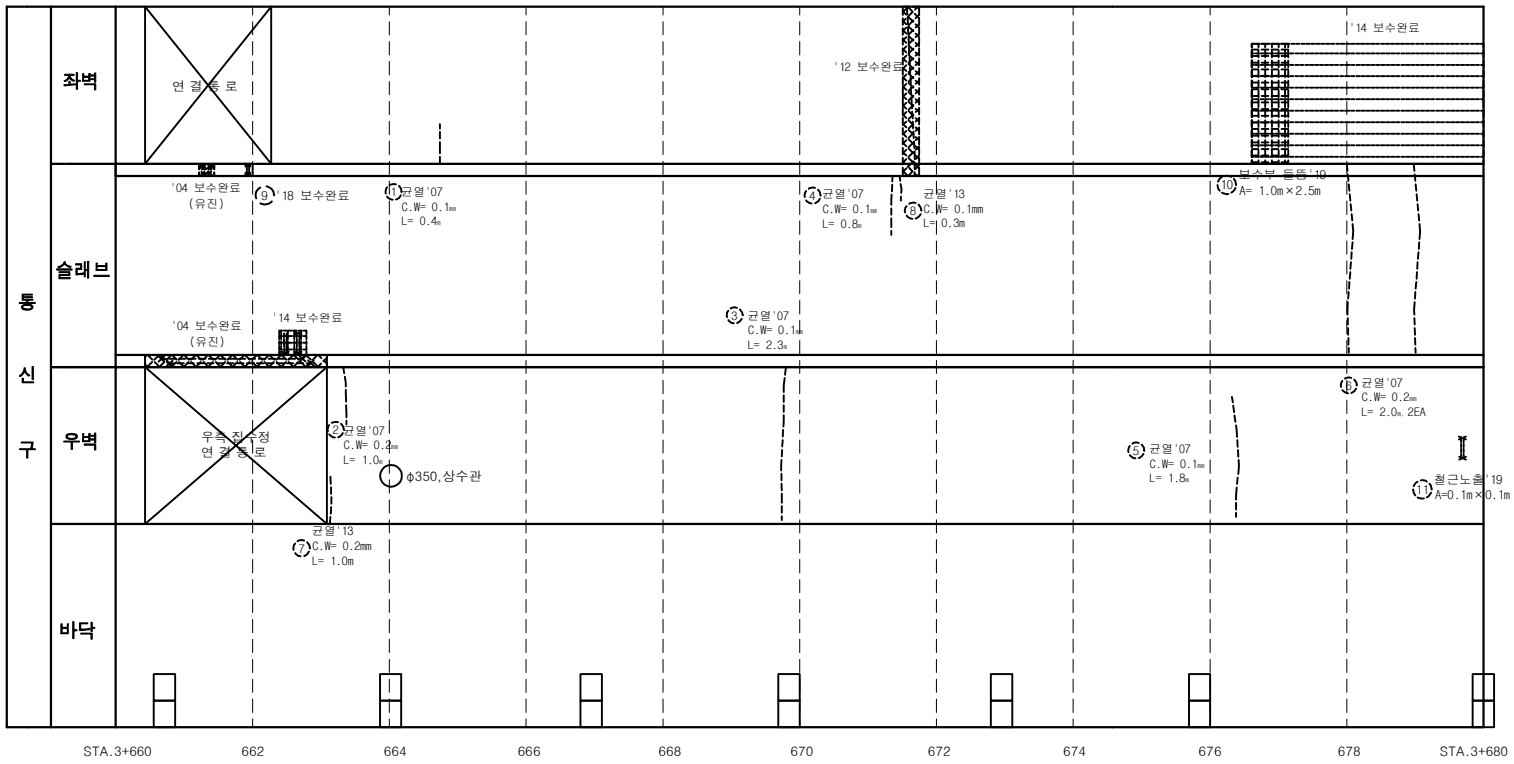

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.1	0.40		0.40	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	
3	2007	균열	0.1	2.30		2.30	m	1			-	
4	2007	균열	0.1	0.80		0.80	m	1			-	
5	2007	균열	0.1	1.80		1.80	m	1			-	
6	2007	균열	0.2	4.00		8.00	m	2			-	
7	2013	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	
8	2013	균열	0.1	0.30		0.30	m	1			-	
9	2017	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.02	
10	2019	보수부 들뜸	1.0	2.50		2.50	㎡	1			-	신규
11	2019	철근노출	0.1	0.10		0.01	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+680m ~ 3+700m)

KEYPLAN



SECTION



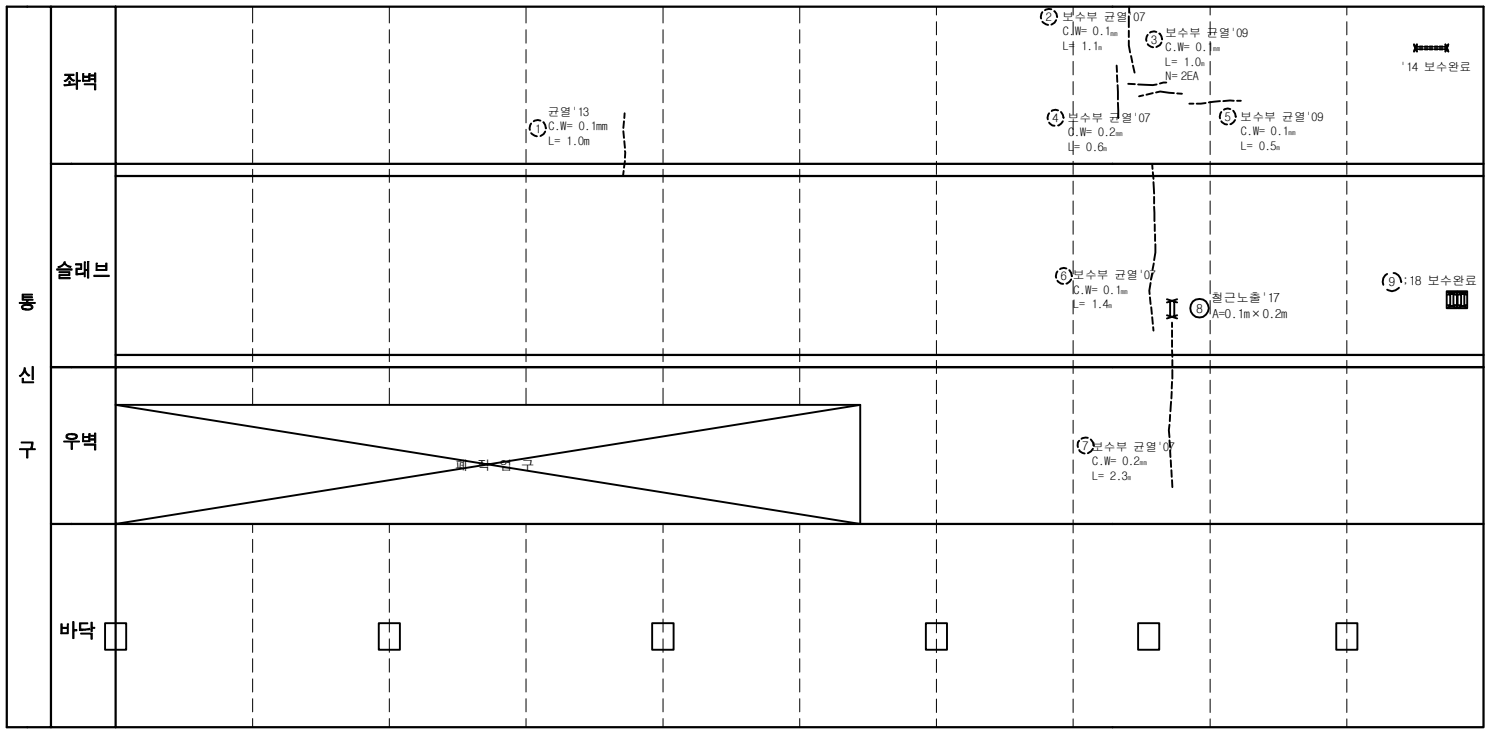

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수번호	공법명	물량	
1	2013	균열	0.1	1.00		1.00	m	1			-	
2	2007	보수부 균열	0.1	1.10		1.10	m	1			-	
3	2009	보수부 균열	0.1	1.00		2.00	m	2			-	실이중가
4	2007	보수부 균열	0.2	0.60		0.60	m	1			-	
5	2009	보수부 균열	0.1	0.50		0.50	m	1			-	재결함
6	2007	균열	0.1	1.40		1.40	m	1			-	
7	2007	균열	0.2	2.30		2.30	m	1			-	
8	2017	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1			-	중요
9	2017	철근노출	0.1	0.20		0.04	㎡	2	2018	단면복구(방청)	0.05	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 폐 작업구 (순환선 3,690m)

KEYPLAN

SECTION



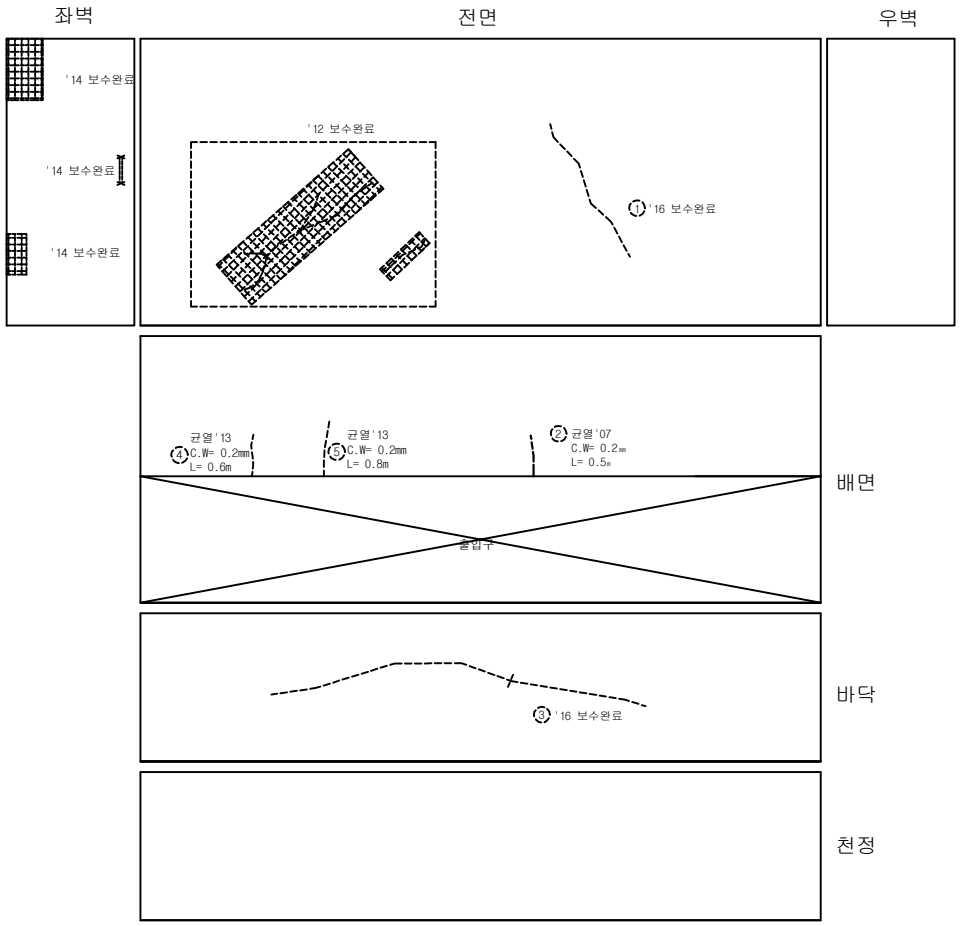

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.3	2.00		2.00	m	1	2016	주입보수공법	2.40	
2	2007	균열	0.2	0.50		0.50	m	1			-	
3	2007	균열	0.3	6.00		6.00	m	1	2016	주입보수공법	7.20	
4	2013	균열	0.2	0.60		0.60	m	1			-	
5	2013	균열	0.2	0.80		0.80	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **작업구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+700m ~ 3+720m)

KEYPLAN



SECTION



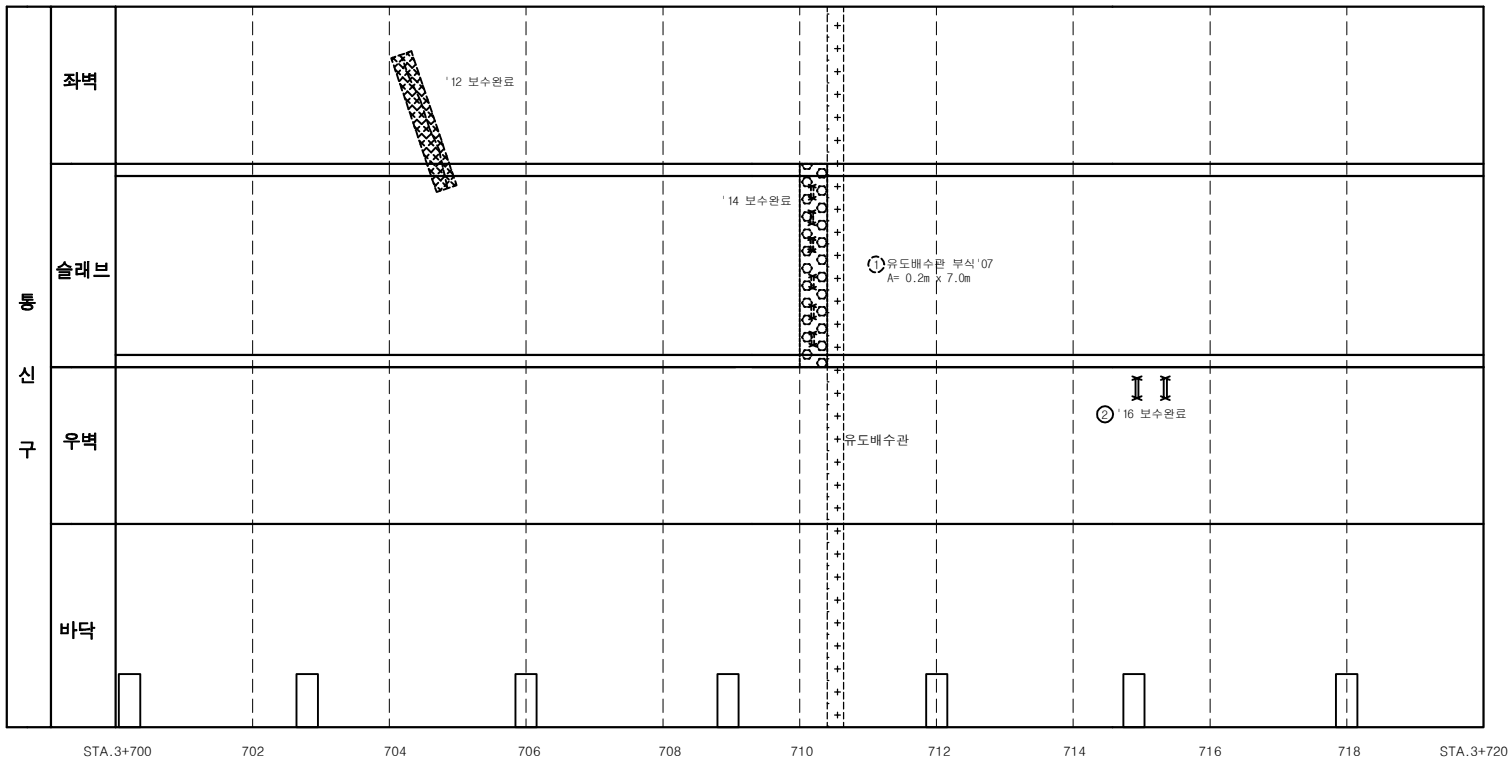

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	유도배수관부식	0.2	7.00		1.40	㎡	1			-	
2	2015	철근노출	0.1	0.20		0.04	㎡	2	2016	단면복구(방청)	0.05	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+720m ~ 3+740m)

KEYPLAN



SECTION



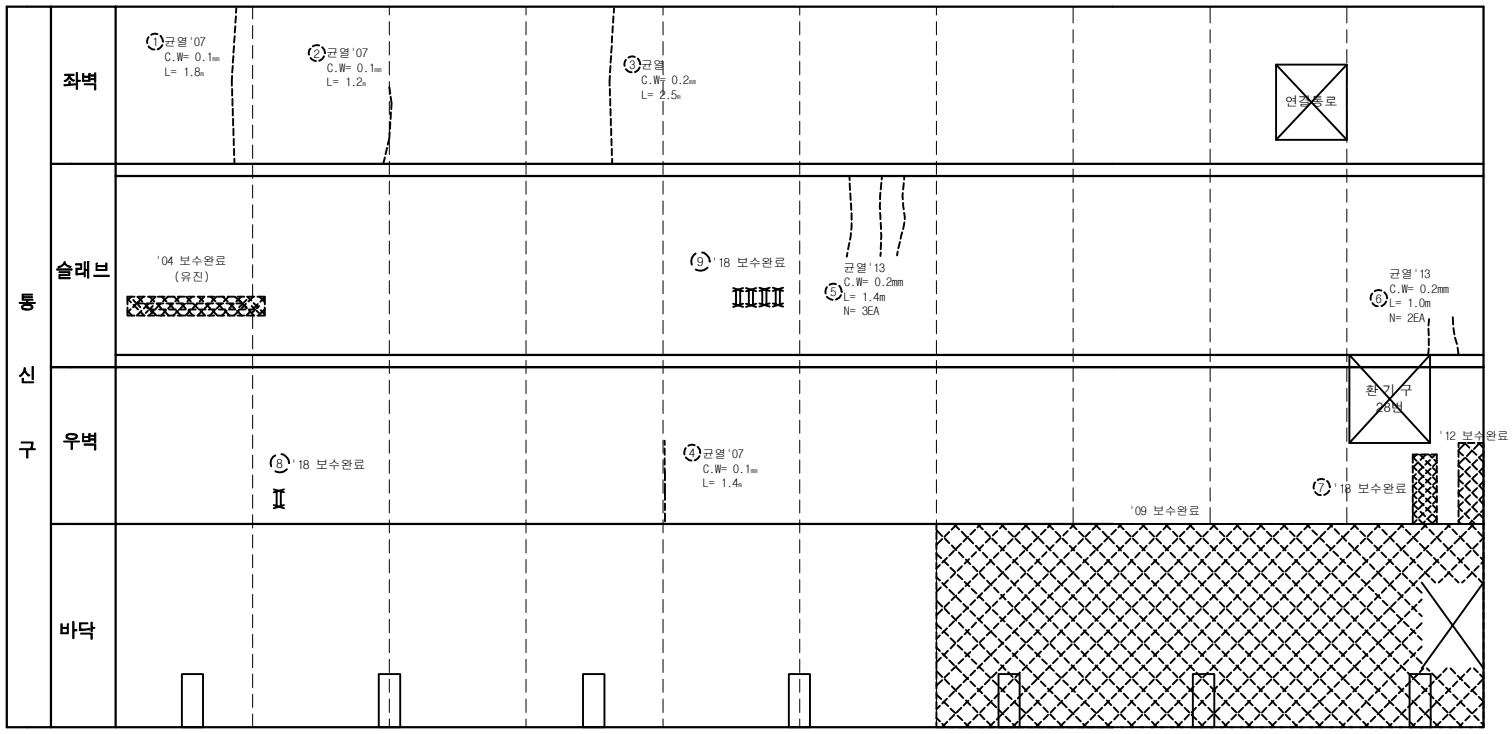

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.1		1.80	1.80	m	1			-	
2	2007	균열	0.1		1.20	1.20	m	1			-	
3	2007	균열	0.2		2.50	2.50	m	1			-	
4	2007	균열	0.1		1.40	1.40	m	1			-	
5	2013	균열	0.2		4.20	12.60	m	3			-	
6	2013	균열	0.2		2.00	4.00	m	2			-	
7	2013	누수		0.1	1.00	0.10	㎡	1	2018	배면누수보수	0.12	
8	2017	철근노출		0.1	0.20	0.02	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.02	
9	2017	철근노출		0.1	0.30	0.12	㎡	4	2018	단면복구(방청)	0.14	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

환기구 28번 (순환선 3,738m)

KEYPLAN

SECTION



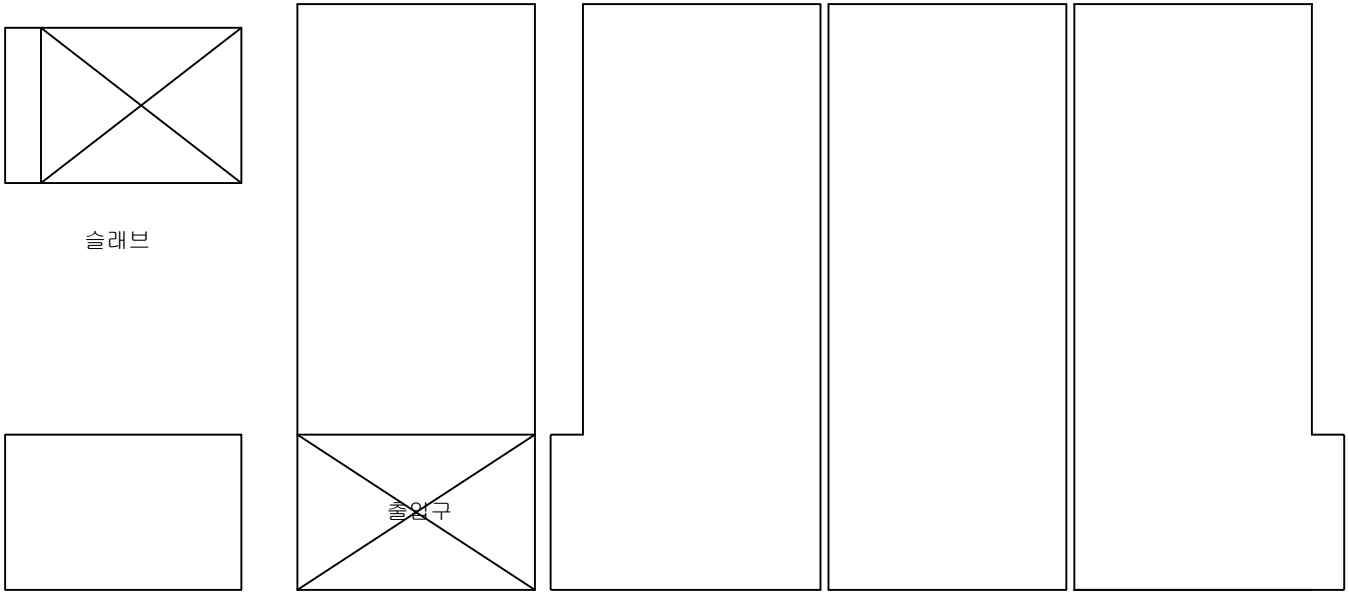

슬래브

바닥

배면

좌벽

전면

우벽

손 상 물 량 표

연번	제품 년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+740m ~ 3+760m)

KEYPLAN



SECTION



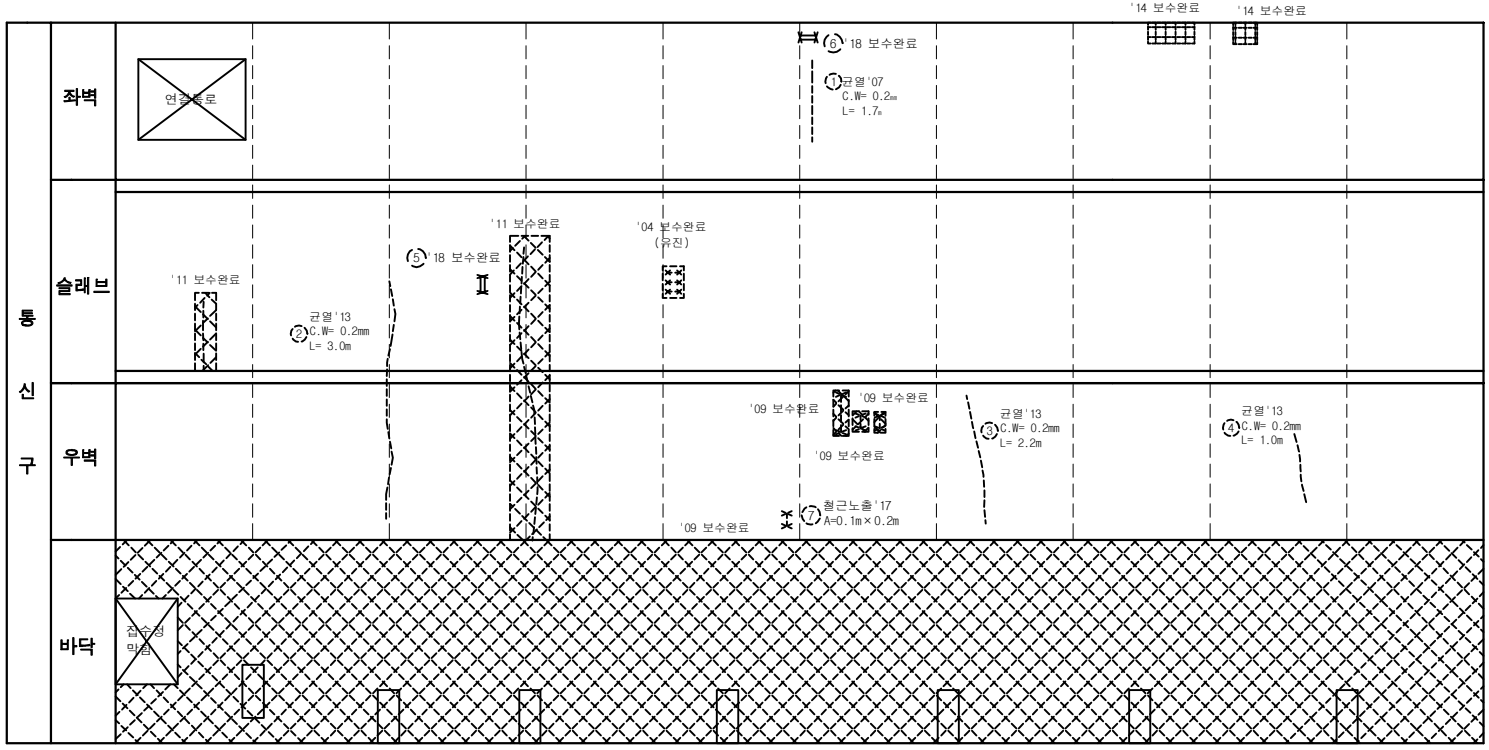

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	1.70		1.70	m	1			-	
2	2013	균열	0.2	3.00		3.00	m	1			-	
3	2013	균열	0.2	2.20		2.20	m	1			-	
4	2013	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	
5	2017	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.02	
6	2017	철근노출	0.2	0.20		0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.05	
7	2017	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+760m ~ 3+780m)

KEYPLAN



SECTION



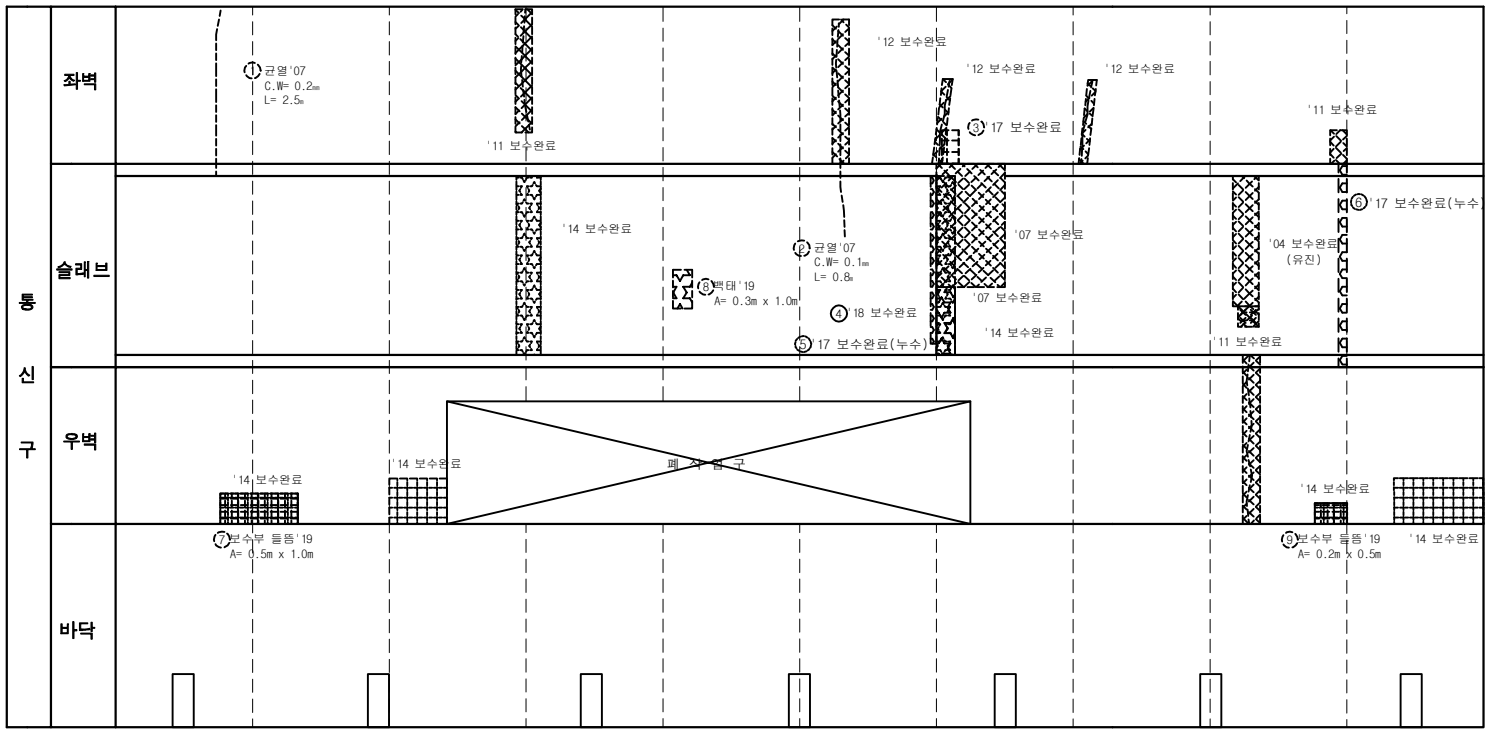

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	2.50		2.50	m	1			-	
2	2007	균열	0.1	0.80		0.80	m	1			-	
3	2009	보수부 파손	0.2	0.20		0.04	㎡	1	2017	단면복구공법	0.05	
4	2015	보수부 백태	0.2	1.00		0.20	㎡	1	2018	표면처리공법	0.24	
5	2017	누수				2.00	㎡	1	2017	누수보수공법	2.40	
6	2017	누수				1.55	㎡	1	2017	누수보수공법	1.86	
7	2019	보수부 들뜸	0.5	1.00		0.50	㎡	1			-	신규
8	2019	백태	0.3	1.00		0.30	㎡	1			-	신규
9	2019	보수부 들뜸	0.2	0.50		0.10	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 폐 작업구 (순환선 3,770m)

KEYPLAN

SECTION

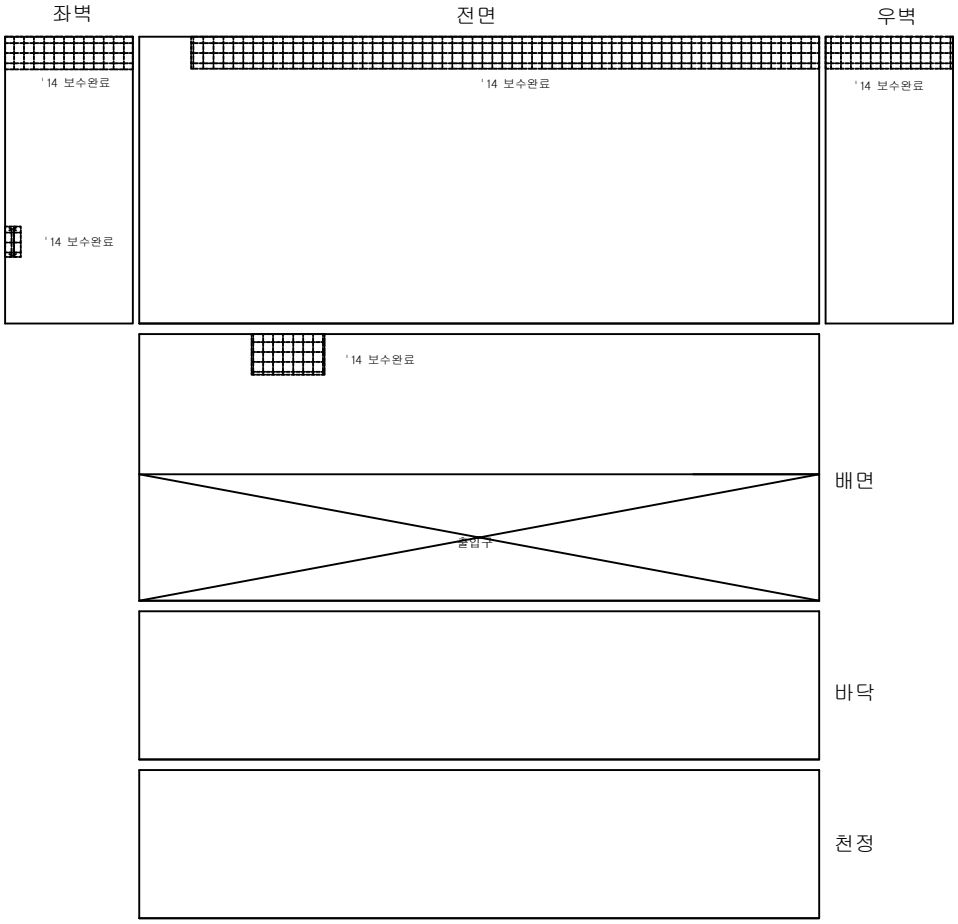

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **작업구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+780m ~ 3+800m)

KEYPLAN



SECTION



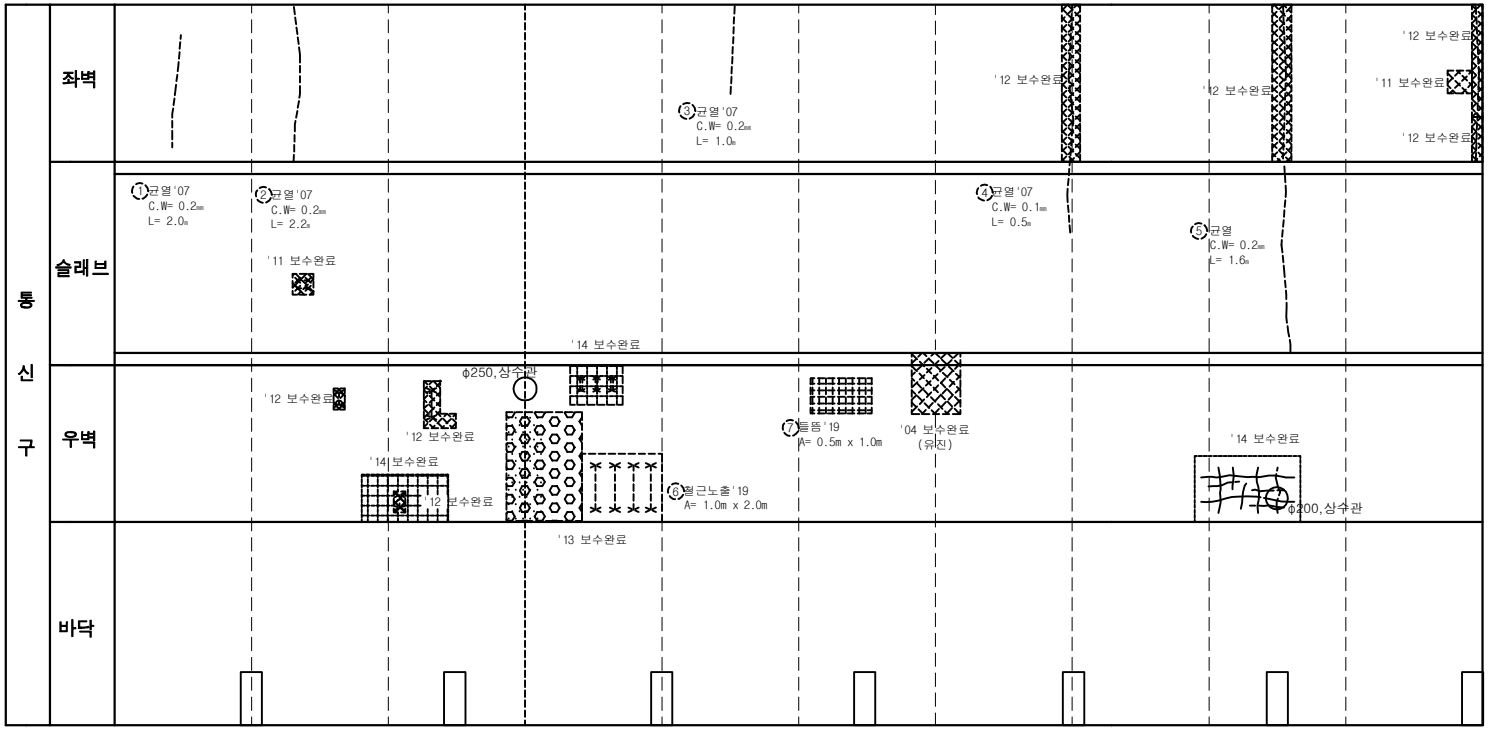

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	2.20		2.20	m	1			-	
3	2007	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	
4	2007	균열	0.1	0.50		0.50	m	1			-	
5	2007	균열	0.2	1.60		1.60	m	1			-	
6	2019	철근노출	1.0	2.00		2.00	㎡	1			-	신규
7	2019	들뜸	0.5	1.00		0.50	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+800m ~ 3+820m)





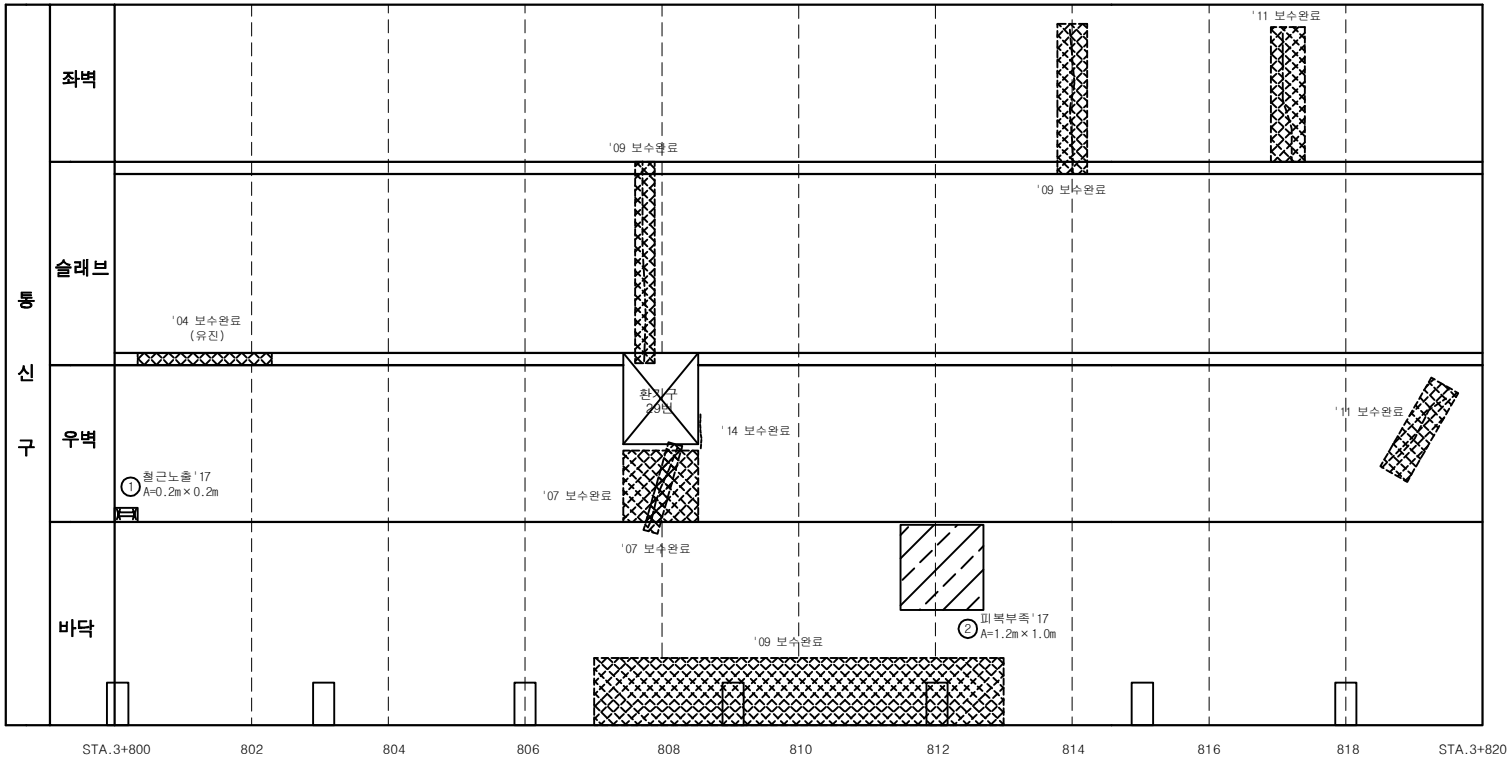

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2017	철근노출	0.2	0.20		0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.05	
2	2017	피복부족	1.2	1.00		1.20	㎡	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

환기구 29번 (순환선 3,808m)

KEYPLAN

SECTION

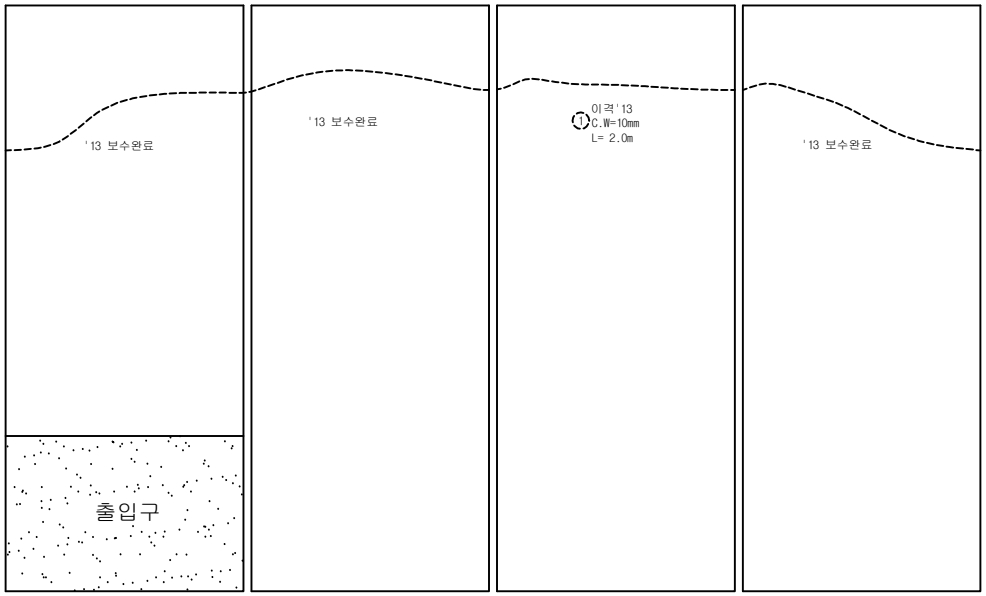

배면 좌벽 전면 우벽

손 상 물 량 표

연번	적용 년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수면도	공법명	물량	
1	2013	이격	10.0	2.00		2.00	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **환기구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+820m ~ 3+840m)

KEYPLAN



SECTION



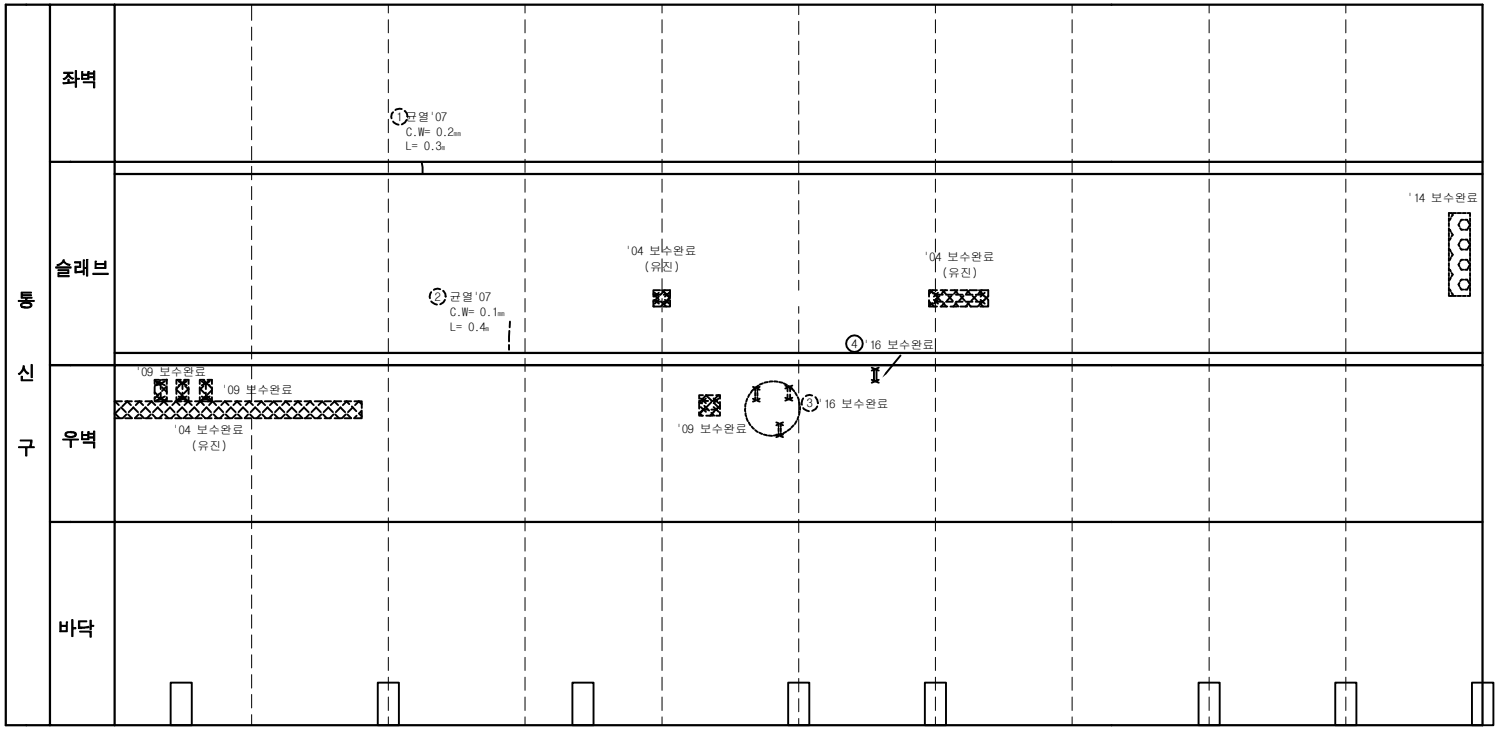

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	0.30		0.30	m	1			-	
2	2007	균열	0.1	0.40		0.40	m	1			-	
3	2013	철근노출	0.1	0.10		0.03	㎡	3	2016	단면복구(방청)	0.04	
4	2015	철근노출	0.1	0.10		0.01	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.01	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+840m ~ 3+860m)

KEYPLAN



SECTION



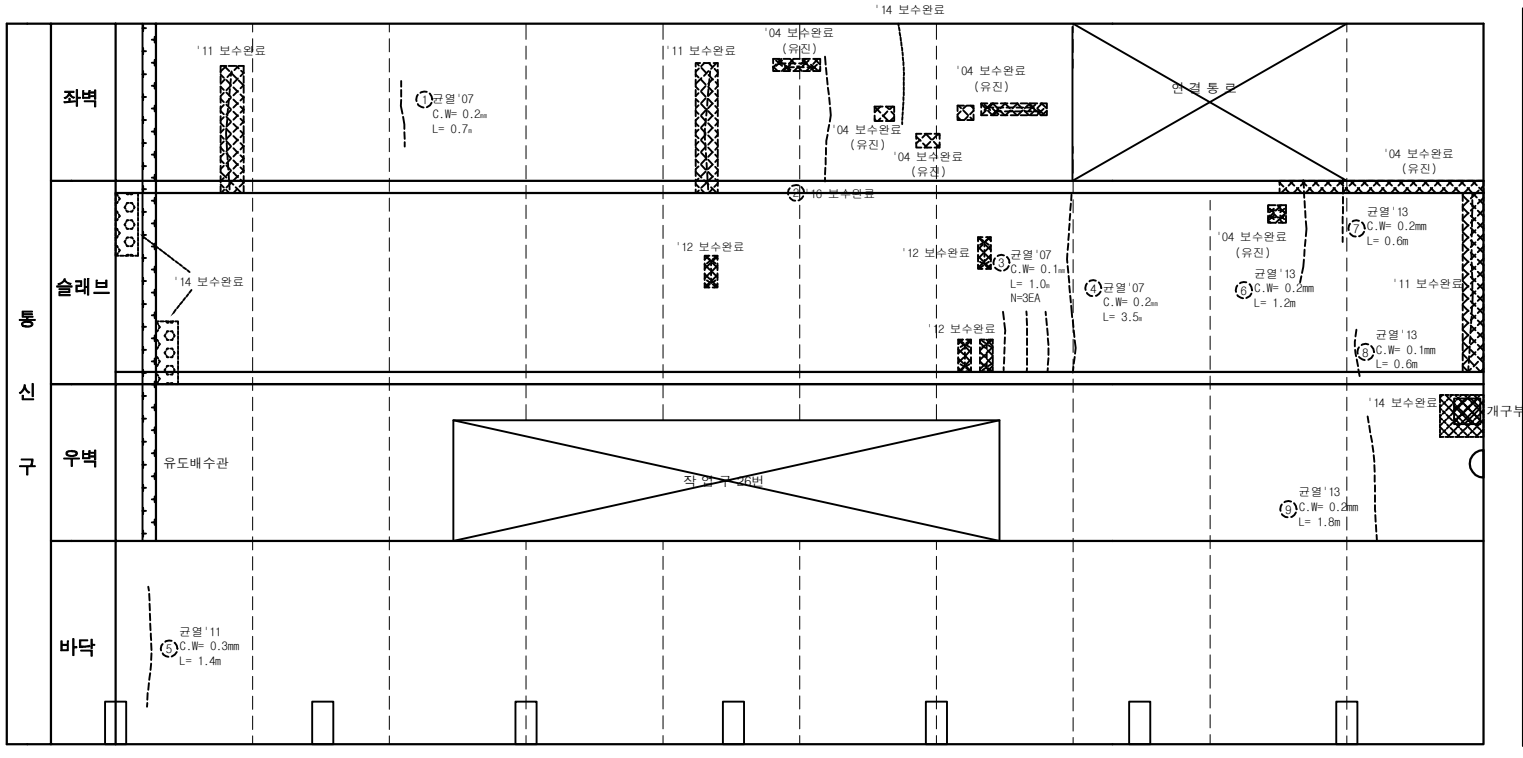

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2		0.70	0.70	m	1			-	
2	2007	균열	0.3		2.00	2.00	m	1	2016	주입보수공법	2.40	
3	2007	균열	0.1		3.00	9.00	m	3			-	
4	2007	균열	0.2		3.50	3.50	m	1			-	
5	2011	균열	0.3		1.40	1.40	m	1			-	중요
6	2013	균열	0.2		1.20	1.20	m	1			-	
7	2013	균열	0.2		0.60	0.60	m	1			-	
8	2013	균열	0.1		0.60	0.60	m	1			-	
9	2013	균열	0.2		1.80	1.80	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 작업구 26번 (순환선 3,843m)

KEYPLAN

SECTION

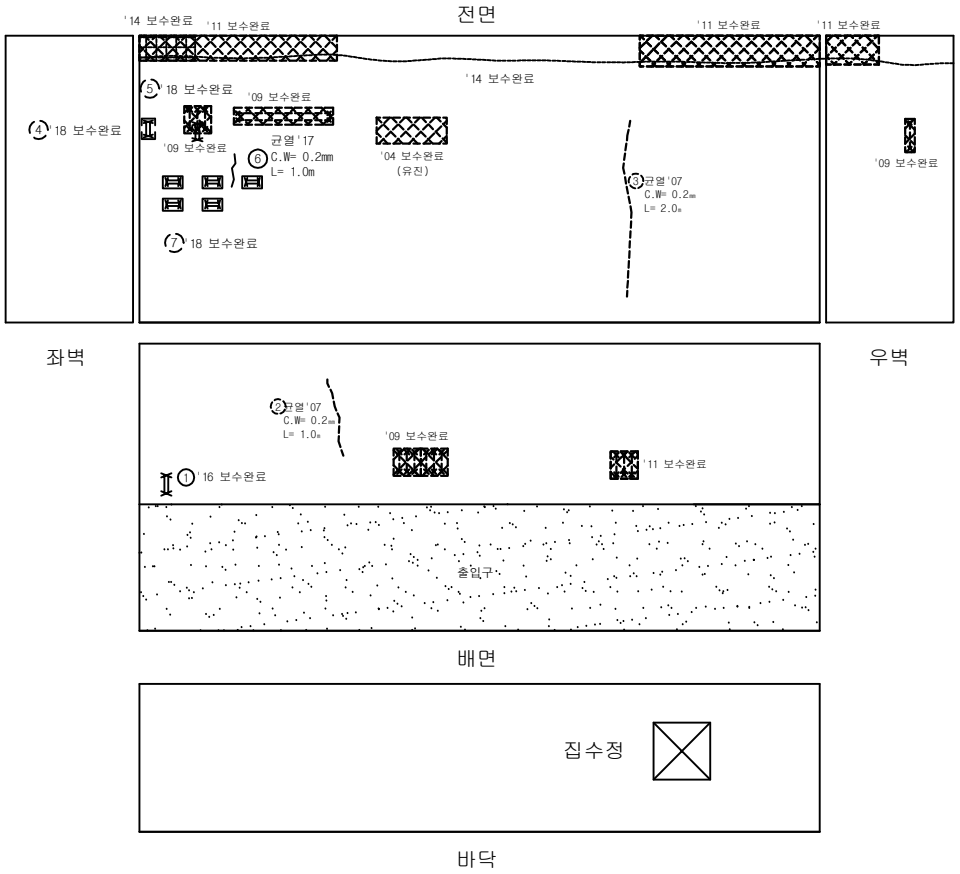

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2015	철근노출	0.2	0.20		0.04	㎡	1	2016	단면복구(방청)	0.05	
2	2007	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	
3	2007	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
4	2017	철근노출	0.2	0.20		0.04	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.05	
5	2017	보수부 철근노출	0.4	0.40		0.16	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.19	
6	2017	균열	0.2	1.00		1.00	m	1			-	
7	2017	철근노출	0.1	0.20		0.10	㎡	5	2018	단면복구(방청)	0.12	

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)

TITLE OF SHIFT

작업구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+860m ~ 3+880m)

KEYPLAN



SECTION



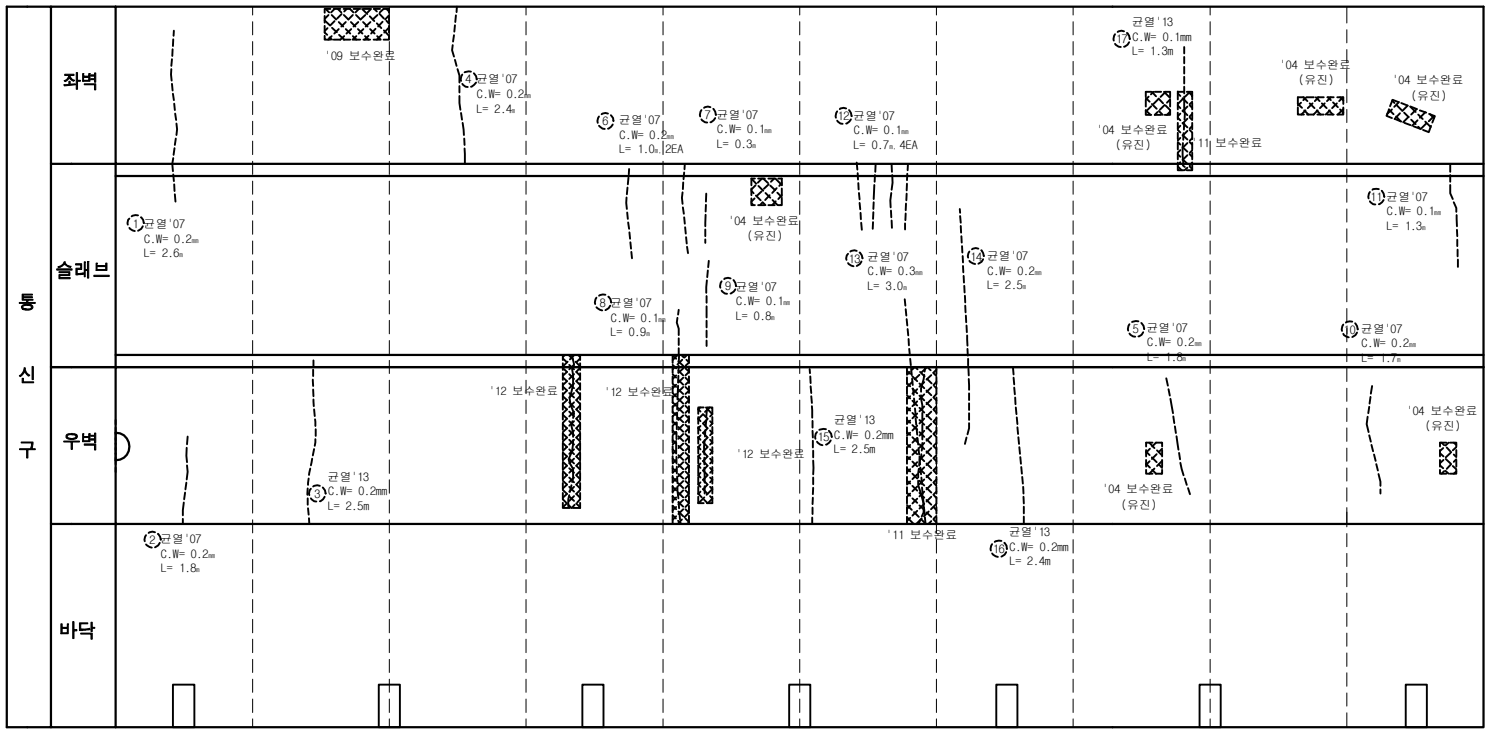

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수면	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	2.60		2.60	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	1.80		1.80	m	1			-	
3	2013	균열	0.2	2.50		2.50	m	1			-	
4	2007	균열	0.2	2.40		2.40	m	1			-	
5	2007	균열	0.2	1.80		1.80	m	1			-	
6	2007	균열	0.2	2.00		4.00	m	2			-	
7	2007	균열	0.1	0.30		0.30	m	1			-	
8	2007	균열	0.1	0.90		0.90	m	1			-	
9	2007	균열	0.1	0.80		0.80	m	1			-	
10	2007	균열	0.2	1.70		1.70	m	1			-	
11	2007	균열	0.1	1.30		1.30	m	1			-	
12	2007	균열	0.1	2.80		11.20	m	4			-	
13	2013	균열	0.3	3.00		3.00	m	1			-	중요
14	2013	균열	0.2	2.50		2.50	m	1			-	
15	2013	균열	0.2	2.50		2.50	m	1			-	
16	2013	균열	0.2	2.40		2.40	m	1			-	
17	2013	균열	0.1	1.30		1.30	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+880m ~ 3+900m)

KEYPLAN



SECTION



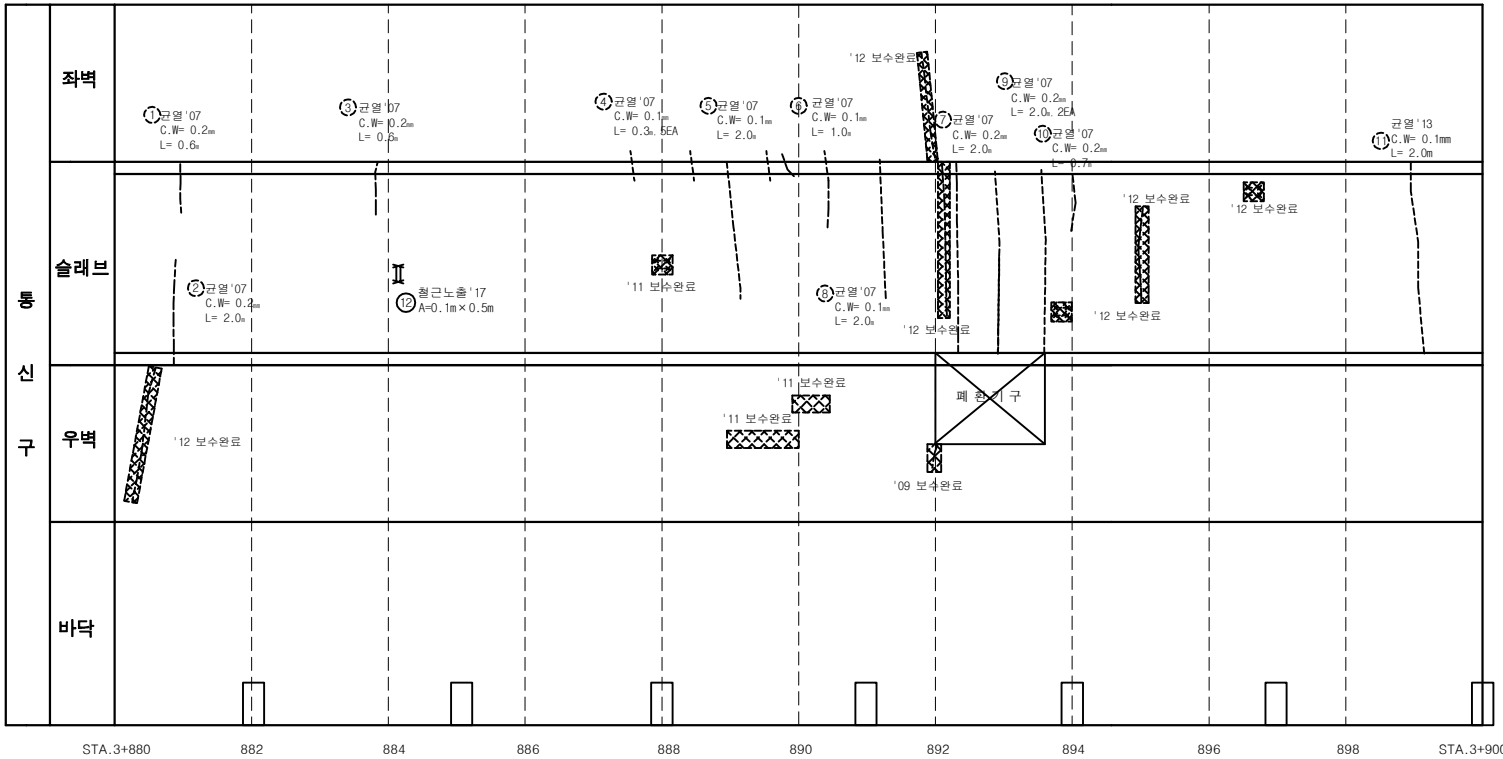

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	0.60		0.60	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
3	2007	균열	0.2	0.60		0.60	m	1			-	
4	2007	균열	0.1	1.50		7.50	m	5			-	
5	2007	균열	0.1	2.00		2.00	m	1			-	
6	2007	균열	0.1	1.00		1.00	m	1			-	
7	2007	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
8	2007	균열	0.1	2.00		2.00	m	1			-	
9	2007	균열	0.2	4.00		8.00	m	2			-	
10	2007	균열	0.2	0.70		0.70	m	1			-	
11	2013	균열	0.1	2.00		2.00	m	1			-	
12	2017	철근노출	0.1	0.50		0.05	㎡	1			-	중요

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+900m ~ 3+920m)

KEYPLAN



SECTION



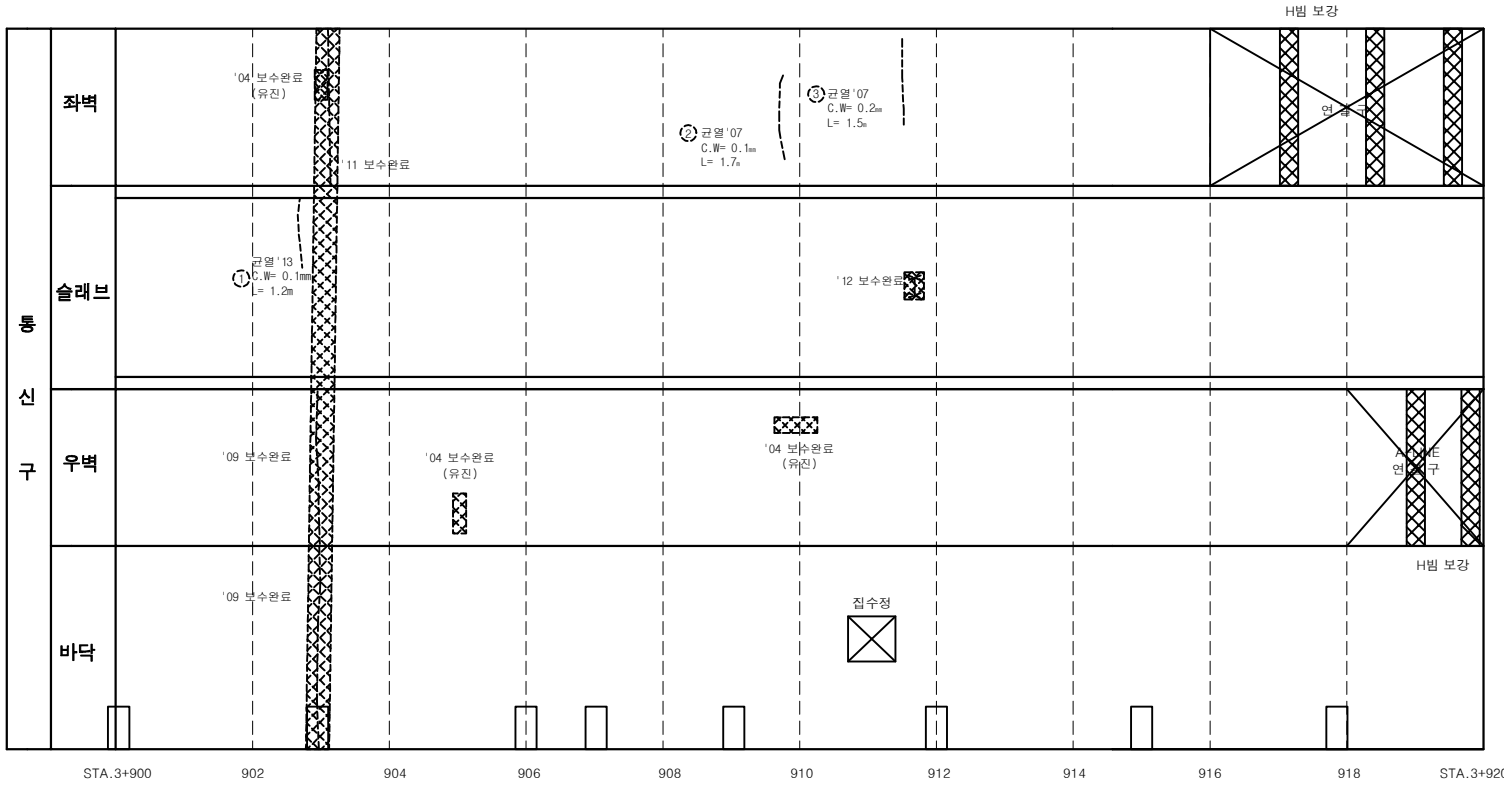

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	균열	0.1	1.20		1.20	m	1			-	
2	2007	균열	0.1	1.70		1.70	m	1			-	
3	2007	균열	0.2	1.50		1.50	m	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+920m ~ 3+940m)

KEYPLAN



SECTION



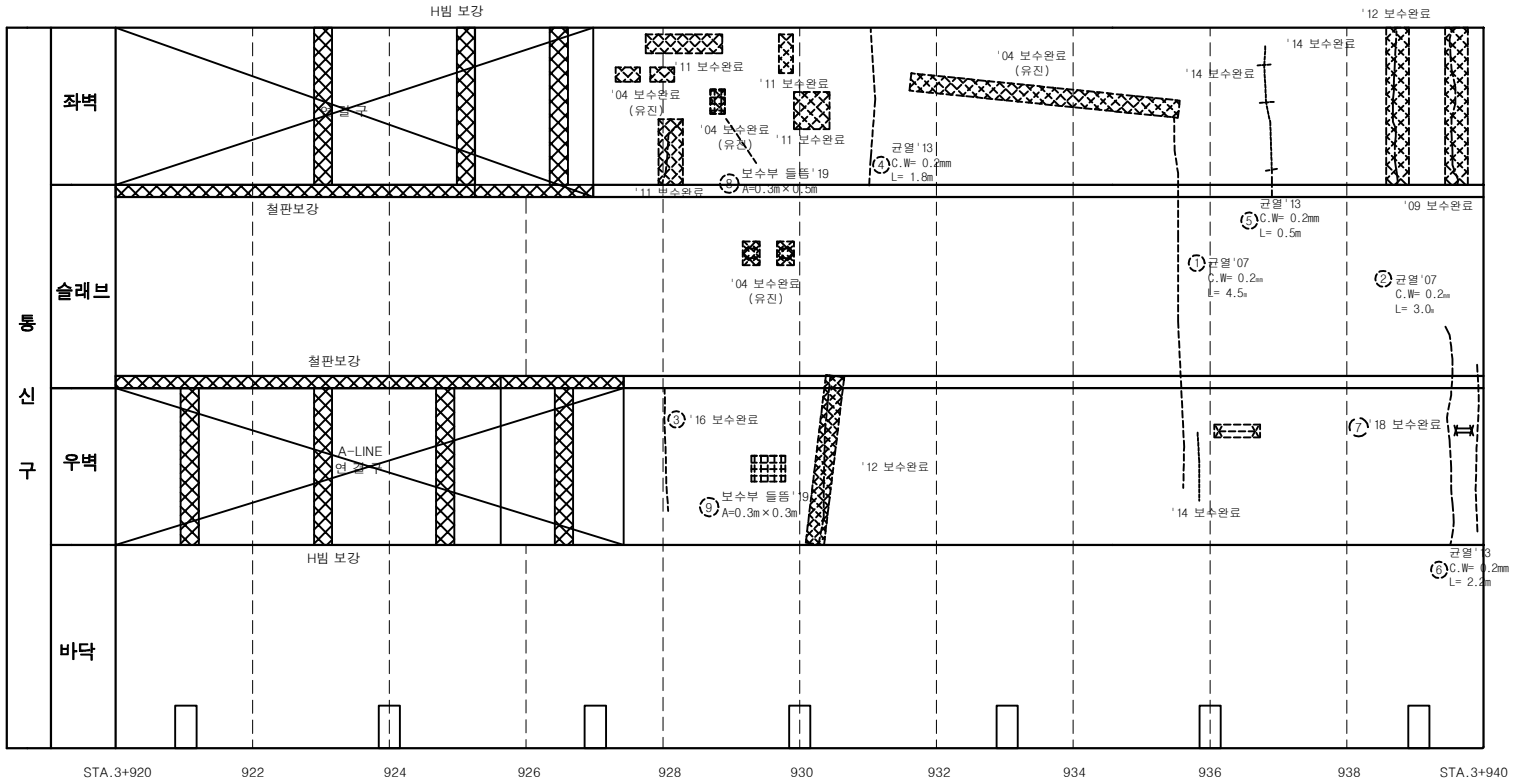

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.2	4.50		4.50	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	3.00		3.00	m	1			-	
3	2013	균열	0.3	1.60		1.60	m	1	2016	주입보수공법	1.92	
4	2013	균열	0.2	1.80		1.80	m	1			-	
5	2013	균열	0.2	0.50		0.50	m	1			-	
6	2013	균열	0.2	2.20		2.20	m	1			-	
7	2017	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1	2018	단면복구(방청)	0.02	
8	2019	보수부 들뜸	0.3	0.50		0.15	㎡	1			-	신규
9	2019	보수부 들뜸	0.3	0.30		0.09	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+940m ~ 3+960m)

KEYPLAN



SECTION



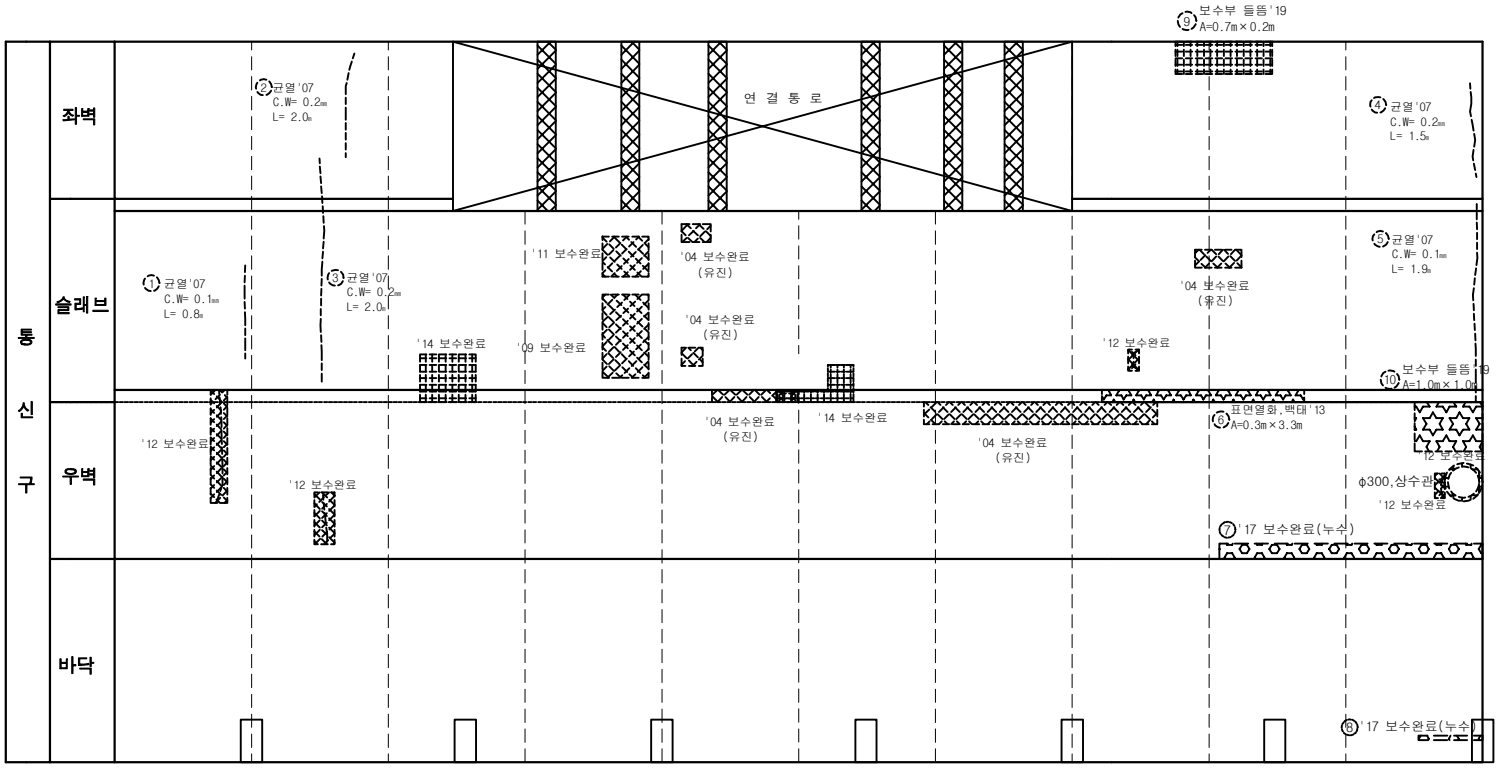

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.1	0.80		0.80	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
3	2007	균열	0.2	2.00		2.00	m	1			-	
4	2007	균열	0.2	1.50		1.50	m	1			-	
5	2007	균열	0.1	1.90		1.90	m	1			-	
6	2013	표면열화,백태	0.3	3.30		0.99	㎡	1			-	
7	2017	누수				2.00	㎡	1	2017	누수보수공법	2.40	
8	2017	누수				0.50	㎡	1	2017	누수보수공법	0.60	
9	2019	보수부 들뜸	0.2	0.70		0.14	㎡	1			-	신규
10	2019	백태	1.0	1.00		1.00	㎡	1			-	신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+960m ~ 3+980m)





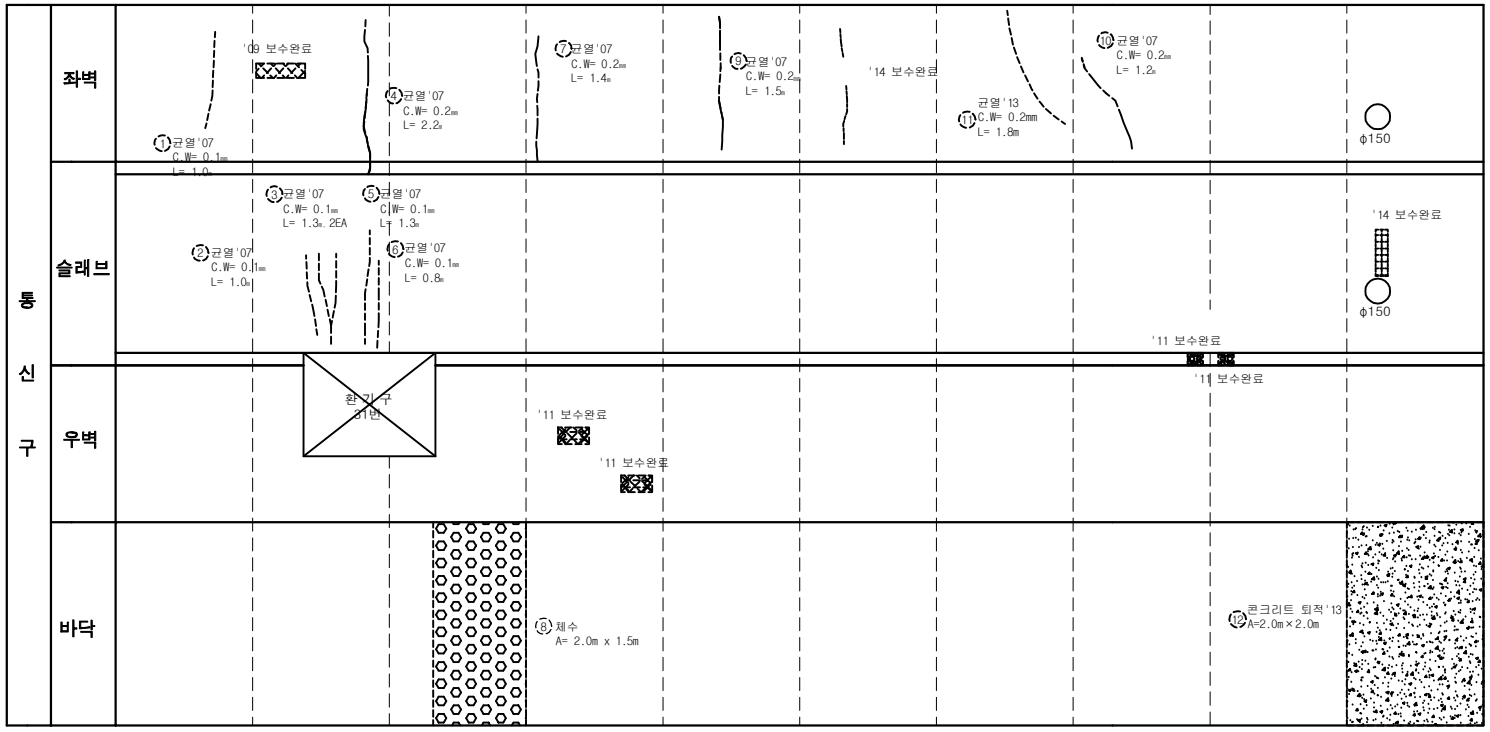



손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2007	균열	0.1	1.00		1.00	m	1			-	
2	2007	균열	0.1	1.00		1.00	m	1			-	
3	2007	균열	0.1	2.60		5.20	m	2			-	
4	2007	균열	0.2	2.20		2.20	m	1			-	
5	2007	균열	0.1	1.30		1.30	m	1			-	
6	2007	균열	0.1	0.80		0.80	m	1			-	
7	2007	균열	0.2	1.40		1.40	m	1			-	
8	2007	제수	2.0	1.50		3.00	㎡	1			-	
9	2007	균열	0.2	1.50		1.50	m	1			-	
10	2007	균열	0.2	1.20		1.20	m	1			-	
11	2013	균열	0.2	1.80		1.80	m	1			-	
12	2013	콘크리트 퇴적	2.0	2.00		4.00	㎡	1			-	
13	2013	거푸집미제거				1	EA	1			-	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도

환기구 31번 (순환선 3,964m)

KEYPLAN

SECTION

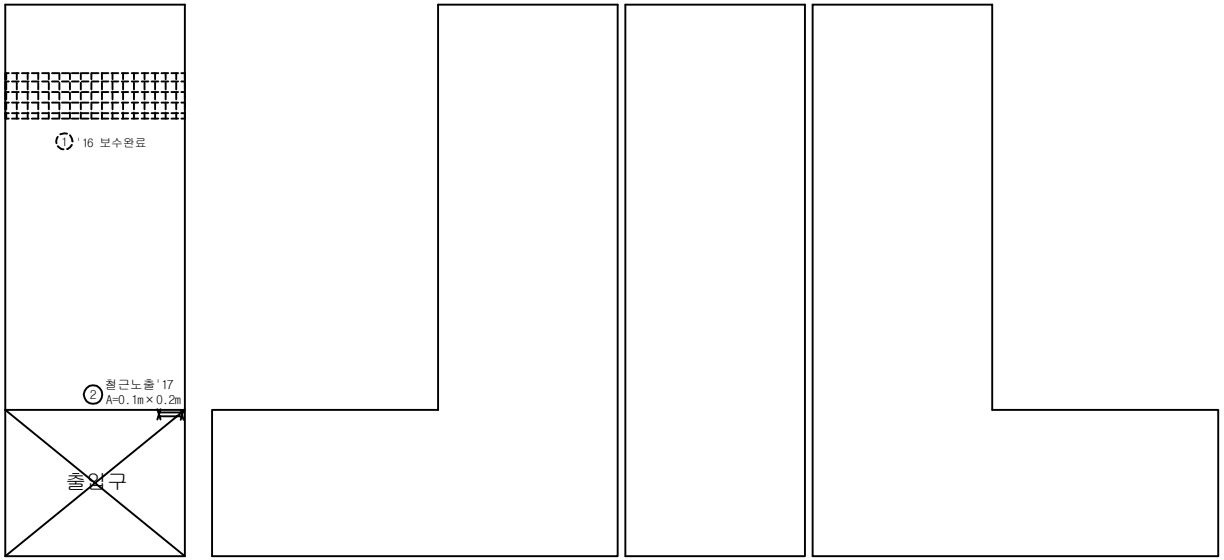

배면 좌벽 전면 우벽

손 상 물 량 표

연번	작업년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명	물량	
1	2013	박락	0.2	1.30		0.26	㎡	1	2016	단면복구공법	0.31	
2	2017	철근노출	0.1	0.20		0.02	㎡	1			-	중요

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT **2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)**	TITLE OF SHIFT **환기구 외관조사망도**

여의도 공동구 - 순환선 통신구 (STA. 3+980m ~ 3+987m)

KEYPLAN



SECTION



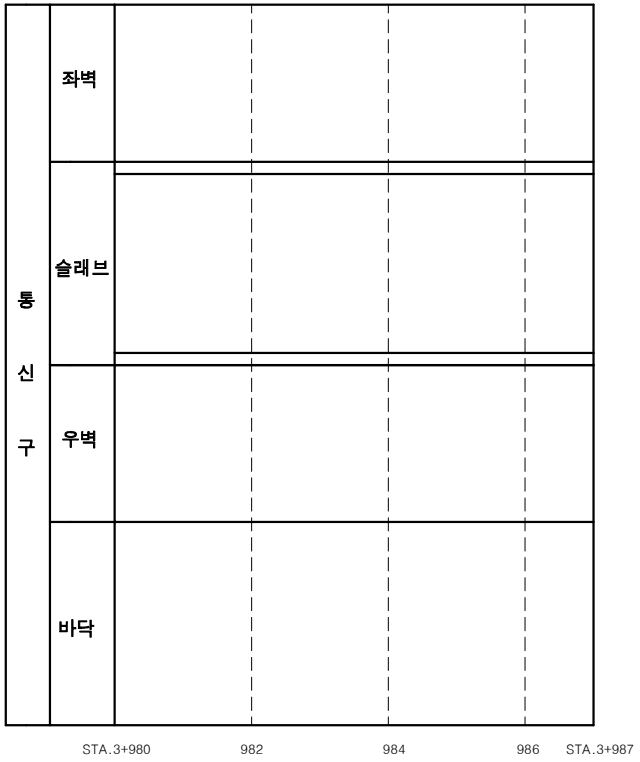

손 상 물 량 표

연번	제품년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수면	공법명	물량	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)	TITLE OF SHIFT 순환선 통신구 외관조사망도
