가락 공동구 - 중대로(STA. 0 m ~ 20 m) 전력구 구간





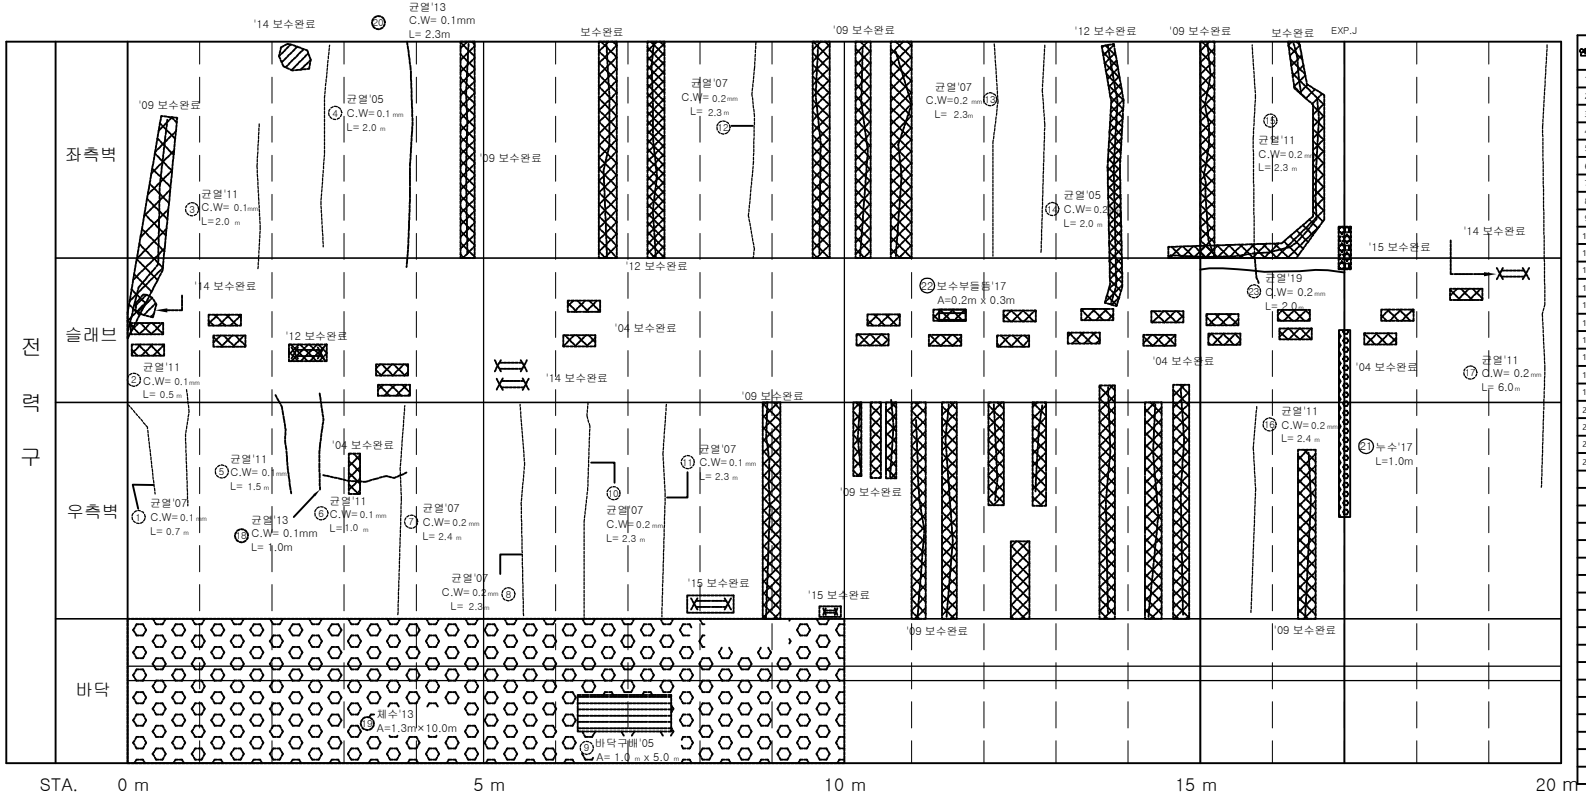

손 상 물 량 표

연번	계열법도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
2	2011	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
3	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
4	2005	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
5	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
6	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
7	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
9	2005	바닥구배		5.00		5.00	㎡	1				
10	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
11	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
12	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
13	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
14	2005	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
15	2011	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
16	2011	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
17	2011	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
18	2013	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
19	2013	체수		13.00		13.00	㎡	1				
20	2013	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
21	2017	누수		1.00		1.00	m	1				
22	2017	보수부들뜸	0.20	0.30		0.06	㎡	1				재결함
23	2019	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 20 m ~ 40 m) 전력구 구간





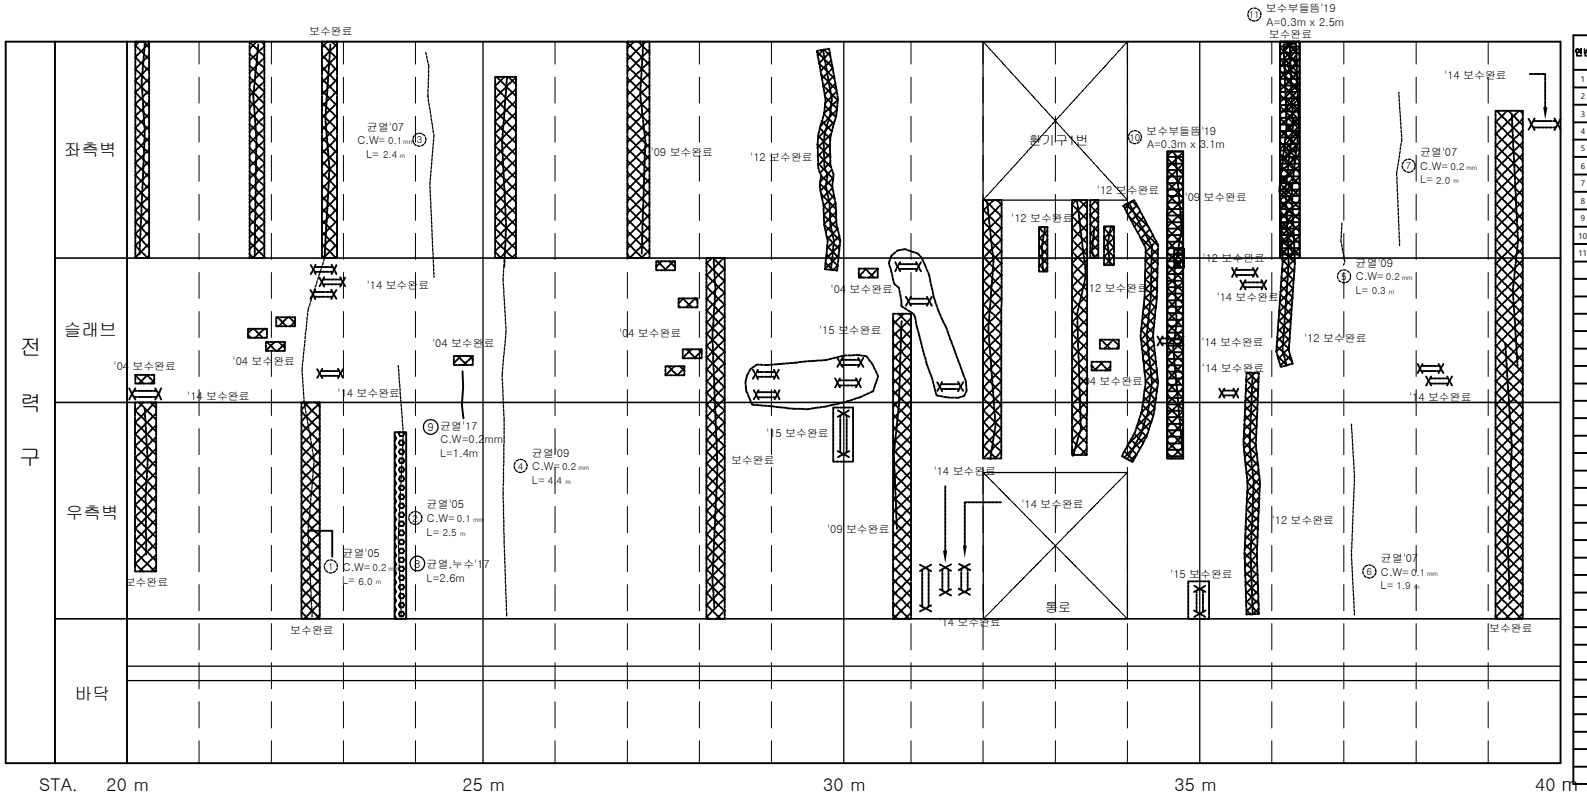

손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2005	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
2	2005	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				
3	2007	균열	0.10	2.40		2.40	m	1				
4	2009	균열	0.20	4.40		4.40	m	1				
5	2009	균열	0.20	0.30		0.30	m	1				
6	2007	균열	0.10	1.90		1.90	m	1				
7	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
8	2017	균열,누수		2.60		2.60	m	1				
9	2017	균열	0.20	1.40		1.40	m	1				
10	2019	보수부들뜸	0.30	3.10		0.93	㎡	1				재검험
11	2019	보수부들뜸	0.30	2.50		0.75	㎡	1				재검험

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 40 m ~ 60 m) 전력구 구간





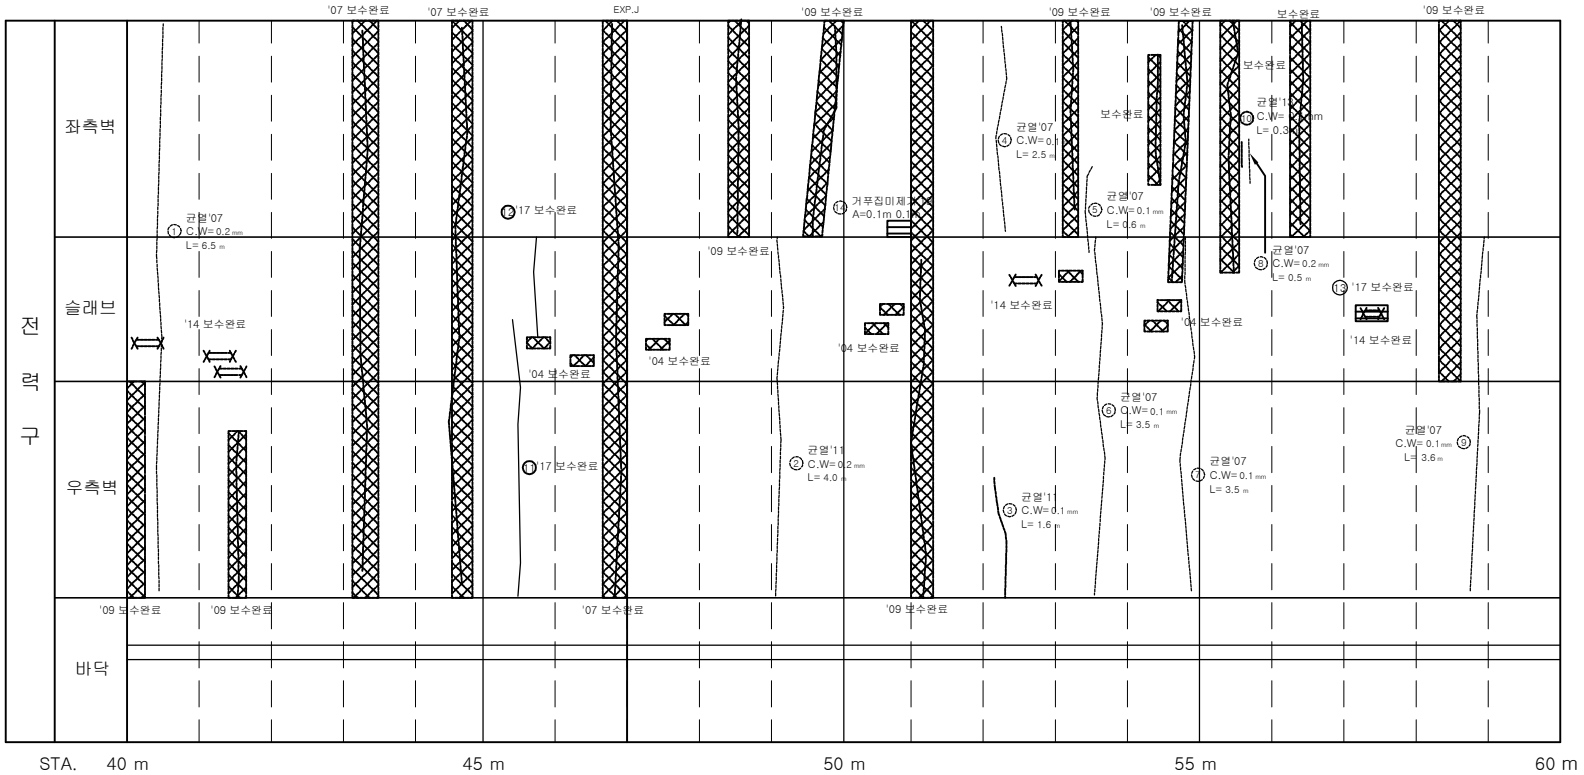

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.20	6.50		6.50	m	1				
2	2011	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
3	2011	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
4	2007	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				
5	2007	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
6	2007	균열	0.10	3.50		3.50	m	1				
7	2007	균열	0.10	3.50		3.50	m	1				
8	2007	균열	0.20	0.50		0.50	m	1				
9	2007	균열	0.10	3.60		3.60	m	1				
10	2013	균열	0.10	0.30		0.30	m	1				
11	2011	균열	0.30	2.50		2.50	m	1	2017	주입보수공법	3.00	
12	2011	균열	0.20	1.30		1.30	m	1				
13	2017	보수부들림	0.10	0.10		0.01	m'	1	2017	단면복구공법	0.01	
14	2019	거푸집미제거	0.10	0.10		0.01	m'	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 60 m ~ 80 m) 전력구 구간





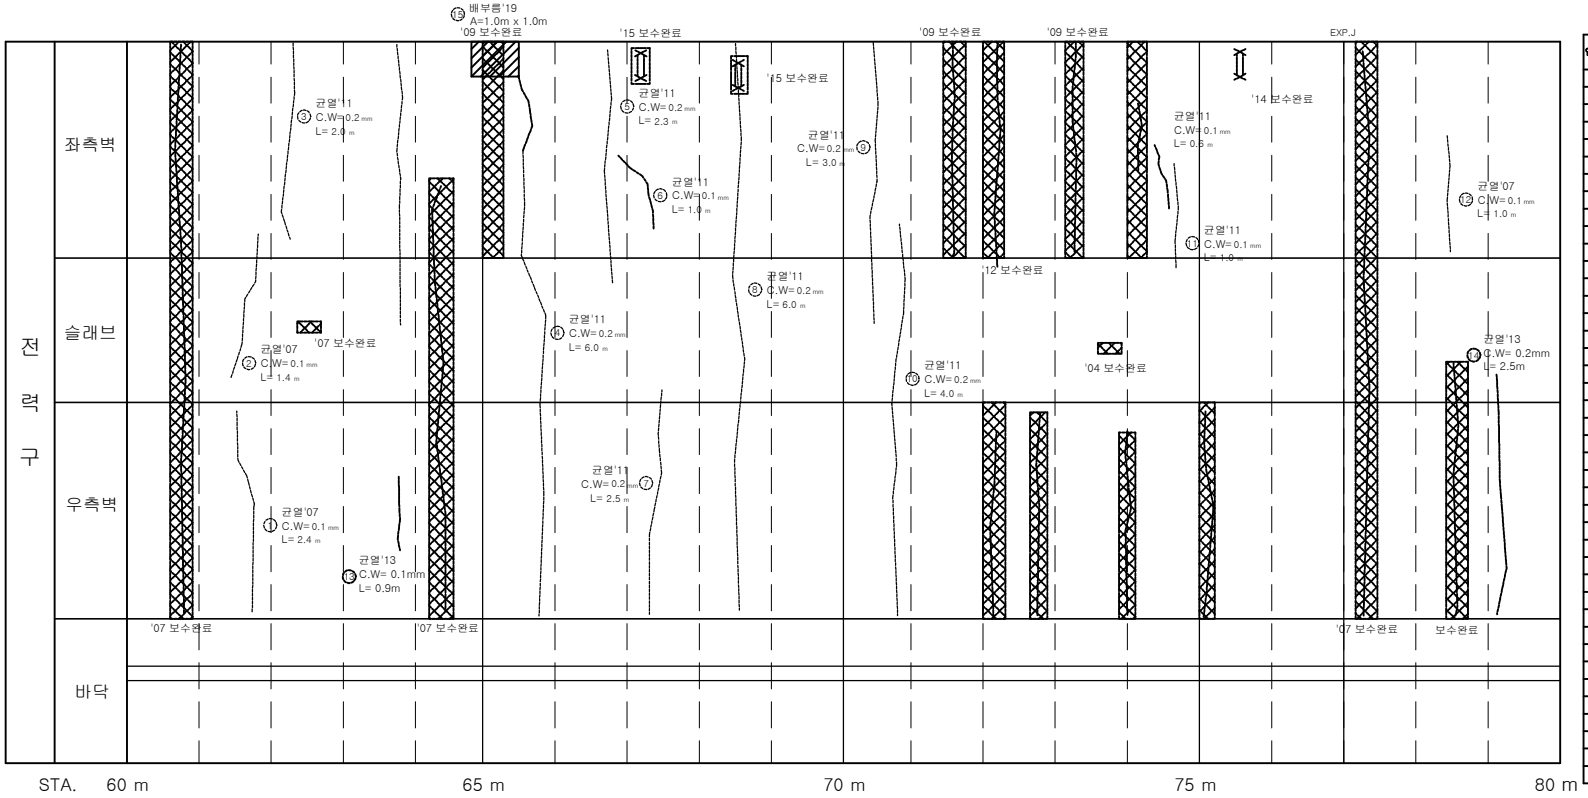

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역					비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량		
1	2007	균열	0.10	2.40		2.40	m	1					
2	2007	균열	0.10	1.40		1.40	m	1					
3	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1					
4	2011	균열	0.20	6.00		6.00	m	1					
5	2011	균열	0.20	2.30		2.30	m	1					
6	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1					
7	2011	균열	0.20	2.50		2.50	m	1					
8	2011	균열	0.20	6.00		6.00	m	1					
9	2011	균열	0.20	3.00		3.00	m	1					
10	2011	균열	0.20	4.00		4.00	m	1					
11	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1					
12	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1					
13	2013	균열	0.10	0.90		0.90	m	1					
14	2013	균열	0.20	2.50		2.50	m	1					
15	2019	배부름	1.00	1.00		1.00	ea'	1					신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA. 80 m ~100 m) 전력구 구간





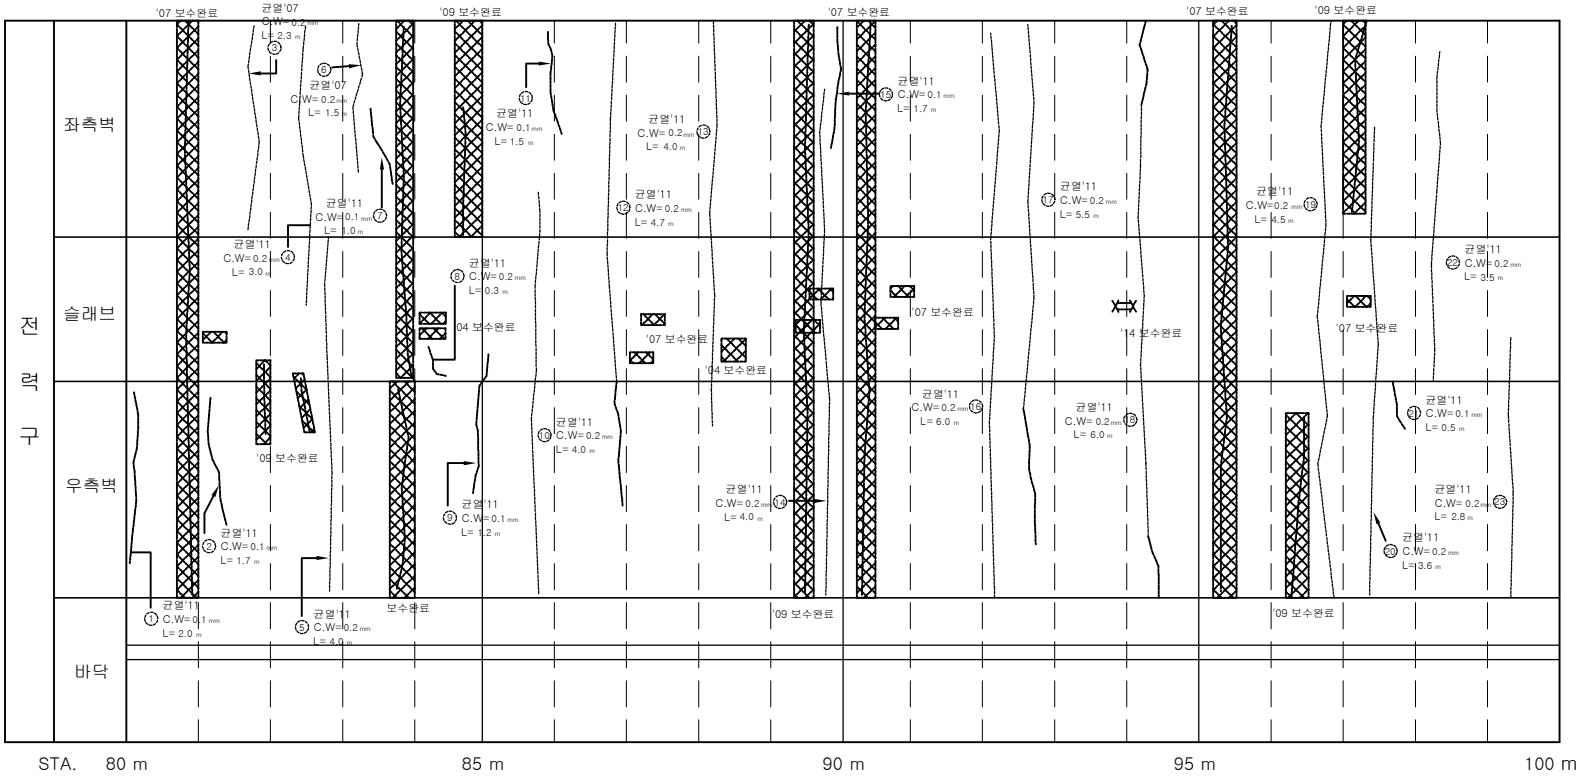

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역					비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량		
1	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1					
2	2011	균열	0.10	1.70		1.70	m	1					
3	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1					
4	2011	균열	0.20	3.00		3.00	m	1					
5	2011	균열	0.20	4.00		4.00	m	1					
6	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1					
7	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1					
8	2011	균열	0.20	0.30		0.30	m	1					
9	2011	균열	0.10	1.20		1.20	m	1					
10	2011	균열	0.20	4.00		4.00	m	1					
11	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1					
12	2011	균열	0.20	4.70		4.70	m	1					
13	2011	균열	0.20	4.00		4.00	m	1					
14	2011	균열	0.20	4.00		4.00	m	1					
15	2011	균열	0.10	1.70		1.70	m	1					
16	2011	균열	0.20	6.00		6.00	m	1					
17	2011	균열	0.20	5.50		5.50	m	1					
18	2011	균열	0.20	6.00		6.00	m	1					
19	2011	균열	0.20	4.50		4.50	m	1					
20	2011	균열	0.20	3.60		3.60	m	1					
21	2011	균열	0.10	0.50		0.50	m	1					
22	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1					
23	2011	균열	0.20	2.80		2.80	m	1					

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.100 m ~120 m) 전력구 구간





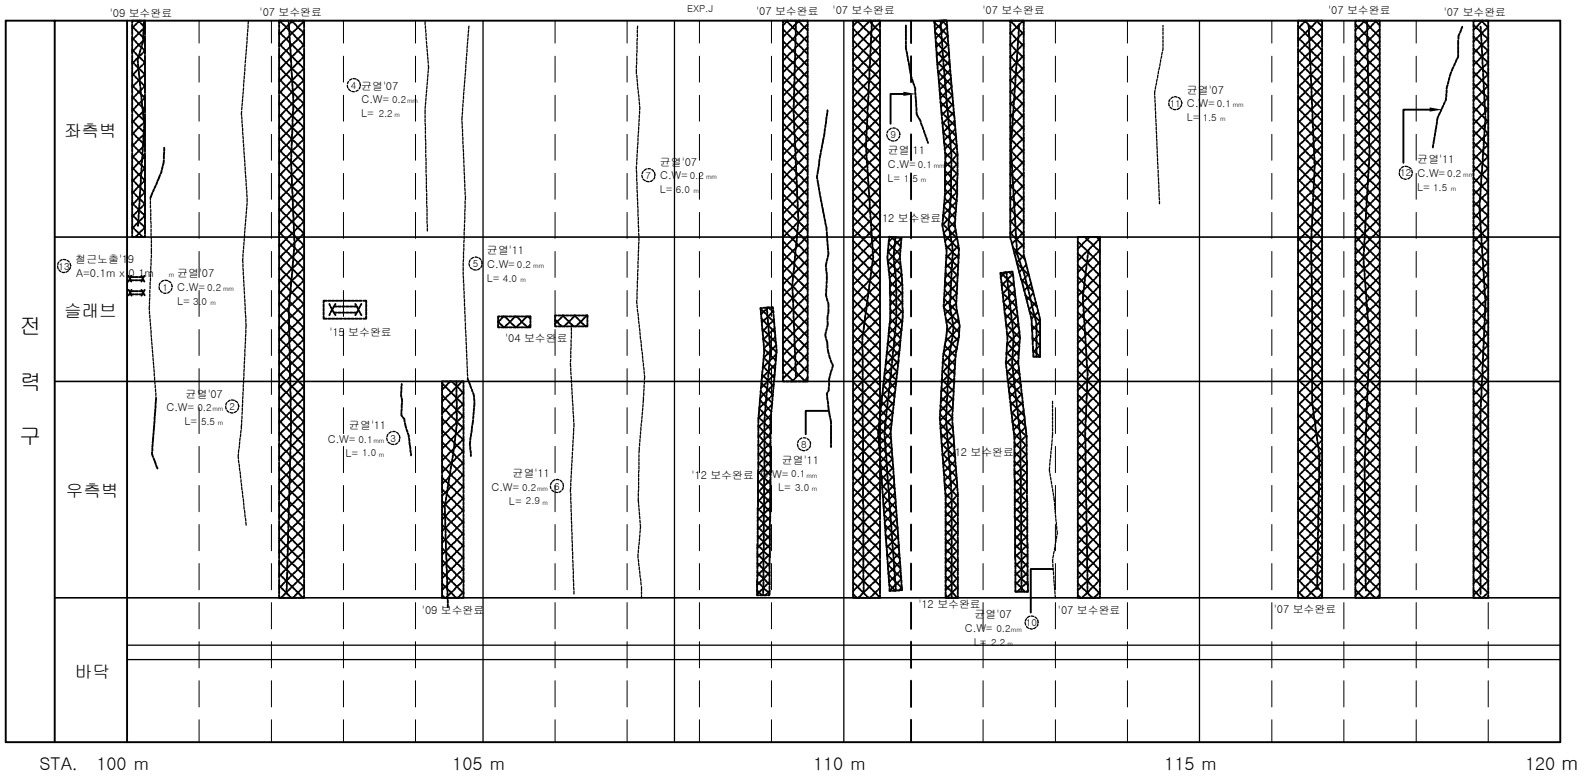

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	종량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	종량	
1	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
2	2007	균열	0.20	5.50		5.50	m	1				
3	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
4	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
5	2011	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
6	2011	균열	0.20	2.90		2.90	m	1				
7	2007	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
8	2011	균열	0.10	3.00		3.00	m	1				
9	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
10	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
11	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
12	2011	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
13	2019	철근노출	0.10	0.10		0.02	㎡	2				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.120 m ~140 m) 전력구 구간





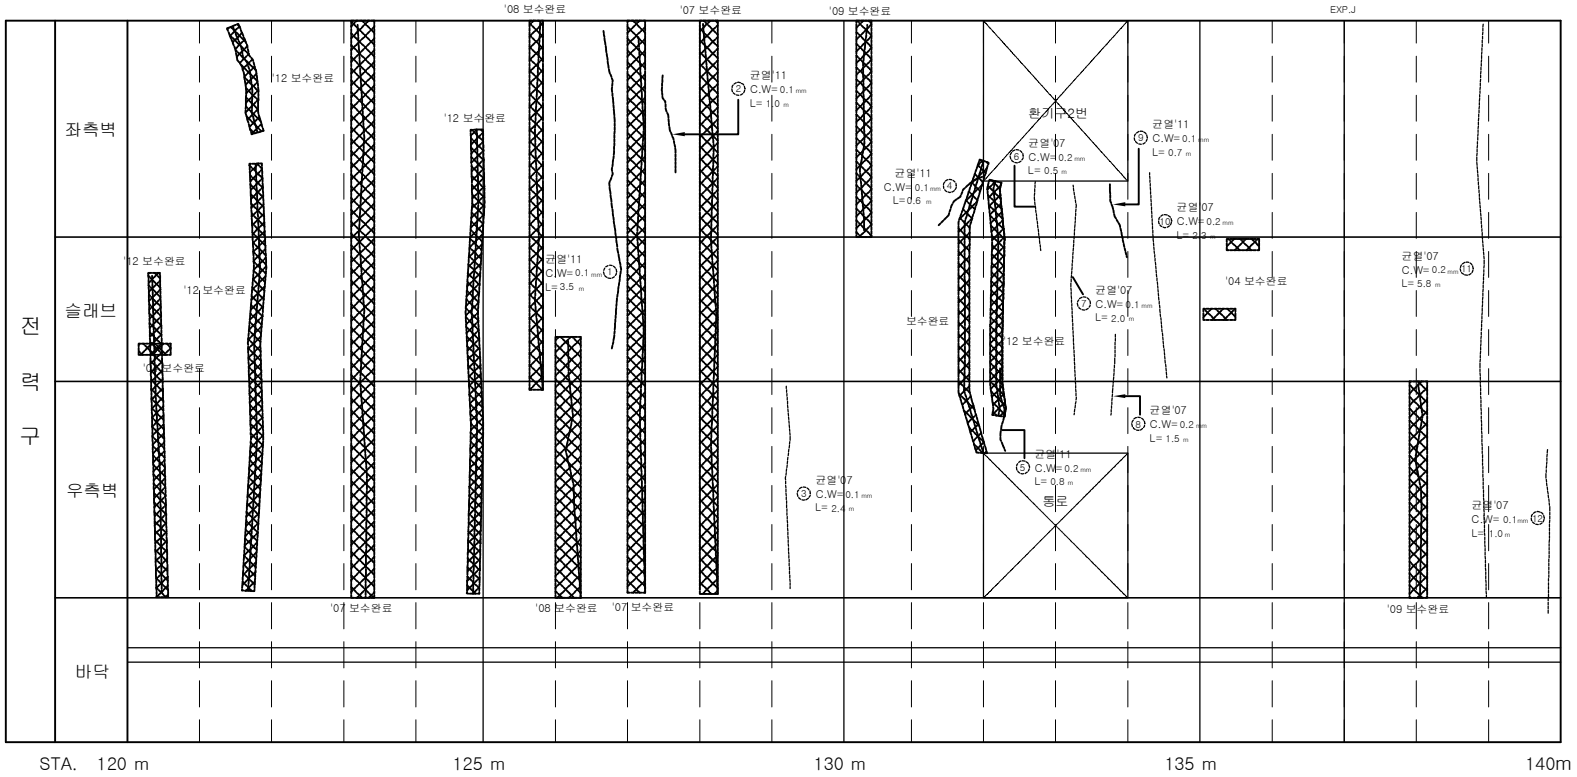

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2011	균열	0.10	3.50		3.50	m	1				
2	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
3	2007	균열	0.10	2.40		2.40	m	1				
4	2011	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
5	2011	균열	0.20	0.80		0.80	m	1				
6	2007	균열	0.20	0.50		0.50	m	1				
7	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
8	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
9	2011	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
10	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
11	2007	균열	0.20	5.80		5.80	m	1				
12	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.140 m ~160 m) 전력구 구간





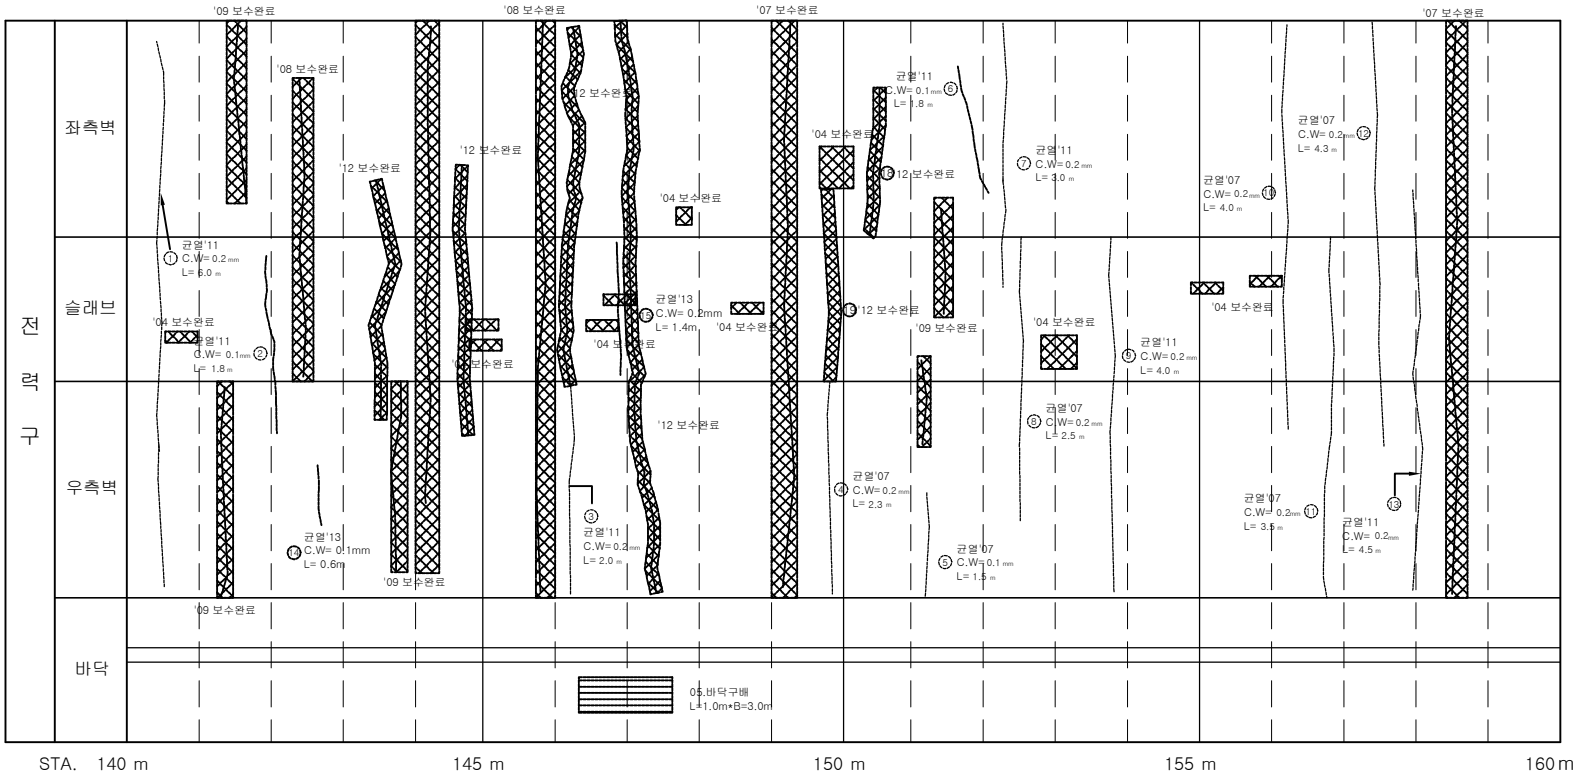

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역					비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량		
1	2011	균열	0.20	6.00		6.00	m	1					
2	2011	균열	0.10	1.80		1.80	m	1					
3	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1					
4	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1					
5	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1					
6	2011	균열	0.10	1.80		1.80	m	1					
7	2011	균열	0.20	3.00		3.00	m	1					
8	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1					
9	2011	균열	0.20	4.00		4.00	m	1					
10	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1					
11	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1					
12	2007	균열	0.20	4.30		4.30	m	1					
13	2011	균열	0.20	4.50		4.50	m	1					
14	2013	균열	0.10	0.60		0.60	m	1					
15	2013	균열	0.20	1.40		1.40	m	1					

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.160 m ~180 m) 전력구 구간





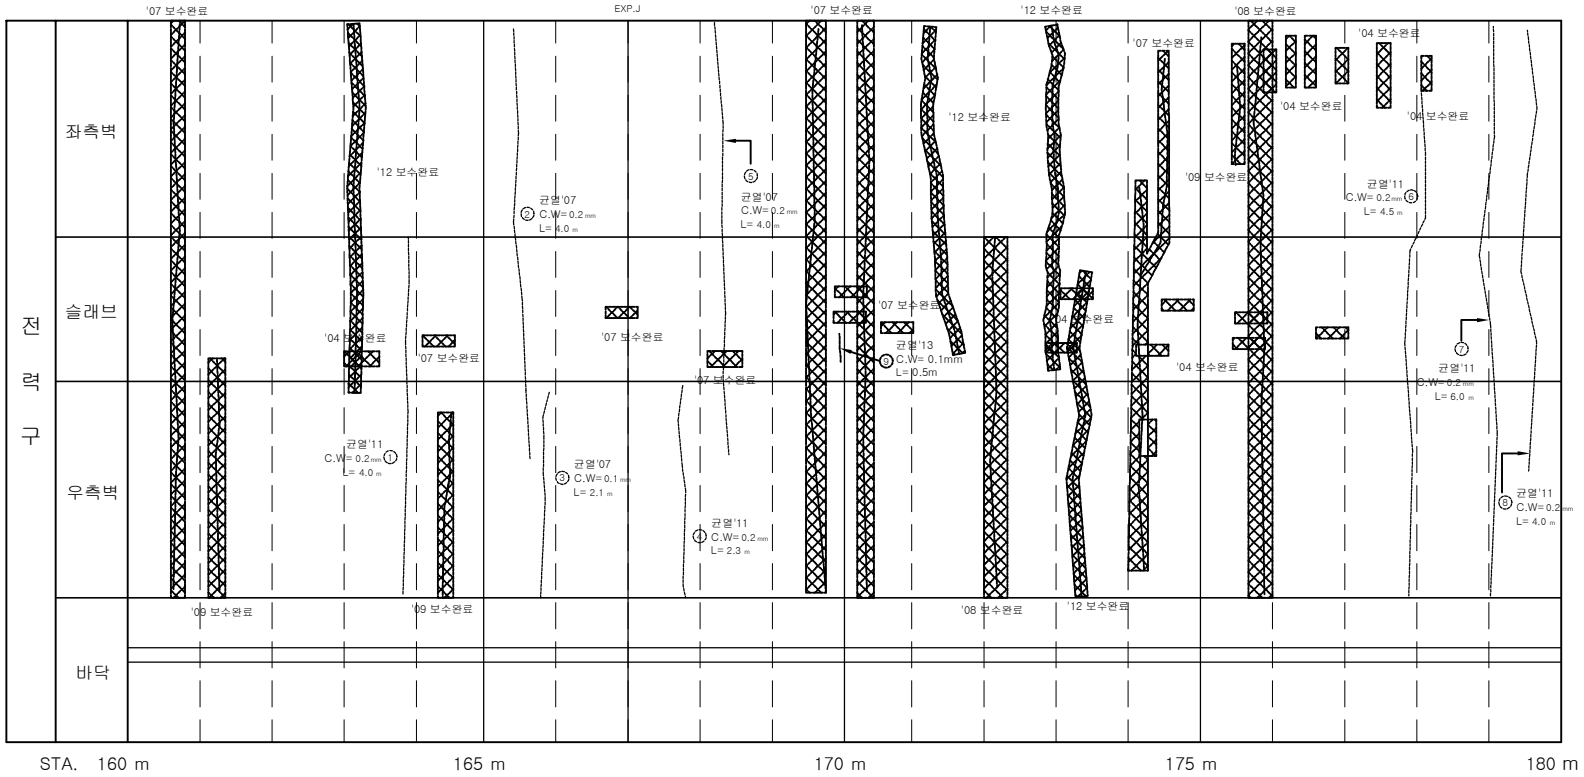

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2011	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
2	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
3	2007	균열	0.10	2.10		2.10	m	1				
4	2011	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
5	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
6	2011	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
7	2011	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
8	2011	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
9	2013	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.180 m ~200 m) 전력구 구간





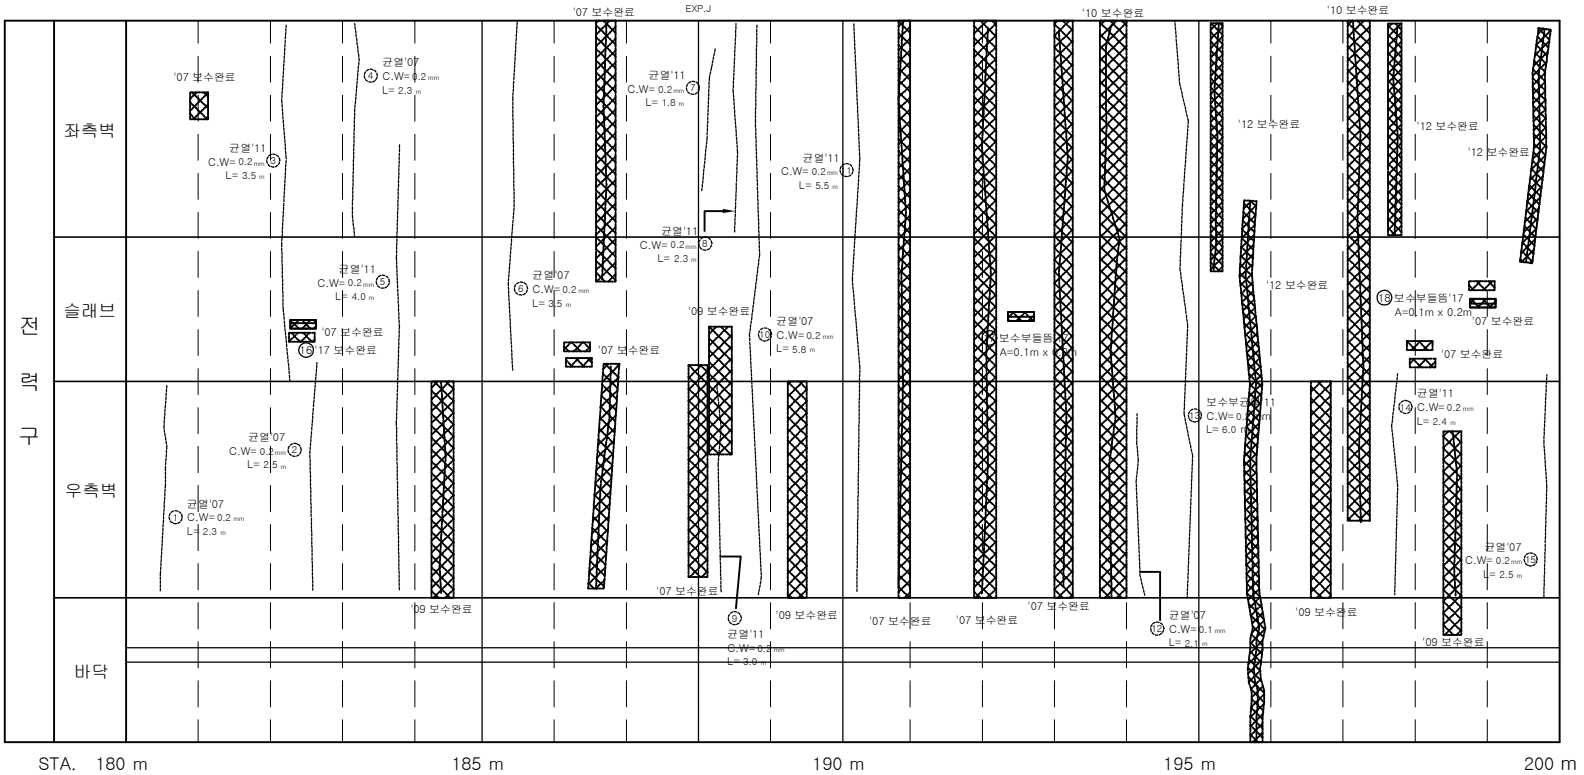

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
2	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
3	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
4	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
5	2011	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
6	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
7	2011	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
8	2011	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
9	2011	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
10	2007	균열	0.20	5.80		5.80	m	1				
11	2011	균열	0.20	5.50		5.50	m	1				
12	2007	균열	0.10	2.10		2.10	m	1				
13	2011	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
14	2011	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
15	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
16	2017	보수부들뜸	0.10	0.20		0.02	㎡	1	2017	단면복구공법	0.02	
17	2017	보수부들뜸	0.10	0.20		0.02	㎡	1				재결함
18	2017	보수부들뜸	0.10	0.20		0.02	㎡	1				재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.200 m ~220 m) 전력구 구간





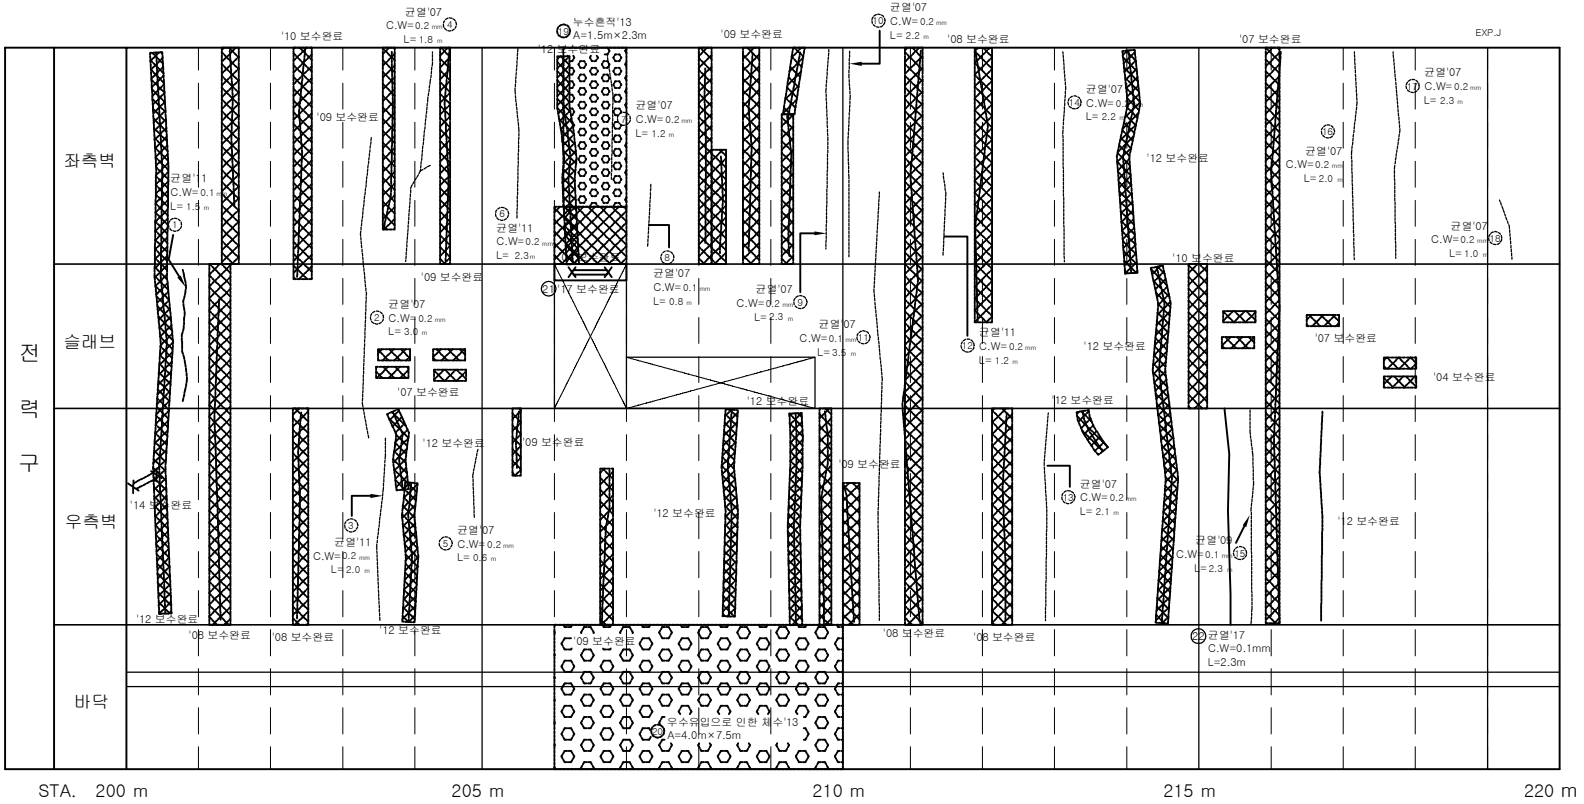

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
2	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
3	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
4	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
5	2007	균열	0.20	0.60		0.60	m	1				
6	2011	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
7	2007	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
8	2007	균열	0.10	0.80		0.80	m	1				
9	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
10	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
11	2007	균열	0.10	3.50		3.50	m	1				
12	2011	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
13	2007	균열	0.20	2.10		2.10	m	1				
14	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
15	2009	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
16	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
17	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
18	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
19	2013	누수흔적		3.45		3.45	㎡	1				
20	2013	제수		30.00		30.00	㎡	1				
21	2017	철근노출	1.00	0.40		0.40	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.48	
22	2017	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.220 m ~240 m) 전력구 구간





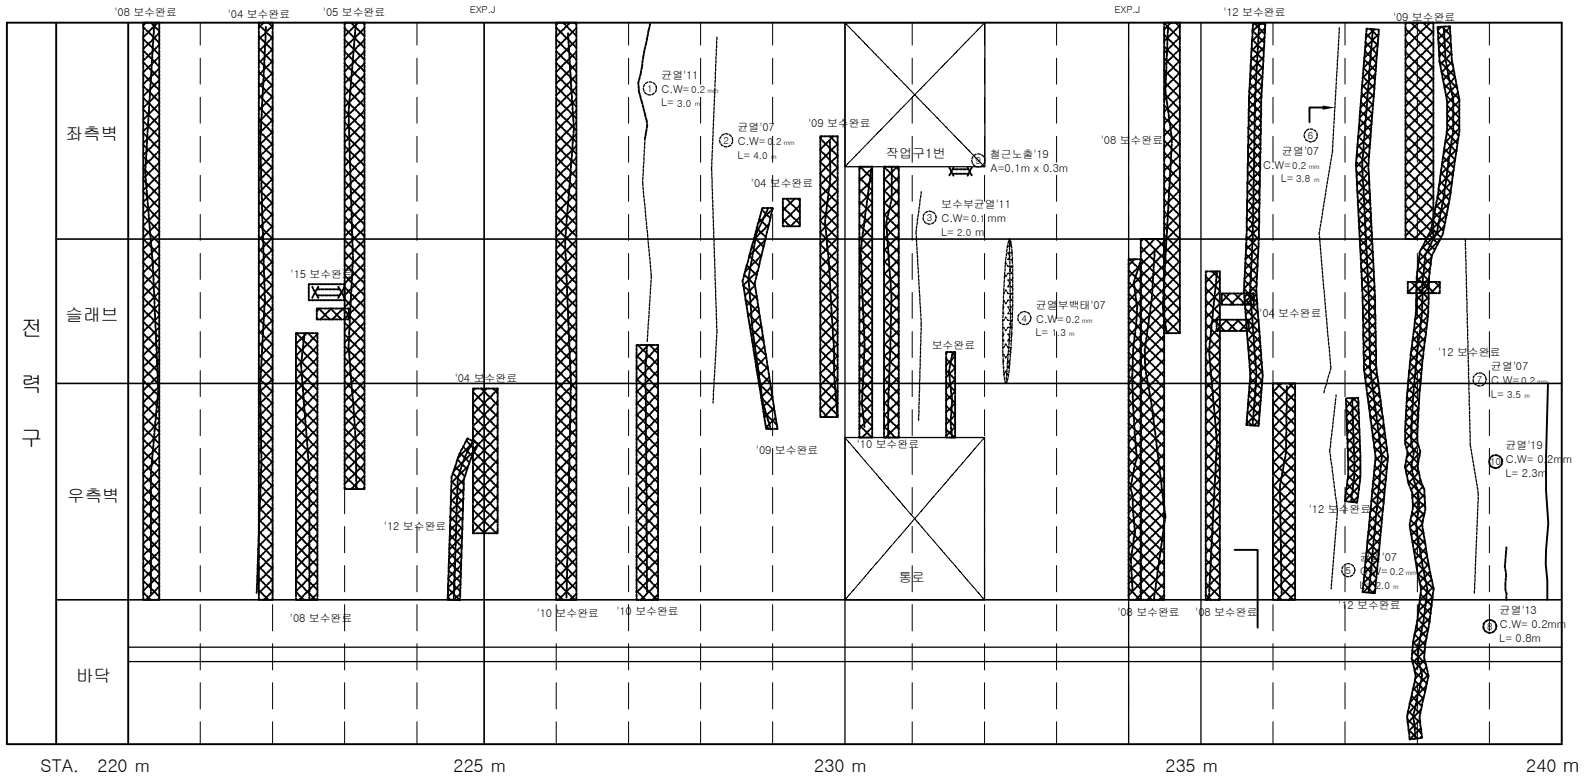

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2011	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
2	2007	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
3	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
4	2007	균열부백태	0.20	1.30		1.30	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
6	2007	균열	0.20	3.80		3.80	m	1				
7	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				실매장
8	2013	균열	0.20	0.80		0.80	m	1				
9	2019	철근노출	0.10	0.30		0.03	m²	1				신규
10	2019	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.240 m ~260 m) 전력구 구간





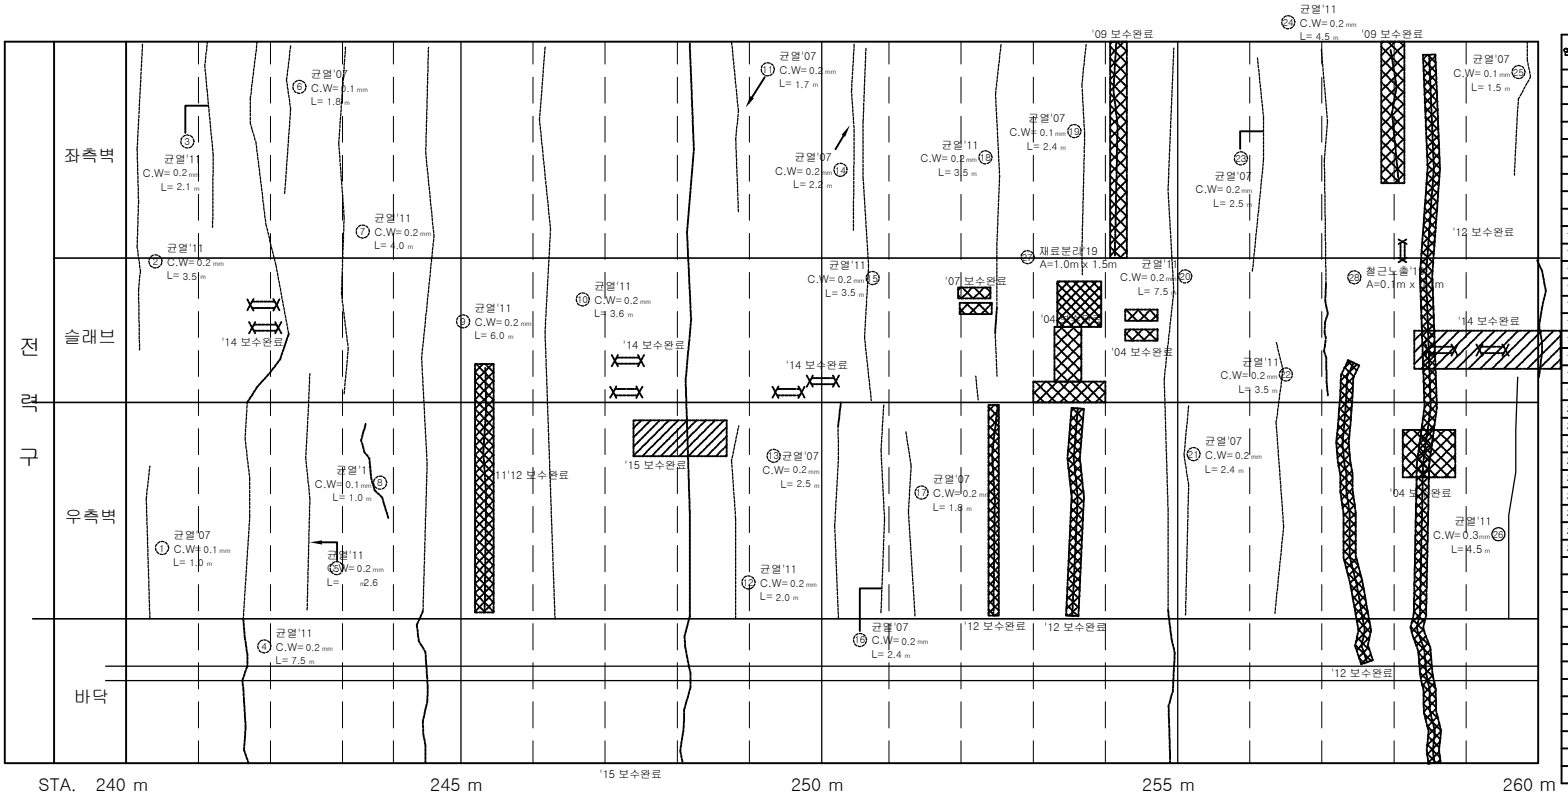

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역					비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량		
1	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1					
2	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1					
3	2011	균열	0.20	2.10		2.10	m	1					
4	2011	균열	0.20	7.50		7.50	m	1					
5	2011	균열	0.20	2.60		2.60	m	1					
6	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1					
7	2011	균열	0.20	4.00		4.00	m	1					
8	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1					
9	2011	균열	0.20	6.00		6.00	m	1					
10	2011	균열	0.20	3.60		3.60	m	1					
11	2007	균열	0.20	1.70		1.70	m	1					
12	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1					
13	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1					
14	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1					
15	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1					
16	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1					
17	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1					
18	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1					
19	2007	균열	0.10	2.40		2.40	m	1					
20	2011	균열	0.20	7.50		7.50	m	1					
21	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1					
22	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1					
23	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1					
24	2011	균열	0.20	4.50		4.50	m	1					
25	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1					
26	2011	균열	0.30	4.50		4.50	m	1	2017	주입보수공법	5.40		
27	2019	재료분리	1.00	1.50		1.50	㎡	1					신규
28	2019	철근노출	0.10	0.10		0.01	㎡	1					신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.260 m ~280 m) 전력구 구간





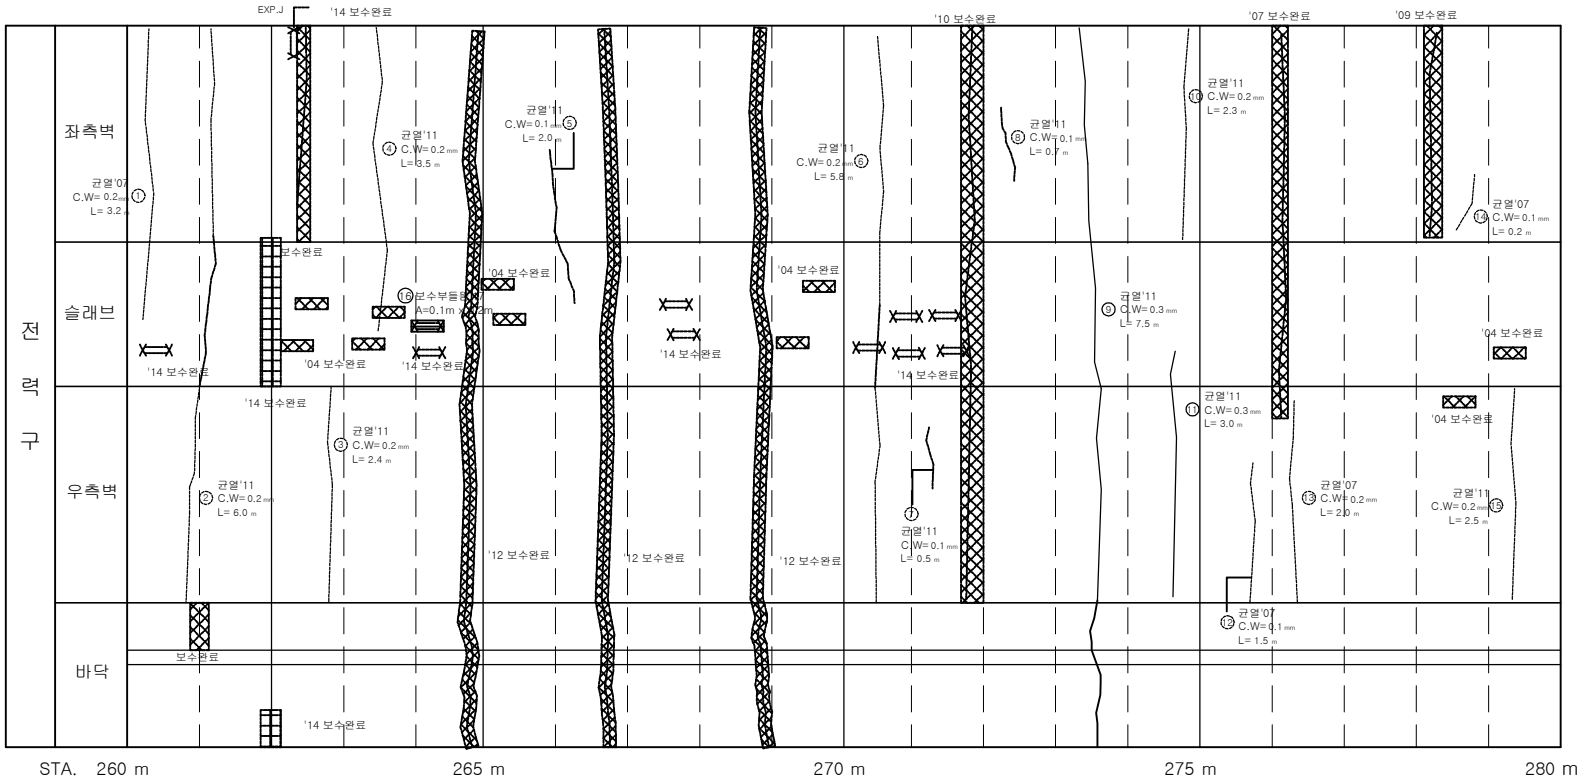

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.20	3.20		3.20	m	1				
2	2011	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
3	2011	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
4	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
5	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
6	2011	균열	0.20	5.80		5.80	m	1				
7	2011	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
8	2011	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
9	2011	균열	0.30	7.50		7.50	m	1	2017	주입보수공법	9.00	
10	2011	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
11	2011	균열	0.20	3.00		3.00	m	1	2017	표면처리공법	3.60	
12	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
13	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
14	2007	균열	0.10	0.20		0.20	m	1				
15	2011	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
16	2017	보수부들림	0.10	0.20		0.02	㎡	1				재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.280 m ~300 m) 전력구 구간





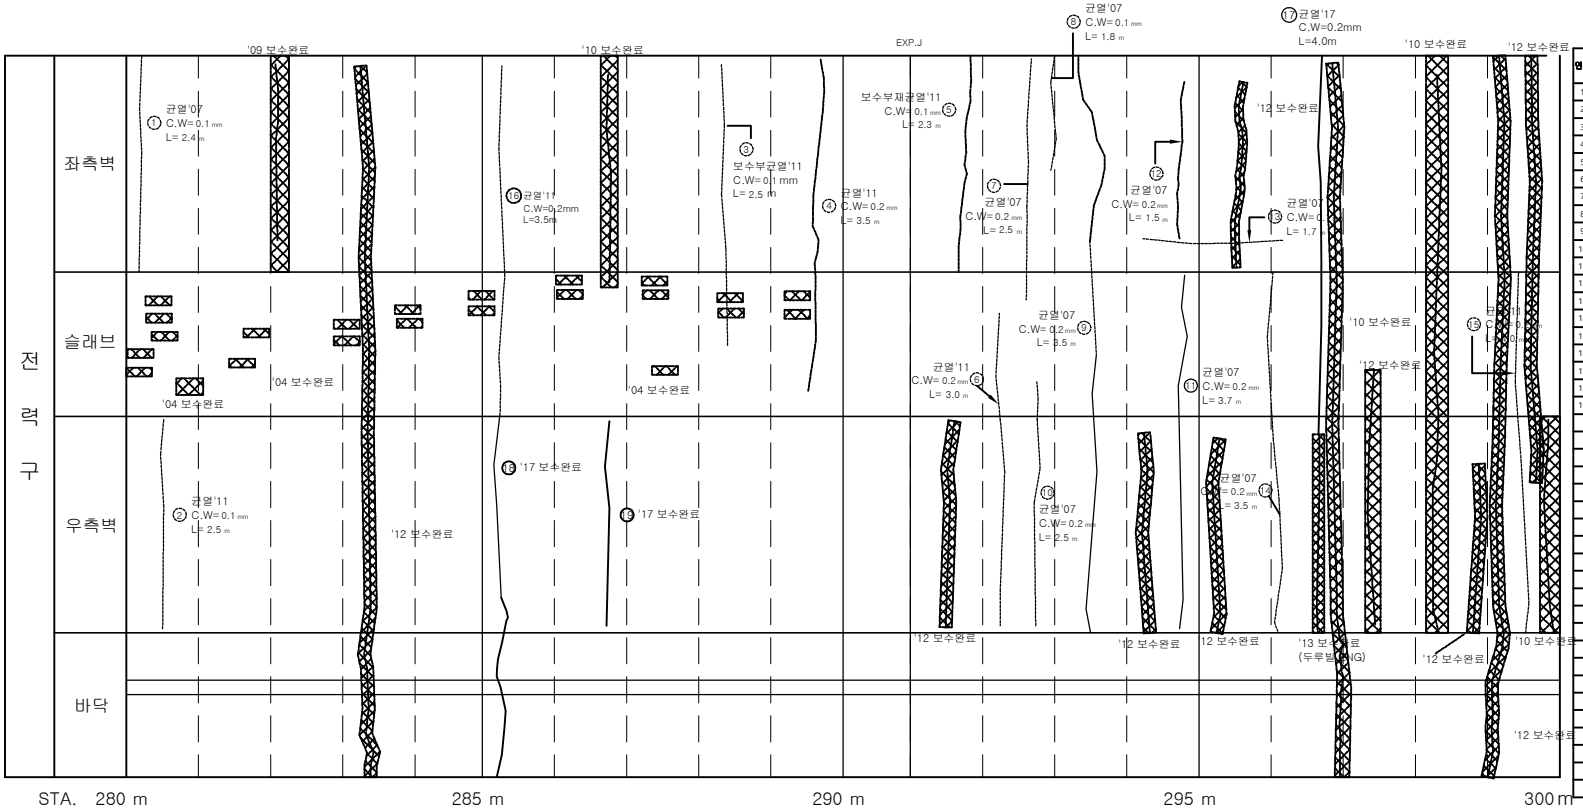

손 상 물 량 표

연번	제출연도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.10	2.40		2.40	m	1				
2	2011	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				
3	2011	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				
4	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
5	2011	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
6	2011	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
7	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
8	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
9	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
10	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
11	2007	균열	0.20	3.70		3.70	m	1	2017	표면처리공법	4.44	
12	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
13	2007	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
14	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
15	2011	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
16	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
17	2017	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
18	2011	균열	0.20	7.50		7.50	m	1	2017	표면처리공법	2.25	
19	2011	균열	0.30	2.00		2.00	m	1	2017	주입보수공법	2.40	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.300 m ~320 m) 전력구 구간





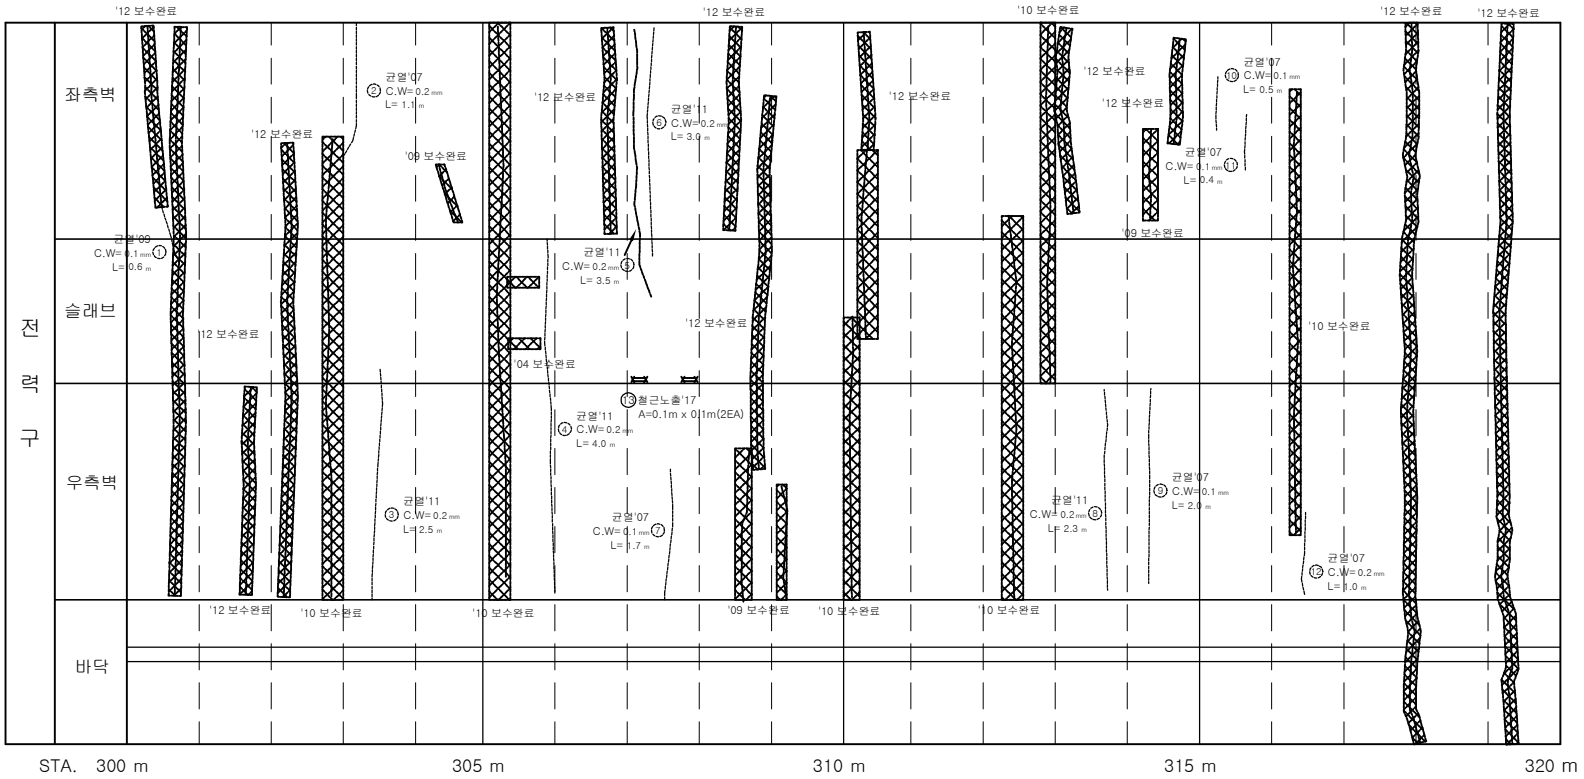

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역					비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량		
1	2009	균열	0.10	0.60		0.60	m	1					
2	2007	균열	0.20	1.10		1.10	m	1					
3	2011	균열	0.20	2.50		2.50	m	1					
4	2011	균열	0.20	4.00		4.00	m	1					
5	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1					
6	2011	균열	0.20	3.00		3.00	m	1					
7	2007	균열	0.10	1.70		1.70	m	1					
8	2011	균열	0.20	2.30		2.30	m	1					
9	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1					
10	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1					
11	2007	균열	0.10	0.40		0.40	m	1					
12	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1					
13	2017	철근노출	0.10	0.10		0.02	㎡	2					중요

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.320 m ~340 m) 전력구 구간





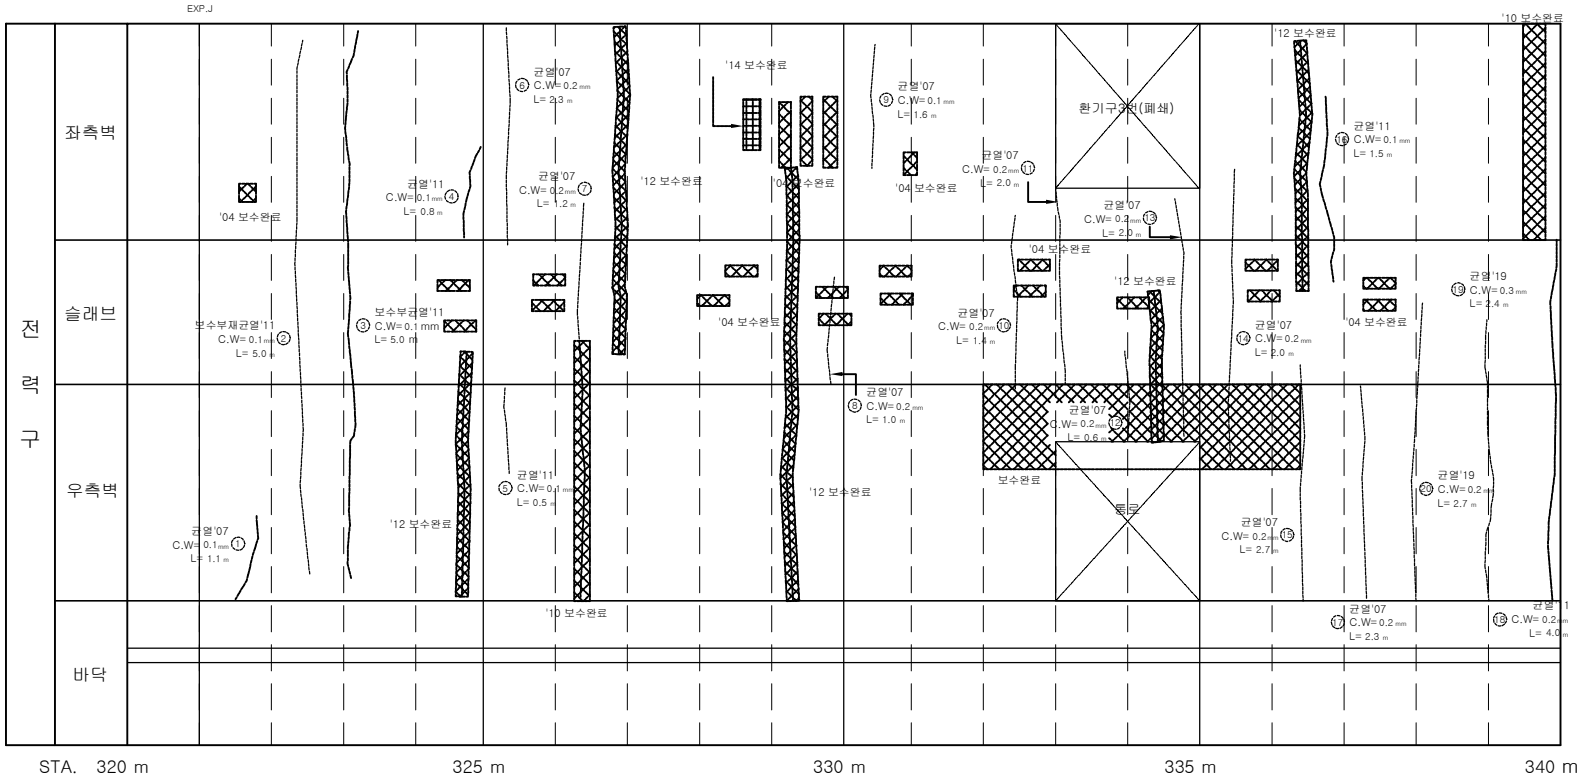

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역					비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명		총량	
1	2007	균열	0.10	1.10		1.10	m	1					
2	2011	보수부균열	0.10	5.00		5.00	m	1					재결함
3	2011	균열	0.10	5.00		5.00	m	1					
4	2011	균열	0.10	0.80		0.80	m	1					
5	2011	균열	0.10	0.50		0.50	m	1					
6	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1					
7	2007	균열	0.20	1.20		1.20	m	1					
8	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1					
9	2007	균열	0.10	1.60		1.60	m	1					
10	2007	균열	0.20	1.40		1.40	m	1					
11	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1					
12	2007	균열	0.20	0.60		0.60	m	1					
13	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1					
14	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1					
15	2007	균열	0.20	2.70		2.70	m	1					
16	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1					
17	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1					
18	2011	균열	0.20	4.00		4.00	m	1					
19	2019	균열	0.30	2.40		2.40	m	1					신규
20	2019	균열	0.20	2.70		2.70	m	1					신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.340 m ~360 m) 전력구 구간





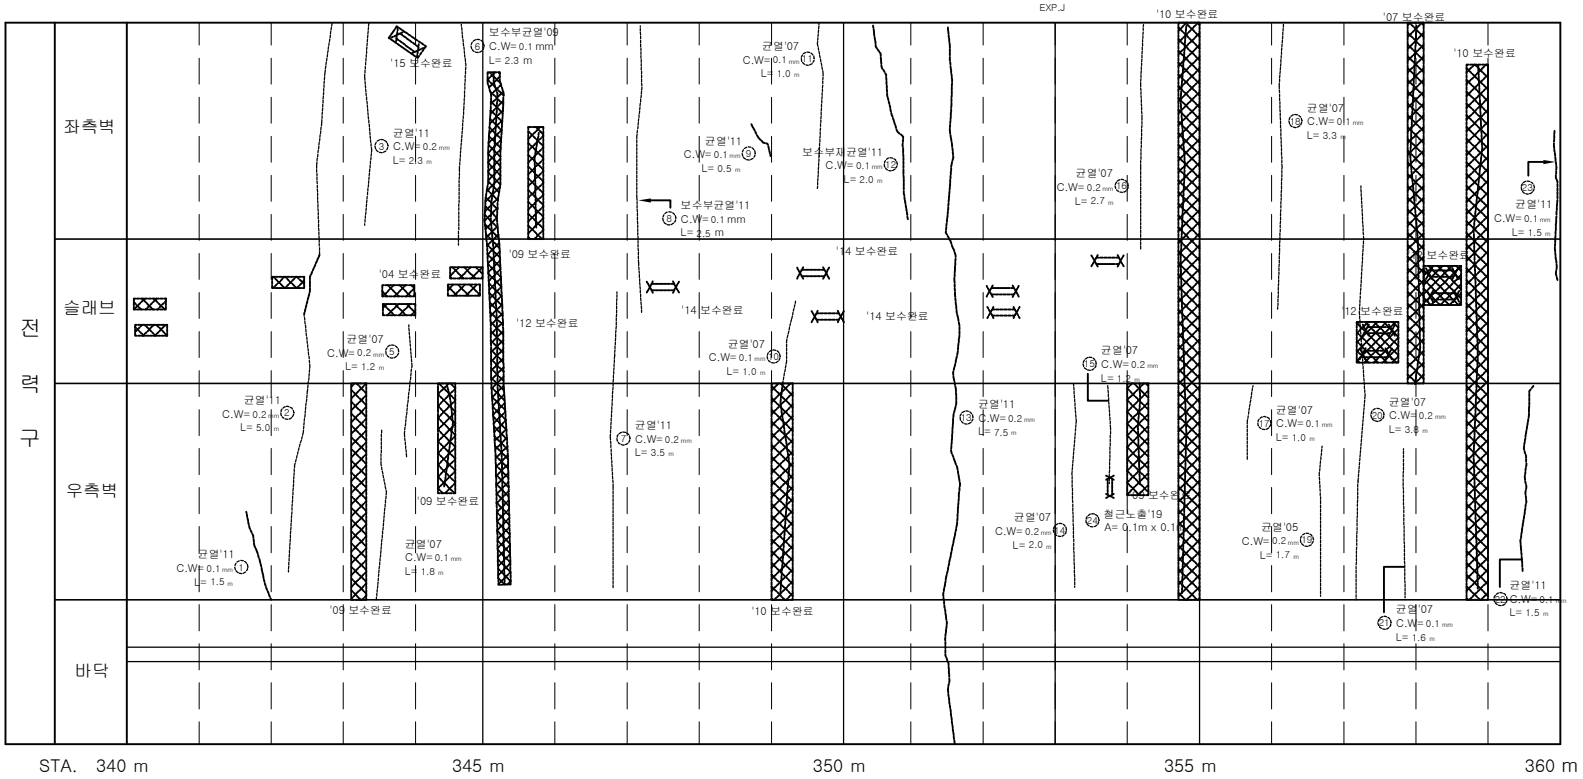

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역					비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량		
1	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1					
2	2011	균열	0.20	5.00		5.00	m	1					
3	2011	균열	0.20	2.30		2.30	m	1					
4	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1					
5	2007	균열	0.20	1.20		1.20	m	1					
6	2009	균열	0.10	2.30		2.30	m	1					
7	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1					
8	2011	균열	0.10	2.50		2.50	m	1					
9	2011	균열	0.10	0.50		0.50	m	1					
10	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1					
11	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1					
12	2011	보수부균열	0.10	2.00		2.00	m	1					재결함
13	2011	균열	0.20	7.50		7.50	m	1					
14	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1					
15	2007	균열	0.20	1.20		1.20	m	1					
16	2007	균열	0.20	2.70		2.70	m	1					
17	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1					
18	2007	균열	0.10	3.30		3.30	m	1					
19	2007	균열	0.20	1.70		1.70	m	1					
20	2007	균열	0.20	3.80		3.80	m	1					
21	2007	균열	0.10	1.60		1.60	m	1					
22	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1					
23	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1					
24	2019	철근노출	0.10	0.10		0.01	㎡	1					신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.360 m ~380 m) 전력구 구간





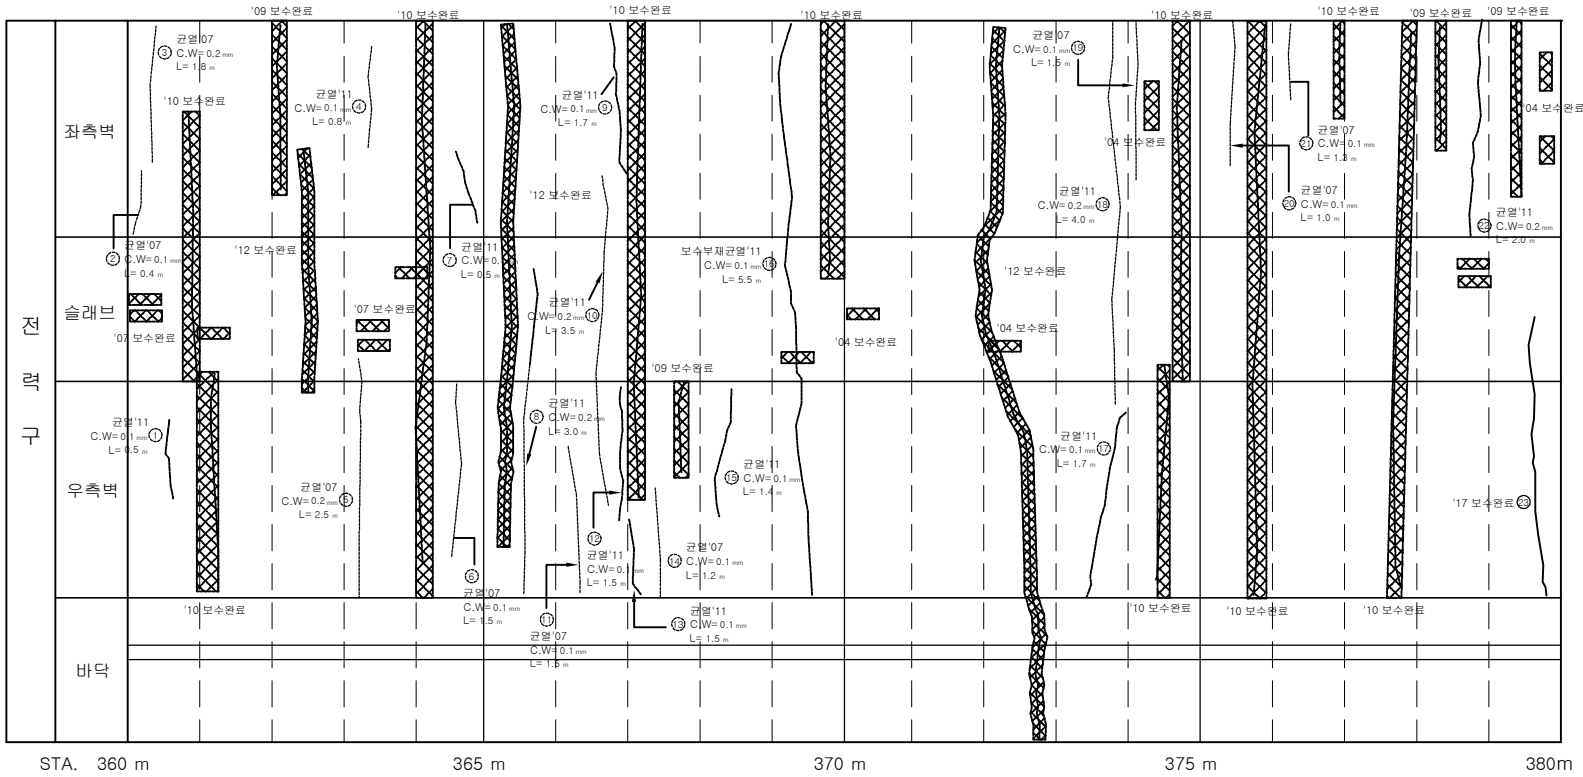

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2011	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
2	2007	균열	0.10	0.40		0.40	m	1				
3	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
4	2011	균열	0.10	0.80		0.80	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
6	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
7	2011	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
8	2011	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
9	2011	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
10	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
11	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
12	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
13	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
14	2007	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
15	2011	균열	0.10	1.40		1.40	m	1				
16	2011	균열	0.10	5.50		5.50	m	1				
17	2011	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
18	2011	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
19	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
20	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
21	2007	균열	0.10	1.30		1.30	m	1				
22	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
23	2011	균열	0.20	4.00		4.00	m	1	2017	표면처리공법	1.20	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.380 m ~400 m) 전력구 구간





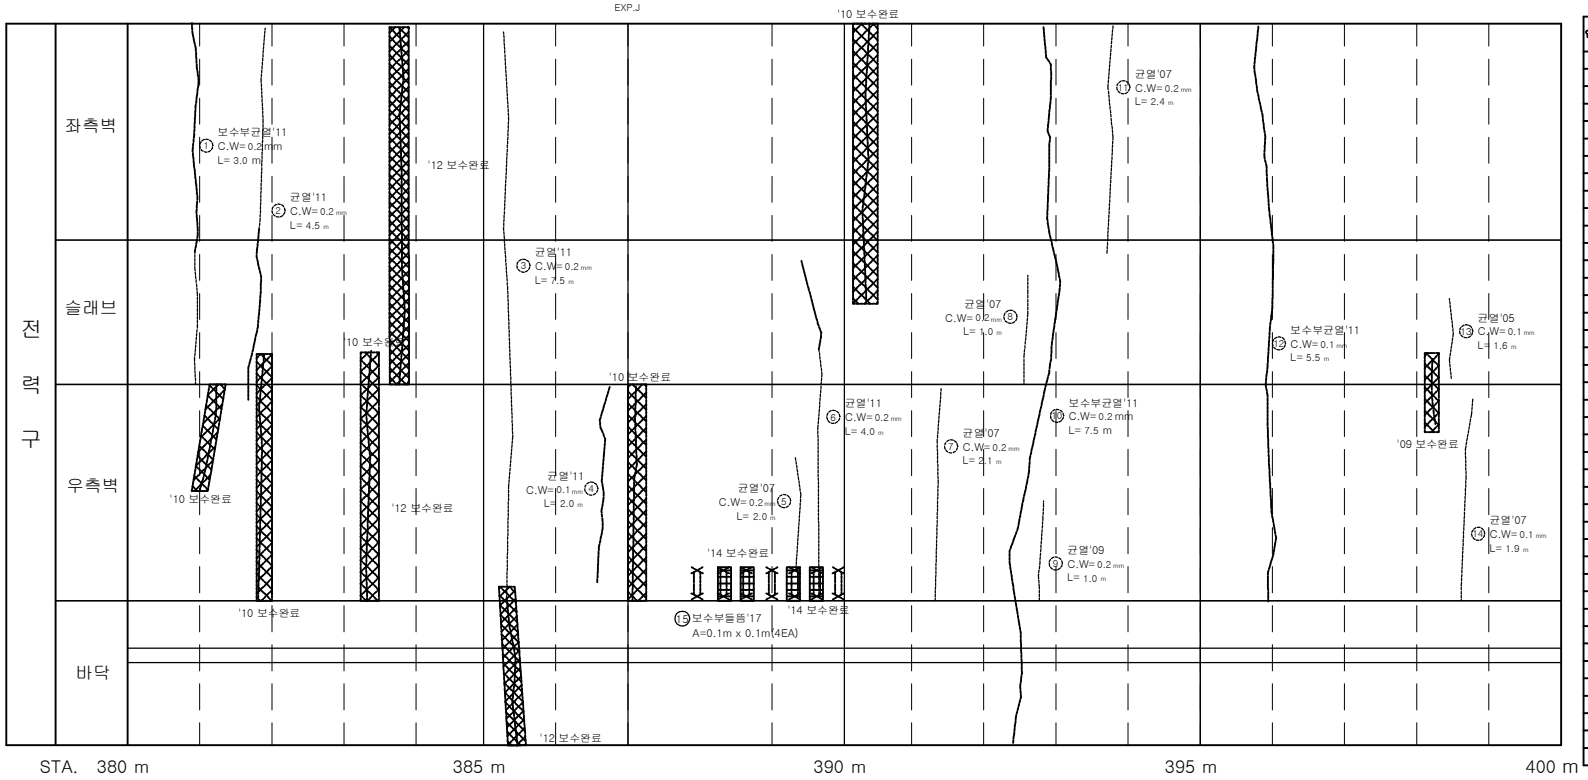

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2011	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
2	2011	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
3	2011	균열	0.20	7.50		7.50	m	1				
4	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
6	2011	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
7	2007	균열	0.20	2.10		2.10	m	1				
8	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
9	2009	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
10	2011	균열	0.20	7.50		7.50	m	1				
11	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
12	2011	보수부균열	0.10	5.50		5.50	m	1				재결함
13	2005	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
14	2007	균열	0.10	1.90		1.90	m	1				
15	2017	보수부들뜸	0.10	0.10		0.04	㎡	4				재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.400 m ~420 m) 전력구 구간





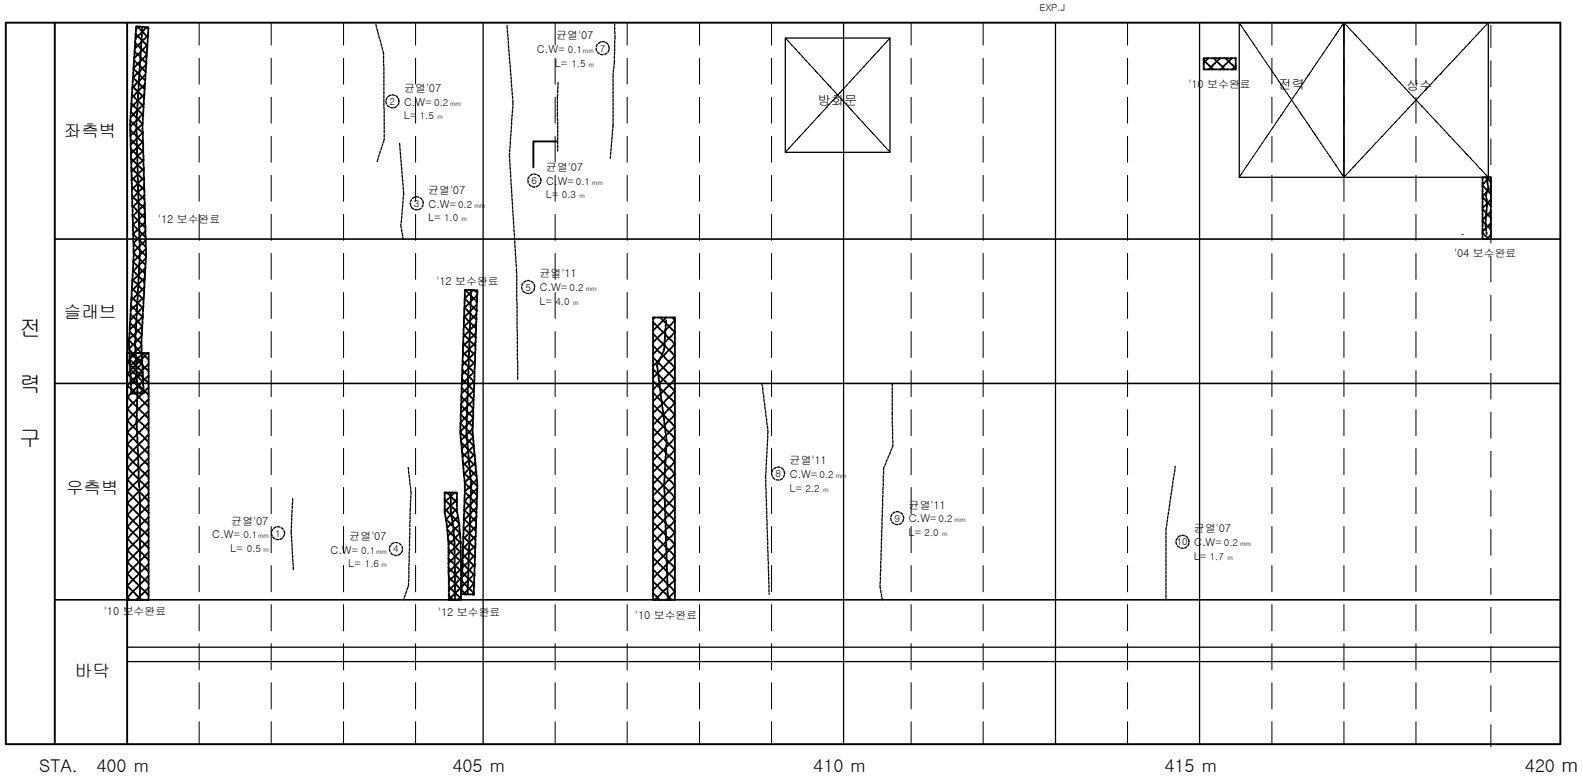

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역					비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량		
1	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1					
2	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1					
3	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1					
4	2007	균열	0.10	1.60		1.60	m	1					
5	2011	균열	0.20	4.00		4.00	m	1					
6	2007	균열	0.10	0.30		0.30	m	1					
7	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1					
8	2011	균열	0.20	2.20		2.20	m	1					
9	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1					
10	2007	균열	0.20	1.70		1.70	m	1					

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.420 m ~440 m) 전력구 구간





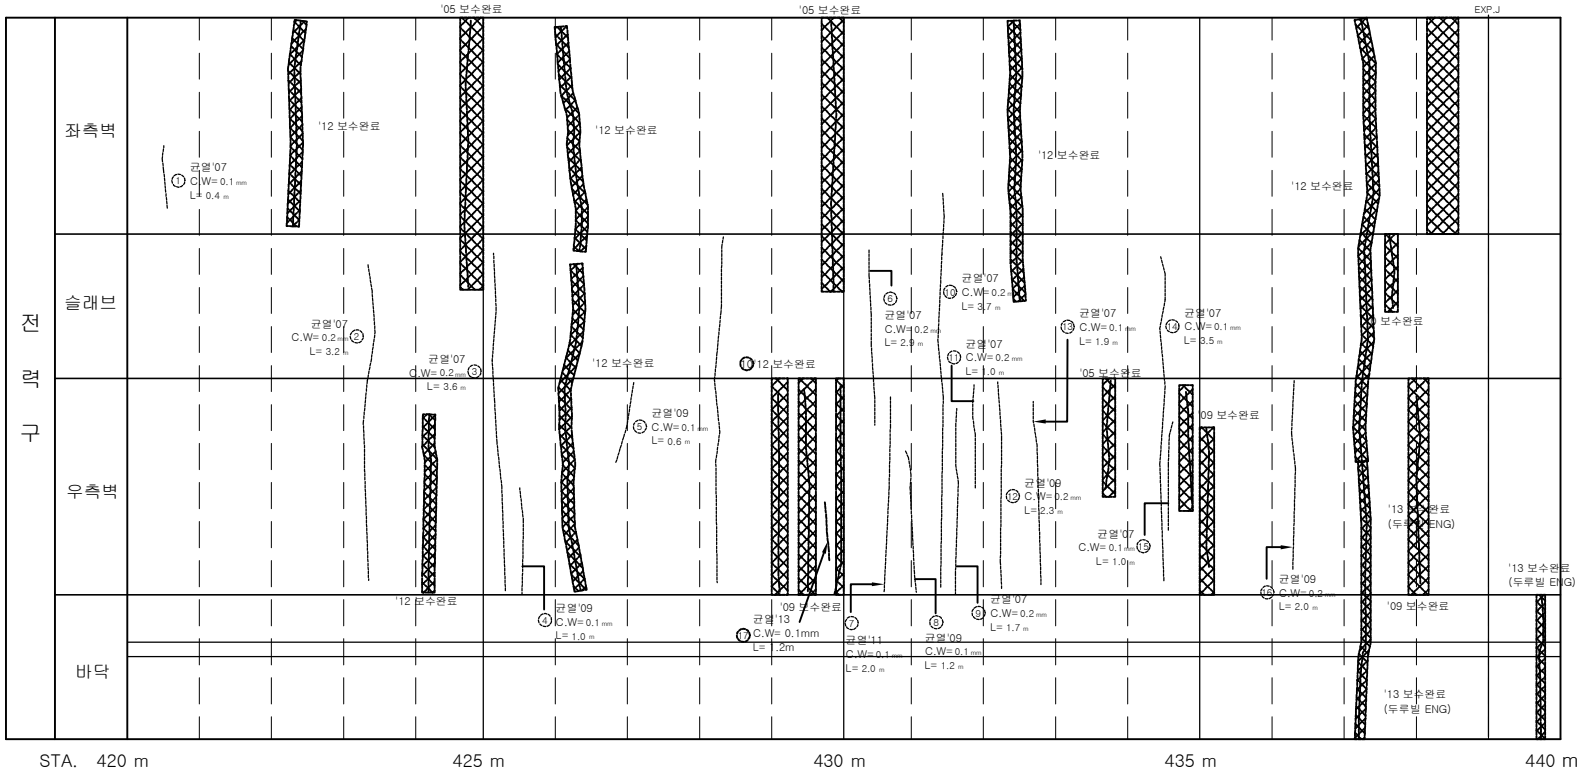

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.10	0.40		0.40	m	1				
2	2007	균열	0.20	3.20		3.20	m	1				
3	2007	균열	0.20	3.60		3.60	m	1				
4	2009	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
5	2009	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.90		2.90	m	1				
7	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
8	2009	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
9	2007	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
10	2007	균열	0.20	3.70		3.70	m	1				
11	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
12	2009	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
13	2007	균열	0.10	1.90		1.90	m	1				
14	2007	균열	0.10	3.50		3.50	m	1				
15	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
16	2009	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
17	2013	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.440 m ~460 m) 전력구 구간





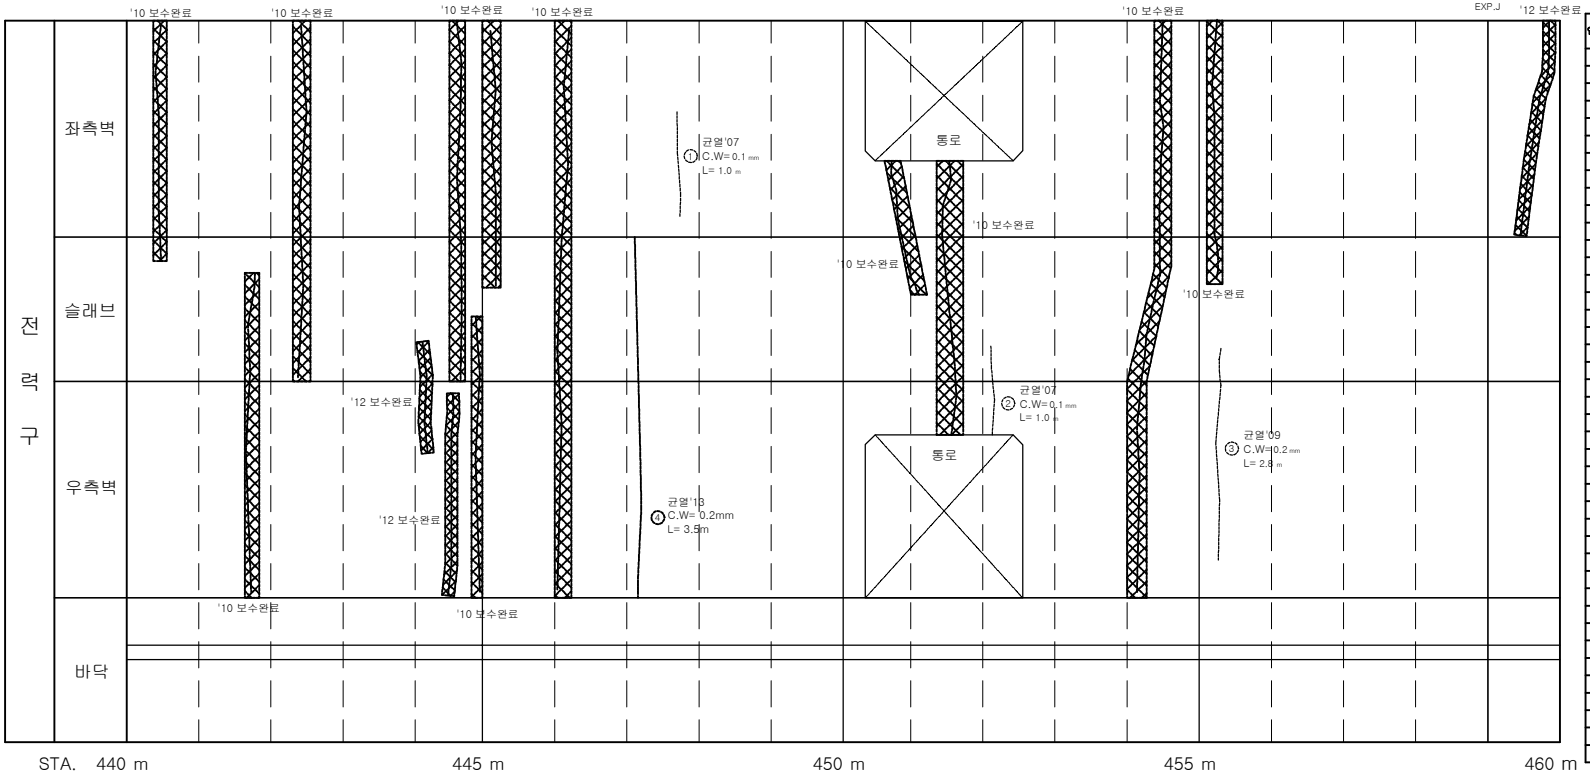

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
2	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
3	2009	균열	0.20	2.80		2.80	m	1				
4	2013	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				일이중가

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.460 m ~480 m) 전력구 구간





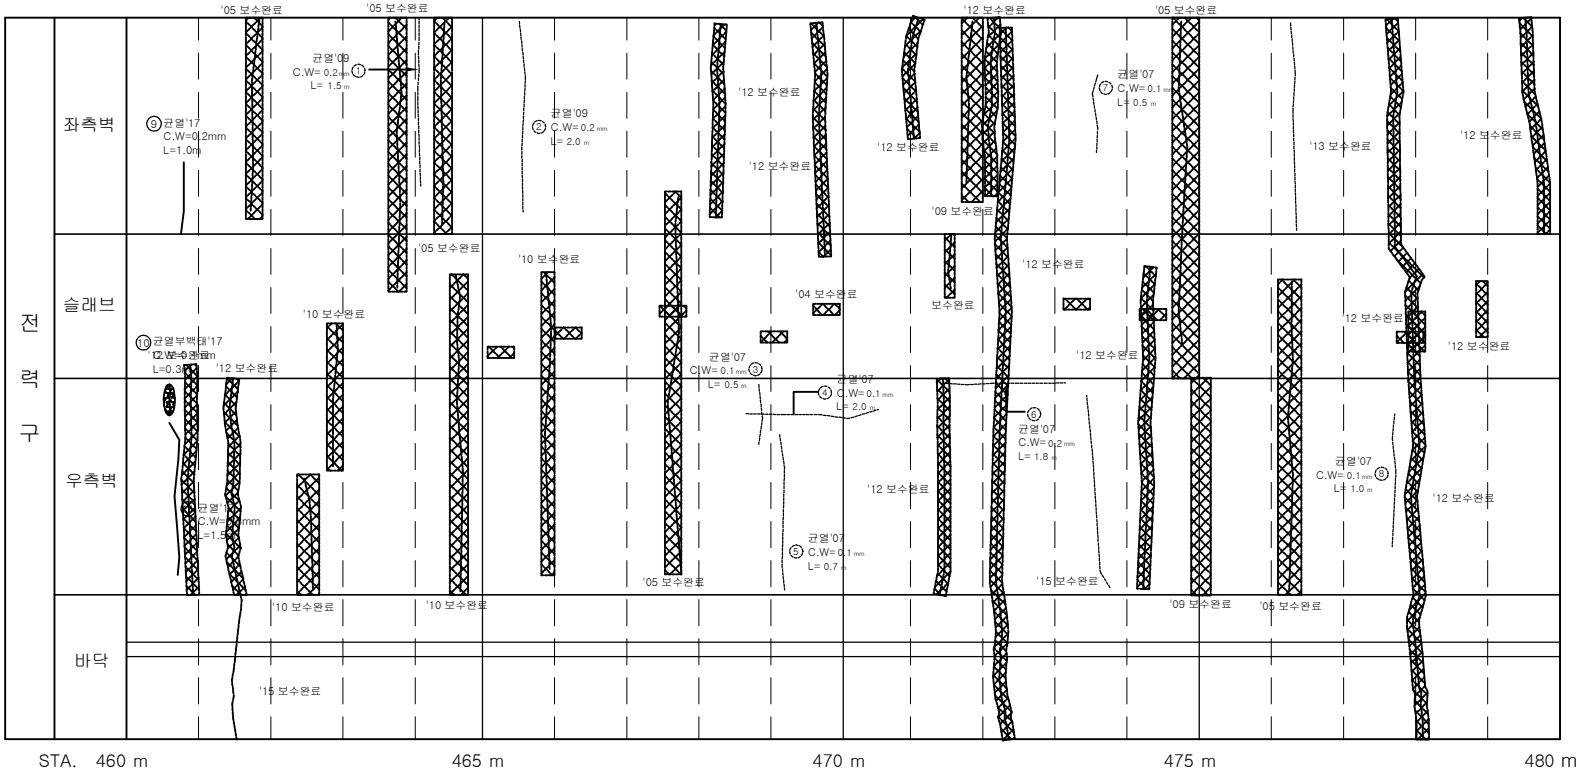

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역					비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량		
1	2009	균열	0.20	1.50		1.50	m	1					
2	2009	균열	0.20	2.00		2.00	m	1					
3	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1					
4	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1					
5	2007	균열	0.10	0.70		0.70	m	1					
6	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1					
7	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1					
8	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1					
9	2017	균열	0.20	1.00		1.00	m	1					신규
10	2017	균열부백태	0.10	0.30		0.30	m	1					신규
11	2017	균열	0.30	1.50		1.50	m	1					중요

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 - 중대로(STA.480 m ~500 m) 전력구 구간





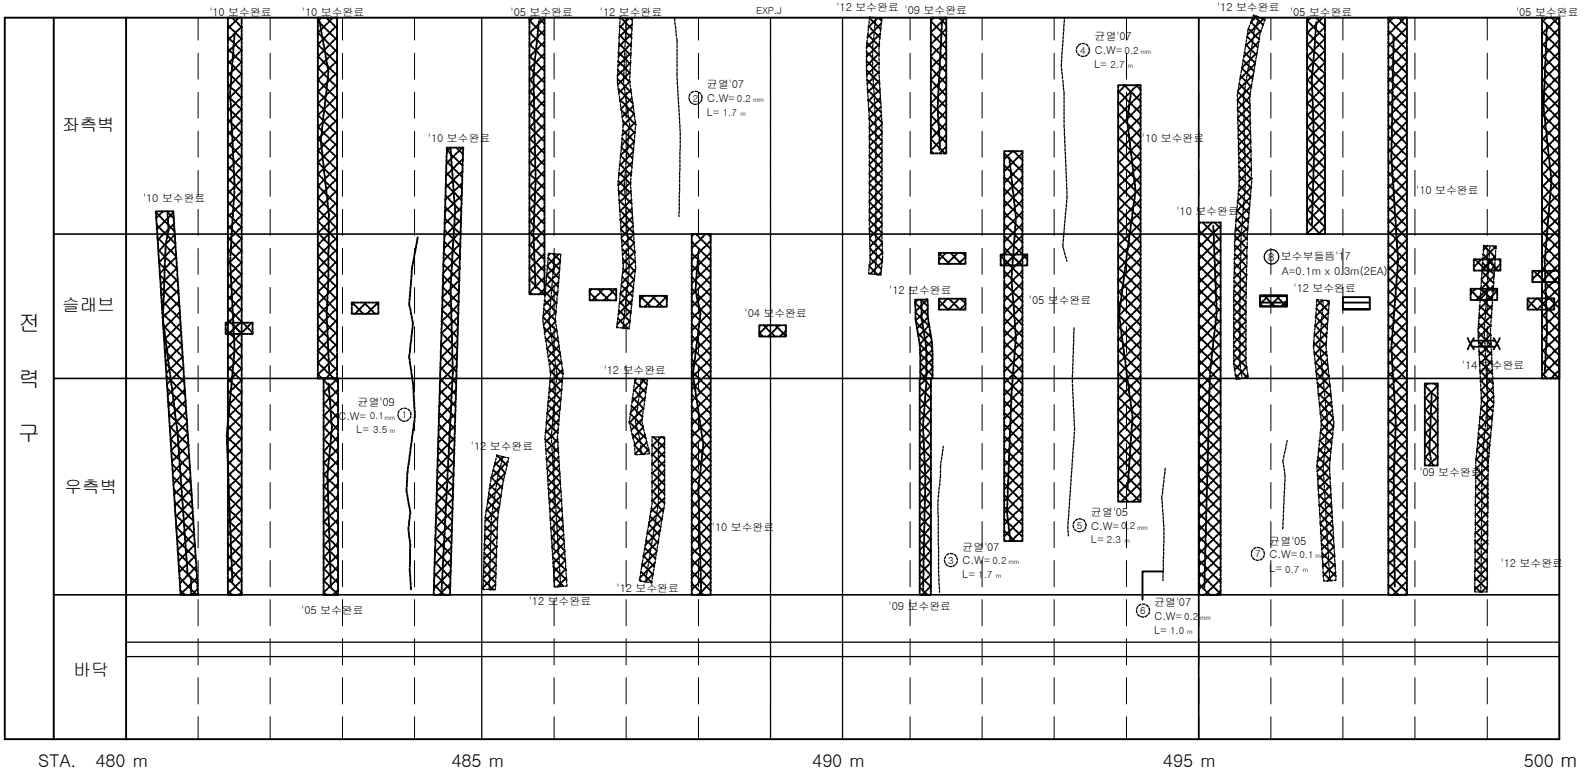

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2009	균열	0.10	3.50		3.50	m	1				
2	2007	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
3	2007	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
4	2007	균열	0.20	2.70		2.70	m	1				
5	2005	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
6	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
7	2005	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
8	2017	보수부들뜸	0.10	0.30		0.06	㎡	2				재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 500 m ~ 520 m) 전력구 구간





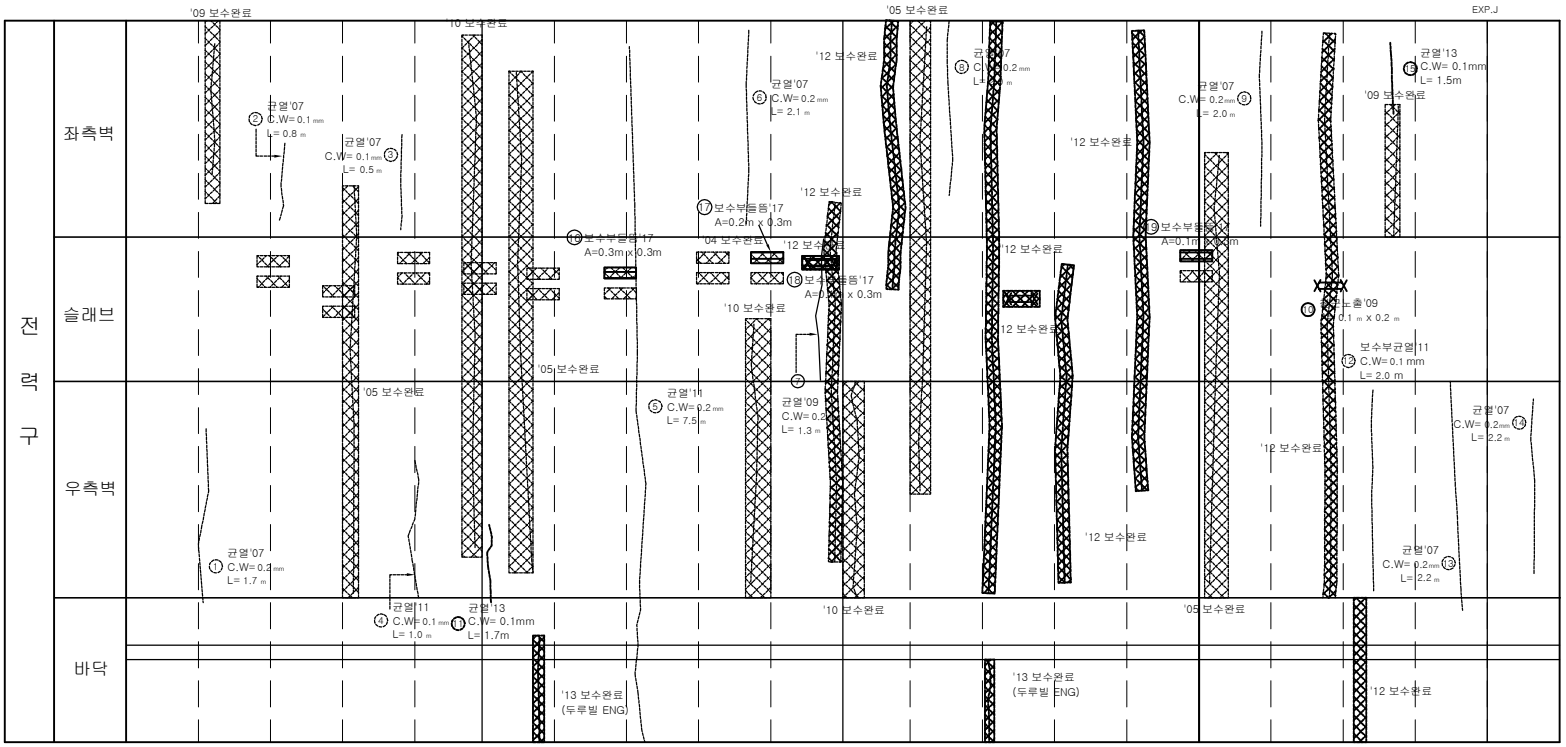

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
2	2007	균열	0.10	0.80		0.80	m	1				
3	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
4	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
5	2011	균열	0.20	7.50		7.50	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.10		2.10	m	1				
7	2009	균열	0.20	1.30		1.30	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
9	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
10	2009	철근노출		0.07		0.07	㎡	1				중요
11	2013	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
12	2011	보수부균열	0.10	2.00		2.00	m	1				재결함
13	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
14	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
15	2013	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
16	2017	보수부들뜸	0.30	0.30		0.09	㎡	1				재결함
17	2017	보수부들뜸	0.20	0.30		0.06	㎡	1				재결함
18	2017	보수부들뜸	0.10	0.30		0.03	㎡	1				재결함
19	2017	보수부들뜸	0.10	0.30		0.03	㎡	1				재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 520 m ~ 540 m) 전력구 구간





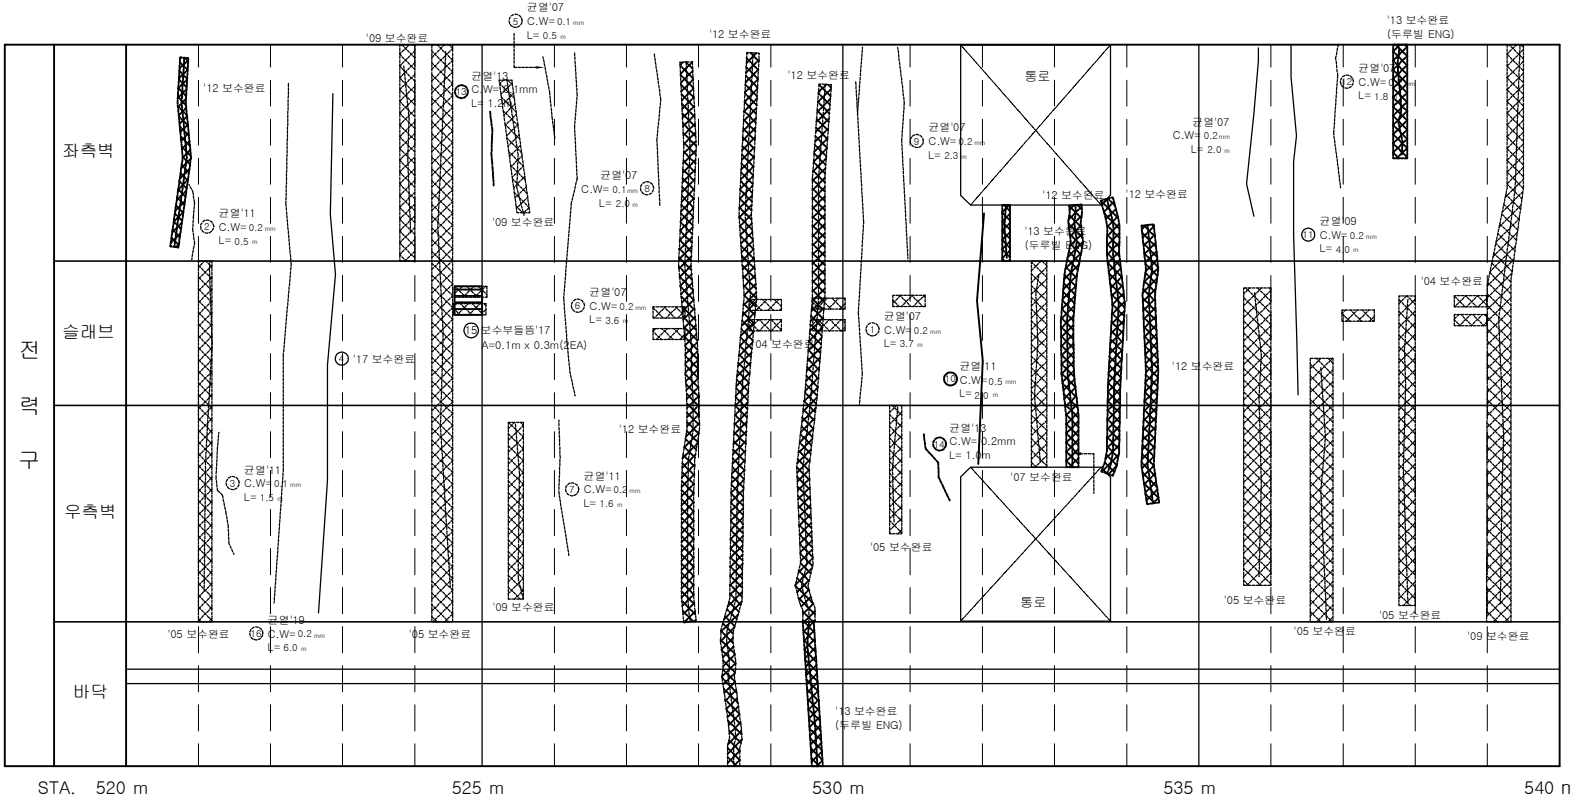

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	가소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	3.70		3.70	m	1				
2	2011	균열	0.20	0.50		0.50	m	1				
3	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
4	2011	균열	0.30	6.00		6.00	m	1	2017	주입보수공법	7.20	
5	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
6	2007	균열	0.20	3.60		3.60	m	1				
7	2011	균열	0.20	1.60		1.60	m	1				
8	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
9	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
10	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
11	2009	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
12	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
13	2013	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
14	2013	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
15	2017	보수부들뜸	0.10	0.30		0.06	m²	2				재원원
16	2019	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 540 m ~ 560 m) 전력구 구간





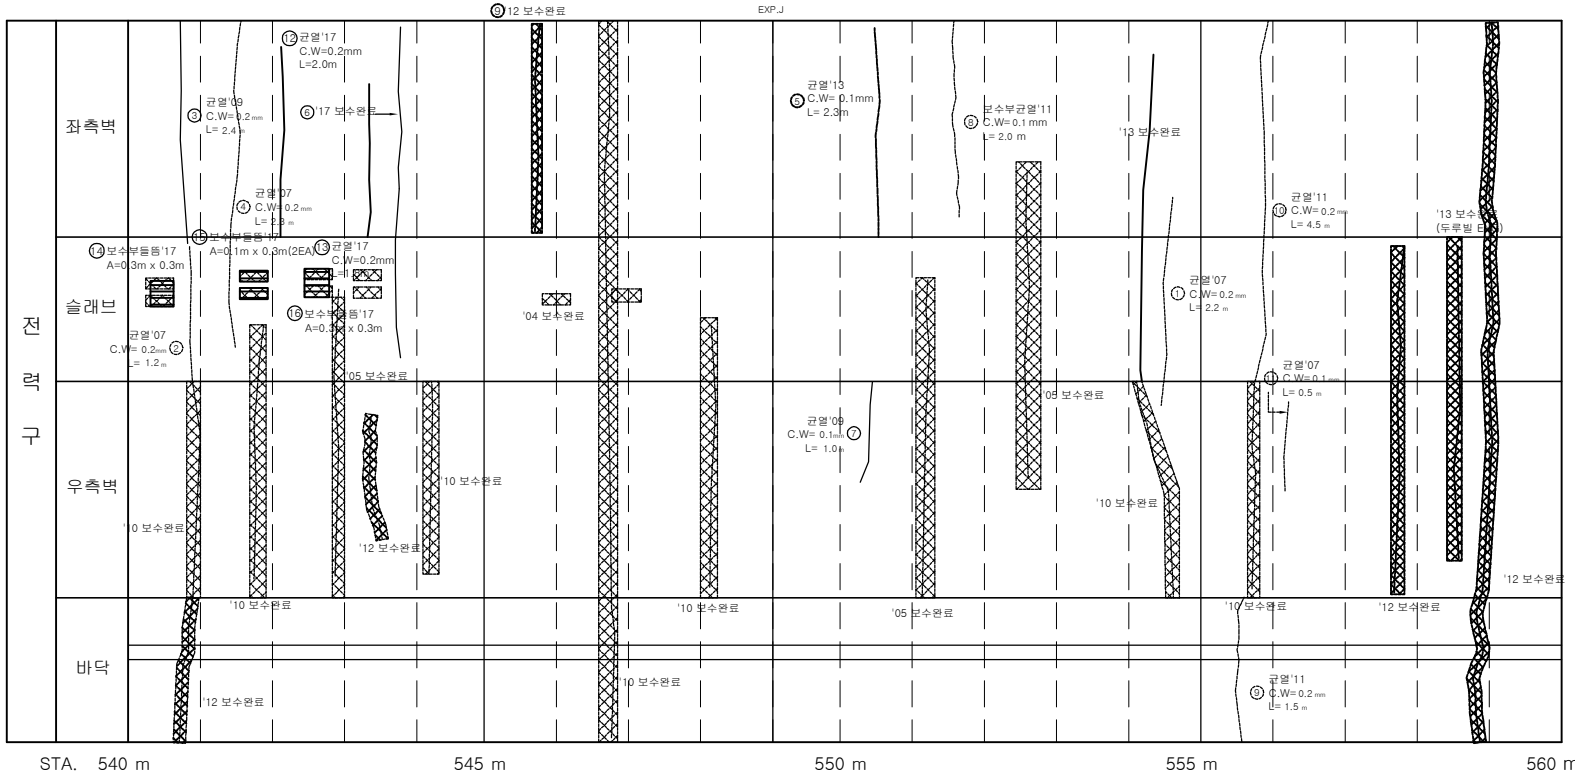

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	가소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
2	2007	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
3	2009	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
4	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
5	2013	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
6	2011	균열	0.30	4.00		4.00	m	1	2017	주입보수공법	4.80	
7	2009	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
9	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
8	2011	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
10	2011	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
11	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
12	2017	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
13	2017	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
14	2017	보수부들뜸	0.30	0.30		0.09	㎡	1				재결함
15	2017	보수부들뜸	0.10	0.30		0.06	㎡	2				재결함
16	2017	보수부들뜸	0.30	0.30		0.09	㎡	1				재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 560 m ~ 580 m) 전력구 구간





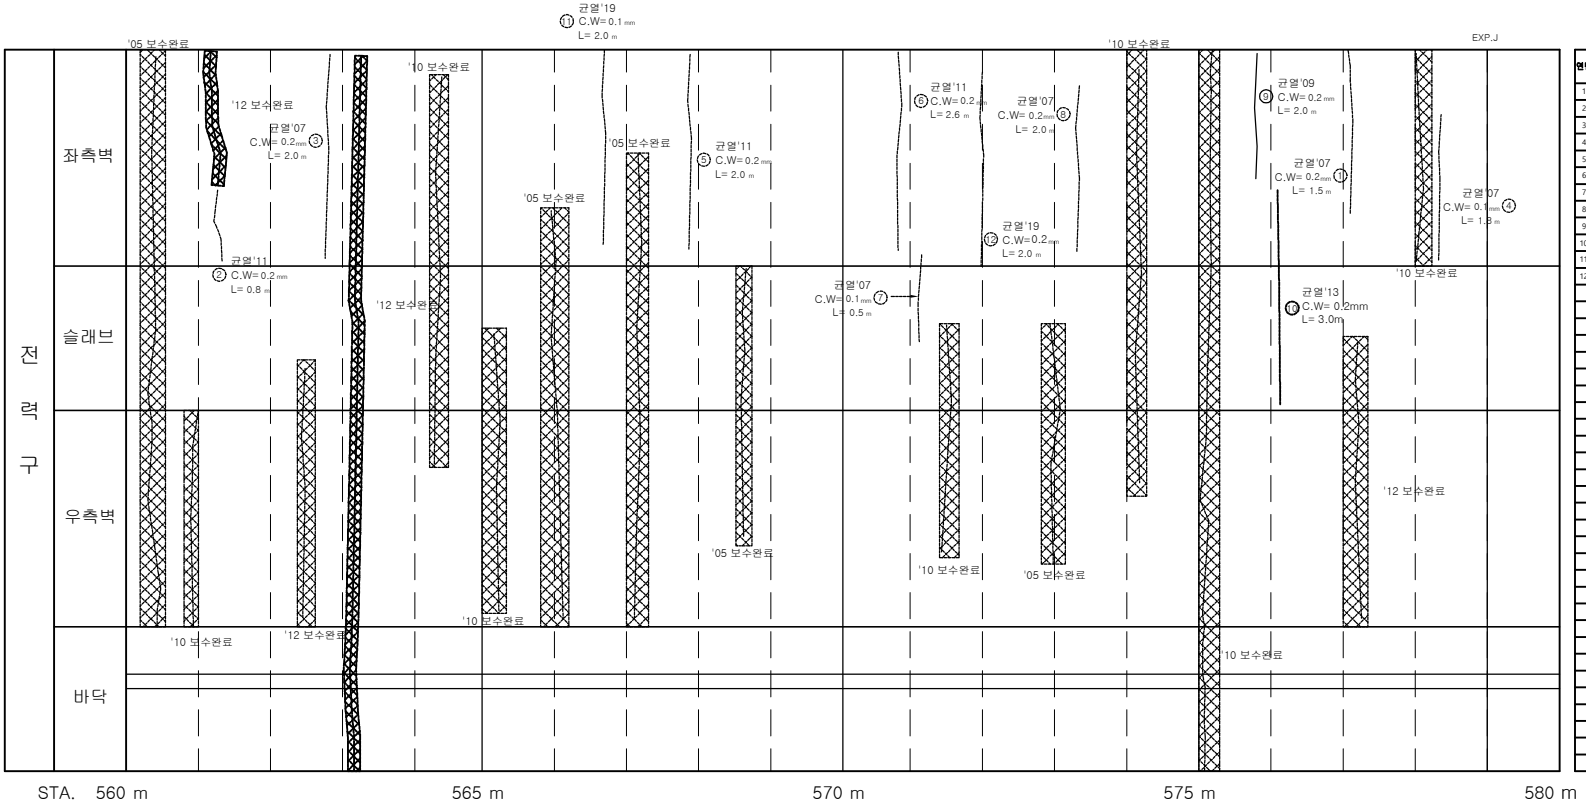

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	기소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
2	2011	균열	0.20	0.80		0.80	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
4	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
5	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
6	2011	균열	0.20	2.60		2.60	m	1				
7	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
8	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
9	2009	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
10	2013	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
11	2019	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				신규
12	2019	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 580 m ~ 600 m) 전력구 구간





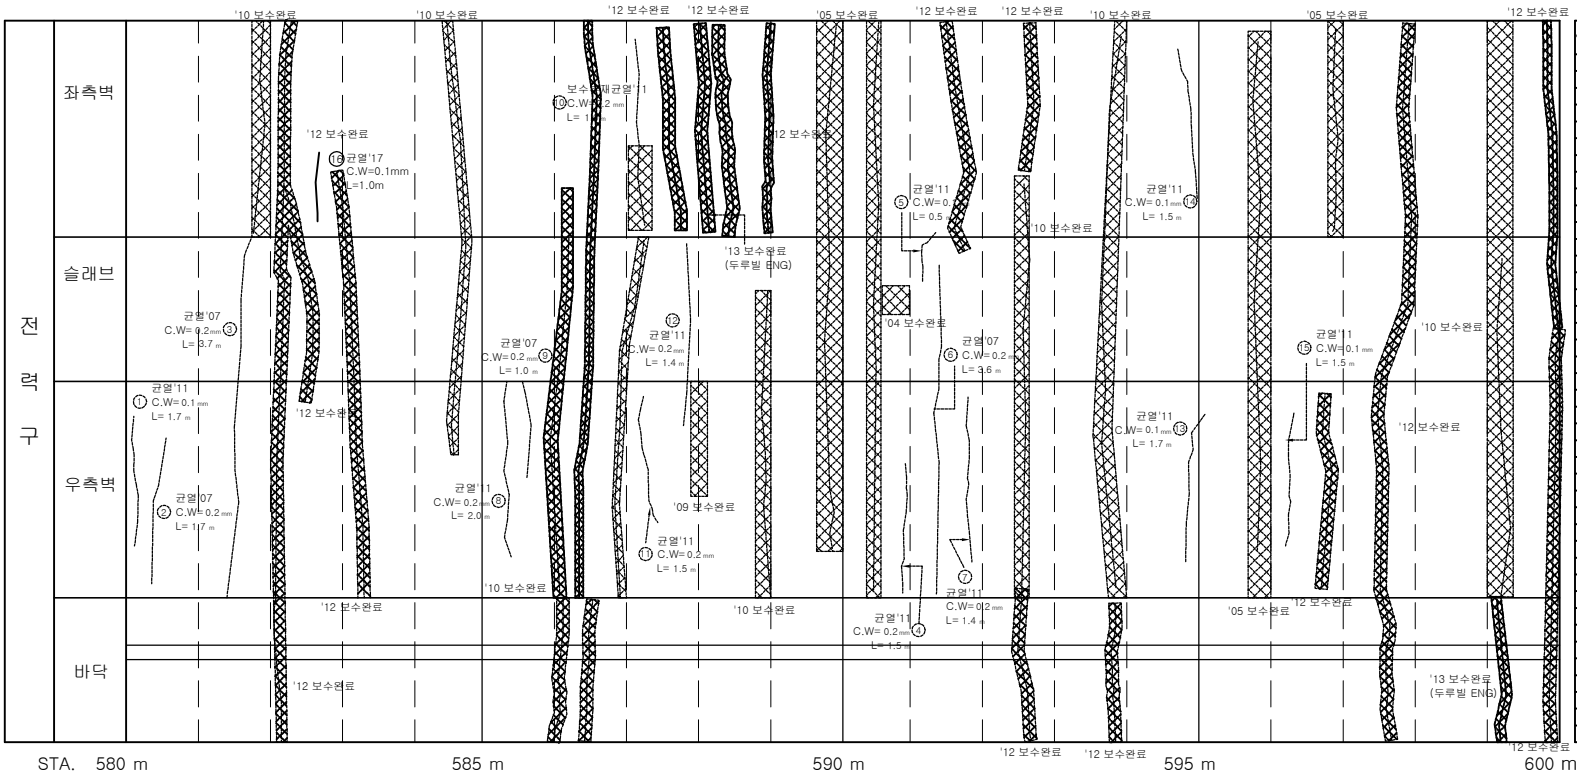

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	기소보수년도	공법명/자재명	물량		
1	2011	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
2	2007	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
3	2007	균열	0.20	3.70		3.70	m	1				
4	2011	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
5	2011	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
6	2007	균열	0.20	3.60		3.60	m	1				
7	2011	균열	0.20	1.40		1.40	m	1				
8	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
9	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
10	2011	보수부균열	0.20	1.00		1.00	m	1				재균열
11	2011	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
12	2011	균열	0.20	1.40		1.40	m	1				
13	2011	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
14	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
15	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
16	2017	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 600 m ~ 620 m) 전력구 구간





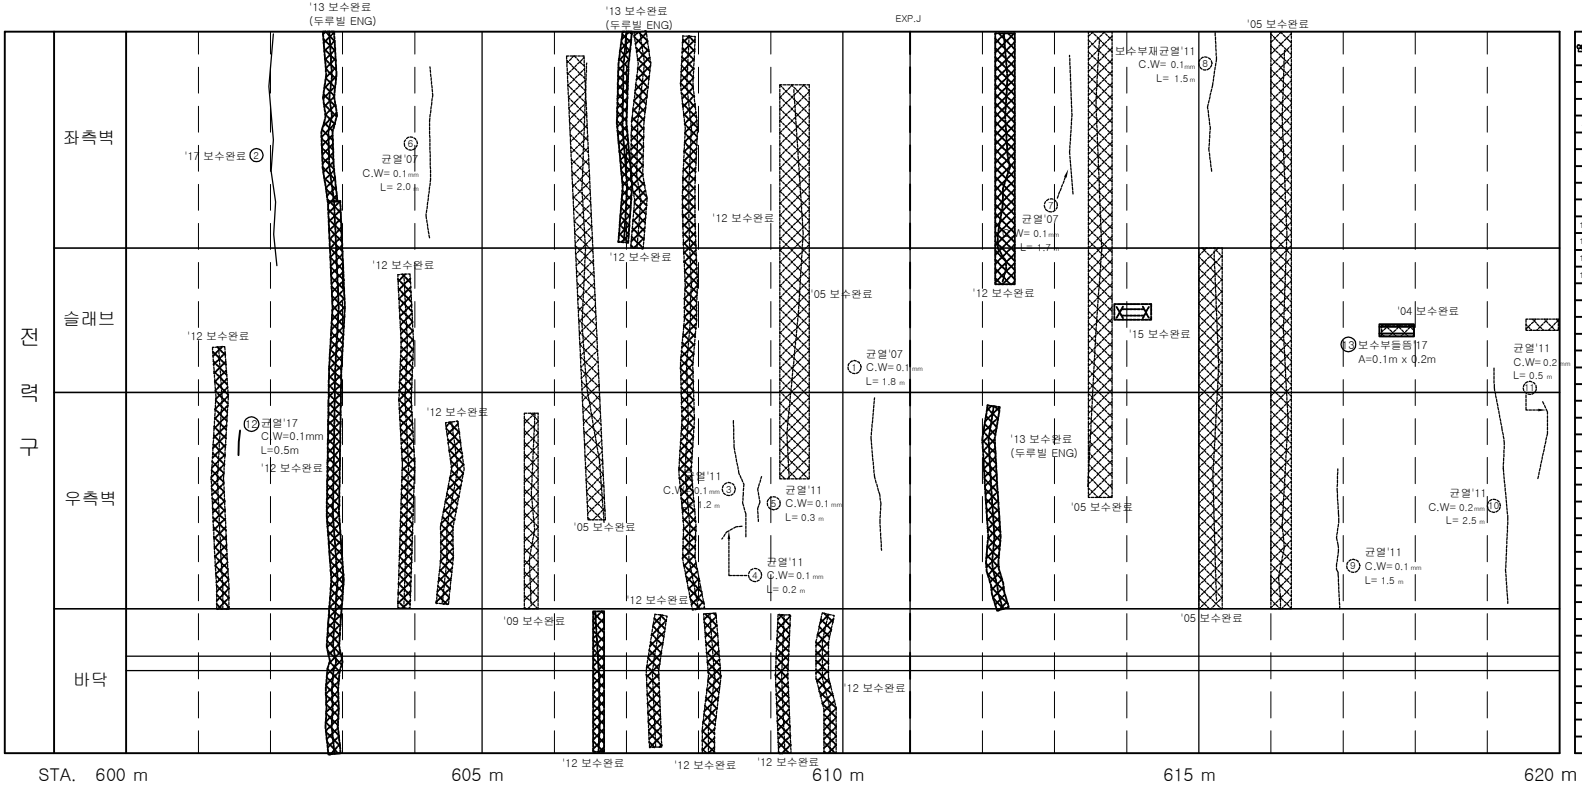

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역					비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량		
1	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1					
2	2011	균열	0.30	2.40		2.40	m	1	2017	주입보수공법	2.88		
3	2011	균열	0.10	1.20		1.20	m	1					
4	2011	균열	0.10	0.20		0.20	m	1					
5	2011	균열	0.10	0.30		0.30	m	1					
6	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1					
7	2007	균열	0.10	1.70		1.70	m	1					
8	2011	보수부균열	0.10	1.50		1.50	m	1					재결함
9	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1					
10	2011	균열	0.20	2.50		2.50	m	1					
11	2011	균열	0.20	0.50		0.50	m	1					
12	2017	균열	0.10	0.50		0.50	m	1					
13	2017	보수부들뜸	0.10	0.20		0.02	㎡	1					재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 620 m ~ 640 m) 전력구 구간





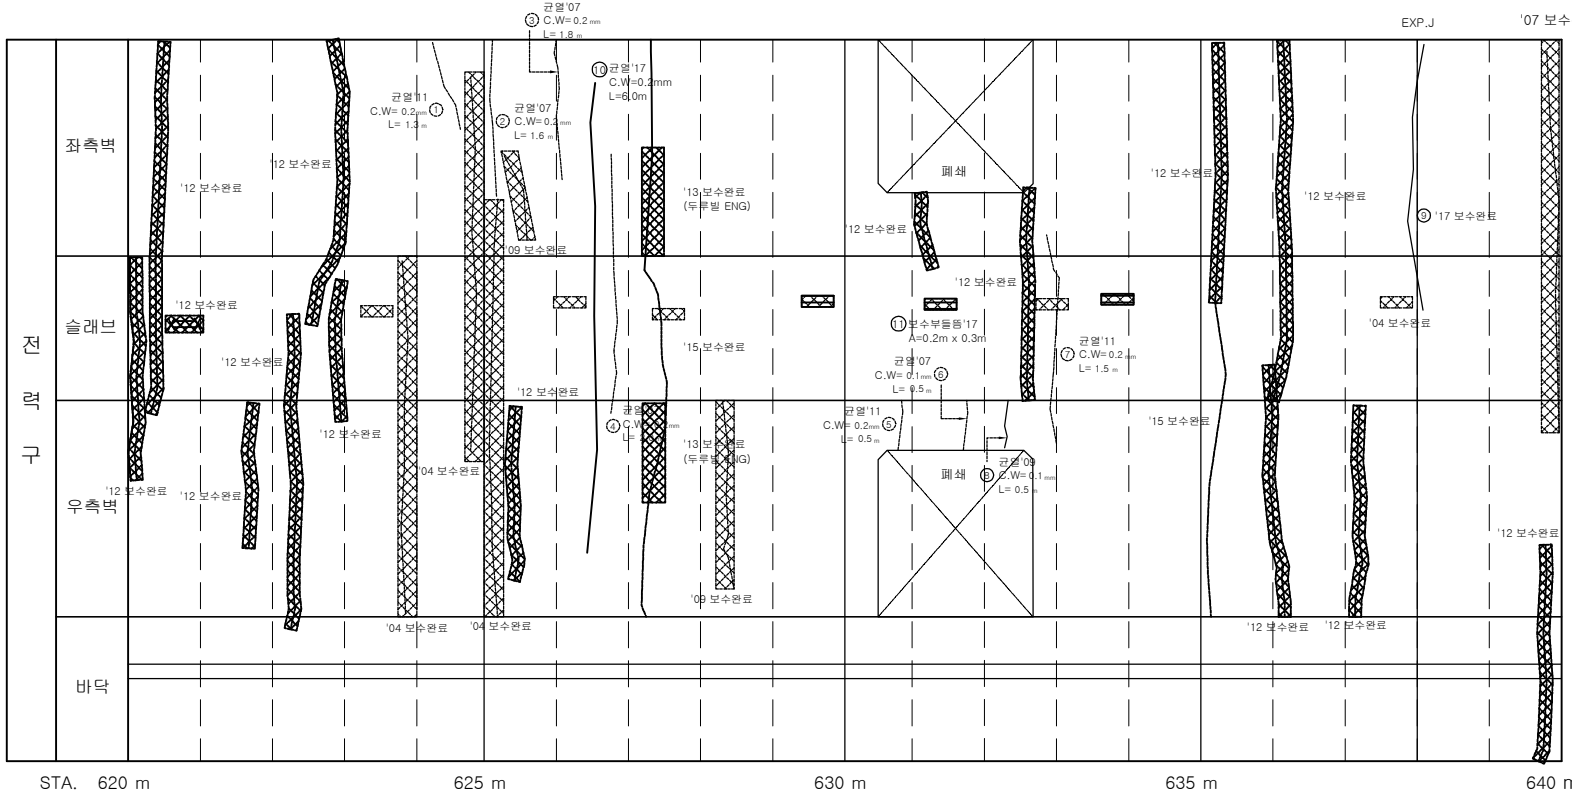

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	가소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2011	균열	0.20	1.30		1.30	m	1				
2	2007	균열	0.20	1.60		1.60	m	1				
3	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
4	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
5	2011	균열	0.20	0.50		0.50	m	1				
6	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
7	2011	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
8	2009	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
9	2009	균열	0.30	2.30		2.30	m	1	2017	주입보수공법	2.76	
10	2017	균열	0.20	6.00		6.00	m	1				
11	2017	보수부들뜸	0.20	0.30		0.06	m²	1				재팽창

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 640 m ~ 660 m) 전력구 구간





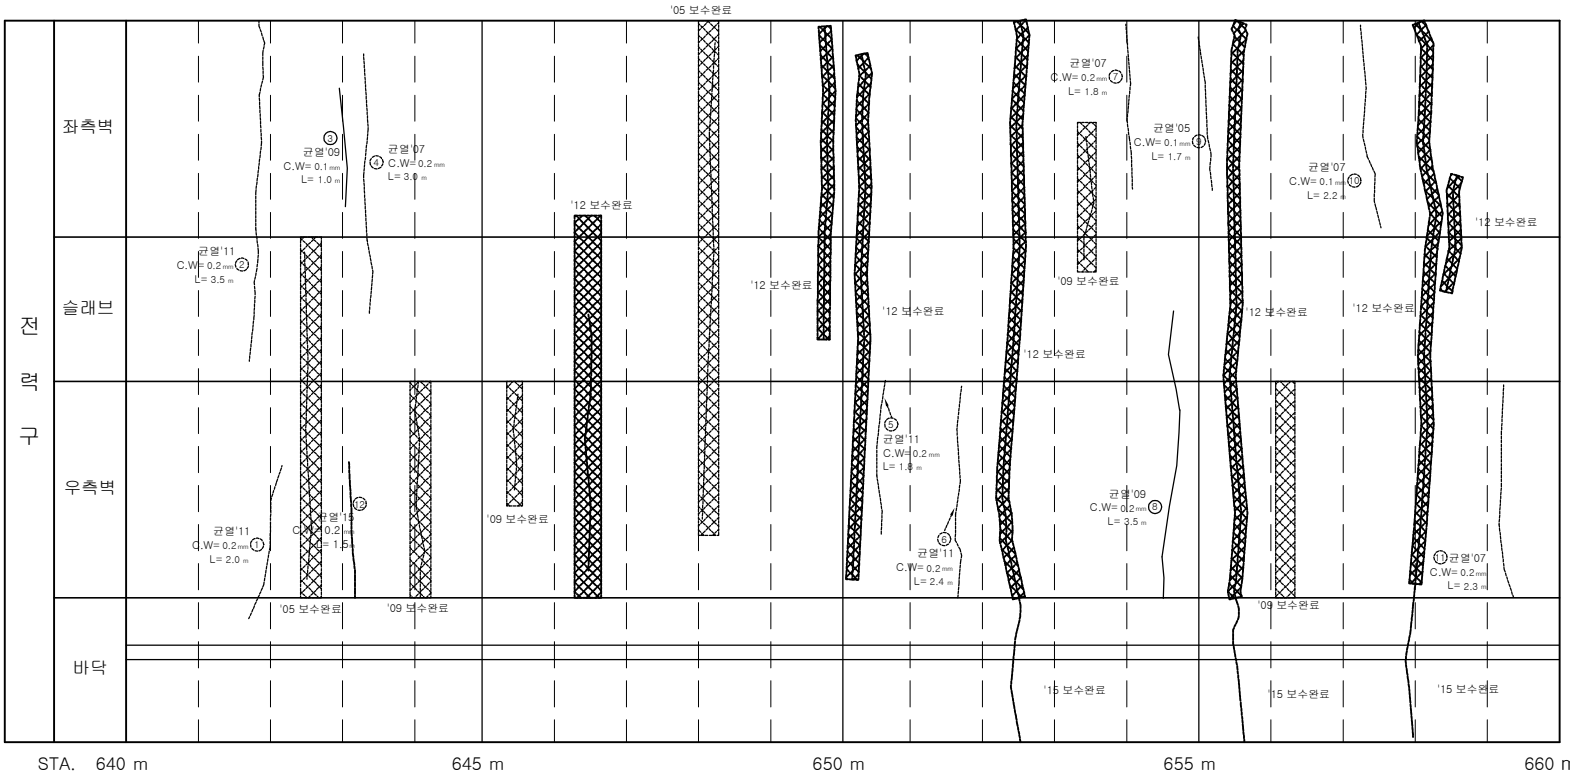

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	가스보수	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
2	2011	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
3	2009	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
4	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
5	2011	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
6	2011	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
7	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
8	2009	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
9	2005	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
10	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
11	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
12	2015	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 660 m ~ 680 m) 전력구 구간





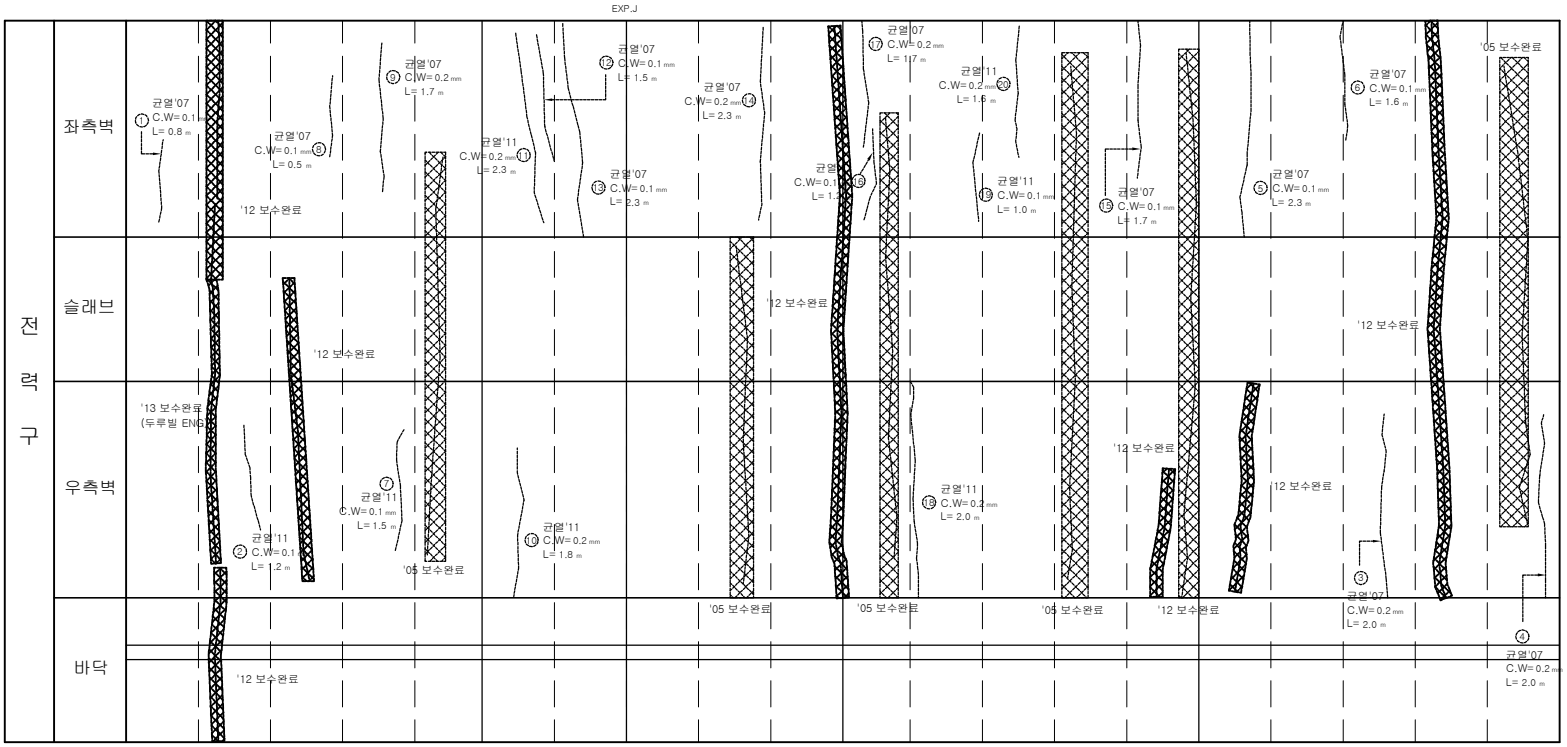

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	가스보수년도	공법명/자재명	물량		
1	2007	균열	0.10	0.80		0.80	m	1				
2	2011	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
4	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
5	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
6	2007	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
7	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
8	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
9	2007	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
10	2011	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
11	2011	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
12	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
13	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
14	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
15	2007	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
16	2011	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
17	2007	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
18	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
19	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
20	2011	균열	0.20	1.60		1.60	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 680 m ~ 700 m) 전력구 구간





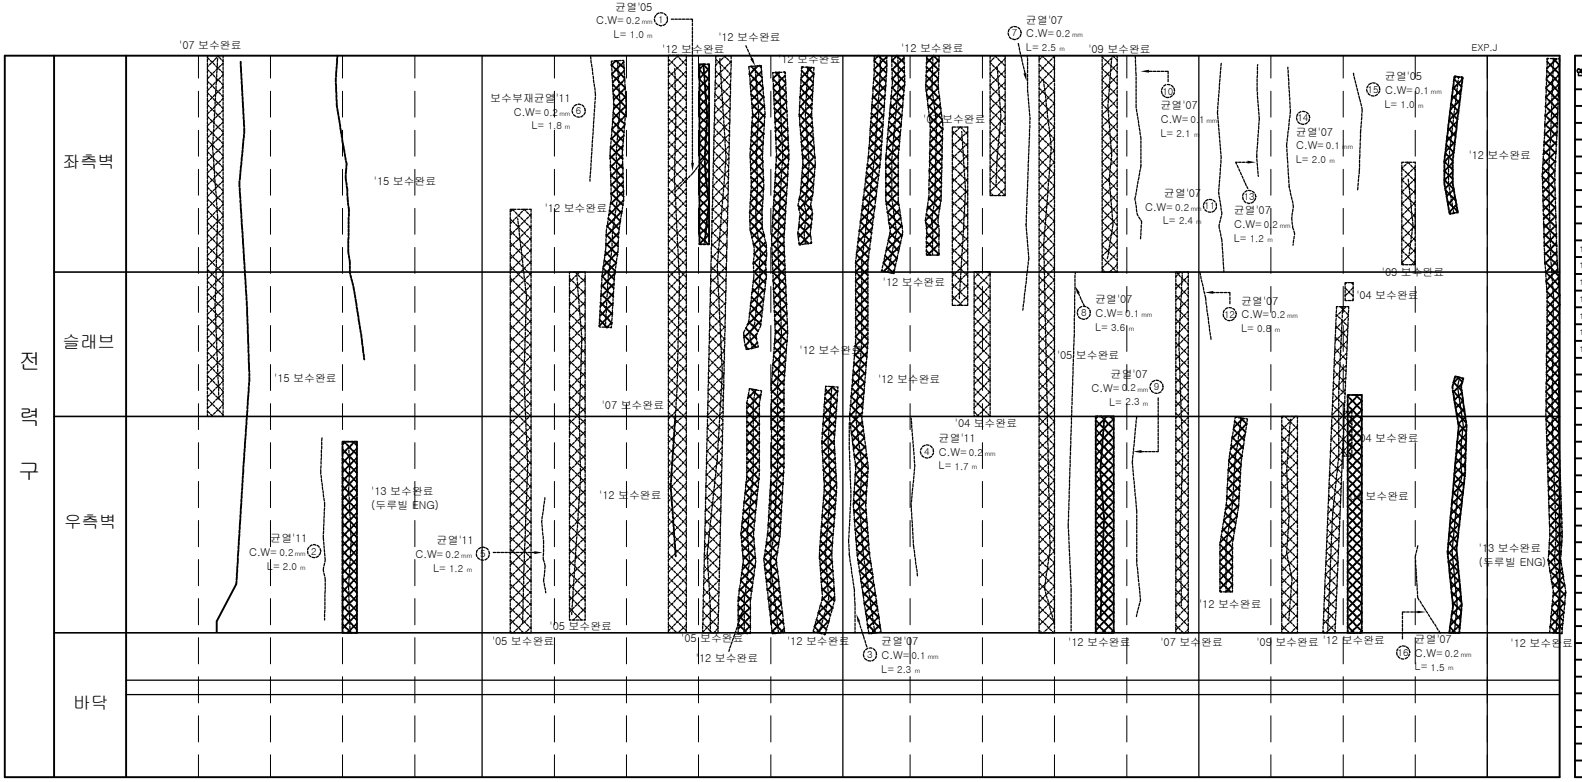

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	기소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2005	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
2	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
3	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
4	2011	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
5	2011	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
6	2011	보수부균열	0.20	1.80		1.80	m	1				재결함
7	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
8	2007	균열	0.10	3.60		3.60	m	1				
9	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
10	2007	균열	0.10	2.10		2.10	m	1				
11	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
12	2007	균열	0.20	0.80		0.80	m	1				
13	2007	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
14	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
15	2005	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
16	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 700 m ~ 720 m) 전력구 구간





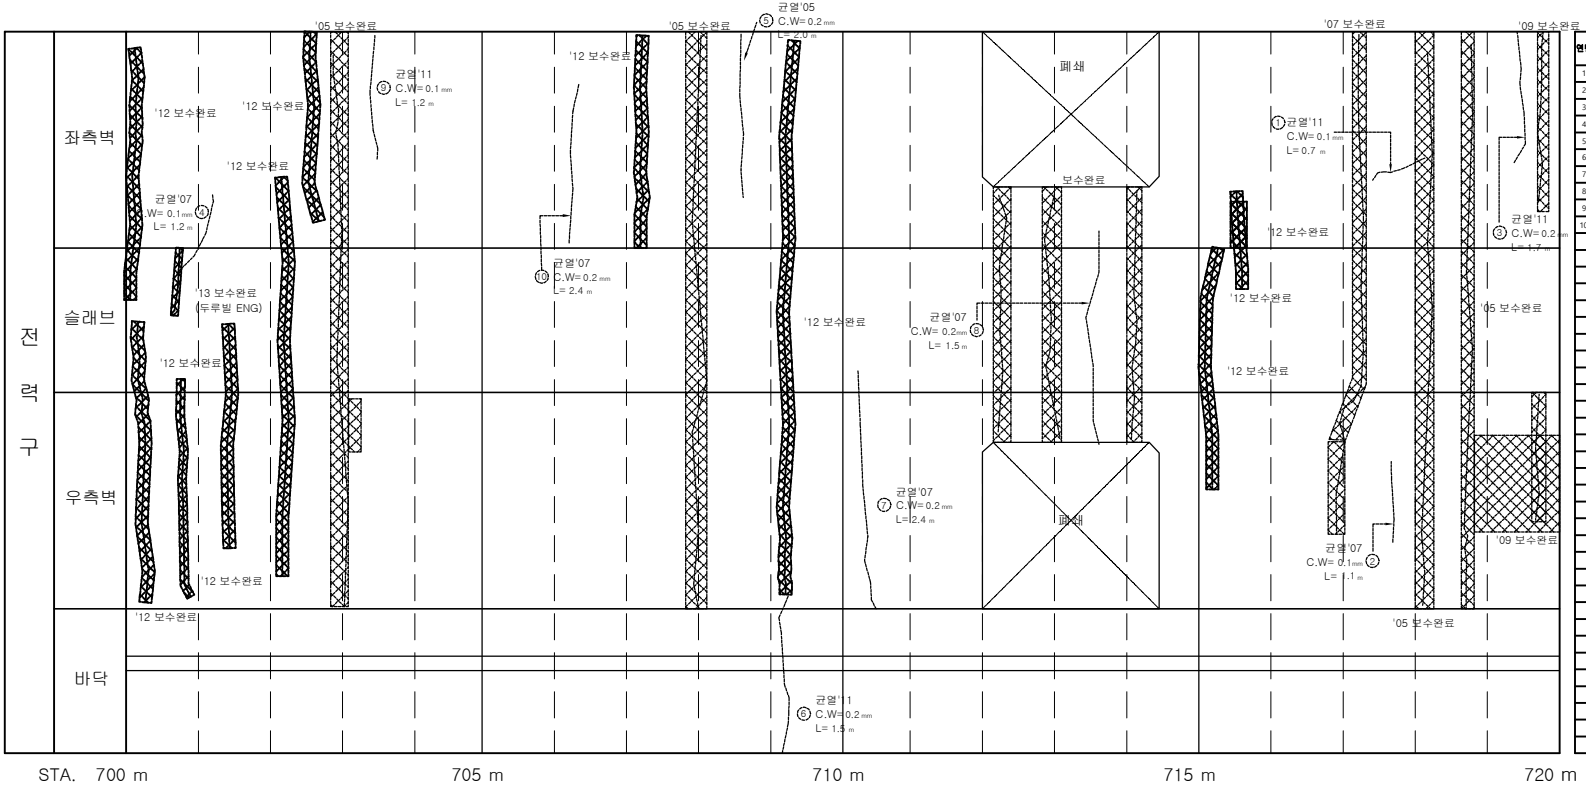

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	기소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2011	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
2	2007	균열	0.10	1.10		1.10	m	1				
3	2011	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
4	2007	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
5	2005	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
6	2011	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
7	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
8	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
9	2011	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
10	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 720 m ~ 740 m) 전력구 구간





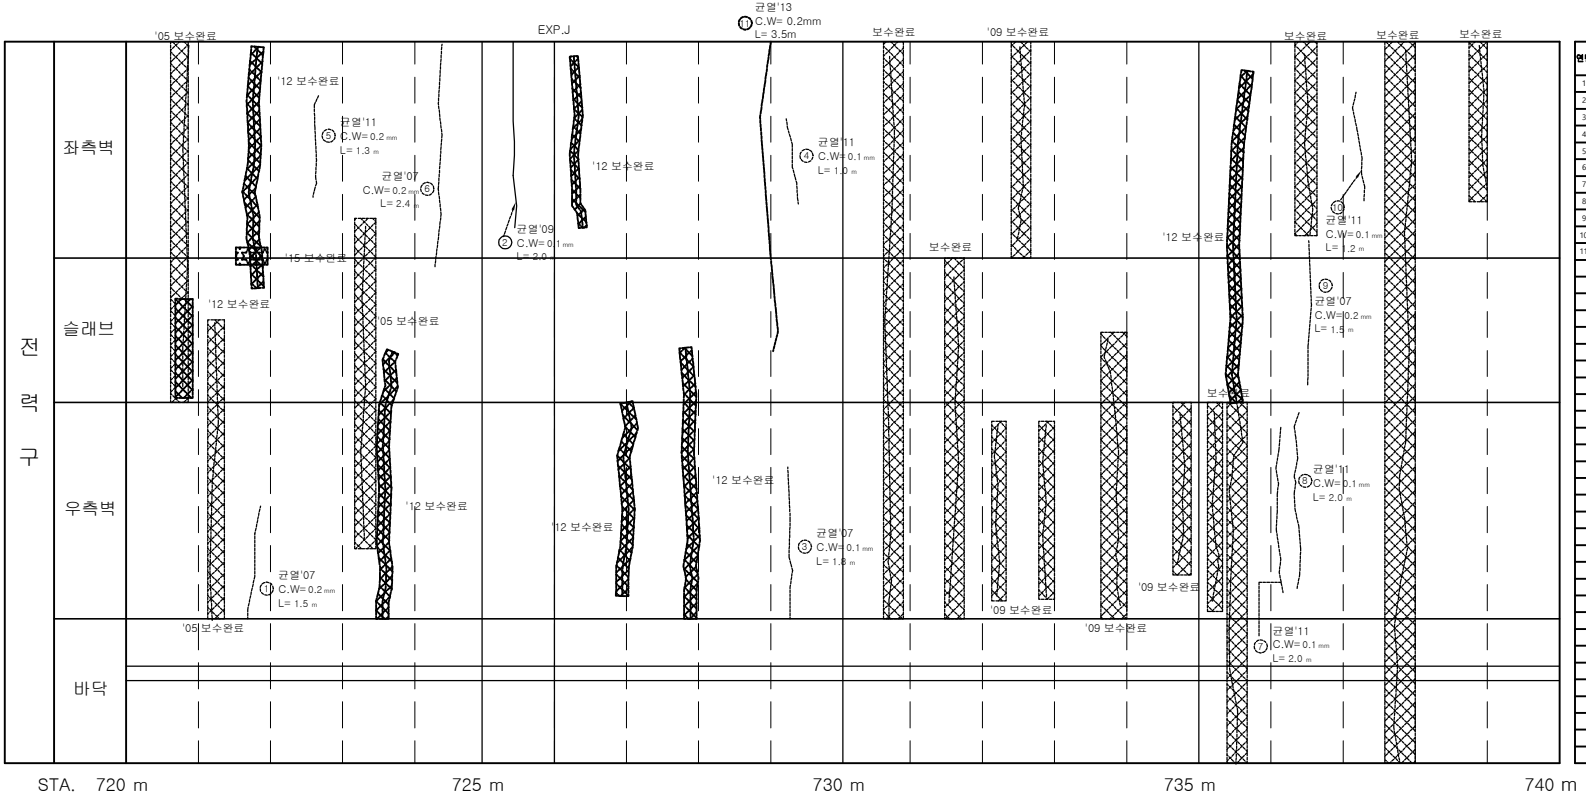

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	가스보수	단면공법	열/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
2	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
3	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
4	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
5	2011	균열	0.20	1.30		1.30	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
7	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
8	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
9	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
10	2011	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
11	2013	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 740 m ~ 760 m) 전력구 구간





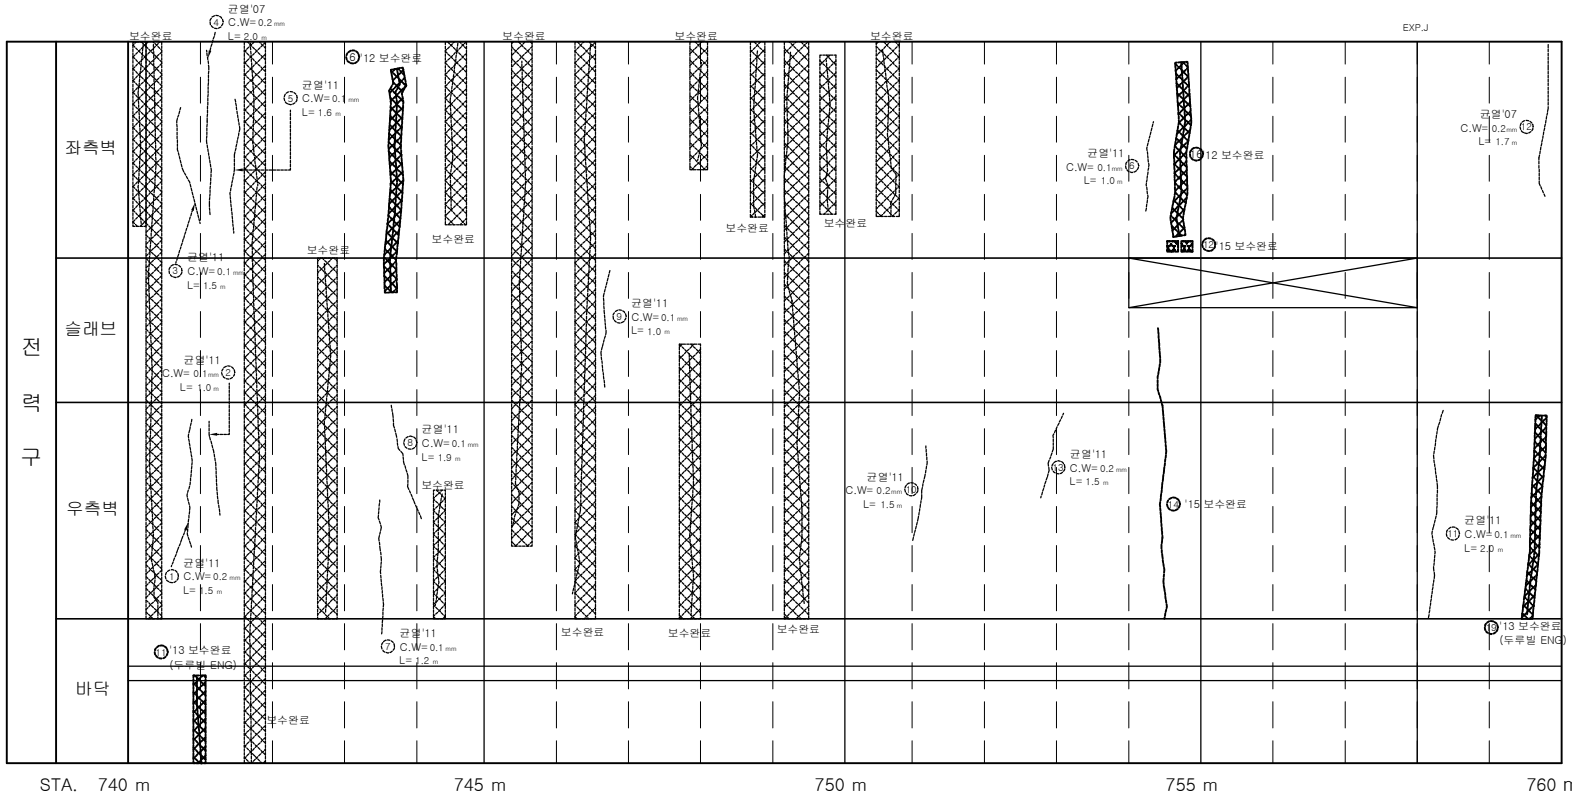

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	기소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2011	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
2	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
3	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
4	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
5	2011	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
6	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
7	2011	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
8	2011	균열	0.10	1.90		1.90	m	1				
9	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
10	2011	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
11	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
12	2007	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
13	2011	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 760 m ~ 780 m) 전력구 구간





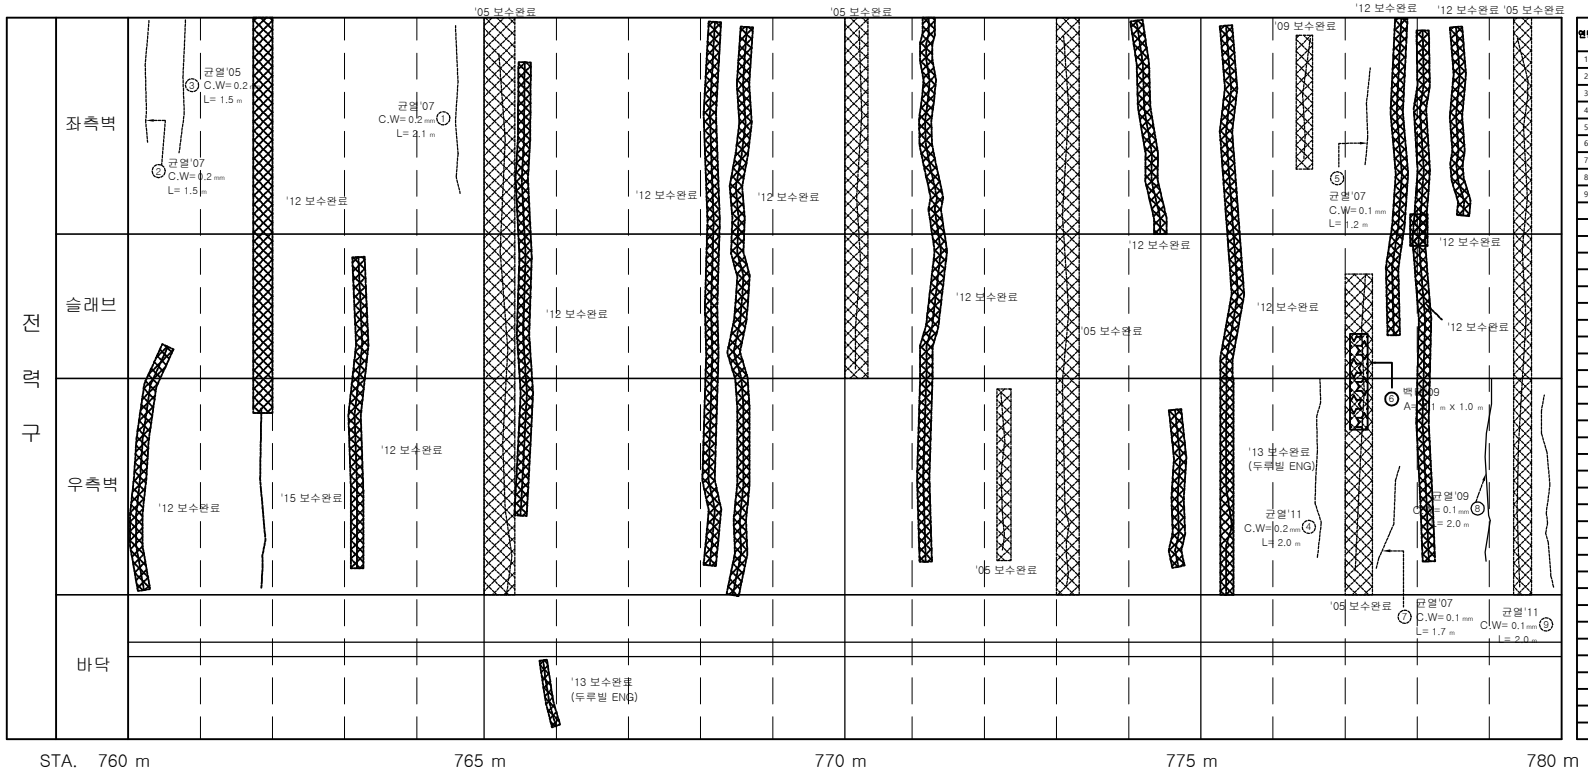

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	가스	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	2.10		2.10	m	1				
2	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
3	2005	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
4	2011	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
5	2007	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
6	2009	백태		0.10		0.10	㎡	1				
7	2007	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
8	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
9	2011	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 780 m ~ 800 m) 전력구 구간





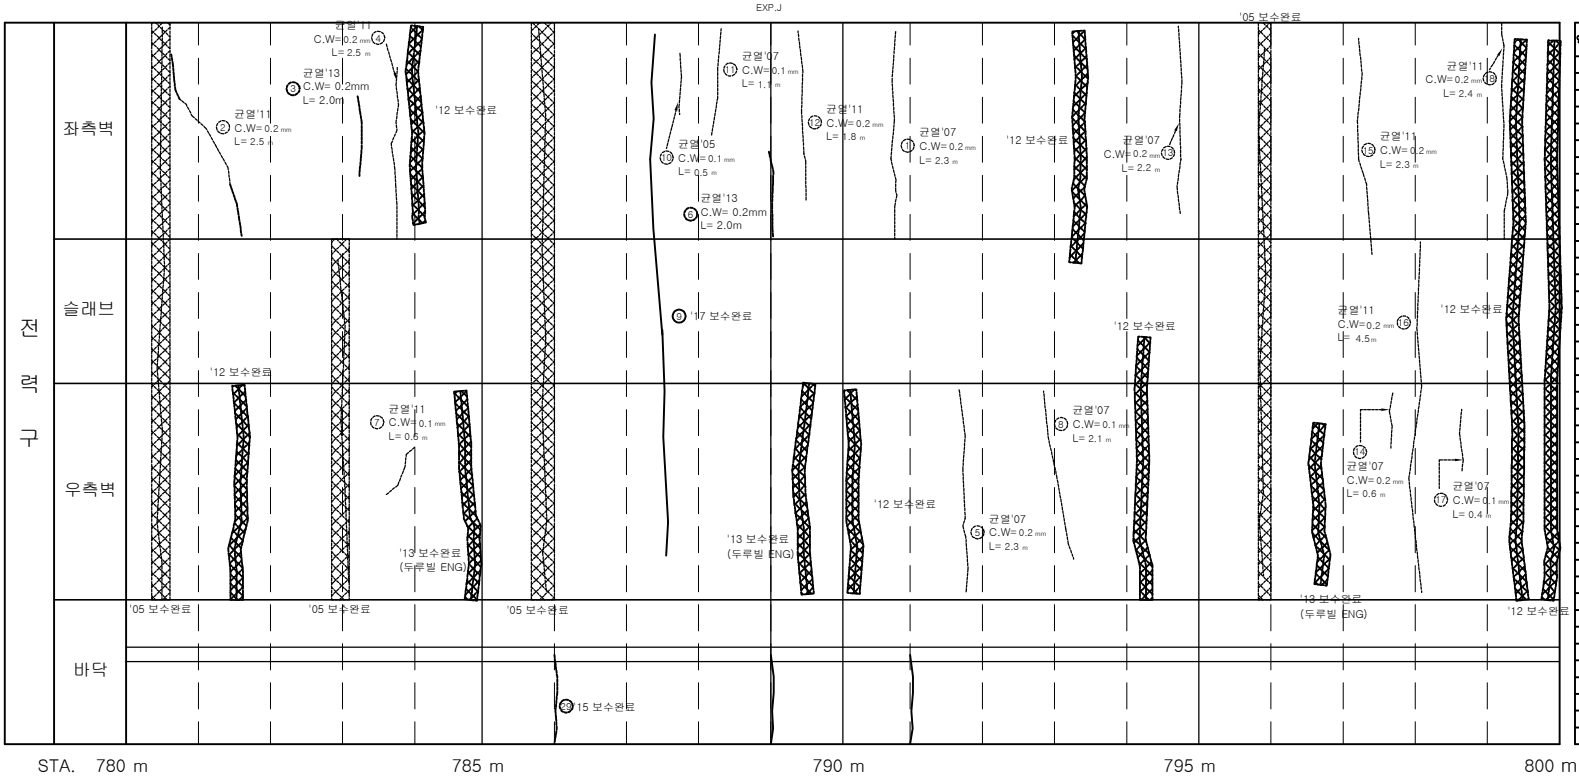

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	가스	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
2	2011	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
3	2013	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
4	2011	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
6	2013	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
7	2011	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
8	2007	균열	0.10	2.10		2.10	m	1				
9	2011	균열	0.30	5.50		5.50	m	1	2017	주입보수공법	6.60	
10	2005	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
11	2007	균열	0.10	1.10		1.10	m	1				
12	2011	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
13	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
14	2007	균열	0.20	0.60		0.60	m	1				
15	2011	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
16	2011	균열	0.20	4.50		4.50	m	1				
17	2007	균열	0.10	0.40		0.40	m	1				
18	2011	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 800 m ~ 820 m) 전력구 구간





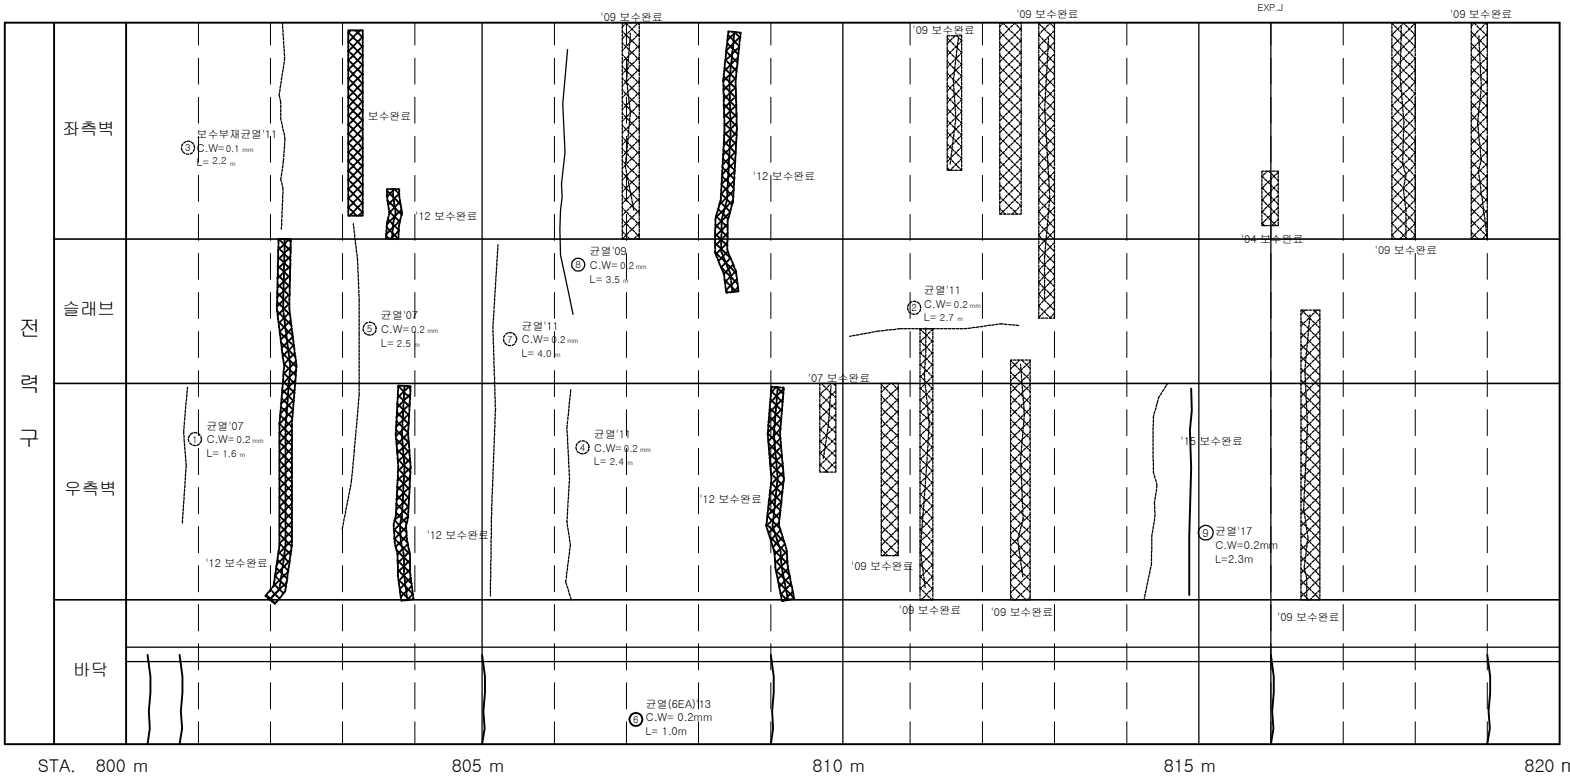

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	가소보수년도	공법명/자재명	물량		
1	2007	균열	0.20	1.60		1.60	m	1				
2	2011	균열	0.20	2.70		2.70	m	1				
3	2011	보수부균열	0.10	2.20		2.20	m	1				재결함
4	2011	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
6	2013	균열	0.30	1.00		6.00	m	6				
7	2011	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
8	2009	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
9	2017	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 820 m ~ 840 m) 전력구 구간





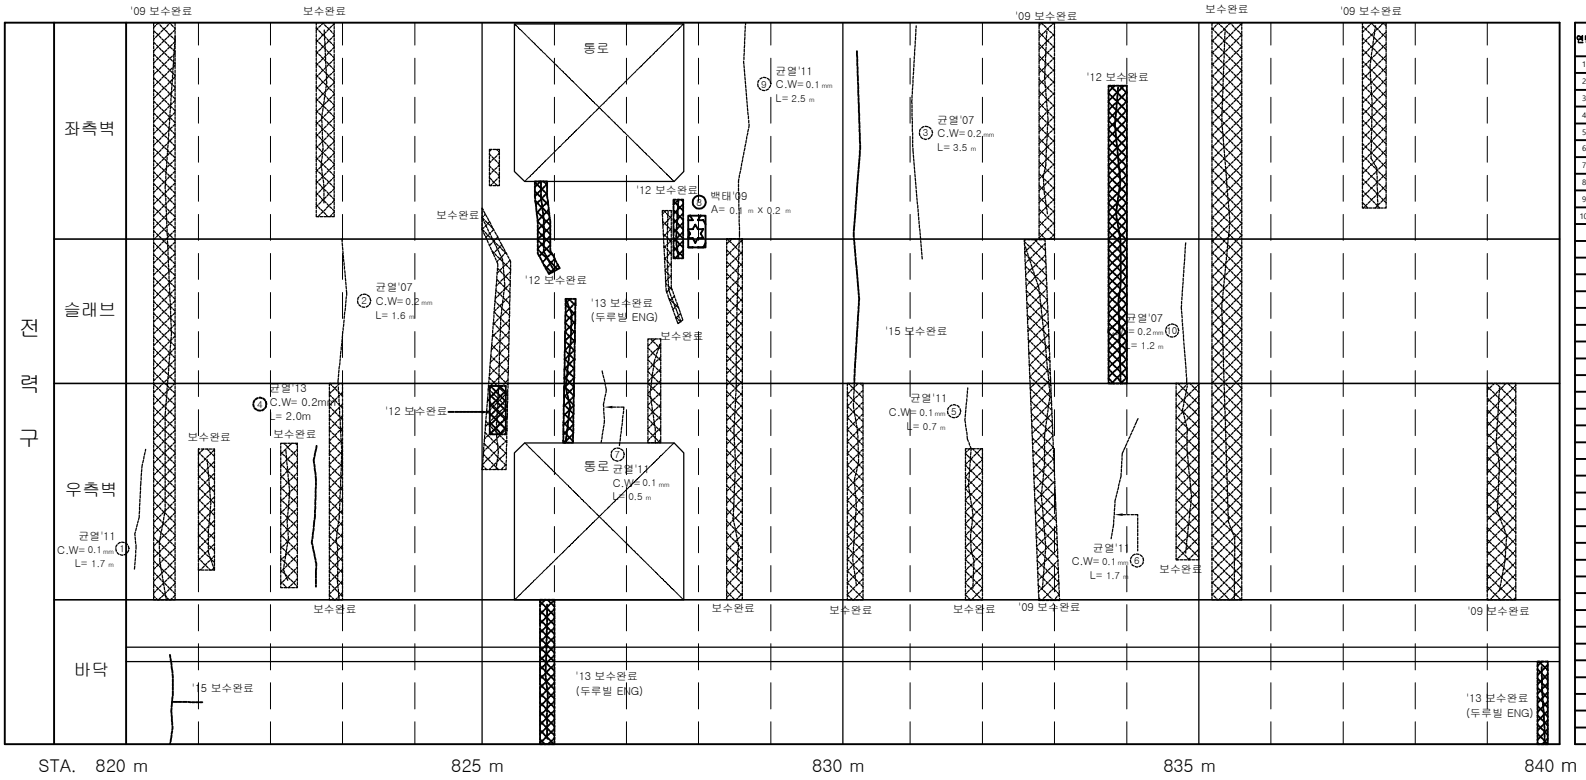

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	기소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2011	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
2	2007	균열	0.20	1.60		1.60	m	1				
3	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
4	2013	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
5	2011	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
6	2011	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
7	2011	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
8	2009	백태		0.02		0.02	㎡	1				
9	2011	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				
10	2007	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 840 m ~ 860 m) 전력구 구간





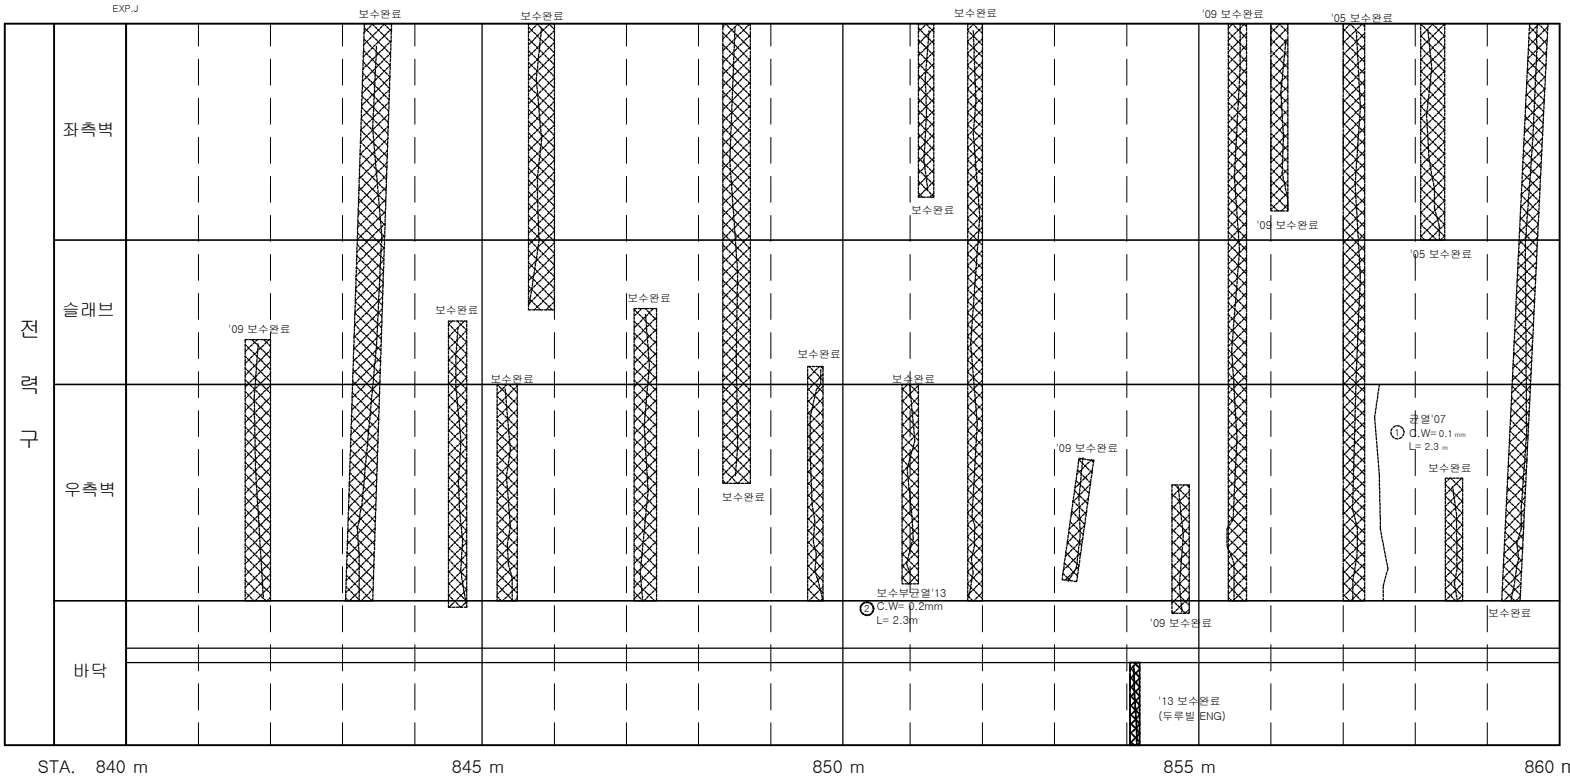

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	기소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	균열	0.10	2.30		2.30	m	1				
2	2013	보수부균열	0.20	2.30		2.30	m	1				재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 860 m ~ 880 m) 전력구 구간





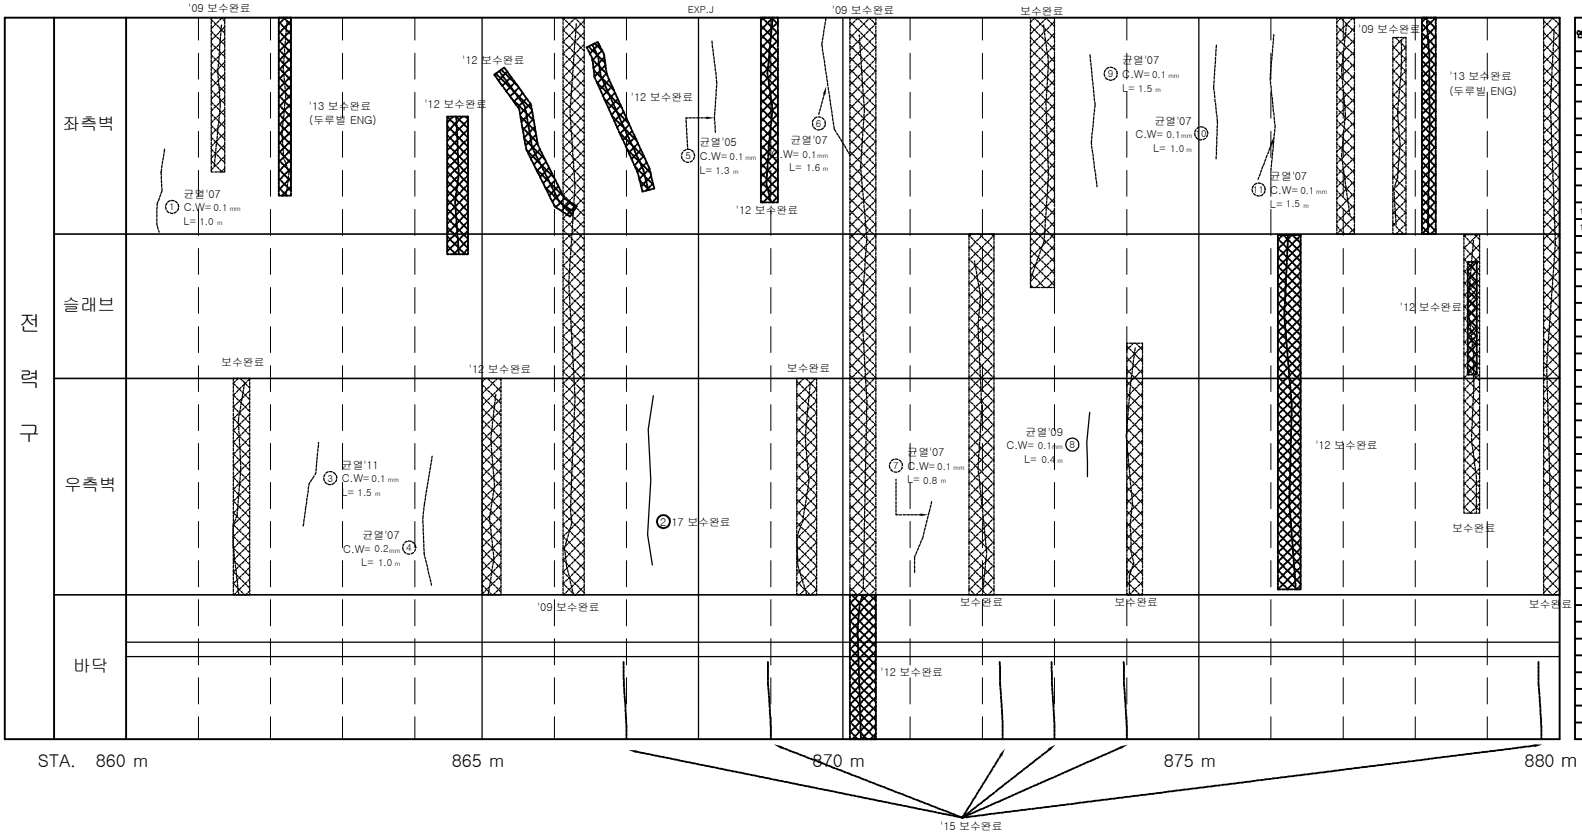

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	가소보수년도	공법명/자재명	물량		
1	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
2	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1	2017	표면처리공법	2.40	
3	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
4	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
5	2005	균열	0.10	1.30		1.30	m	1				
6	2007	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
7	2007	균열	0.10	0.80		0.80	m	1				
8	2009	균열	0.10	0.40		0.40	m	1				
9	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
10	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
11	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 880 m ~ 900 m) 전력구 구간





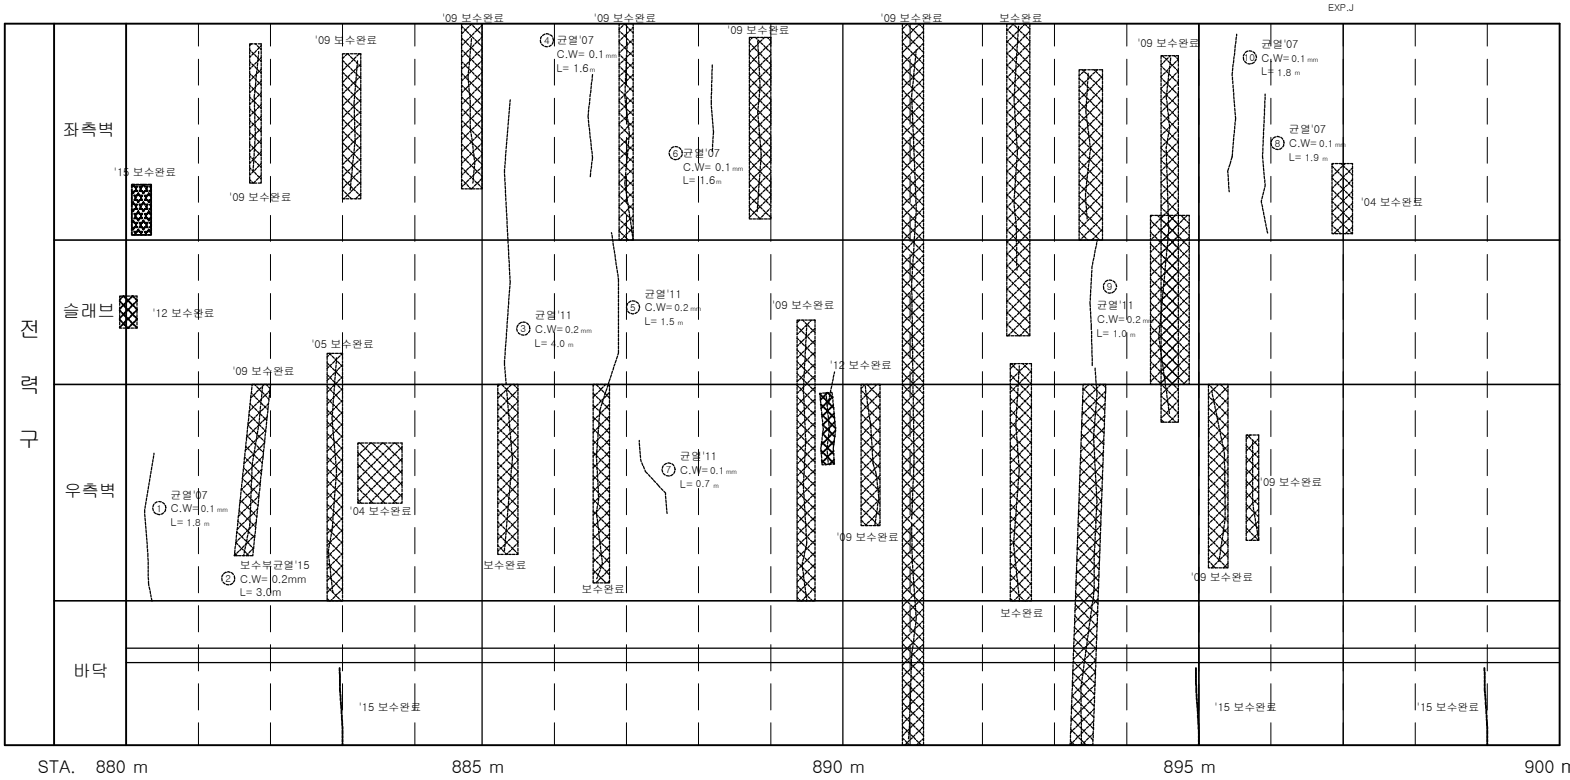

손 상 물 량 표

연번	적발년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	가소보수년도	공법명/자재명	물량		
1	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
2	2015	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
3	2011	균열	0.20	4.00		4.00	m	1				
4	2007	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
5	2011	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
6	2007	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
7	2011	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
8	2007	균열	0.10	1.90		1.90	m	1				
9	2011	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
10	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 900 m ~ 920 m) 전력구 구간





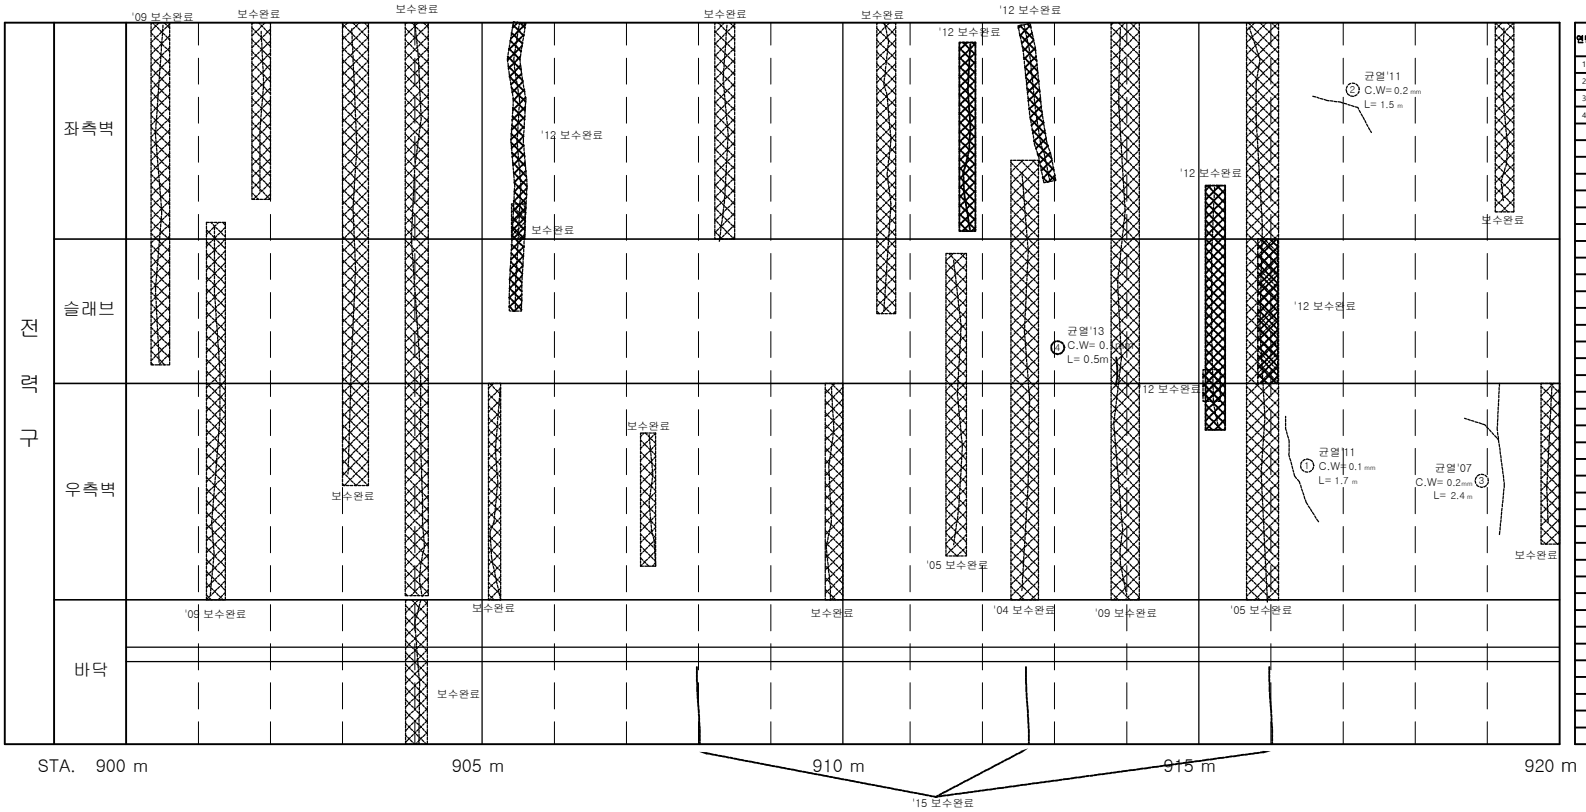

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	가스보수	내도공법	열/자재명	물량	
1	2011	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
2	2011	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
4	2013	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도

가락 공동구 대1-57(STA. 920 m ~ 940 m) 전력구 구간





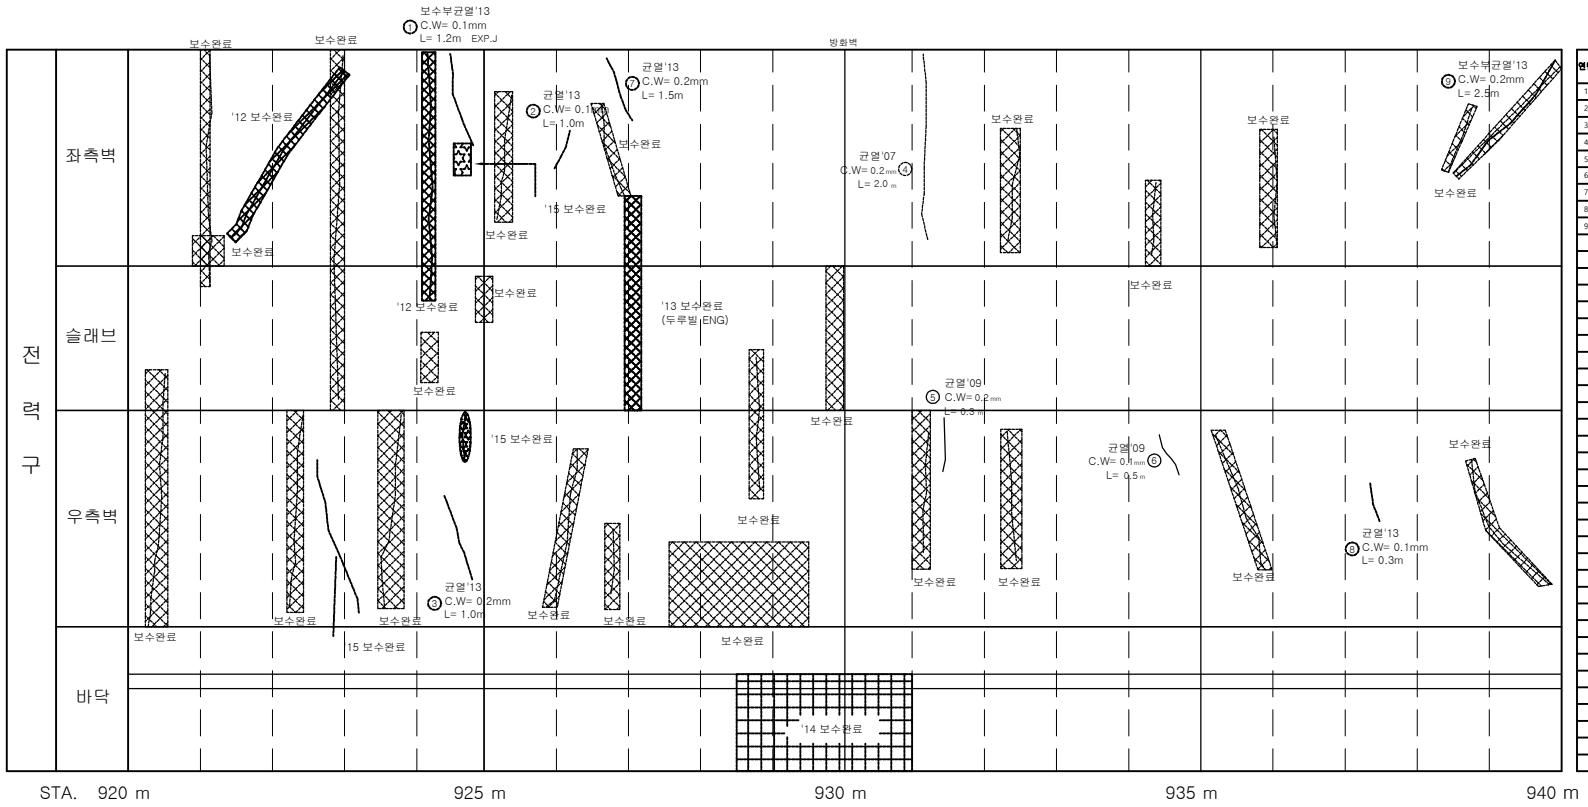

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	기소보수	내도공법열/자재명		물량	
1	2013	보수부균열	0.10	1.20		1.20	m	1				재결함
2	2013	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
3	2013	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
4	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
5	2009	균열	0.20	0.30		0.30	m	1				
6	2009	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
7	2013	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
8	2013	균열	0.10	0.30		0.30	m	1				
9	2013	보수부균열	0.20	2.50		2.50	m	1				재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 중대로 외관조사망도
