불 광 천 포 장 부 J8(0K 234) ~ J13(0K 376)

KEY PLAN





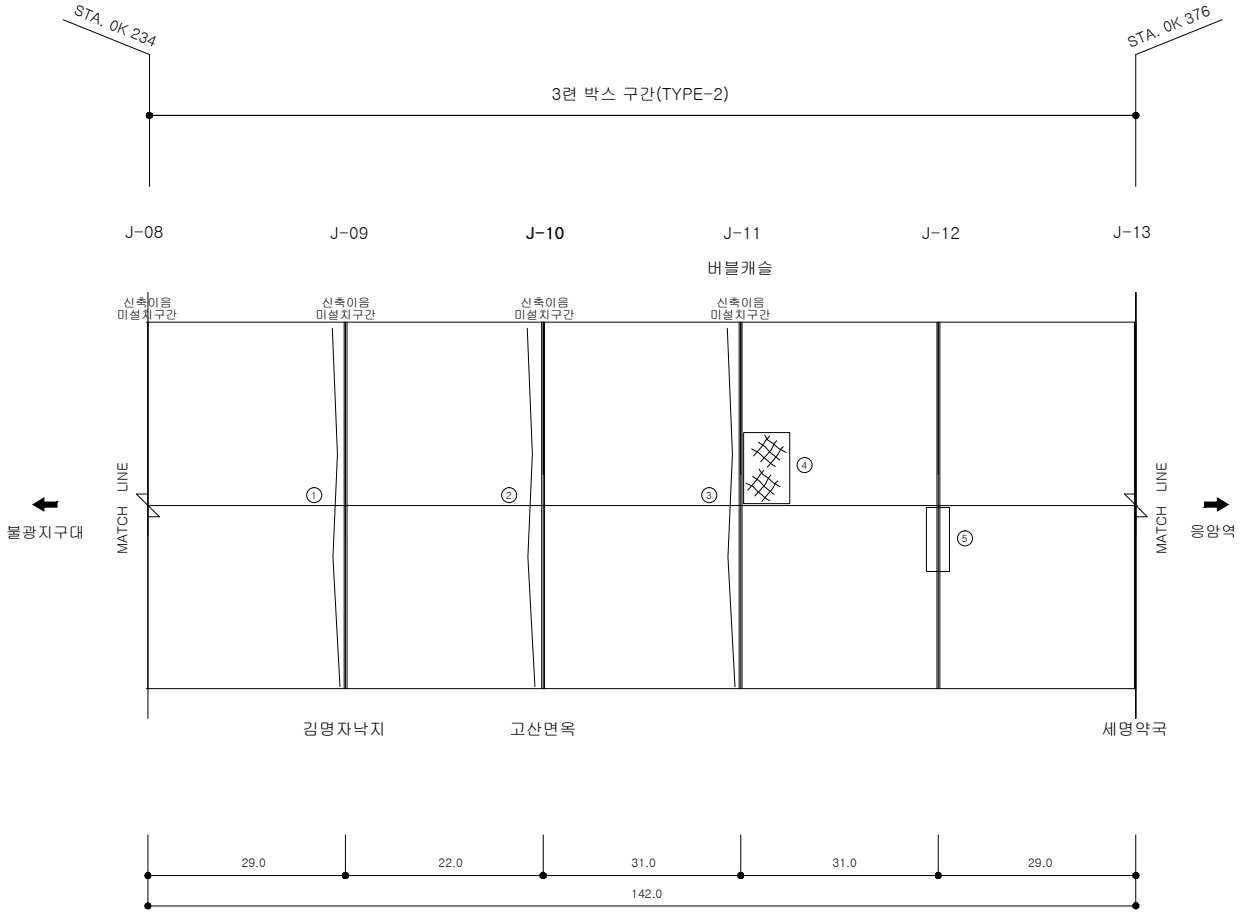

손 상 물 량 표

범 례	① - 2013 신규	기① - 기존손상	1 보수완료

번 호	손 상 위 치		적출년도	결함규모							비 고
				내 용	폭	길이	깊이	물 량	단위	개소	
1	8-9	S	2013	균열	1.0	15.0		15.00	m	1	신규
2	9-10	S	2013	균열	1.0	15.0		15.00	m	1	신규
3	10-11	S	2013	균열	1.0	15.0		15.00	m	1	신규
4	11-12	S	2013	망상균열	2.0	3.0		6.00	㎡	1	신규
5	11-13	S	2013	구스조인트소성변형	0.3	2.0		0.60	㎡	1	신규
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

-1순위 : Type-7~9 (예일여고~역말사거리)
-2순위 : Type-9~11 (역말사거리~신사오거리) 및 조인트 손상
-3순위 : Type-1~7 (시점~예일여고) 및 포장균열

범 례	균 열	재료분리	박리,파손	망상균열	거푸집미제거	펀칭, 공동	시공이음분리,층분리	이토퇴적	철근노출	철근부식	누수, 습윤	백태	강재표면부식	콘크리트변색,녹물	단 위	/mm 지름	T=mm 두께	A=mxm 면적

발주처	용역사	PROJECT	TITLE	SCALE
서울특별시 서부도로사업소	(주)한국시설안전연구원	불광천1복개 정밀안전진단 및 녹번천복개 정밀점검 용역	불 광 천 포 장 부 J8(0K 234) ~ J13(0K 376)	NONE 0-3
