KEY PLAN



횡단면도



범 례



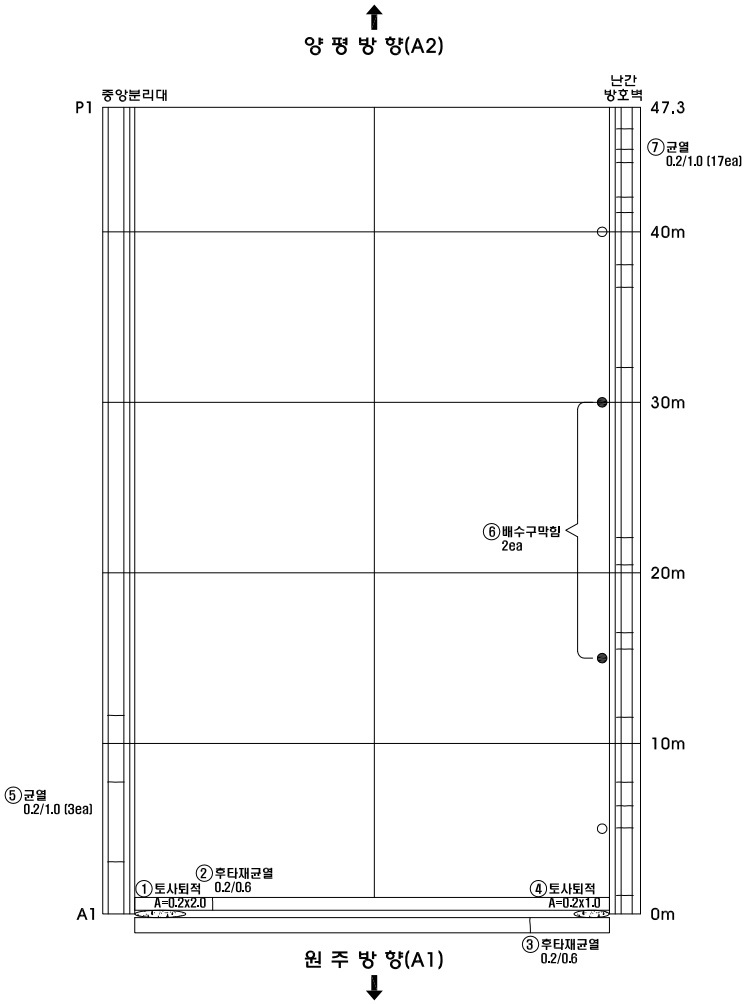

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	신축이음(유간)	토사퇴적		0.20	2.00	0.40	1	
2	후타재	균열	0.20	0.60			1	
3	후타재	균열	0.20	0.60			1	
4	신축이음(유간)	토사퇴적		0.20	1.00	0.20	1	
5	중앙분리대	균열	0.20	1.00			3	
6	배수구	막힘					2	
7	난간방호벽	균열	0.20	1.00			17	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S1)	외관조사망도	NONE	01

KEY PLAN



횡단면도



범 례



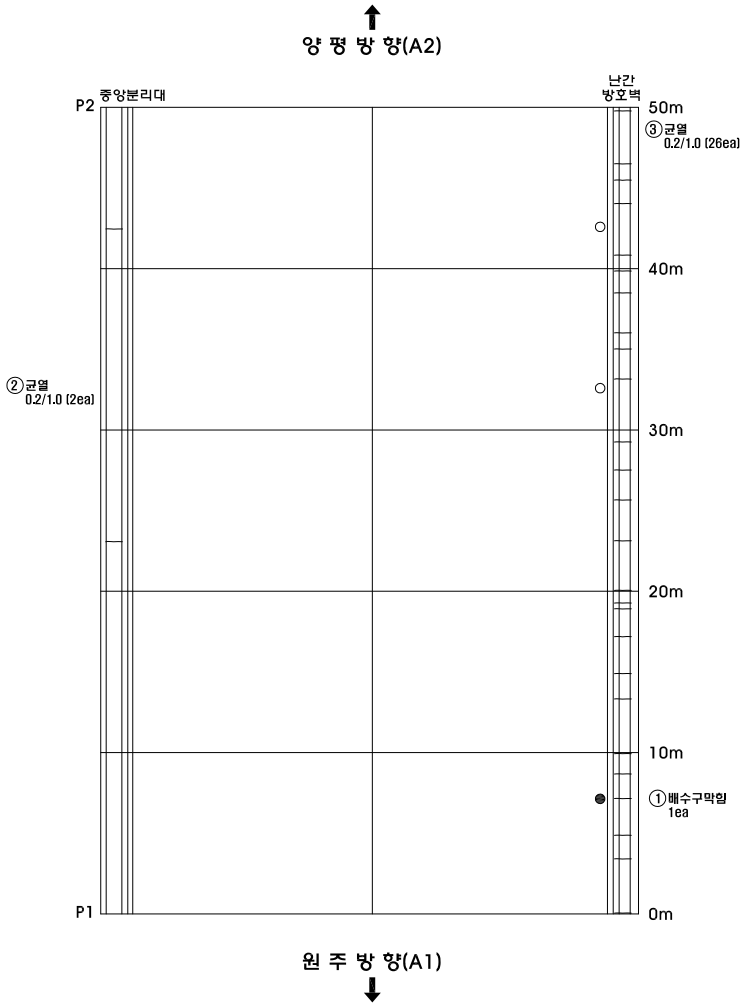

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	배수구	막힘					1	
2	중앙분리대	균열	0.20	1.00			2	
3	난간방호벽	균열	0.20	1.00			26	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S2)	외관조사망도	NONE	02

KEY PLAN



횡단면도



범 례



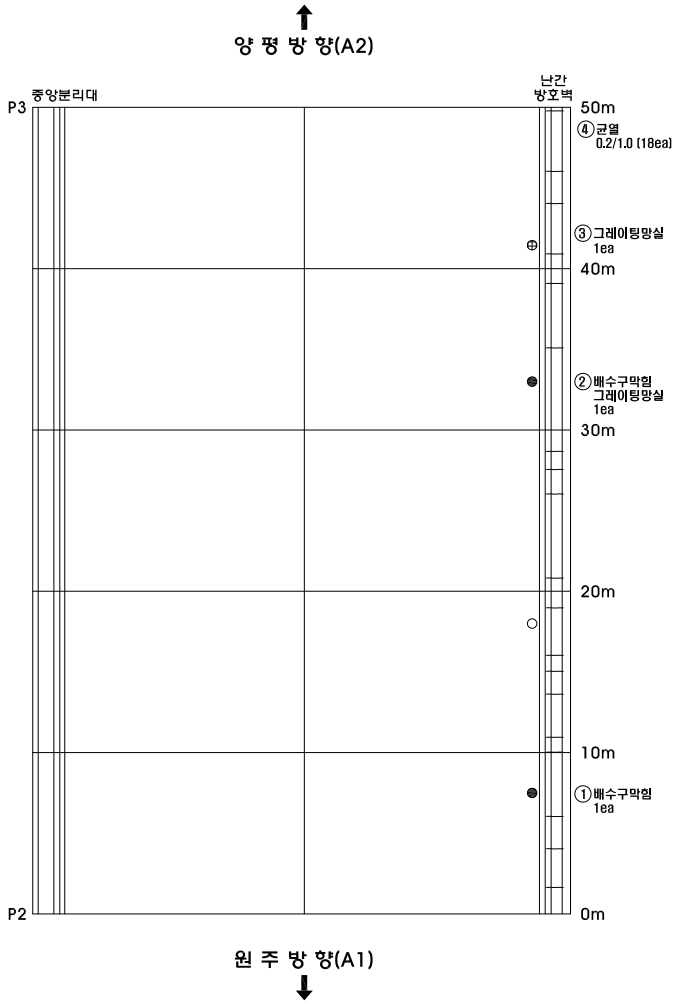

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	배수구	막힘					1	
2	배수구	막힘					1	
	배수구	그레이팅망실					1	
3	배수구	그레이팅망실					1	
4	난간방호벽	균열	0.20	1.00			18	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S3)	외관조사망도	NONE	03

KEY PLAN



횡단면도



범 례



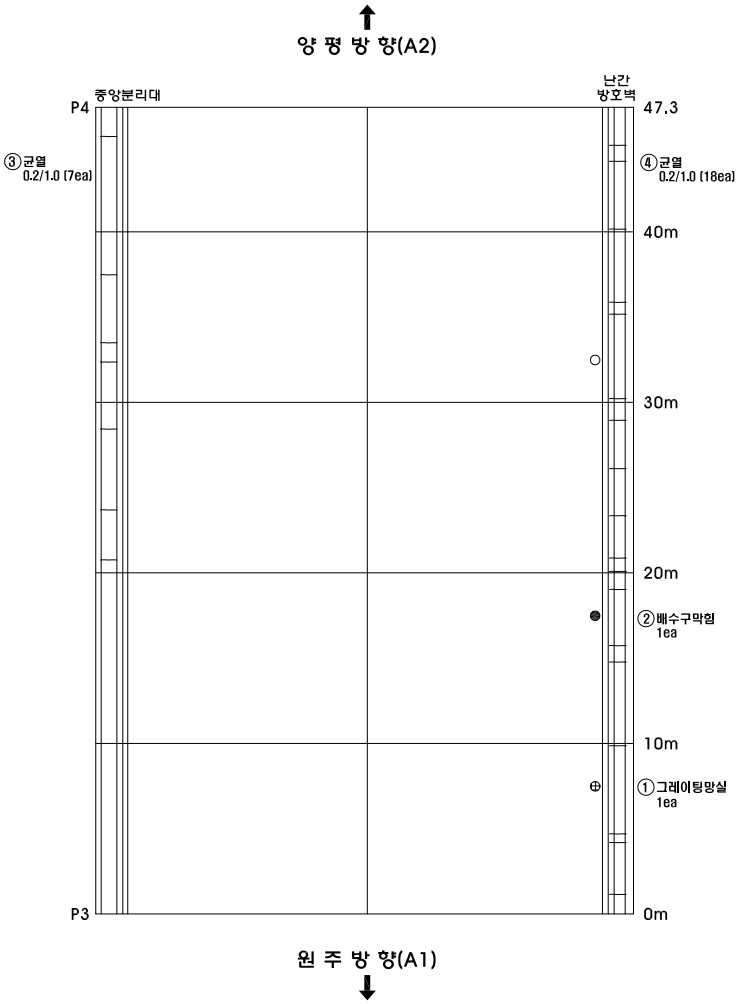

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	배수구	그레이팅망실					1	
2	배수구	막힘					1	
3	중앙분리대	균열	0.20	1.00			7	
3	난간방호벽	균열	0.20	1.00			18	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S4)	외관조사망도	NONE	04

KEY PLAN



횡단면도



범 례



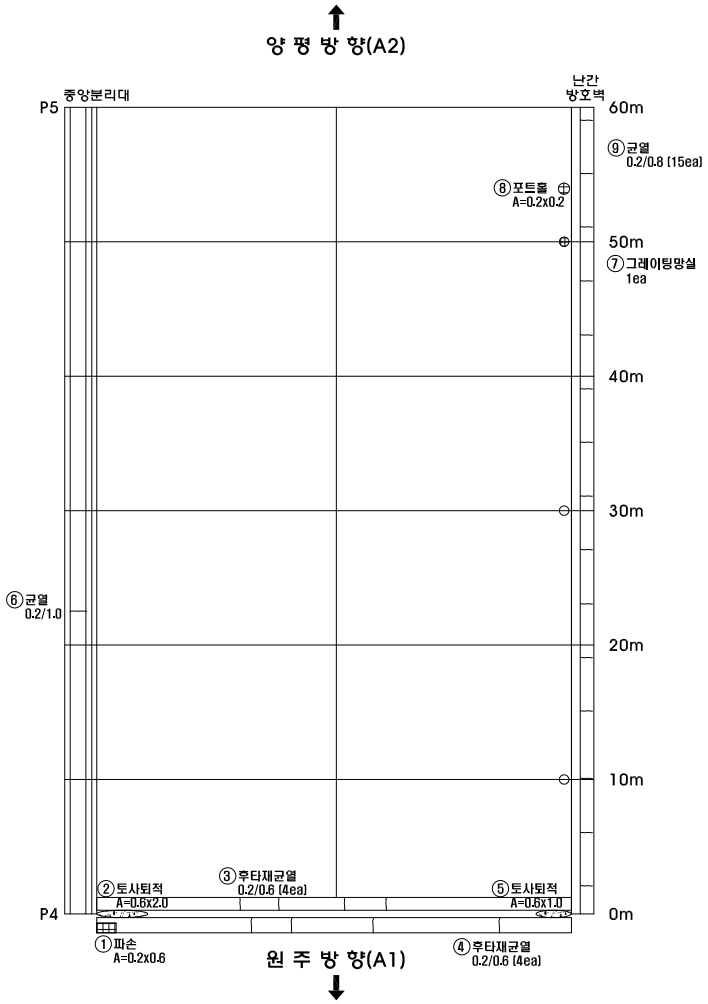

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	후타재	파손		0.20	0.60	0.12	1	
2	신축이음(유간)	토사퇴적		0.60	2.00	1.20	1	
3	후타재	균열	0.20	0.60			4	
4	후타재	균열	0.20	0.60			4	
5	신축이음(유간)	토사퇴적		0.60	1.00	0.60	1	
6	중앙분리대	균열	0.20	1.00			1	
7	배수구	그레이팅망실					1	
8	교면포장	포트홀		0.20	0.20	0.04	1	
9	난간방호벽	균열	0.20	0.80			15	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S5)	외관조사망도	NONE	05

KEY PLAN



횡단면도



범 례



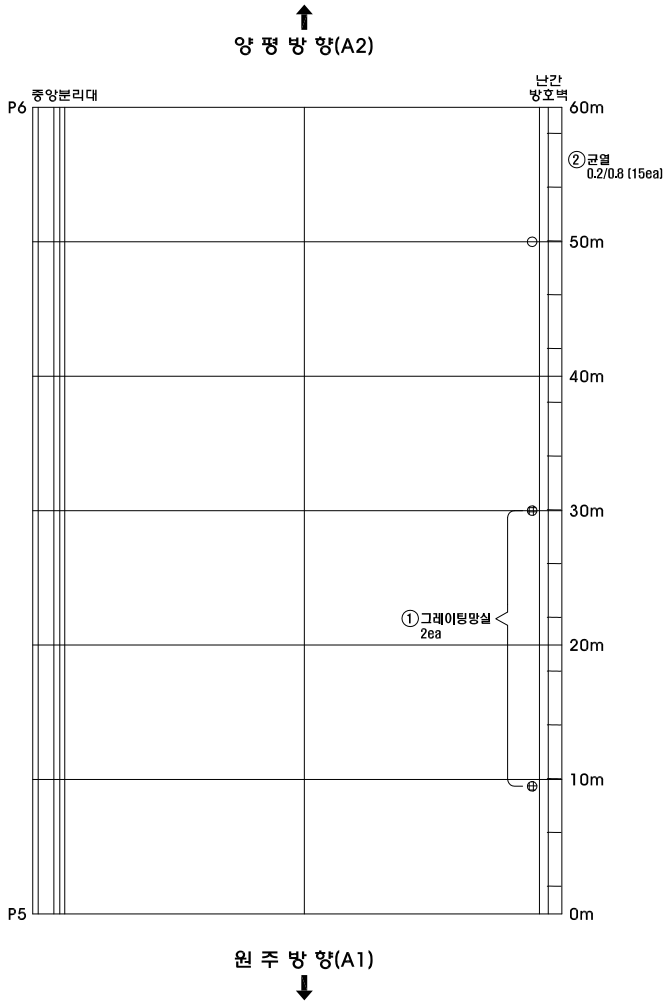

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	배수구	그레이팅망실					2	
2	난간방호벽	균열	0.20	0.80			15	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S6)	외관조사망도	NONE	06

KEY PLAN



횡단면도



범 례



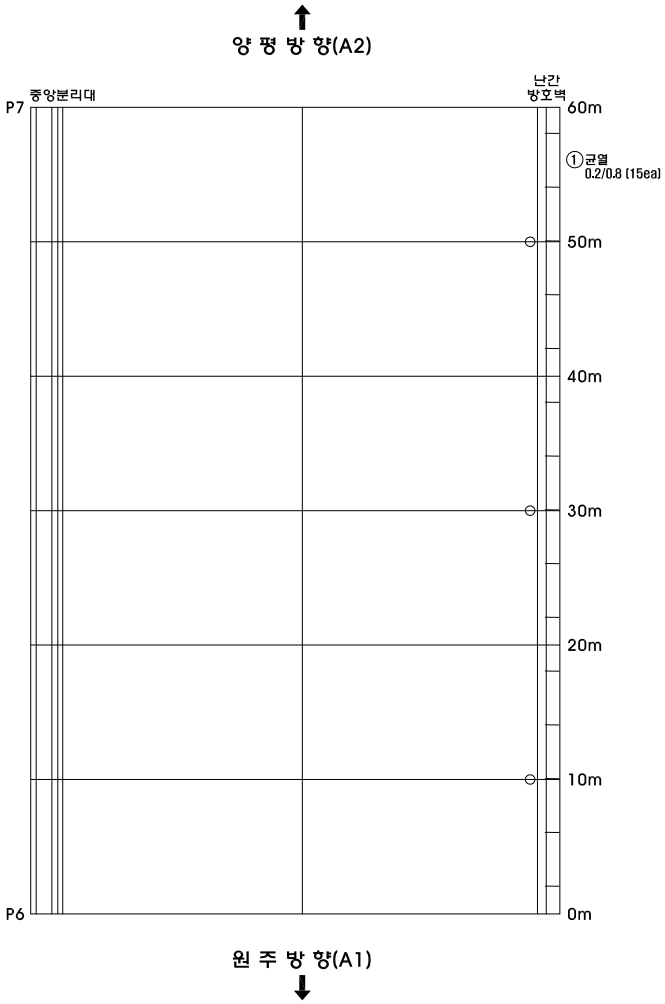

일련번호	위치	손상내용	결함정도					비고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	난간방호벽	균열	0.20	0.80			15	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S7)	외관조사망도	NONE	07

KEY PLAN



횡단면도



범 례



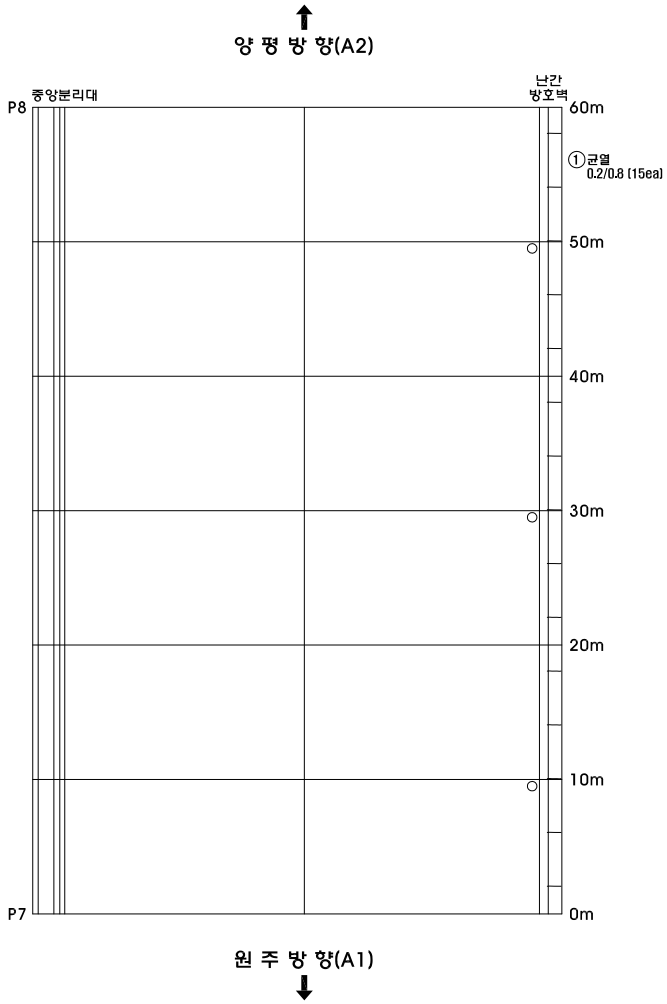

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	난간방호벽	균열	0.20	0.80			15	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S8)	외관조사망도	NONE	08

KEY PLAN



횡단면도



범 례



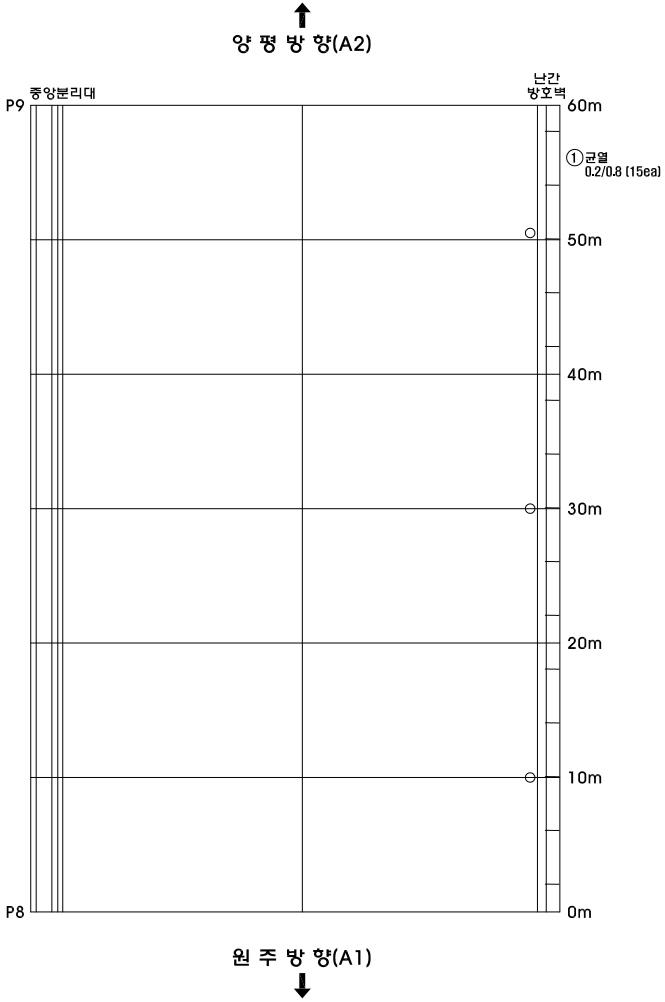

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	난간방호벽	균열	0.20	0.80			15	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S9)	외관조사망도	NONE	09

KEY PLAN



횡단면도



범 례



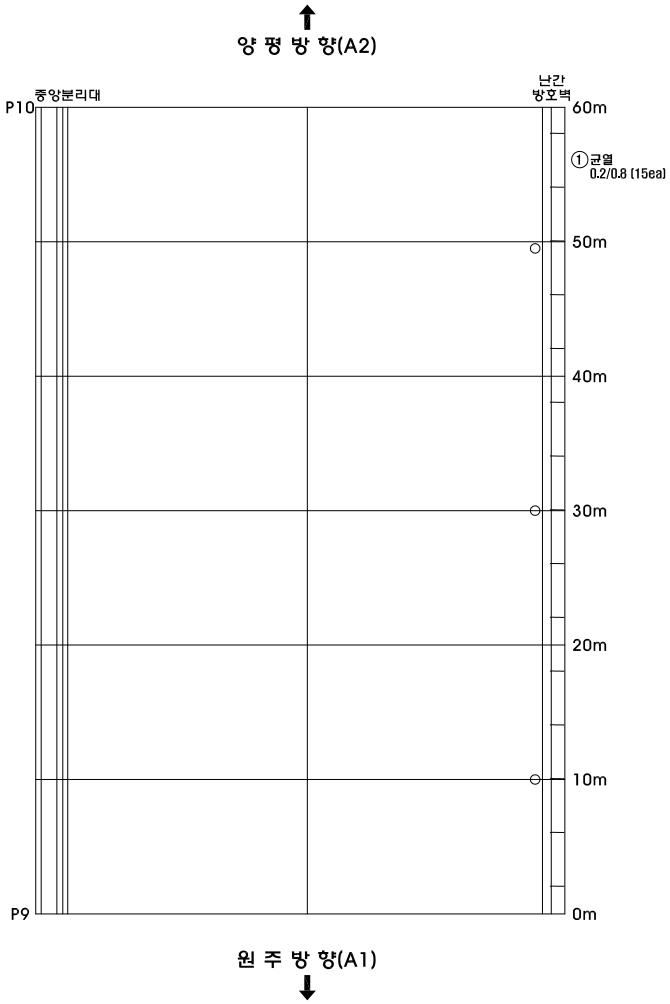

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	난간방호벽	균열	0.20	0.80			15	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S10)	외관조사망도	NONE	10

KEY PLAN



횡단면도



범 례



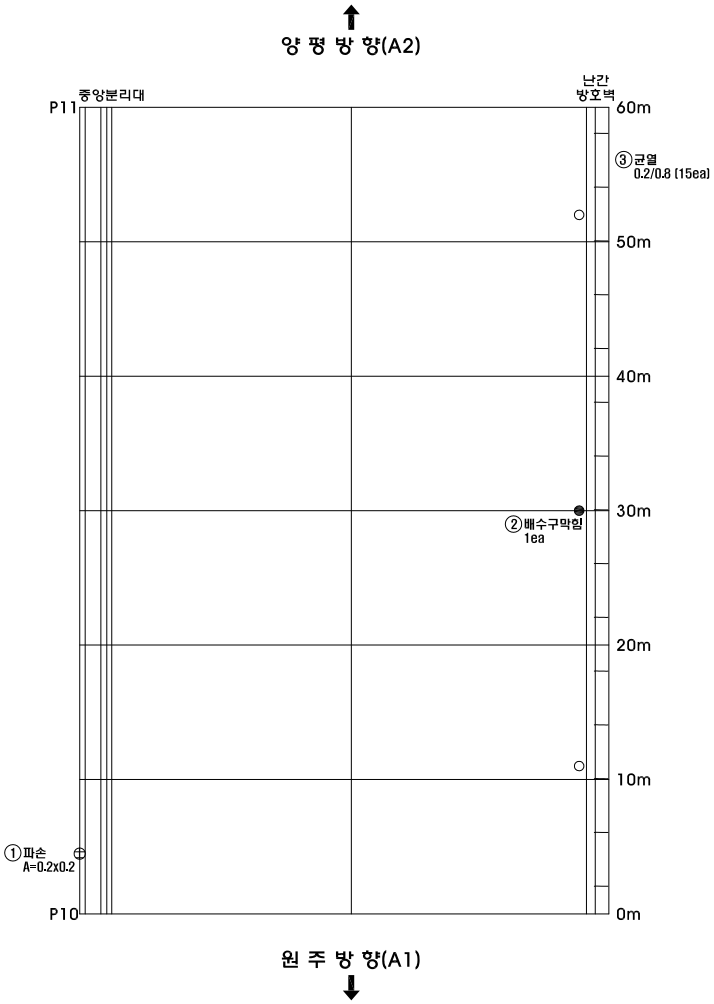

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	중앙분리대	파손		0.20	0.20	0.04	1	
2	배수구	막힘					1	
3	난간방호벽	균열	0.20	0.80			15	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S11)	외관조사망도	NONE	11

KEY PLAN



횡단면도



범 례



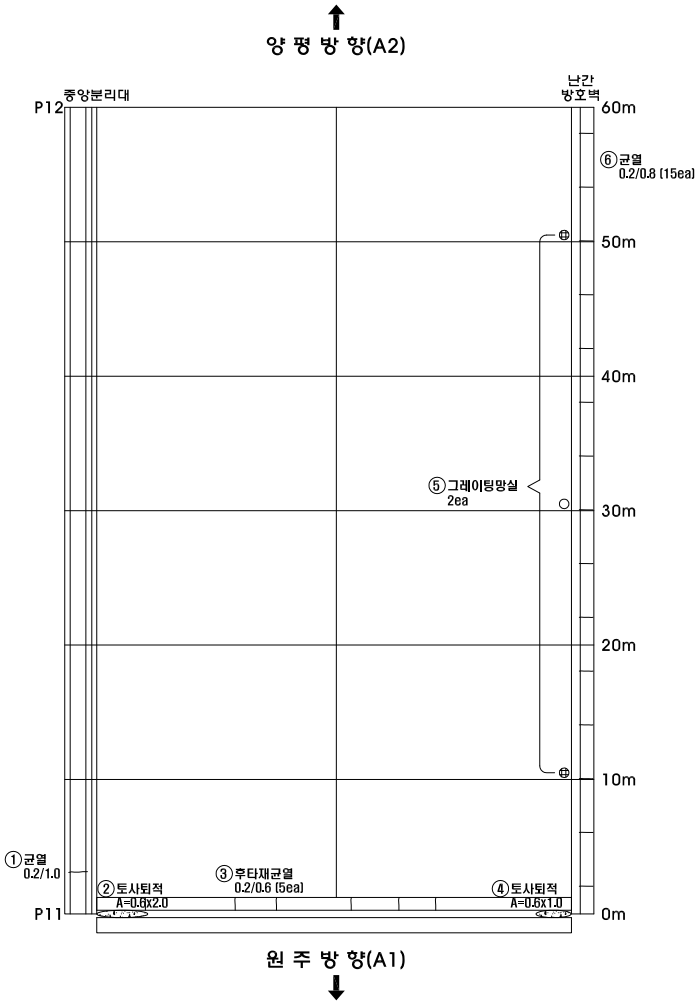

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	중앙분리대	균열	0.20	1.00			1	
2	신축이음(유간)	토사퇴적		0.60	2.00	1.20	1	
3	후타재	균열	0.20	0.60			5	
4	신축이음(유간)	토사퇴적		0.60	1.00	0.60	1	
5	배수구	그레이팅맹실					2	
6	난간방호벽	균열	0.20	0.80			15	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S12)	외관조사망도	NONE	12

KEY PLAN



횡단면도



범 례



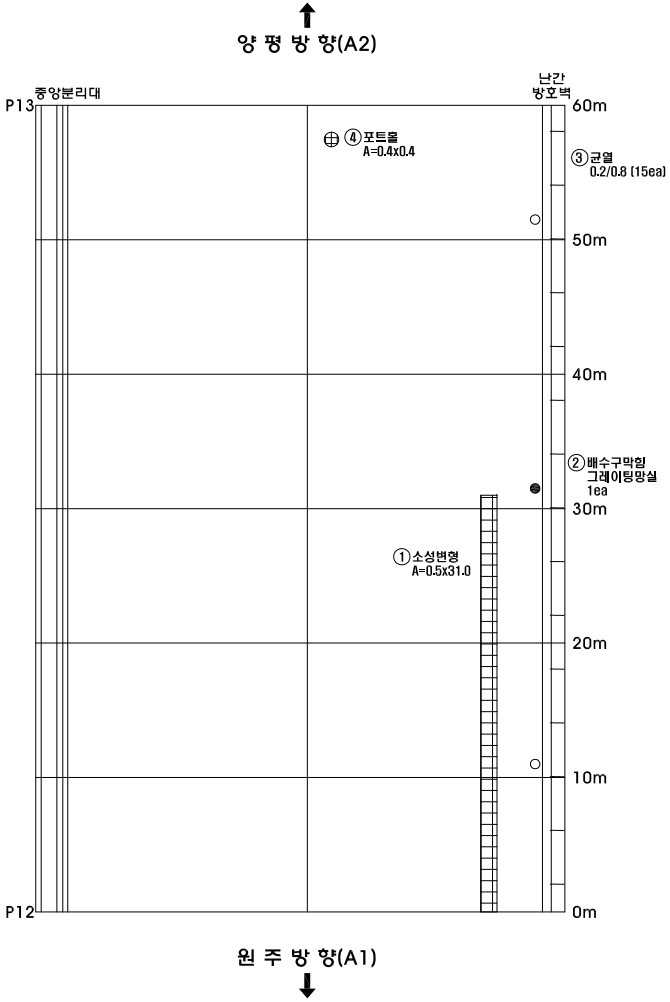

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교면포장	소성변형		0.50	31.00	15.50	1	
2	배수구	막힘					1	
	배수구	그레이팅망실					1	
3	난간방호벽	균열	0.20	0.80			15	
4	교면포장	포트홀		0.40	0.40	0.16	1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S13)	외관조사망도	NONE	13

KEY PLAN



횡단면도



범 례



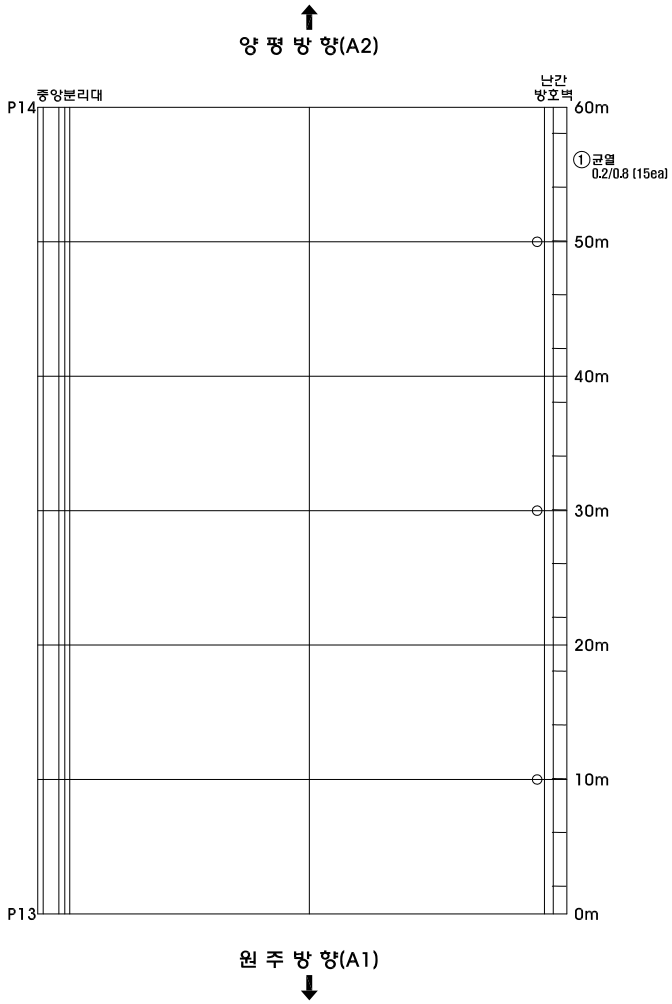

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	난간방호벽	균열	0.20	0.80			15	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S14)	외관조사망도	NONE	14

KEY PLAN



횡단면도



범 례



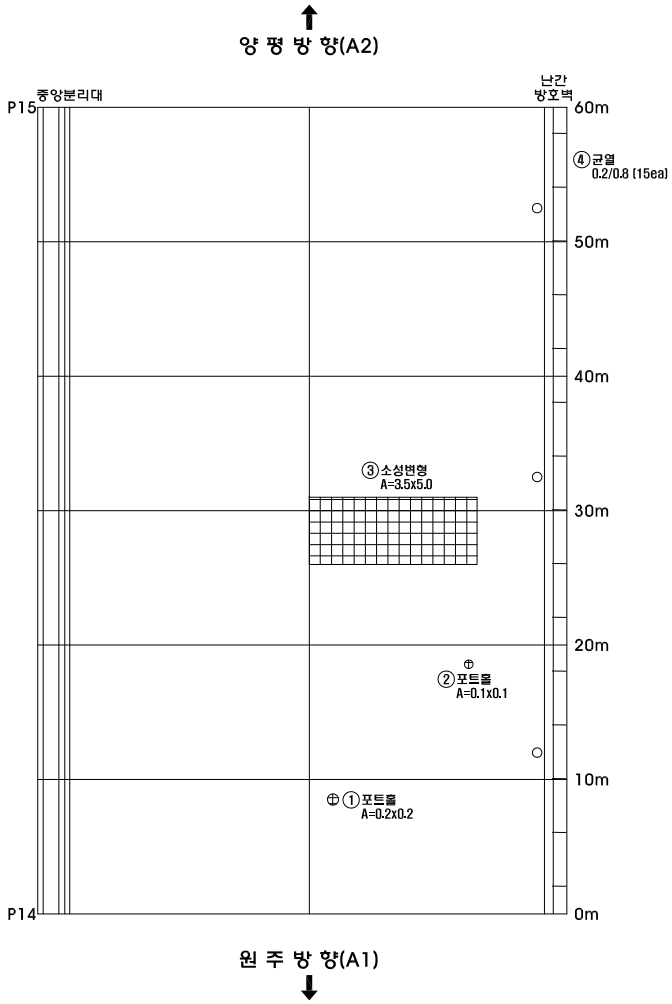

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교면포장	포트홀		0.20	0.20	0.04	1	
2	교면포장	포트홀		0.10	0.10	0.01	1	
3	교면포장	소성변형		3.50	5.00	17.50	1	
4	난간방호벽	균열	0.20	0.80			15	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S15)	외관조사망도	NONE	15

KEY PLAN



횡단면도



범 례



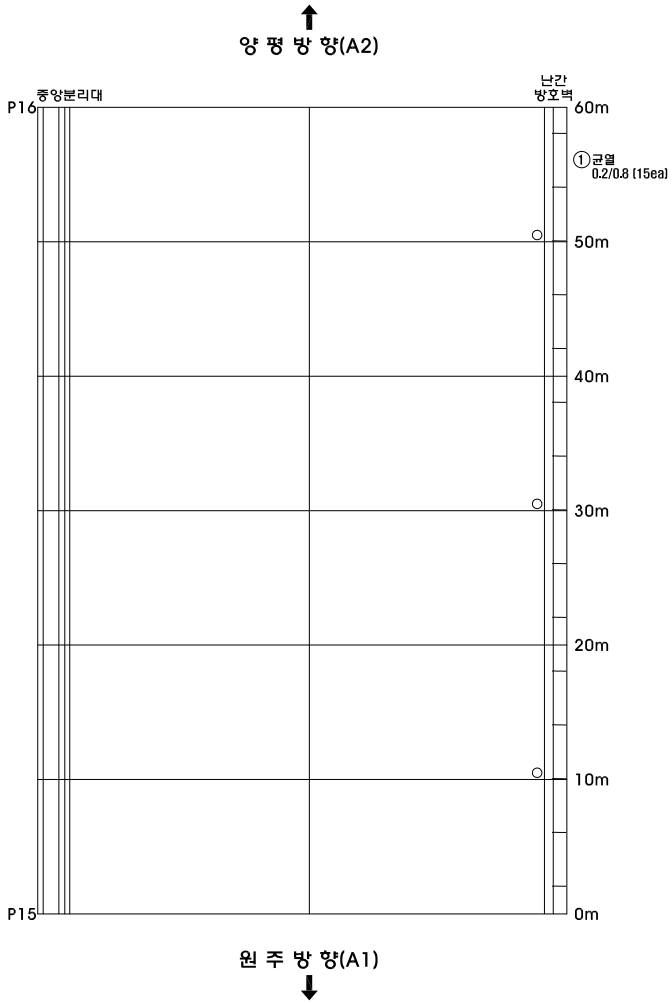

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	난간방호벽	균열	0.20	0.80			15	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S16)	외관조사망도	NONE	16

KEY PLAN



횡단면도



범 례



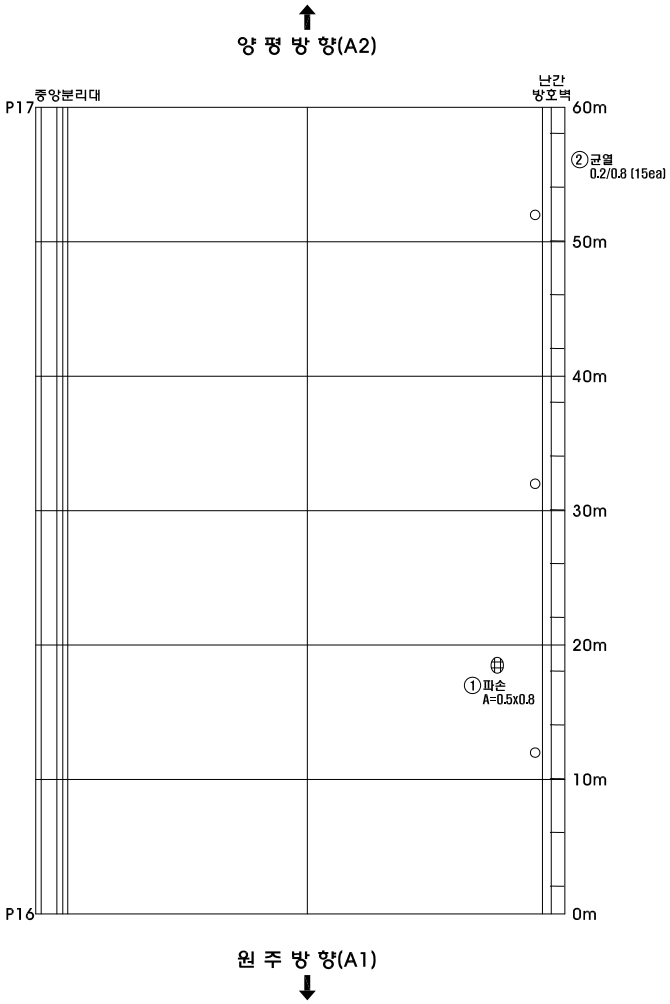

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교면포장	파손		0.50	0.80	0.40	1	
2	난간방호벽	균열	0.20	0.80			15	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S17)	외관조사망도	NONE	17

KEY PLAN



횡단면도



범 례



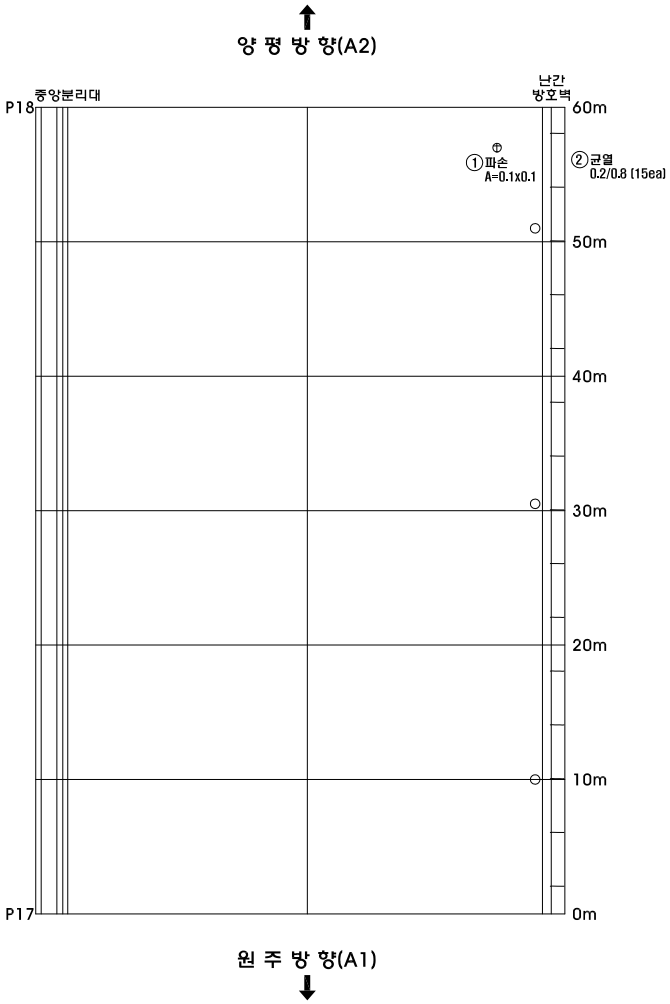

일련번호	위치	손상내용	결함정도					비고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교면포장	파손		0.10	0.10	0.01	1	
2	난간방호벽	균열	0.20	0.80			15	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S18)	외관조사망도	NONE	18

KEY PLAN



횡단면도



범 례



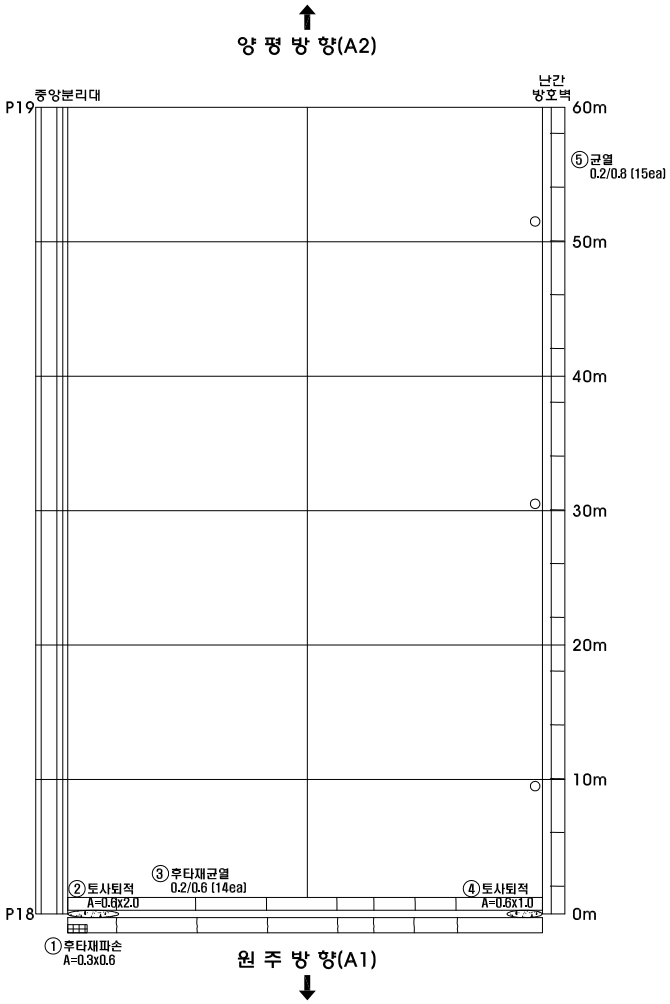

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	후타재	파손		0.30	0.60	0.18	1	
2	신축이음(유간)	토사퇴적		0.60	2.00	1.20	1	
3	후타재	균열	0.20	0.60			14	
4	신축이음(유간)	토사퇴적		0.60	1.00	0.60	2	
5	난간방호벽	균열	0.20	0.80			15	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S19)	외관조사망도	NONE	19

KEY PLAN



횡단면도



범 례



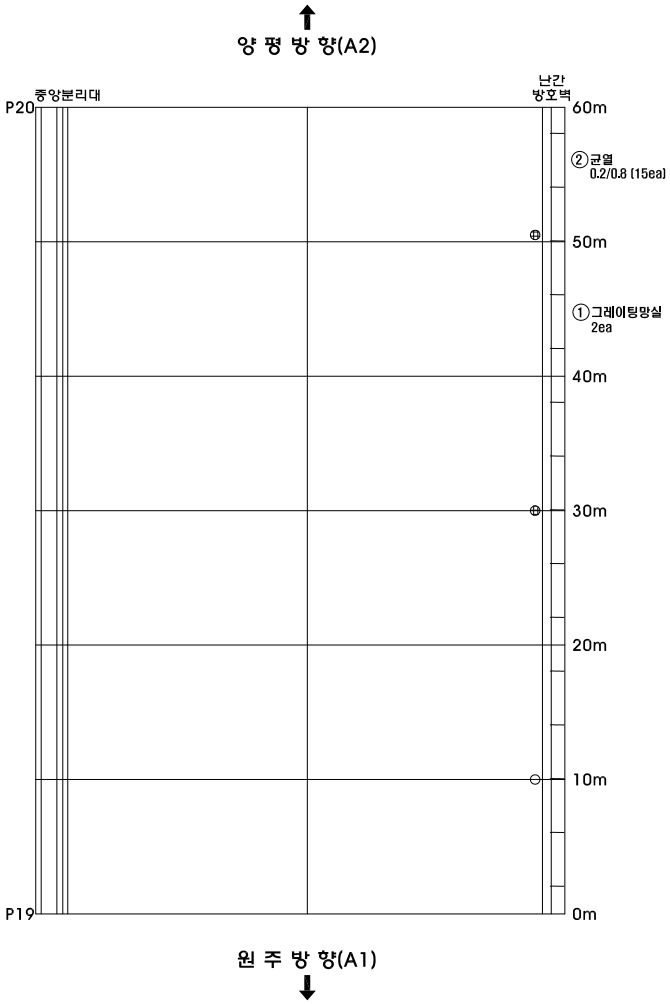

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	배수구	그레이팅망실					2	
2	난간방호벽	균열	0.20	0.80			15	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S20)	외관조사망도	NONE	20

KEY PLAN



횡단면도



범 례



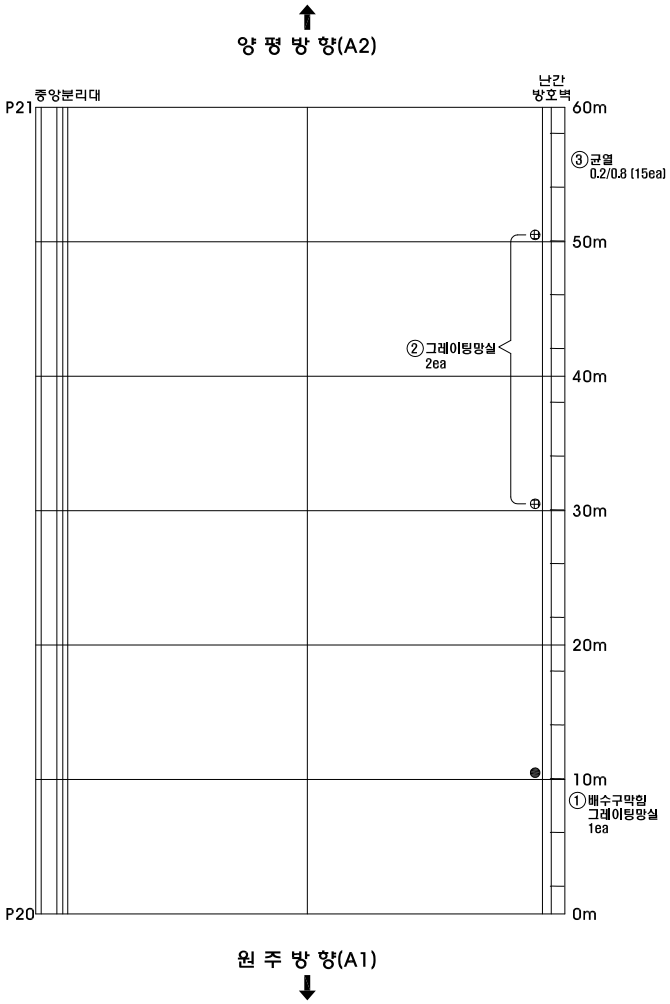

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	배수구	막힘					1	
	배수구	그레이팅망실					1	
2	배수구	그레이팅망실					2	
3	난간방호벽	균열	0.20	0.80			15	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S21)	외관조사망도	NONE	21

KEY PLAN



횡단면도



범 례



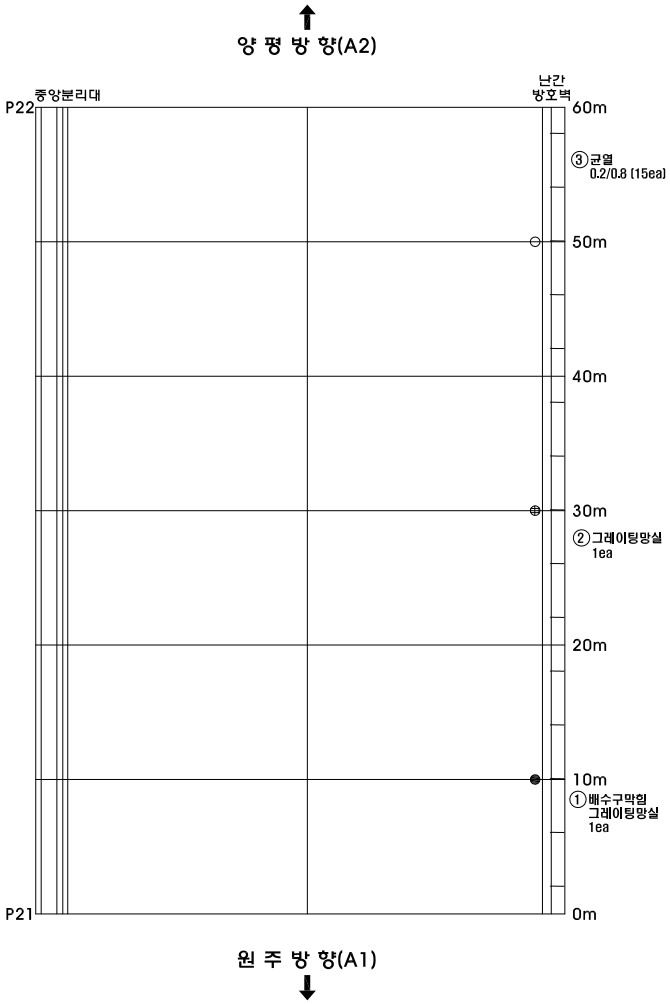

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	배수구	막힘					1	
	배수구	그레이팅망실					1	
2	배수구	그레이팅망실					1	
3	난간방호벽	균열	0.20	0.80			15	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S22)	외관조사망도	NONE	22

KEY PLAN



횡단면도



범 례



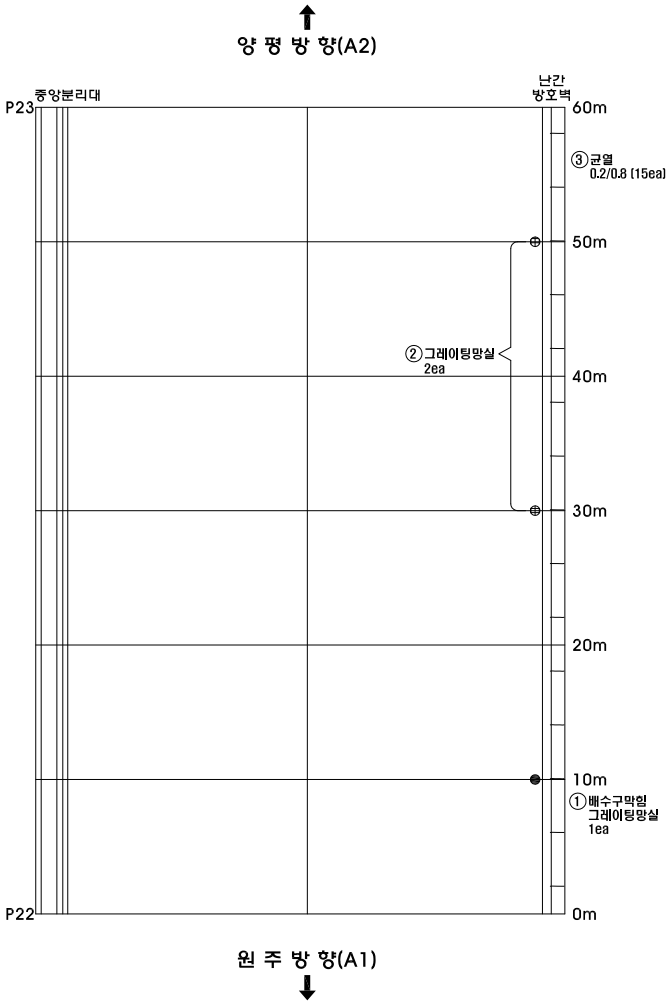

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	배수구	막힘					1	
	배수구	그레이팅망실					1	
2	배수구	그레이팅망실					2	
3	난간방호벽	균열	0.20	0.80			15	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S23)	외관조사망도	NONE	23

KEY PLAN



횡단면도



범 례



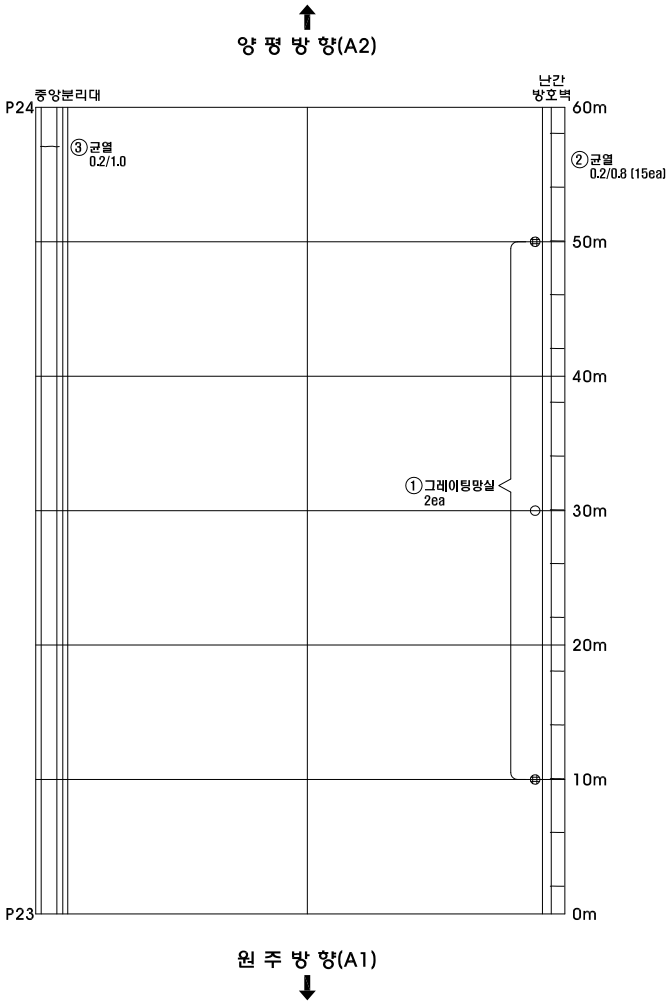

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	배수구	그레이팅망실					2	
2	난간방호벽	균열	0.20	0.80			15	
3	중앙분리대	균열	0.20	1.00			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S24)	외관조사망도	NONE	24

KEY PLAN



횡단면도



범 례



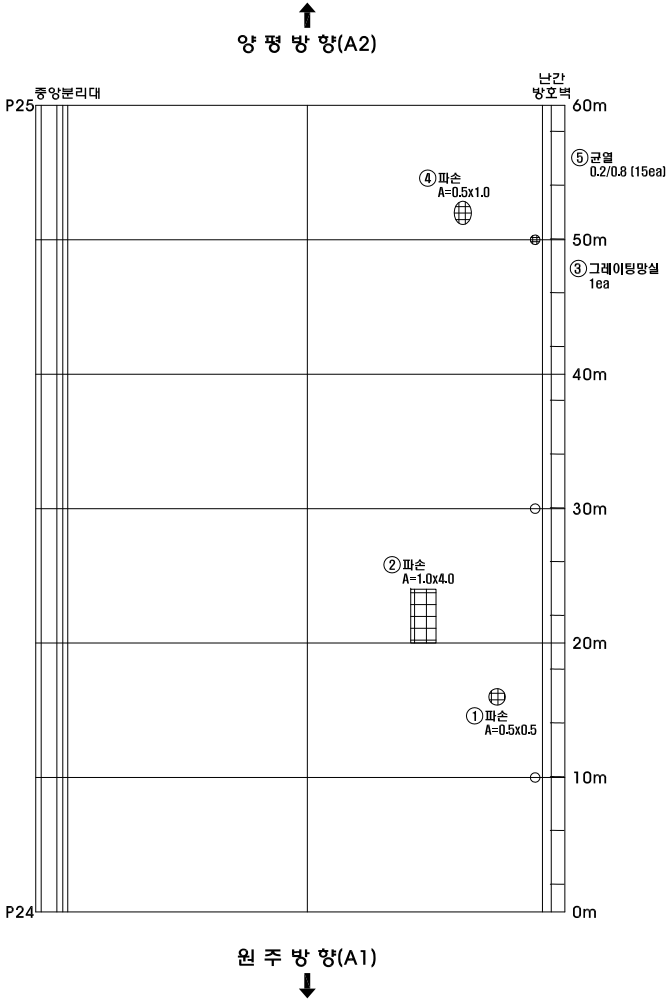

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교면포장	파손		0.50	0.50	0.25	1	
2	교면포장	파손		1.00	4.00	4.00	1	
3	배수구	그레이팅망실					1	
4	교면포장	파손		0.50	1.00	0.50	1	
5	난간방호벽	균열	0.20	0.80			15	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S25)	외관조사망도	NONE	25

KEY PLAN



횡단면도



범 례



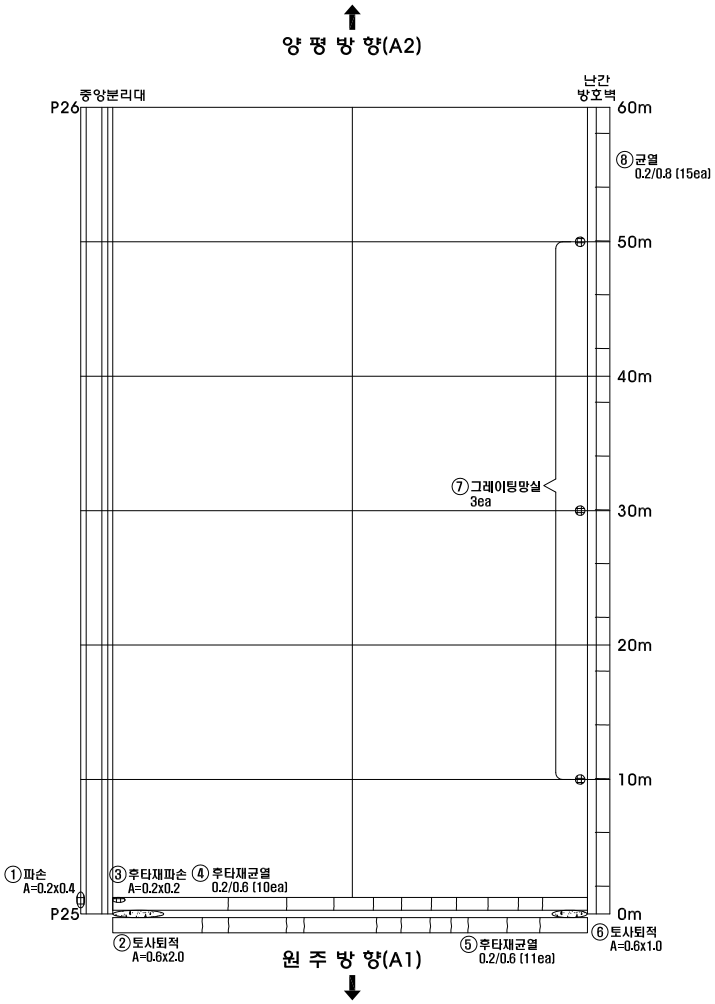

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	중앙분리대	파손		0.20	0.40	0.08	1	
2	신축이음(유간)	토사퇴적		0.60	2.00	1.20	1	
3	후타재	파손		0.20	0.20	0.04	1	
4	후타재	균열	0.20	0.60			10	
5	후타재	균열	0.20	0.60			11	
6	신축이음(유간)	토사퇴적		0.60	1.00	0.60	1	
7	배수구	그레이팅망실					3	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S26)	외관조사망도	NONE	26

KEY PLAN



횡단면도



범 례



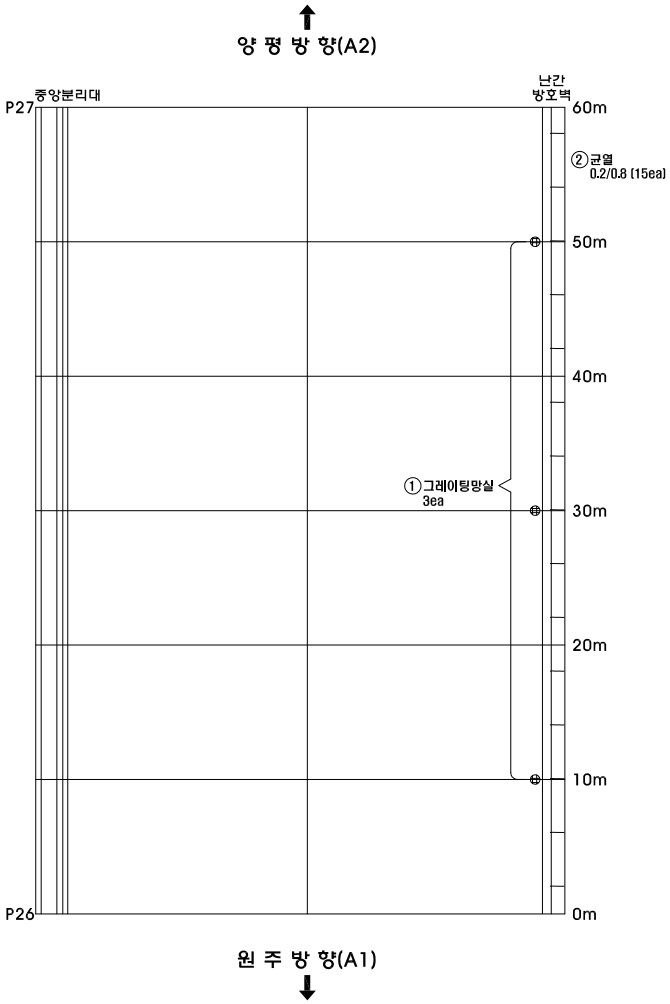

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	배수구	그레이팅망실					3	
2	난간방호벽	균열	0.20	0.80			15	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S27)	외관조사망도	NONE	27

KEY PLAN



횡단면도



범 례



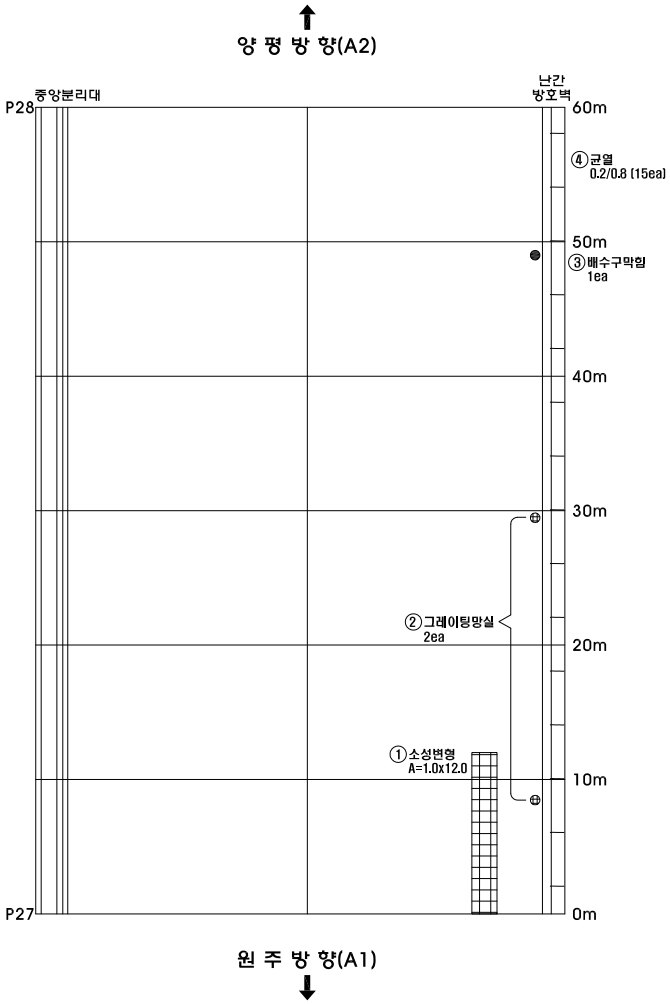

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교면포장	소성변형		1.00	12.00	12.00	1	
2	배수구	그레이팅망실					2	
3	배수구	막힘					1	
4	난간방호벽	균열	0.20	0.80			15	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S28)	외관조사망도	NONE	28

KEY PLAN



횡단면도



범 례



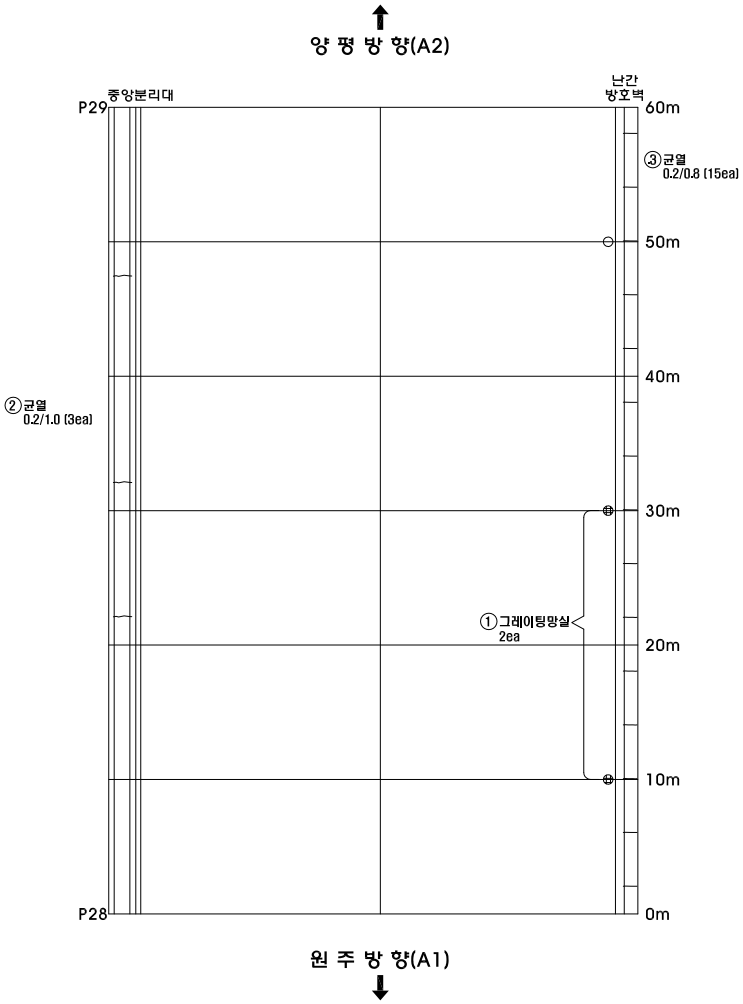

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	해수구	그레이팅망실					2	
2	중앙분리대	균열	0.20	1.00			3	
3	난간방호벽	균열	0.20	0.80			15	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S29)	외관조사망도	NONE	29

KEY PLAN



횡단면도



범 례



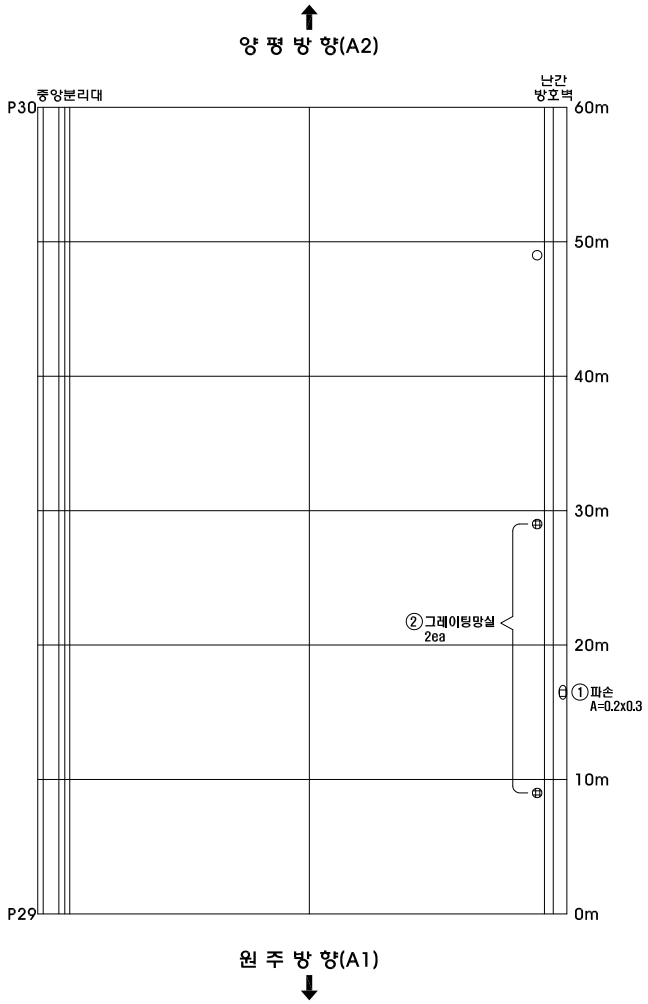

일련번호	위 치	손상내용	결함정도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	난간방호벽	파손		0.20	0.30	0.06	1	
2	배수구	그레이팅망실					2	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S30)	외관조사망도	NONE	30

KEY PLAN



횡단면도



범 례



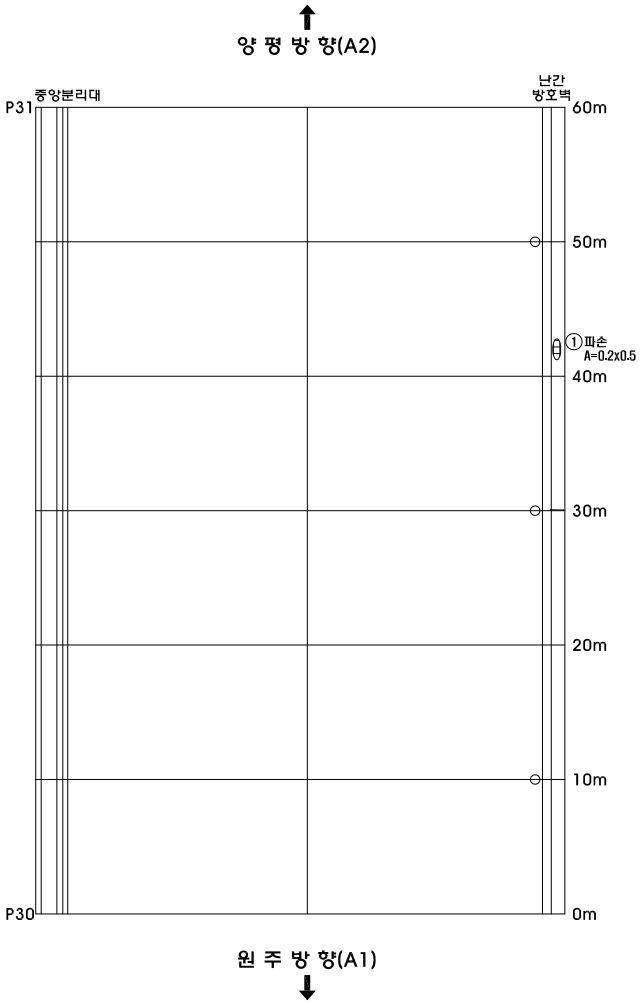

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	난간방호벽	파손		0.20	0.50	0.10	1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S31)	외관조사망도	NONE	31

KEY PLAN



횡단면도



범 례



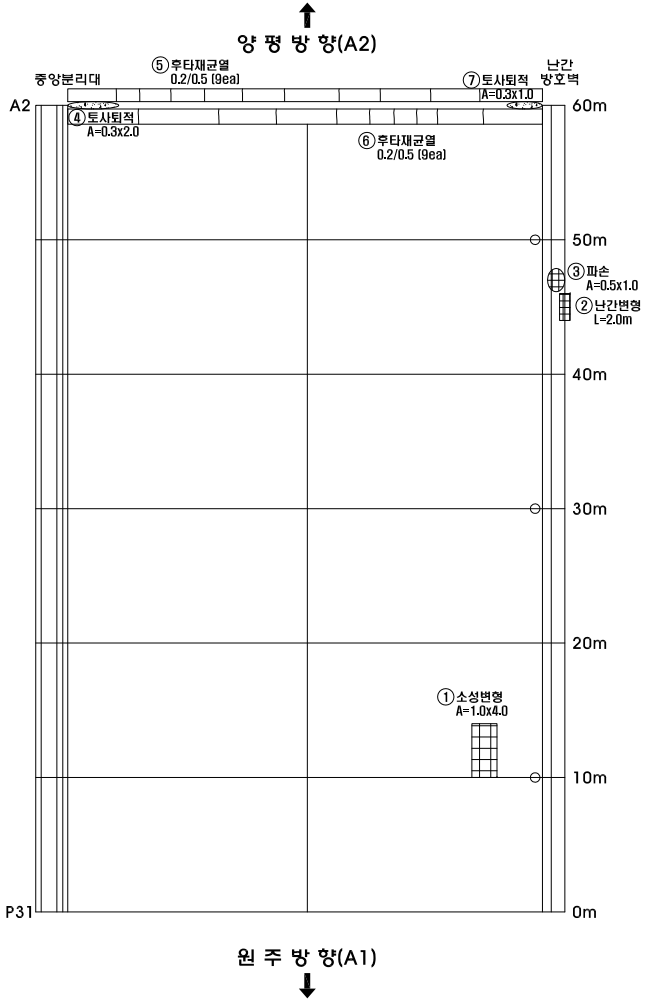

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교면포장	소성변형		1.00	4.00	4.00	1	
2	난간방호벽	변형		2.00			1	
3	난간방호벽	파손		0.50	1.00	0.50	1	
4	신축이음(유간)	토사퇴적		0.30	2.00	0.60	1	
5	후타재	균열	0.20	0.50			9	
6	후타재	균열	0.20	0.50			9	
7	신축이음(유간)	토사퇴적		0.30	1.00	0.30	1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교면포장 (S32)	외관조사망도	NONE	32

KEY PLAN



횡단면도



범 례



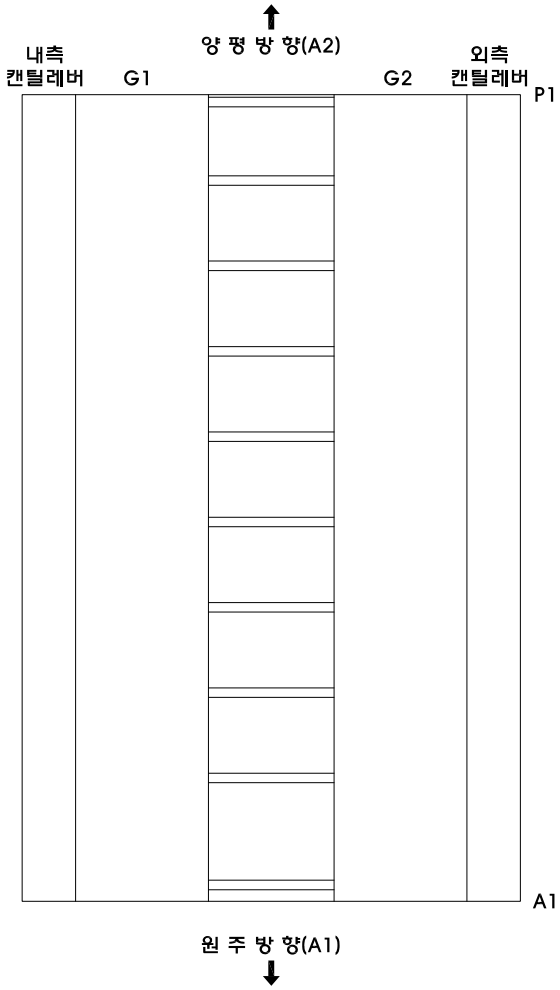

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S1)	외관조사망도	NONE	33

KEY PLAN



횡단면도



범 례



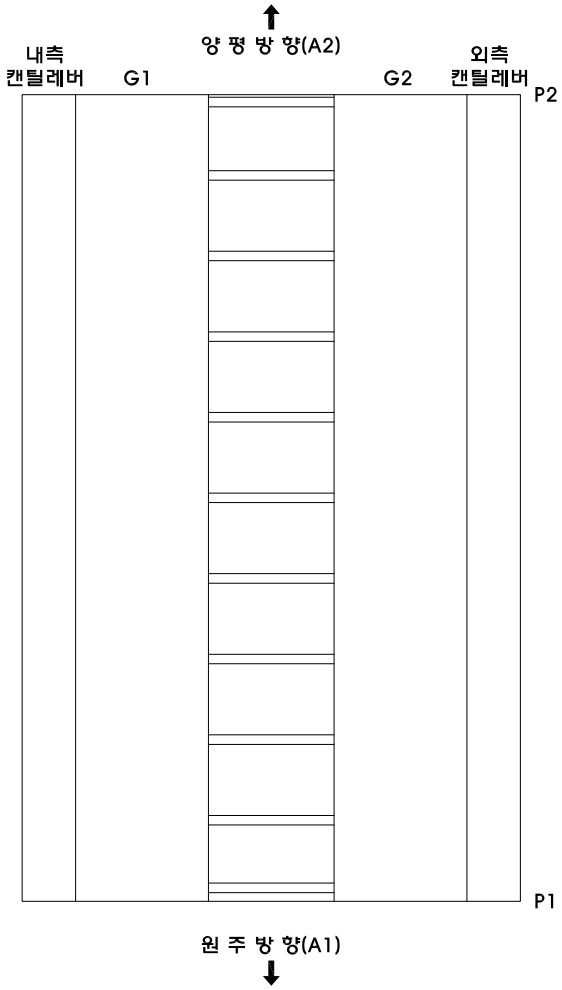

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S2)	외관조사망도	NONE	34

KEY PLAN



횡단면도



범 례



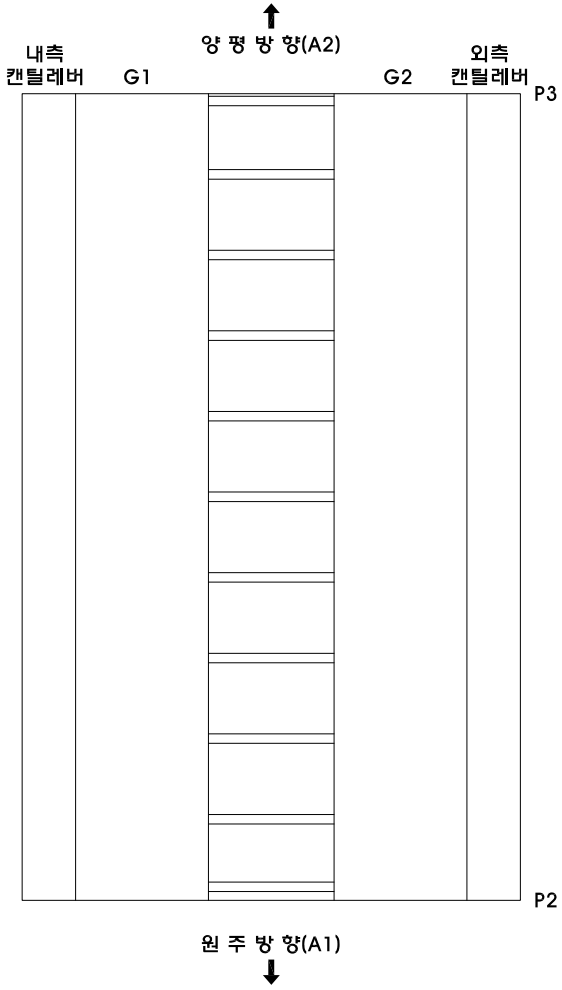

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S3)	외관조사망도	NONE	35

KEY PLAN



횡단면도



범 례



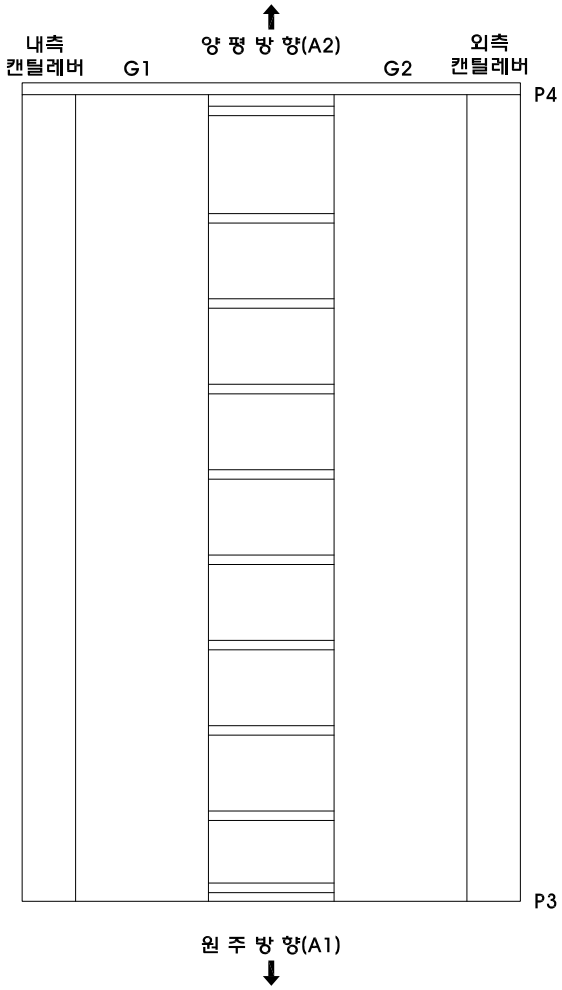

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S4)	외관조사망도	NONE	36

KEY PLAN



횡단면도



범 례



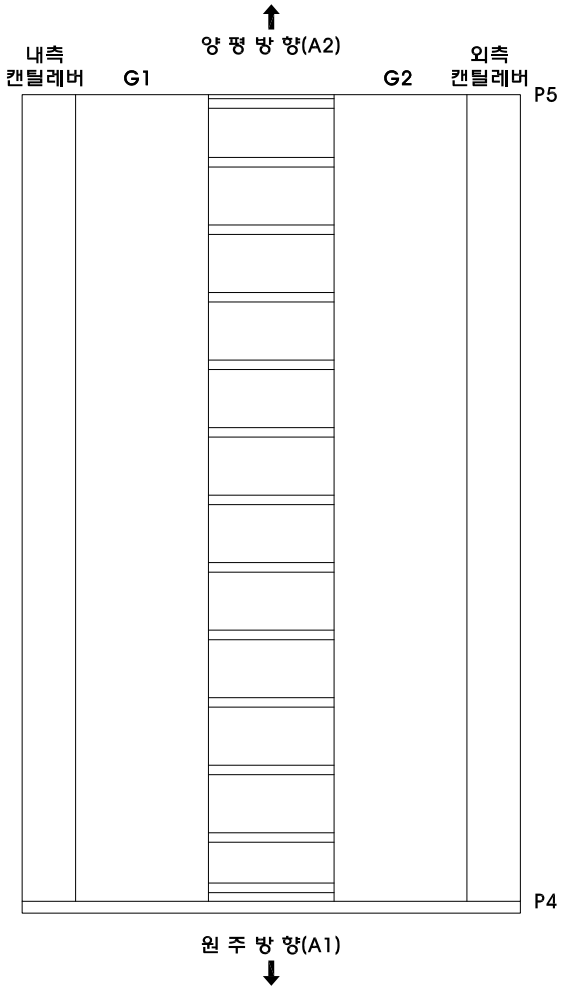

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S5)	외관조사망도	NONE	37

KEY PLAN



횡단면도



범 례



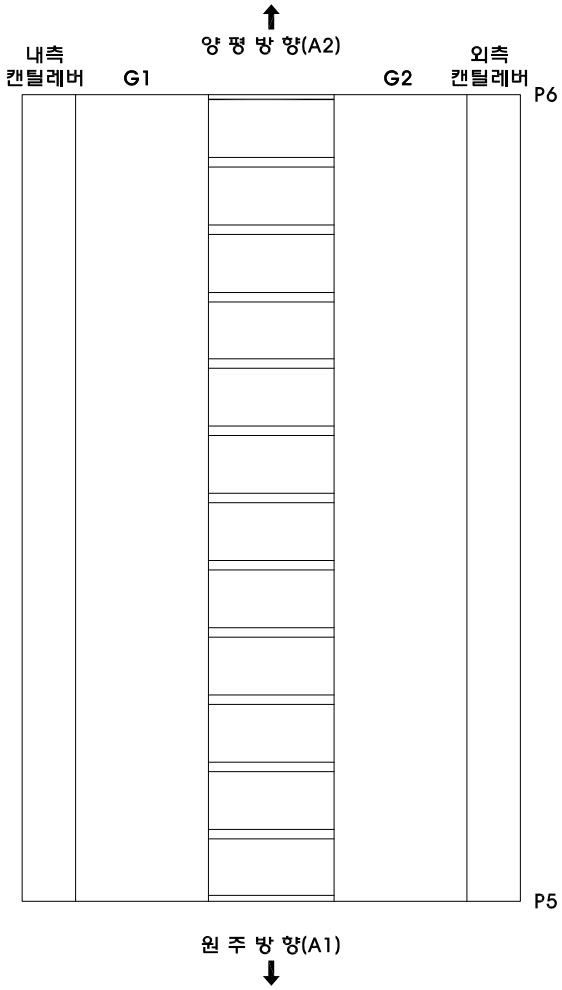

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S6)	외관조사망도	NONE	38

KEY PLAN



횡단면도



범 례



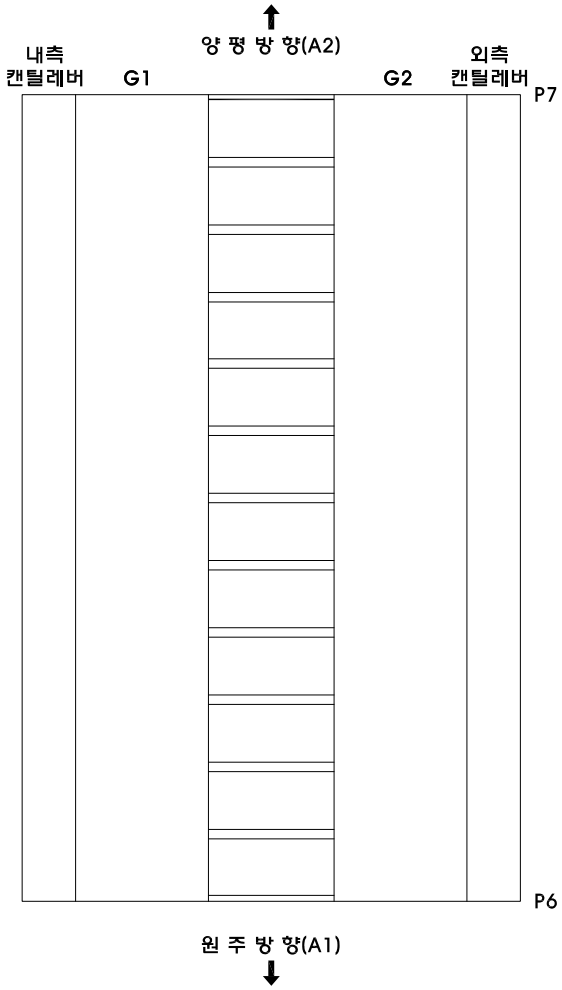

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S7)	외관조사망도	NONE	39

KEY PLAN



횡단면도



범 례



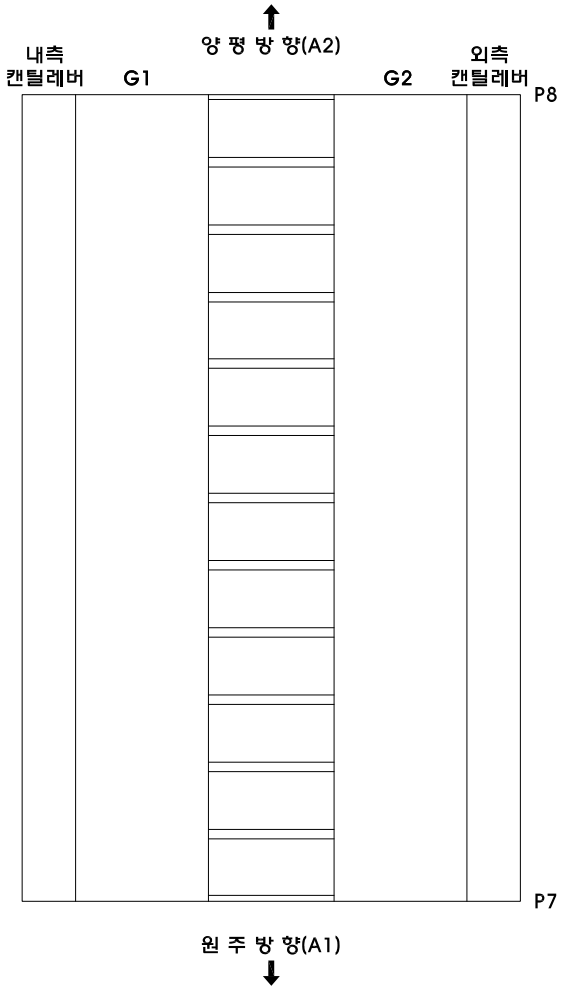

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S8)	외관조사망도	NONE	40

KEY PLAN



횡단면도



범 례



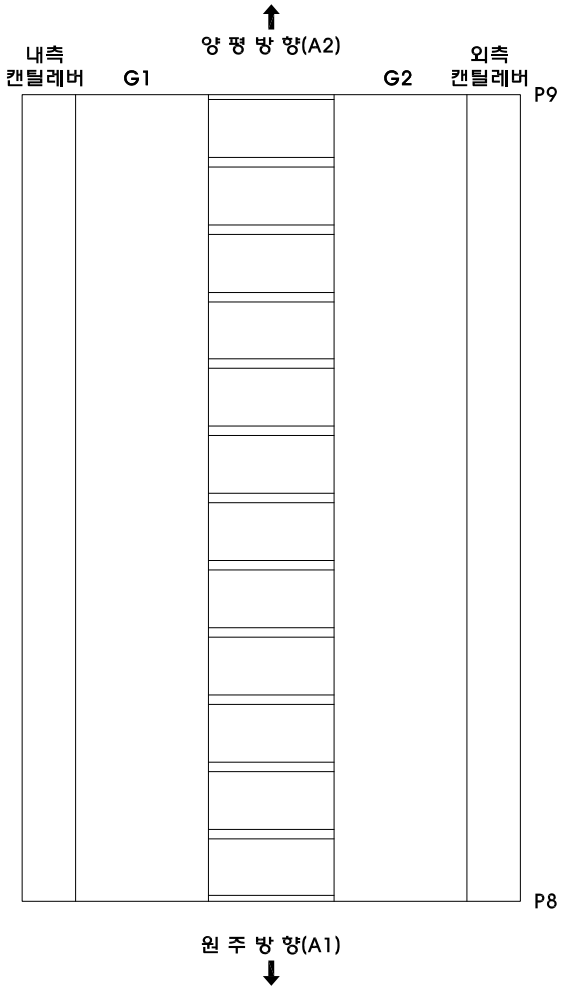

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S9)	외관조사망도	NONE	41

KEY PLAN



횡단면도



범 례



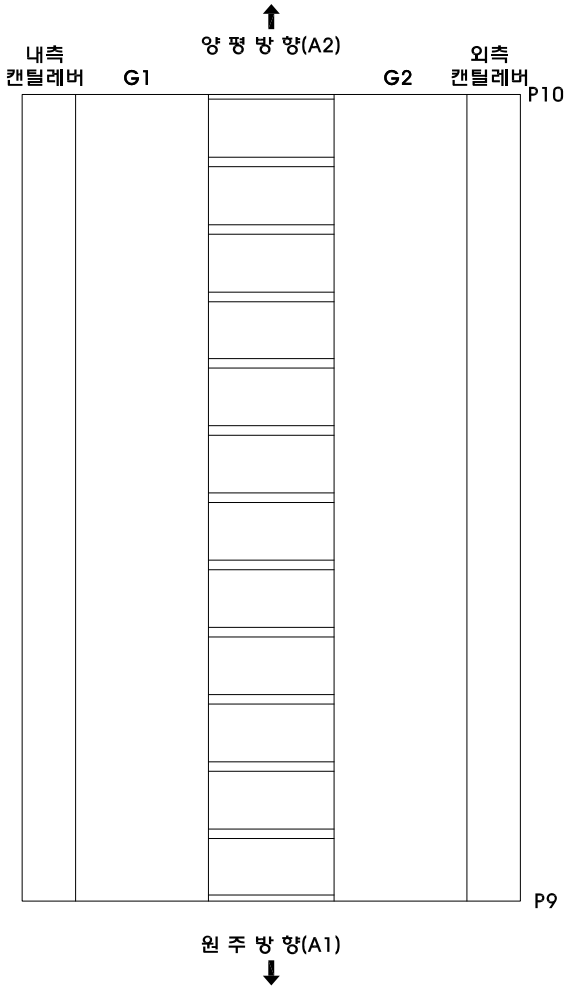

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S10)	외관조사망도	NONE	42

KEY PLAN



횡단면도



범 례



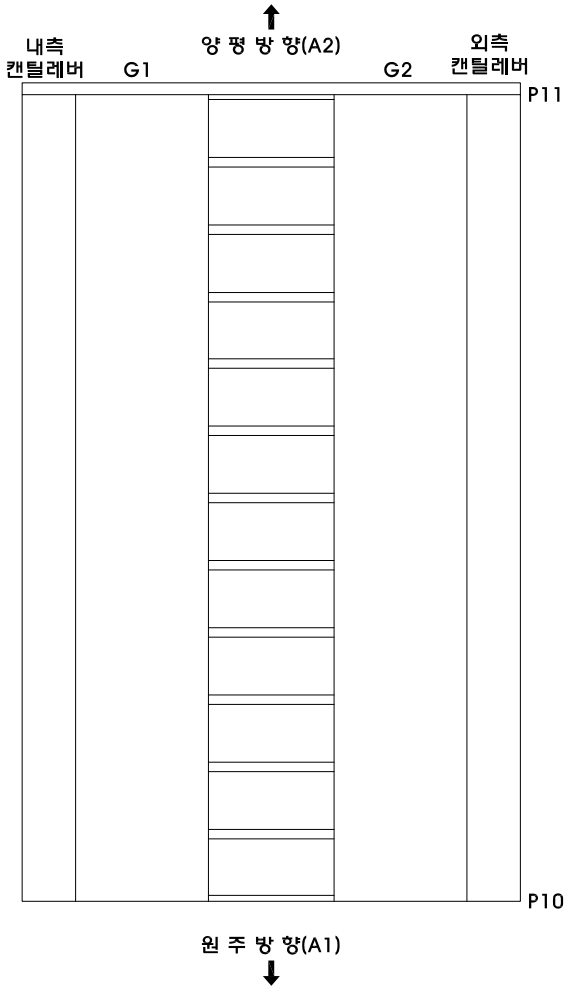

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S11)	외관조사망도	NONE	43

KEY PLAN



횡단면도



범 례



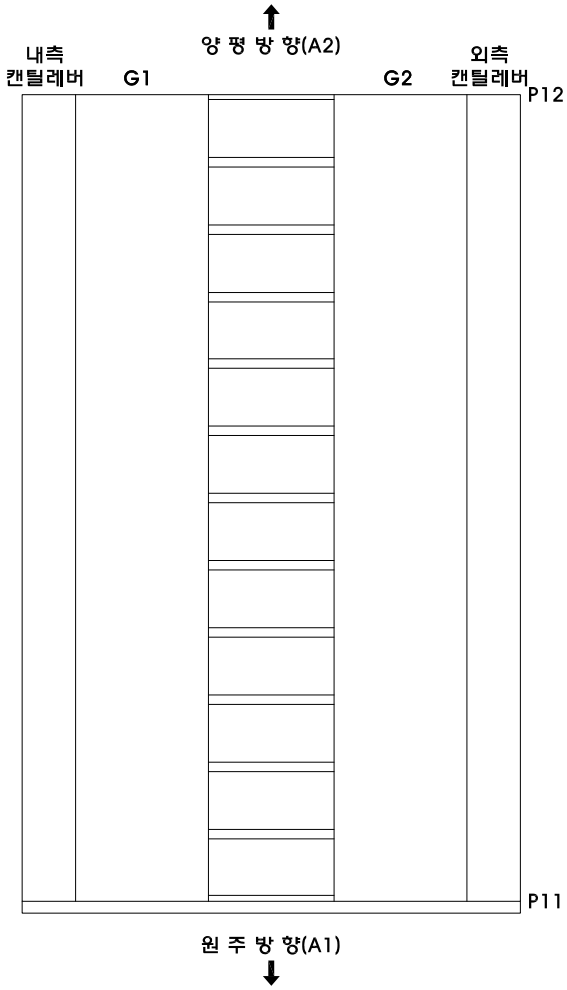

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S12)	외관조사망도	NONE	44

KEY PLAN



횡단면도



범 례



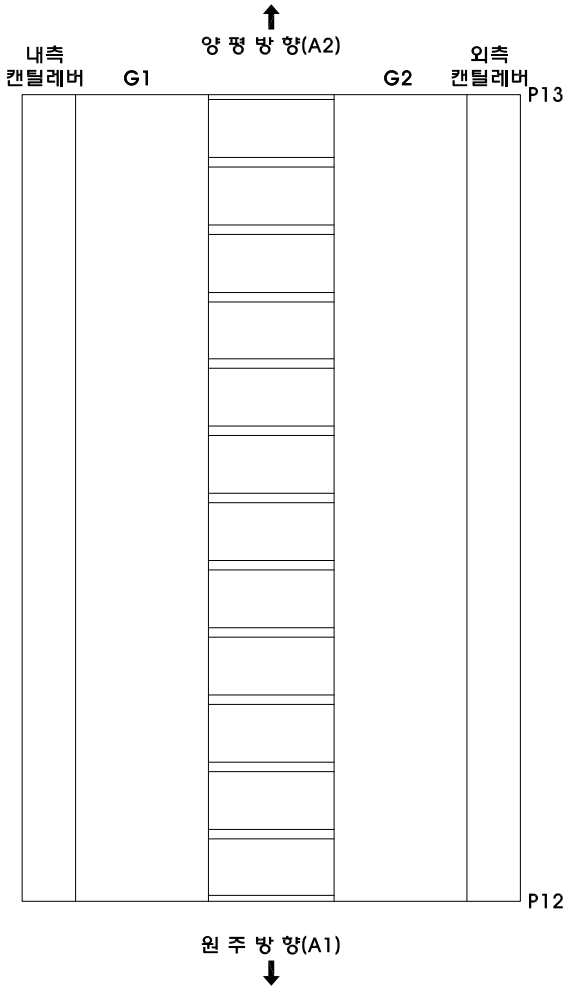

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S13)	외관조사망도	NONE	45

KEY PLAN



횡단면도



범 례



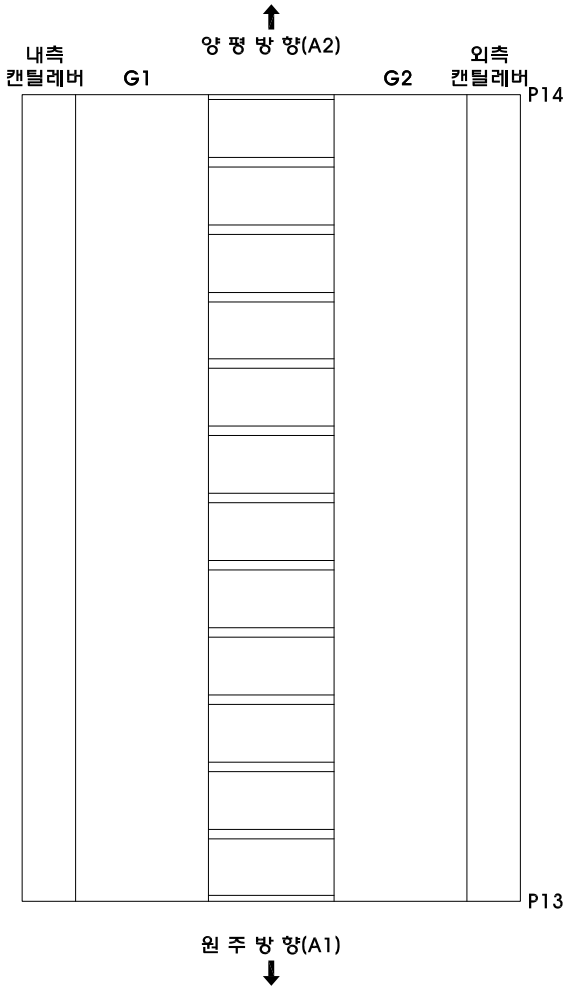

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S14)	외관조사망도	NONE	46

KEY PLAN



횡단면도



범 례



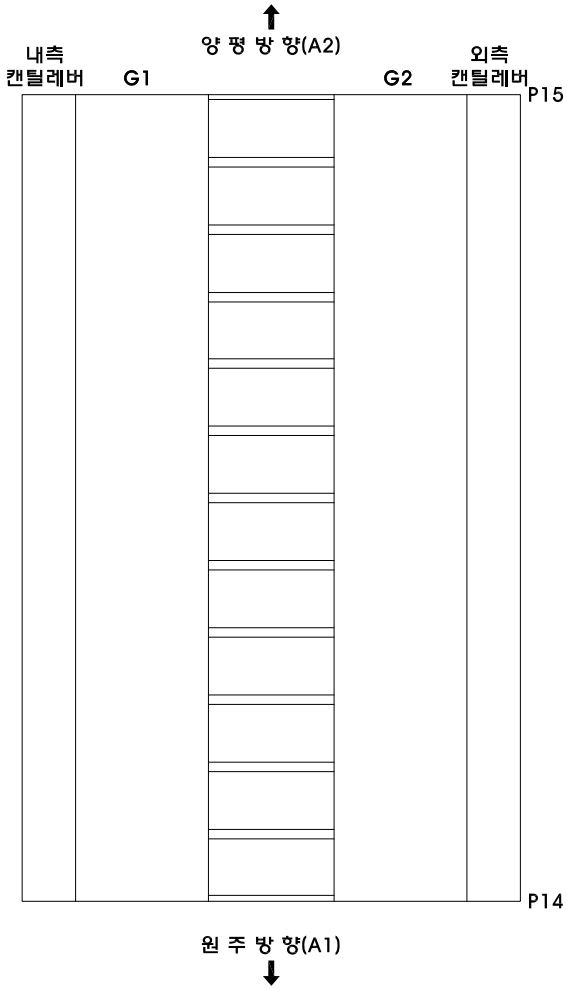

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S15)	외관조사망도	NONE	47

KEY PLAN



횡단면도



범 례



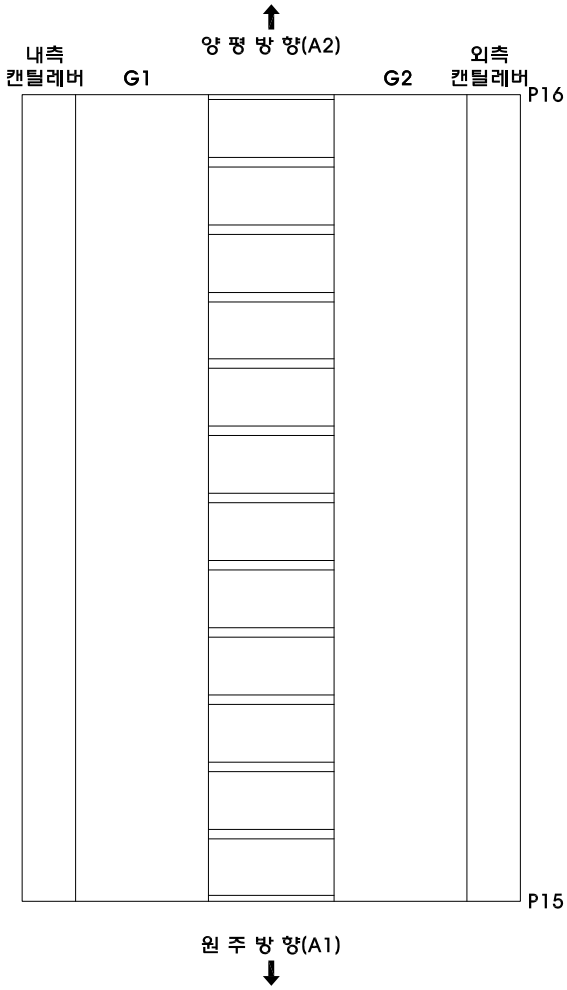

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S16)	외관조사망도	NONE	48

KEY PLAN



횡단면도



범 례



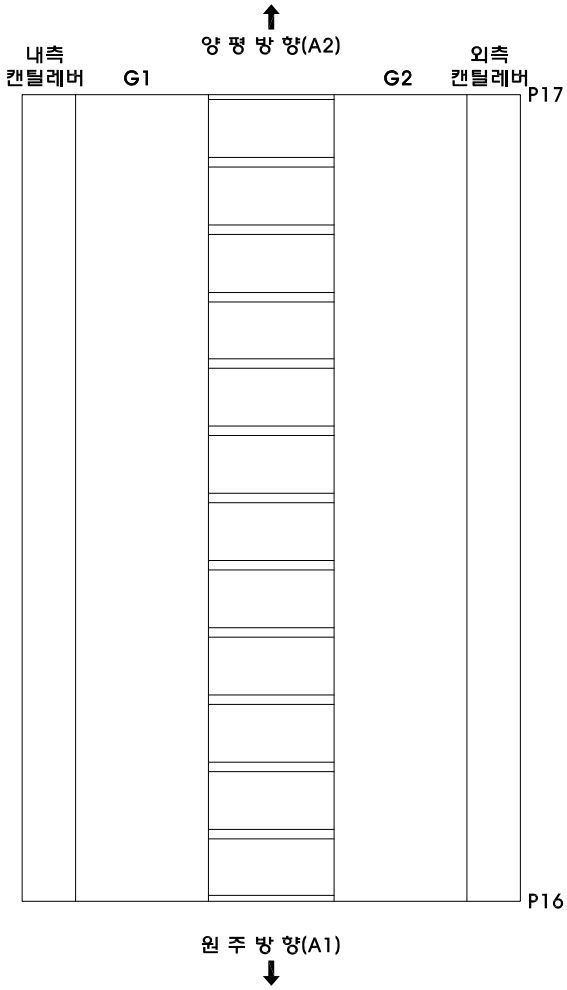

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S17)	외관조사망도	NONE	49

KEY PLAN



횡단면도



범 례



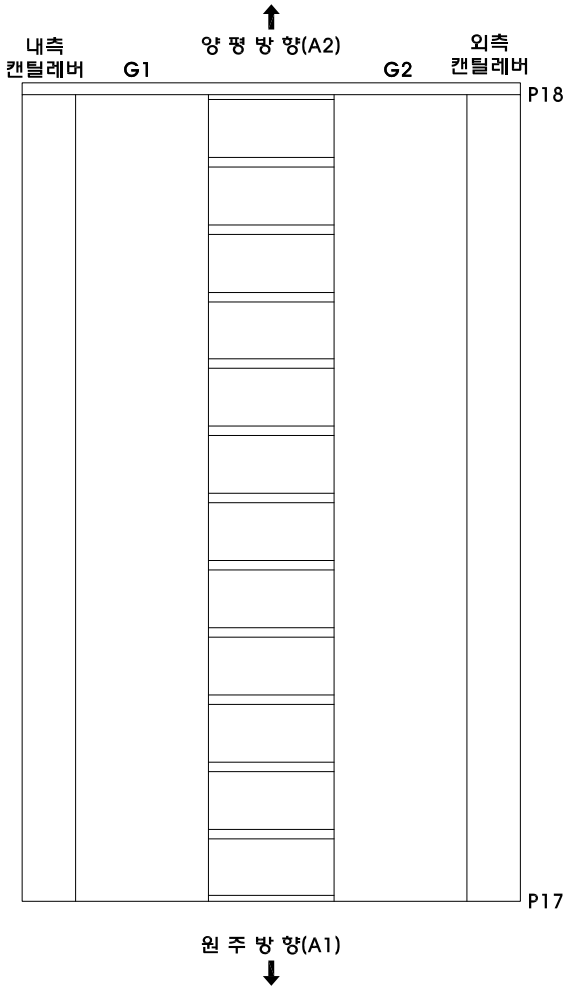

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S18)	외관조사망도	NONE	50

KEY PLAN



횡단면도



범 례



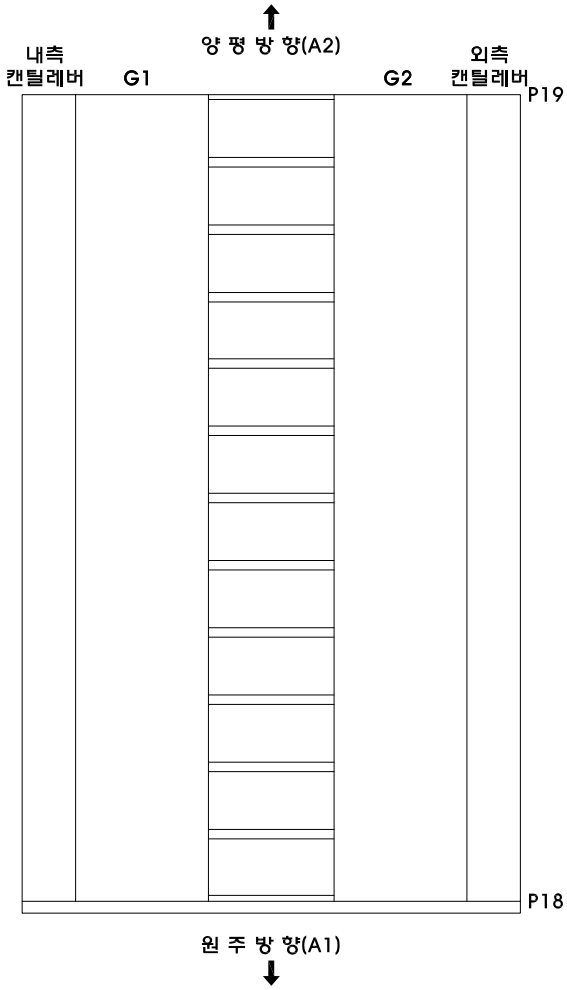

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S19)	외관조사망도	NONE	51

KEY PLAN



횡단면도



범 례



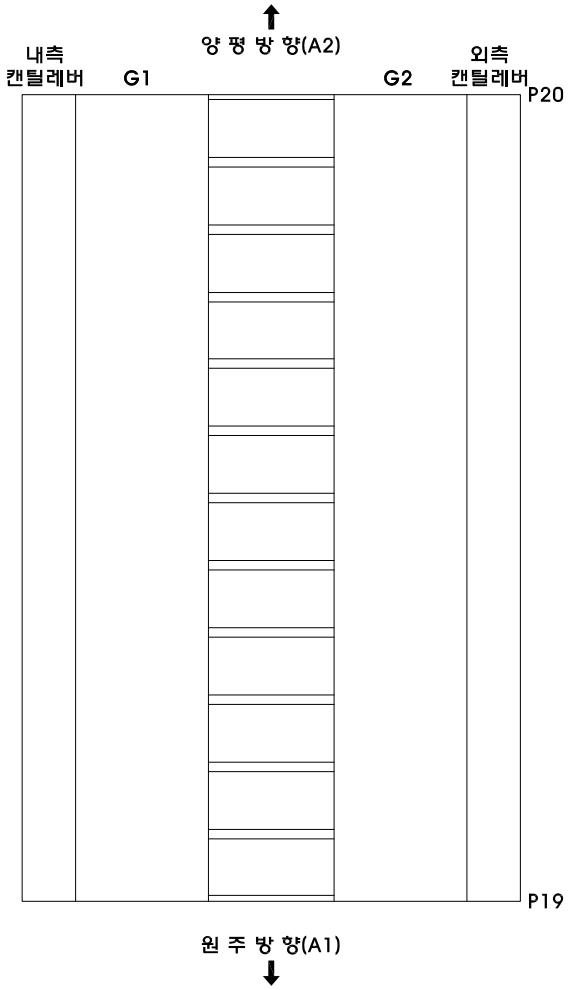

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S20)	외관조사망도	NONE	52

KEY PLAN



횡단면도



범 례



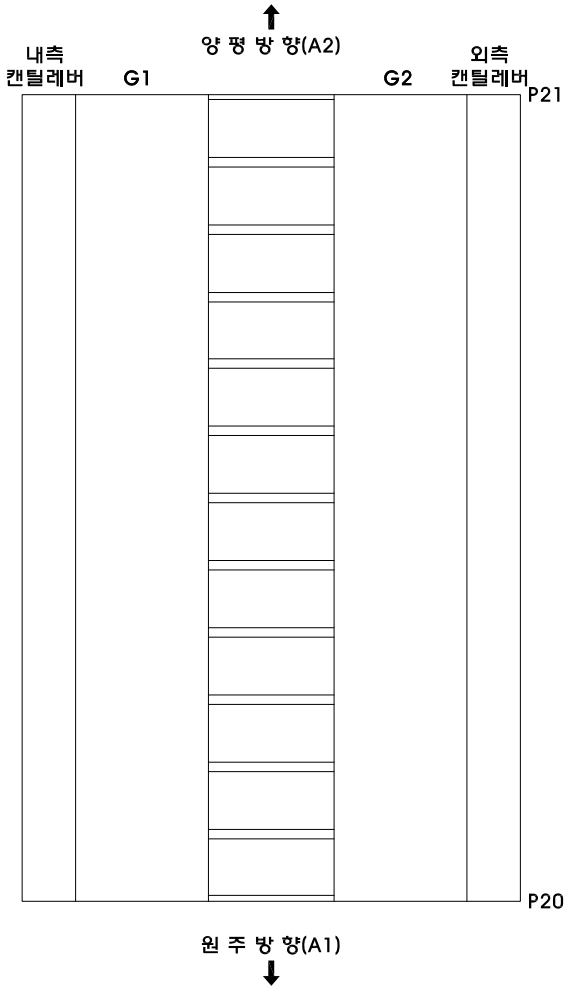

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S21)	외관조사망도	NONE	53

KEY PLAN



횡단면도



범 례



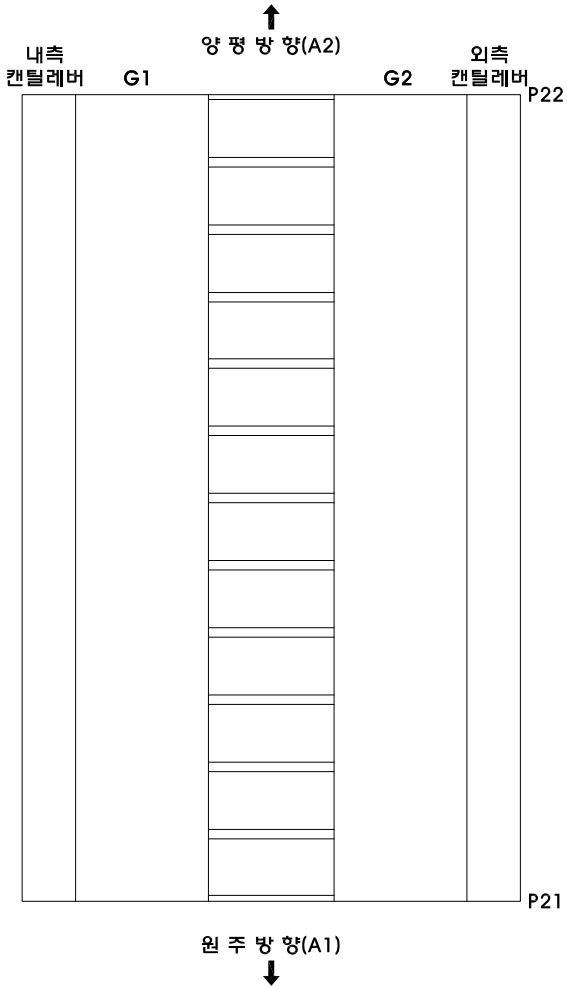

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S22)	외관조사망도	NONE	54

KEY PLAN



횡단면도



범 례



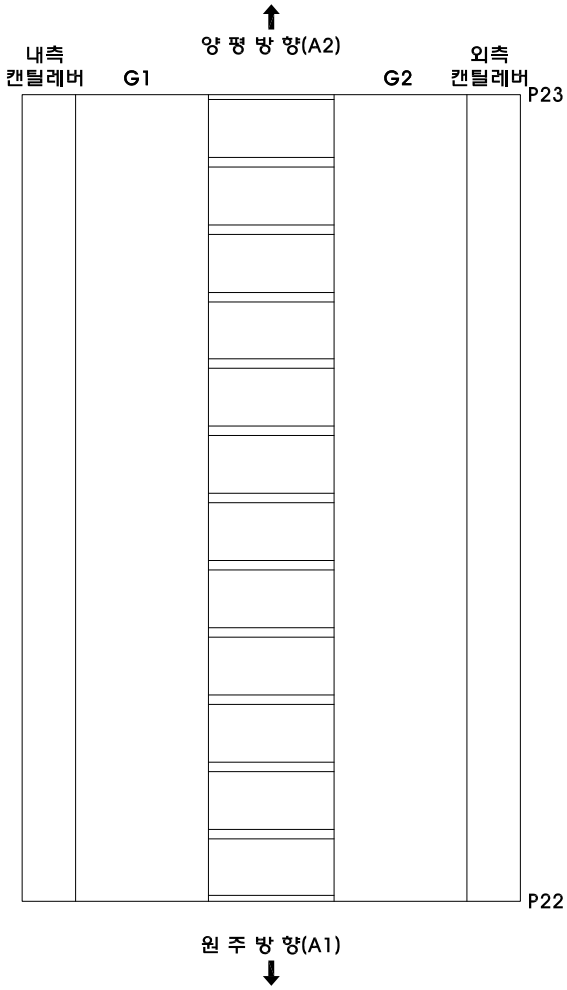

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S23)	외관조사망도	NONE	55

KEY PLAN



횡단면도



범 례



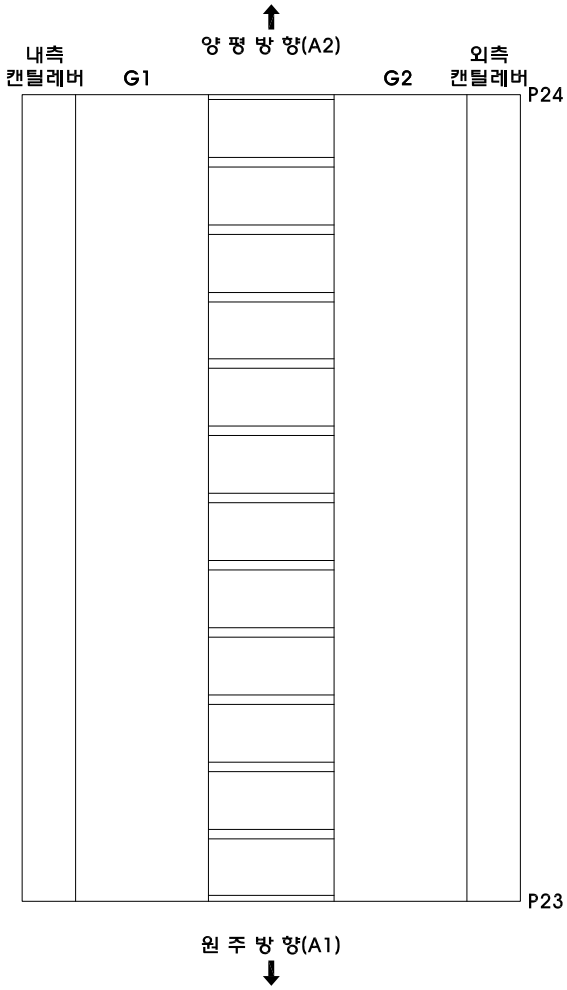

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S24)	외관조사망도	NONE	56

KEY PLAN



횡단면도



범 례



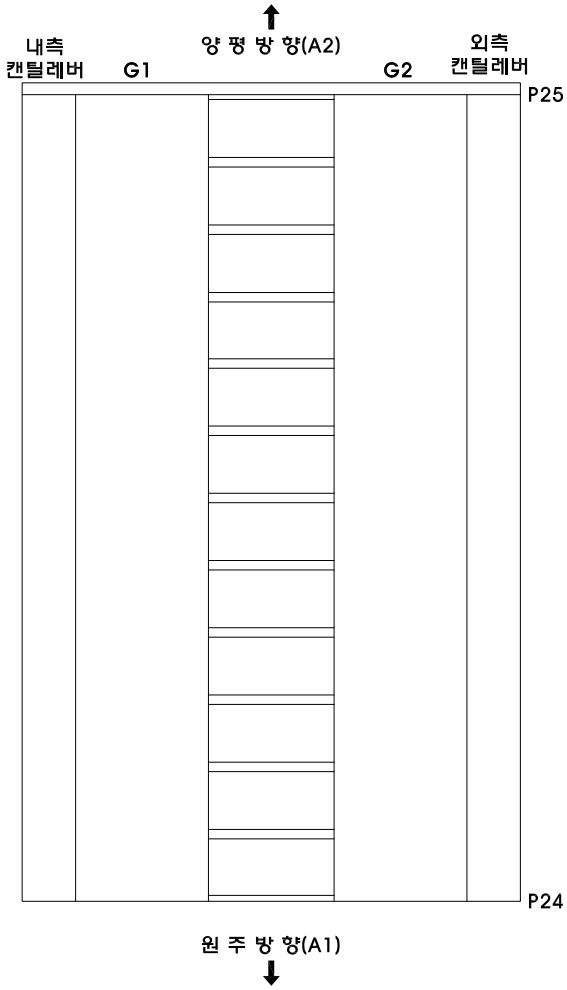

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S25)	외관조사망도	NONE	57

KEY PLAN



횡단면도



범 례



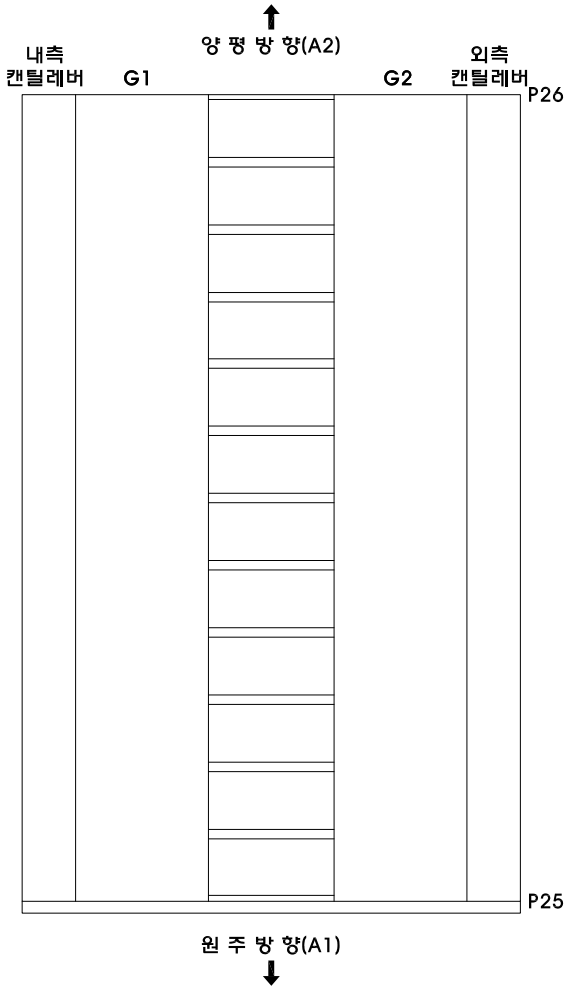

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S26)	외관조사망도	NONE	58

KEY PLAN



횡단면도



범 례



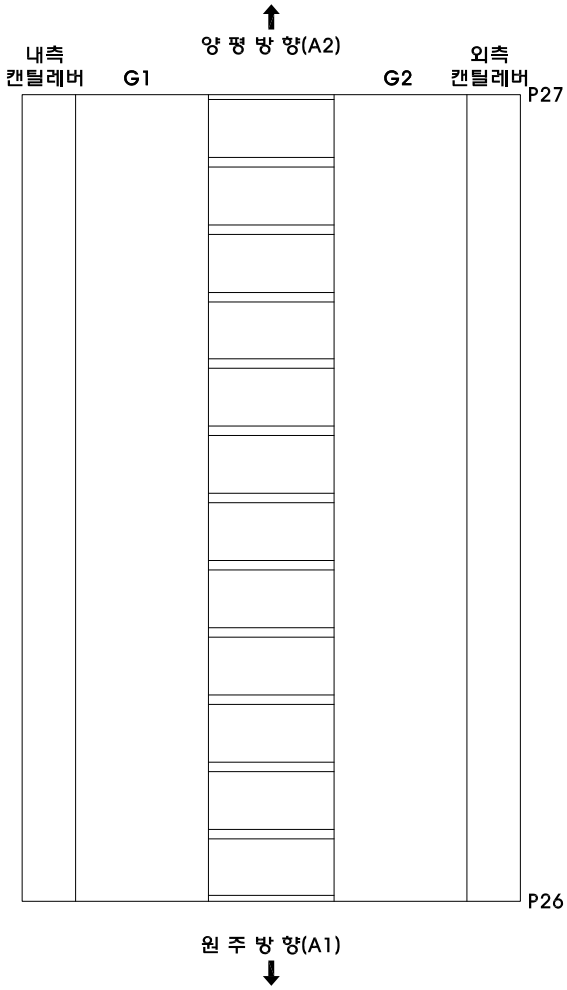

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S27)	외관조사망도	NONE	59

KEY PLAN



횡단면도



범 례



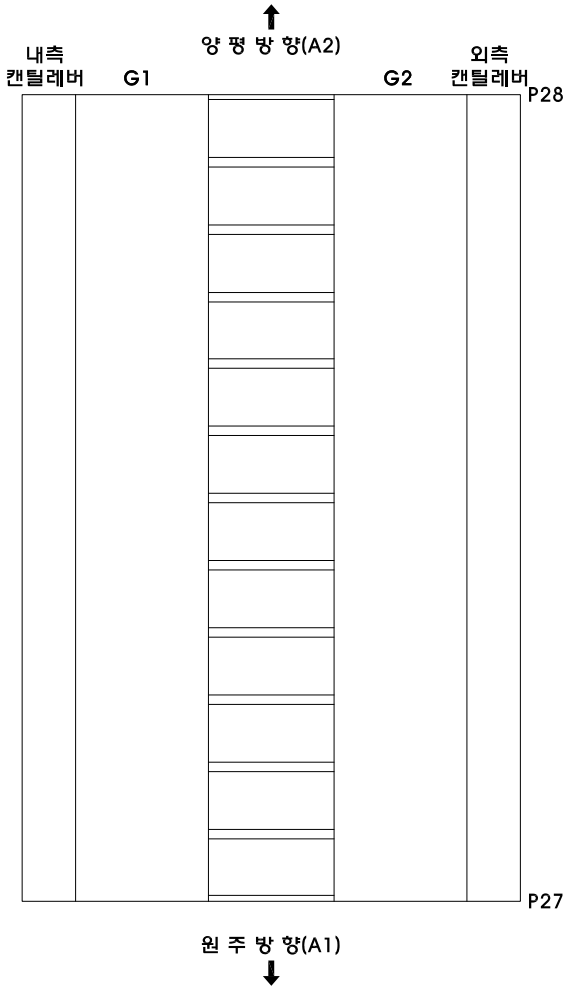

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S28)	외관조사망도	NONE	60

KEY PLAN



횡단면도



범 례



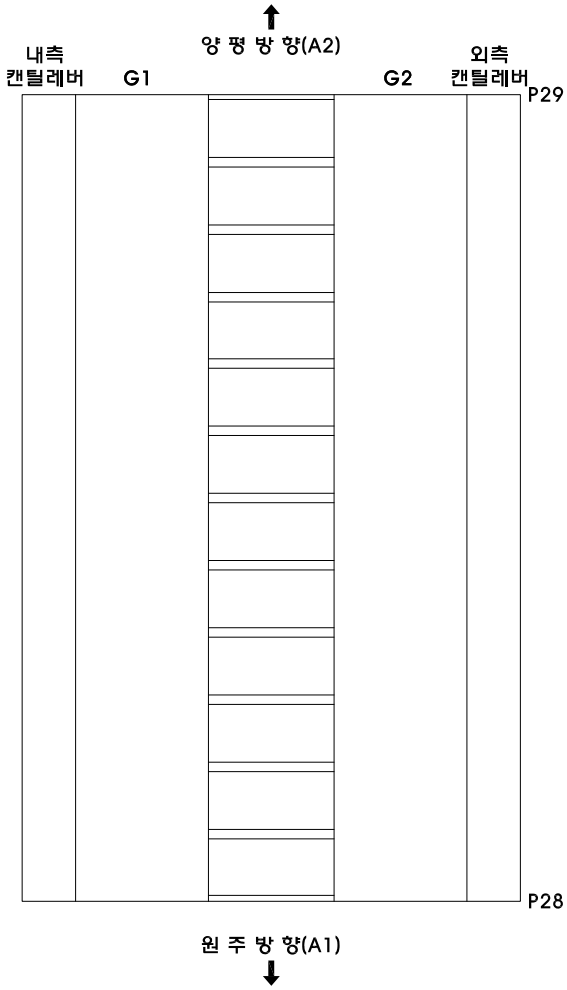

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S29)	외관조사망도	NONE	61

KEY PLAN



횡단면도



범 례



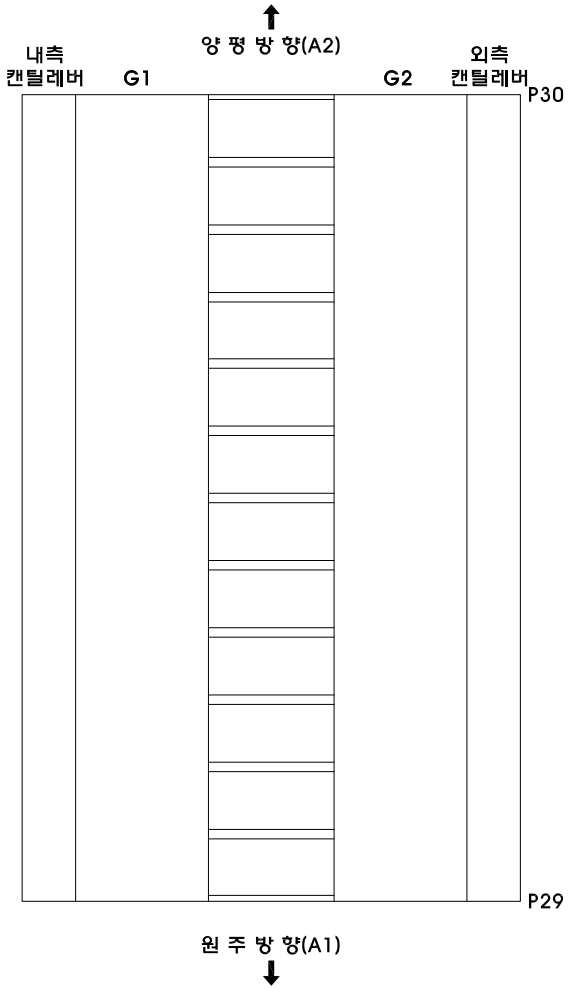

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S30)	외관조사망도	NONE	62

KEY PLAN



횡단면도



범 례



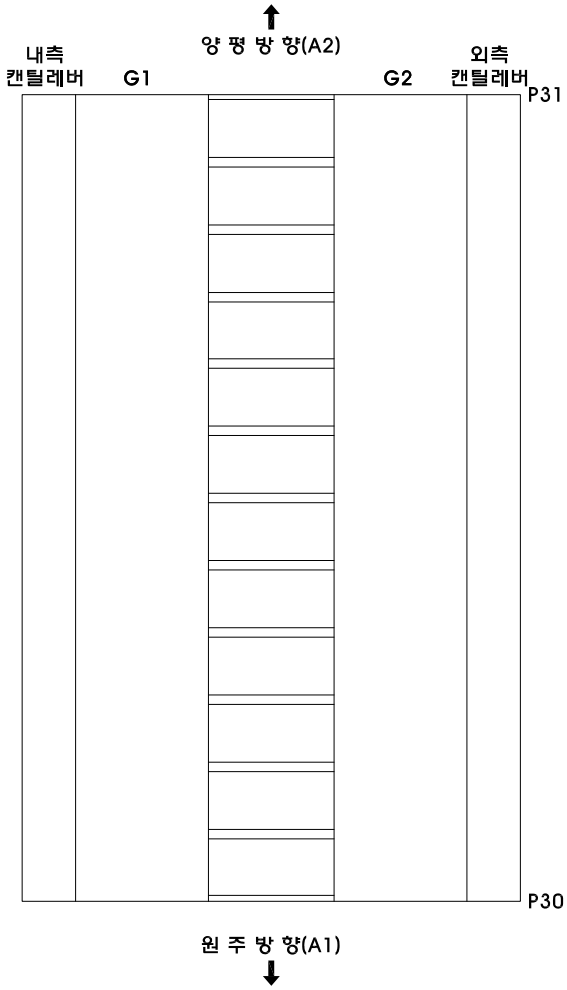

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S31)	외관조사망도	NONE	63

KEY PLAN



횡단면도



범 례



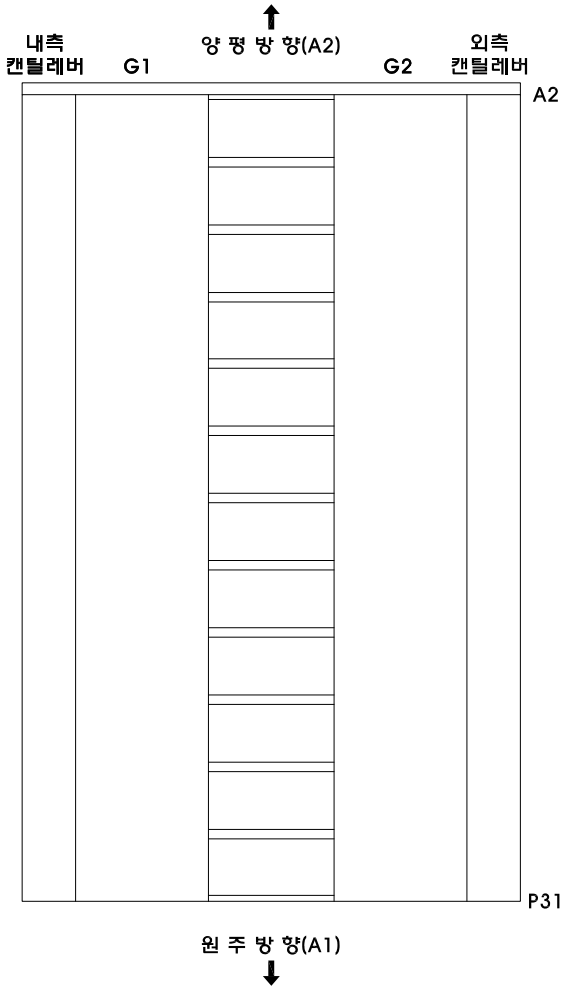

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 바닥판하면 (S32)	외관조사망도	NONE	64

KEY PLAN



횡단면도



범 례



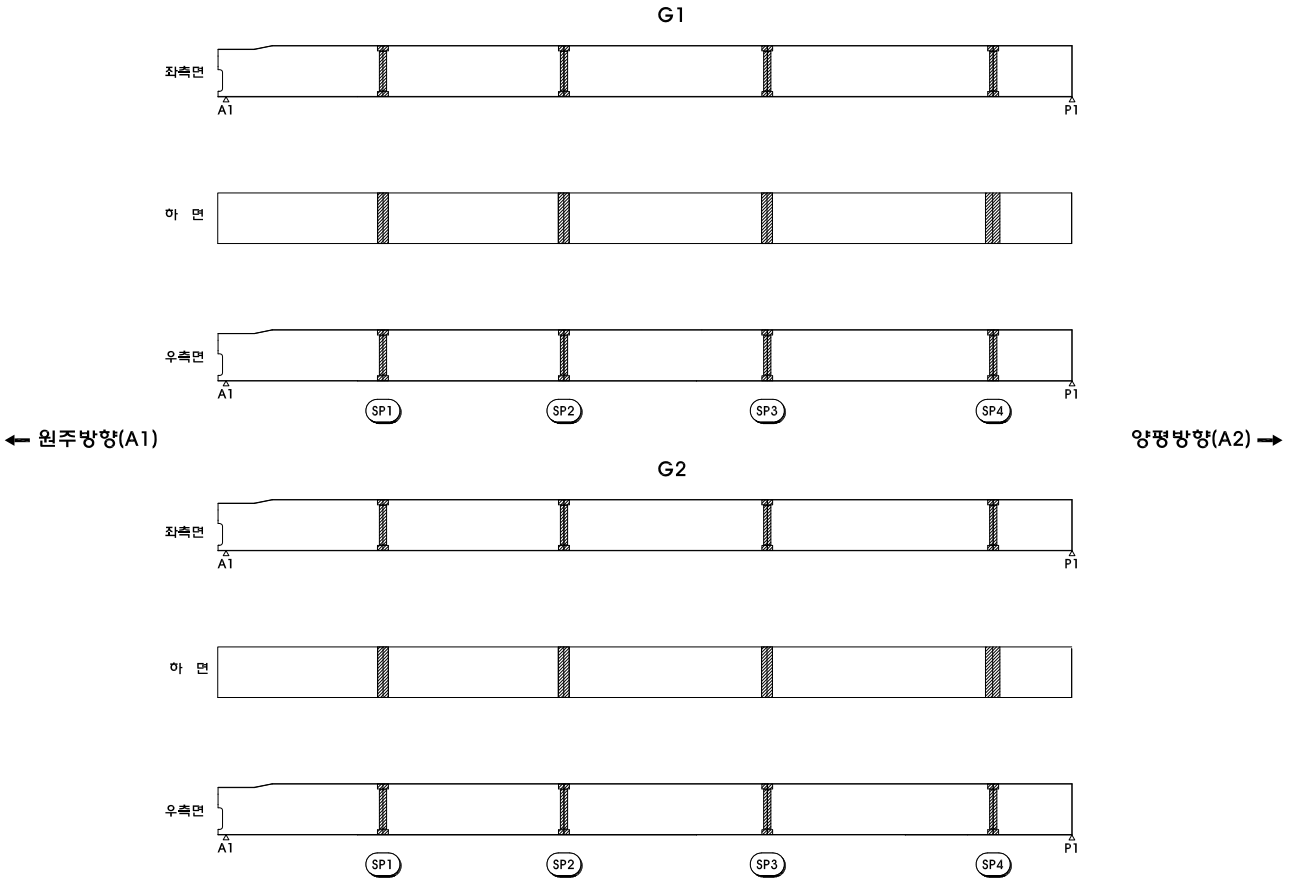

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S1)	외관조사망도	NONE	65

KEY PLAN



횡단면도



범 례



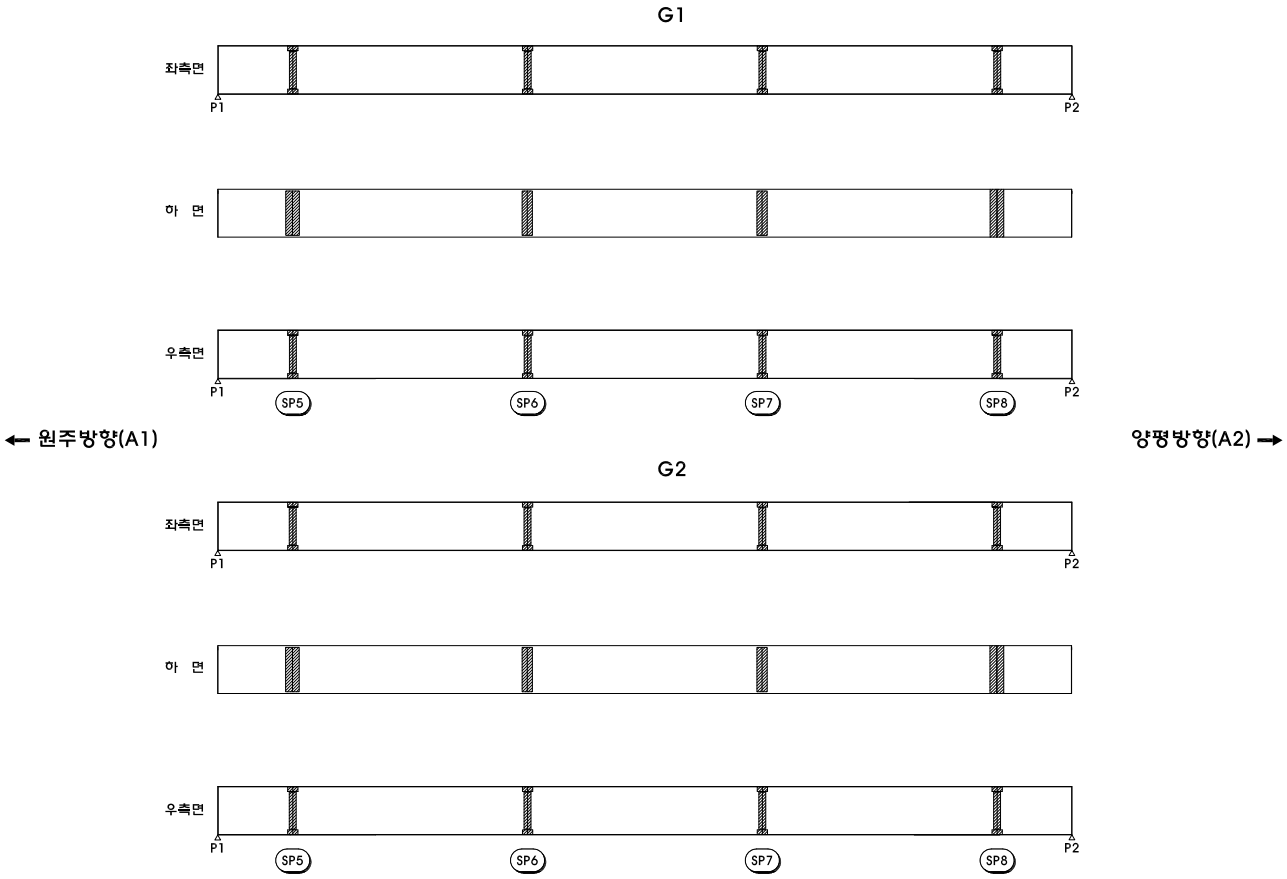

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S2)	외관조사망도	NONE	66

KEY PLAN



횡단면도



범 례



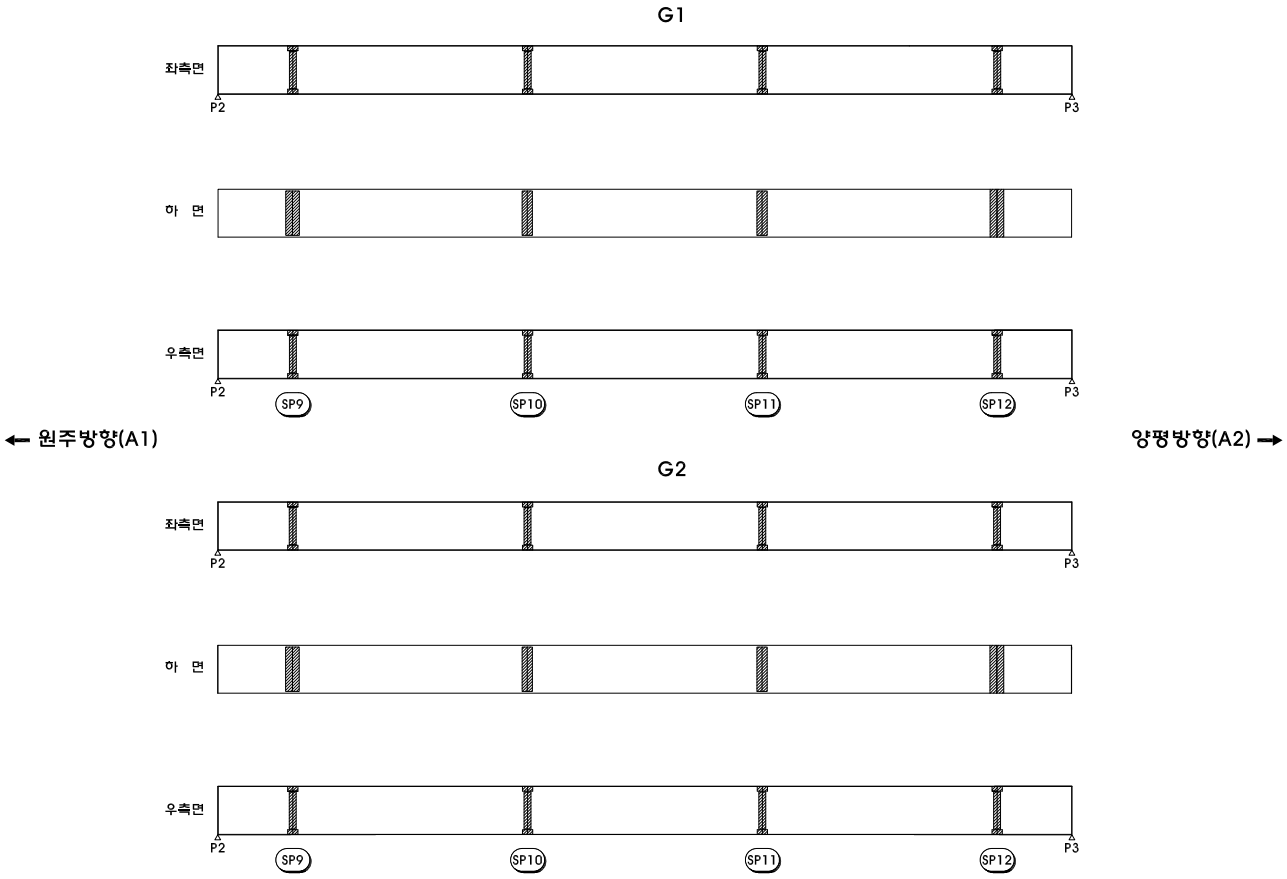

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S3)	외관조사망도	NONE	65

KEY PLAN



횡단면도



범 례



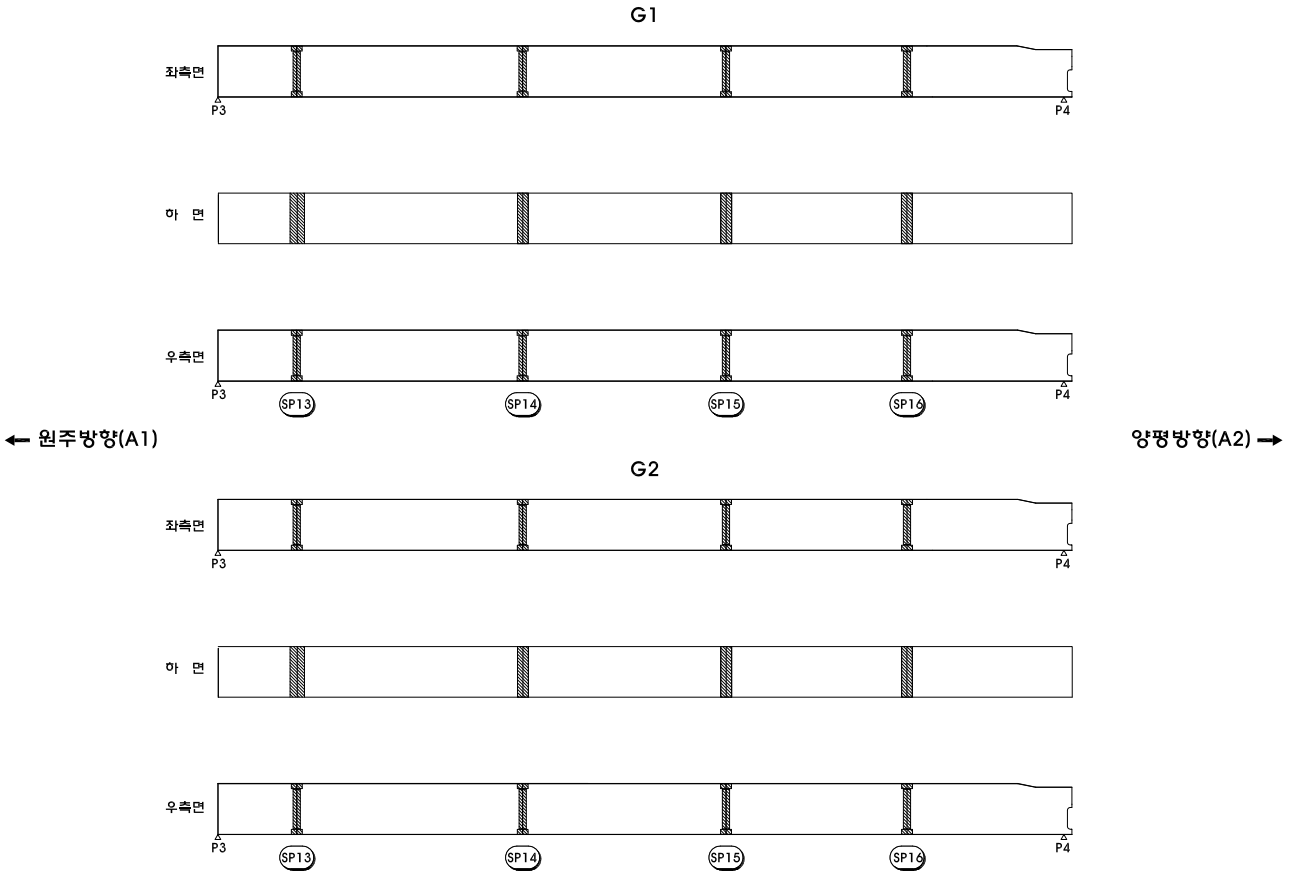

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S4)	외관조사망도	NONE	68

KEY PLAN



횡단면도



범 례



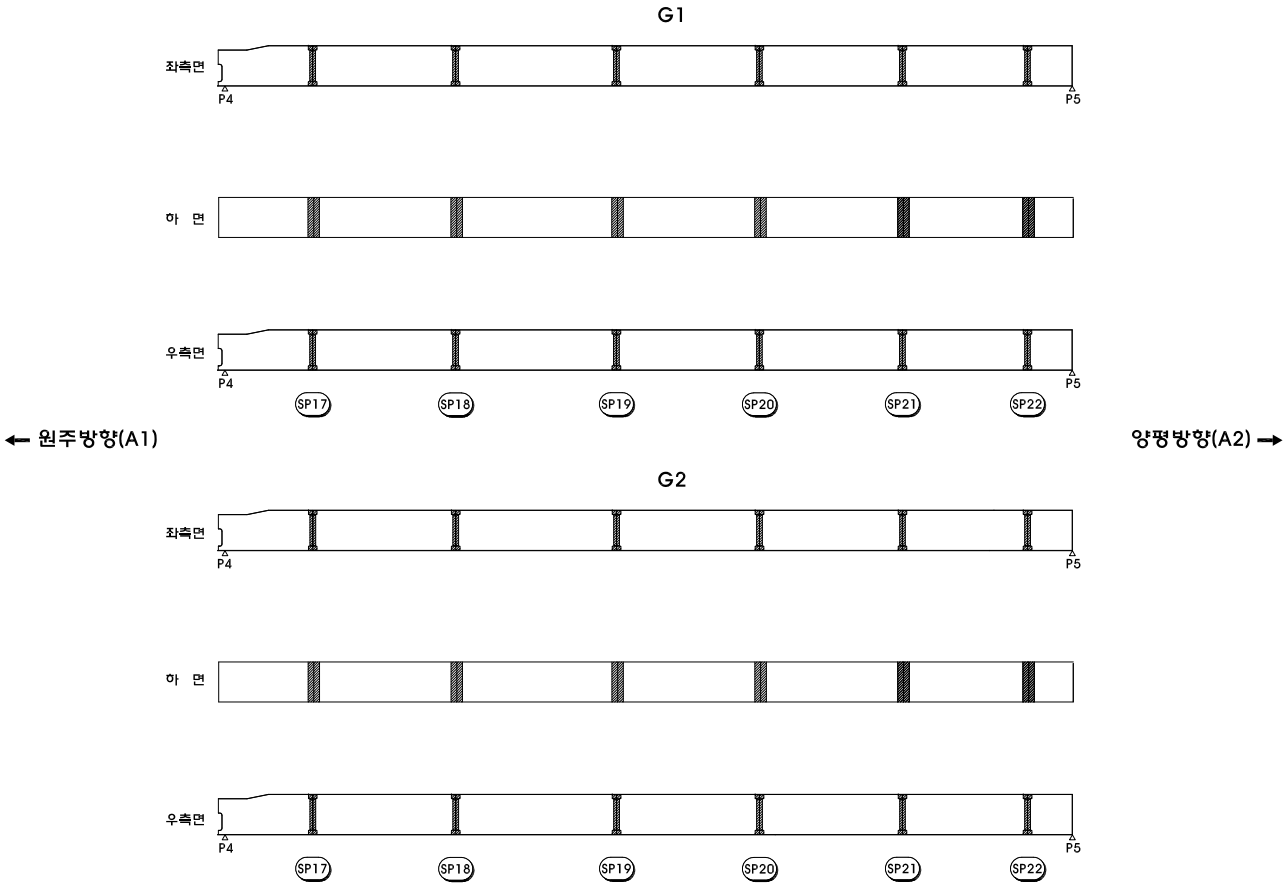

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S5)	외관조사망도	NONE	69

KEY PLAN



횡단면도



범 례



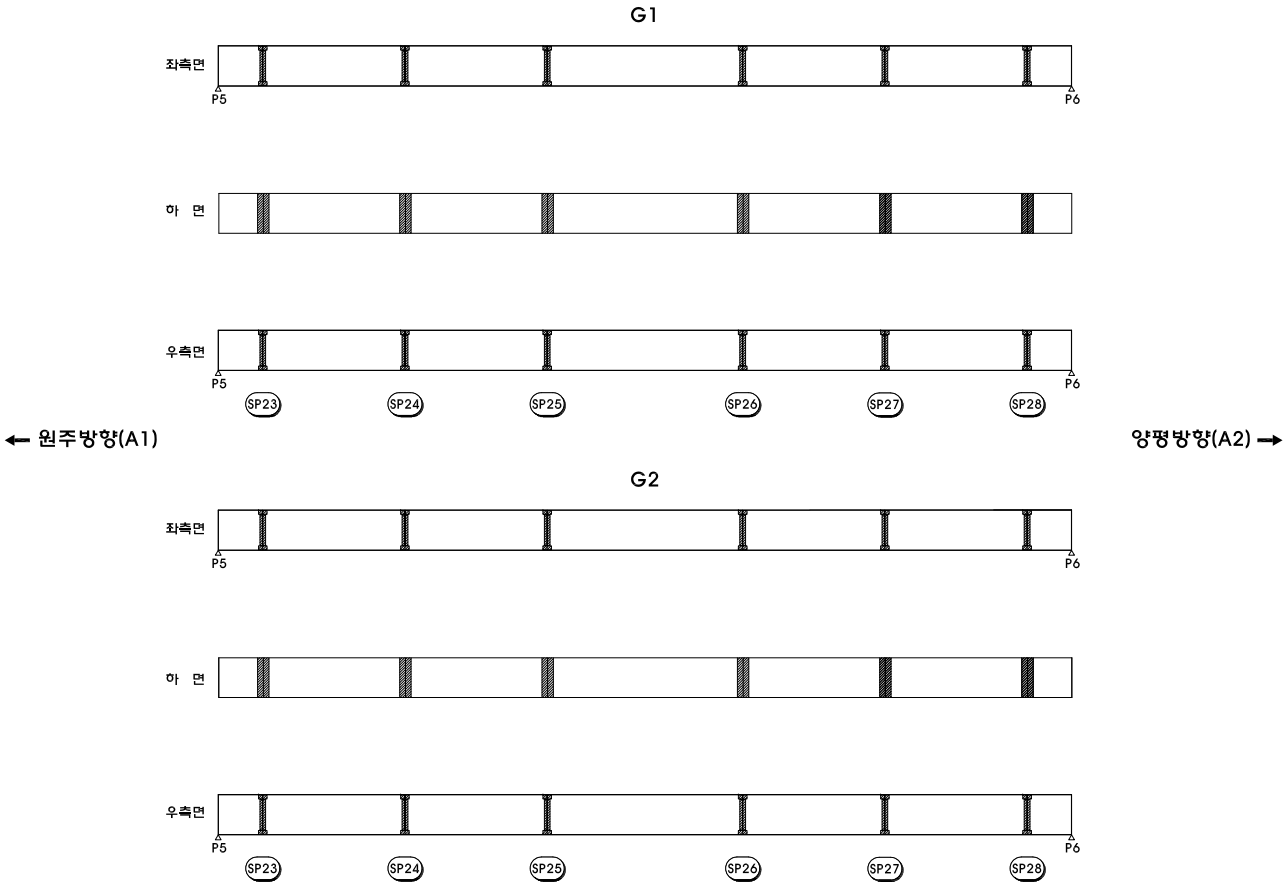

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S6)	외관조사망도	NONE	70

KEY PLAN



횡단면도



범 례



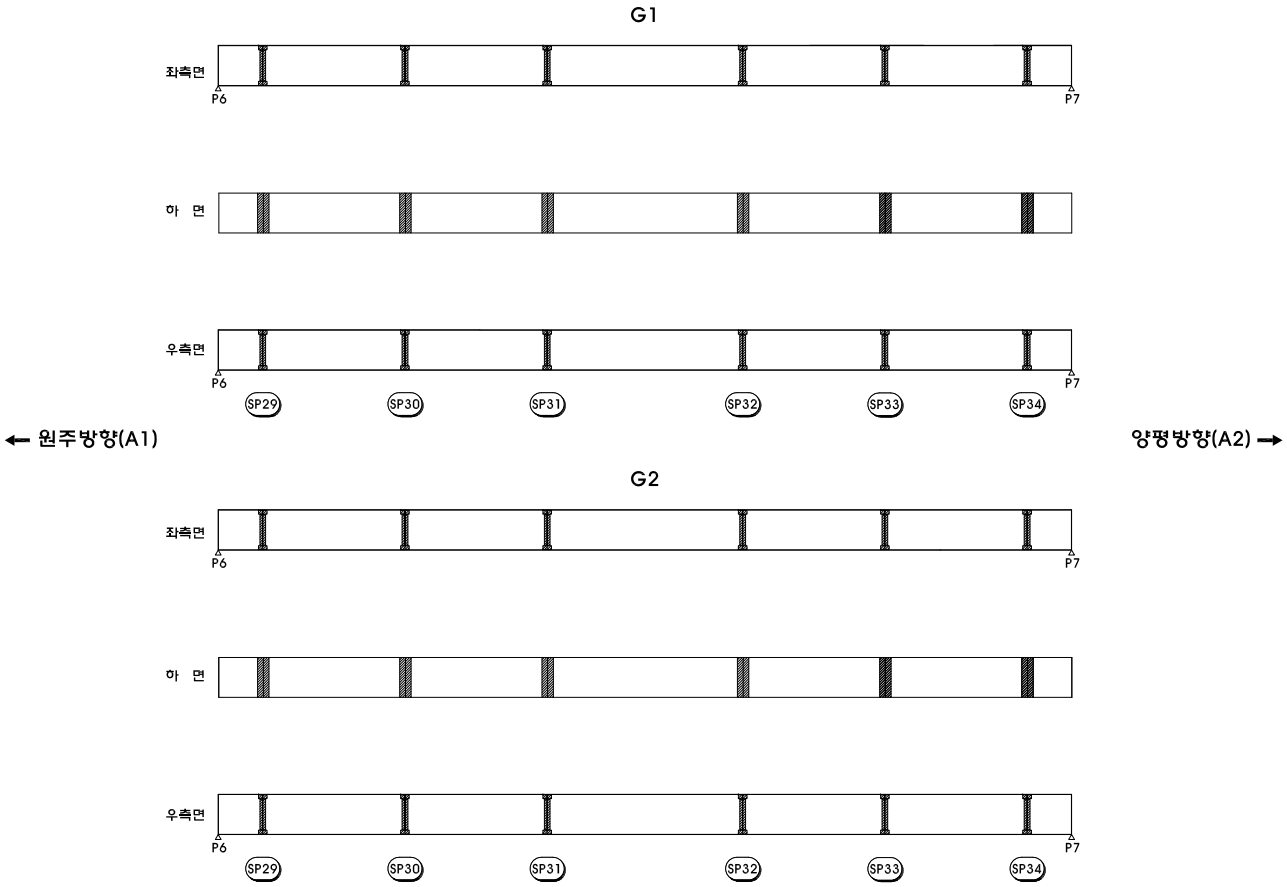

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S7)	외관조사망도	NONE	71

KEY PLAN



횡단면도



범 례



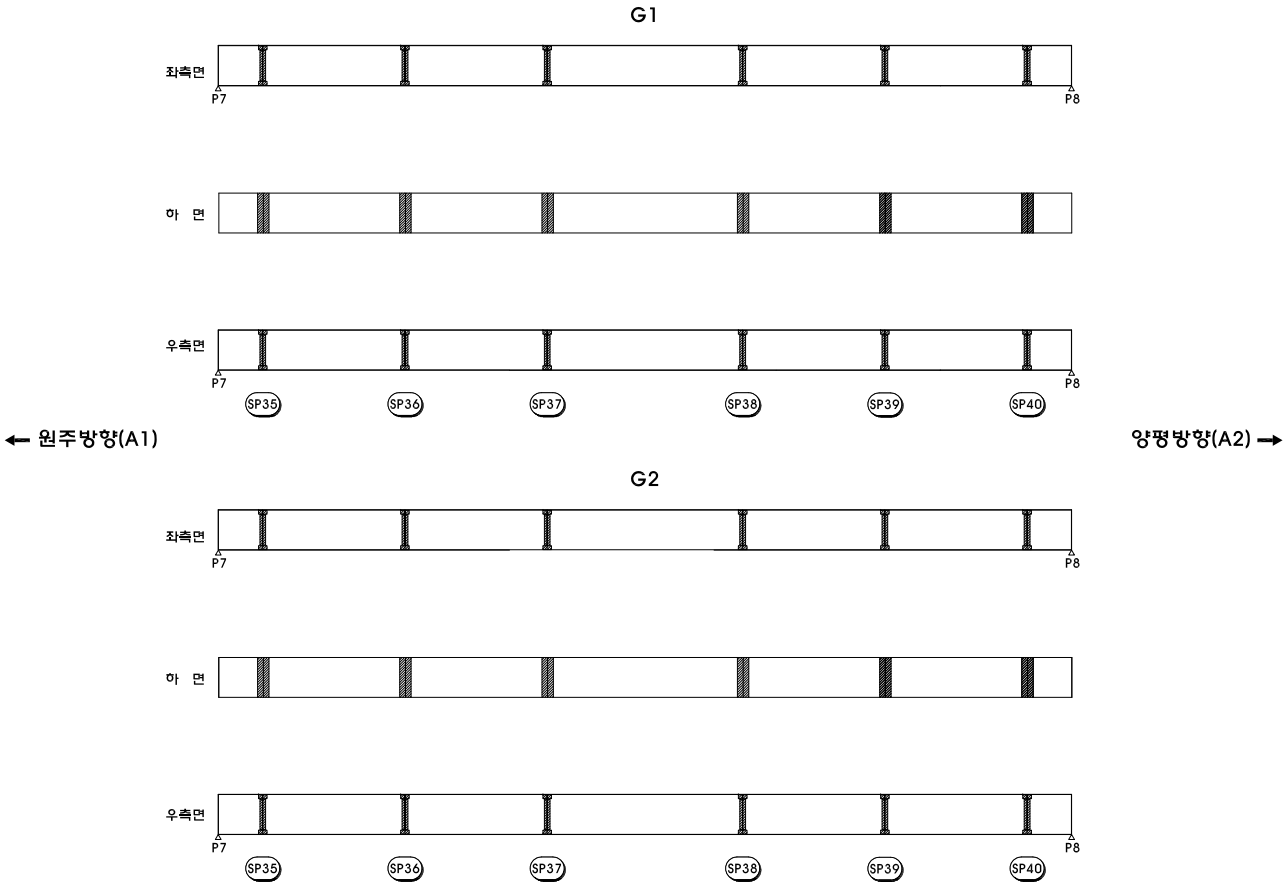

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S8)	외관조사망도	NONE	72

KEY PLAN



횡단면도



범 례



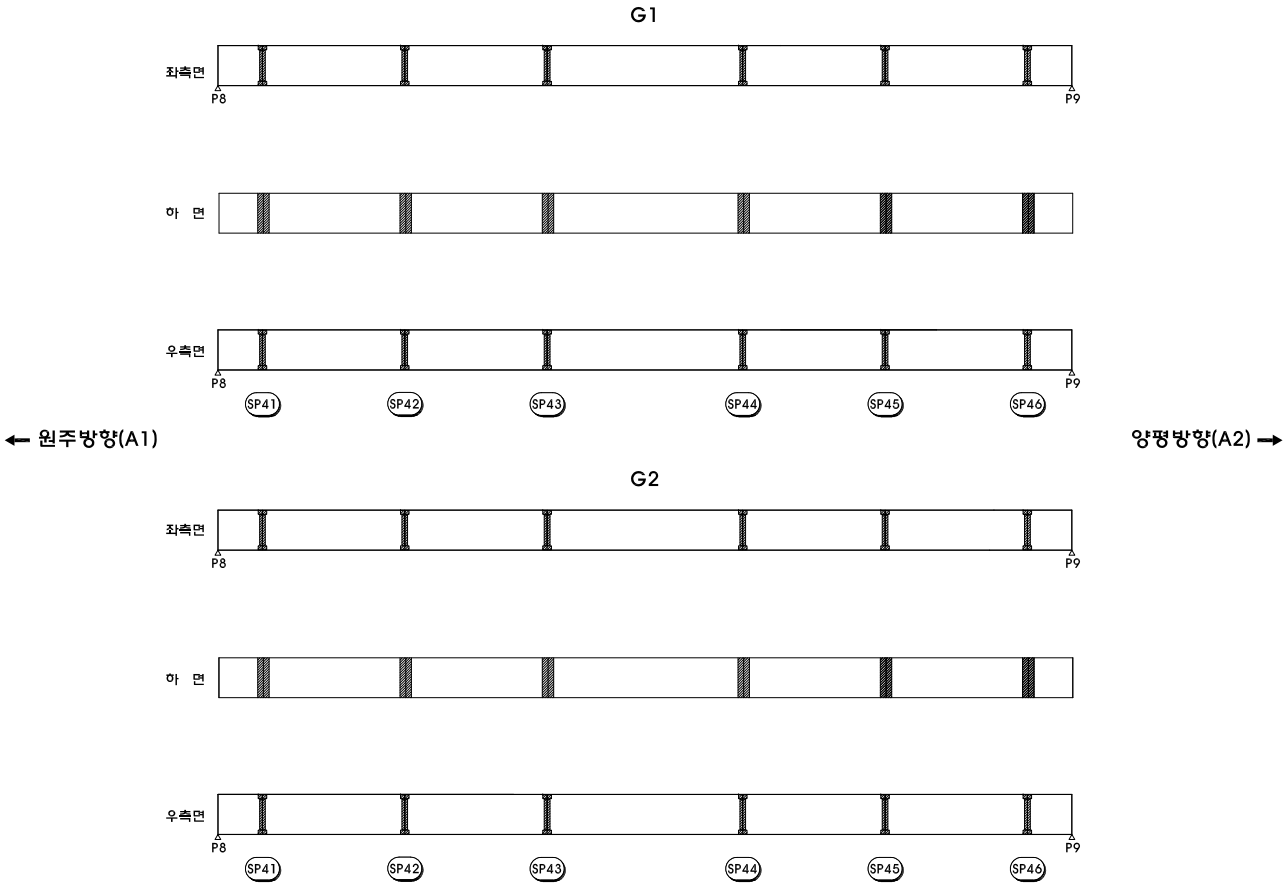

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S9)	외관조사망도	NONE	73

KEY PLAN



횡단면도



범 례



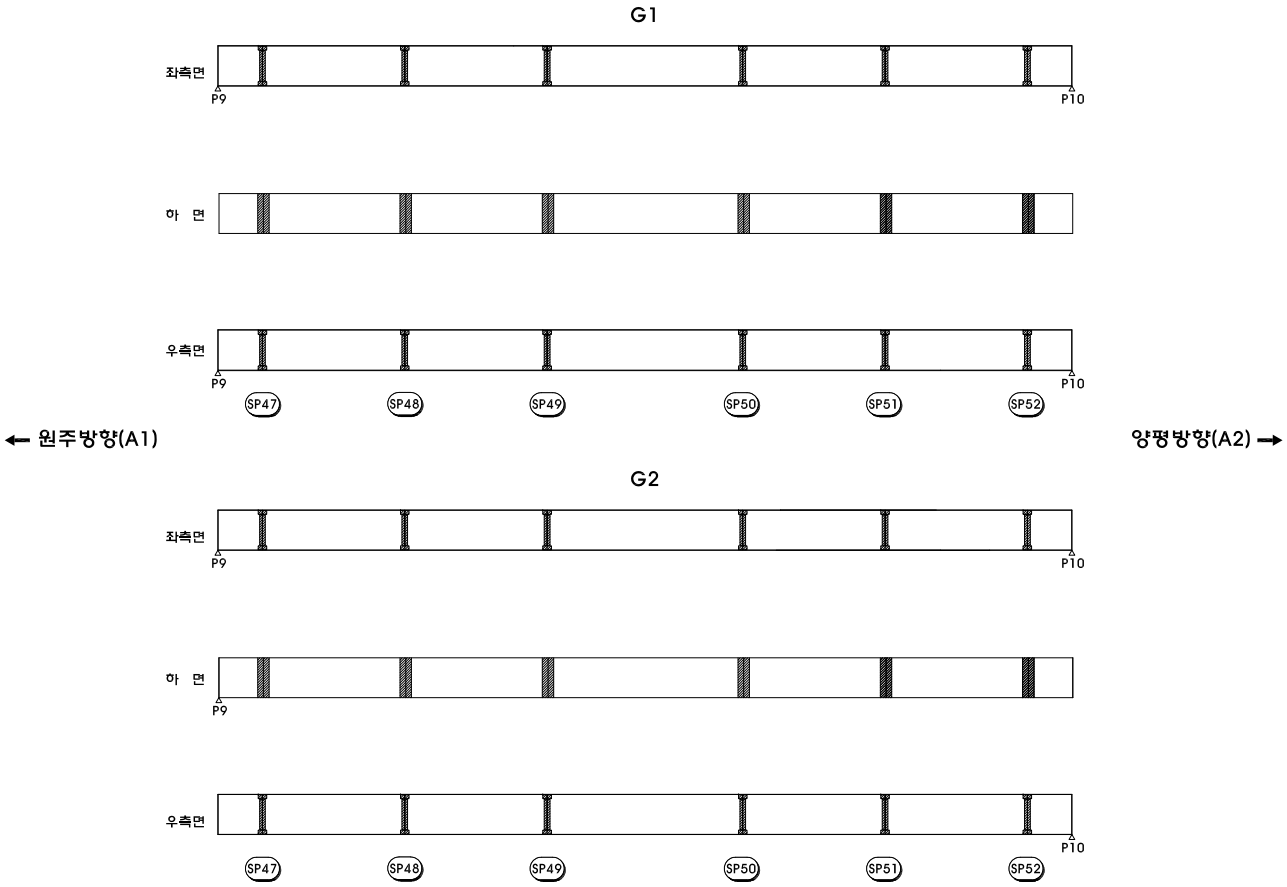

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S10)	외관조사망도	NONE	74







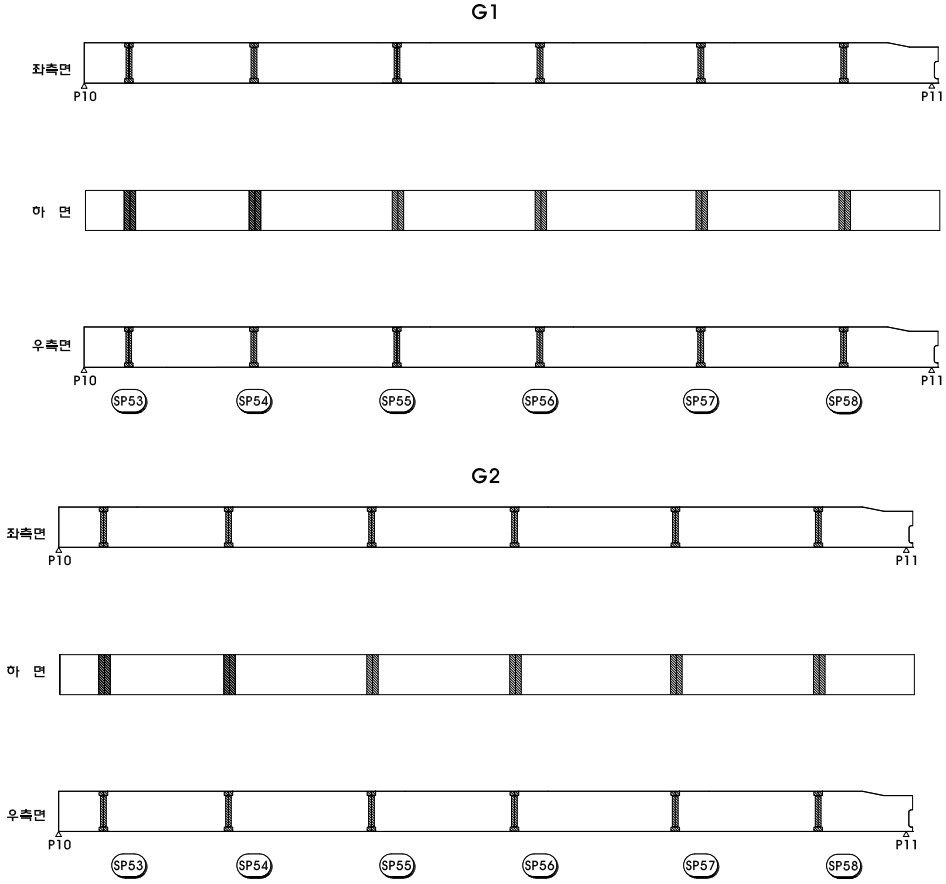

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S11)	외관조사망도	NONE	75

KEY PLAN



횡단면도



범 례



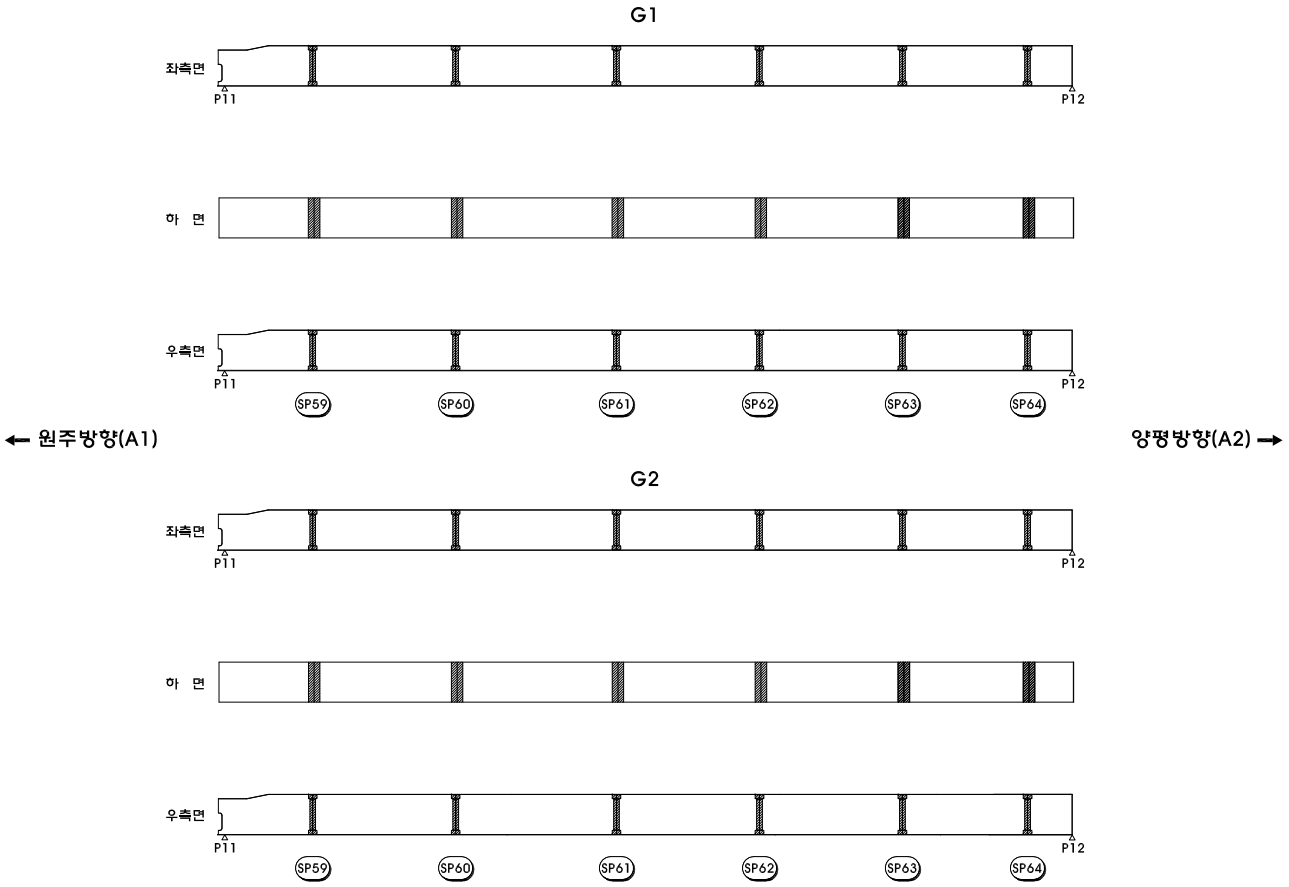

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S12)	외관조사망도		76

KEY PLAN



횡단면도



범 례



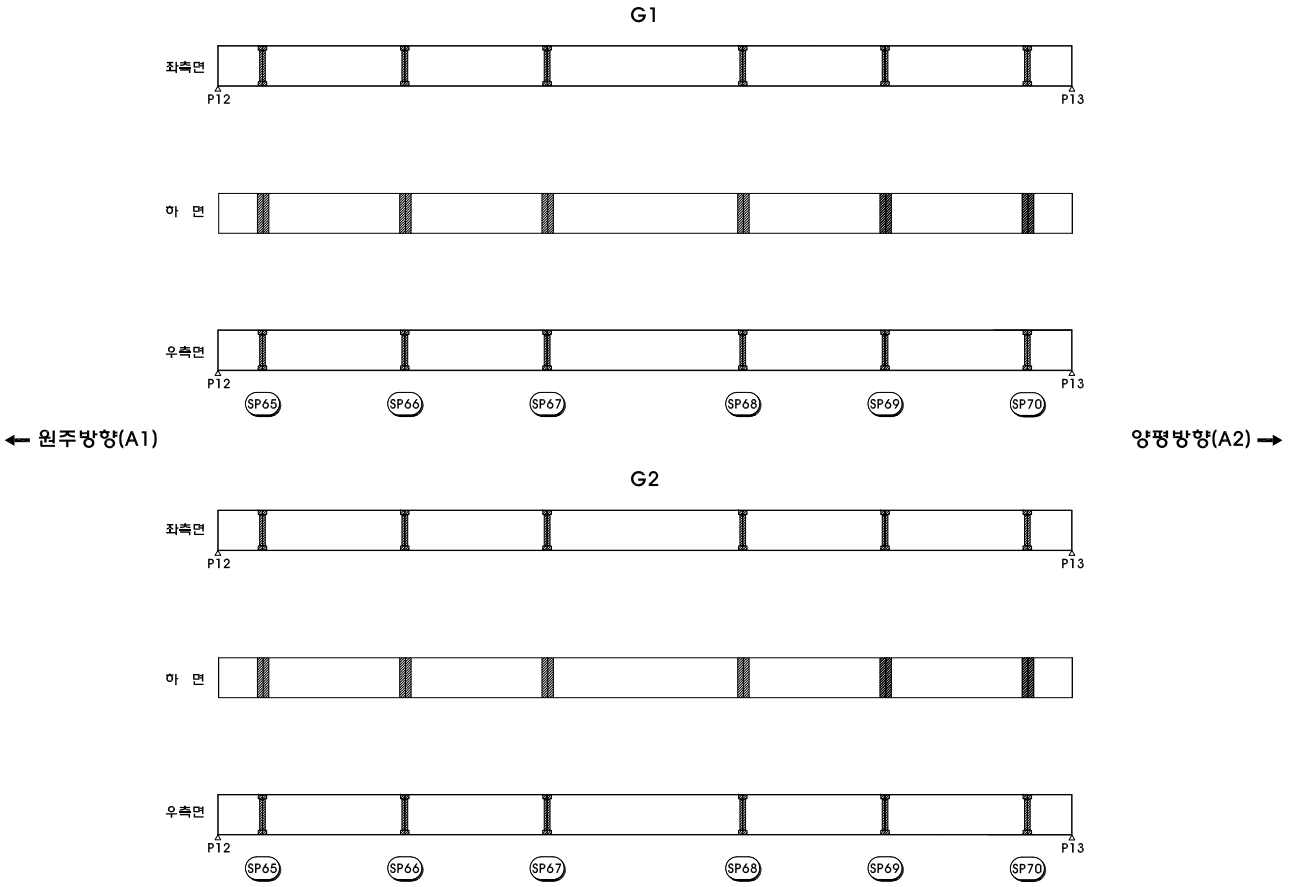

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S13)	외관조사망도		77

KEY PLAN



횡단면도



범 례



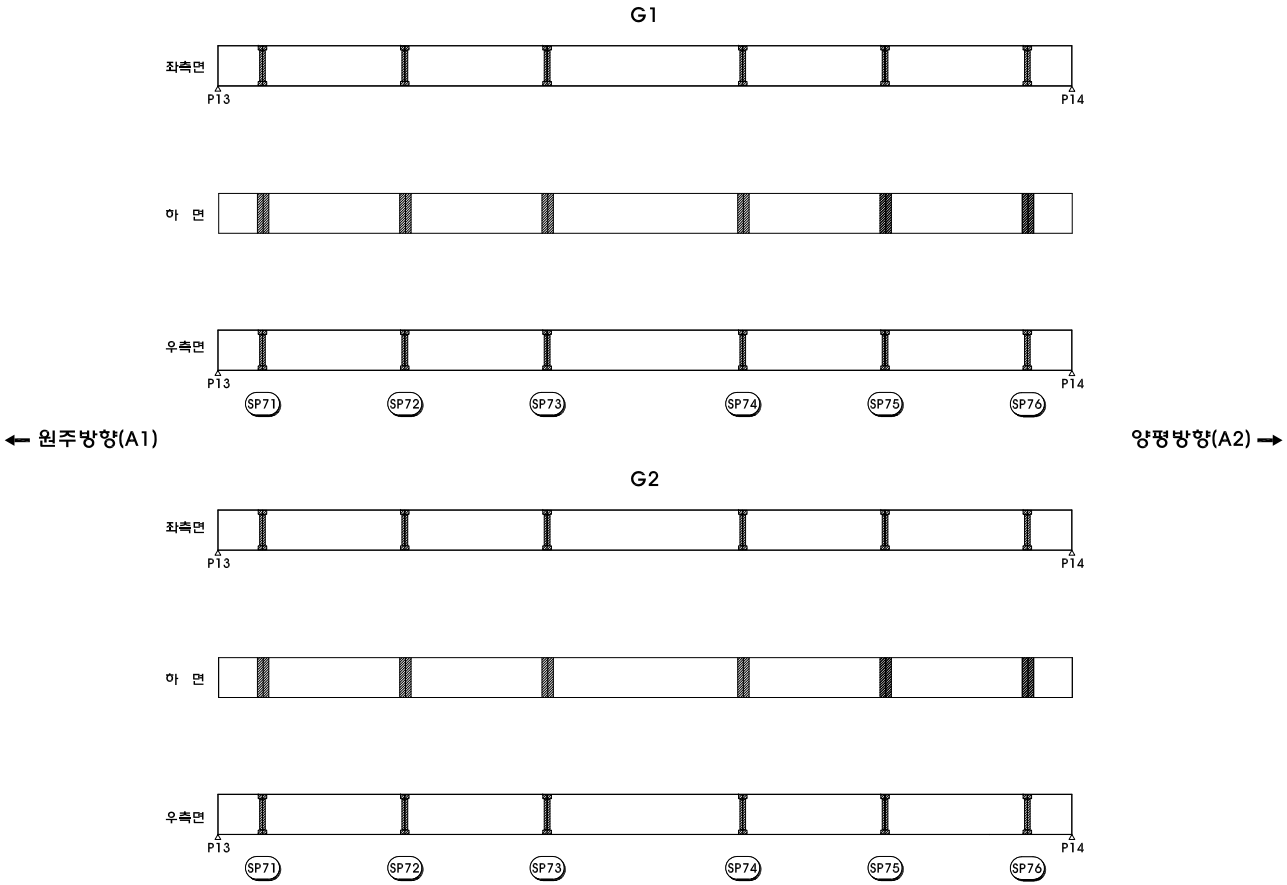

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S14)	외관조사망도		78

KEY PLAN



횡단면도



범 례



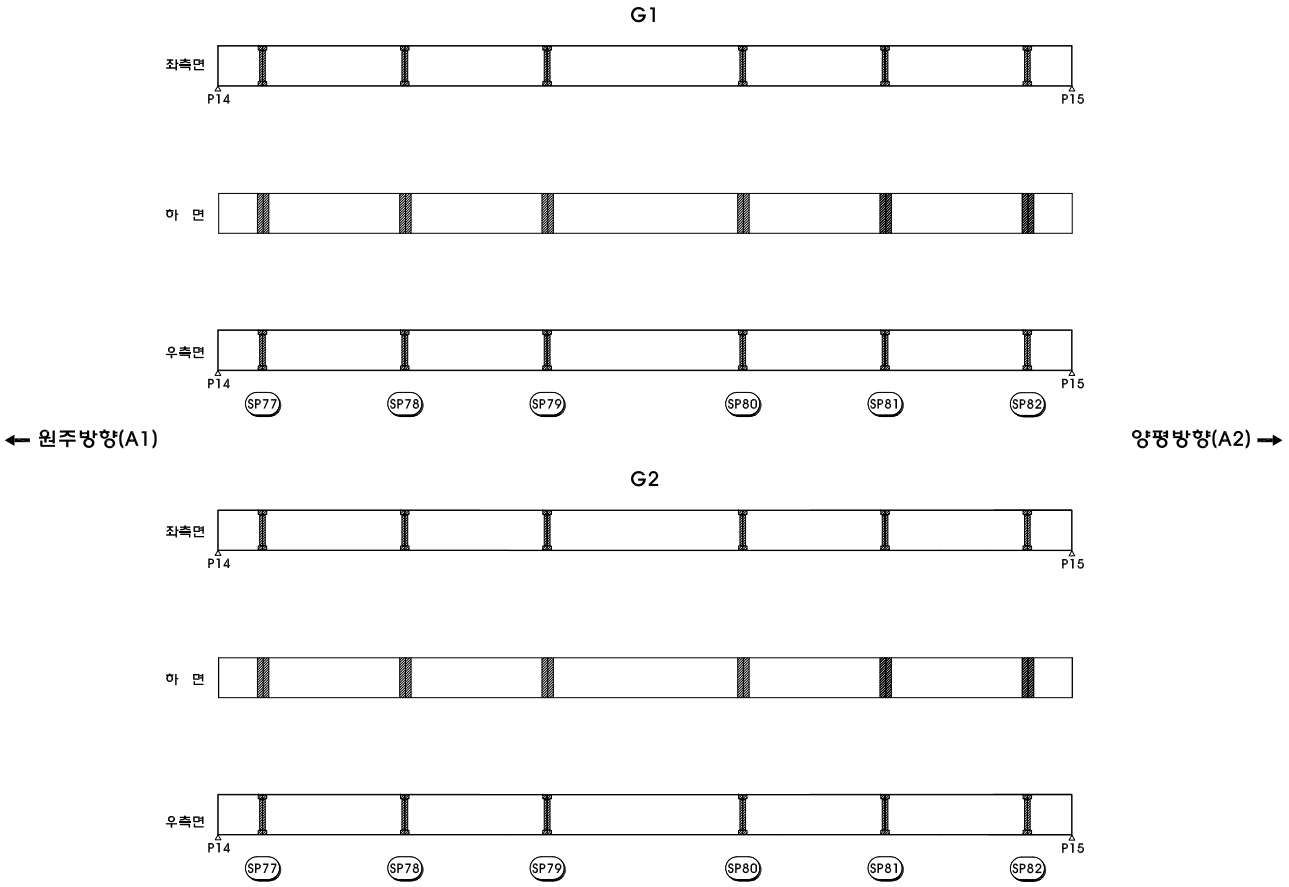

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S15)	외관조사망도		79

KEY PLAN



횡단면도



범 례



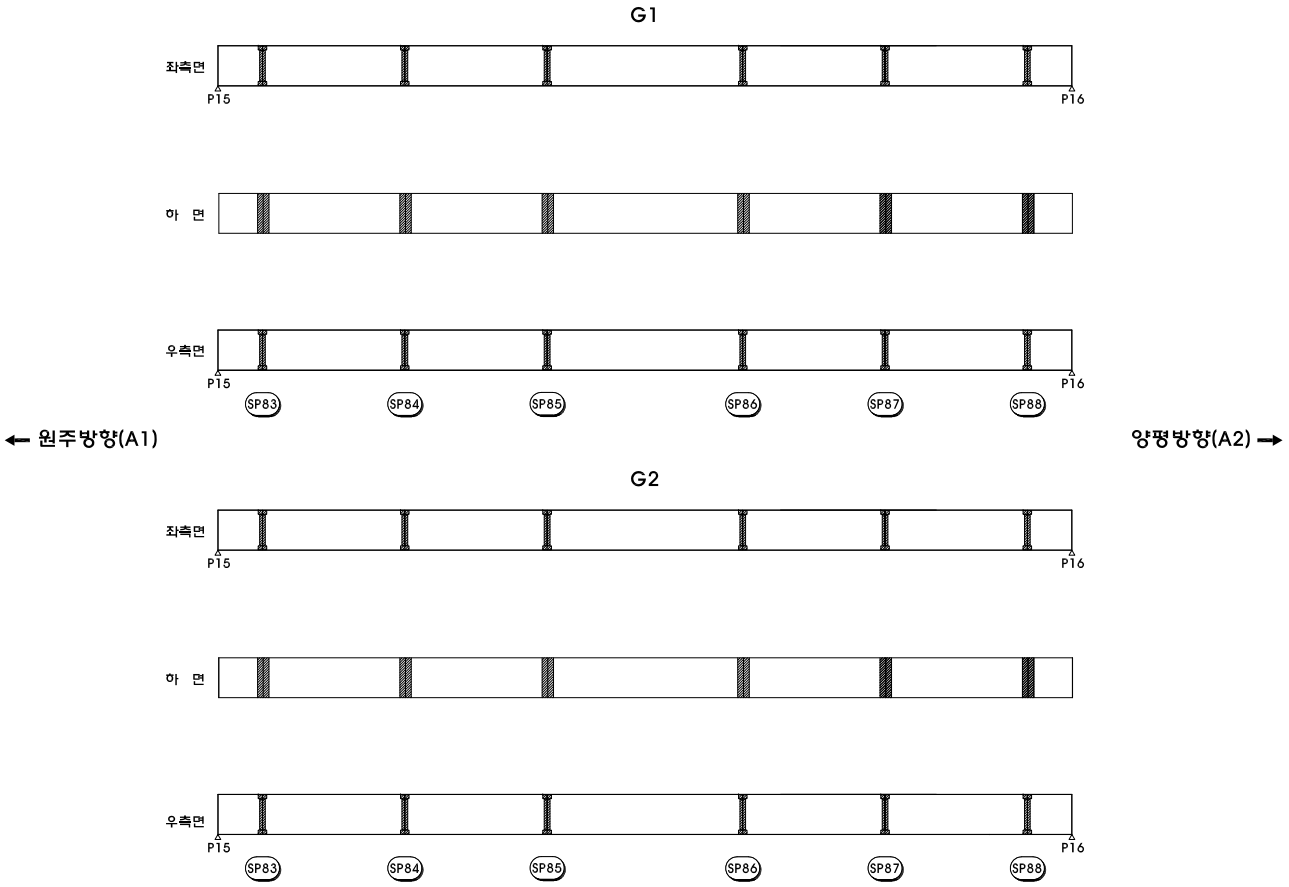

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S16)	외관조사망도		80

KEY PLAN



횡단면도



범 례



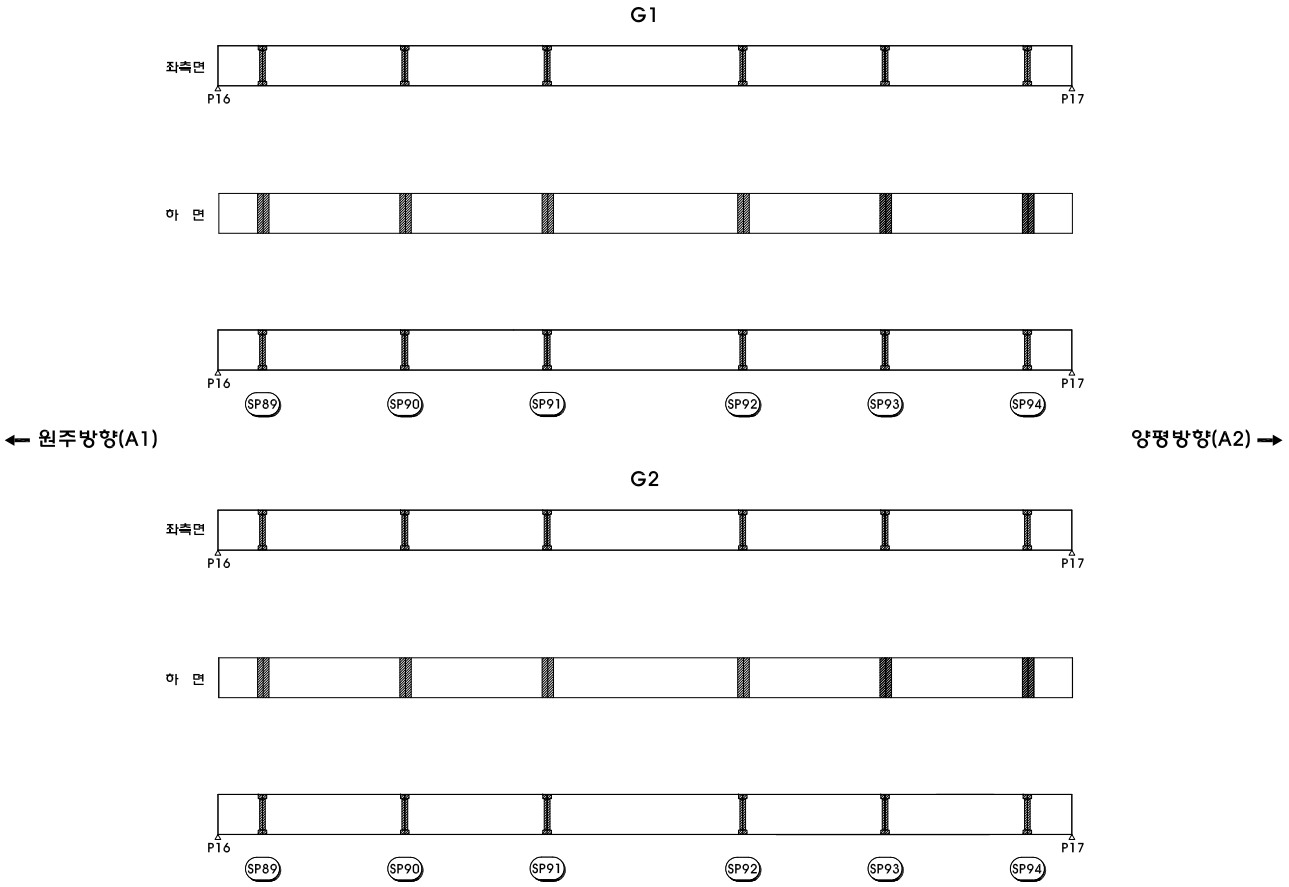

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S17)	외관조사망도		81

KEY PLAN



횡단면도



범 례



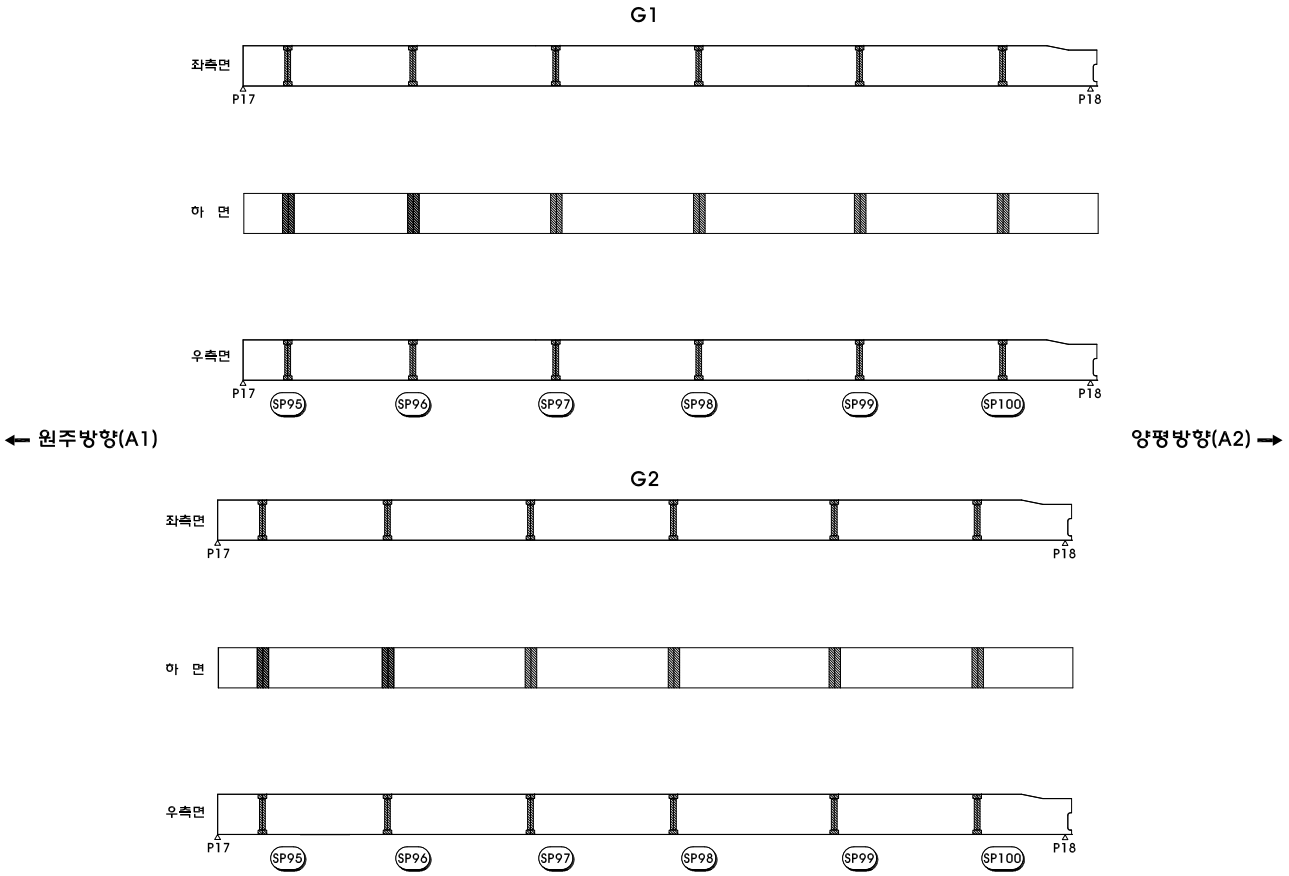

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S18)	외관조사망도		82

KEY PLAN



횡단면도



범 례



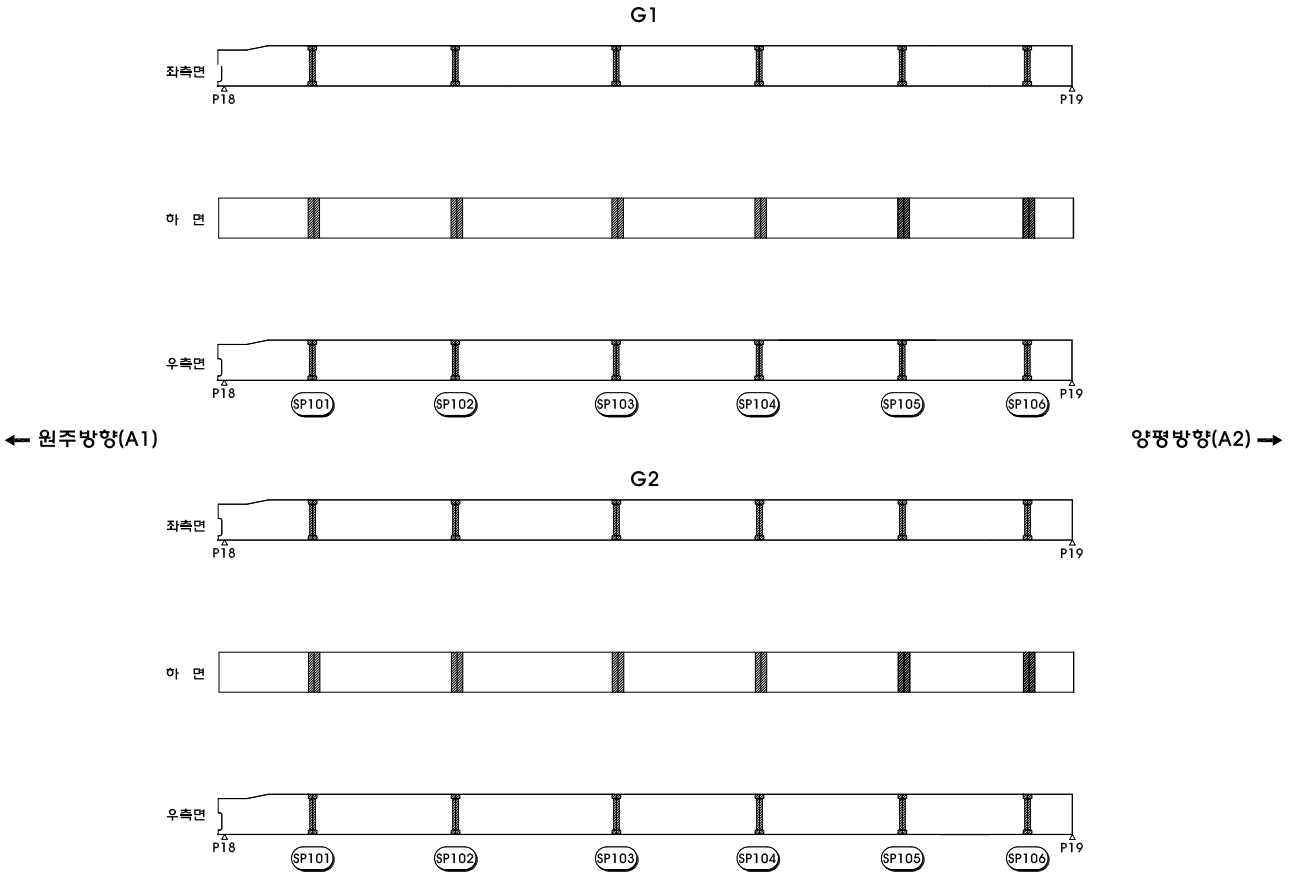

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S19)	외관조사망도		83

KEY PLAN



횡단면도



범 례



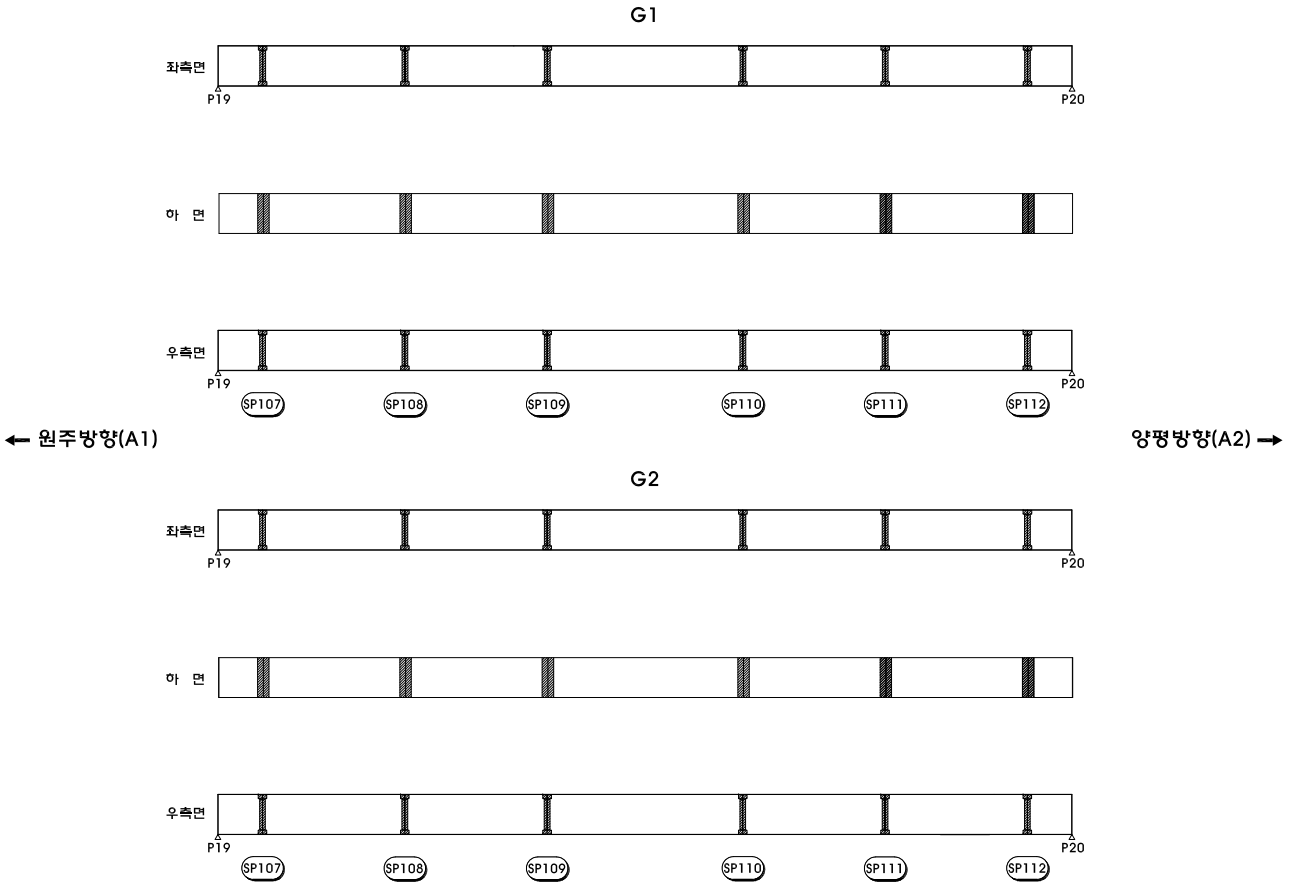

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S20)	외관조사망도		84

KEY PLAN



횡단면도



범 례



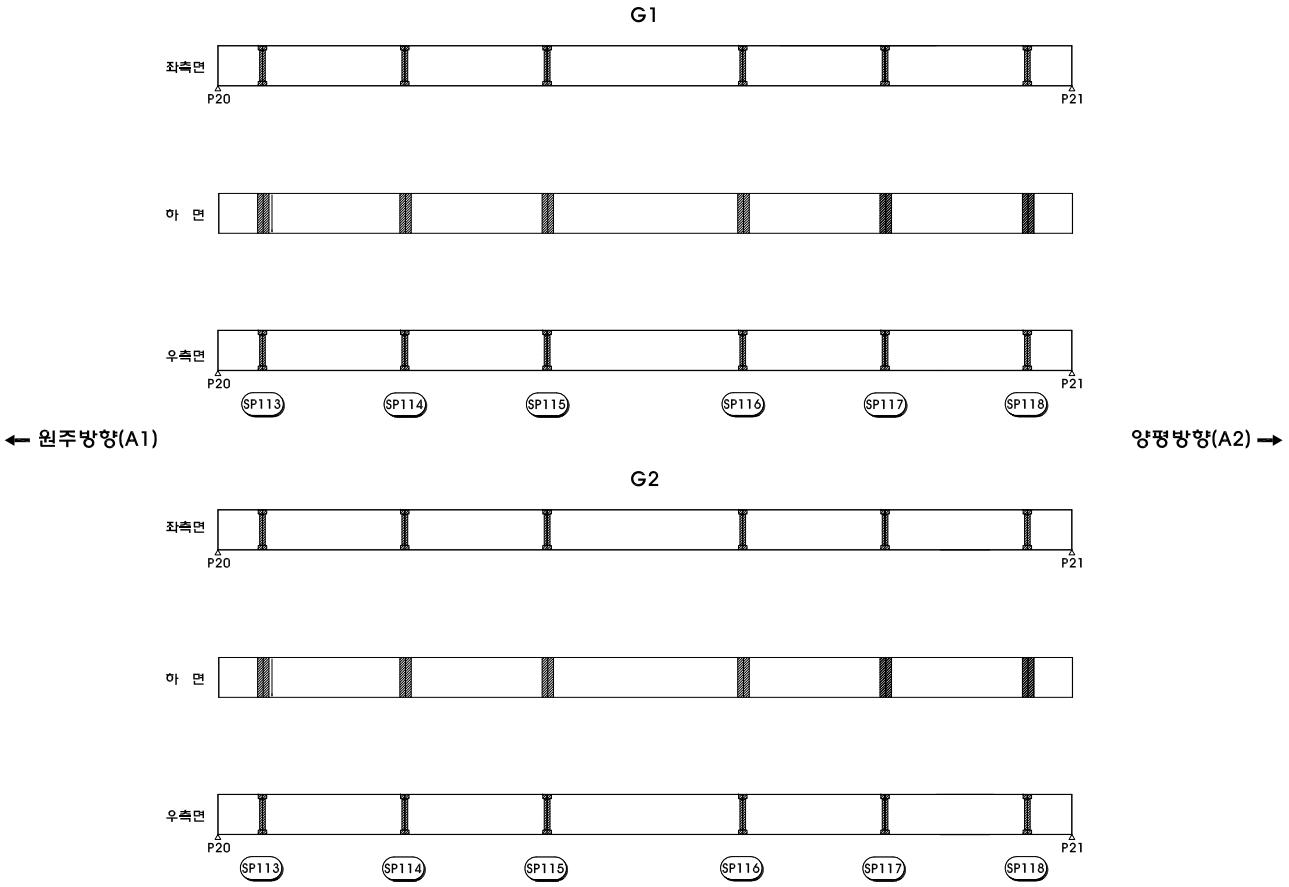

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S21)	외관조사망도	NONE	85

KEY PLAN



횡단면도



범 례



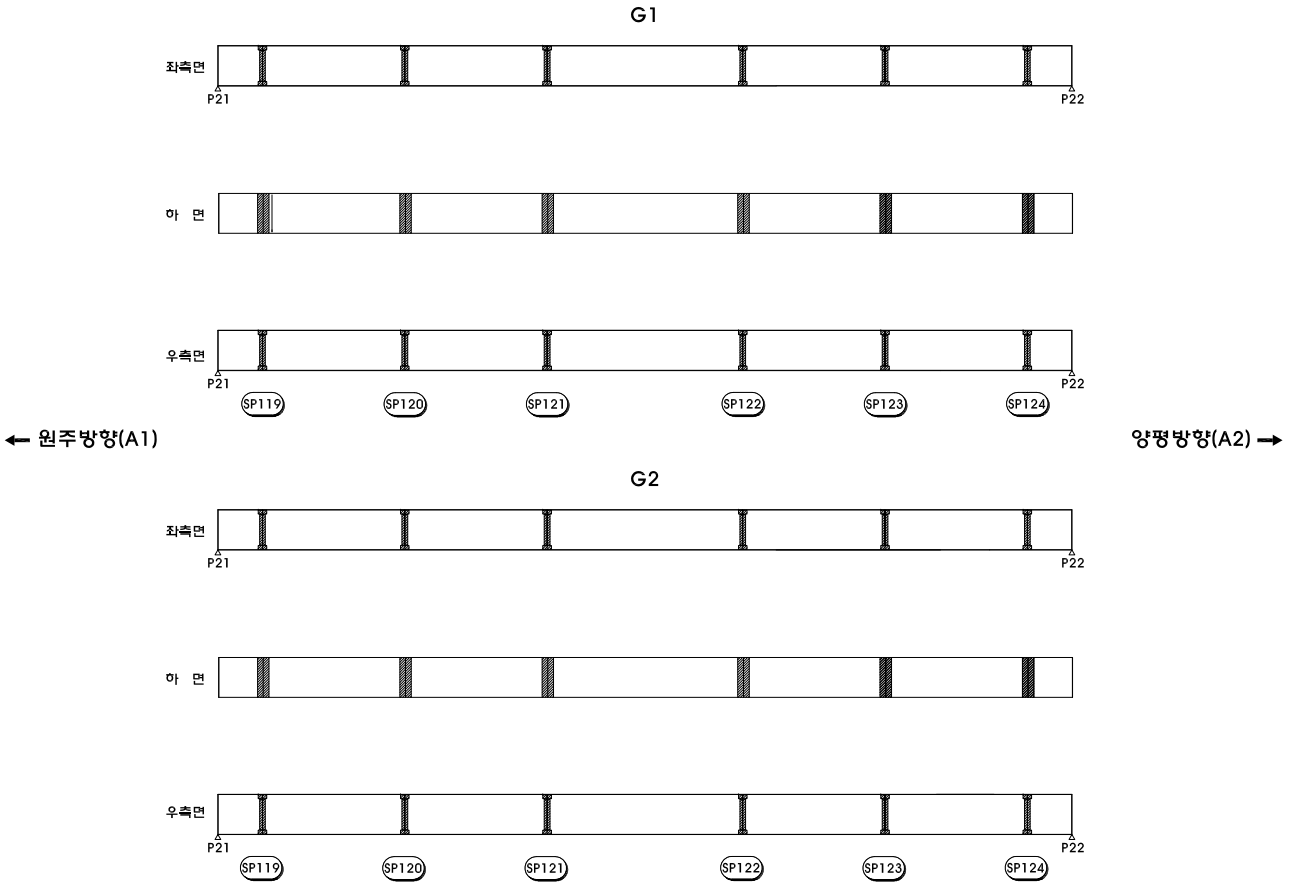

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S22)	외관조사망도	NONE	86

KEY PLAN



횡단면도



범 례



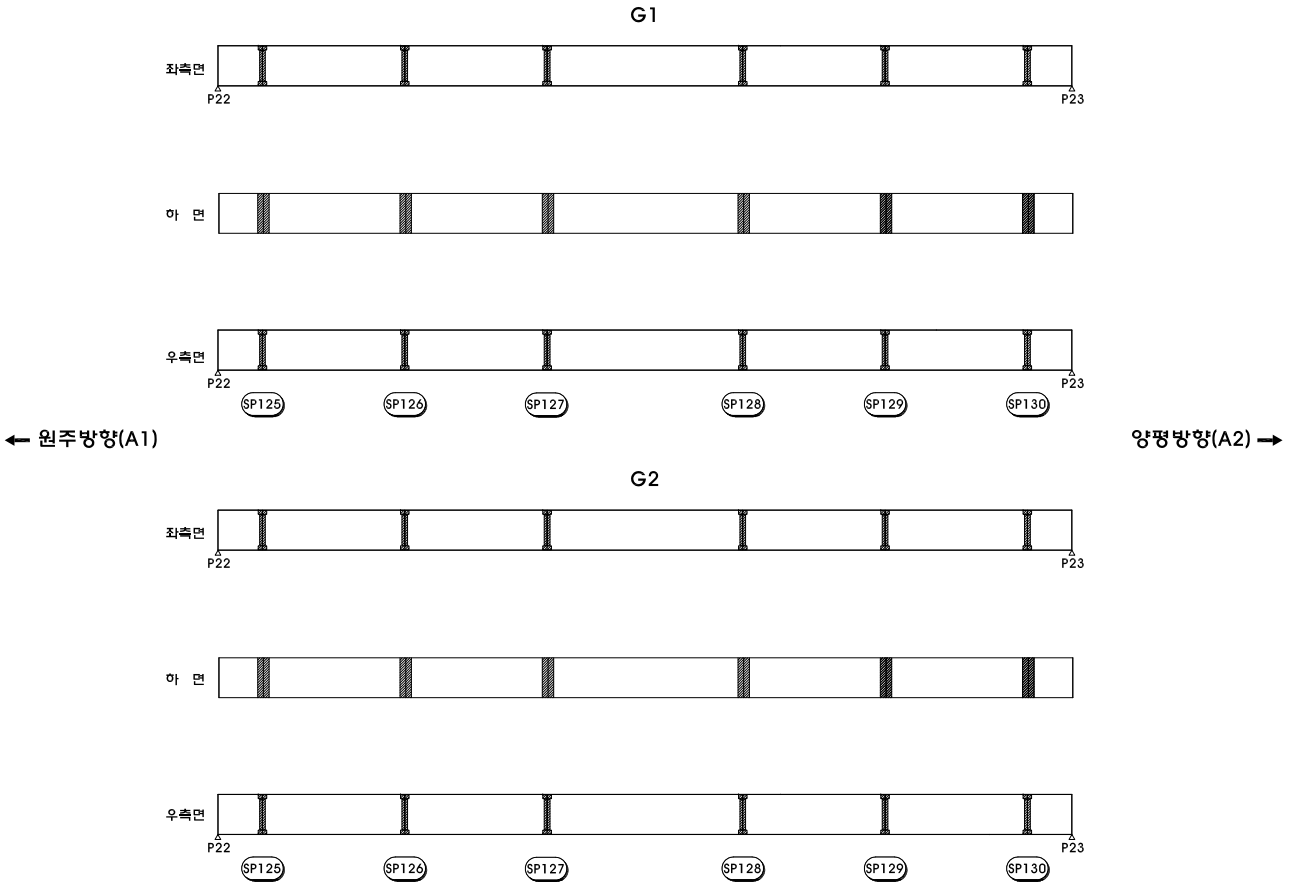

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S23)	외관조사망도	NONE	87

KEY PLAN



횡단면도



범 례



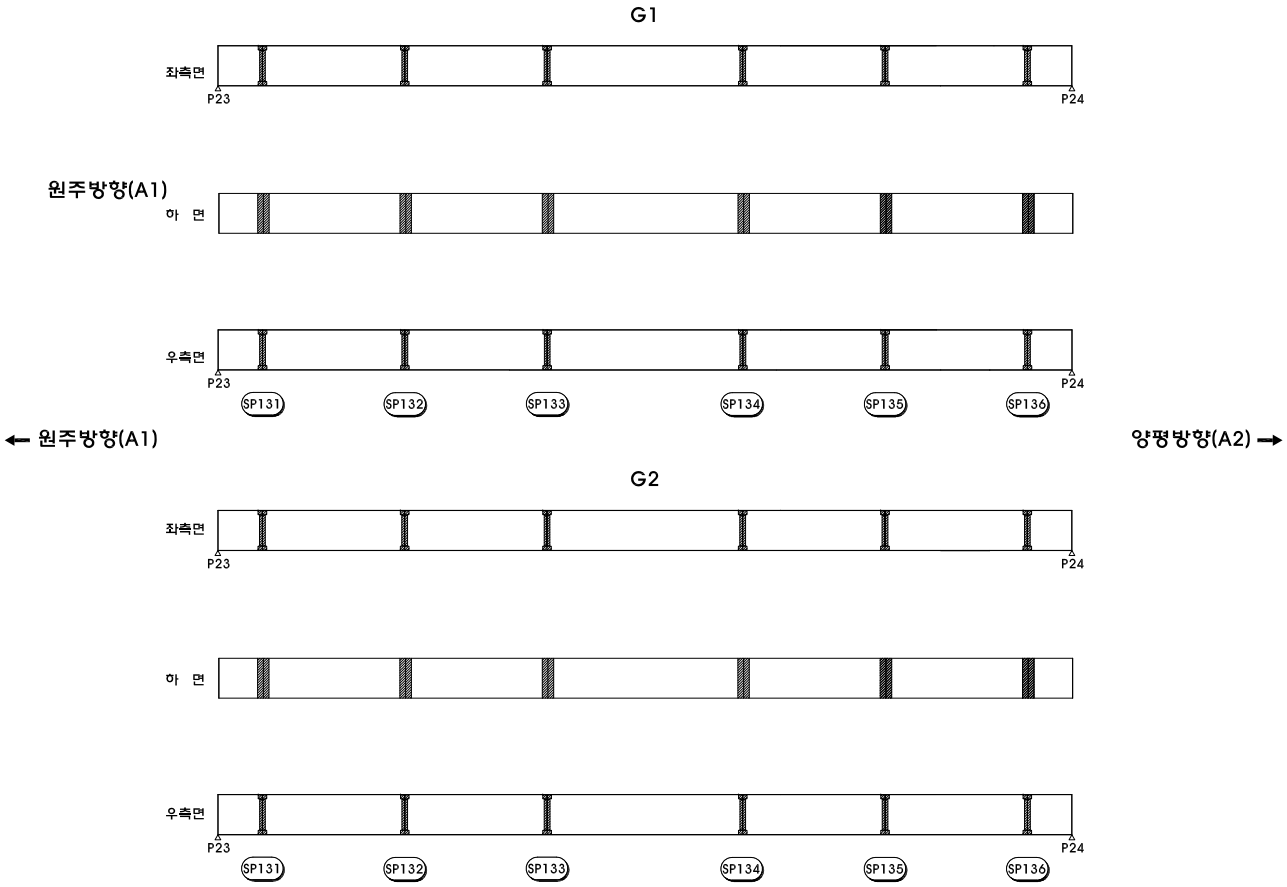

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S24)	외관조사망도	NONE	88

KEY PLAN



횡단면도



범 례



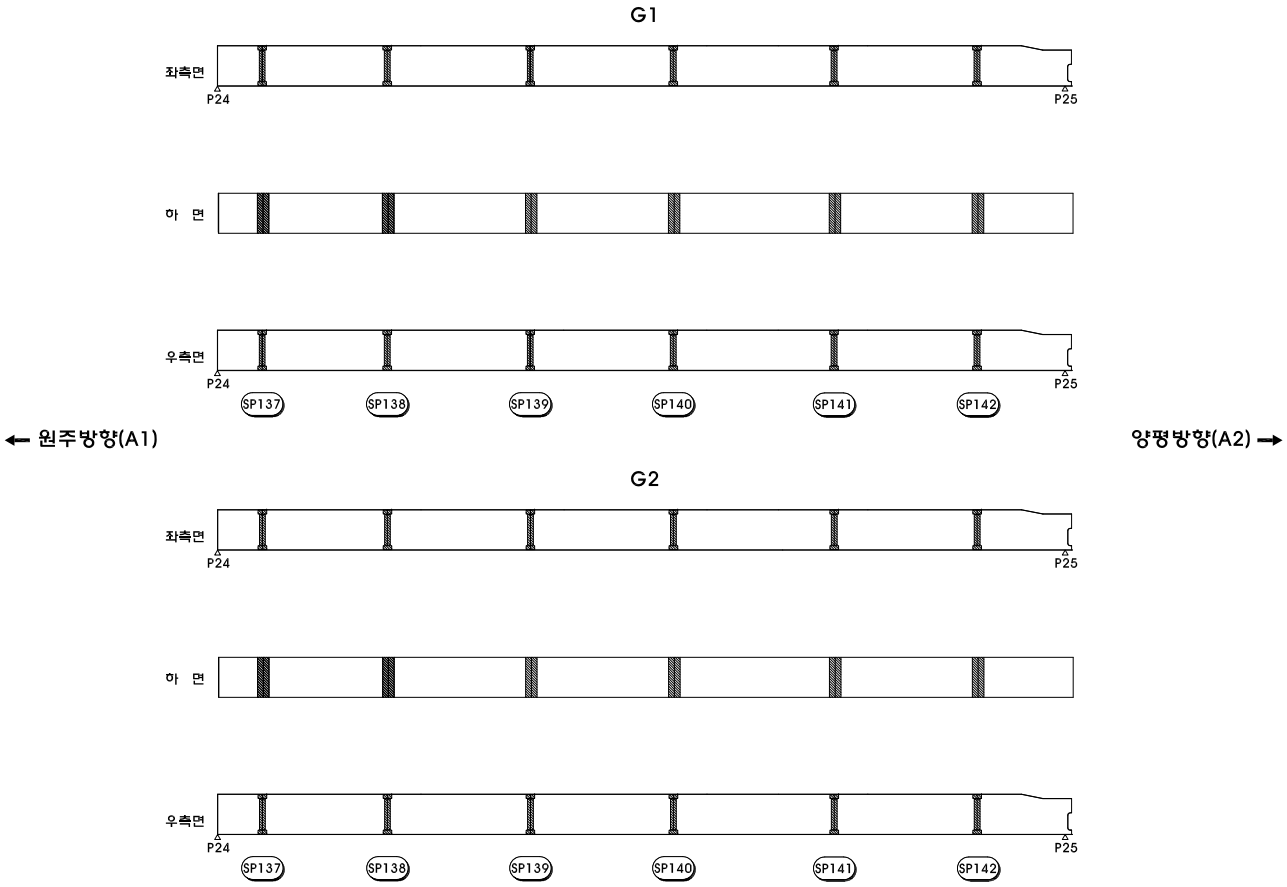

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S25)	외관조사망도	NONE	89

KEY PLAN



횡단면도



범 례



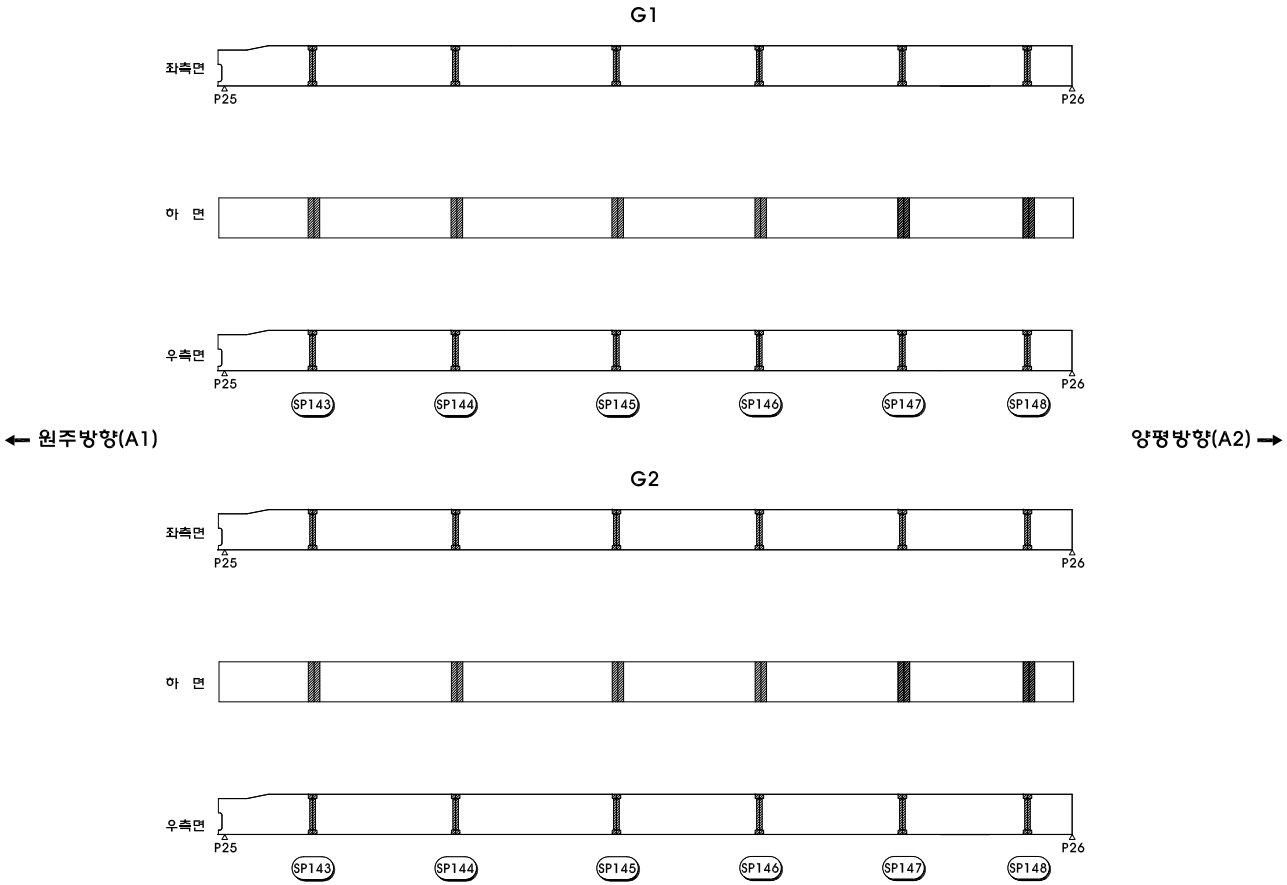

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S26)	외관조사망도	NONE	90

KEY PLAN



횡단면도



범 례



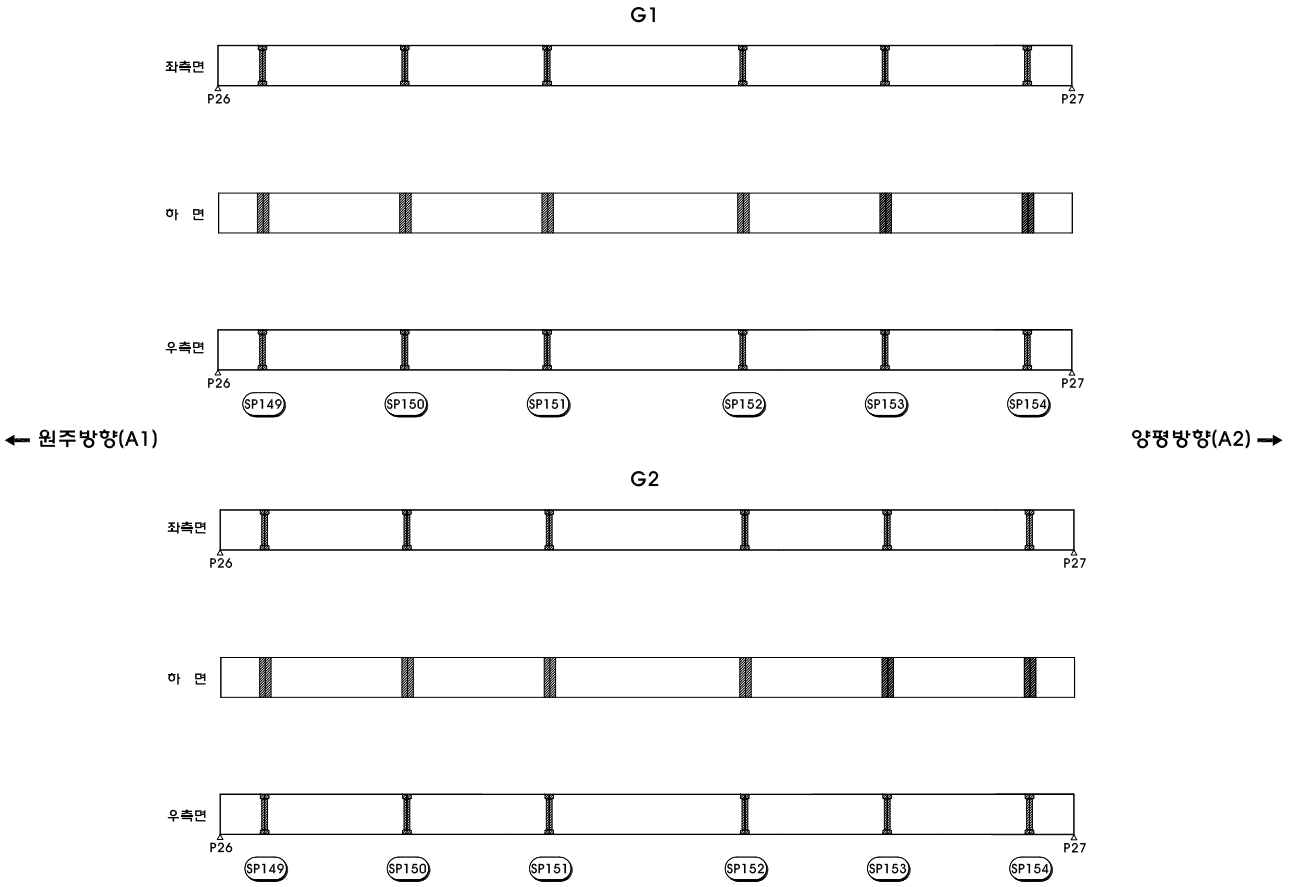

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S27)	외관조사망도	NONE	91

KEY PLAN



횡단면도



범 례



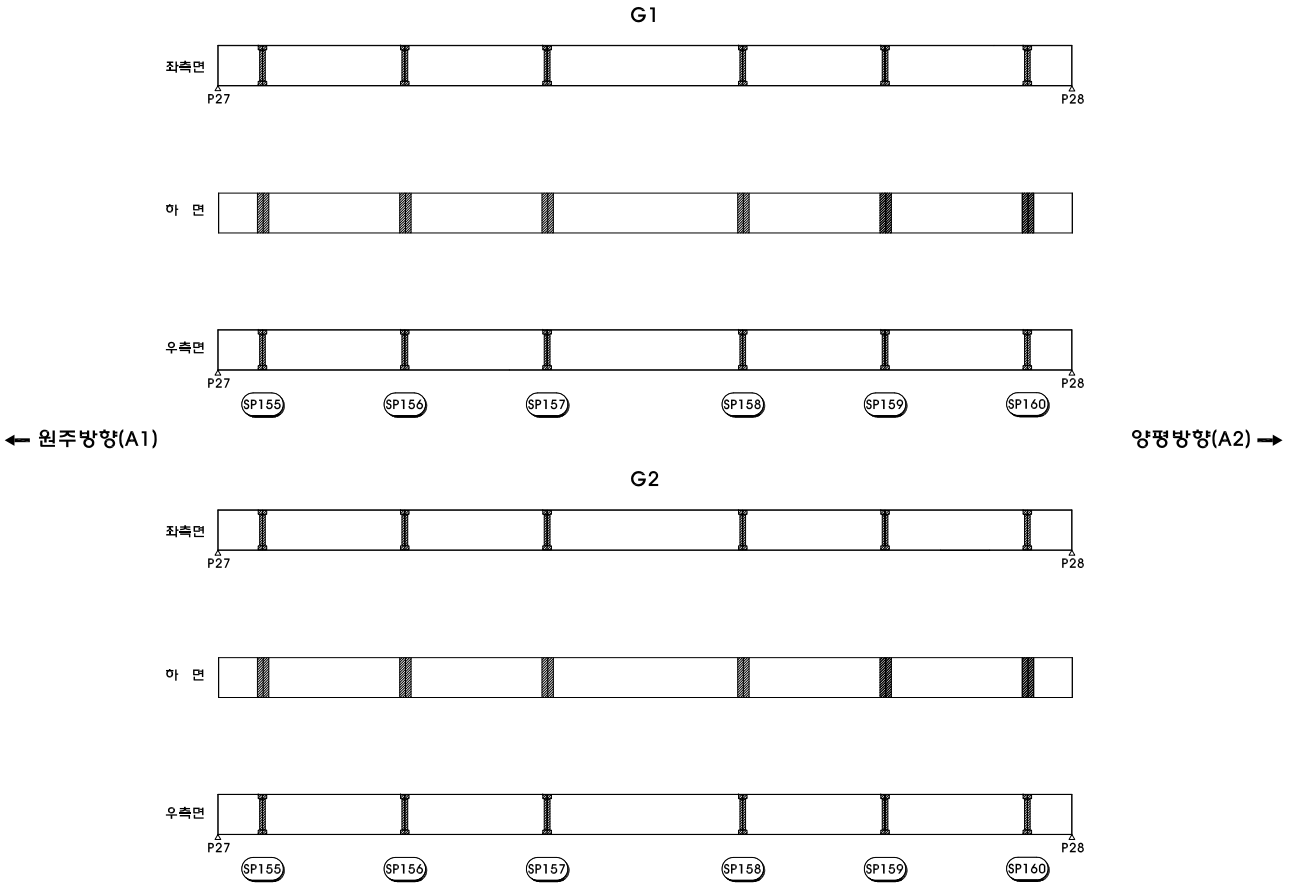

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S28)	외관조사망도	NONE	92

KEY PLAN



횡단면도



범 례



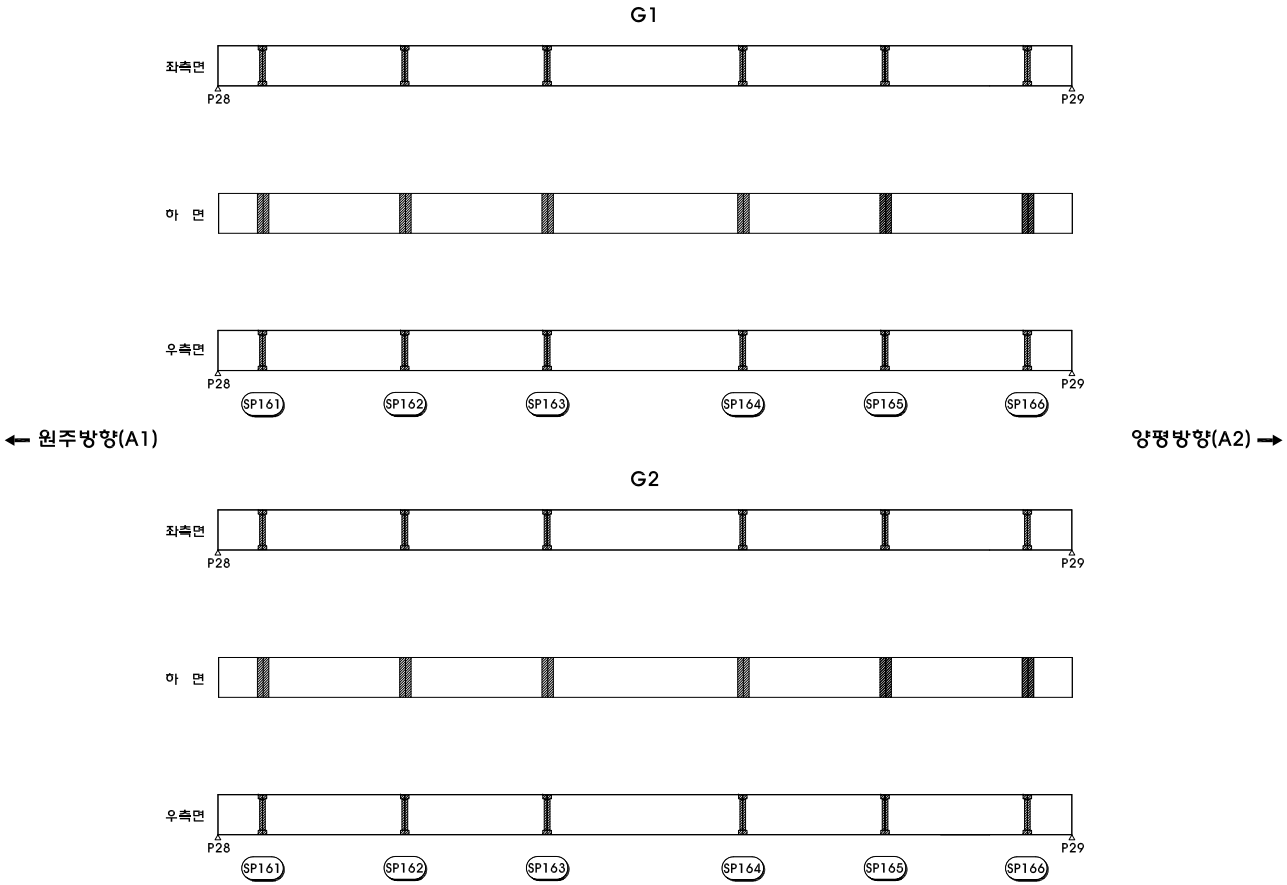

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S29)	외관조사망도	NONE	93

KEY PLAN



횡단면도



범 례



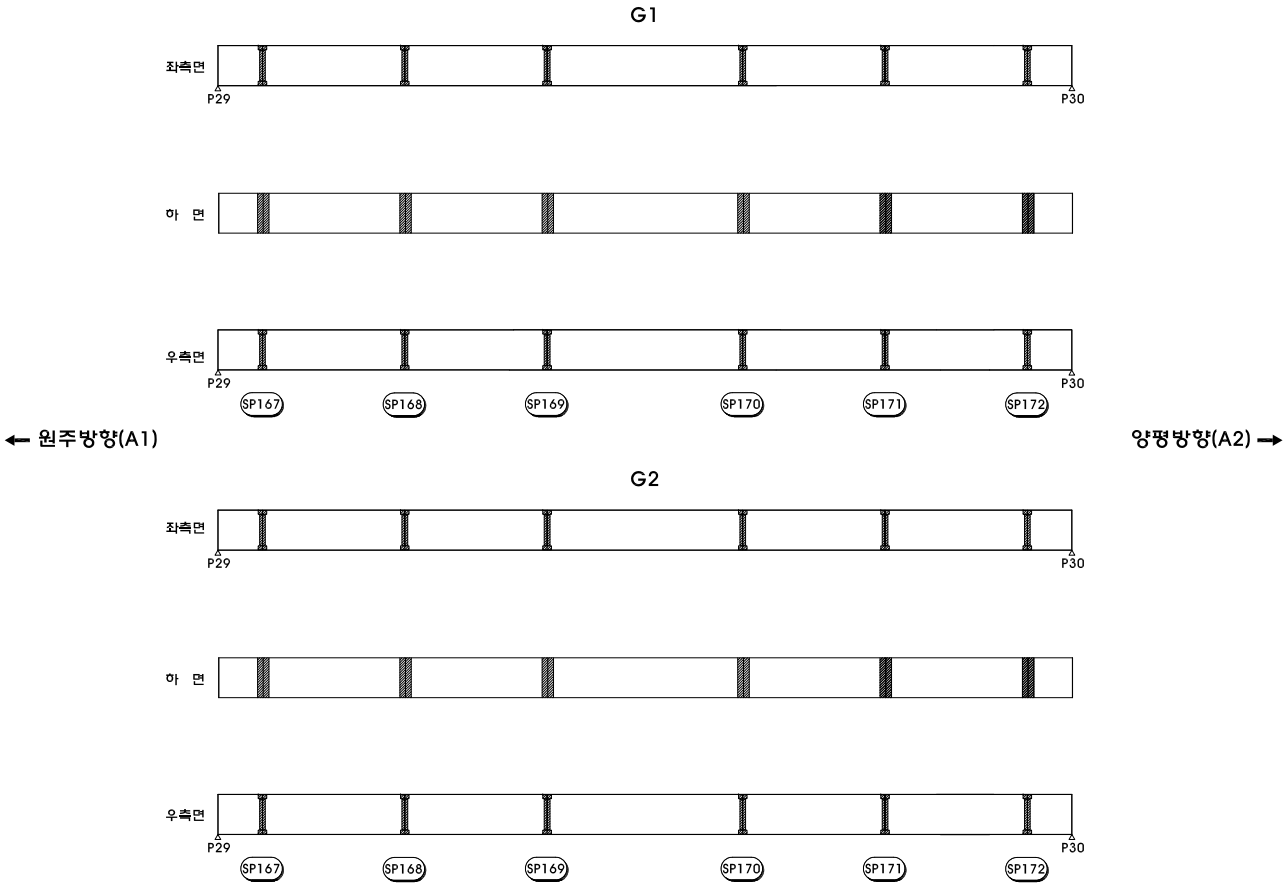

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S30)	외관조사망도	NONE	94

KEY PLAN



횡단면도



범 례



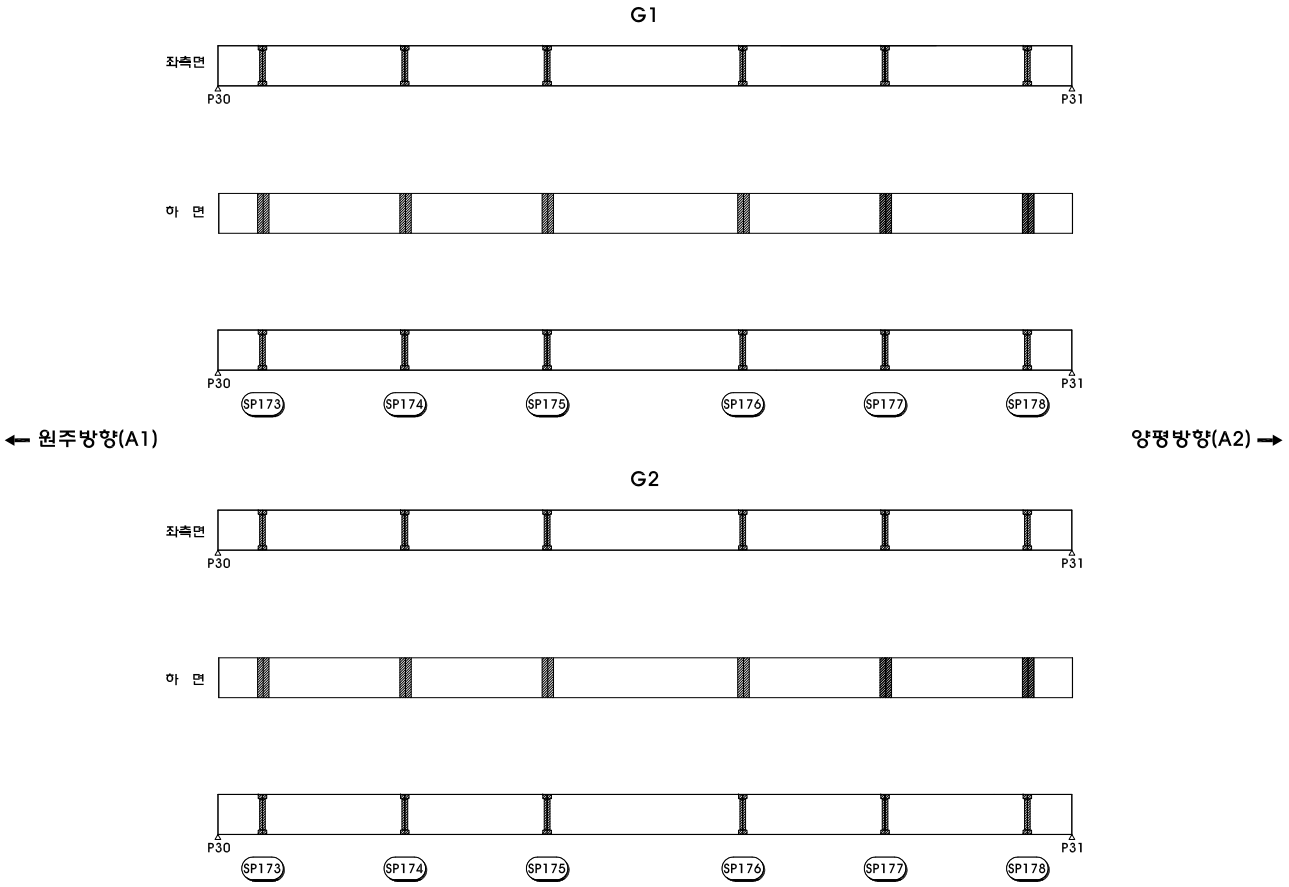

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S31)	외관조사망도	NONE	95

KEY PLAN



횡단면도



범 례



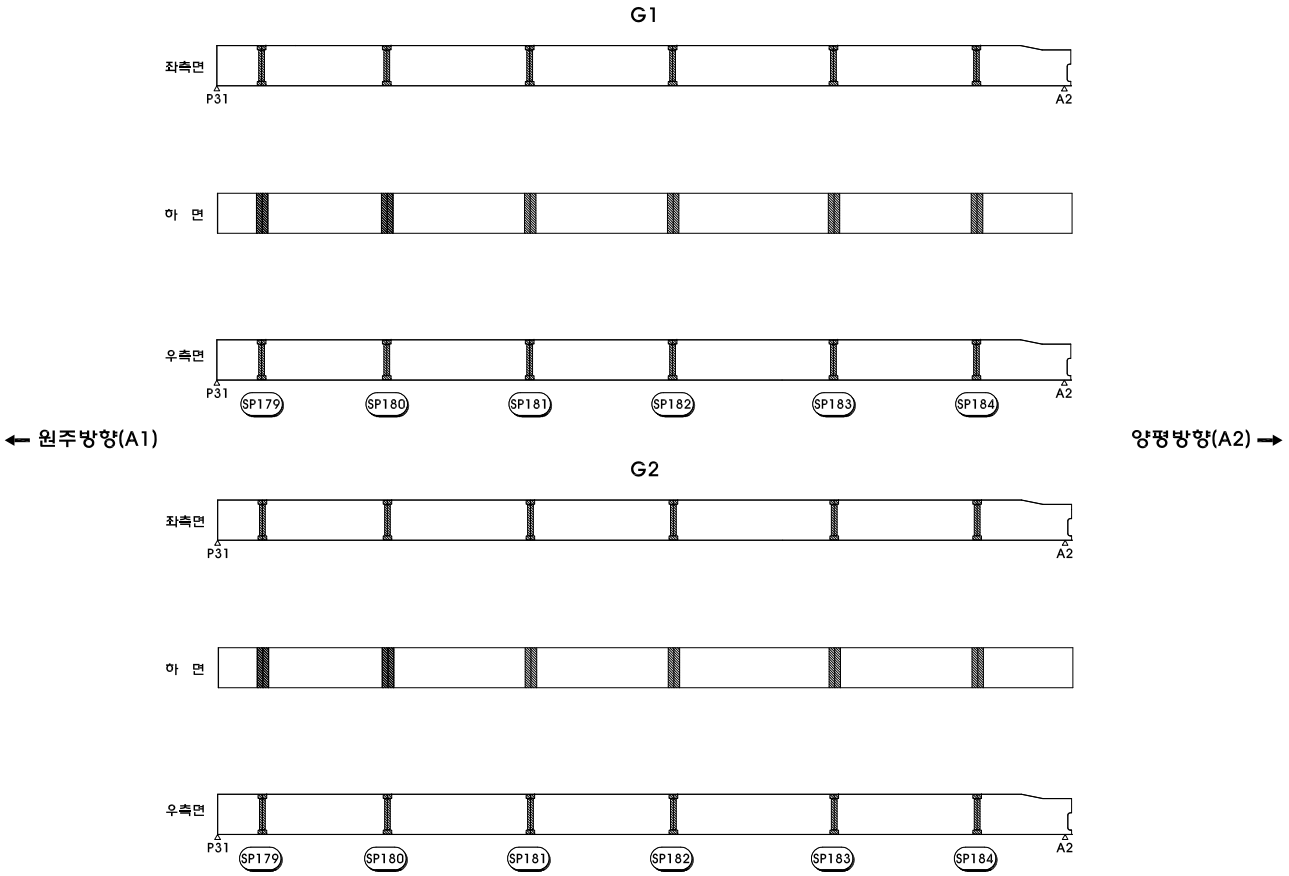

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 외부 (S32)	외관조사망도	NONE	96

KEY PLAN



횡단면도



범 례



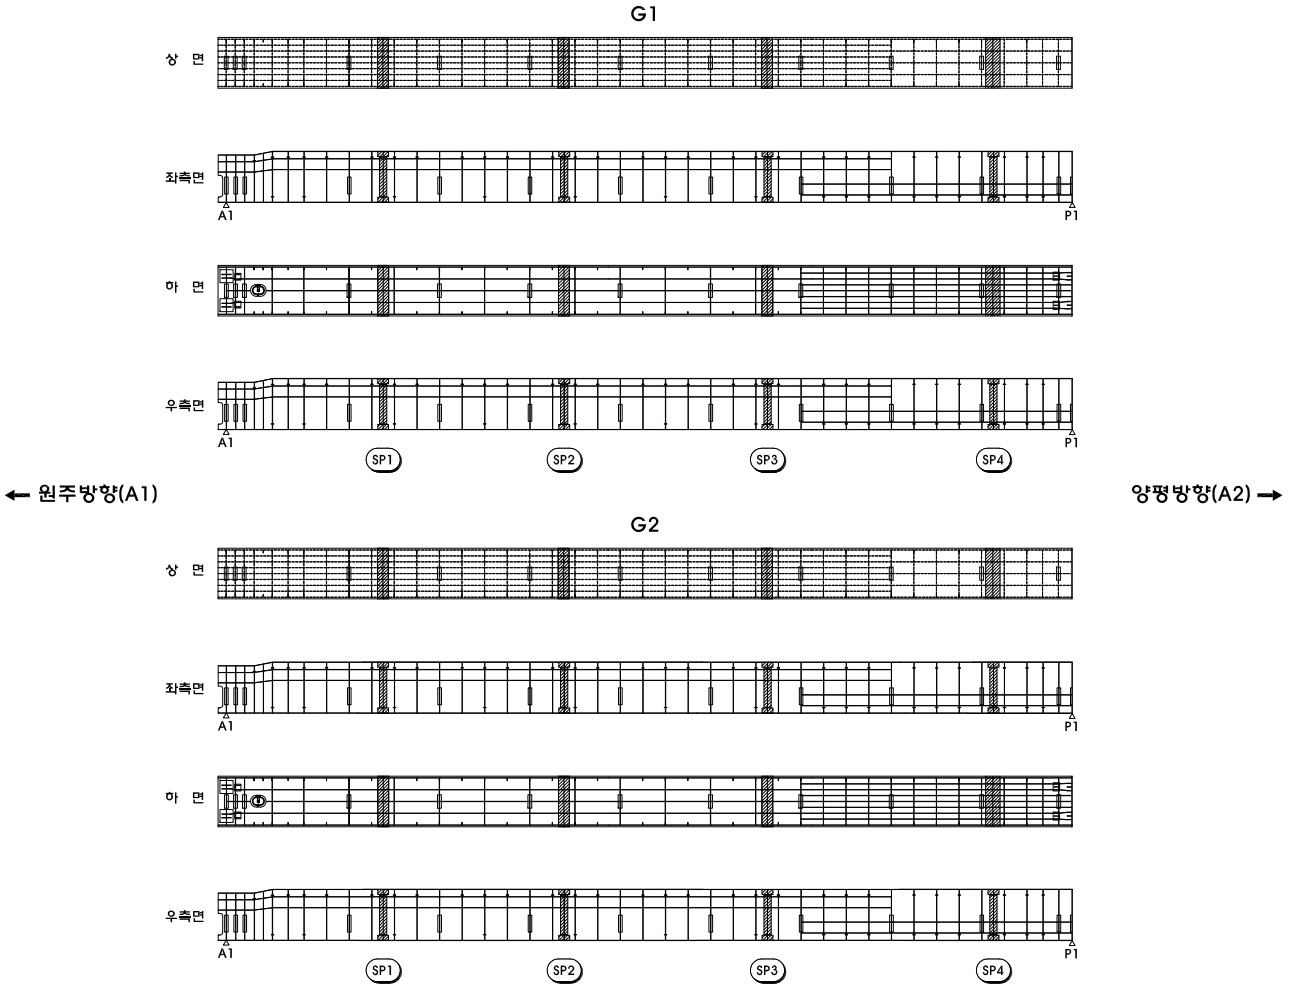

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S1)	외관조사망도	NONE	05

KEY PLAN



횡단면도



범 례



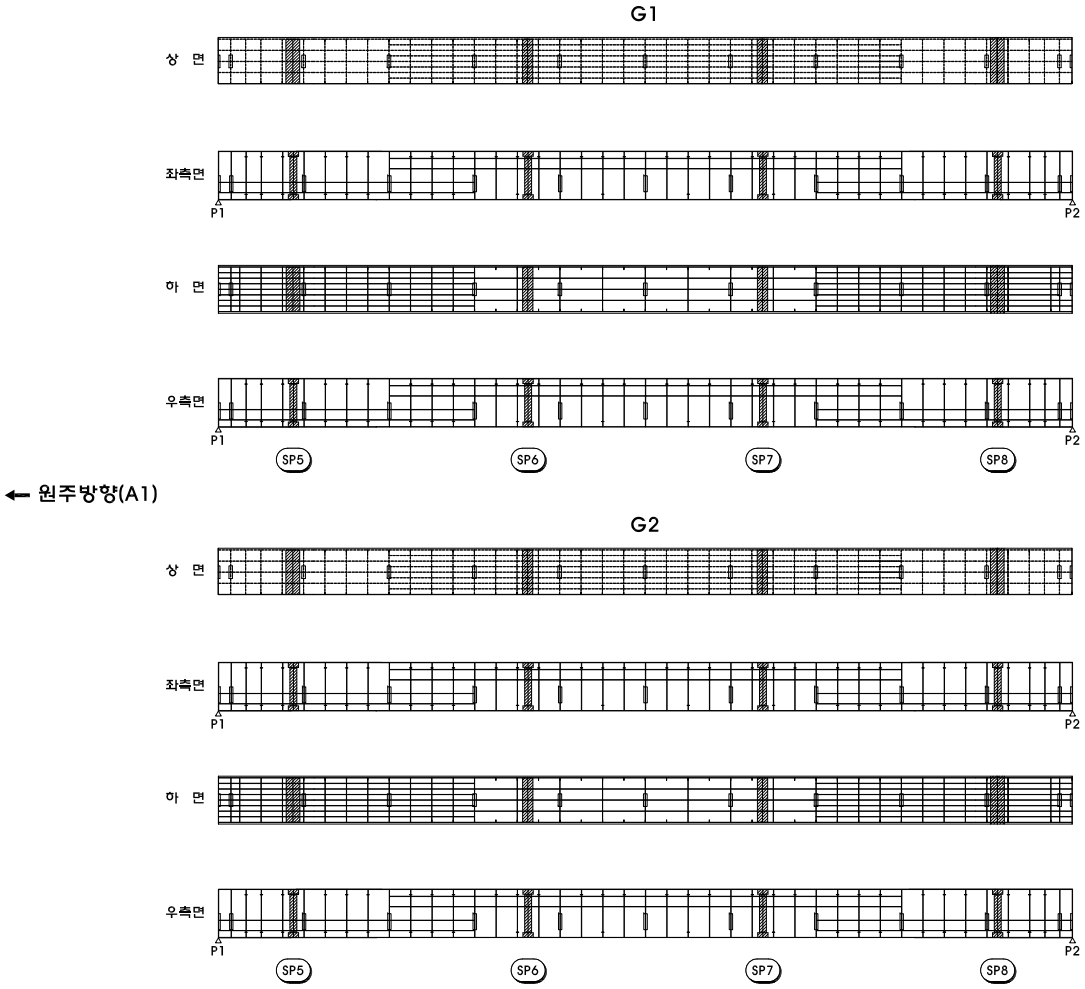

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S2)	외관조사망도	NONE	98

KEY PLAN



횡단면도



범 례



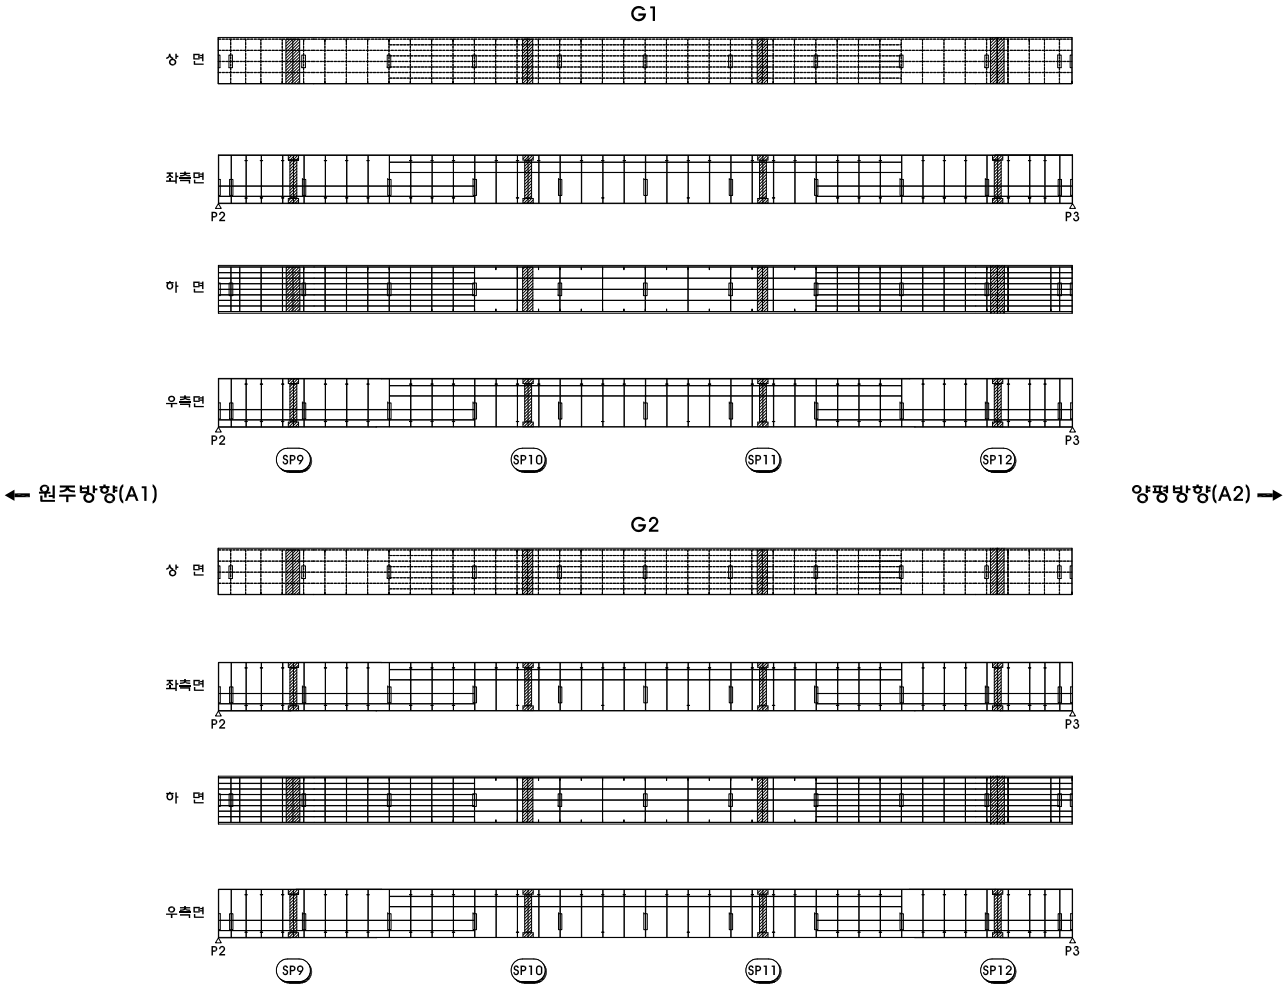

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S3)	외관조사망도	NONE	99

KEY PLAN



횡단면도



범 례



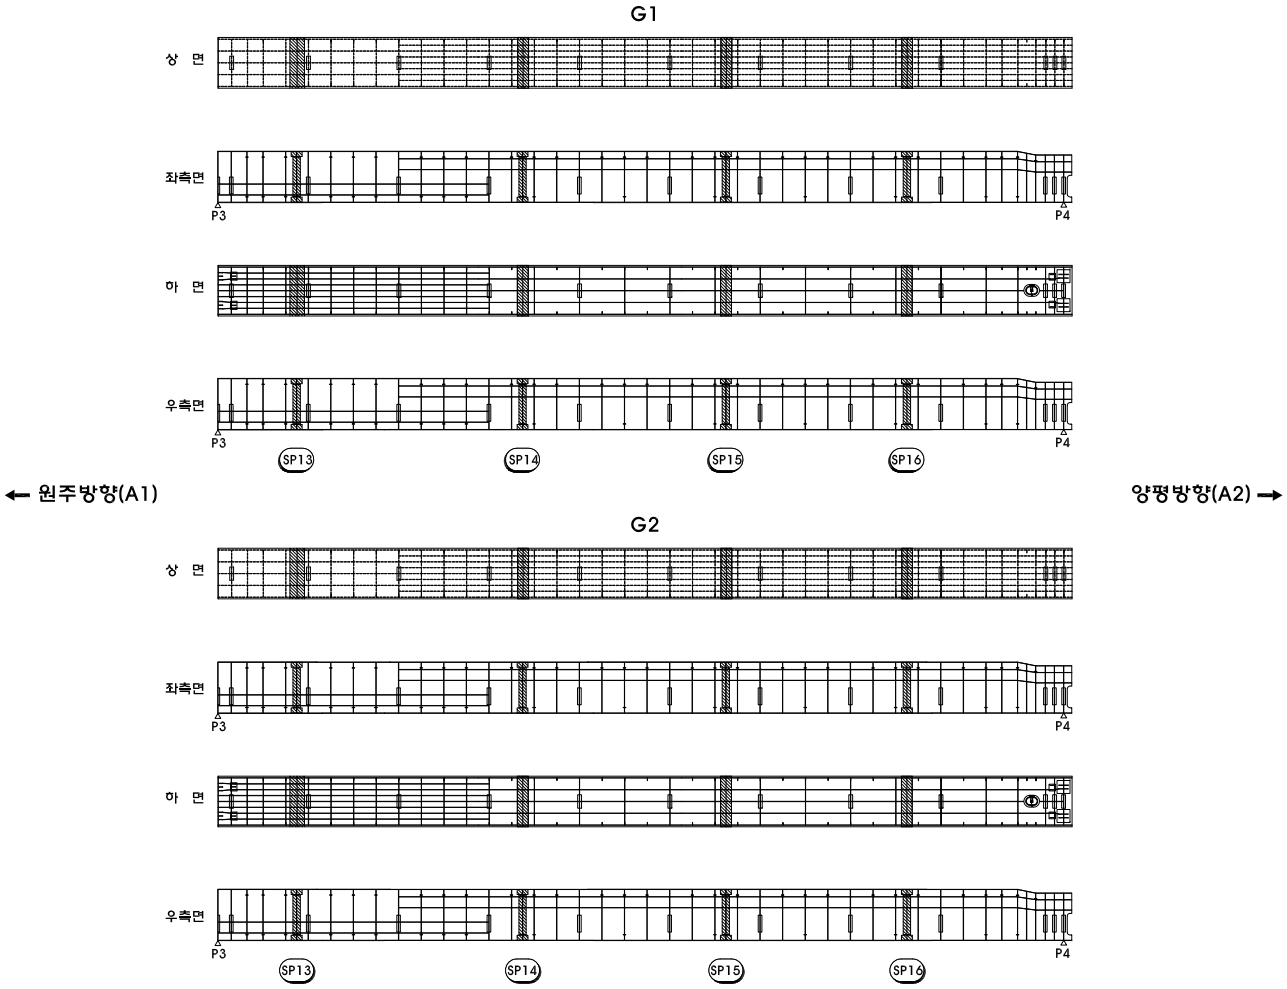

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S4)	외관조사망도	NONE	100

KEY PLAN



횡단면도



범 례



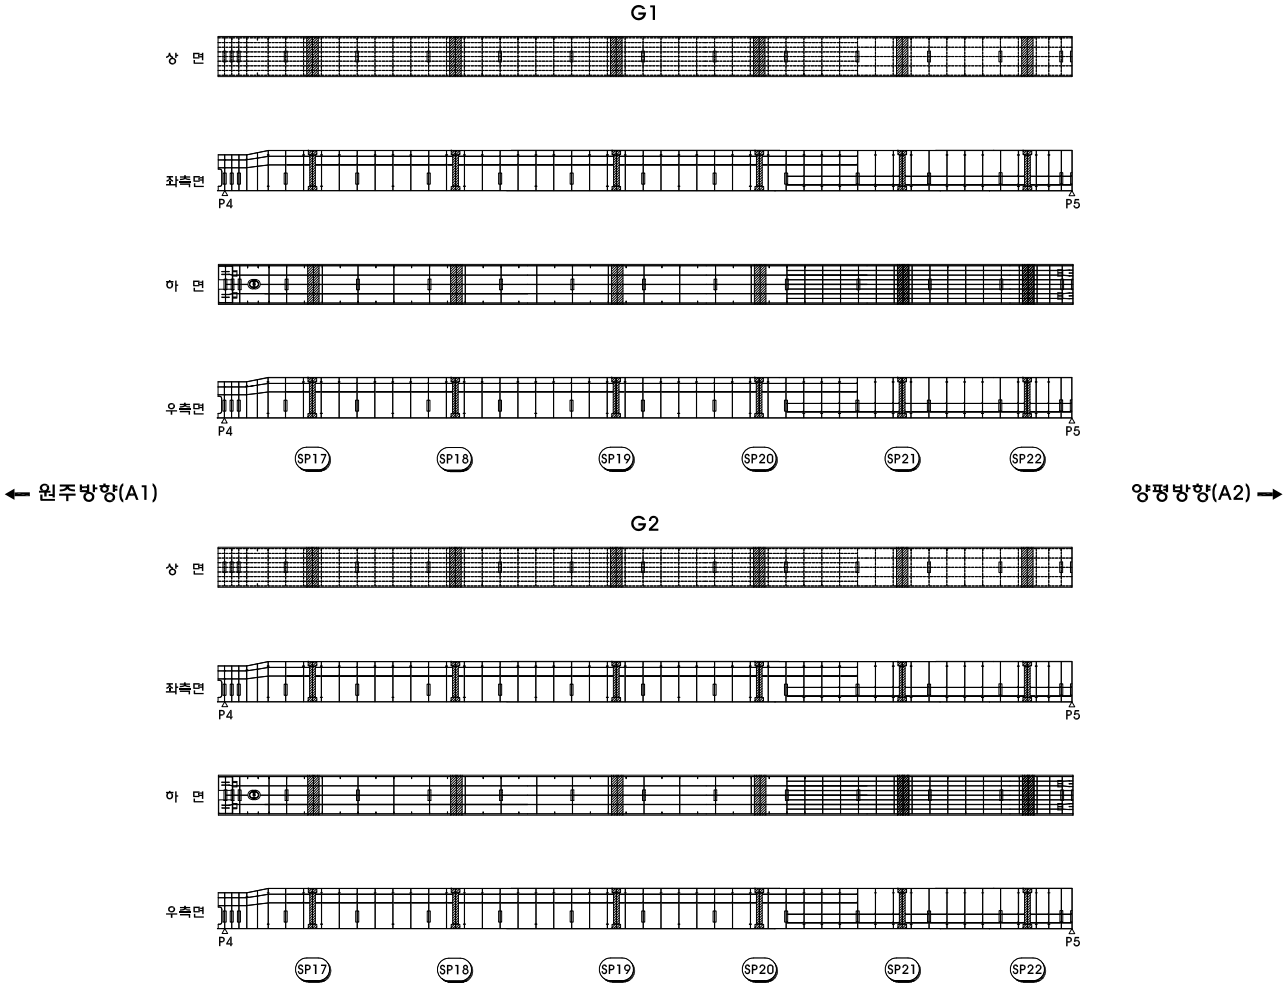

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S5)	외관조사망도	NONE	101

KEY PLAN



횡단면도



범 례



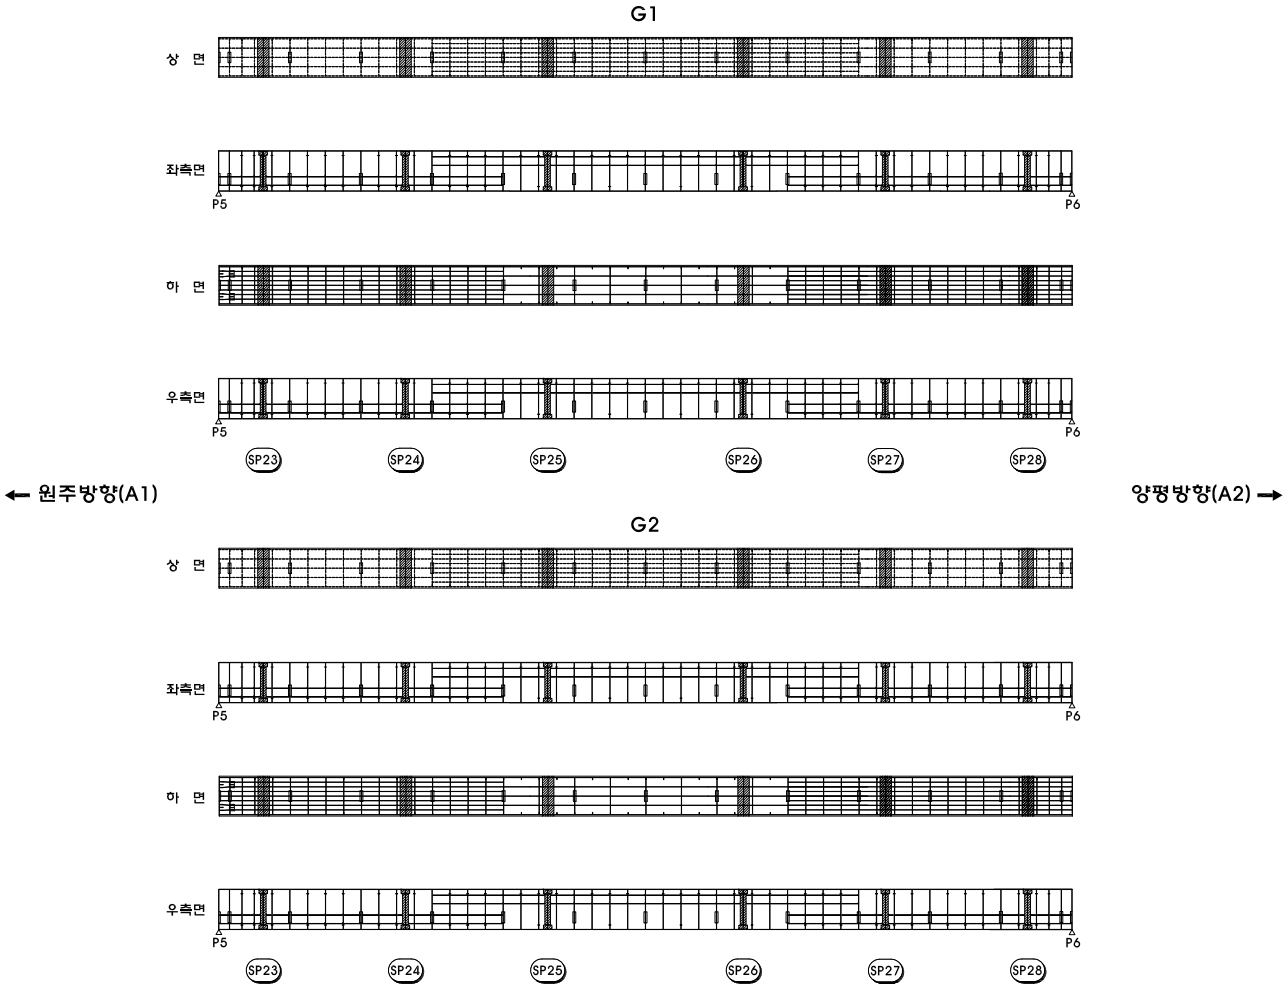

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S6)	외관조사망도	NONE	102

KEY PLAN



횡단면도



범 례



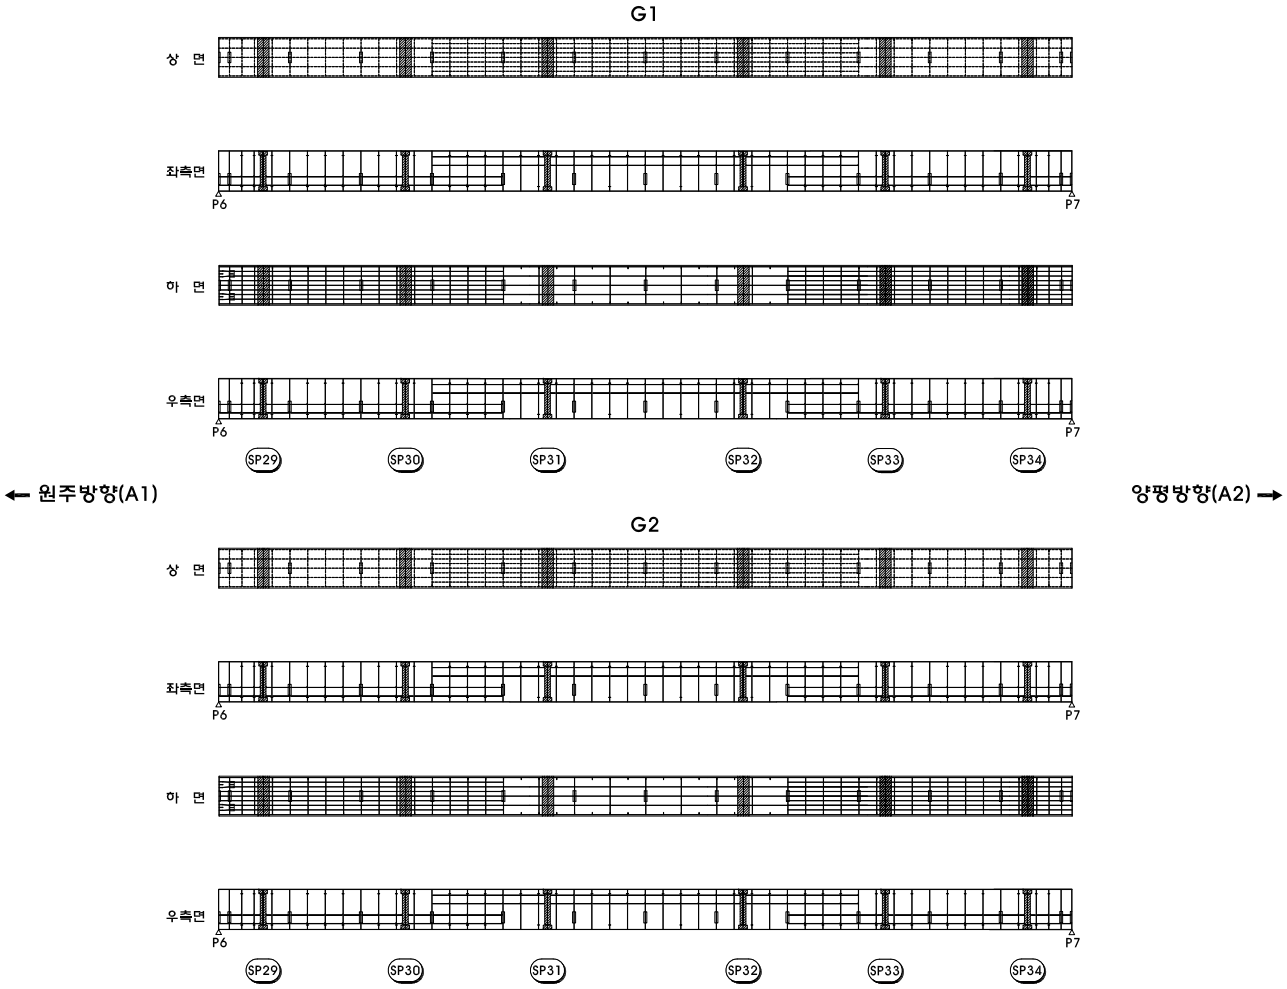

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S7)	외관조사망도	NONE	103

KEY PLAN



횡단면도



범 례



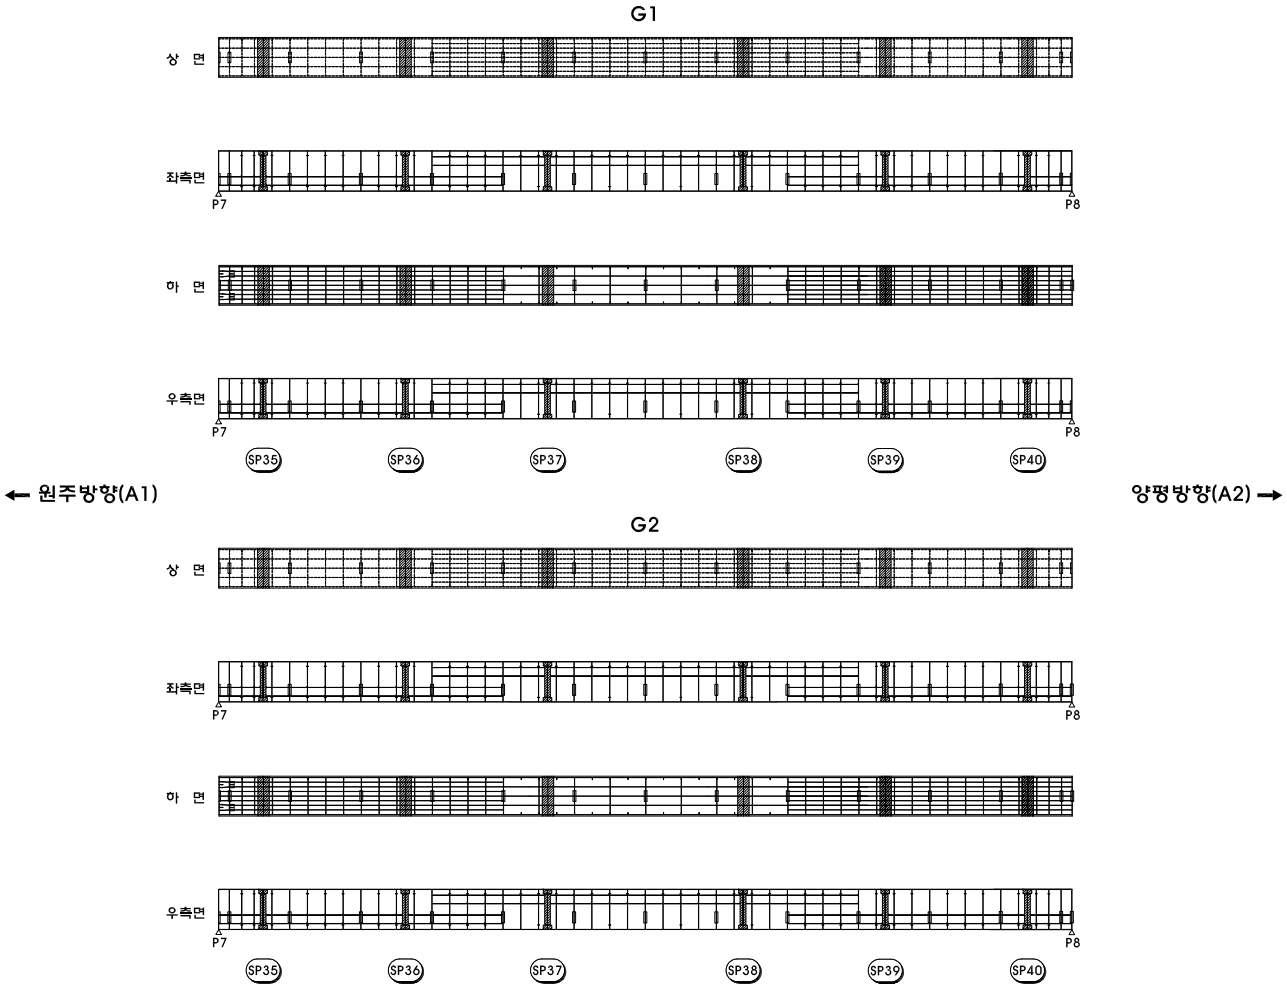

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S8)	외관조사망도	NONE	104

KEY PLAN



횡단면도



범 례



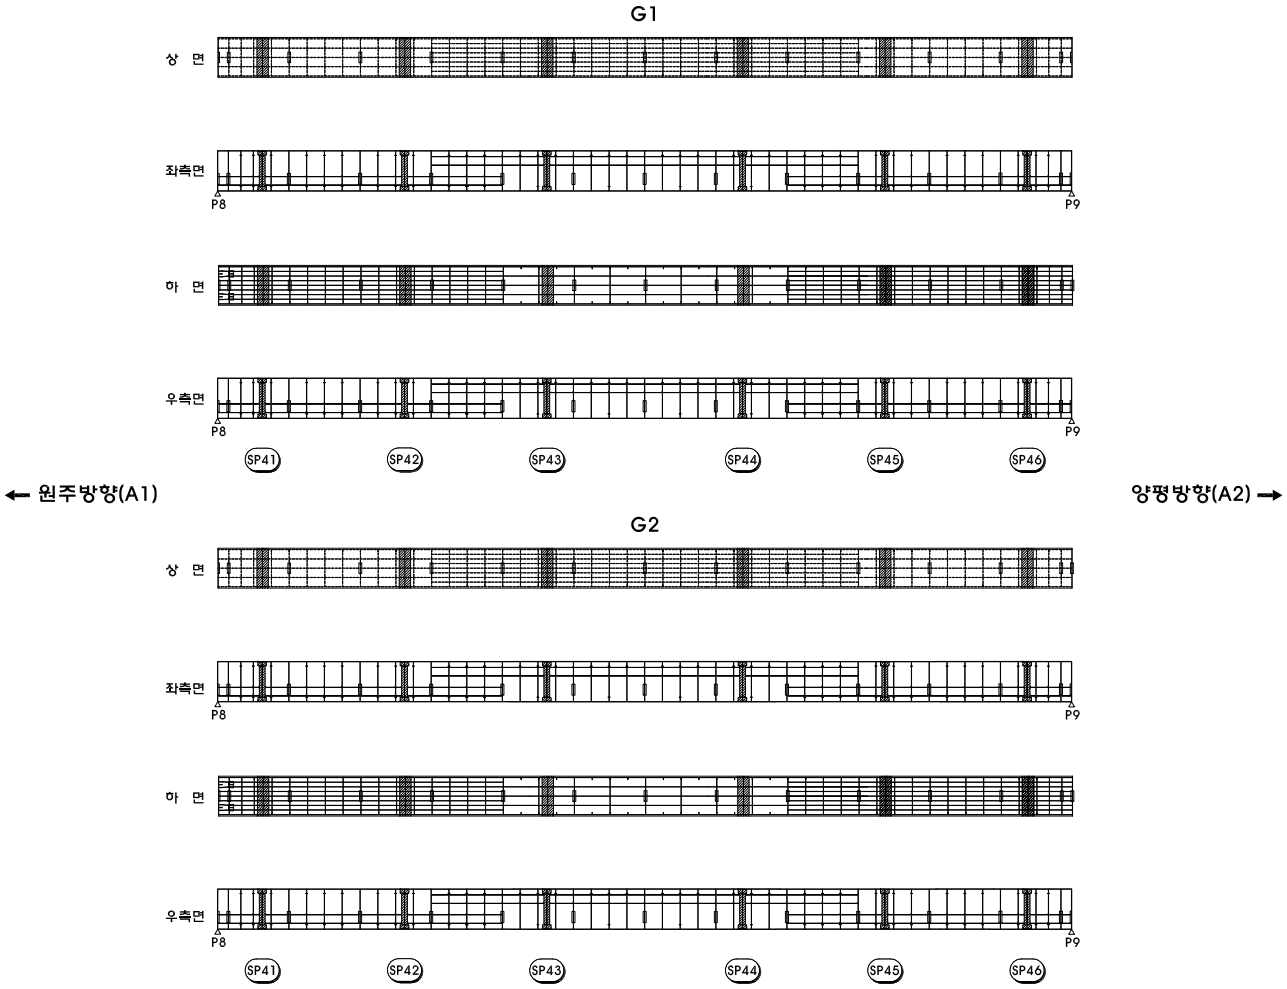

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S9)	외관조사망도	NONE	105

KEY PLAN



횡단면도



범 례



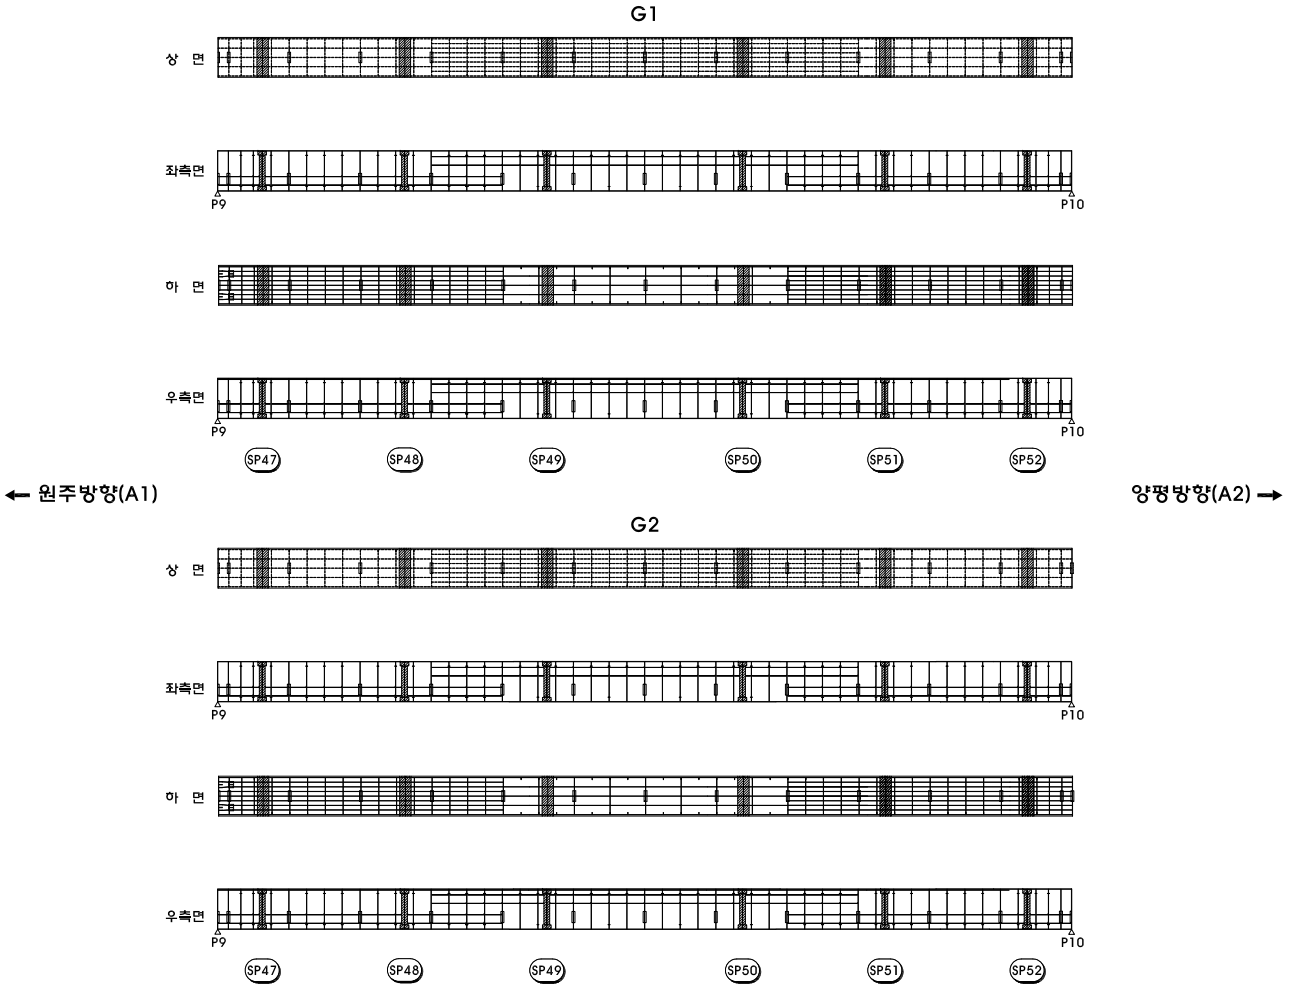

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S10)	외관조사망도	NONE	106

KEY PLAN



횡단면도



범 례



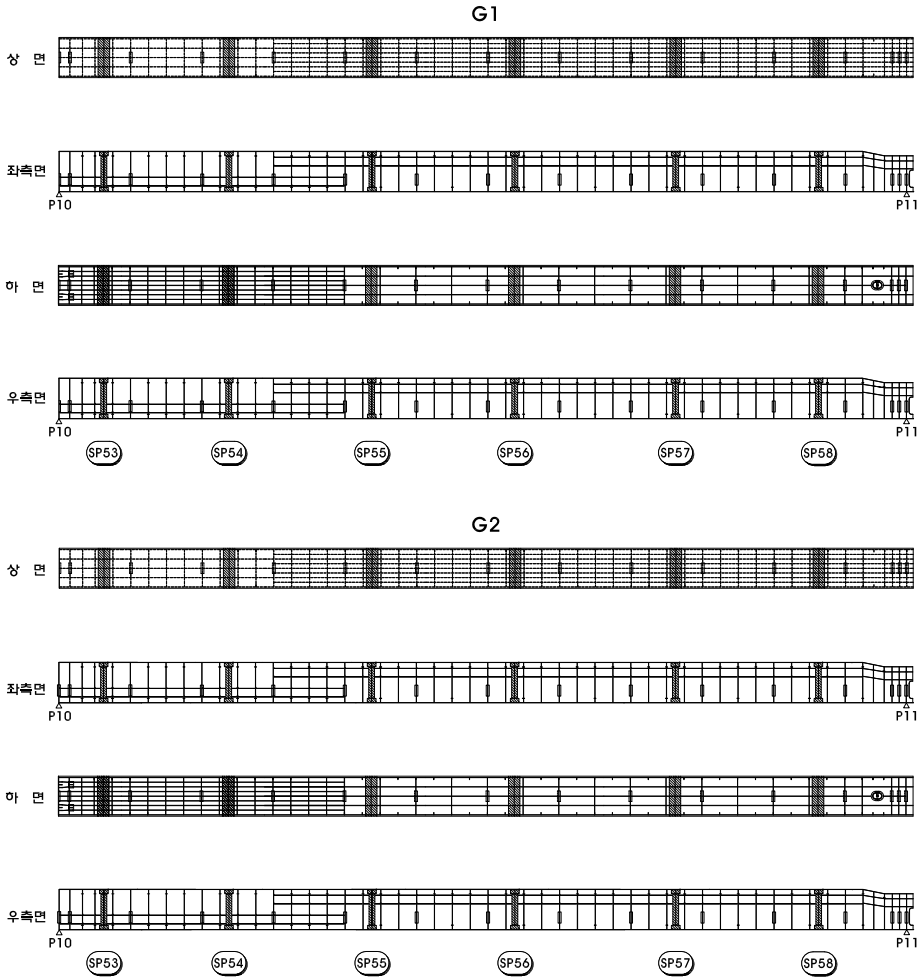

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S11)	외관조사망도	NONE	107

KEY PLAN



횡단면도



범 례



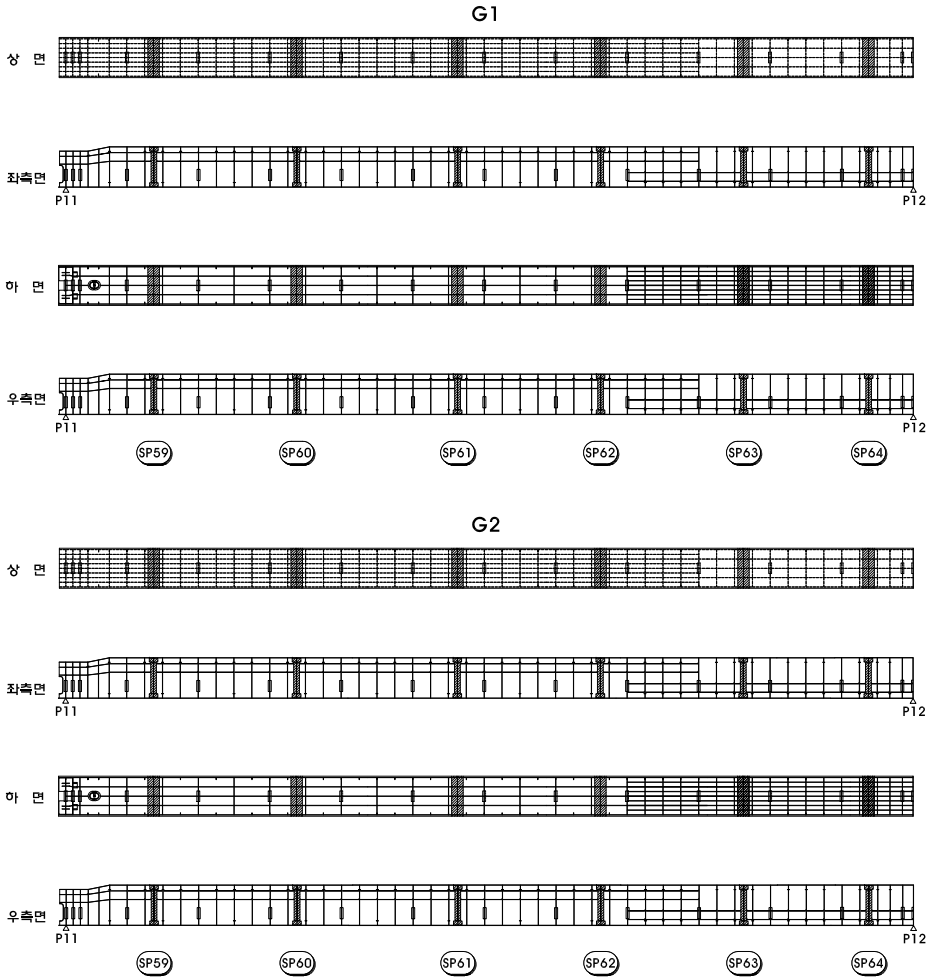

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S12)	외관조사망도	NONE	108

KEY PLAN



횡단면도



범 례



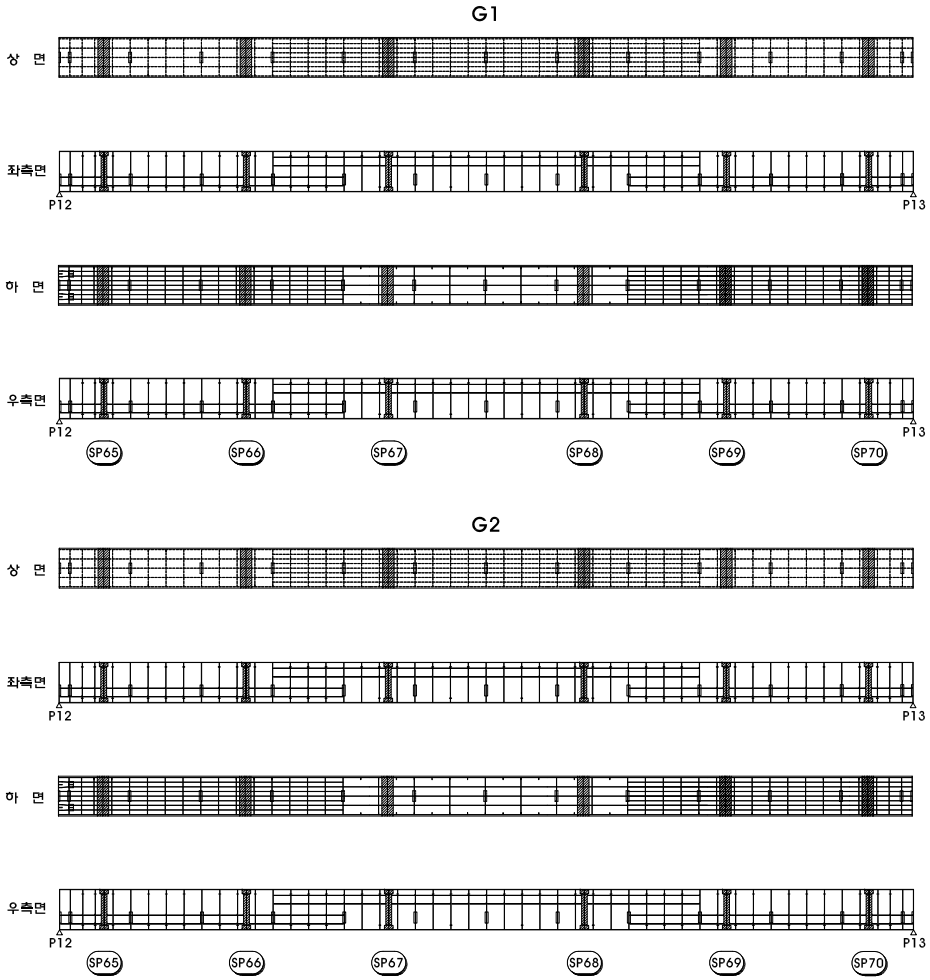

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S13)	외관조사망도	NONE	109

KEY PLAN



횡단면도



범 례



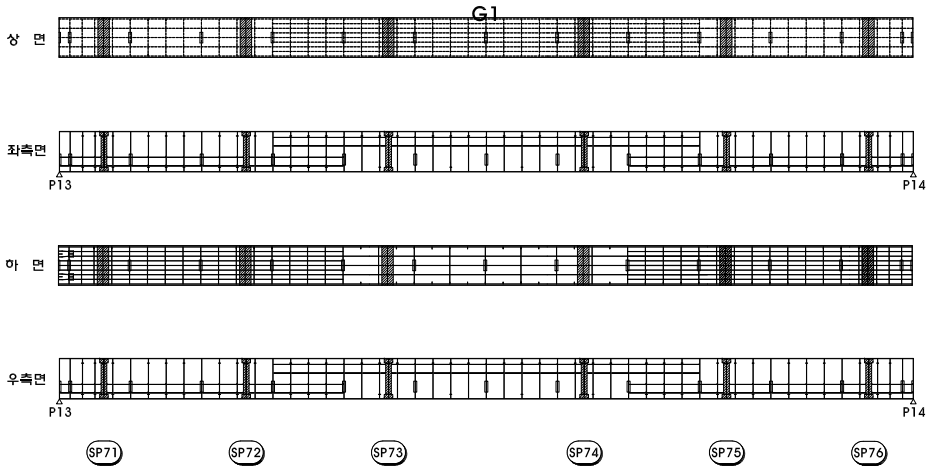

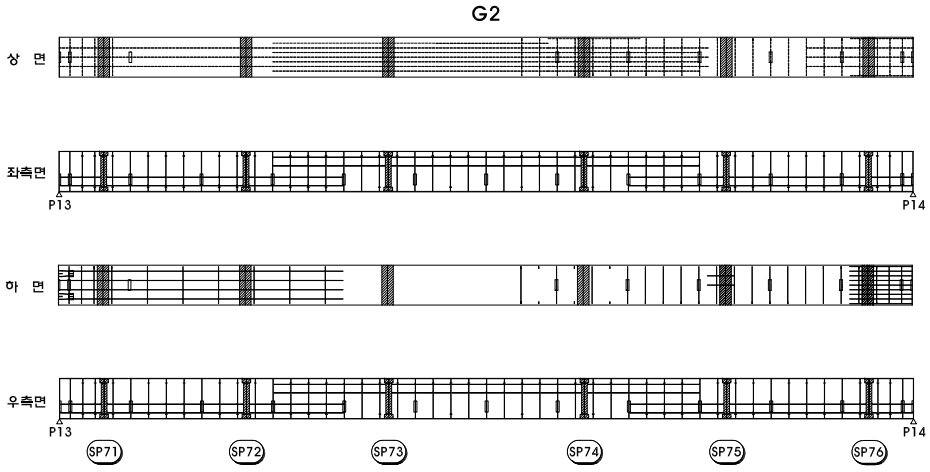

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S14)	외관조사망도	NONE	110

KEY PLAN



횡단면도



범 례



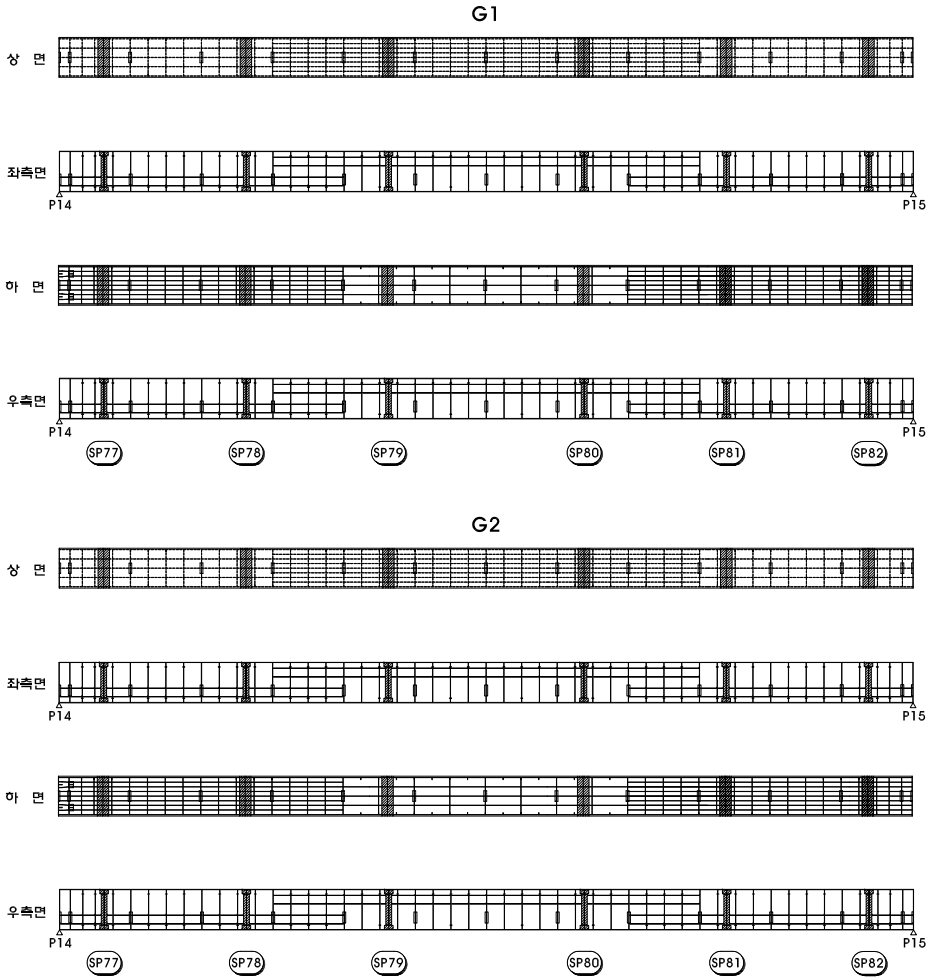

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S15)	외관조사망도	NONE	111

KEY PLAN



횡단면도



범 례



G1

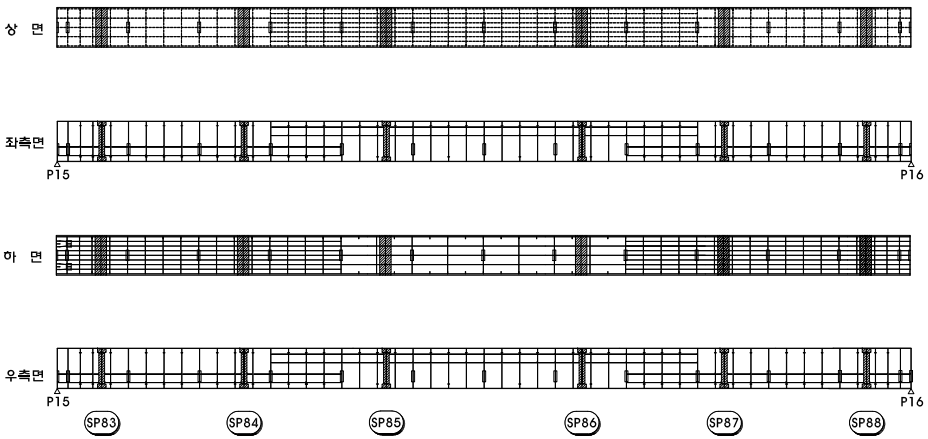

G2

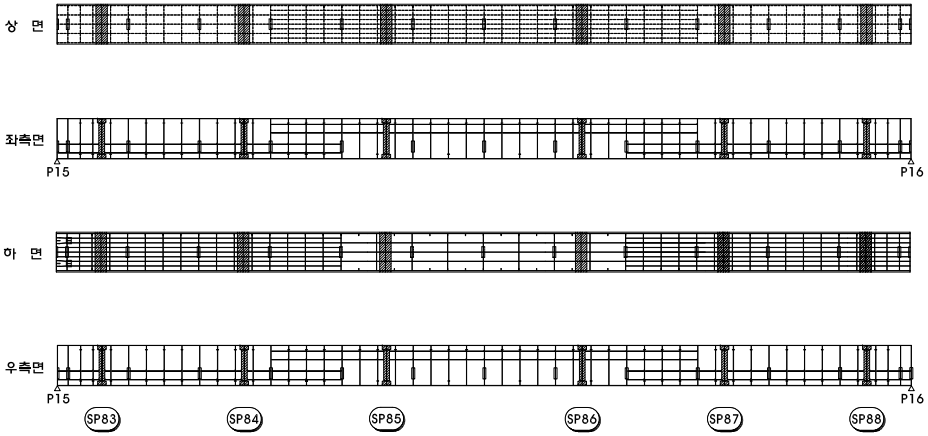

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S16)	외관조사망도	NONE	112

KEY PLAN



횡단면도



범 례



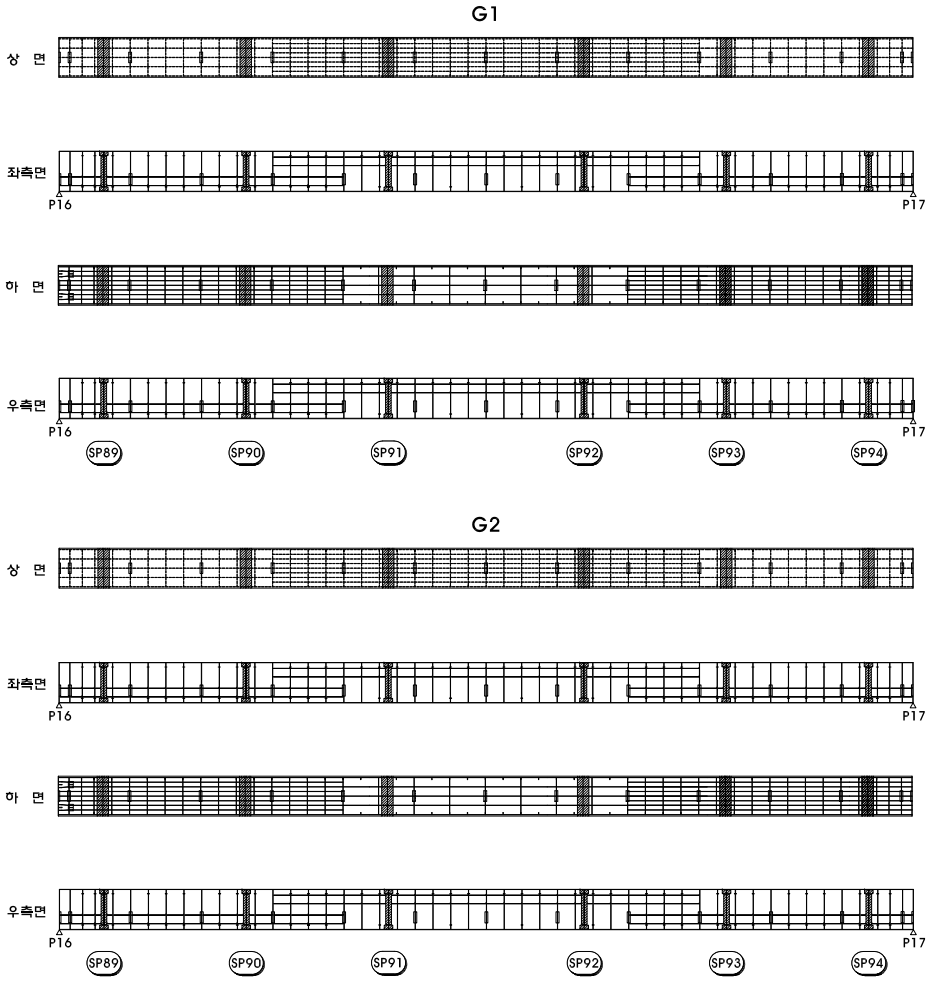

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S17)	외관조사망도	NONE	113

KEY PLAN



횡단면도



범 례



G1

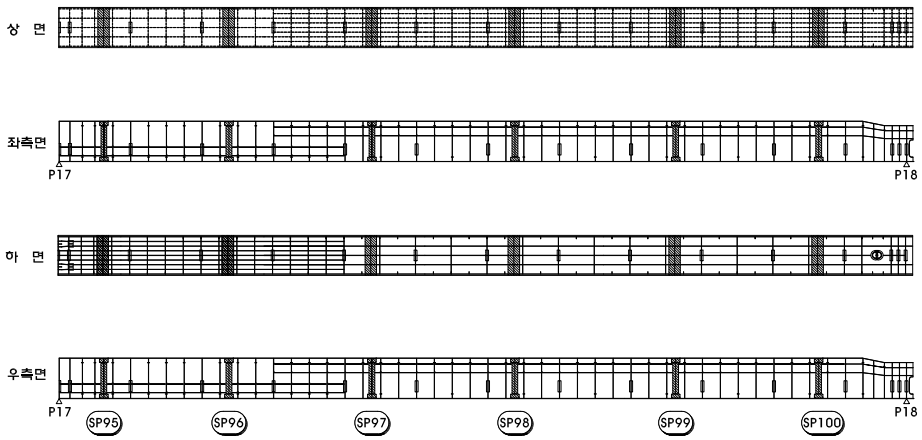

G2

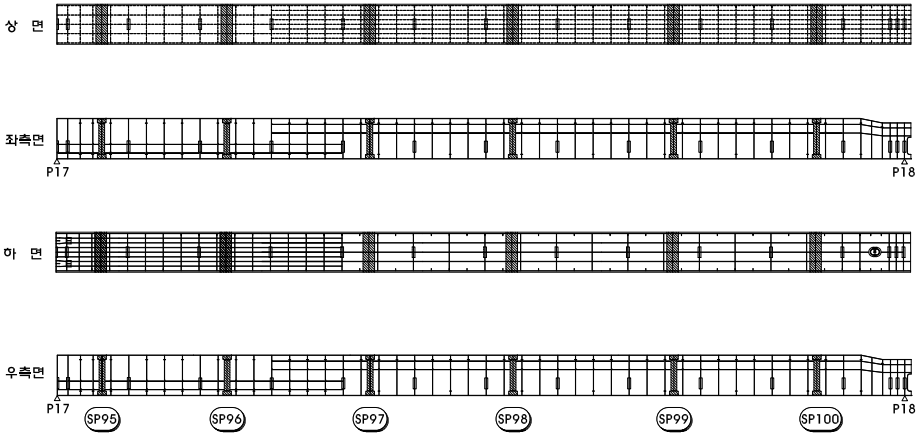

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S18)	외관조사망도	NONE	114

KEY PLAN



횡단면도



범 례



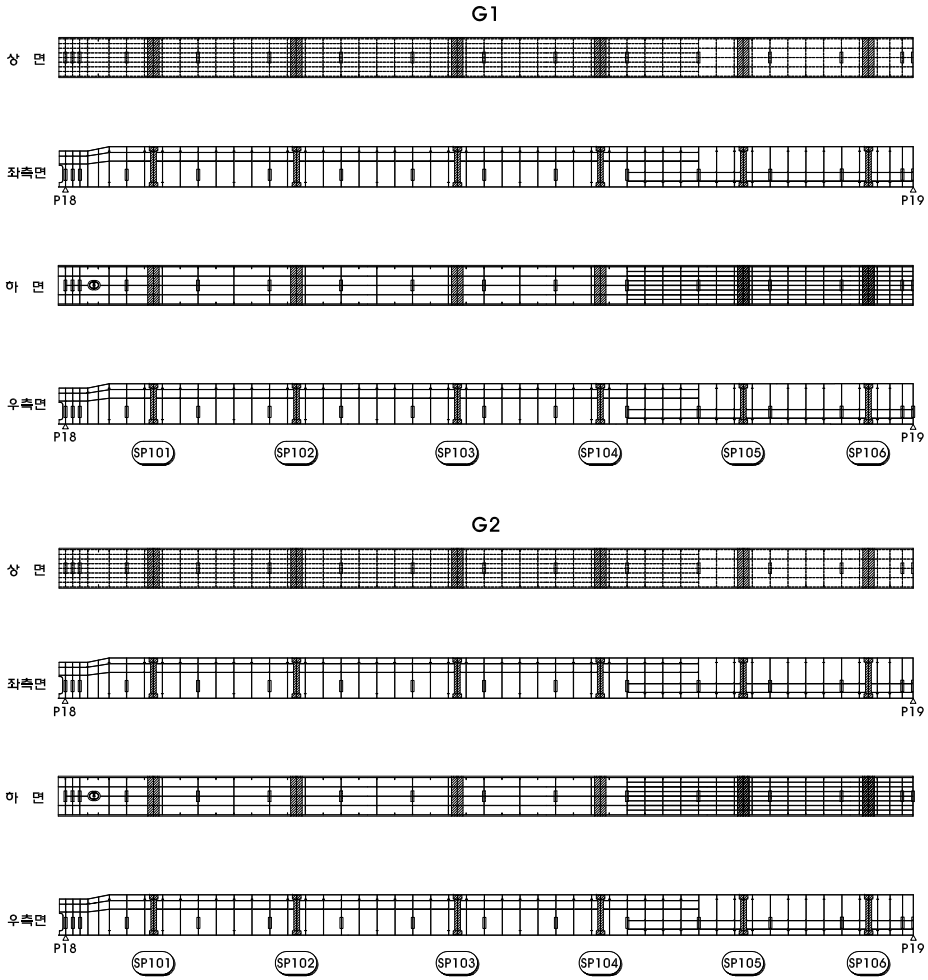

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S19)	외관조사망도	NONE	115

KEY PLAN



횡단면도



범 례



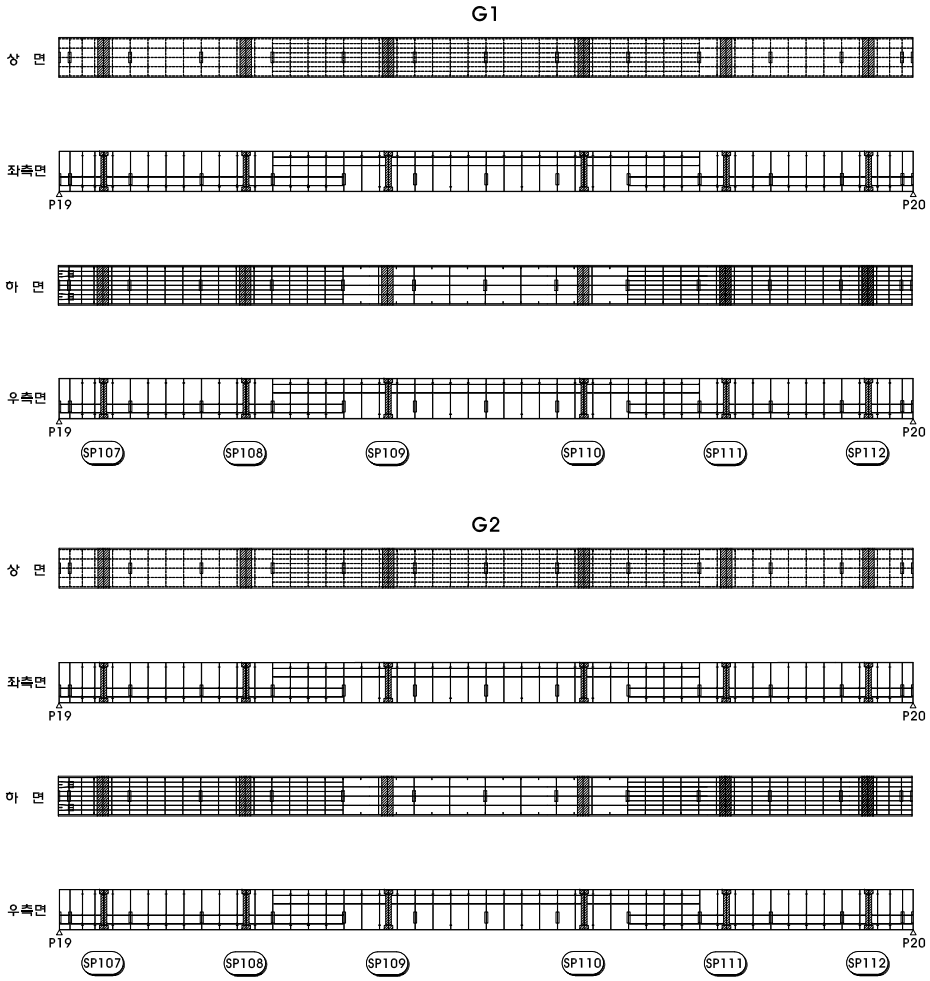

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S20)	외관조사망도	NONE	116

KEY PLAN



횡단면도



범 례



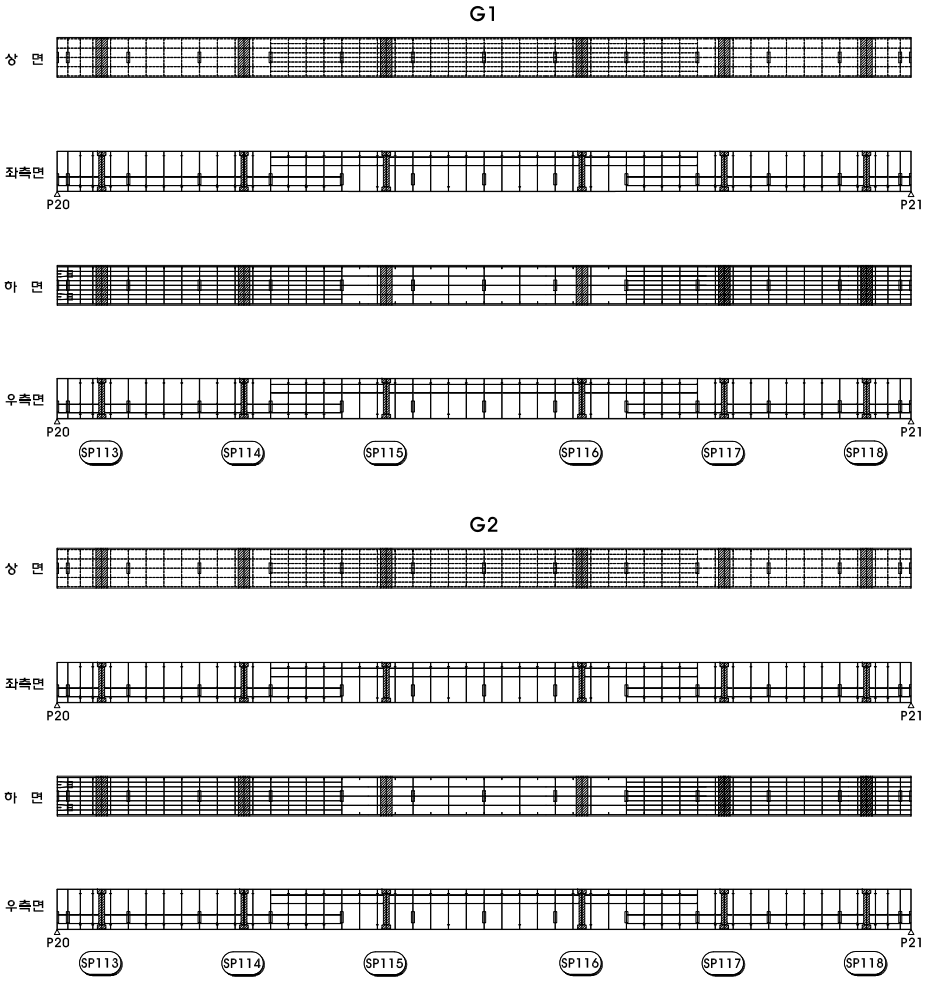

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S21)	외관조사망도	NONE	117

KEY PLAN



횡단면도



범 례



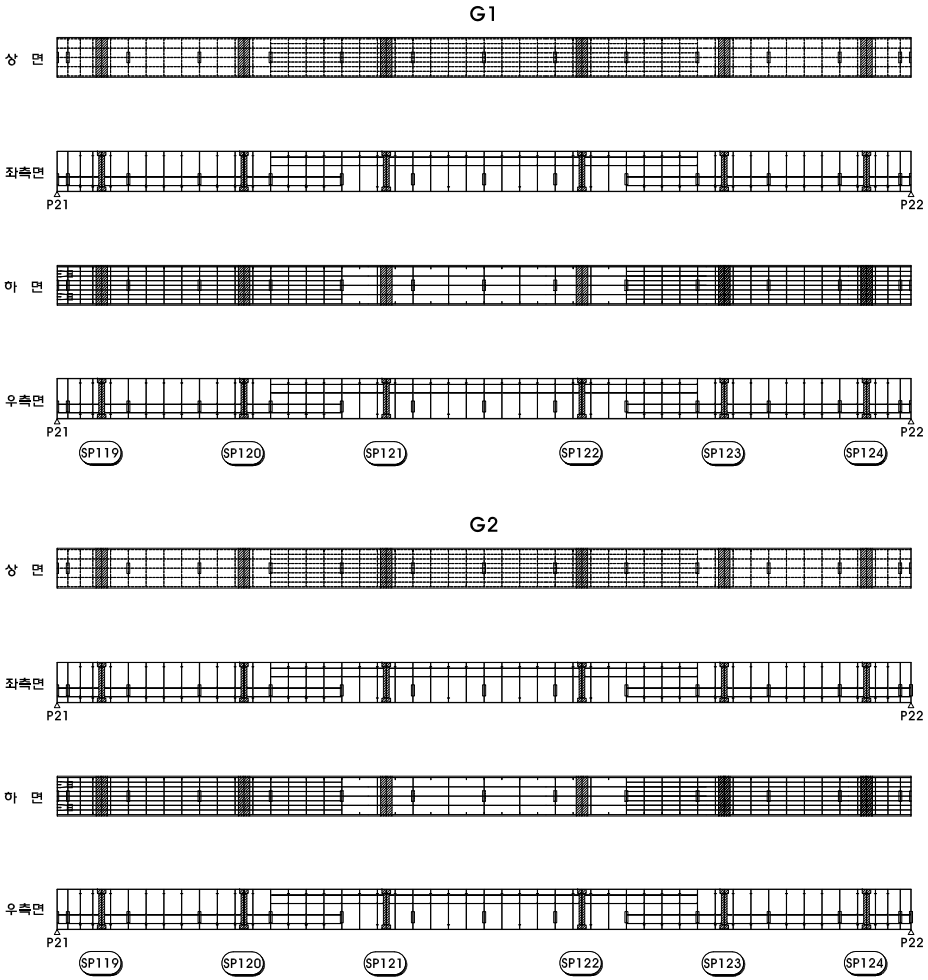

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S22)	외관조사망도	NONE	118

KEY PLAN



횡단면도



범 례



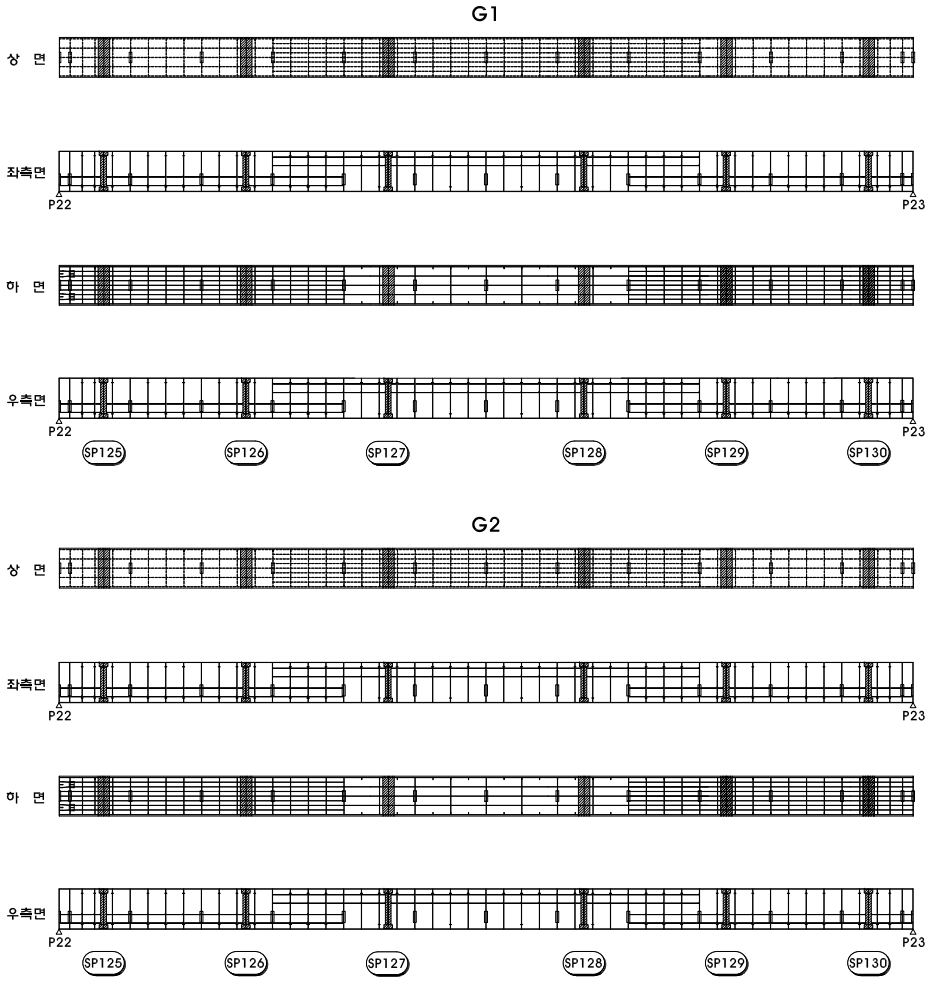

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S23)	외관조사망도	NONE	119

KEY PLAN



횡단면도



범 례



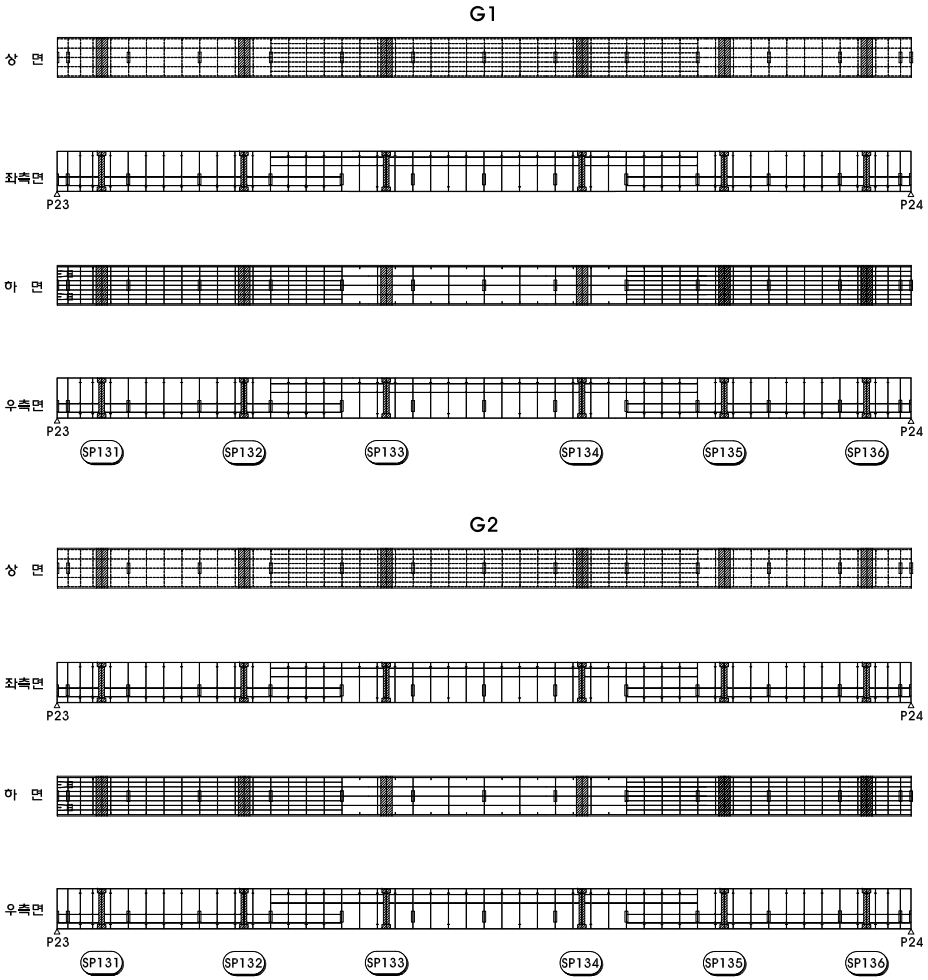

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S24)	외관조사망도	NONE	120

KEY PLAN



횡단면도



범 례



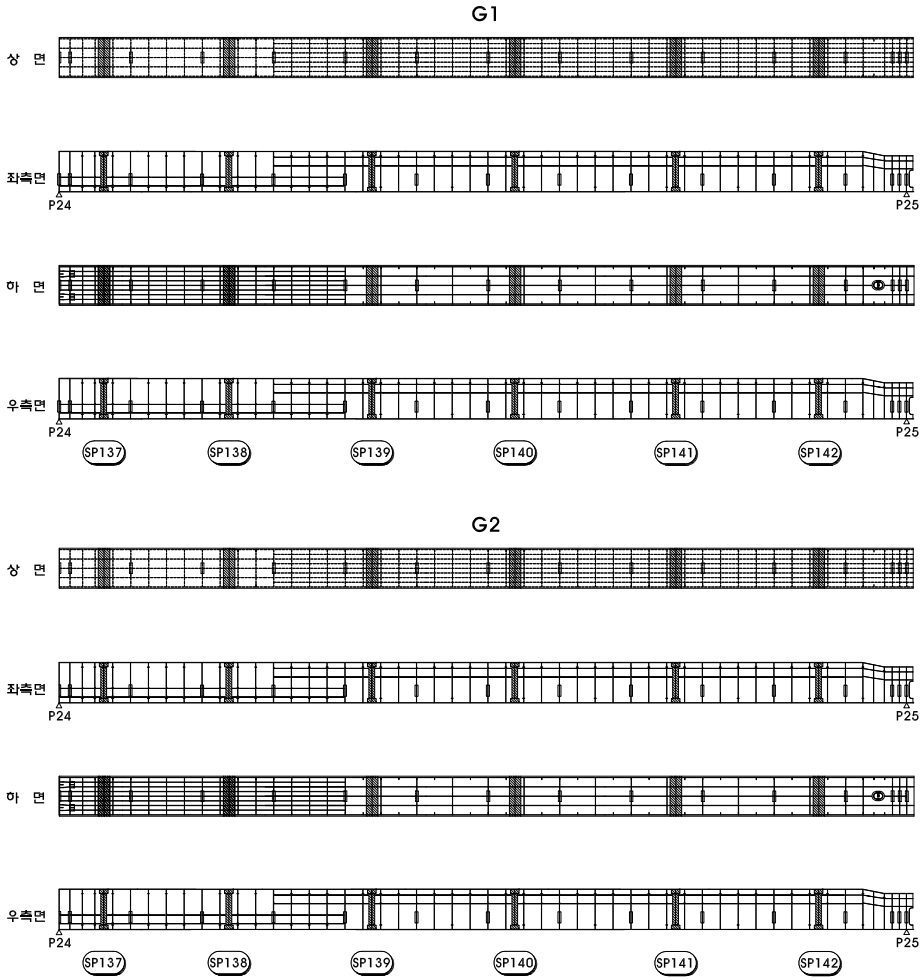

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S25)	외관조사망도	NONE	121

KEY PLAN



횡단면도



범 례



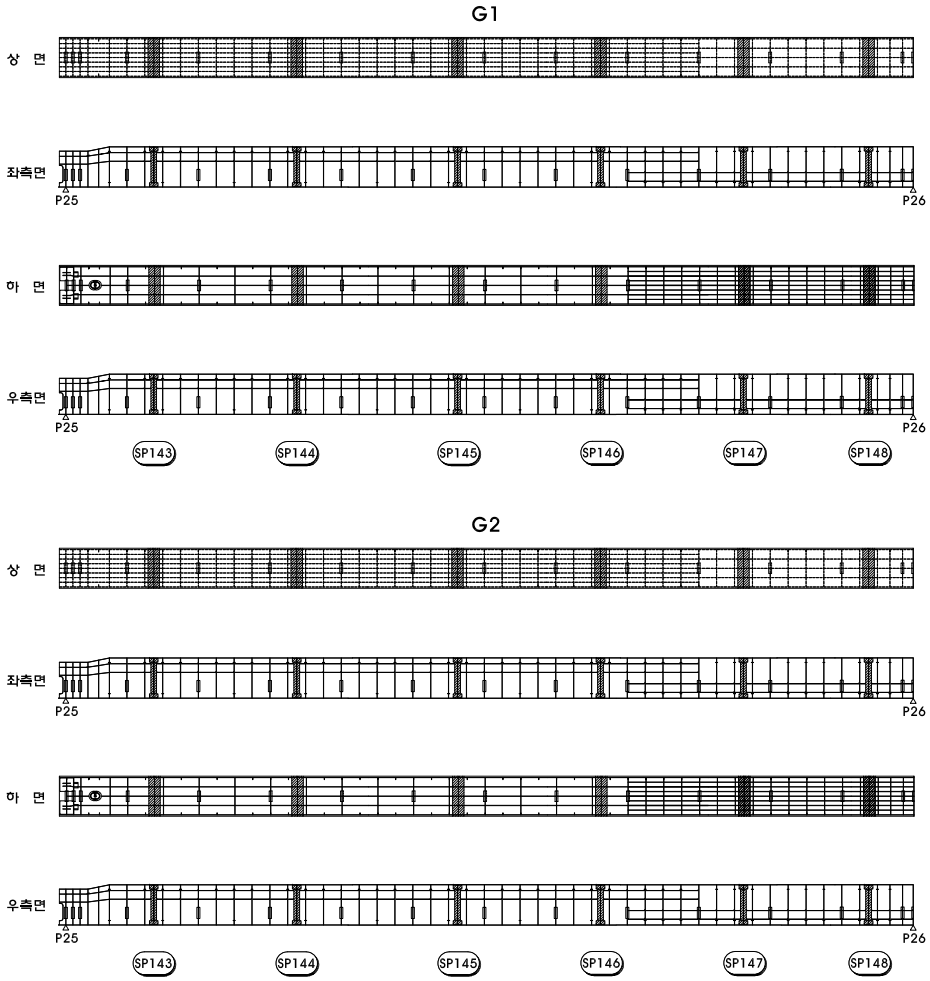

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S26)	외관조사망도	NONE	122

KEY PLAN



횡단면도



범 례



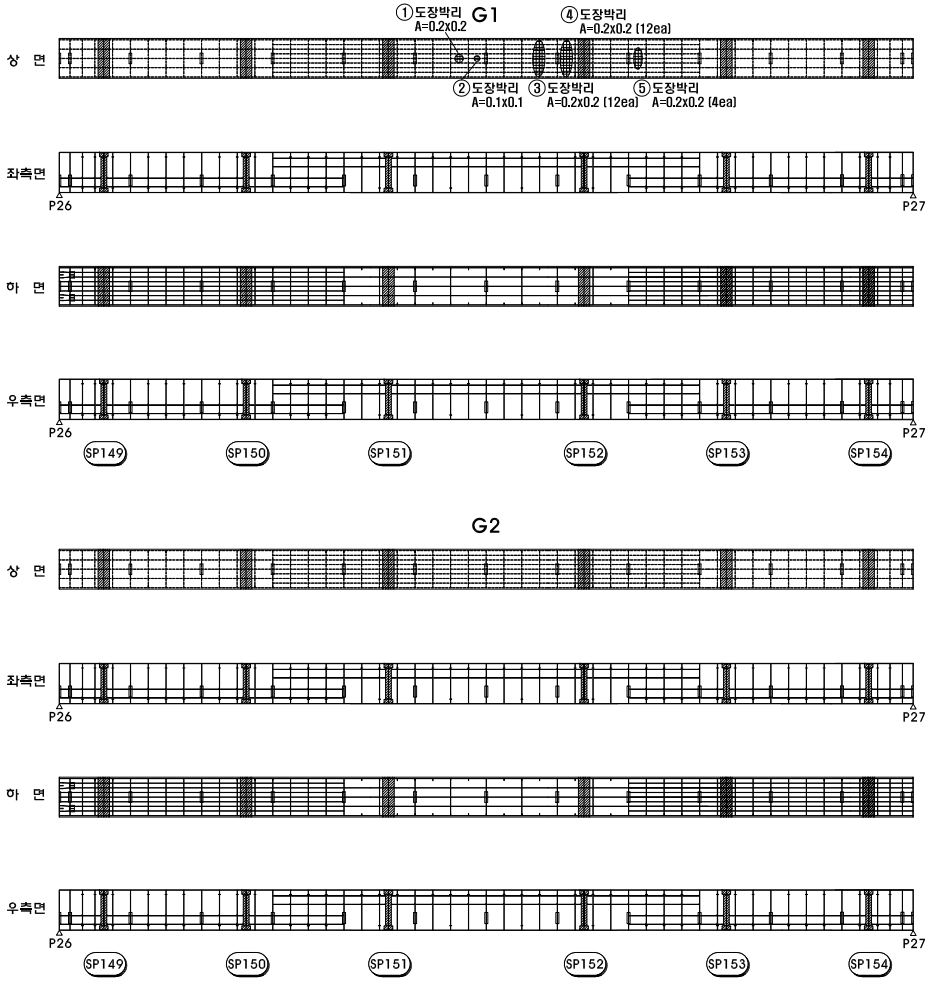

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	강재주형 내부	도장박리		0.20	0.20	0.04		
2	강재주형 내부	도장박리		0.10	0.10	0.01		
3	강재주형 내부	도장박리		0.20	0.20	0.48	12	
4	강재주형 내부	도장박리		0.20	0.20	0.48	12	
5	강재주형 내부	도장박리		0.20	0.20	0.16	4	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S27)	외관조사망도	NONE	123

KEY PLAN



횡단면도



범 례



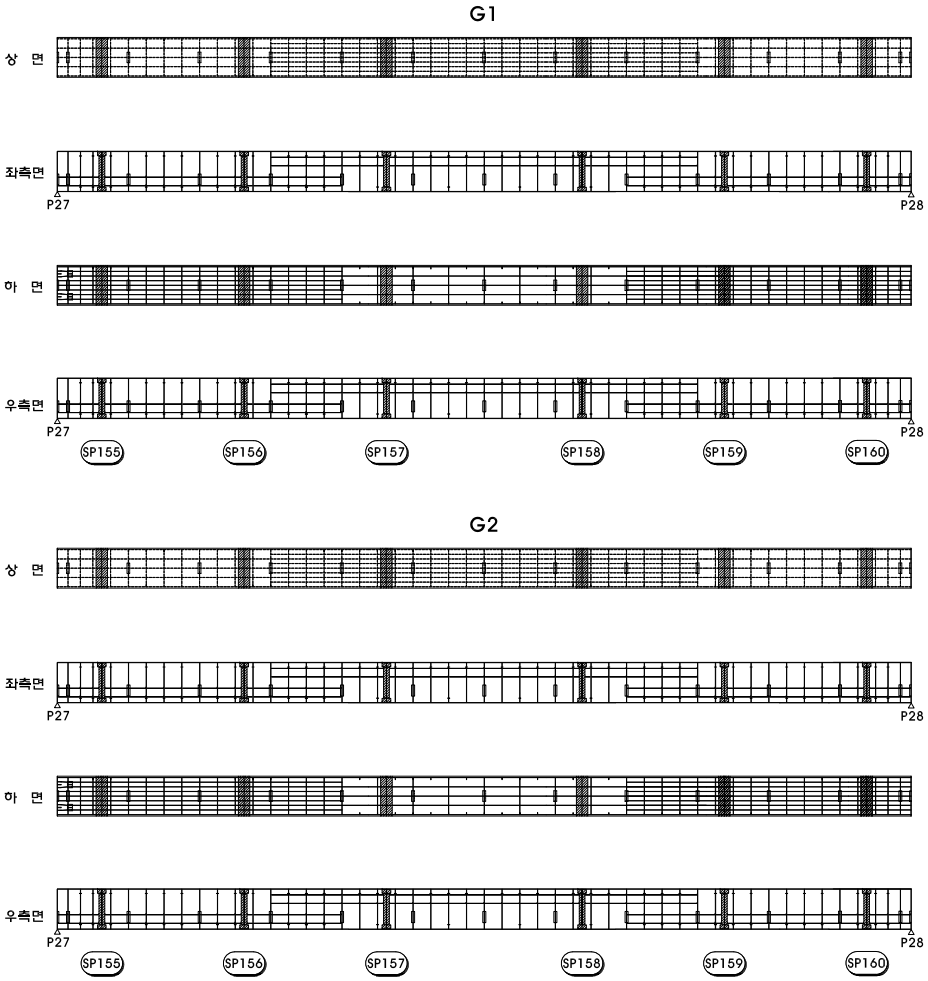

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S28)	외관조사망도	NONE	124

KEY PLAN



횡단면도



범 례



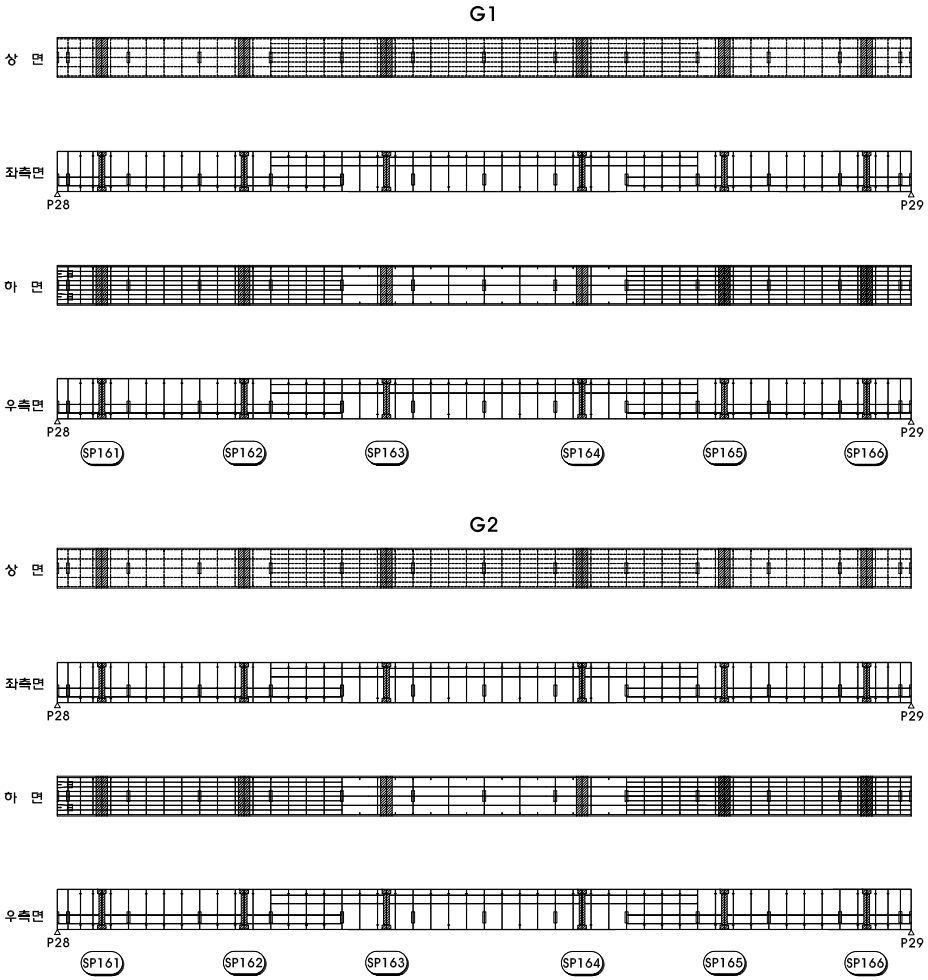

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S29)	외관조사망도	NONE	125

KEY PLAN



횡단면도



범 례



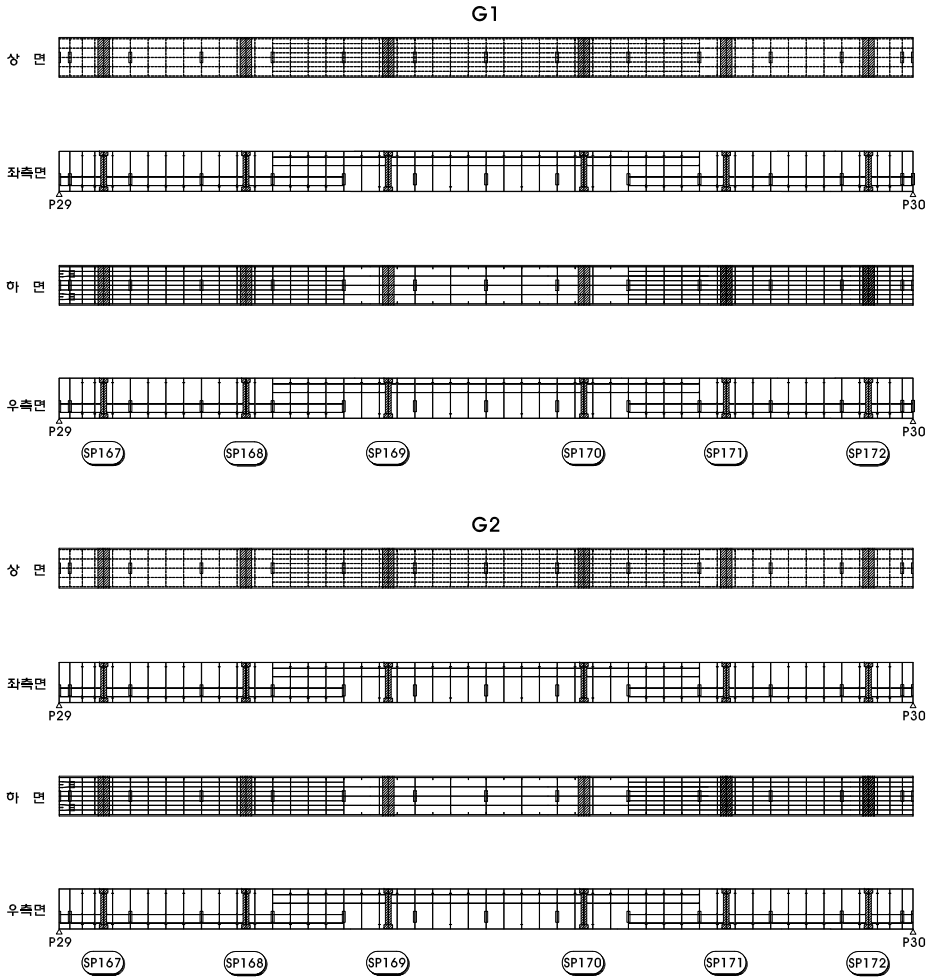

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S30)	외관조사망도	NONE	126

KEY PLAN



횡단면도



범 례



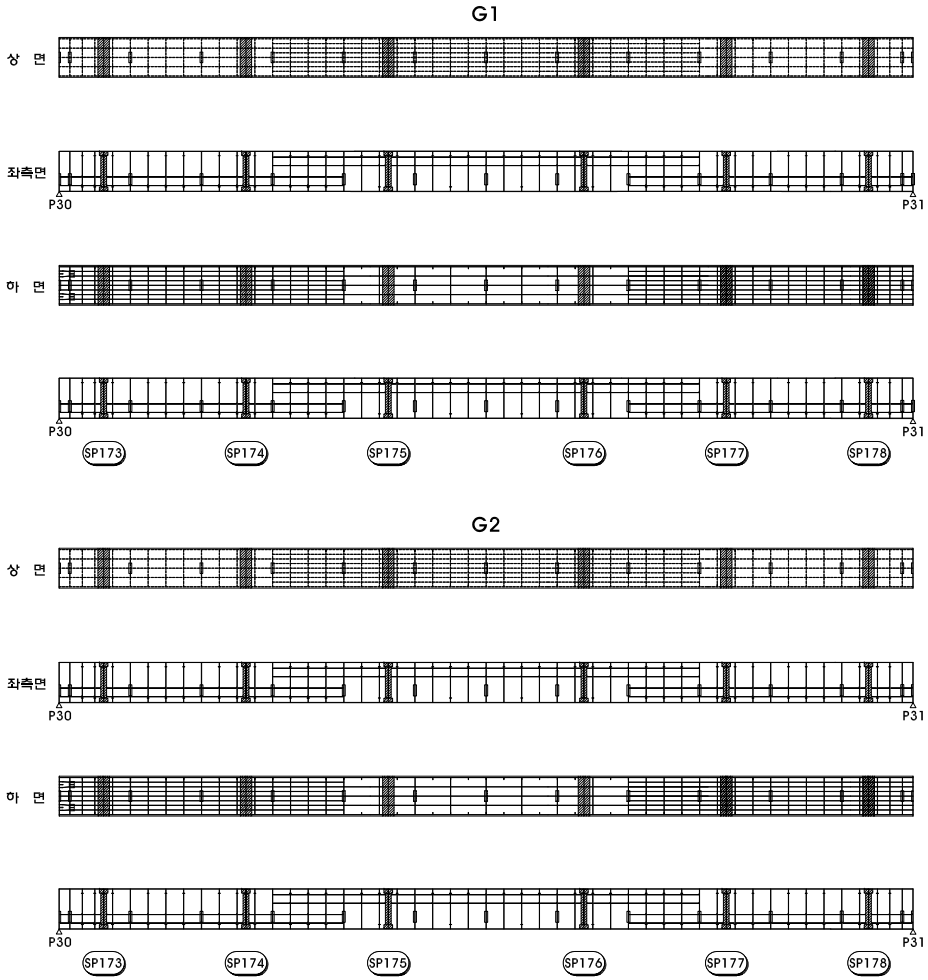

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S31)	외관조사망도	NONE	127

KEY PLAN



횡단면도



범 례



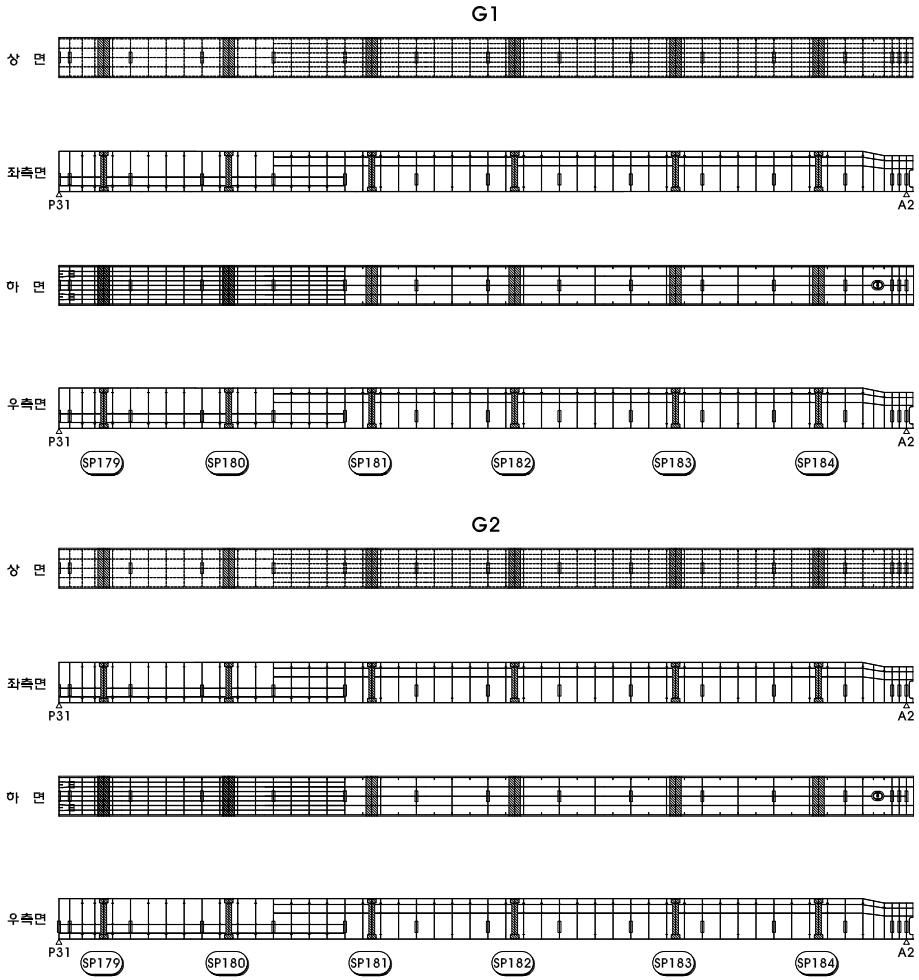

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 강재주형 내부 (S32)	외관조사망도	NONE	128

KEY PLAN



범 례



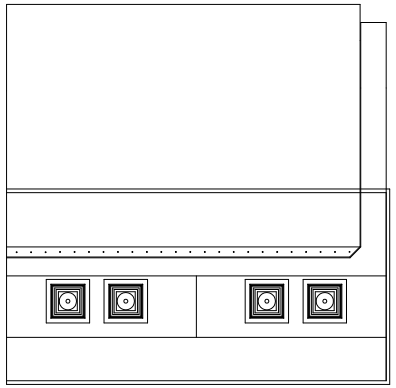

평 면

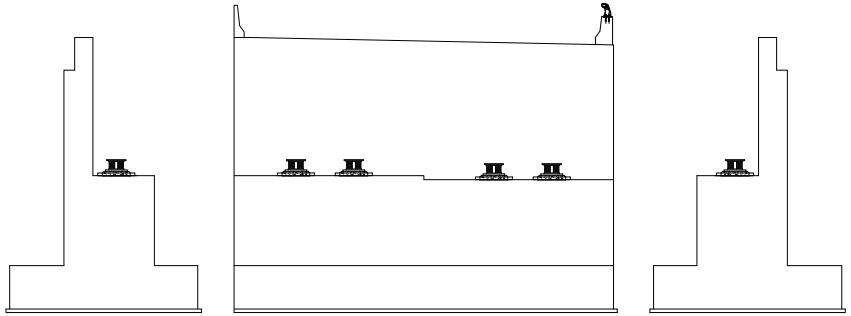

좌측면 정 면 우측면

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교대 (A1)	외관조사망도	NONE	129

KEY PLAN



범 례



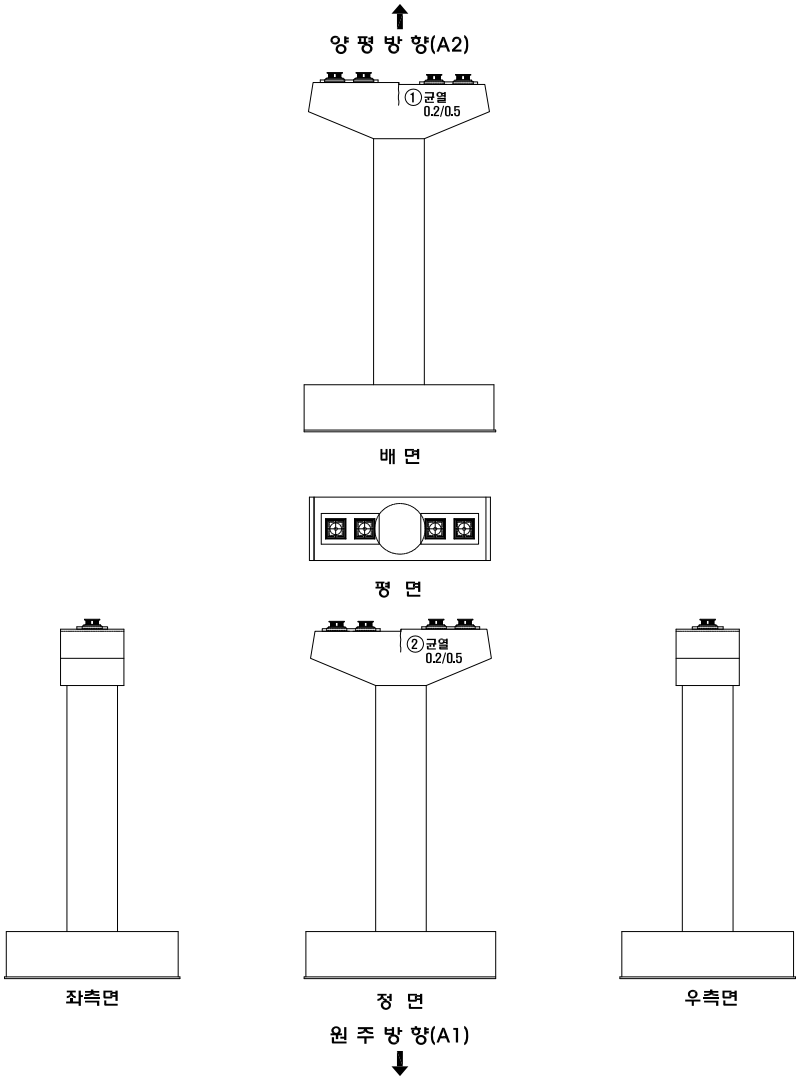

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P1)	외관조사망도	NONE	130

KEY PLAN



범 례



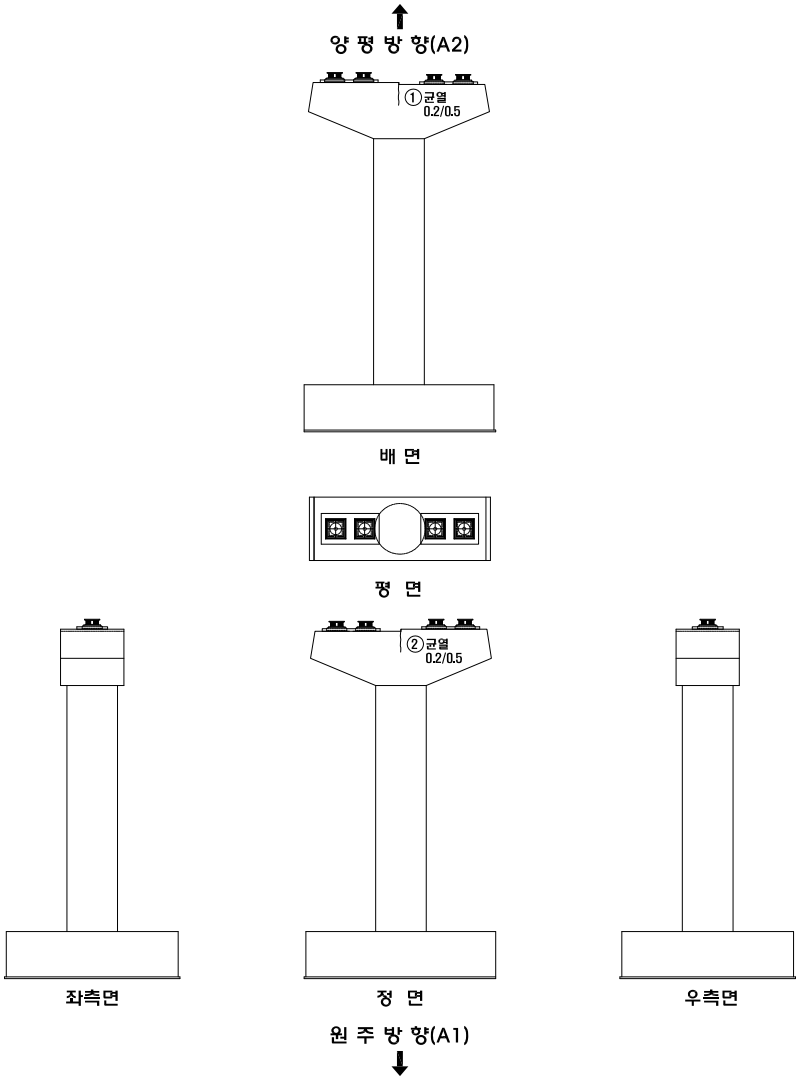

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P2)	외관조사망도	NONE	131

KEY PLAN



범 례



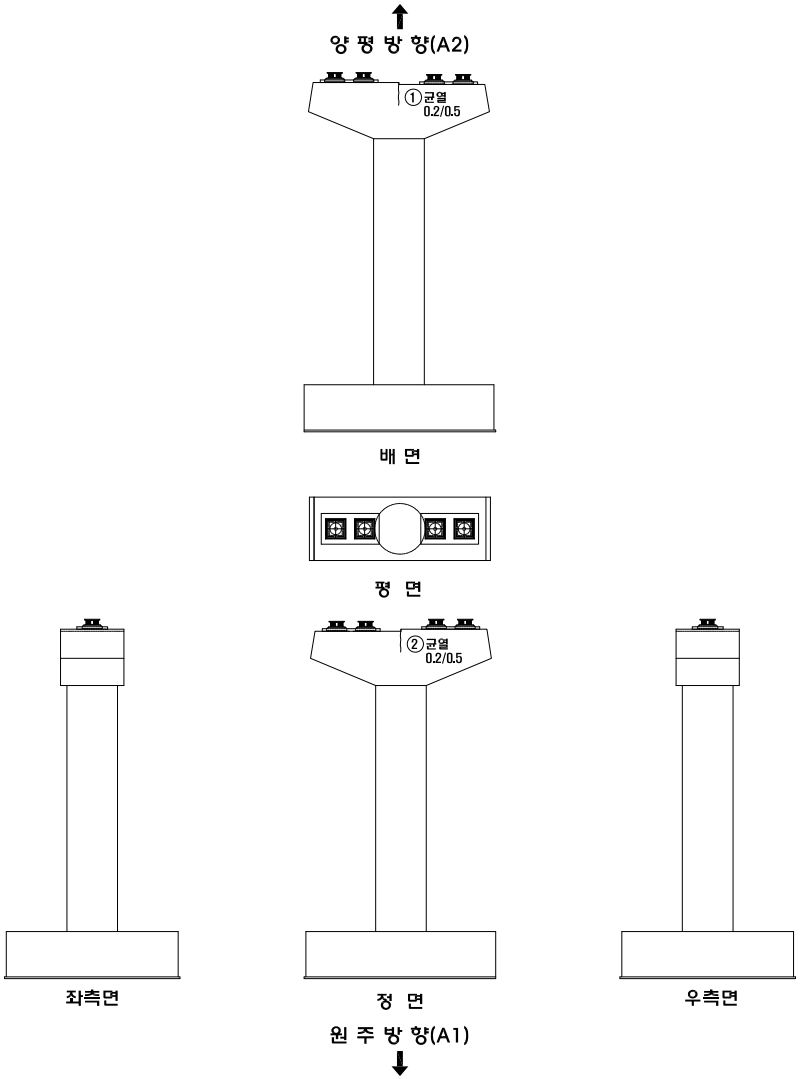

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P3)	외관조사망도	NONE	132

KEY PLAN



범 례



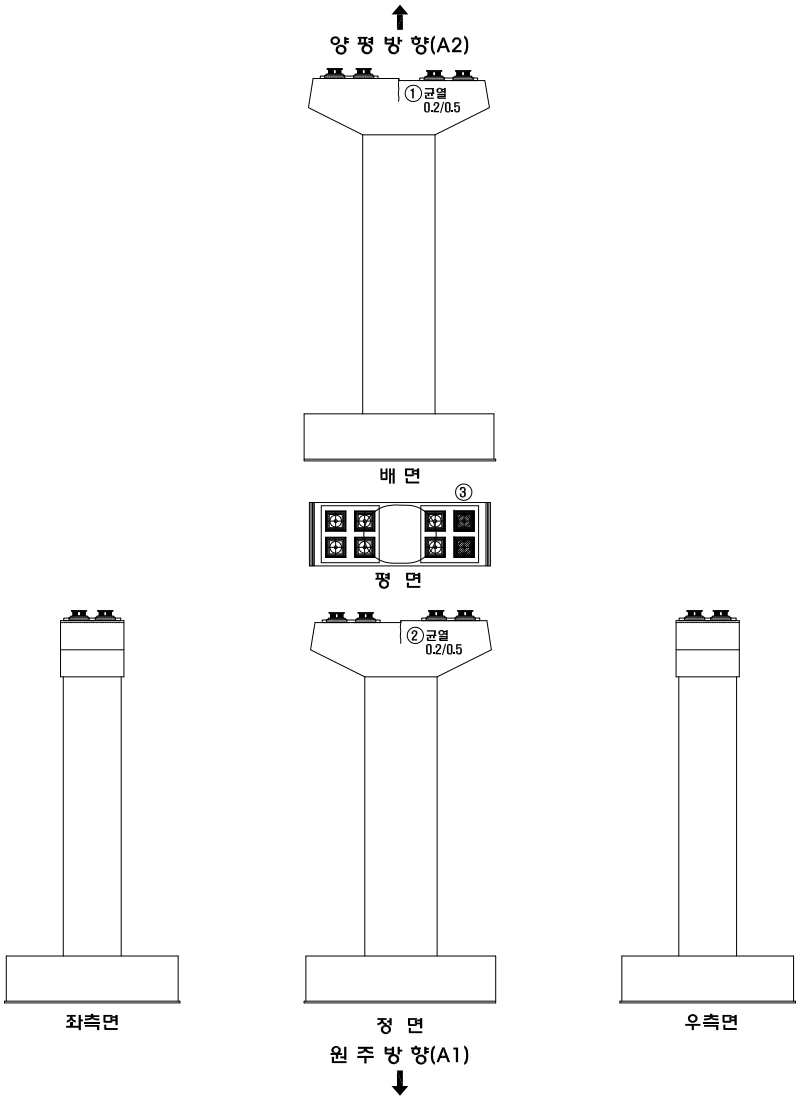

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	
3	교각	SOLE PLATE 부식					2	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P4)	외관조사망도	NONE	133

KEY PLAN



범 례



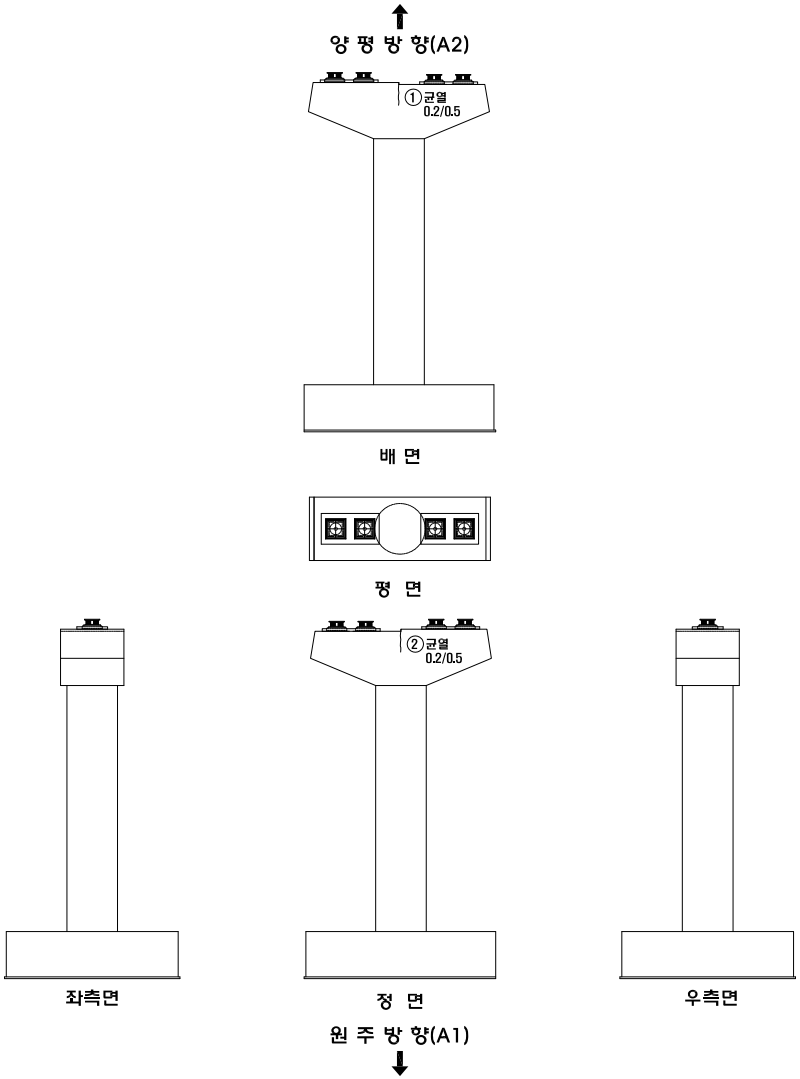

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P5)	외관조사망도	NONE	134

KEY PLAN



범 례



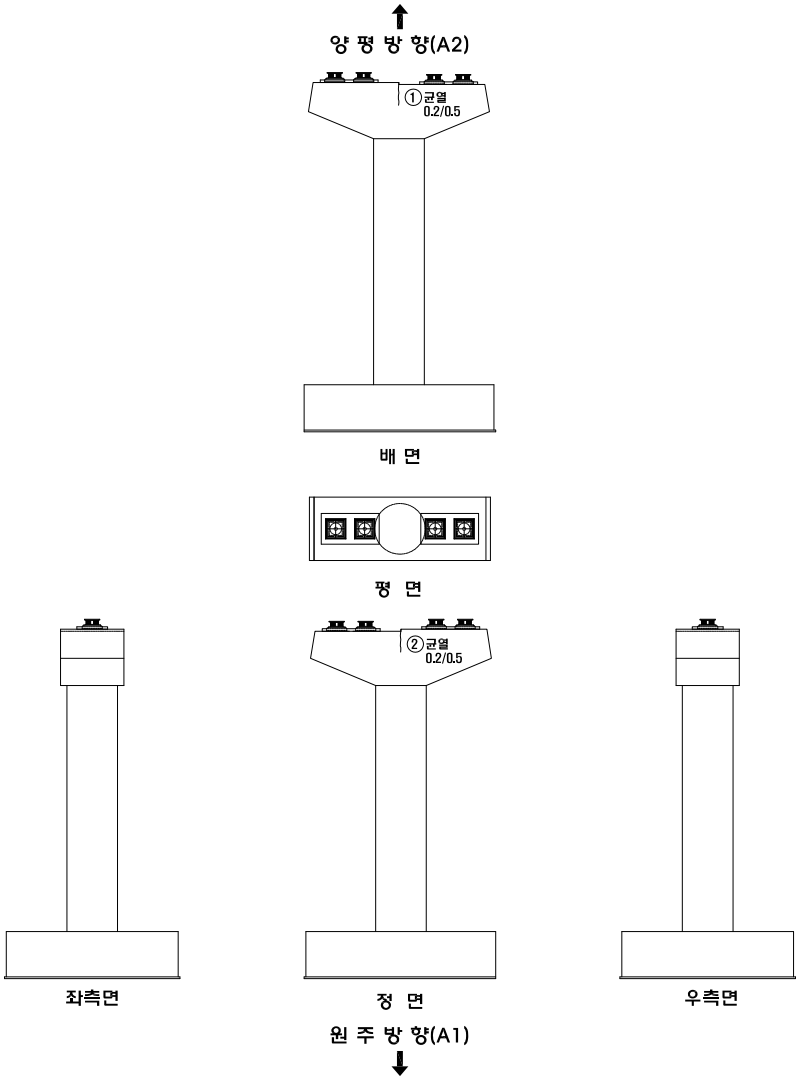

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P6)	외관조사망도	NONE	135

KEY PLAN



범 례



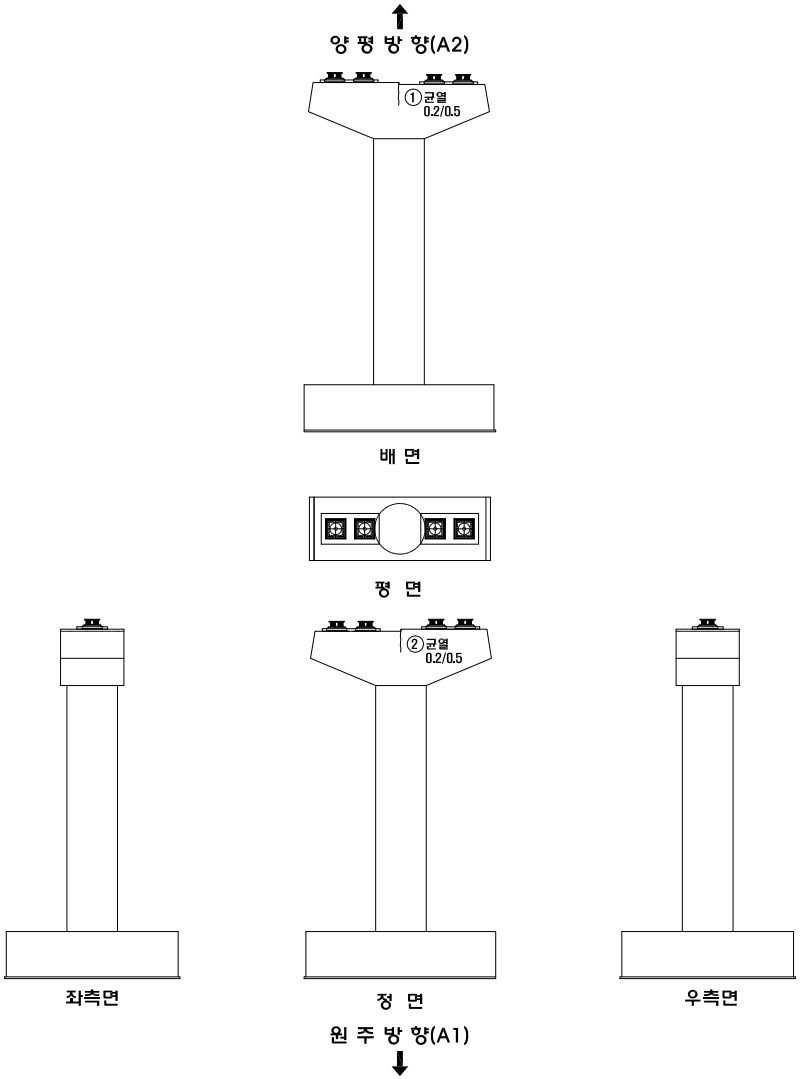

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P7)	외관조사망도	NONE	136

KEY PLAN



범 례



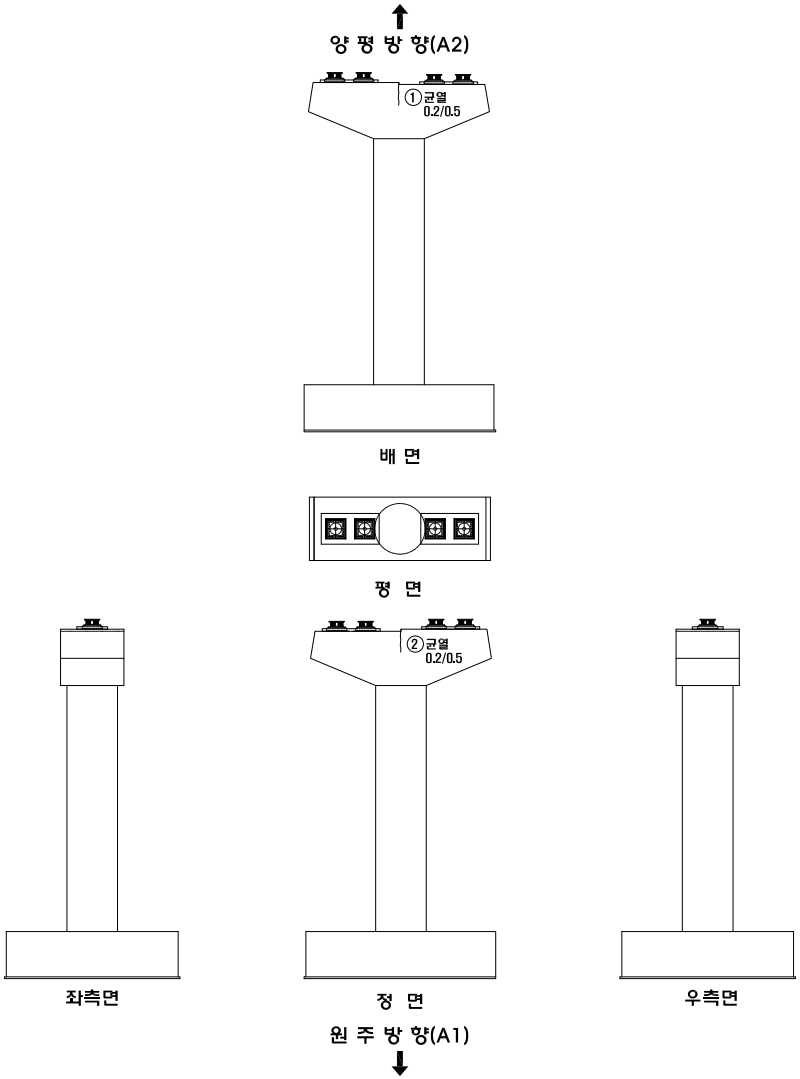

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P8)	외관조사망도	NONE	137

KEY PLAN



범 례



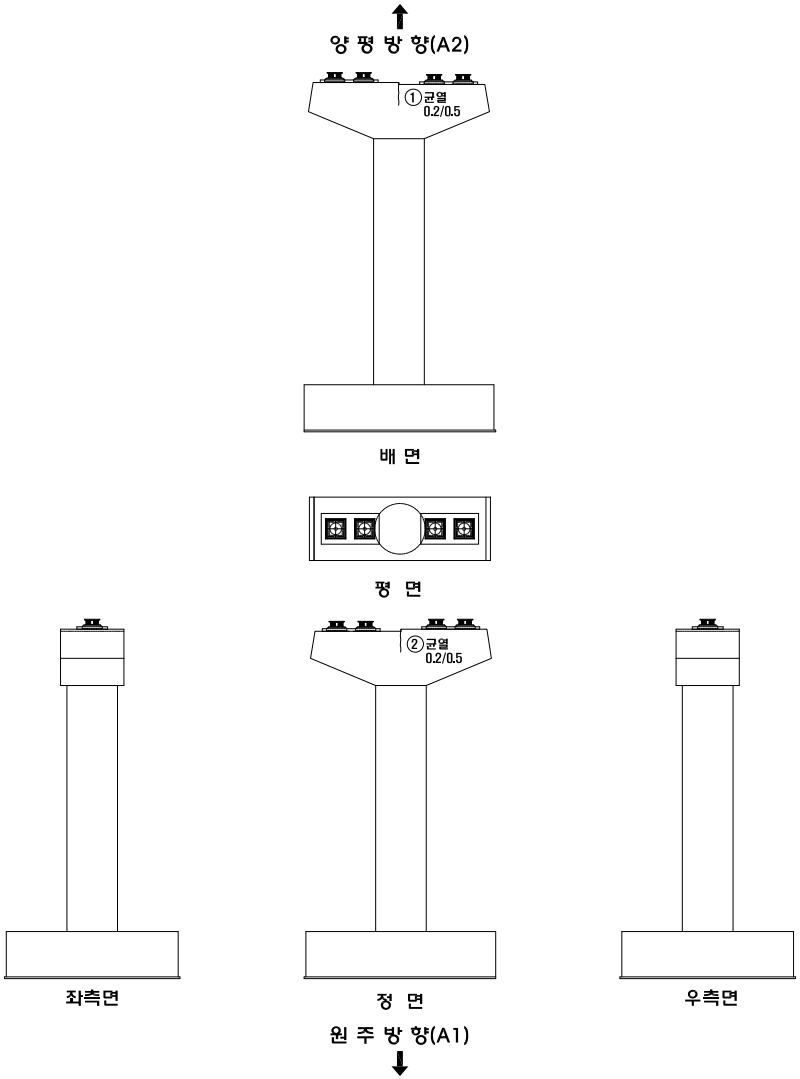

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P9)	외관조사망도	NONE	138

KEY PLAN



범 례



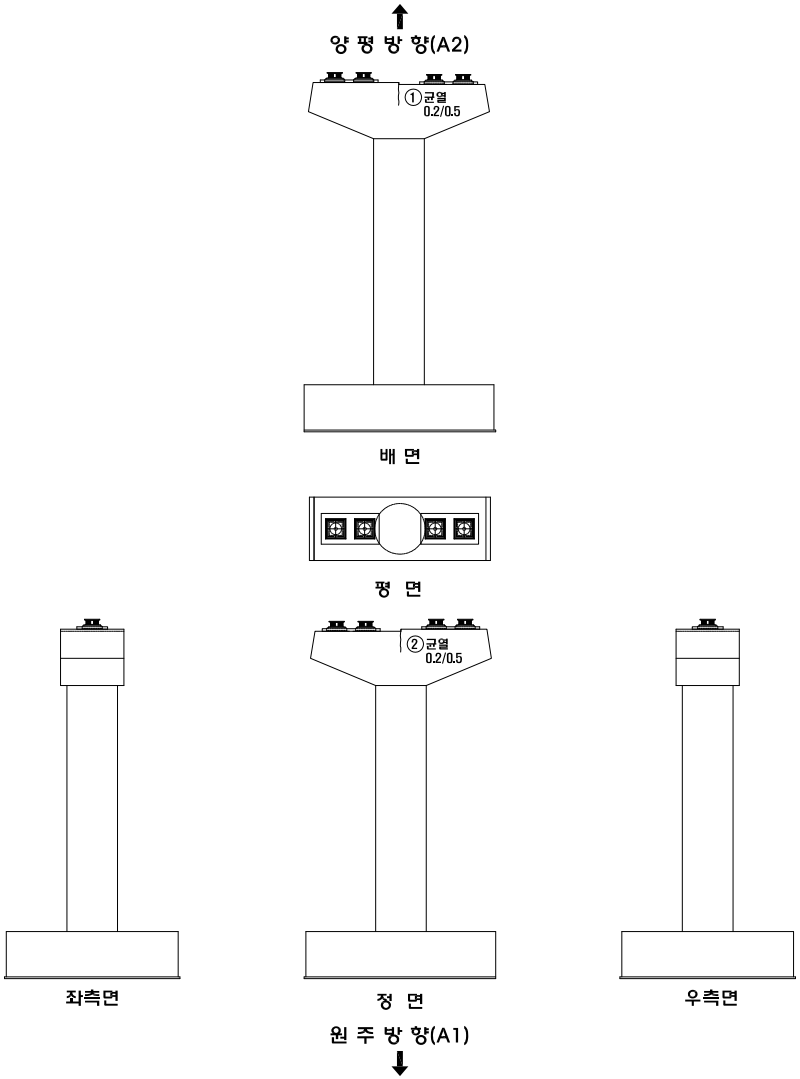

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P10)	외관조사망도	NONE	139

KEY PLAN



범 례



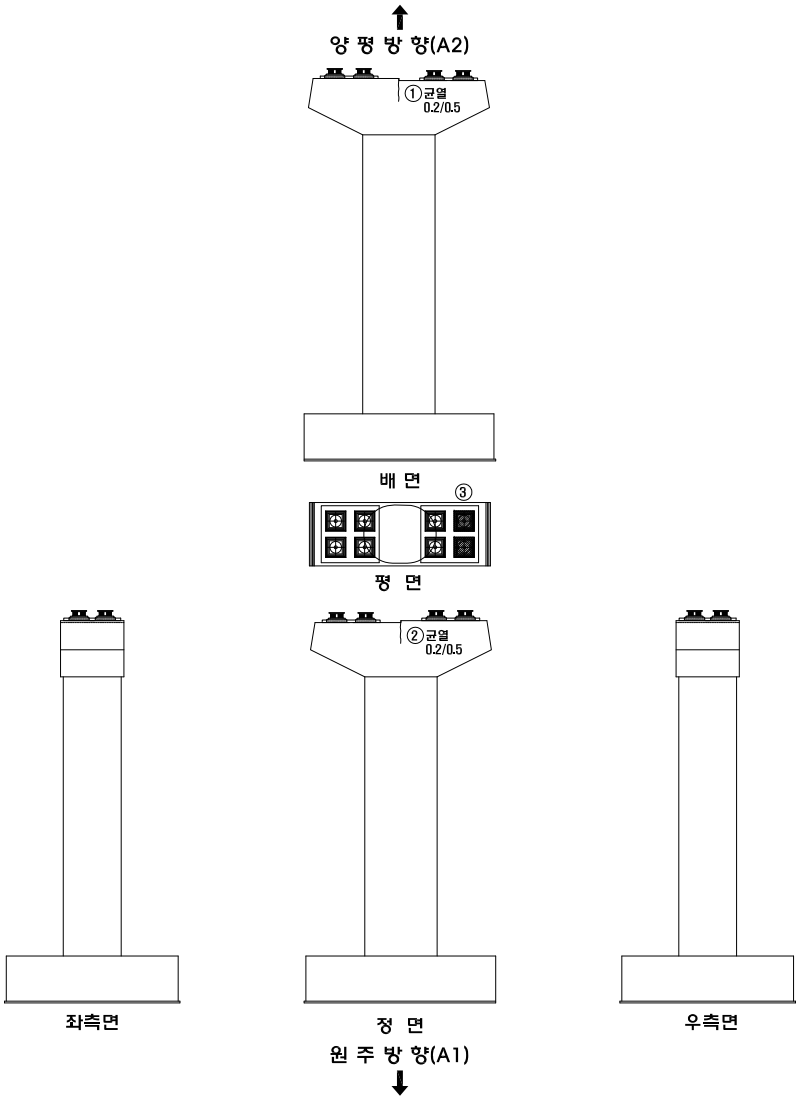

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	
3	교각	SOLE PLATE 부식					2	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P11)	외관조사망도	NONE	140

KEY PLAN



범 례



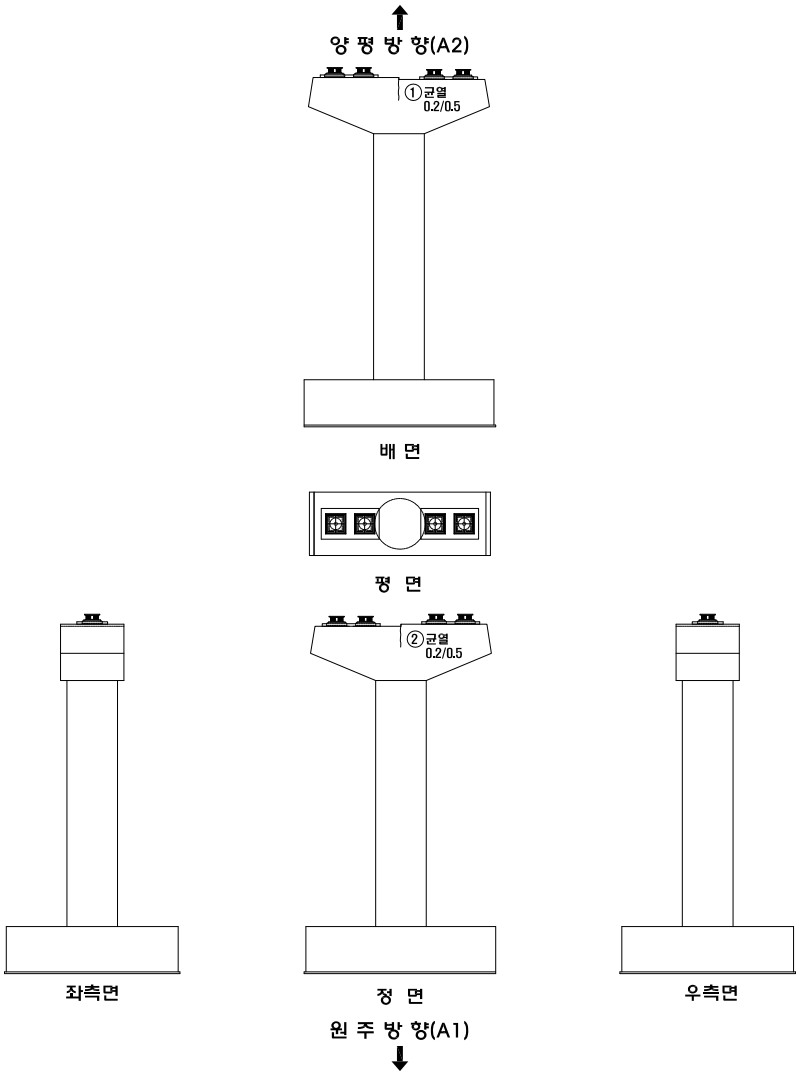

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P12)	외관조사망도	NONE	141

KEY PLAN



범 례



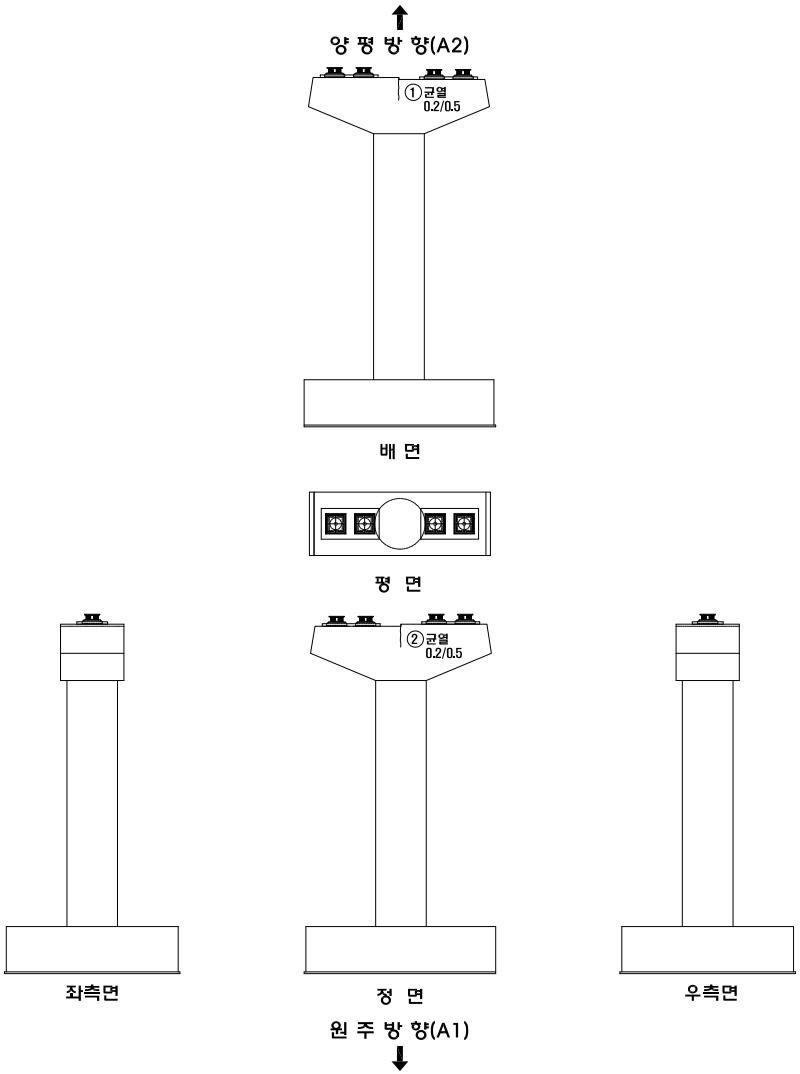

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P13)	외관조사망도	NONE	142

KEY PLAN



범 례



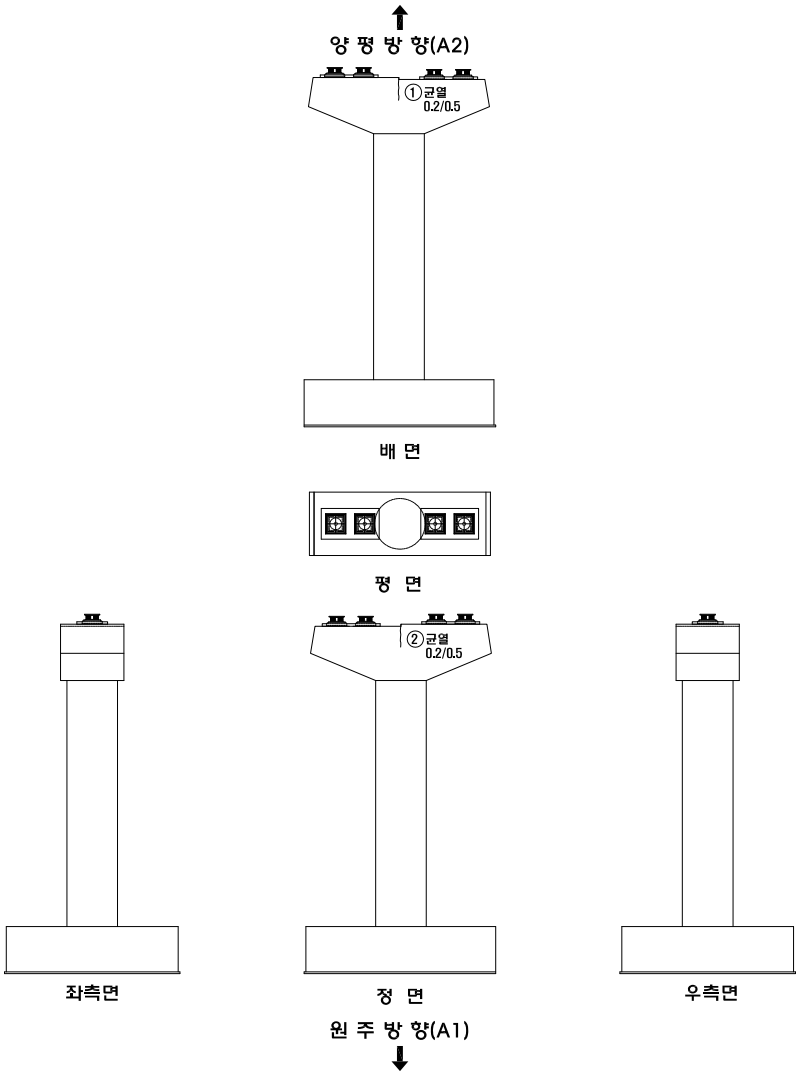

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P14)	외관조사망도	NONE	143

KEY PLAN



범 례



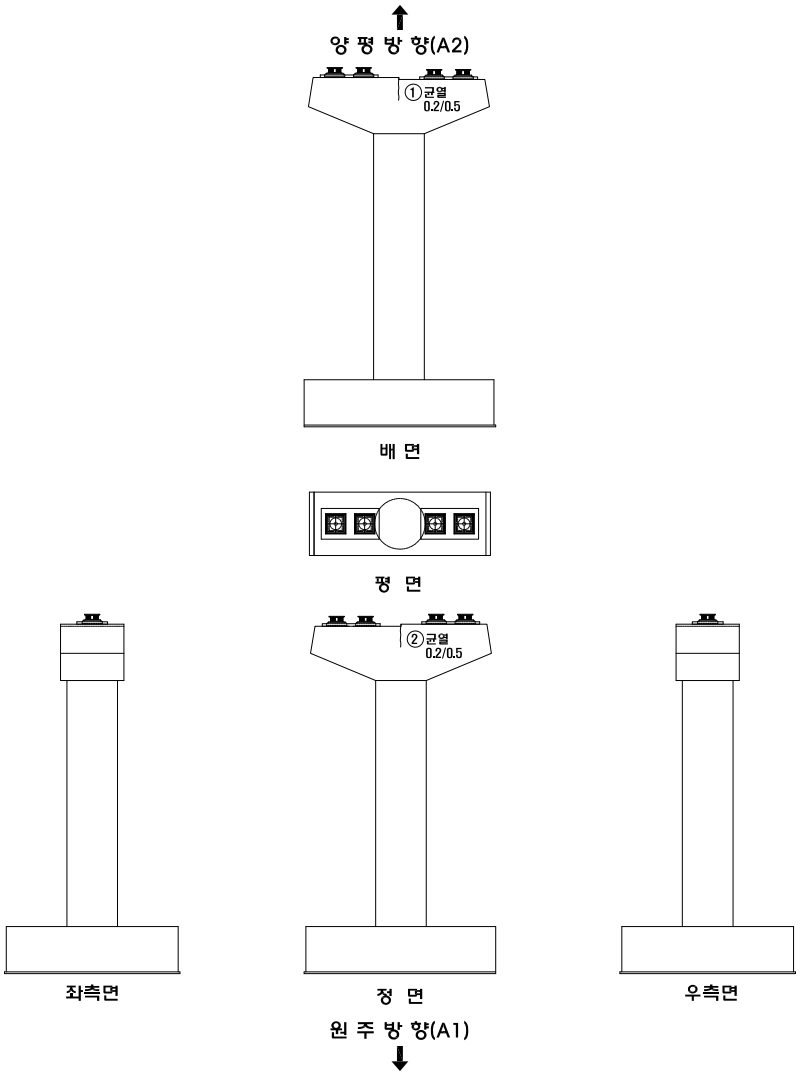

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P15)	외관조사망도	NONE	144

KEY PLAN



범 례



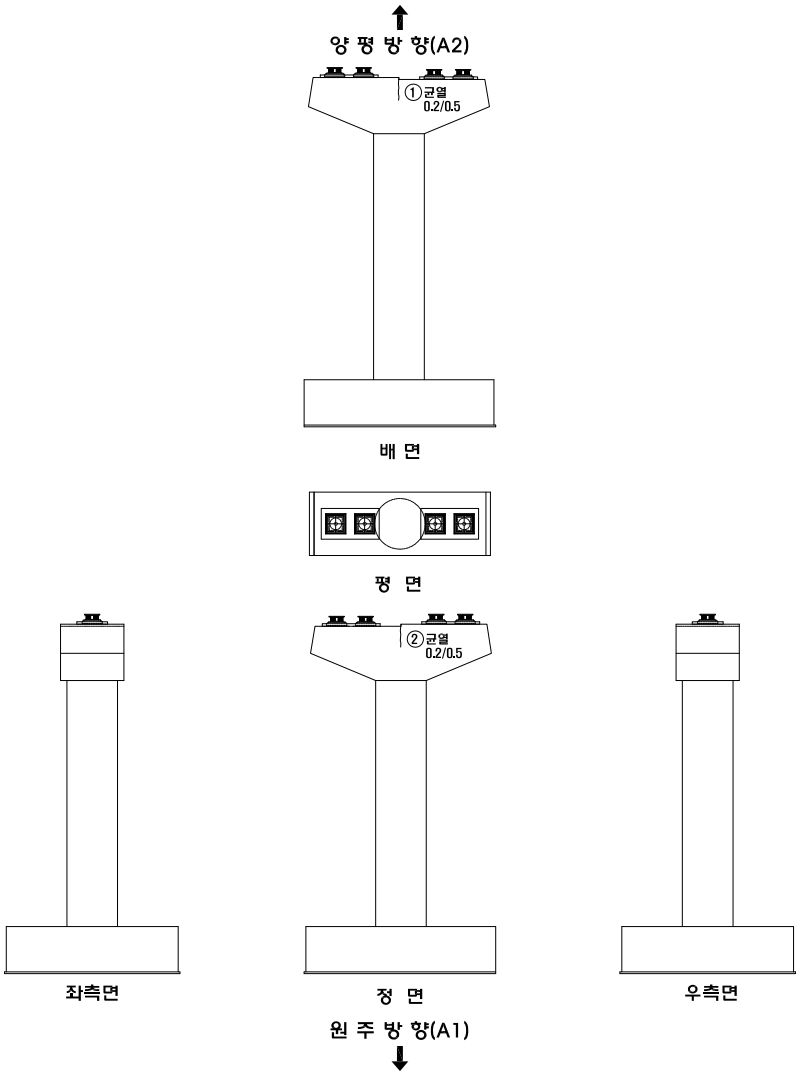

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P16)	외관조사망도	NONE	145

KEY PLAN



범 례



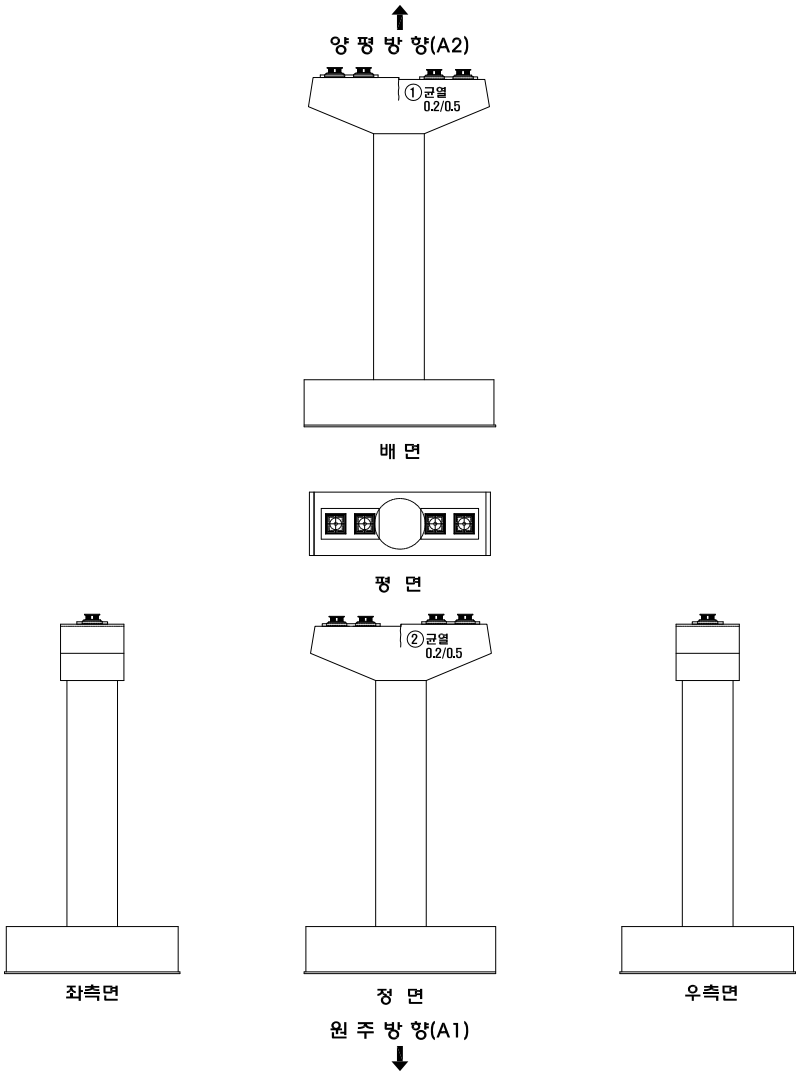

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P17)	외관조사망도	NONE	146

KEY PLAN



범 례



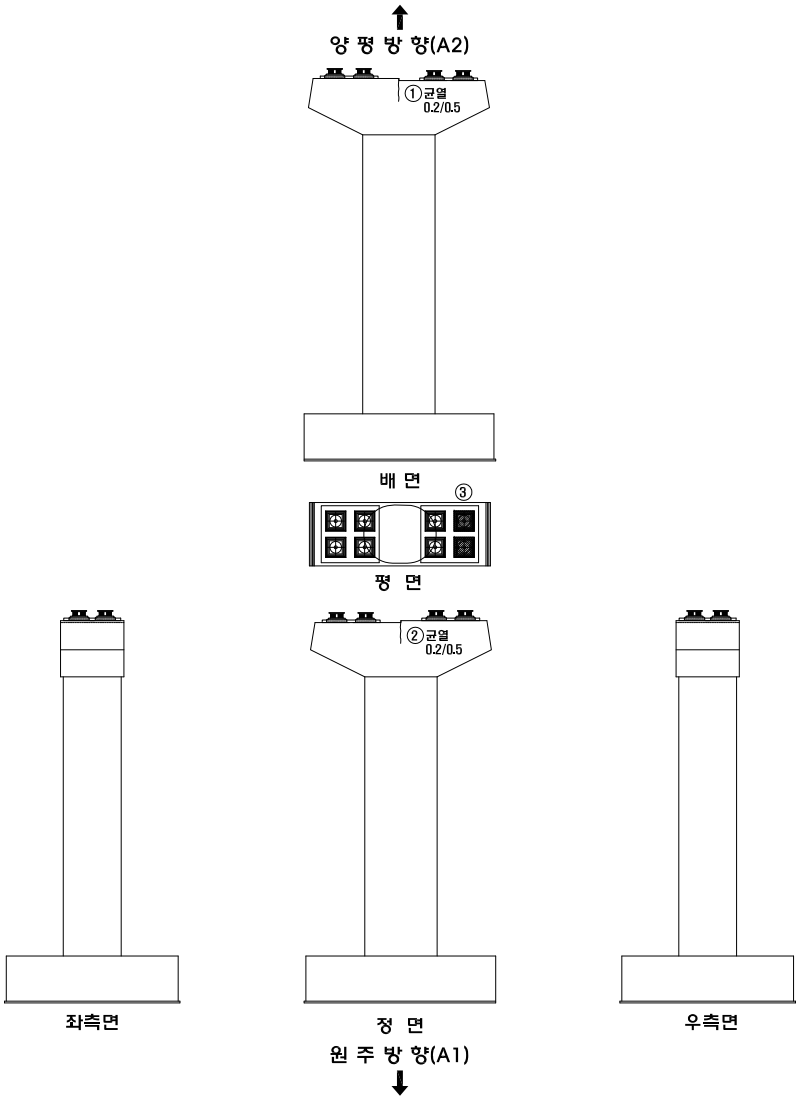

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	
3	교각	SOLE PLATE 부식					2	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P18)	외관조사망도	NONE	147

KEY PLAN



범 례



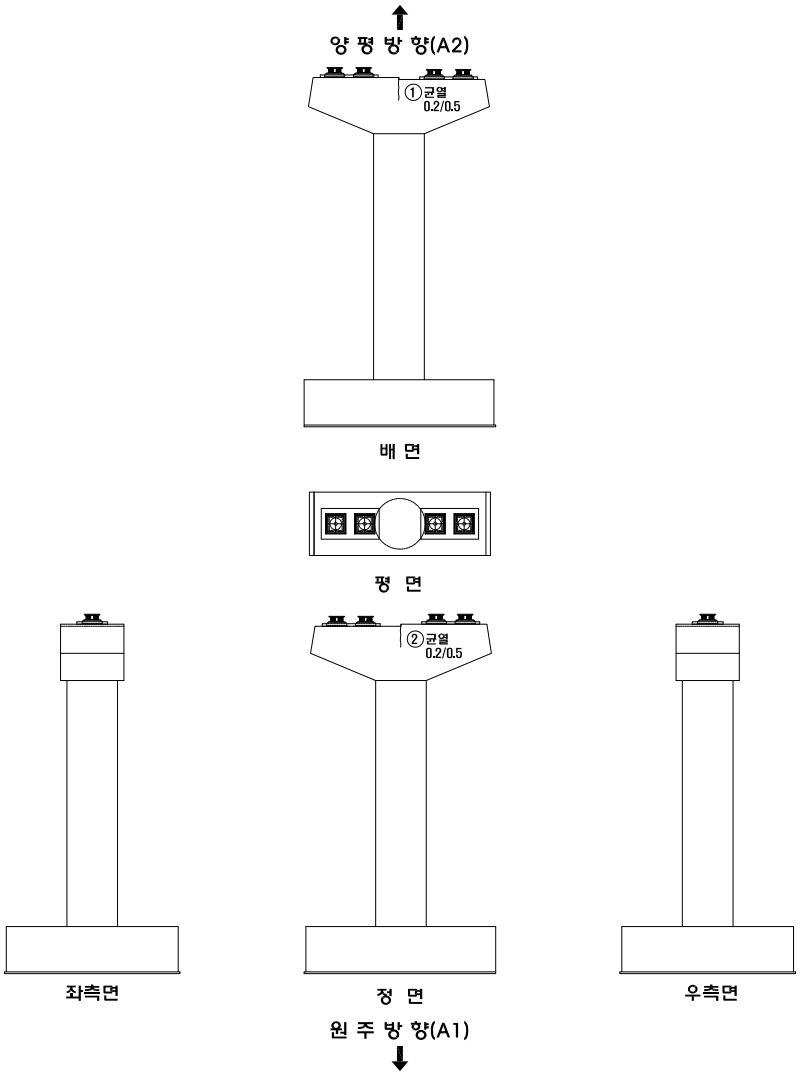

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P19)	외관조사망도	NONE	148

KEY PLAN



범 례



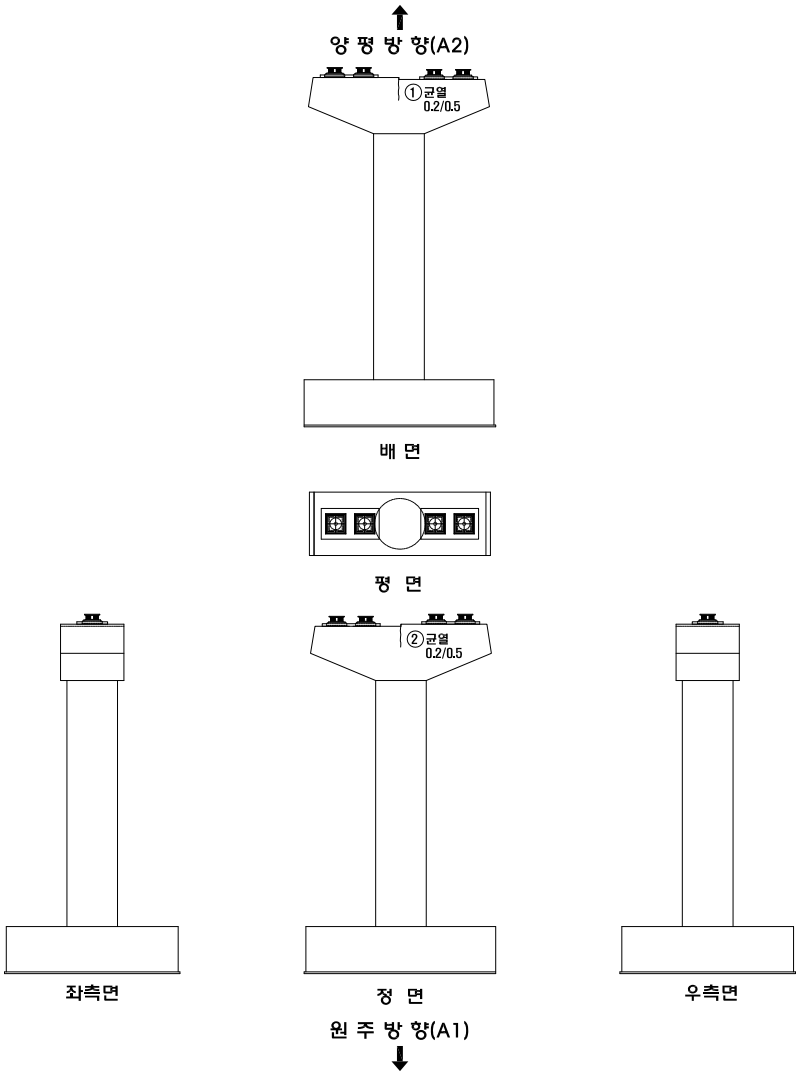

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P20)	외관조사망도	NONE	149

KEY PLAN



범 례



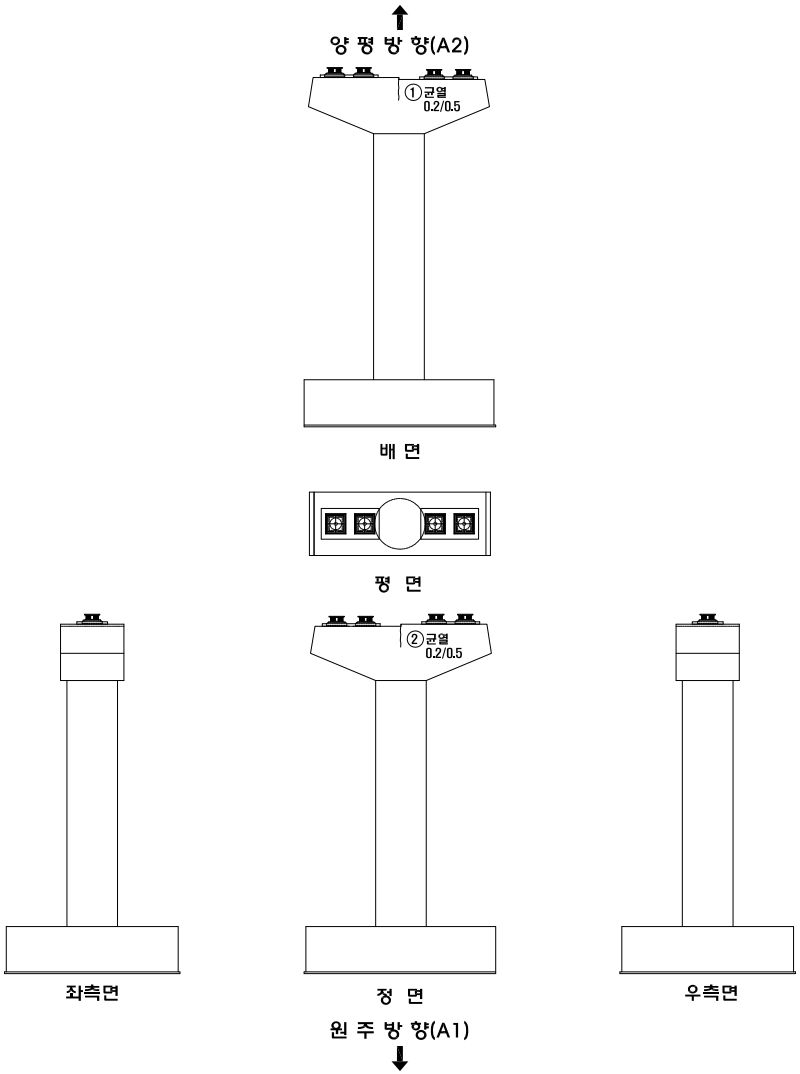

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P21)	외관조사망도	NONE	150

KEY PLAN



범 례



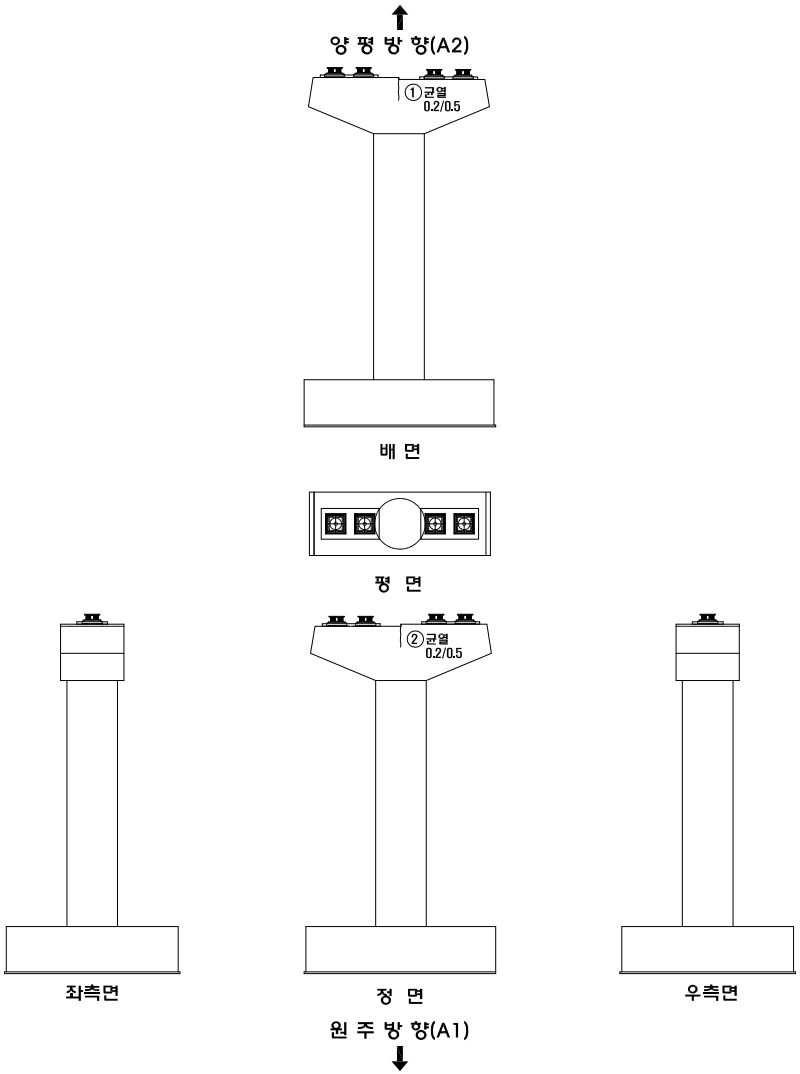

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P22)	외관조사망도	NONE	151

KEY PLAN



범 례



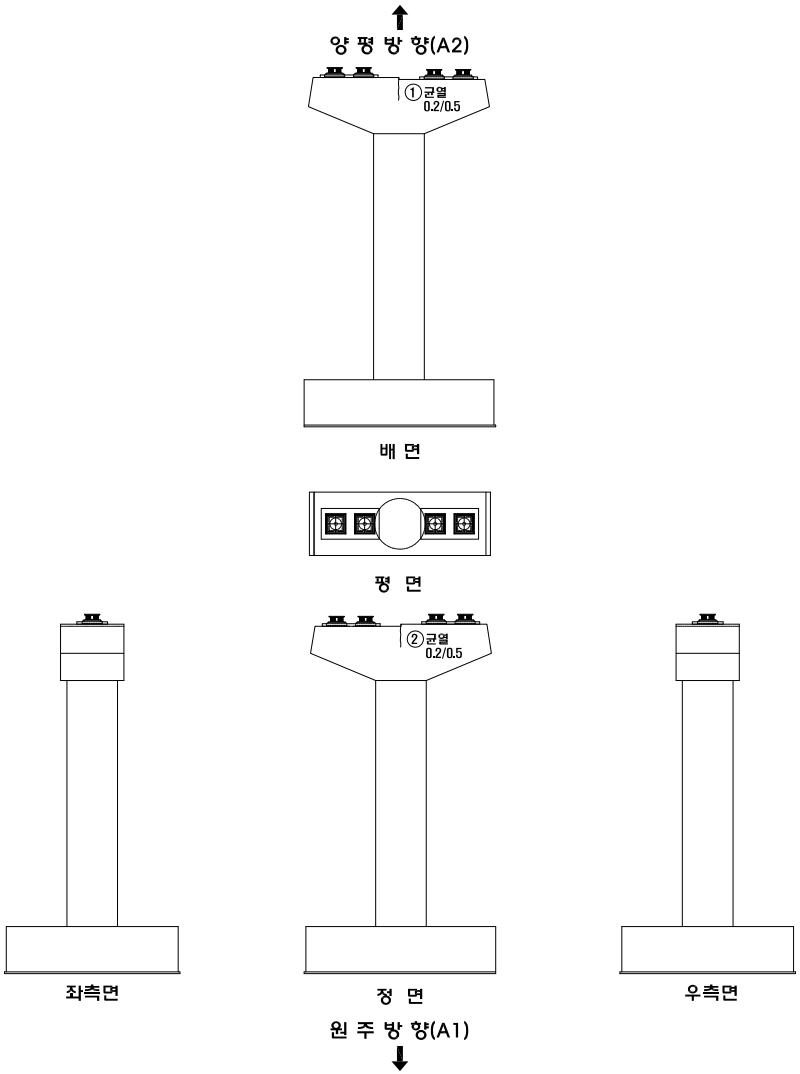

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P23)	외관조사망도	NONE	152

KEY PLAN



범 례



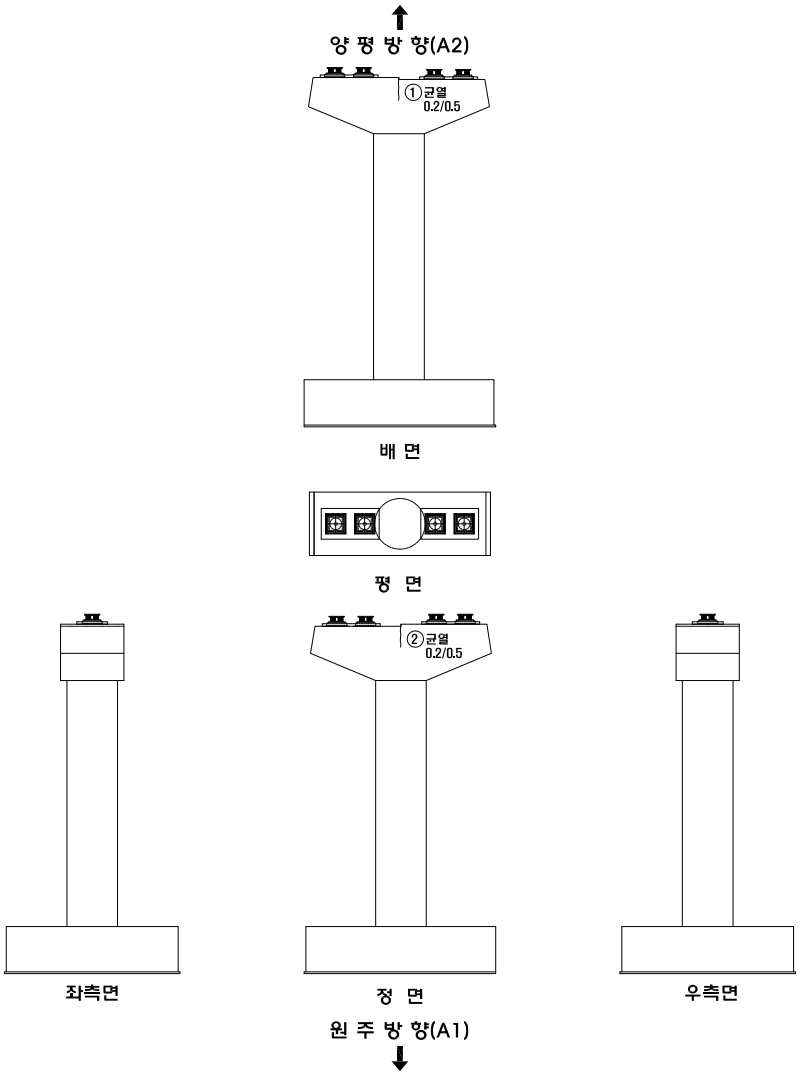

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P24)	외관조사망도	NONE	153

KEY PLAN



범 례



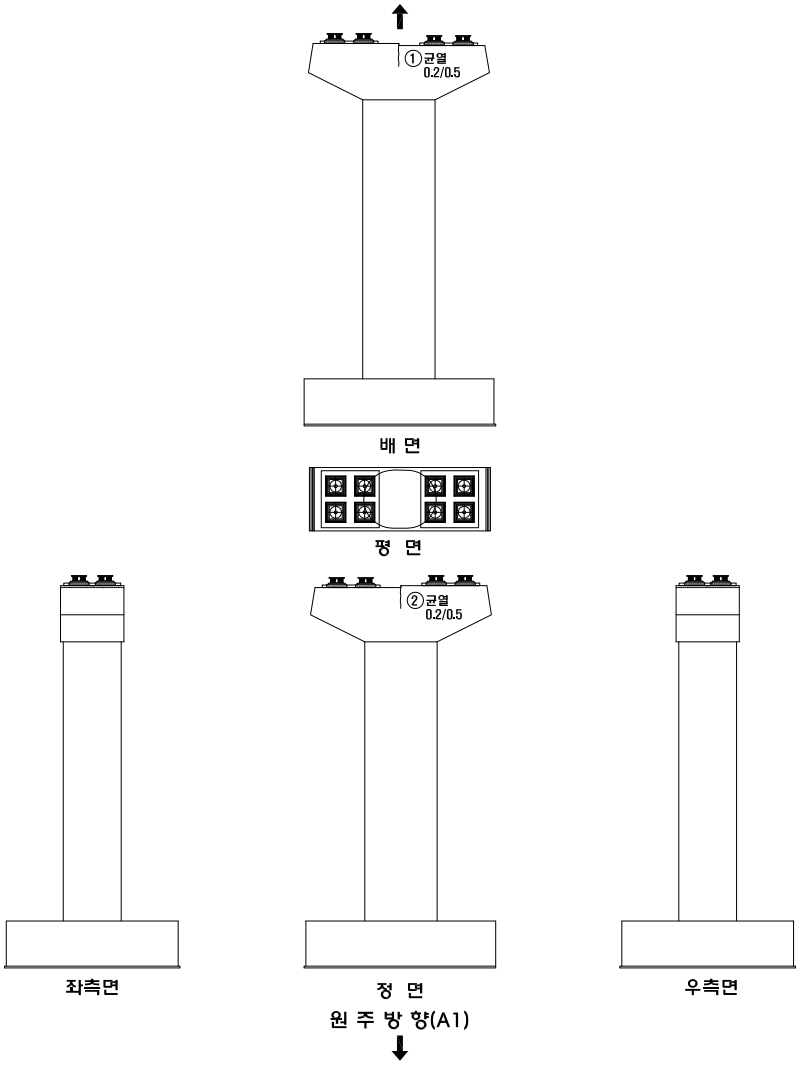

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P25)	외관조사망도	NONE	154

KEY PLAN



범 례



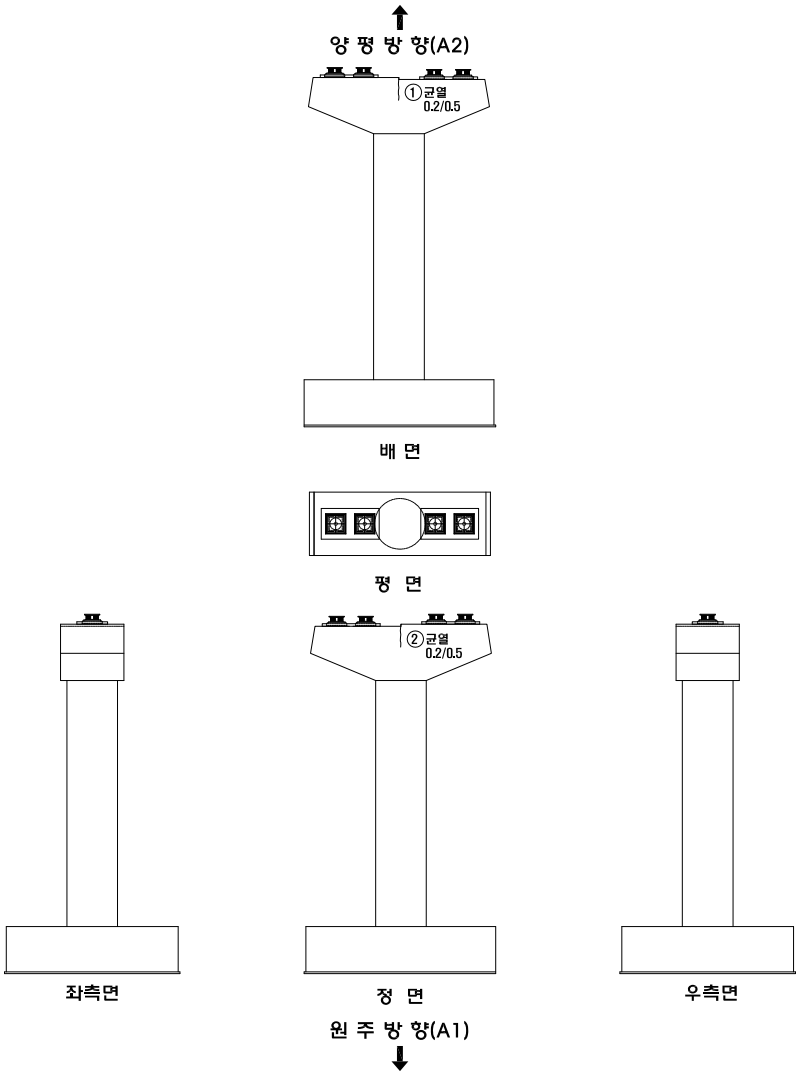

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P26)	외관조사망도	NONE	155

KEY PLAN



범 례



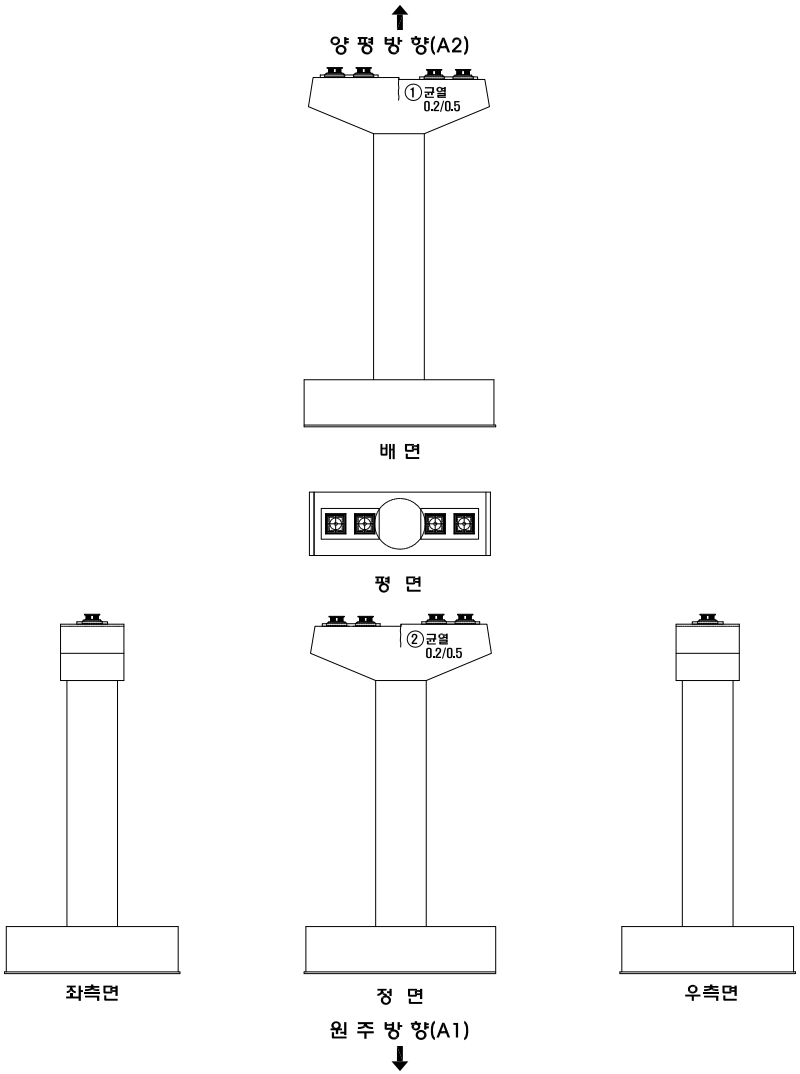

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P27)	외관조사망도	NONE	156

KEY PLAN



범 례



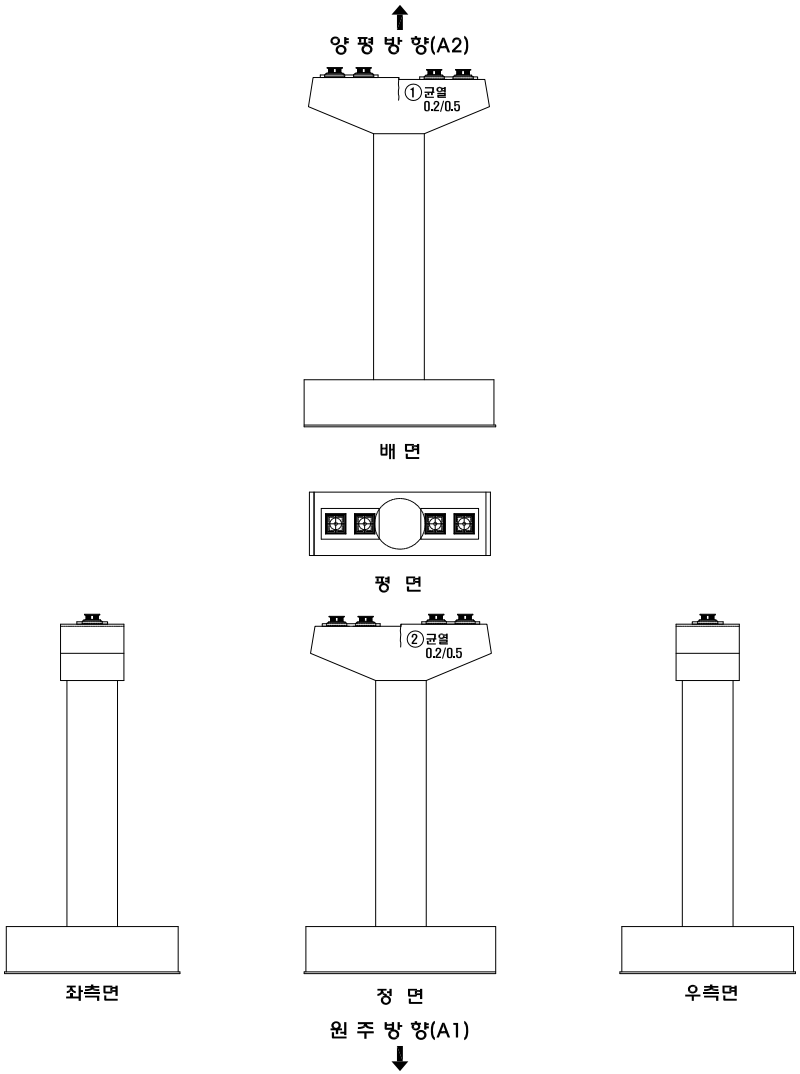

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P28)	외관조사망도	NONE	157

KEY PLAN



범 례



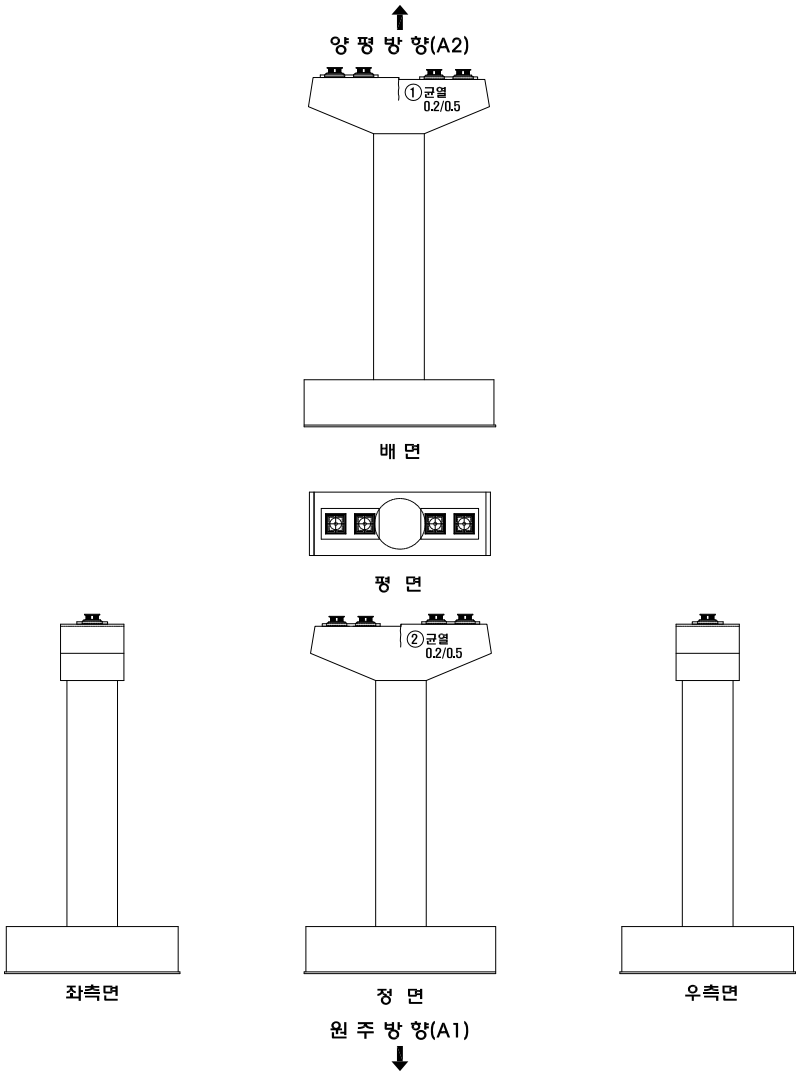

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P29)	외관조사망도	NONE	158

KEY PLAN



범 례



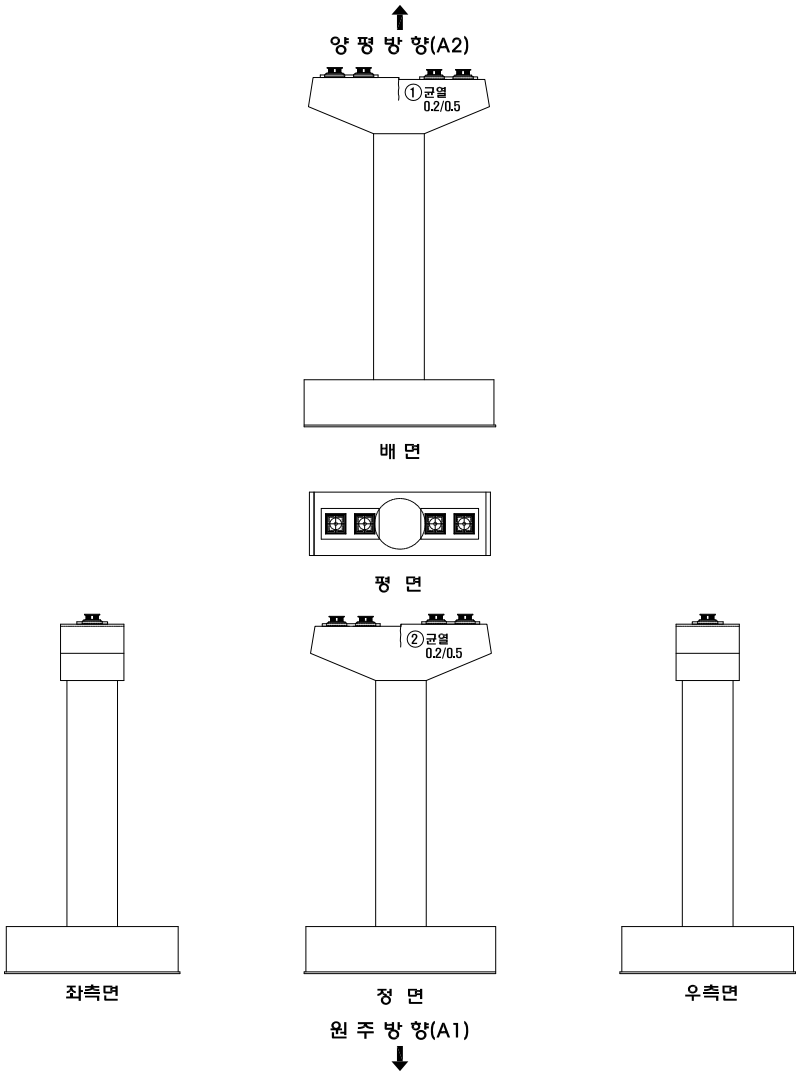

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P30)	외관조사망도	NONE	159

KEY PLAN



범 례



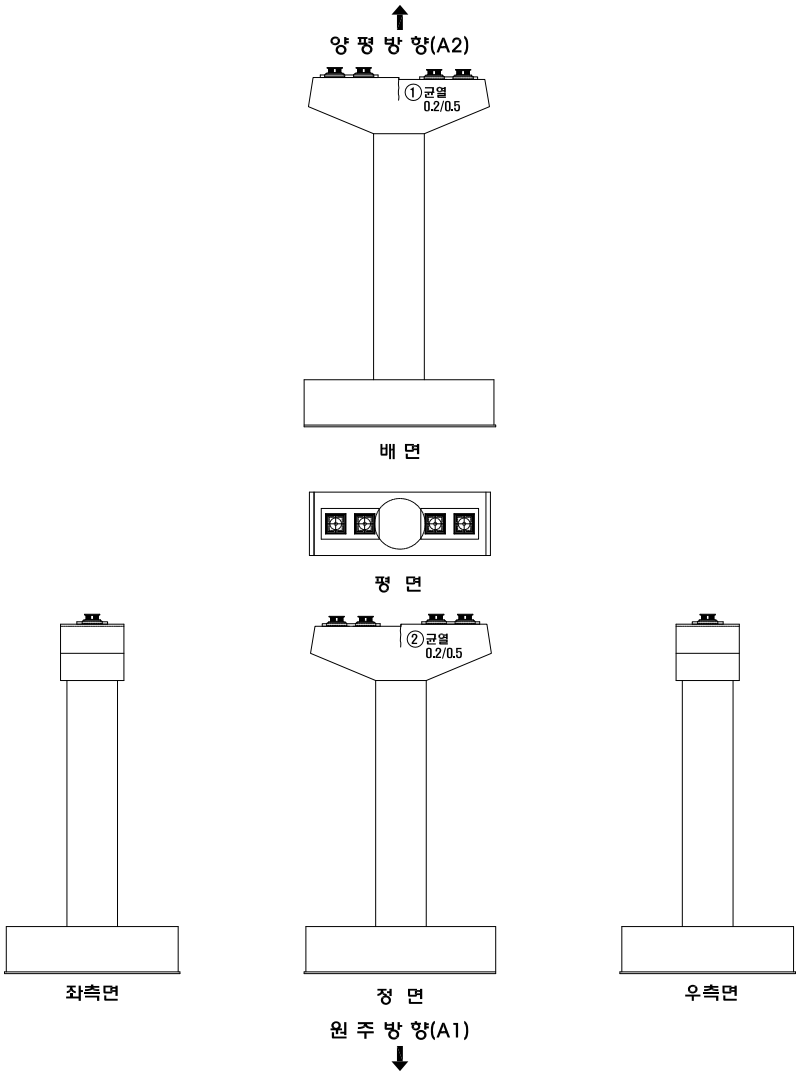

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	
1	교각	균열	0.20	0.50			1	
2	교각	균열	0.20	0.50			1	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교각 (P31)	외관조사망도	NONE	160

KEY PLAN



범 례



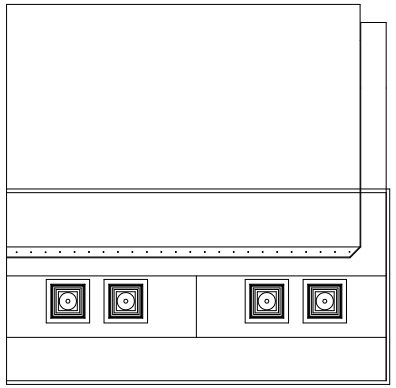

평 면

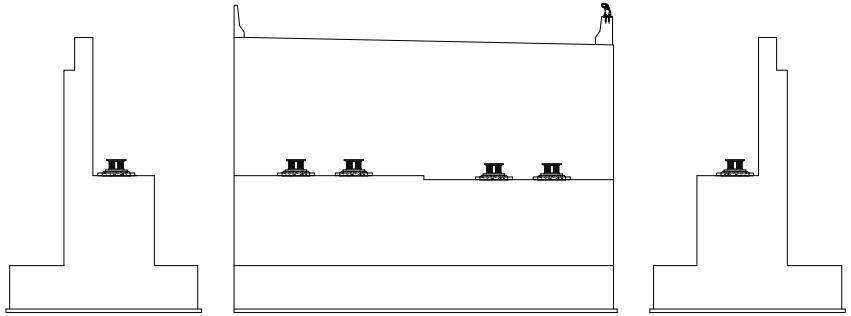

좌측면 정 면 우측면

일련번호	위 치	손 상 내 용	결 함 정 도					비 고
			폭(mm)	길이(m)	너비(m)	면적(㎡)	개소	

시행청	용역사	용역명	위 치	도면명	축 척	
수원국도관리사무소	(주) 천 마 기 술 단	국도37호선 세종대교 외 3개소 정밀점검	세종대교(양평방향) 교대 (A2)	외관조사망도	NONE	161
