

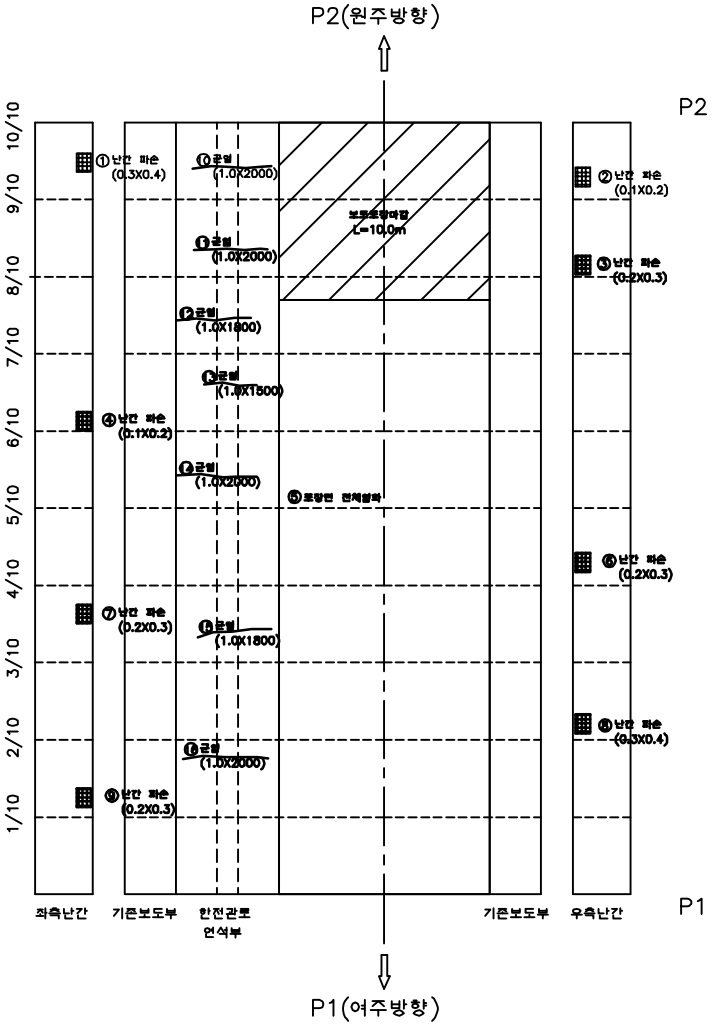

S2 SLAB 상면

현황조사결과표

번호	위치,구조 (마감철대)	손상철대	손상규모				사진 번호	비고
			W(mm,m)	L(m)	개소	계(m,m²,EA)		
1	난간	파손	0.3	0.4	1	0.12		
2	난간	파손	0.1	0.2	1	0.02		
3	난간	파손	0.2	0.3	1	0.06		
4	난간	파손	0.1	0.2	1	0.02		
5	포장부	탈락			1	-		
6	난간	파손	0.2	0.3	1	0.06		
7	난간	파손	0.2	0.3	1	0.06		
8	난간	파손	0.3	0.4	1	0.12		
9	난간	파손	0.2	0.3	1	0.06		
10	한전관 보호구체	균열	1.0	2.0	1	2.00		
11	한전관 보호구체	균열	1.0	2.0	1	2.00		
12	한전관 보호구체	균열	1.0	1.8	1	1.80		
13	한전관 보호구체	균열	1.0	1.5	1	1.50		
14	한전관 보호구체	균열	1.0	2.0	1	2.00		
15	한전관 보호구체	균열	1.0	1.8	1	1.80		
16	한전관 보호구체	균열	1.0	2.0	1	2.00		
