호남고속선 영곡터널_26(22.689~22.698km, S26)

외관조사망도 번호
U6_영곡터널_26(22k689~22k698)

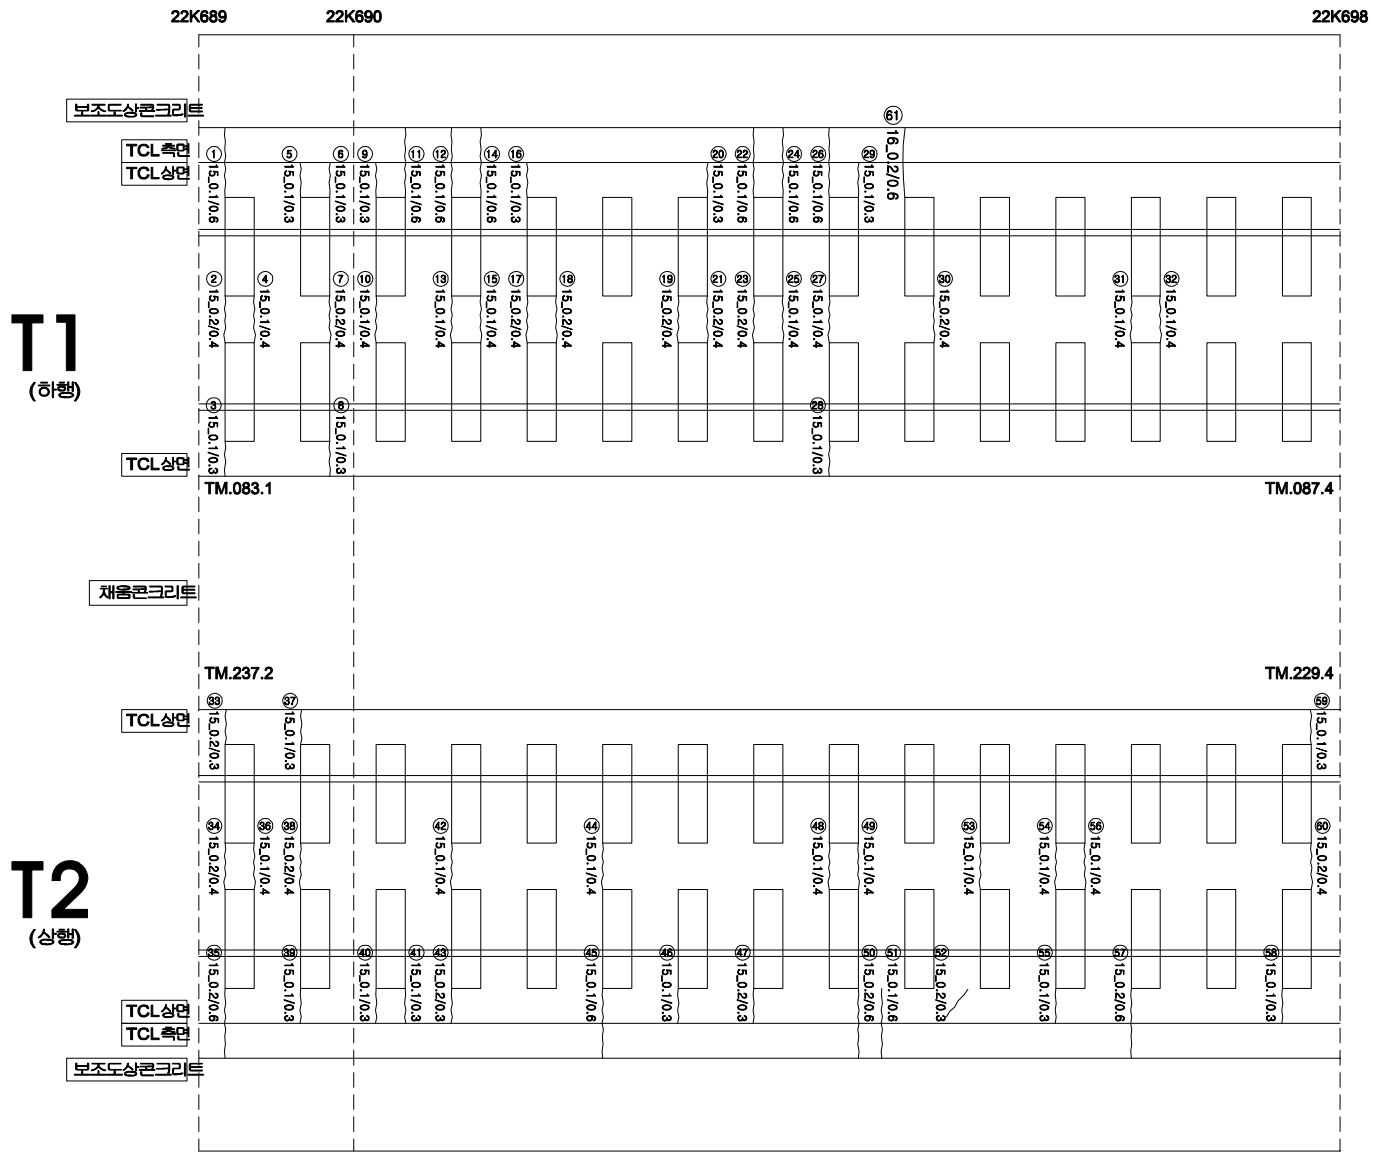

연번	손상	폭		연장		비고	연번	손상	폭		연장		비고
1	균열	0.1	㎜	0.6	m		56	균열	0.1	㎜	0.4	m	
2	균열	0.2	㎜	0.4	m		57	균열	0.2	㎜	0.6	m	
3	균열	0.1	㎜	0.3	m		58	균열	0.1	㎜	0.3	m	
4	균열	0.1	㎜	0.4	m		59	균열	0.1	㎜	0.3	m	
5	균열	0.1	㎜	0.3	m		60	균열	0.2	㎜	0.4	m	
6	균열	0.1	㎜	0.3	m		61	균열	0.2	㎜	0.6	m	
7	균열	0.2	㎜	0.4	m		62						
8	균열	0.1	㎜	0.3	m		63						
9	균열	0.1	㎜	0.3	m		64						
10	균열	0.1	㎜	0.4	m		65						
11	균열	0.1	㎜	0.6	m		66						
12	균열	0.1	㎜	0.6	m		67						
13	균열	0.1	㎜	0.4	m		68						
14	균열	0.1	㎜	0.6	m		69						
15	균열	0.1	㎜	0.4	m		70						
16	균열	0.1	㎜	0.3	m		71						
17	균열	0.2	㎜	0.4	m		72						
18	균열	0.2	㎜	0.4	m		73						
19	균열	0.2	㎜	0.4	m		74						
20	균열	0.1	㎜	0.3	m		75						
21	균열	0.2	㎜	0.4	m		76						
22	균열	0.1	㎜	0.6	m		77						
23	균열	0.2	㎜	0.4	m		78						
24	균열	0.1	㎜	0.6	m		79						
25	균열	0.1	㎜	0.4	m		80						
26	균열	0.1	㎜	0.6	m		81						
27	균열	0.1	㎜	0.4	m		82						
28	균열	0.1	㎜	0.3	m		83						
29	균열	0.1	㎜	0.3	m		84						
30	균열	0.2	㎜	0.4	m		85						
31	균열	0.1	㎜	0.4	m		86						
32	균열	0.1	㎜	0.4	m		87						
33	균열	0.2	㎜	0.3	m		88						
34	균열	0.2	㎜	0.4	m		89						
35	균열	0.2	㎜	0.6	m		90						
36	균열	0.1	㎜	0.4	m		91						
37	균열	0.1	㎜	0.3	m		92						
38	균열	0.2	㎜	0.4	m		93						
39	균열	0.1	㎜	0.3	m		94						
40	균열	0.1	㎜	0.3	m		95						
41	균열	0.1	㎜	0.3	m		96						
42	균열	0.1	㎜	0.4	m		97						
43	균열	0.2	㎜	0.3	m		98						
44	균열	0.1	㎜	0.4	m		99						
45	균열	0.1	㎜	0.6	m		100						
46	균열	0.1	㎜	0.3	m		101						
47	균열	0.2	㎜	0.3	m		102						
48	균열	0.1	㎜	0.4	m		103						
49	균열	0.1	㎜	0.4	m		104						
50	균열	0.2	㎜	0.6	m		105						
51	균열	0.1	㎜	0.6	m		106						
52	균열	0.2	㎜	0.3	m		107						
53	균열	0.1	㎜	0.4	m		108						
54	균열	0.1	㎜	0.4	m		109						
55	균열	0.1	㎜	0.3	m		110						

시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 참 여 자		균열			
			과 업 책 임 자	분 야 별 책 임 자				
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이 복 영	라 윤 강 김 경 기 윤 석 기	0.2/2.0 (0.3㎜이하 : 흑색) 0.4/2.0 (0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색) 0.6/2.0 (0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색) 1.0/2.0 (1.0㎜이상 : 분홍색)	침목도상분리 망상 박리,박락,파손 백태	재료분리 철근노출 누수,습윤부 시공이음분리,층분리	
