갈산교_토공노반_27(56.890~56.895km, L=5m)

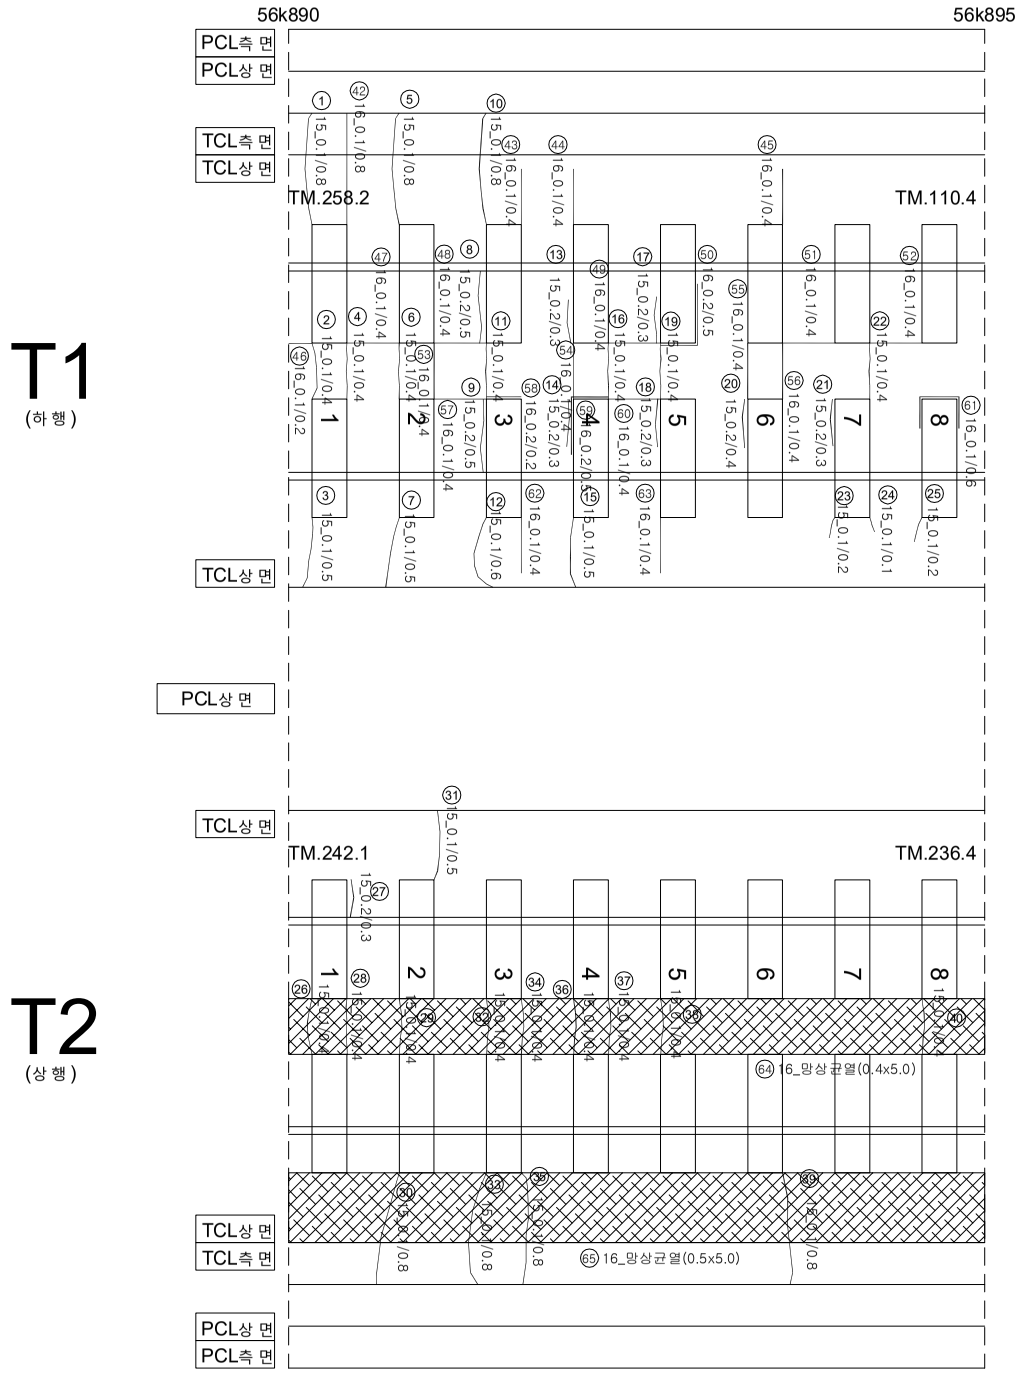

연번	손상	폭		연장		비고	연번	손상	폭		연장		비고
1	균열	0.1	㎜	0.8	m		55	균열	0.1	㎜	0.4	m	
2	균열	0.1	㎜	0.4	m		56	균열	0.1	㎜	0.4	m	
3	균열	0.1	㎜	0.5	m		57	균열	0.1	㎜	0.4	m	
4	균열	0.1	㎜	0.4	m		58	균열	0.2	㎜	0.2	m	
5	균열	0.1	㎜	0.8	m		59	균열	0.2	㎜	0.5	m	
6	균열	0.1	㎜	0.4	m		60	균열	0.1	㎜	0.4	m	
7	균열	0.1	㎜	0.5	m		61	경계부 균열	0.1	㎜	0.6	m	
8	경계부 균열	0.2	㎜	0.5	m		62	균열	0.1	㎜	0.4	m	
9	경계부 균열	0.2	㎜	0.5	m		63	균열	0.1	㎜	0.4	m	
10	균열	0.1	㎜	0.8	m		64	망상균열	0.4	m	5.0	m	
11	균열	0.1	㎜	0.4	m		65	망상균열	0.5	m	5.0	m	
12	균열	0.1	㎜	0.6	m		66						
13	경계부 균열	0.2	㎜	0.3	m		67						
14	경계부 균열	0.2	㎜	0.3	m		68						
15	균열	0.1	㎜	0.5	m		69						
16	균열	0.1	㎜	0.4	m		70						
17	경계부 균열	0.2	㎜	0.3	m		71						
18	경계부 균열	0.2	㎜	0.3	m		72						
19	균열	0.1	㎜	0.4	m		73						
20	경계부 균열	0.2	㎜	0.4	m		74						
21	경계부 균열	0.2	㎜	0.3	m		75						
22	균열	0.1	㎜	0.4	m		76						
23	균열	0.1	㎜	0.2	m		77						
24	균열	0.1	㎜	0.1	m		78						
25	균열	0.1	㎜	0.2	m		79						
26	균열	0.1	㎜	0.4	m		80						
27	경계부 균열	0.2	㎜	0.3	m		81						
28	균열	0.1	㎜	0.4	m		82						
29	균열	0.1	㎜	0.4	m		83						
30	균열	0.1	㎜	0.8	m		84						
31	균열	0.1	㎜	0.5	m		85						
32	균열	0.1	㎜	0.4	m		86						
33	균열	0.1	㎜	0.8	m		87						
34	균열	0.1	㎜	0.4	m		88						
35	균열	0.1	㎜	0.8	m		89						
36	균열	0.1	㎜	0.4	m		90						
37	균열	0.1	㎜	0.4	m		91						
38	균열	0.1	㎜	0.4	m		92						
39	균열	0.1	㎜	0.8	m		93						
40	균열	0.1	㎜	0.4	m		94						
41	균열	0.1	㎜	0.8	m		95						
42	균열	0.1	㎜	0.4	m		96						
43	균열	0.1	㎜	0.4	m		97						
44	균열	0.1	㎜	0.4	m		98						
45	균열	0.1	㎜	0.4	m		99						
46	균열	0.1	㎜	0.2	m		100						
47	균열	0.1	㎜	0.4	m		101						
48	균열	0.1	㎜	0.4	m		102						
49	균열	0.2	㎜	0.5	m		103						
50	경계부 균열	0.1	㎜	0.4	m		104						
51	균열	0.1	㎜	0.4	m		105						
52	균열	0.1	㎜	0.4	m		106						
53	균열	0.1	㎜	0.4	m		107						
54	균열	0.1	㎜	0.4	m		108						

시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 책 임 자	분 야 별 책 임 자	균 열			
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이 복 영	라 윤 강 김 경 기 윤 석 기	0.2/2.0 (0.3㎜이하 : 흑색) 0.4/2.0 (0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색) 0.6/2.0 (0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색) 1.0/2.0 (1.0㎜이상 : 분홍색)	침목도상분리 망상 박리,박락,파손 백태	재료분리 철근노출 누수,습윤부 시공이음분리,층분리	
