가도 및 축도 계획도

S=1:800

1. 세원교 철거시

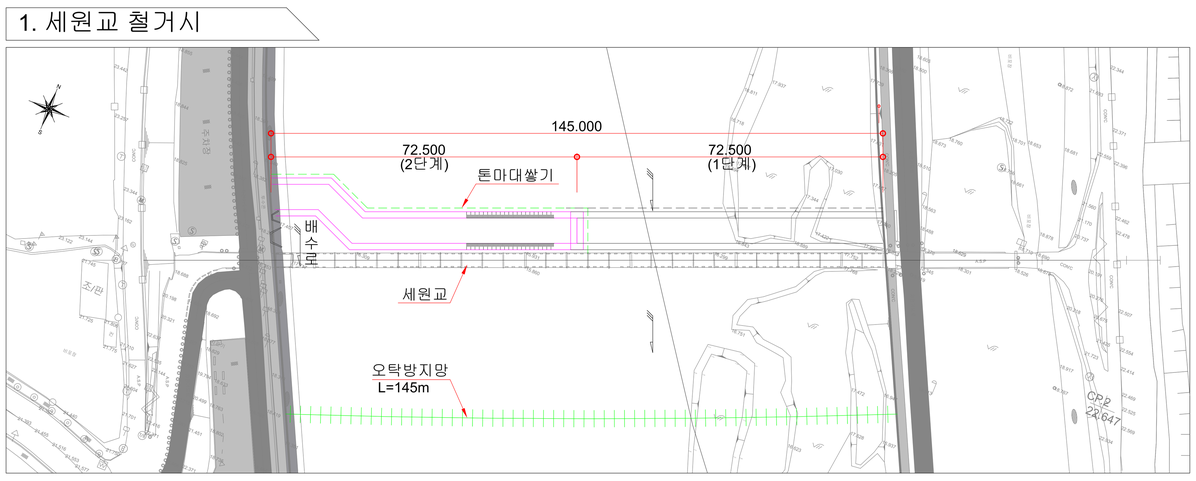

2. 하부기초 시공시

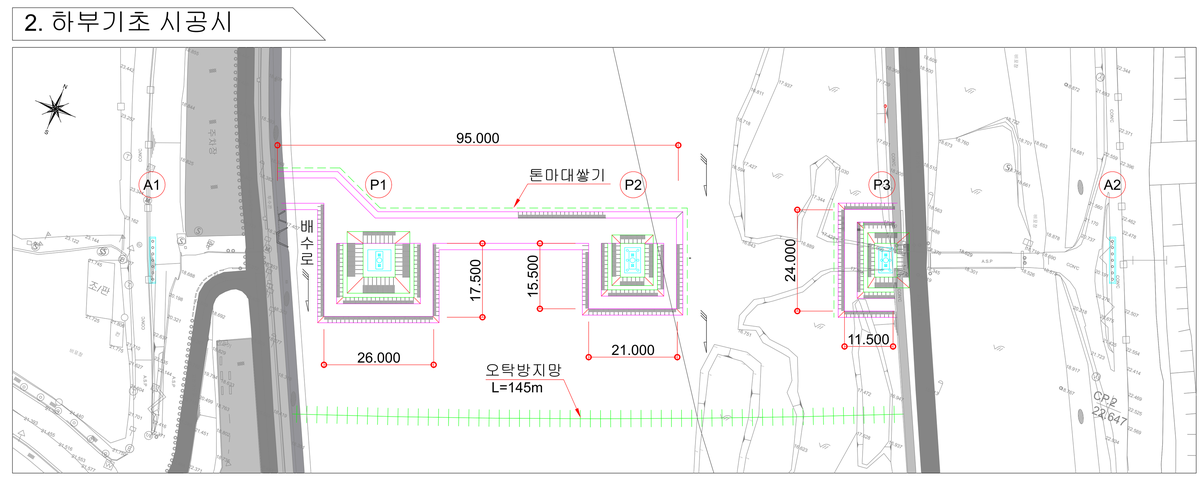

3. 거더 가설시(SEG 1~3)

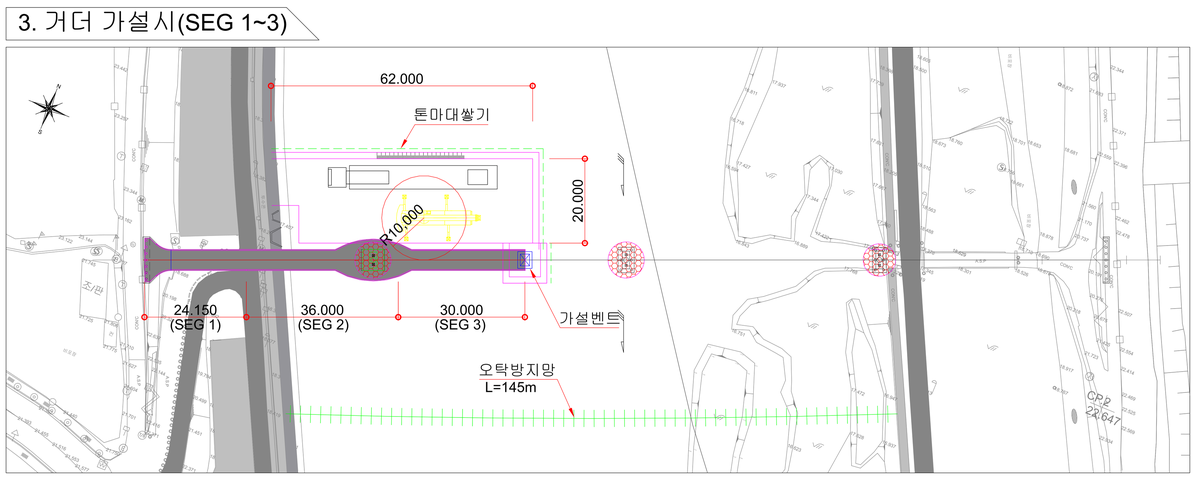

4. 거더 가설시(SEG 4~5)

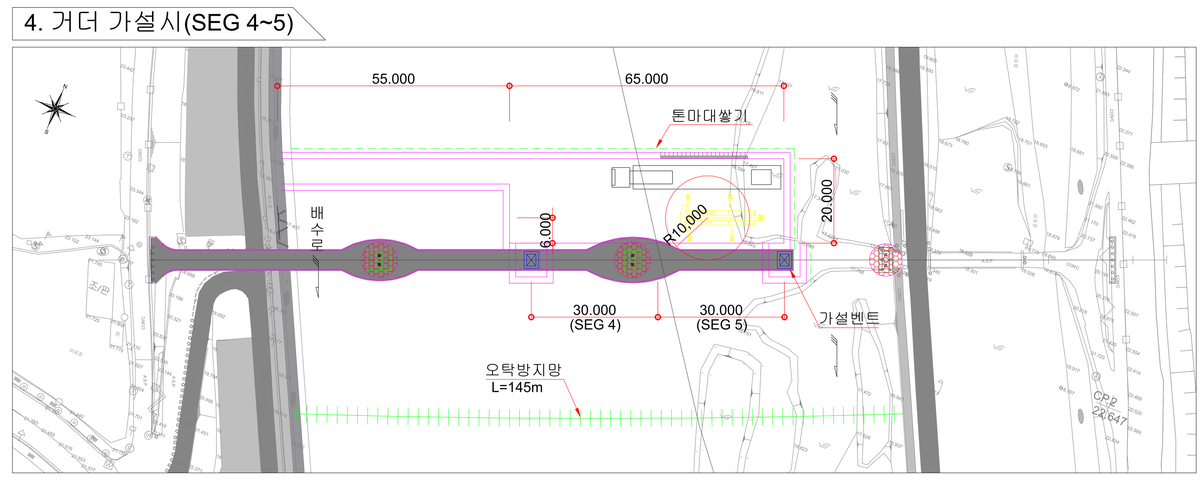

5. 거더 가설시(SEG 6~8)

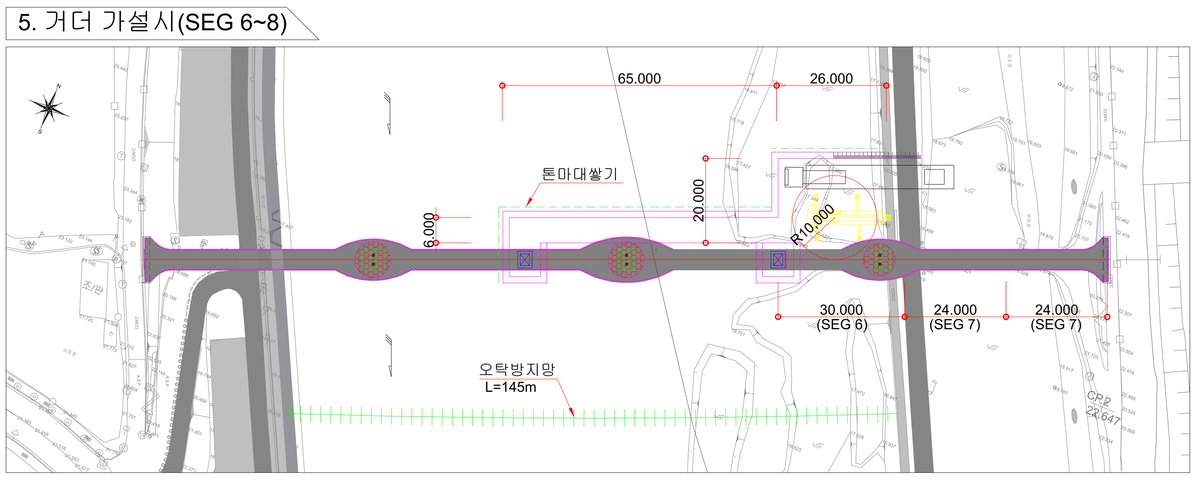

가도 및 축도 단면도

(가도 단면도)



(축도 단면도)



재 료 표

구 분	규 격	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	비 고
흙 쌓 기	가 도	1305 ㎥	1710 ㎥	2948 ㎥	4172 ㎥	2588 ㎥	
	축 도	-	1680 ㎥	-	-	-	
톤마대 쌓기	1.0X1.0X0.7	250 개	447 개	288 개	450 개	330 개	
오탁방지망	145 m						
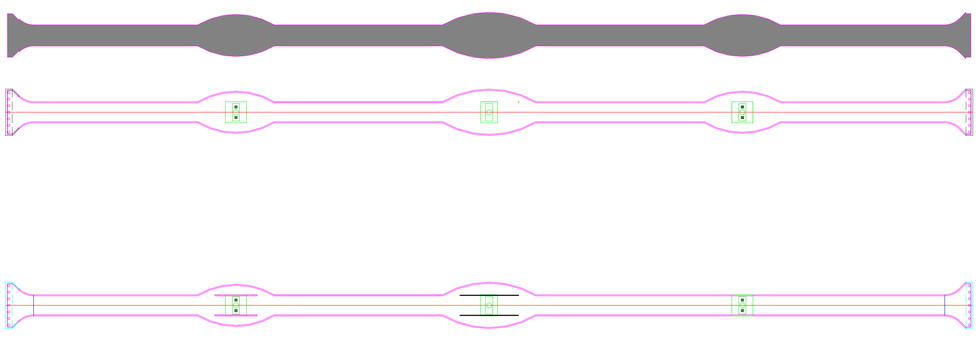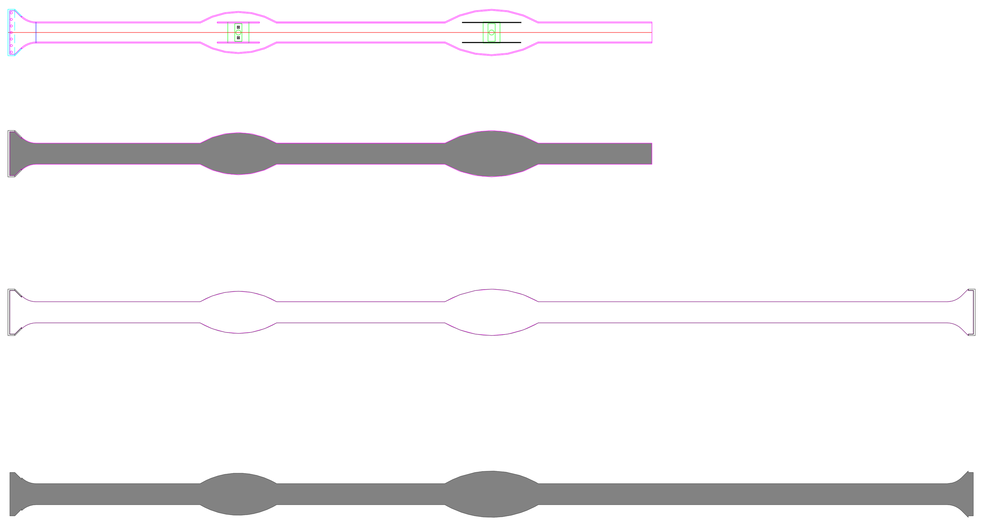
* 가도 및 축도 수위 기준을 2년 빈도 홍수위를 적용시 평수위보다 2.0m정도로 다소 높은 관계로 하부 및 상부거더 가설 공정이 6개월 이내인 점을 감안하여 평수위 기준으로 계획하였으며, 공사시에는 가동보 개방을 통해 수위를 최대한 낮춘후 기존 세원교 철거 및 가도 설치를 하여야 한다.
